	# INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	marzo 5 de 2026				
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	18/02/2026	Y EL	5/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA – POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	CINCO (05) meses
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 4,836,119,240.00
PROCESO No.:	CM2-015-2025	FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO No.:	01492-2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	Consorcio POMCA Río Fonce 2025	LOCALIZACIÓN	POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	902.015.095-7	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERO RODOLFO SANCHEZ

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	18/12/2025	18/12/2025	17/05/2026	5M-150 D	0	17/05/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				5	150			
% AVANCE FISICO				9%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101272742	24/12/2025	2	CUMPLIMIENTO	18/12/2025	18/11/2026	$ 118.810.152,00
				PAGO DE SALARIOS	18/12/2025	18/05/2029	$ 118.810.152,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	$ -
				CALIDAD DEL SERVICIO	18/12/2025	18/05/2027	$ 118.810.152,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	11-44-101272742	24/12/2025	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/12/2025	18/05/2026	$ 284.700.000,00

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**		
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO	FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 4.836.119.240,00			
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.836.119.240,00			
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00			
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 4.836.119.240,00			
VALOR PAGADO:	$ 0,00			
VALOR POR PAGAR:	$ 4.836.119.240,00			
% POR PAGAR	100,00%			
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	**TOTAL DE ADICIONES**		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

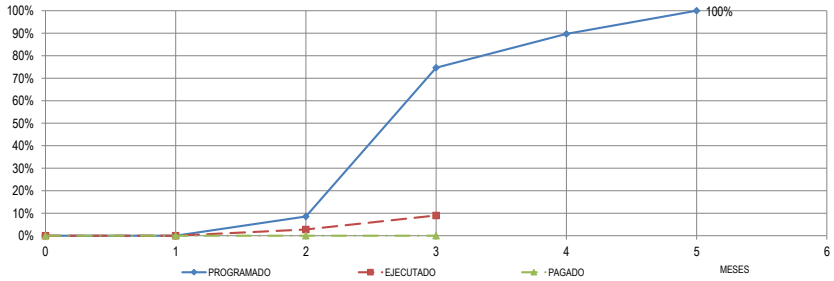

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	0%	0%	0%
2	9%	3%	0%
3	75%	9%	0%
4	90%		
5	100%		

PROGRAMADO	75%	
EJECUTADO	9%	
ATRASOS	-66%	
DESEMPEÑO		0,12
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	434.767.120
Pendiente por can	$	4.401.352.120
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1. Plan de trabajo - 1.1.2. Realizar la identificación, caracterización y priorización de los actores - 1.1.3. Diseñar la estrategia de participación en las fases del POMCA - 1.1.4 Proceso de conformación del consejo de cuenca - 1.1.5. Recopilacion y análisis secundaria - 1.1.6.Realizar análisis situacional inicial - 1.1.7 Plan operativo detallado

2.1.1. Conformar el consejo de cuenca - 2.1.2.1. Cartografia base

Se envia PDT con fuljo fisico y financiero con corte a la semana 11

RECOMENDACIONES

Continuar con las actividades establecidas en el PDT hasta tanto se emita el concepto de aprobación de la prórroga.

RIESGOS Y ALERTAS

En el oficio CPRF-016-2026, de fecha 04/03/2026, el consultor solicita la prórroga del Contrato No. 01492 de 2025. A la fecha de entrega del presente informe, dicha solicitud se encuentra en estudio por parte de esta interventoría, con el fin de emitir el concepto correspondiente para la supervisión.

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA

Luego del concepto sobre la solicitud de prórroga del consultor, se deberá generar la versión No. 2 del PDT, la cual fue presentada por el consultor mediante el oficio CPRF-016-2026. Actualmente, este documento se encuentra en revisión por parte de la interventoría, con el fin de emitir el concepto correspondiente a la supervisión.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

https://drive.google.com/drive/folders/1s5TXVbCVF_D_VEkXRSo5HHrdNl7Iv6bT?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wIg8cCQMhIX-?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wIg8cCQMhIX-?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1xlEz6lyMso-y7RxVJcsYSejkGBviqm9h?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
https://drive.google.com/drive/folders/1GNgVsvJFA_i2Rzn6OAgG34UORls3TAXF?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1SrAXNypvwws-36YJzYdbkcLBt_2z4KON?usp=sharing		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 3	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Juridica y Admon	
V.B:			
