	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	Abril 5 de 2026				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	6/03/2026	Y EL	2/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA – POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	CINCO (05) meses	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA		VALOR INICIAL CONTRATO	$ 4,836,119,240.00	
PROCESO No.:	CM2-015-2025		FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATO No.:	01492-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE MAYO 2026	
CONTRATISTA:	Consorcio POMCA Rio Fonce 2025		LOCALIZACIÓN	POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER	
NIT CONTRATISTA:	902.015.095-7		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental	
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco		APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERO RODOLFO SANCHEZ	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	18/12/2025	18/12/2025	17/05/2026	5M-150 D	0	17/05/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				5	150			
% AVANCE FISICO				11%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	37-44-101045855	12/12/2025	0	CUMPLIMIENTO	11/12/2025	11/11/2026	$ 967.223.848,00
				PAGO DE SALARIOS	11/12/2025	11/05/2029	$ 967.223.848,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	$ -
				CALIDAD DEL SERVICIO	11/12/2025	11/05/2027	$ 967.223.848,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	37-40-101030134	12/12/2025	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	11/12/2025	11/05/2026	$ 569.400.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 4.836.119.240,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 4.836.119.240,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 4.836.119.240,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 4.836.119.240,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	**TOTAL DE ADICIONES**			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

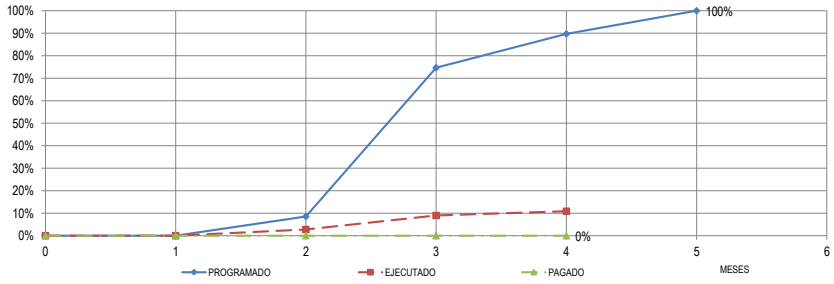

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	0%	0%	0%
2	9%	3%	0%
3	75%	9%	0%
4	90%	11%	0%
5	100%		

PROGRAMADO	90%	
EJECUTADO	11%	
ATRASOS	-79%	
DESEMPEÑO		0,12
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	526.169.773
Pendiente por can	$	4.309.949.467
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.2. Avance Realizar la identificación, caracterización y priorización de los actores, Planeación y programación de Talleres (17), 1.1.3. Diseñar la estrategia de participación en las fases del POMCA, 2.1. Avance caracterización básica

Se enxa PDT con fuljo fisico y financiero con corte a la semana 15

RECOMENDACIONES

Continuar con las actividades establecidas en el PDT hasta tanto se emita el concepto de aprobación de la prórroga, solicitada en el oficio OF-POM-24-26 DE FECHA 18/03/2026

Proyectar el PDT versión 2 según tiemposolicitado en prórroga

RIESGOS Y ALERTAS

Se evidencia un atraso en % de fisico y financiero, para lo cual el consultor solicito prorroga y la interventoria remitio a la supervisón oficio OF-POM-24-26 DE FECHA 18/03/2026 a la fecha de este informe no se tiene respuesta

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA

Luego del concepto sobre la solicitud de prórroga del consultor, se deberá generar la versión No. 2 del PDT, la cual fue presentada por el consultor mediante el oficio CPRF-016-2026. Actualmente, este documento se encuentra en revisión por parte de la supervisión

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

https://drive.google.com/drive/folders/1s5TXVbCVF_D_VEkXRSo5HHrdNl7lv6bT?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wIg8cCQMhIX-?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1KZPNQ-znmdNkJlJ0NRRkpsJCjAI4XNwr?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1xlEz6lyMso-y7RxVJcsYSejkGBviqm9h?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
https://drive.google.com/drive/folders/16Th0wp1c0PPczFxBSxihCzAOvqf9Tpqk?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1SrAXNypvwws-36YJzYdbkcLBt_2z4KON?usp=sharing		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 4	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Juridica y Admon	
V.B:			
