CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

CONTRATO ☐ CONVENIO [X]

Proyecto 4.3 MPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

LOCALIZACIÓN: Municipio: Santa Cruz de Lorica, San Antero y San Bernardo del Viento

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: abril 30 de 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	009 de 2026
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de Asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 de enero de 2026
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos la implementación del plan de manejo de dos áreas Protegidas en el departamento de Córdoba en las categorías de DRMI y DCS: Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y Sectores Aledaños al Delta Estuarino el Río Sinú y Distrito de Conservación de Suelos Ciénaga de Bañó.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$416.699.410
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $146.000.000
PLAZO:	Seis (06) meses
FECHA DE INICIO:	Veintinueve (29) de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION:	Veintinueve (29) de julio de 2026

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101210850			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	26/01/2026	27/01/2027	$41.669.941,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	26/01/2026	27/01/2027	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	26/01/2026	27/01/2027	$41.669.941,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	26/01/2026	27/07/2029	$20.834.970,50
POLIZA RCE No	Anexo 0	25-40-101056072		
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	26/01/2026	27/07/2026	$350.181.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-40-101056072			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	29/01/2026	30/01/2027	$41.669.941,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	29/01/2026	30/01/2027	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	29/01/2026	30/01/2027	$41.669.941,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	29/01/2026	30/07/2029	$20.834.970,50
POLIZA RCE No	Anexo 2	25-40-101056072		
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	29/01/2026	30/07/2026	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actividad 1: Apoyar las acciones del Programa Vida Manglar, sumado a las actividades de vigilancia y control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar.

Se realizo la reunión inicial de planificación y programación para los monitoreos acuáticos y terrestres, con la orientación de la Ingeniera Forestal, posteriormente se realizaron las visitas a los centros de acopio y los monitoreos acuáticos para un total de 17 actividades de control y vigilancia de la manera:

16 terrestres (Cuatro en Caño Lobo, tres en Cantarillo, tres en La Balsa, seis en Tinajones (3 Hijo y 3 Rivera); realizados desde el 27 de marzo al 30 de abril y un monitoreo acuático el 23 de abril en la ruta Caño Mocho, Caño Salado y Angostura.

En relación al Comité Técnico del Programa Vida Manglar, se han participado de tres (3) encuentros: uno presencial el 17 de febrero en instalaciones de CVS Montería y dos virtuales, el 11 de marzo y el 10 de abril de 2026, así mismo acompañamiento a la coordinación local del programa, en diferentes aspectos logísticos como la actividad de encuesta socioeconómicas y el apoyo para la revisión y aprobación de productos y gestiones relacionadas en el marco de los convenios con Fondo Acción y reuniones para socializar el estado del reporte de monitoreo en el sector de Caño Grande.

Actividad 2. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.

La corporación y el convenio participaron de dos encuentros comunitarios, en el marco de Convenios con Fondo Acción, de las entregas comunitarios de las actividades agro con las asociaciones, los días 13 y 20 de febrero, dando información general, sobre los aspectos forestales, considerándolo una actividad de apertura. Posteriormente entre el grupo de profesionales seleccionaron de las temáticas y planteamiento de capacitaciones. Para la primera semana de mayo se programó encuentro con las asociaciones de mangleros, con el ánimo de informar el estado de los permisos y el estado de casa organización y definir las fechas de las capacitaciones.

Actividad 3: Promover y continuar la estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones

En el primer mes se planificaron de las actividades, montaje de contenidos y presentaciones, selección de Instituciones Educativas, para los talleres, así como revisión de actividades para la celebración ambiental en el marco del Convenio. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas en el mes de febrero, sumando al receso de semana Santa, las actividades de socialización del área protegida se limitaron, estando en contacto con las instituciones, así mismo no se atendieron

visitas en la Estación CIMACI, debido a las restricciones emitidas por la autoridad marítima. A partir del mes de abril se realizaron cuatro (4), talleres en la Institución Educativa JUCEMI con los grados terceros de las Sedes, El Carmen, Sagrado Corazón y Cispatá, para un total de 131 participantes, relacionados con la importancia de la fauna y flora en el DRMI Cispatá, en las fechas 23 y 24 de abril. Una visita en Estación CIMACI, el 30 de abril, con la atención del Colegio la Alegría, del municipio de San Antero, participando un total de 189 personas.

En cuanto a las actividades de divulgación se cuenta con tres publicaciones de la siguiente manera:

- 29 de abril 2026- Reporte de monitoreo en la Ciénaga de Baño (Instagram, Facebook)
- 30 de abril 2026- Informe de visita colegio La Alegría en Estación CIMACI (Instagram)
- 30 de abril 2026- Video Apoyo de Vida Manglar en la implementación del DRMI (You Tube)

Actividad 4: Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución N°2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud

La veterinaria, realizo reporte del estado de los animales en custodia en la Estación CIMACI, el documento fue socializado el 27 de febrero de 2026, para la revisión de sugerencias, así mismo de propuso convocatoria para reunión con Asocaimán, para las indicaciones en el marco del convenio. Se realizaron dos encuentros con Asocaimán, los días 5 y 10 de marzo para la revisión del manejo de los ejemplares, las condiciones de la Estación CIMACI, y la ejecución de convenios a cargo de la asociación, y que se relaciona con las actividades de monitoreo y control de la biodiversidad.

Se realizo el censo el 23 de abril, contabilizando 138 ejemplares; de los cuales 119 son juveniles y 19 son adultos, presentando mejores condiciones de salud.

Actividad 5: Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Baño, con énfasis en la observación de los objetos de conservación y el fortalecimiento de ecoturismo comunitario; mediante la identificación de áreas de la presencia de las especies, mediante monitoreos biológicos y participativos

Inicialmente se realizó la revisión del plan de manejo y actividades del área protegida, teniendo en cuenta los cambios ocurridos por la ola invernal, se alteraron las condiciones del ecosistema, realizando reunión del equipo de profesionales y la convocatoria preliminar para diálogos con lideres comunitarios. El acercamiento preliminar se realizó el 5 de marzo; posteriormente y mediante convocatoria se realizó el 13 de marzo la socialización general del plan, escuchando las expectativas y problemáticas manifestadas por la comunidad. Como parte de esta reunión, se establecido la realización del monitoreo preliminar o de diagnóstico de la ciénaga, para contar con información de las condiciones de la ciénaga. Para ello una reunión logística y preparatoria por el grupo de profesionales el 16 de marzo, realizando el monitoreo por un tiempo de 3 días desde el 18 al 20 de marzo, y una jornada de análisis de los datos el 25 de marzo, y realizando reunión al siguiente día (26 de marzo) con lideres comunitarios exponiendo y compartiendo lo información obtenida, y evidenciando el estado de sedimentación de la ciénaga, en este espacio

se definieron cinco acciones generales, para ser desarrolladas a través del convenio y con la aprobación de la comunidad:

1. Monitoreos de la ciénaga. 2. Reactivación de mesa interinstitucional, 3. Seguimiento y control. 4 estrategia de educación ambiental. 5. Capacitaciones orientadas el ecoturismo. Estas líneas generales, fueron detalladas y expuestas en espacio propuesto el 8 de abril de 2026, dando continuidad al plan de trabajo concertado con la comunidad y de la cual participaron las asociaciones: APACIBAN, ASOPESCA, COOMUPROCA, JOVENES CAMPESINOS, ECONBIBA, ASOPAMARS, y JAC; para el 21 de abril, en reunión comunitaria se detallaron las aspectos, programación e insumos para iniciar la reactivación de la mesa institucional. A nivel biológico se realizó el segundo monitoreo los días 28, 29 y 30 de abril 2026, abordando 30 puntos distribuidos en el espejo de agua de la ciénaga de Bañó, con base en un diseño de muestreo en cuadrículas alternadas de 200x200 m, para realizar monitoreo mediante la evaluación de variables fisicoquímicas (pH, oxígeno disuelto, conductividad y turbidez) e hidromorfológicos (profundidad y espesor de sedimento).

En total para el área protegida DCS Ciénaga de Baño, se han realizado cinco espacios comunitarios y dos monitoreos ambientales.

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Actividad 1: Apoyar las acciones del Programa Vida Manglar, sumado a las actividades de vigilancia y control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar.	Reunión de planificación y programación 17 Actividades de Control y Vigilancia 16 Visitas terrestres a centros de Acopio: 4 en Caño Lobo, 3 en Cantarillo, 3 en La Balsa, 6 en Tinajones (3 Hijo y 3 Rivera); realizados desde el 27 de marzo al 30 de abril y un monitoreo acuático el 23 de abril en la ruta Caño Mocho, Caño Salado y Angostura. Participación en tres Comité Técnico: uno Presencial 17 de febrero, y dos virtuales 11 de marzo y 10 de abril . Apoyos a Vida manglar, logística, acompañamiento y reuniones.	70%
2	Actividad 2. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.	Participación de 2 encuentros comunitarios de información general. Selección de las temáticas y planteamiento de capacitaciones. Primera convocatoria para el mes de mayo	15%
3	Actividad 3: Promover y continuar la estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones	Reunión inicial, y planificación de las actividades, montaje de contenidos y presentaciones, selección de Instituciones Educativas. Contactos en Instituciones Educativas. Realización de 4 Talleres de Educación Ambiental en la Institución Educativa JUCEMI, con la participación de 131 participantes de grado tercero, el 23 y 24 abril. Una visita en Estación CIMACI, el 30 de abril, con la atención del Colegio la Alegría, del municipio de San Antero, participando un total de 189 personas. En cuanto a las actividades de divulgación se cuenta con tres publicaciones de la siguiente manera:	60%

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
		-29 de abril 2026- Reporte de monitoreo en la Ciénaga de Baño (Instagram, Facebook) -30 de abril 2026- Informe de visita colegio La Alegría en Estación CIMACI (Instagram) -30 de abril 2026- Video Apoyo de Vida Manglar en la implementación del DRMI (You Tube)	
4	Actividad 4: Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución N°2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.	Revisión de los reportes veterinarios y sugerencias, convocatoria para reunión con Asocaimán, para indicaciones en el marco del convenio. 2 Reuniones con Asocaimán 1 Censo de animales realizado el 23 de abril, contabilizando 138 ejemplares; de los cuales 119 son juveniles y 19 son adultos.	50%
5	Actividad 5: Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Baño, con énfasis en la observación de los objetos de conservación y el fortalecimiento de ecoturismo comunitario; mediante la identificación de áreas de la presencia de las especies, mediante monitoreos biológicos y participativos	Revisión del plan de manejo y actividades, etapa documental. Convocatoria preliminar para diálogos con lideres comunitarios. Reunión del equipo de trabajo para abordar situación en Ciénaga de Baño. 5 encuentros y diálogos con Lideres comunitarios (5, 13 y 26 de marzo, y 8 y 21 de abril). Dos monitoreo en el DSC Ciénaga de Baño del 18 al 20 de marzo y del 28 al 30 de abril de 2026. Dos reuniones del equipo técnico, antes y después de monitoreo, para actividades prelogísticas y de análisis de la información.	70%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS
VALOR CONTRATO $416.699.410
VALOR ANTICIPO $146.000.000
% AVANCE FINANCIERO 40%


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	19-03-2026	$146.000.000				$146.000.000		$146.000.000
ACTA 01	30-04-2026	$109.500.000					$109.500.000	$255.500.000
ACTA 02								
ACTA 03								

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025


VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Inducción de Ingreso	Contratación de personal	Entrega y revisión de documentación de contratistas del Convenio.
Exámenes ocupacionales	Verificación y actualización de EOM	Archivo en carpetas de personal contratado
	Reactivación de contactos Concertaciones preliminares	Programación de actividades con comunidad
	Programación de convenio Solicitud de insumos	Proyección de actividades y acercamientos iniciales
Solicitud de dotación	Diseño y elaboración de elementos de identificación para el persona	Entrega de dotación a contratistas en el mes de abril.
Capacitaciones ARL SURA	Inicio de capacitaciones con ARL	Tema 1-Primeros auxilios

REGISTRO FOTOGRAFICO

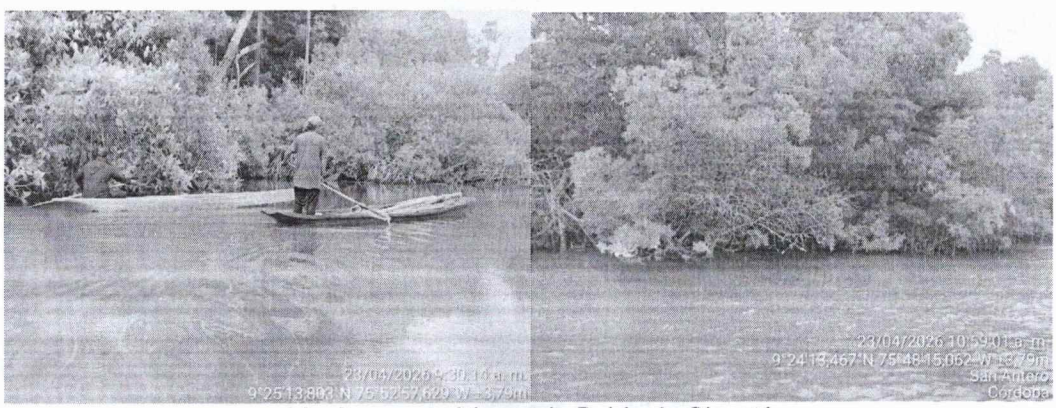


Monitoreo acuático en la Bahía de Cispatá




Comité Virtual Vida Manglar 10 de abril, tema estándares de calidad



Talleres de Educación Ambiental en Institución Educativa JUCEMI

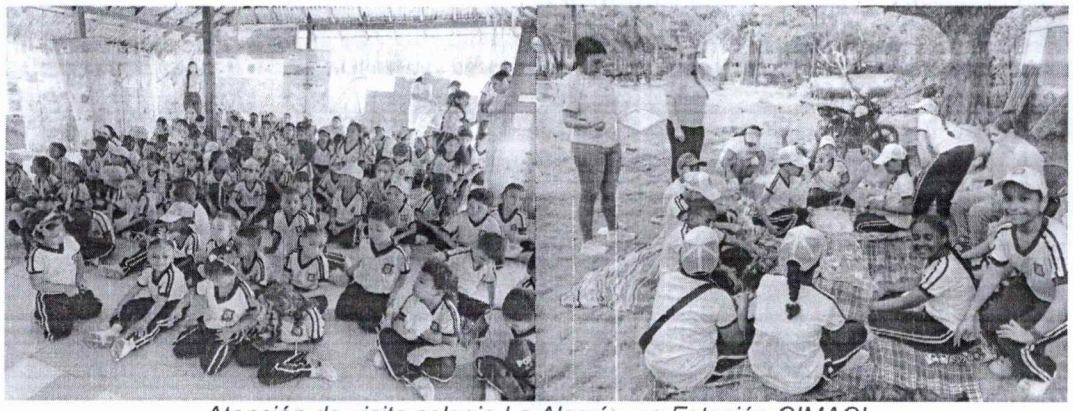


Atención de visita colegio La Alegría, en Estación CIMACI




Censo de caimanes en estación CIMACI

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

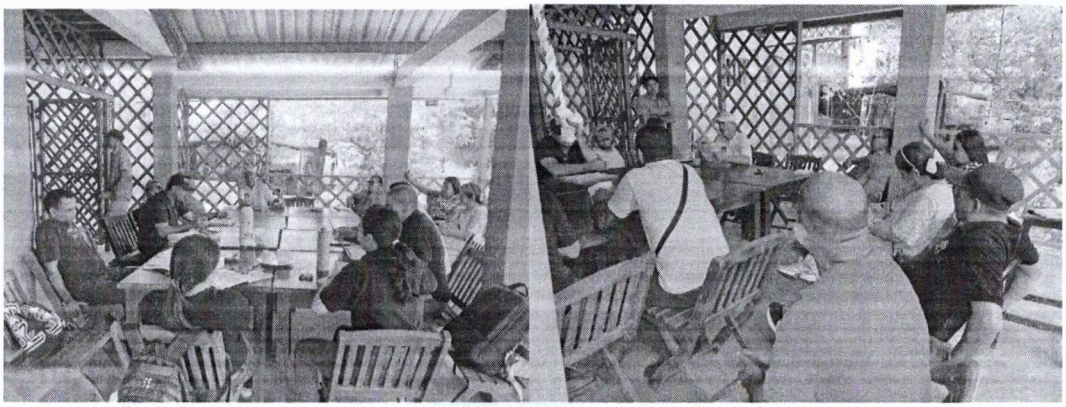

Reuniones y encuentros con lideres comunitarios DCS Ciénaga de Baño

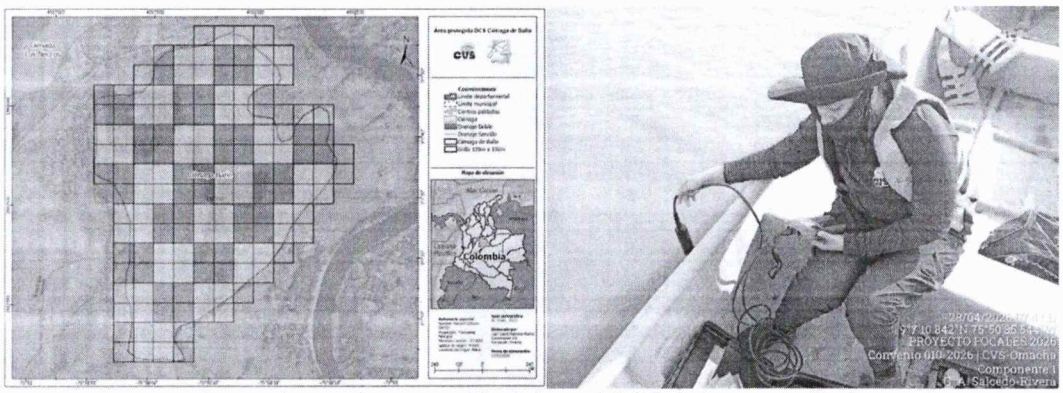

Segundo monitoreo ambiental en el DCS Ciénaga de Baño

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor, CVS
Convenio No. 009/2026 CVS – F. Omacha

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Fecha corte informe: 30 de abril de 2026
