SANTA FE CONVIVE

25/8/26, 15:42 Sticker web
Alcaldía Local de Santafe
R No. 2026-531-007538-2
2026-08-25 15:42 - Folios: 3 Anexos: 0
Destino: Despacho - ALCALDIA LOCAL
Rem/D: CONSORCIO SANTA FE CONVIV
20265310075382

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2026

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

Supervisor del Contrato

Alcaldía Local de Santa Fe

Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 437 de 2025

Respetados señores:

Por medio de la presente, el Consorcio Santa Fe Convive, identificado con NIT 902012248-3, actuando a través de su Representante Legal, Eduardo Acuña Carrera, respetuosamente se dirige a su despacho con el propósito de solicitar formalmente una prórroga de 2 meses, al plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No 437 de 2025, cuyo objeto es "*Contratar la prestación de servicios para el desarrollo de estrategias pedagógicas de formación y acciones encaminadas a la promoción de la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de comunidades y organizaciones sociales, orientadas a la prevención de conflictos y la generación de entornos seguros en la localidad de Santa Fe*"

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento a satisfacción de las metas físicas y cualitativas pactadas, motivada por las situaciones ajenas a las partes constitutivas de fuerza mayor, sobrevenidos durante el desarrollo contractual, las cuales se exponen de manera detallada a continuación.

Justificación Técnica y Trazabilidad Cronológica por Componente

COMPONENTE 1

Gestión / Evento	Fecha Inicio / Solicitud	Fecha Respuesta / Atención	Tiempo Transcurrido	Impacto Concreto en el Cronograma	Soporte Adjunto
Gestiones de enlace ante el Coronel Perdomo y Policía Local para Zonas Seguras	10/04/2026	22/04/2026	12 días cal.	Coordinación de disponibilidad de agenda institucional de la Policía Nacional.	*22 de abril de 2026 frentes de seguridad alcaldía - policía*
Primera jornada de sensibilización y trabajo de campo	22/04/2026	27/04/2026	5 días	Inicio operativo de visitas punto a punto para	*27 de abril zonas seguras*


Powered by CamScanner

en Zonas Seguras con Policía				diagnóstico de las 27 Zonas Seguras.	

Impacto en el cronograma: Un acumulado de diecisiete (17) días calendario en las gestiones previas requeridas ante las instancias institucionales para el inicio de los recorridos técnicos en campo.

A la fecha, el Componente 1 presenta un avance físico del 30 %, correspondiente a la instalación y puesta en funcionamiento de ocho (8) kits de alarmas comunitarias. Restan por instalar diecinueve (19) kits para alcanzar la meta total prevista del 100 % (27 kits).

Estado de ejecución de talleres: En lo referente a la meta de transferencia de conocimiento, a la fecha se han ejecutado exitosamente cuarenta (70) talleres de un total de cien (100) programados, lo cual representa un avance físico del 40 % en esta actividad. Quedan pendientes por desarrollar sesenta (60) talleres, los cuales se encuentran en proceso de programación e implementación conforme al cronograma ajustado.

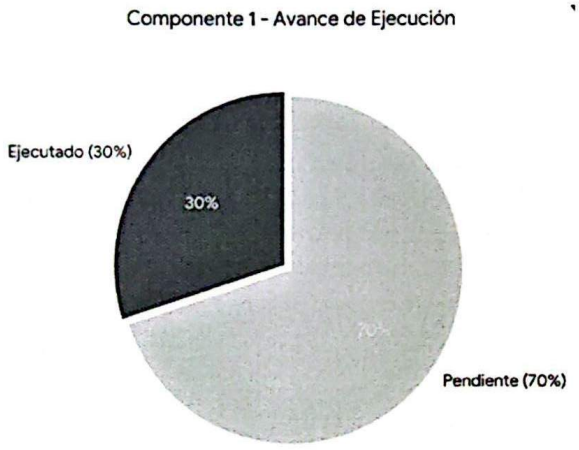

Trazabilidad de Capacitaciones y Procesos Formativos (Componente 2 - Escuela Ciudadana y Componente 3 - Entornos Escolares).


Gestión / Evento	Fecha Solicitud	Fecha Respuesta	Tiempo Transcurrido	Impacto Concreto en el Cronograma	Soporte Adjunto
Solicitud de confirmación de contactos de colegios	16/04/2026	20/04/2026	4 días	Actualización de correos y número de contacto	*CARPETA DILE*
Solicitud formal de aval de ingreso ante la Dirección Local	7/04/2026	28/04/2026	21 días cal.	Trámite de revisión contacto	*CARPETA DILE*

Powered by CamScanner

de Educación (DILE)				institucional por parte de la DILE.	
Concertación de agendas con Rectores y Coordinadores de Convivencia	29/04/2026	15/05/2026	16 días cal.	Adaptación a las semanas de evaluaciones y programación interna de cada colegio.	*CARPETA COLEGIOS*
Receso escolar de mitad de año (Vacaciones lectivas del sector oficial)	15/06/2026	7/07/2026	22 días cal.	Suspensión total de talleres con estudiantes, entrega de Mochilas Lúdicas y talleres de padres.	*CARPETA COLEGIOS*

A pesar de que se presentaron contingencias que conllevó a la pérdida de dos (2) meses dentro del cronograma inicial, se continuó de manera sostenida con la ejecución de las actividades. A la fecha, se registra un avance del 70 % gracias al desarrollo total de los talleres de diagnóstico de la mochila y las capacitaciones en las instituciones educativas. El 30 % pendiente de ejecución corresponde a la fase de implementación de la mochila y a la realización de los talleres prácticos en los colegios.

Estado de ejecución de talleres: En lo referente a la meta de transferencia de conocimiento, a la fecha se han ejecutado exitosamente cuarenta (70) talleres de un total de cien (162) programados, lo cual representa un avance físico del 43% en esta actividad. Quedan pendientes por desarrollar sesenta (92) talleres, los cuales se encuentran en proceso de programación e implementación conforme al cronograma ajustado.

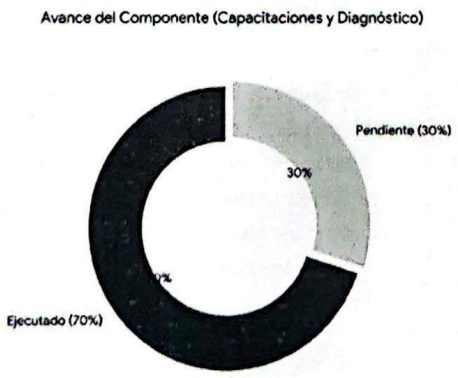

Powered by CamScanner

SANTA FE CONVIVE

Trazabilidad del Subcomponente "Raye por la Paz" y copa Santa Fe por la paz (Componente 4 - Arte Urbano y Muralismo y campeonato de banquitas)


La ejecución de las intervenciones artísticas y talleres de muralismo de *"Raye por la Paz"* presentó un proceso complejo de concertación con la Mesa de Grafiti y constructores locales. Este subcomponente requirió 6 reuniones específicas, caracterizadas para la correcta implementación del componente técnico que se requiere para el desarrollo de estas actividades asi como, revisión de perfiles y solicitudes de veeduría que retrasaron el inicio de la fase operativa:

Fecha de Sesión	Objeto de la Sesión / Actuación	Acuerdos, Requerimientos y Retrocesos Presentados	Impacto Concreto en el Cronograma	Soporte Adjunto
31/03/2026	Revisión del Anexo Técnico con Maicol y su colectivo.	Se solicita por parte de los constructores locales la armonización de diferentes temas para la ejecución del proyecto.	Dilación para el inicio de las actividades de raye por la paz	*Anexo 5.2: Acta de revisión técnica del 31 de marzo*
28/04/2026	Apertura formal y evaluación de Hojas de Vida.	Hubo retrasos en el envío de hojas de vida por parte de la comunidad para poder evaluar el cumplimiento de los perfiles.	Dilación en la contratación del equipo pedagógico mientras se validaban perfiles sugeridos por la Mesa.	*Anexo 5.3: Acta de presentación y perfiles del 28 de abril*
13/05/2026	Mesa de Diálogo: Observaciones de constructores locales.	Intervención de constructores locales El Consorcio y la Supervisión de la Alcaldía atendieron inquietudes y concertaron la ruta operativa de selección de talleristas.	Se generó una reestructuración de la estrategia metodológica de los talleres de arte urbano.	*Anexo 5.4: Acta de respuestas y ruta operativa del 13 de mayo*
25/06/2026	Evaluación de Convocatoria y Diseño Pedagógico.	Se definieron visitas institucionales a colegios para gestionar consentimientos. Se evidenció un reporte de solo 12 inscritos.	Invalidez de inscripciones por duplicidad de roles; necesidad de reiniciar la búsqueda activa de participantes en canales abiertos. Se inicia proceso de apertura en colegio ante la negativa de los	*Anexo 5.6: Acta 25 de junio*

Powered by CamScanner

			constructores en realizar procesos de inscripciones.	

Durante el periodo comprendido entre marzo y julio, se adelantaron diversas mesas de articulación con la comunidad y los constructores para coordinar el inicio de la estrategia *Raye por la Paz*. Si bien la etapa inicial presentó contratiempos administrativos derivados del proceso de inscripción y del envío extemporáneo de las hojas de vida de los talleristas, desde el mes de julio se reactivó el desarrollo continuo de la agenda formativa, restando únicamente la ejecución de dos (2) talleres y la realización del evento final para la intervención de los murales. Asimismo, es preciso destacar que la actividad referente a la *Copa Santa Fe por la Paz* ya fue ejecutada al 100 %. Con base en lo anterior, este componente registra un avance acumulado del 85 %, quedando únicamente un 15 % pendiente de ejecución.

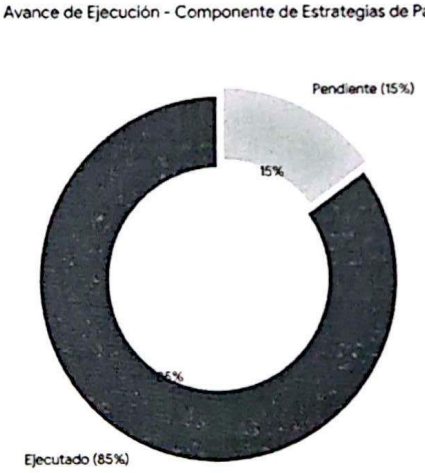

Resumen de Estado de ejecución y Plan de Cierre por Componentes


Fase / Componente	Estado / Avance Ejecutado (al 30 de Julio)	Plan de Entrega del 100% (Con Prórroga)
Fase I: Alistamiento	100% Ejecutado. Acta de inicio, personal, plan de trabajo, hojas de vida y presentación ante JAL culminados.	Fase finalizada en su totalidad.
Fase II: Publicidad y Convocatoria	100% Ejecutado. Afiches diseñados e impresos fijados en zonas estratégicas. Base de participantes en construcción.	En ejecución, Coordinación de pautas en medios comunitarios locales y contratación de apoyo documental para archivo e inscripciones.
Componente 1: Frentes de Seguridad	Diagnóstico al 100%. Instalación Kits: 30%, Pendiente de ejecución 70%.	Suministro e instalación de kits de cámaras IP y alarmas, realización de capacitaciones comunitarias y actas de entrega formal.
Componente 2: Escuela Ciudadana	70% de Ejecución Pendiente de Ejecución 30% corresponde a la culminación del total de los talleres y entrega de los Kits de incentivos (agendas, botilitos, bolsos) comprados en bodega.	En ejecución, Realización de talleres restantes de convivencia, certificación de 400 beneficiarios y realización de la Salida Recreativa de cierre.

Powered by CamScanner

SANTA FE CONVIVE

	Talleristas contratados.	
Componente 3: Entornos Escolares	70% de Ejecucion #0%pendinet ede ejecutar: Talleres en ejecución en I.E.D. Soto del Corral y el Verjon. Cobertura ampliada a I.E.D. Antonio José Uribe. Herramienta lúdica diseñada.	En ejecución. Entrega de la Mochila pedagógica y talleres con padres y estudiantes, y evento de cierre institucional con entrega de kits.

En conclusión, con el desarrollo consolidado de los diferentes componentes, el Contrato No. 437 de 2025 alcanza a la fecha un avance físico global del 65 %, habiendo superado satisfactoriamente los contratiempos administrativos y logísticos iniciales. El 35 % restante por ejecutar corresponde a las actividades finales de entrega e implementación contempladas en cada frente de trabajo, para lo cual la prórroga solicitada resultará determinante para garantizar la culminación exitosa y con calidad del 100 % del objeto contractual.

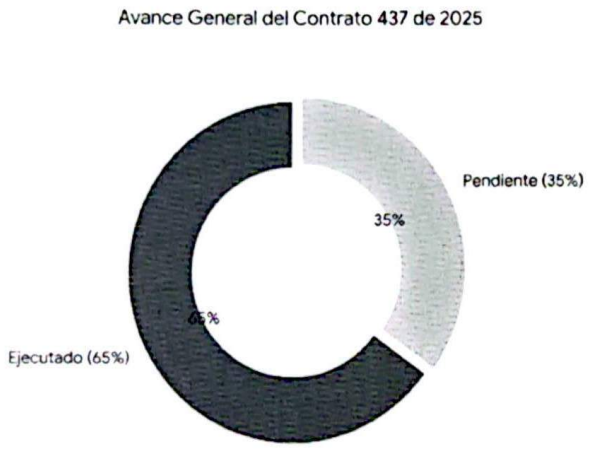

Cronograma Ajustado de Ejecución.

Con ocasión de la prórroga solicitada y contando el tiempo normal de ejecución del contrato, para las actividades pendientes por ejecutar, se adjunta la proyección del Cronograma Ajustado de Ejecución para los dos (2) meses de prórroga solicitados (del 26 de agosto al 25 de octubre de 2026).El cronograma se encuentra adjunto en archivo Excel a la presente solicitud.

Finalmente, se considera que es posible estimar que el tiempo solicitado de prorroga se encuentra ajustado a las necesidades y actividades pendientes por ejecutar, teniendo en cuenta que este es un contrato dispuesto para el apoyo de actividades de carácter social destinadas para la comunidad y la pertinencia que da el objeto contractual, se considera que se debe velar por la finalidad del mismo, esto es, beneficiar a la comunidad conforme a los presupuestos participativos que dieron origen al contrato objeto de prórroga, mencionando que, se reconoce que la presente modificación no demanda recursos que, alteren el equilibrio económico del contrato.

Powered by CamScanner

SANTA FE CONVIVE

Cordialmente

Eduardo Acuña Carrera
Coordinador contrato 437-2.025
Consorcio Santafe Convive

Powered by CamScanner
