INTER TRANSESCOLAR
2025

INFORME DE GESTIÓN MES DE MAYO DE 2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°555 DE 2025

PERIODO:
DESDE 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....4
1. OBJETIVO GENERAL....5
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....5
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO....5
3. GARANTÍAS....6
3.1 POLIZAS LEGALIZACIÓN....6
3.2 POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO....6
3.3 POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°1....7
3.4 POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 2....8
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL....8
5. REGISTRO PRESUPUESTAL....8
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO....9
7. SUPERVISIÓN....9
8. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025....9
9. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025....10
10. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025....10
11. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 11
12. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025....11
13. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 11
14. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025....12
15. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....12
16. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 12
17. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....13
18. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....13
19. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....14
20. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES....14

20.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE CONTROL CONTRACTUAL....14
20.2 COORDINACIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE OPERATIVO, LOGÍSTICO Y DE VERIFICACIÓN EN CAMPO. 16
20.3 SEGUIMIENTO JURÍDICO Y CONTRACTUAL - COMPONENTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA. 17
20.4 PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO - COMPONENTE FINANCIERO, CONTABLE Y DE CONSISTENCIA FÍSICO-PRESUPUESTAL. 18
20.5 TÉCNICO EN SEGURIDAD – COMPONENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL, CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y PREVENCIÓN DEL RIESGO....19
20.6 TÉCNICOS DE APOYO OPERATIVO – COMPONENTE DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, RUTAS, PARQUE AUTOMOTOR Y SOPORTES DE EJECUCIÓN....20
21. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 21
22. VERIFICACION TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PARQUE AUTOMOTOR....22
23. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 23
24. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....24
25. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025....24
26. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024....25
27. COMPONENTES CONTRACTUALES....26
27.1 Componente Administrativo. 26
27.2 Componente Financiero y Contable....26
27.3 Componente Jurídico....26
27.4 Componente Ambiental....27
27.5 Componente Procedimientos y Controles. 27
28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....27

INTER TRANSESCOLAR
2025

INTRODUCCIÓN

El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** suscribió contrato de Interventoría N° 555 de 2025 con **INTER TRANSESCOLAR 2025**, representado legalmente por **RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nombrando como supervisor del contrato a la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,** acta de inicio de fecha 14/10/2025, y con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES.

El presente informe relaciona el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría N° 555 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del año 2026. A continuación, se describe en forma clara y detallada criterios técnicos generales relacionados con las actividades ejecutadas y los controles realizados por la interventoría.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Hacer seguimiento técnico mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato.
- ✓ Medir oportunamente la ejecución de las
- ✓ rutas que prestan el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca.
- ✓ Tomar correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
- ✓ Tomar decisiones relativas a la relación contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
NIT	901.994.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 18 No 30B -27 BARRIO CIUDAD JARDIN
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO	555 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN N° 4557 DEL 30/09/2025

INTER TRANSESCOLAR
2025

FECHA DE FIRMA CONTRATO 555 DE 2024	03/10/2025
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13/08/2026
SEPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

3. GARANTÍAS

3.1 POLIZAS LEGALIZACIÓN.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas Legalización N°. 49-44-101037390 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 03/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	

3.2 POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de inicio N°. 49-44-101037390 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 14/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 2
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	

3.3 POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°1.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 3,4,5 y 6
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 02/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 3 y 4
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	

INTER TRANSESCOLAR
2025

3.4 POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 2.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del, Aprobada el 11/05/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO 8
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 09/10/2027	$113.745.000.00	
Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del, Aprobada el 11/05/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 6
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SPGR No.19325	$ 1.137.450.000,00

5. REGISTRO PRESUPUESTAL.

RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08-10-2025	SGR202526-00248	$1.137.450.000,00

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El servicio de Transporte escolar se presta a las instituciones educativas ubicadas en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca.



Municipios del departamento de Arauca

7. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato de interventoría N° 555 de 2025, está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental.

8. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

	CONCEPTO	CANT	N° DE MESES	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR	1,00	10,00	100%	$7.100.000,00	$71.000.000,00
1.1.2	COORDINADOR DE AREA - PROFESIONAL PARA LOS MUNICIPIOS	1,00	10,00	100%	$6.550.000,00	$65.500.000,00
1.1.3	PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.1.4	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.2	**PROFESIONAL TÉCNICO**					
1.2.1	TECNICOS DE APOYO OPERATIVO	4,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$130.000.000,00
1.2.2	TECNICO EN SEGURIDAD	1,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$32.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$377.500.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**	**$755.000.000,00**
	IVA (19%)					**$143.450.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$898.450.000,00**
2	OTROS COSTOS					
2.1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA	2,00	9,00		$9.250.000,00	$166.500.000,00

2.2	ALQUILER DE OFICINA DOTADA CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	10,00		$7.250.000,00	$72.500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS					**$239.000.000,00**
	TOTAL, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA					**$1.137.450.000,00**

9. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

CARGO	PROFESIONAL	NUMERO CC	INGRESO	RETIRO
DIRECTOR DEL PROYECTO	ANDRES MAURICIO SANTAMARIA NIETO	1.006.453.560	14/10/2025	ACTIVO
CORDINADOR DE AREA	DEICY BRIYITH CASTILLO EREGUA	1.116.807.487	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	CAMILO NIÑO FONSECA	1.116.775.561	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA	68.294.629	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO EN SEGURIDAD	DIEGO ALEJANDRO PADILLA VARGAS	1.006.455.838	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 1	YEISON EDUARDO PICO SANABRIA	1.116.803.165	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 2	JOHNATAN SMIT LINARES DIAZ	17.596.813	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 3	ARDUL HURTADO ANGARITA	1.007.272.066	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 4	JEYSON ALEJANDRO BECERRA	1.006.453.986	14/10/2025	ACTIVO

10. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

EMPRESA	AÑO	MES	No. PLANILLA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	OCTUBRE	9493295632
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	NOVIEMBRE	9496467101
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ENERO	9499556815
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	FEBRERO	9501261336
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MARZO	9502936354
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ABRIL	9504613600
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MAYO	9506154831

DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, en calidad de supervisor y RICARDO ANDRES CONDE BÉNITEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO	**$1.137.450.000,00**
VALOR GIRADO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO (29.97%)	**$340.850.000,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**$321.106.341,38**

11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

El acta de inicio se suscribió con fecha de catorce (14) de octubre de 2025, teniendo en cuenta lo anterior, a corte del presente informe, se ha ejecutado en físico y financiero la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	DÍAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
EJECUTADO OCTUBRE 2025	17 DÍAS	$ 65.503.833
EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	29 DIAS	$115.595.000
EJECUTADO ENERO 2026	16 DIAS	$ 61.650.667
EJECUTADO FEBRERO 2026	28 DÍAS	$115.595.000
EJECUTADO MARZO 2026	29 DÍAS	$111.741.833
EJECUTADO ABRIL 2026	25 DÍAS	$ 96.329.167
EJECUTADO MAYO 2026	31 DÍAS	$115.595.000
TOTAL %	**175 DÍAS**	**59.28 %**

12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta De Inicio	14/10/2025	Inicio de actividades
2	Acta de suspensión N° 1	29/11/2025	Suspensión contrato
3	Acta de reinicio N° 1	16/01/2026	Reinicio de Actividades
4	Acta de suspensión N° 2	30/03/2026	Suspensión contrato
5	Acta de reinicio N° 2	06/04/2026	Reinicio de Actividades

13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

INTER TRANSESCOLAR
2025

14. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

15. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 R/L: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT	901.994.800-9
DIRECCION	CALLE 22 N° 19-66 PISO N° 2 OFICINA 203
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	554 – 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCIÓN N° 4573 DEL 01/10/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO PRINCIPAL	03/10/2025
ACTA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR 2025 R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

16. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 03/10/2025 APROBADA EL 10/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**

INTER TRANSESCOLAR
2025

CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 08/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 08/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N.º COQ.100001753**		**ANEXO: 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2025 hasta 08/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 14/10/2025			
AMPARO	VIGENCIA		COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 2
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 19/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 19/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° COQ 100001753**		**ANEXO: 2**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/10/2025 hasta 19/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

17. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

CDP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SGR 202526-00258	$58.764.989.178,00

18. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

INTER TRANSESCOLAR
2025

RP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08/10/2025	RP SGR202526-00247	$58.764.989.178,00

19. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

Hace parte integral del presente informe, el cuadro de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 554 de 2025. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Total, de cantidad de estudiantes planillados ruta por ruta de todos los municipios del Departamento de Arauca y sus respectivas planillas del periodo del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar ejecutados durante la ejecución del contrato por el periodo del presente informe.
- ✓ Enumeración de los días calendario escolar los cuales se prestó el servicio de ruta escolar durante el periodo del presente informe
- ✓ Total, de valor ejecutado del contrato por ruta escolar
- ✓ Total, de días calendario escolar laborados por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar pendientes por laborar por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, valor ejecutado ruta por ruta de los diferentes municipios del Departamento de Arauca, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Porcentaje de ejecución del contrato, tiendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.

20. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES.

20.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE CONTROL CONTRACTUAL.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, la Dirección del Proyecto adelantó seguimiento integral a la ejecución técnica, operativa, administrativa y contractual del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando el comportamiento general de la operación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial desarrollado en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca, así como la correspondencia entre la ejecución reportada por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR**

2026, y las verificaciones efectuadas por la interventoría en desarrollo de sus obligaciones contractuales.

En ejercicio de las funciones de dirección y control contractual, se efectuó revisión y consolidación de la información técnica y operativa correspondiente al periodo objeto del presente informe, verificando el cumplimiento general de las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, Documento Técnico, Estudios Previos y demás documentos que integran el proceso contractual. Para tal efecto, se adelantó análisis sobre informes mensuales de ejecución, certificaciones expedidas por establecimientos educativos oficiales, reportes de beneficiarios transportados, planillas de asistencia, novedades operativas, consolidado físico-financiero y documentación asociada a la operación de las rutas terrestres y fluviales ejecutadas durante el periodo en mención.

La Dirección del Proyecto efectuó seguimiento permanente a la continuidad de la prestación del servicio, verificando el comportamiento operativo de las rutas escolares, la disponibilidad funcional del parque automotor y fluvial, la ejecución de recorridos autorizados, la cobertura efectiva de estudiantes beneficiarios y la atención de situaciones operativas reportadas durante el periodo evaluado. Esta labor se desarrolló mediante articulación permanente con la Secretaría de Educación Departamental, rectores y coordinadores institucionales, personal operativo del contratista y equipo técnico de la interventoría, permitiendo consolidar trazabilidad suficiente respecto del comportamiento general de la ejecución contractual.

Así mismo, se adelantó control sobre la información documental y operativa presentada por el contratista para soportar la ejecución del servicio, verificando consistencia entre reportes operativos, consolidación de beneficiarios, ejecución de rutas, soportes de asistencia y certificaciones institucionales. Como resultado de dicho análisis, de esta manera, la Dirección del Proyecto formuló observaciones preventivas y requerimientos de ajuste frente a soportes ambiguos, inconsistencias menores de consolidación, novedades insuficientemente soportadas y situaciones que requerían precisión documental u operativa por parte del prestador del servicio, especialmente respecto de trazabilidad de novedades, consolidación de información operativa y claridad en algunos soportes asociados a la ejecución de rutas y beneficiarios.

En materia de control contractual, la Dirección del Proyecto verificó igualmente la correspondencia entre el avance físico reportado para el periodo y la ejecución financiera presentada evidenciando relación general entre la prestación efectiva del servicio y los valores causados por concepto de rutas terrestres y fluviales ejecutadas durante el mes de mayo de 2026. Esta revisión comprendió seguimiento a la ejecución acumulada del contrato, comportamiento porcentual del avance

INTER TRANSESCOLAR
2025

contractual y coherencia general entre la ejecución técnica reportada y los soportes financieros allegados por el contratista.

Producto del seguimiento integral adelantado durante el periodo evaluado, la Dirección del Proyecto evidenció cumplimiento general de las obligaciones esenciales relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial, observándose continuidad operativa, mantenimiento de cobertura sobre la población estudiantil beneficiaria y atención general de las condiciones técnicas y contractuales previstas para la ejecución del contrato, sin perjuicio de las observaciones, ajustes y verificaciones permanentes formuladas por la interventoría en ejercicio de sus competencias contractuales.

20.2 COORDINACIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE OPERATIVO, LOGÍSTICO Y DE VERIFICACIÓN EN CAMPO.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, la Coordinación del Proyecto adelantó seguimiento técnico-operativo y logístico a la ejecución de las rutas escolares terrestres y fluviales desarrolladas por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026,** verificando la continuidad de la operación, cumplimiento de recorridos autorizados, disponibilidad vehicular y adecuada prestación del servicio en los diferentes municipios del departamento de Arauca.

En desarrollo de las actividades de coordinación operativa, se efectuó seguimiento permanente a los reportes diarios y consolidados de ejecución, verificando la correspondencia entre las rutas programadas, las rutas efectivamente operadas, la cantidad de estudiantes beneficiarios movilizados y la información registrada en las planillas de asistencia y certificaciones expedidas por los establecimientos educativos oficiales. Esta labor permitió consolidar información relacionada con comportamiento operativo de las rutas, tiempos de recorrido, continuidad del servicio, novedades logísticas y atención de requerimientos institucionales presentados durante el mes de mayo de 2026.

La Coordinación del Proyecto adelantó igualmente control sobre la disponibilidad y comportamiento operativo del parque automotor y fluvial dispuesto para la ejecución contractual, realizando seguimiento a la operación efectiva de vehículos y embarcaciones, cumplimiento de horarios institucionales, ocupación vehicular, disponibilidad del personal operativo y atención de novedades menores presentadas durante la prestación del servicio. Para tal efecto, se efectuó articulación permanente con el equipo técnico de apoyo operativo de la interventoría y con el personal institucional de los establecimientos educativos beneficiarios, consolidando evidencias y reportes relacionados con la ejecución material de las rutas escolares.

Así mismo, en desarrollo del seguimiento operativo adelantado durante el periodo evaluado, la Coordinación del Proyecto formuló observaciones preventivas y correctivos operativos frente a inconsistencias menores identificadas en algunos reportes de ejecución, novedades sin trazabilidad suficiente, soportes operativos ambiguos y situaciones que requerían mayor precisión documental por parte del prestador del servicio, particularmente respecto de consolidación de información de rutas, beneficiarios transportados y registro de novedades operativas. Dichos requerimientos fueron comunicados al contratista con el propósito de fortalecer los mecanismos de control operativo y garantizar mayor consistencia entre la operación ejecutada y los soportes allegados para el trámite parcial.

La Coordinación del Proyecto, realizó igualmente acompañamiento a las actividades de verificación desarrolladas por el equipo técnico de campo de la interventoría, consolidando información asociada a reportes operativos, seguimiento a novedades, comportamiento de rutas terrestres y fluviales y control general sobre la continuidad del servicio de transporte escolar durante el periodo evaluado.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas durante el periodo objeto del presente informe, la Coordinación del Proyecto evidenció continuidad funcional en la operación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial, observándose atención general de las rutas autorizadas y mantenimiento de cobertura sobre la población estudiantil beneficiaria del Departamento de Arauca, sin perjuicio de los ajustes operativos y requerimientos preventivos formulados por la interventoría en desarrollo de las actividades de seguimiento contractual.

20.3 SEGUIMIENTO JURÍDICO Y CONTRACTUAL - COMPONENTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, el componente jurídico de la interventoría adelantó seguimiento legal, contractual y documental a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando la trazabilidad jurídica de la ejecución reportada y el cumplimiento general de las obligaciones documentales exigidas en el marco de las condiciones contractuales y de la normatividad aplicable a la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial en el Departamento de Arauca.

En desarrollo de las actividades de seguimiento jurídico y contractual, se efectuó revisión integral de la documentación allegada por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026,** verificando informe mensual de ejecución, certificaciones institucionales, reportes operativos, documentación del personal vinculado a la operación, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, pólizas contractuales, documentación habilitante del parque automotor y demás

soportes exigidos en las Especificaciones Técnicas, la Ficha Técnica y el clausulado contractual aplicable al proyecto.

El componente jurídico adelantó verificación documental sobre el personal operativo terrestre y fluvial vinculado a la prestación del servicio, revisando afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, licencias de conducción, soportes de capacitación, correspondencia entre personal reportado y documentación allegada, así como cumplimiento general de requisitos asociados a conductores, auxiliares y acompañantes de ruta conforme a las condiciones previstas en las especificaciones técnicas del proceso contractual.

En desarrollo del control documental y contractual adelantado durante el periodo reportado, el componente jurídico formuló observaciones y requerimientos frente a soportes insuficientemente claros, documentación incompleta, inconsistencias menores de trazabilidad y situaciones que requerían precisión documental o aclaración contractual por parte del prestador del servicio, particularmente respecto de algunos soportes operativos, consolidación documental y consistencia de la información presentada para el trámite parcial. Dichos requerimientos fueron comunicados al contratista con el propósito de fortalecer la trazabilidad jurídica de la ejecución y garantizar mayor consistencia documental frente al avance físico y financiero reportado.

Así mismo, se realizó seguimiento al cumplimiento general de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones concordantes relacionadas con la ejecución del contrato y la prestación del servicio de transporte escolar, verificando correspondencia general entre la ejecución contractual reportada y las obligaciones legales aplicables al proyecto.

Producto del seguimiento adelantado durante el periodo objeto del presente informe, el componente jurídico evidenció cumplimiento general de las obligaciones documentales y contractuales asociadas a la ejecución del servicio, observándose trazabilidad suficiente entre la documentación revisada, los soportes allegados por el contratista y las verificaciones adelantadas por la interventoría, sin perjuicio de los controles permanentes y requerimientos preventivos formulados en ejercicio de las competencias de seguimiento contractual.

20.4 PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO - COMPONENTE FINANCIERO, CONTABLE Y DE CONSISTENCIA FÍSICO-PRESUPUESTAL.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, el Profesional de Apoyo Financiero adelantó la revisión del componente económico, contable y presupuestal asociado al presente informe del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando la

correspondencia entre la ejecución física reportada por el contratista, los valores causados por rutas terrestres y fluviales, la amortización del anticipo y el balance acumulado de ejecución contractual.

La revisión financiera no se limitó a una validación aritmética de los valores reportados, sino que comprendió el análisis de razonabilidad entre el servicio efectivamente ejecutado, los días de operación, la modalidad de ruta, la información de beneficiarios transportados y los documentos presentados. En ese sentido, se formularon observaciones al prestador del servicio frente a inconsistencias menores, soportes que requerían mayor claridad y datos que no permitían una verificación suficiente desde el componente financiero, solicitando su precisión, ajuste o complementación.

De igual manera, se efectuó seguimiento al comportamiento acumulado del contrato, con el propósito de mantener control sobre la ejecución financiera del contrato y evitar desajustes entre la prestación material del servicio y el reconocimiento económico correspondiente.

Con fundamento en la revisión efectuada, el componente financiero evidenció consistencia general entre la información económica presentada, el avance físico reportado y los soportes allegados para el trámite parcial, sin perjuicio de los ajustes, aclaraciones y verificaciones complementarias requeridas al contratista frente a información ambigua o insuficientemente soportada.

20.5 TÉCNICO EN SEGURIDAD – COMPONENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL, CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, el Técnico en Seguridad adelantó seguimiento específico a las condiciones de seguridad operacional, mecánicas, ambientales y preventivas asociadas a la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026**, verificando que la operación se desarrollara bajo parámetros compatibles con la naturaleza del servicio, la población beneficiaria y las exigencias normativas aplicables.

En desarrollo de sus actividades, se efectuó revisión sobre las condiciones generales del parque automotor y fluvial dispuesto para la operación, verificando elementos de seguridad, estado físico de los vehículos, condiciones básicas de operación, documentación habilitante, señalización, elementos preventivos, condiciones de aseo, control de capacidad, presencia de acompañantes cuando correspondía y observancia de protocolos mínimos durante el abordaje, permanencia y descenso de los estudiantes. Esta verificación se articuló con los

reportes de campo y con la información consolidada por el equipo operativo de la interventoría.

Así mismo, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad vial y prevención del riesgo durante la operación de las rutas, especialmente frente a la correcta identificación de vehículos, condiciones de desplazamiento, comportamiento del personal operativo, atención de novedades y disponibilidad de elementos mínimos para la reacción ante contingencias. En las rutas fluviales, el seguimiento se orientó a verificar condiciones básicas de seguridad de las embarcaciones, disponibilidad de elementos de protección y correspondencia entre la operación reportada y las condiciones observadas en campo.

Durante la revisión del periodo reportado, el Técnico en Seguridad formuló observaciones preventivas y requerimientos de ajuste al prestador del servicio frente a aspectos que requerían mayor claridad, soportes ambiguos o situaciones que no permitían establecer plena verificabilidad documental u operacional, especialmente en relación con trazabilidad de mantenimientos, soportes de revisión, evidencias de seguridad y novedades reportadas. Dichas observaciones se orientaron a prevenir riesgos, fortalecer el control de la operación y asegurar que la información presentada fuera suficiente, clara y verificable.

Con fundamento en el seguimiento adelantado, se evidenció que durante el periodo objeto del presente informe, el servicio se desarrolló bajo condiciones generales de seguridad y continuidad operacional, sin perjuicio de la necesidad de mantener control permanente sobre el estado del parque automotor, las condiciones de las rutas, la documentación de seguridad y la atención oportuna de las novedades que puedan incidir en la protección de los estudiantes beneficiarios.

20.6 TÉCNICOS DE APOYO OPERATIVO – COMPONENTE DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, RUTAS, PARQUE AUTOMOTOR Y SOPORTES DE EJECUCIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 y el treinta y uno (31) de mayo de 2026, los Técnicos de Apoyo Operativo, adelantaron actividades de verificación directa en campo en Arauquita, respecto de la prestación del servicio de transporte escolar ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026**, realizando seguimiento a la operación de rutas, disponibilidad del parque automotor, correspondencia de vehículos reportados, evidenciando que se encuentran en estado óptimo para prestar el servicio en las instituciones educativas oficiales beneficiarias.

Los Técnicos de Apoyo Operativo realizaron inspección mecánica a los vehículos y embarcaciones utilizados en la prestación del servicio, revisando aspectos como identificación, capacidad, condiciones físicas, elementos básicos de seguridad,

disponibilidad operativa, correspondencia con las rutas asignadas y coherencia entre lo reportado documentalmente y lo evidenciado en campo. En el caso de las rutas fluviales, la verificación comprendió la observación de condiciones básicas de operación, disponibilidad de elementos de protección y prestación efectiva del servicio conforme a las necesidades de la población estudiantil beneficiaria.

Así mismo, durante las verificaciones en campo se formularon observaciones al prestador del servicio frente a novedades operativas, inconsistencias menores, registros incompletos, soportes ambiguos o situaciones que no permitían una trazabilidad plena entre la operación ejecutada y la información presentada para validación. Dichas observaciones estuvieron orientadas a que el contratista ajustara, aclarara o complementara la información reportada, especialmente frente a novedades de ruta, asistencia de beneficiarios, soportes fotográficos, identificación de vehículos y consistencia de registros operativos.

Con base en las verificaciones efectuadas, se evidenció continuidad general en la prestación del servicio, operación funcional de las rutas escolares y correspondencia razonable entre los reportes presentados y la ejecución observada, sin perjuicio de los ajustes y requerimientos formulados por la interventoría para mejorar la claridad y trazabilidad de la información operativa.

21. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

La interventoría adelantó una verificación exhaustiva sobre el personal vinculado por el contratista, teniendo como referencia los requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas del proceso, la Ficha Técnica del proyecto y la normatividad vigente en Colombia para la operación del servicio de transporte escolar. Con base en la revisión documental y operativa, se constató que los conductores acreditaron licencias de conducción vigentes y adecuadas para la categoría del vehículo operado, así como experiencia mínima en transporte especial, en concordancia con los perfiles previstos en el numeral 7.5.2 de la Ficha Técnica. Se verificó igualmente que cada conductor contara con capacitación reciente en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y en atención segura de estudiantes, aspectos exigidos por el marco técnico del transporte escolar y por las obligaciones específicas estipuladas para el contratista.

La verificación operativa en campo permitió confirmar que el personal asignado correspondía al reportado, que su presencia era efectiva durante el desarrollo de las rutas y que su desempeño se ajustó a los parámetros de seguridad, prudencia y atención establecidos en la normativa del transporte especial escolar. La interventoría corroboró la existencia de acompañantes en las rutas que así lo requerían, la adecuada interacción con los estudiantes, el cumplimiento de horarios

INTER TRANSESCOLAR
2025

y la atención oportuna de novedades. En conjunto, las evidencias documentales y operativas permitieron concluir que el personal dispuesto por el contratista cumplió íntegramente con las obligaciones contractuales, técnicas y legales necesarias para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.

22. VERIFICACION TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PARQUE AUTOMOTOR

La interventoría desarrolló un control técnico integral sobre el parque automotor dispuesto para la ejecución del contrato, observando los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015, en la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, en la Resolución 12379 de 2012, demás normatividad relacionada, y las especificaciones técnicas del proceso contractual. En este marco, se verificó que las unidades operantes contaran con revisión técnico-mecánica vigente, póliza SOAT, tarjeta de operación, certificado de emisiones contaminantes cuando aplicaba, y demás documentación habilitante exigida para los servicios de transporte especial. Se constató igualmente la presencia de los elementos de identificación propios del transporte escolar, tales como rotulación frontal y lateral, luces preventivas, señalización interna, mecanismos de seguridad, equipamiento básico, cinturones en condiciones adecuadas y estados físicos compatibles con el tipo de operación.

La interventoría corroboró que la capacidad de cada vehículo se ajustaba a lo estipulado en la Ficha Técnica del proyecto (buses, busetas, microbuses, camionetas y embarcaciones fluviales menores cuando aplicaba), verificando que el número de estudiantes transportados no superara los límites permitidos y que la operación se ajustara al perfil de cada ruta. Se revisó la correspondencia entre las placas reportadas, las características técnicas, los propietarios inscritos y los vehículos efectivamente observados en campo, confirmando que el parque automotor operante coincidía con el declarado por la Unión Temporal Transporte Escolar 2026, sin evidenciarse sustituciones no autorizadas ni vehículos sin habilitación vigente.

A través de visitas periódicas, inspecciones en sitio, verificación fotográfica y seguimiento a las novedades operativas, la interventoría pudo constatar que los vehículos mantuvieron condiciones de seguridad, mecánica y operación acordes con el objeto contractual y con la normativa que regula la prestación del servicio. Igualmente, se verificó la adecuada implementación de protocolos de seguridad escolar y de accesibilidad, la adecuada apertura y cierre de puertas, la ubicación de los estudiantes, el cumplimiento de los recorridos y la atención de eventos menores que se presentaron durante la ejecución del servicio.


En su conjunto, la verificación técnica y documental permitió concluir que el parque automotor dispuesto por el contratista prestador del servicio, cumplió de manera

INTER TRANSESCOLAR
2025

sostenida con los requisitos legales, contractuales y operativos exigidos para garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte escolar, manteniendo estándares de seguridad y operatividad compatibles con las exigencias reglamentarias y con los parámetros propios del objeto contratado.

23. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025



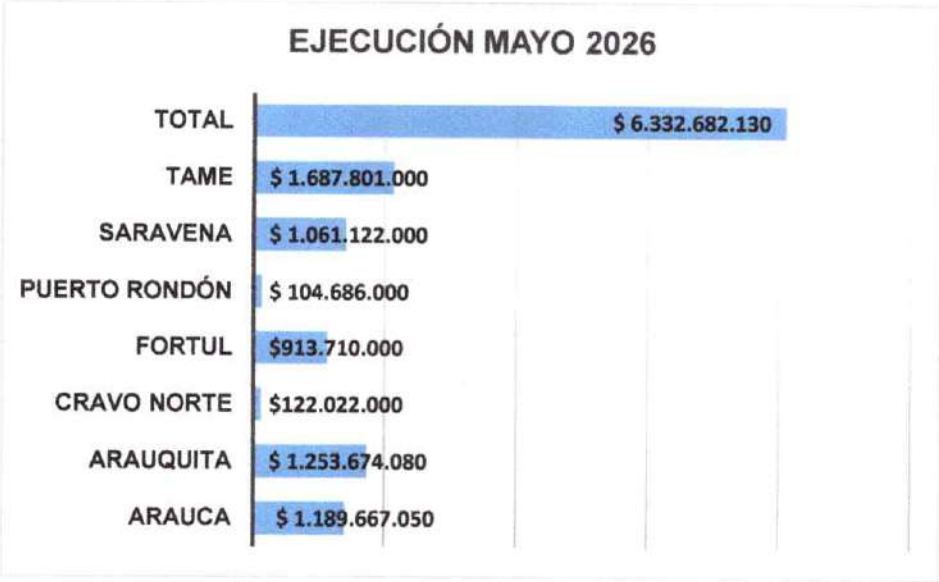


INTER TRANSESCOLAR
2025

24. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



25. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

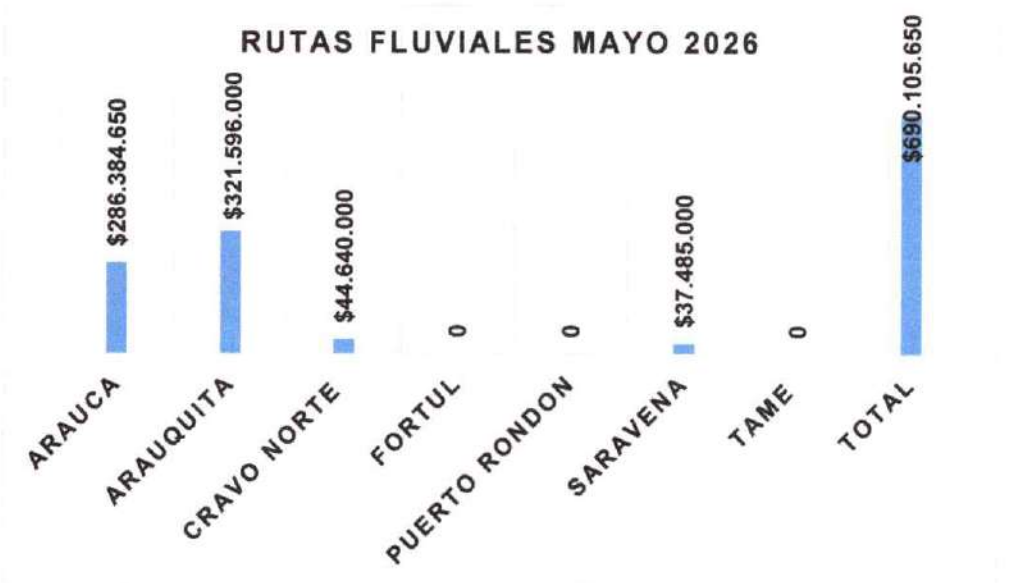

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

NOTA: Los municipios de Fortul, Tame y Puerto Rondón, no cuentan con rutas fluviales.

26. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024.


CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.763
ARAUQUITA	1.966
CRAVO NORTE	97
FORTUL	1.317
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.979
TAME	2.609
TOTAL	**9.889**



CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLAS MES DE MAYO 2026	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.744
ARAUQUITA	1.808
CRAVO NORTE	90
FORTUL	1.113
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.861
TAME	2.436
TOTAL	**9.210**

INTER TRANSESCOLAR
2025

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES PLANILLADOS MAYO 2026

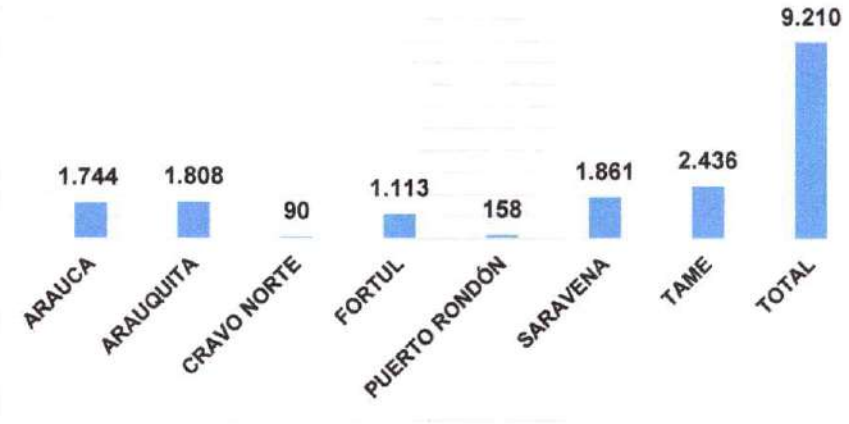

27. COMPONENTES CONTRACTUALES.

27.1 Componente Administrativo.

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, verificando la adecuada gestión documental, la presentación oportuna de informe periódico y la atención de los requerimientos formulados por la entidad contratante. Se revisó la consistencia entre los documentos remitidos por el contratista y la ejecución real del contrato, así como la correcta organización del expediente contractual, con el fin de garantizar trazabilidad, integridad y coherencia administrativa durante toda la vigencia contractual.

27.2 Componente Financiero y Contable

En desarrollo del componente financiero y contable, la interventoría cumplió con la obligación de ejercer control y seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato, verificando la relación entre el avance físico del servicio y los valores ejecutados.

27.3 Componente Jurídico

En atención a las obligaciones jurídicas asignadas a la interventoría, se realizó la revisión, acompañamiento y verificación de las actuaciones contractuales generadas durante la ejecución. La interventoría dejó constancia de las observaciones jurídicas necesarias para garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y adecuada estructuración del

expediente contractual, conforme a lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

27.4 Componente Ambiental.

En cumplimiento del componente ambiental y de seguridad operacional, la interventoría verificó que la prestación del servicio se desarrollara bajo condiciones de prevención y control de riesgos, conforme a las obligaciones establecidas para la vigilancia de la seguridad de los estudiantes y la mitigación de impactos asociados a la operación del transporte escolar.

27.5 Componente Procedimientos y Controles.

En desarrollo de las funciones de control, seguimiento y evaluación previstas para la interventoría, se aplicaron los procedimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas mediante actividades sistemáticas de verificación documental, inspección operativa, análisis de información y registro de evidencias. Estas actuaciones permitieron identificar oportunamente novedades administrativas, financieras y contractuales, formular observaciones preventivas y realizar seguimiento a su atención, cumpliendo con la obligación de ejercer control integral sobre la ejecución del contrato y de suministrar a la entidad información confiable para la toma de decisiones.

28. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, durante el periodo de ejecución del presente informe, realizó las respectivas visitas e inspecciones del parque automotor en el Municipio de Arauquita.
- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, verificó vigencia de documentación de los vehículos, licencias de conducción de los conductores, se realizaron pruebas de alcoholemia y se constató que cumplieran con los elementos pertinentes para la correcta prestación del servicio, en el municipio inspeccionado.
- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, durante la ejecución del periodo del presente informe, prestó el servicio de transporte escolar en condiciones favorables, dando cumplimiento a la prestación de cada una de las rutas escolares, en sus respectivos horarios y días calendario escolar, los soportes entregados para evidenciar dicho cumplimiento son las planillas mensuales de los estudiantes transportados por cada una de las instituciones

educativas oficiales, las cuales se allegan a la supervisión del contrato de interventoría externa en originales.

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, presentó en su revisión documental las certificaciones por parte de los rectores de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca, donde manifiestan satisfacción en el cumplimiento del servicio prestado, dichas certificaciones corresponden a los días escolares ejecutados en el mes de mayo de 2026.
- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, interventoría externa, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.
- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, prestó el servicio de rutas escolares a la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada una de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Arauca dando cumpliendo con los horarios establecidos de los días calendario escolar. En el presente informe se grafica la cantidad de estudiantes transportados durante la ejecución del contrato, en el periodo mencionado.

El presente informe de actividades, del contrato de interventoría N° 555 de 2025, se firma a los 10 días del mes de junio del año 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L Consorcio Inter Trans-Escolar 2025

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
director de proyecto

Deicy Briyith Castillo Eregua.
Proyecto: Deicy Briyith Castillo Eregua
Coordinador de Área

Proyecto aspectos jurídicos: Cristian Camilo Niño Fonseca
Profesional de Apoyo Jurídico

Proyecto aspectos financieros: Carmen Rosa Miranda Valencia
Profesional de Apoyo financiero

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
2. REGISTRO FOTOGRAFICO.
3. CUADRO DE EJECUCIÓN.
4. CERTIFICACIONES GESPROY.
5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
6. INFORME DE INSPECCIÓN.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	D. PROGRAMADO	D. EJECUTADO
OCTUBRE																																17	17
NOVIEMBRE																																30	29
ENERO																																16	16
FEBRERO																																28	28
MARZO																																29	29
ABRIL																																25	25
MAYO																																31	31
JUNIO																																14	14

	TOTAL DÍAS EJECUTADOS	175
	TOTAL DÍAS PROGRAMADOS	300
	TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	125
	TOTAL MESES PROGRAMADOS	10

DÍAS EJECUTADOS
DÍAS PROGRAMADOS
RECESO ESTUDIANTIL


Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

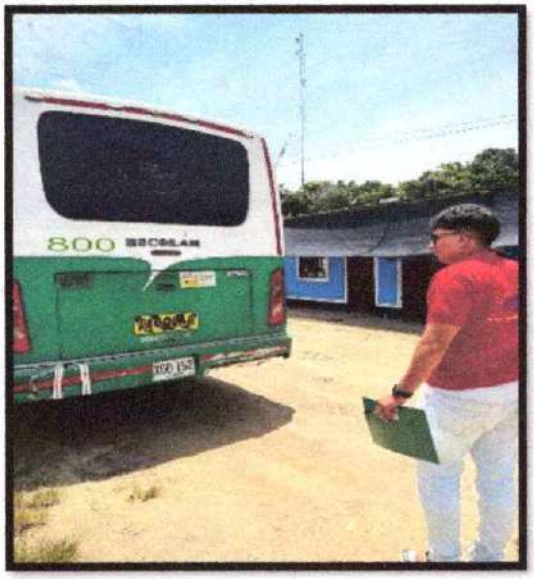







Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025





Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. CUADRO DE EJECUCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 654 DE 2025																	MAYO-2026										
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
Municipio de Arauca							1.763			$ 62.791.000	$ 67.673.650	$ 2.581.942.000	$ 7.959.313.000		$ 10.841.255.000	1744	17,36		$ 1.189.697.090	$ 903.282.490	$ 286.284.600	14,99%	11,29%			$ 6.195.330.000	58,77%
I.E. JOSE ASUNCION SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.170.000	$ 1.260.000	$ 49.140.000	$ 151.200.000	182	$ 200.340.000	56	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 23.940.000	$ 23.940.000	$ 0	15,83%	11,95%	106	56	$ 129.780.000	64,78%
	2	La Portia - Toro Pintao - I.E. José Asunción Silva y Viceversa (El segundo recorrido inicia en la finca El Rastrojo)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	58	42	120	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 54.600.000	$ 168.000.000	182	$ 222.600.000	38	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 26.600.000	$ 26.600.000	$ 0	15,83%	11,95%	106	56	$ 144.200.000	64,78%
	3	Nubes A - Sinai - El Chuzo - I.E. José Asunción Silva - Viceversa	29,5	41	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	182	$ 311.640.000	53	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 37.240.000	$ 37.240.000	$ 0	15,83%	11,95%	106	56	$ 201.880.000	64,78%
	4	Sede la Becerra - I.E José Asunción Silva y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 58.800.000	$ 180.000.000	182	$ 238.800.000	38	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 28.500.000	$ 28.500.000	$ 0	15,83%	11,93%	106	56	$ 154.800.000	64,82%
	5	I.E. José Asunción Silva - Becas Caño La Pera - I.E. José Asunción Silva y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre																						
	6	Sede El Sol - Sede Nubes A y Viceversa	30	60	Terrestre	oneta - 2 Rec	20	42	120	$ 1.236.000	$ 1.332.000	$ 51.912.000	$ 159.840.000	182	$ 211.752.000	21	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 25.308.000	$ 25.308.000	$ 0	15,83%	11,95%	106	56	$ 137.160.000	64,77%
	7	Guaritas - Sede Cañafistola - Sector la Vaca - Caño la Pera y Viceversa	20,8	41,6	Fluvial	ote - 2 Recor	44	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.350	$ 43.638.000	$ 134.442.000	182	$ 178.080.000	44	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 21.288.650	$ 0	$ 21.288.650	15,83%	11,95%	106	56	$ 115.340.400	64,77%
	8	Finca Isaias Caro - Sede El Final y Viceversa	9	18	Terrestre	oneta - 2 Rec	38	42	120	$ 1.219.000	$ 1.315.000	$ 51.198.000	$ 157.800.000	182	$ 208.998.000	36	19	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,15,19,20, 21,22,25,26,27, 28,29	$ 24.985.000	$ 24.985.000	$ 0	15,83%	11,95%	106	56	$ 135.358.000	64,77%
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCANO	9	Lourdes - Avenida Principal de Pedro Itel Jiménez - CAI Primero de Enero - Dique - Playitas - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	182	$ 185.970.000	42	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ 0	15,00%	11,32%	100	82	$ 113.430.000	60,99%
	10	Plaza del Ussón - Obelisco - Avenida Juan Isidro Daboin Redoma HSV - Avenida Rondón - Caño Córdoba - Rey del Bufalo - Ricaurte - Cancha Guires - Corocoras Alcaldía Municipal IE Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.083.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	182	$ 185.604.000	56	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.024.000	$ 21.024.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	82	$ 113.168.000	60,98%
	11	Barrio Manhattan - Gaiones - Barrio Matevenao - Mangos - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.082.000	$ 1.168.000	$ 45.444.000	$ 140.160.000	182	$ 185.604.000	37	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.024.000	$ 21.024.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	82	$ 113.168.000	60,98%
	12	Vereda Papayito - El Rosario - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	182	$ 185.970.000	40	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ 0	15,00%	11,32%	100	82	$ 113.430.000	60,99%
	13	La Portia (Km 2 Antioqueña - Caño Limón) - La Antioqueña - Chaparrito - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa	15,9	31,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.085.000	$ 1.170.000	$ 45.570.000	$ 140.400.000	182	$ 185.970.000	25	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ 0	15,00%	11,32%	100	82	$ 113.430.000	60,99%
	14	Matecaña - Arrecifes - Grimonato - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en la Parada del Ciclista)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.750.000	$ 1.920.000	$ 74.760.000	$ 230.400.000	182	$ 305.160.000	67	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 34.560.000	$ 34.560.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	82	$ 186.120.000	60,99%

Calle 18 N°39b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3164495360

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 604 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2026	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
I.E. MATECANDELA	15	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Nel Jiménez - Piscina Femar - Fundadoras (Solo Ida Martes y Jueves)	15,2		Terrestre	1 Bus	38	16	49	$ 635.000	$ 900.000	$ 13.360.000	$ 44.100.000	65	$ 57.460.000
	16	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Papayito (Solo ida Martes y Jueves)	14,5		Terrestre	1 Buseta	28	16	49	$ 705.000	$ 780.000	$ 11.280.000	$ 37.240.000	65	$ 48.520.000
	17	I.E. Agropecuario Municipal Araucano - Matepiña (Solo ida Martes y Jueves)	22,2		Terrestre	1 Camioneta	10	16	49	$ 570.000	$ 815.000	$ 9.120.000	$ 30.135.000	65	$ 39.255.000
	18	Villa Luz - Alcaravan - Cecar Mogollón - Piscina FEMAR - Fundadores - La Embejada - Dique - I.E. Agropecuario Municipal Araucano y Viceversa (Segundo recorrido inicia en Caño Jesús)	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000
	19	Barrio Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Mañana	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000
	20	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los guires) - Jornada Mañana.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000
	21	Barrio Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en Villa Luz) Jornada Tarde	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000
	22	Romboy Avenida 5ª - Malecón - Barrio Libertadores Dique - I.E. Matecandela y Viceversa (El segundo recorrido inicia en el sector los Güires) - Jornada Tarde.	23,1	46,2	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.735.000	$ 1.870.000	$ 72.870.000	$ 224.400.000	162	$ 297.270.000
	23	Femar - Centauros Alcaraván - Playitas - I.E. Matecandela y Viceversa.- Jornada Tarde.	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.820.000	$ 1.960.000	$ 76.440.000	$ 235.200.000	162	$ 311.640.000
	24	Corocito - La Peyara - El Torno - Barrancón - I.E. Matecandela y Viceversa	18,5	37	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.150.000	$ 44.940.000	$ 138.000.000	162	$ 182.940.000
	25	Vereda Corocito - Sector Guarduito - Sede José Gregorio González Laguna La Morenera - Sede Pablo Emilio Guarín - Sede José Gregorio González y Viceversa	17,2	34,4	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.070.000	$ 1.154.000	$ 44.940.000	$ 138.480.000	162	$ 183.420.000

MAYO-2026

Institución Educativa	No. Ruta	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. MATECANDELA	15	54	8	5,7,12,14,19,21 ,26,28	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ 0	16,33%	12,53%	39	26	$ 34.080.000	59,28%
	16	9	8	5,7,12,14,19,21 ,26,28	$ 6.080.000	$ 6.080.000	$ 0	16,33%	12,53%	39	26	$ 26.760.000	58,27%
	17	11	8	5,7,12,14,19,21 ,26,28	$ 4.920.000	$ 4.920.000	$ 0	16,33%	12,53%	39	26	$ 23.265.000	58,27%
	18	81	16	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 33.680.000	$ 33.680.000	$ 0	15,06%	11,32%	100	62	$ 181.330.000	61,00%
	19	49	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 31.790.000	$ 31.790.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 175.720.000	59,11%
	20	100	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 31.790.000	$ 31.790.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 175.720.000	59,11%
	21	41	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 31.790.000	$ 31.790.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 175.720.000	59,11%
	22	39	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 31.790.000	$ 31.790.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 175.720.000	59,11%
	23	50	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 33.320.000	$ 33.320.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 184.240.000	59,12%
	24	18	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 19.550.000	$ 0	$ 19.550.000	14,17%	10,69%	100	62	$ 111.640.000	61,03%
	25	26	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 19.618.000	$ 0	$ 19.618.000	14,17%	10,70%	99	63	$ 110.718.000	60,36%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 854 DE 2025 | **MAYO-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
C.E. MONSERRATE	26	Puente Internacional - Llano Alto - El Recreo - Vista Hermosa - Laguna de Oxidación - La Curva - Buenos Aires - La Y - Cementerio - C.E. Monserrate y Viceversa (El segundo recorrido inicia en las lagunas de oxidación)	8,51	17,02	Terrestre	2 Busetas	48	42	120	$ 1.668.000	$ 2.010.000	$ 78.496.000	$ 241.200.000	162	$ 319.856.000	64	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 34.170.000	$ 34.170.000	$ 0	14,17%	10,89%	97	65	$ 189.006.000	59,13%
	27	Barrio Manhattan - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Carretero - Tienda La Canoa - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.185.000	$ 1.280.000	$ 49.770.000	$ 153.600.000	162	$ 203.370.000	68	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 23.040.000	$ 23.040.000	$ 0	15,00%	11,33%	97	65	$ 129.179.000	50,09%
	28	Sector Las Compuertas - Los Pachos - C.E. Monserrate y Viceversa	13,5	27	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	44	42	120	$ 1.709.000	$ 1.842.000	$ 71.778.000	$ 221.040.000	162	$ 292.818.000	26	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 31.314.000	$ 31.314.000	$ 0	14,17%	10,69%	97	65	$ 173.088.000	59,11%
	29	Finca La Lorena - Vereda Clarinetero - Sede Marco Fidel Suarez y Viceversa	8,5	17	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	27	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.224.000	$ 19.224.000	$ 0	15,00%	11,32%	97	65	$ 109.404.000	58,12%
	30	Finca La Lorena - Comunidad Indigena La Estrellita - Sede El Triunfo y Viceversa	10	20	Terrestre	2 Camionetas	20	42	120	$ 1.565.000	$ 1.685.000	$ 65.730.000	$ 202.200.000	162	$ 267.930.000	30	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 30.330.000	$ 30.330.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 156.720.000	58,49%
I.E. SANTO ANGEL	31	Reforma del Hospital - Los Arrecifes - Sede San Emilio - Matepiña - Sede Santo Ángel y Viceversa	39	78	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.323.000	$ 1.427.000	$ 55.566.000	$ 171.240.000	162	$ 226.806.000	82	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 25.686.000	$ 25.686.000	$ 0	15,00%	11,33%	93	69	$ 128.343.000	56,59%
	32	La Y Santa Rosa + 3 kms via Caracol-María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 856.000	$ 923.300	$ 35.952.000	$ 110.796.000	162	$ 146.748.000	15	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 16.619.400	$ 16.619.400	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 83.963.600	57,22%
	33	Sector el Alcaravan - Sede María Auxiliadora - Sede Santo Ángel y Viceversa	7,5	15	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 782.000	$ 844.000	$ 32.844.000	$ 101.280.000	162	$ 134.124.000	7	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 15.192.000	$ 15.192.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 76.732.000	57,21%
	34	Sede Gabriela Mistral (Vda Feliciano) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	18	42	120	$ 1.524.000	$ 1.643.000	$ 64.008.000	$ 197.160.000	162	$ 261.168.000	13	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 29.574.000	$ 29.574.000	$ 0	15,00%	11,32%	93	69	$ 147.801.000	56,59%
	35	Puerto Infante Cubano - Sede Puerto Colombia y Viceversa	20	40	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.100.000	$ 2.270.000	$ 88.200.000	$ 272.400.000	162	$ 360.600.000	70	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 40.860.000	$ 0	$ 40.860.000	15,00%	11,33%	75	87	$ 163.110.000	45,23%
	36	Caseríos Bolívieros Garceritos - Villanueva - Isla La Pradeña - Sede Agropecuario Caracol y Viceversa	13	26	Fluvial	1 Bote	17	42	120	$ 1.070.000	$ 1.152.000	$ 44.940.000	$ 138.240.000	162	$ 183.180.000	14	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.736.000	$ 0	$ 20.736.000	15,00%	11,32%	79	83	$ 87.564.000	47,80%
	37	Bamenca Amarilla - Sede Agropecuario Caracol - Viceversa	6,7	13,4	Fluvial	1 Bote	16	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	21	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.242.000	$ 0	$ 19.242.000	15,00%	11,32%	79	83	$ 81.217.000	47,79%
	38	Finca El Hombre de Oro - Finca La María - Sede El Vapor y Viceversa	13,7	25,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.067.000	$ 1.151.000	$ 44.814.000	$ 138.120.000	162	$ 182.934.000	4	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.718.000	$ 0	$ 20.718.000	15,00%	11,33%	93	69	$ 103.518.000	56,59%
	39	Puente la Florida - Camazas - Y Zamuracos - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	42	120	$ 810.000	$ 875.000	$ 34.020.000	$ 105.000.000	162	$ 139.020.000	6	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 15.750.000	$ 15.750.000	$ 0	15,00%	11,33%	93	69	$ 78.645.000	56,57%
	40	Matepiña - Sede Arrecifes y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 900.000	$ 970.000	$ 37.800.000	$ 116.400.000	162	$ 154.200.000	29	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.460.000	$ 17.460.000	$ 0	15,00%	11,32%	93	69	$ 87.270.000	56,60%
	41	Concha de Finca la Venturosa - Sede San Cayetano - Finca El Porfin (Dumar Sánchez) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	18	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 15.192.000	$ 15.192.000	$ 0	15,00%	11,32%	93	69	$ 75.930.000	56,59%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 664 DE 2025 | **MAYO-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
C.E. INDOENA SIKUANI PLAYEROS	42	Caño Jesús - Dique Vía - Villa Luz - Playitas - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.090.000	$ 2.254.000	$ 87.780.000	$ 270.480.000	162	$ 358.260.000	52	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 40.572.000	$ 40.572.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 204.988.000	57,22%
	43	Los Peches - Barrancones - C.E. Indígena Sikuani Playeros y Viceversa	34	68	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	15	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.924.000	$ 0	$ 21.924.000	15,00%	11,32%	94	68	$ 110.796.000	57,22%
	44	Resguardo Indígena Corocito - Isla de Guardulio - C.E. Sikuani Playeros y Viceversa	38	76	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.130.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 146.160.000	162	$ 193.620.000	20	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.924.000	$ 0	$ 21.924.000	15,00%	11,32%	94	68	$ 110.796.000	57,22%
	45	Redoma Hospital - Chalieco - Avenida 9ª - Malecón - Gules - Primero de Enero - C.E. Indígena. Sikuani y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.186.000	$ 1.258.000	$ 48.972.000	$ 150.960.000	162	$ 199.932.000	23	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 22.644.000	$ 22.644.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 114.366.000	57,21%
C.E. EL TRANSITO	46	Vereda Las Cruces (vereda alto primores) - Vereda El Vigía - Vereda Cañas Bravas - C.E. El Tránsito y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	10	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 17.226.000	$ 17.226.000	$ 0	15,00%	11,33%	96	66	$ 86.932.000	56,47%
	47	La Y Manantiales - Maperal - La Conquista - C.E. El Tránsito y Viceversa.	16,5	33	Terrestre	2 Camionetas	29	42	120	$ 1.628.000	$ 1.756.000	$ 68.376.000	$ 210.720.000	162	$ 279.096.000	17	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 31.608.000	$ 31.608.000	$ 0	15,00%	11,33%	96	66	$ 163.200.000	58,47%
	48	Sede La Paz A - Vereda Caño Sivo - Caserío Bocas de Ele - C.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 884.000	$ 954.000	$ 37.128.000	$ 114.480.000	162	$ 151.608.000	17	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 17.172.000	$ 17.172.000	$ 0	15,00%	11,33%	96	66	$ 86.644.000	56,47%
	49	Sede Santa Ana (Laureles I) - Vereda El Diamante - Vereda Los Laureles- C.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 780.000	$ 840.000	$ 32.760.000	$ 100.800.000	162	$ 133.560.000	18	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 76.120.000	56,49%
	50	Puente Caño Manzano - Puente Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	11	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 17.226.000	$ 17.226.000	$ 0	15,00%	11,33%	96	66	$ 86.932.000	56,47%
C.E. HITNU LAS VEGAS	51	Caserío Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Sede Las Vegas y Viceversa	17,6	35,2	Fluvial	1 Bote - 2 Recorridos	28	42	129	$ 1.545.000	$ 1.666.000	$ 64.890.000	$ 199.920.000	162	$ 264.810.000	27	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 29.988.000	$ 0	$ 29.988.000	15,00%	11,32%	90	72	$ 144.858.000	54,70%
Municipio de Arauquita							1.956			$ 72.657.200	$ 78.979.755	$ 3.061.602.400	8.477.570.500		$ 12.529.179.000	1909	16,9999999		$ 1.253.974.000	$ 932.079.000	$ 321.895.000	13,33%	10,01%			$ 7.369.404.925	58,82%
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Rancho - Javillal - La Florida - El Porvenir – I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,9	35,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.039.000	$ 1.120.000	$ 43.638.000	$ 134.400.000	162	$ 178.038.000	40	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 17.920.000	$ 17.920.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 104.118.000	58,48%
	2	Los Chorros - El Triunfo - La Y - Estación Neira - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	36	42	120	$ 1.017.000	$ 1.096.000	$ 42.714.000	$ 131.520.000	162	$ 174.234.000	30	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 17.536.000	$ 17.536.000	$ 0	13,33%	10,06%	96	66	$ 101.898.000	58,48%
	3	El Cadrito - Bocas Del Juju - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	30	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 109.980.000	58,48%
	4	San Lorenzo - Vereda Totumal - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000	13	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 14.592.000	$ 14.592.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 84.738.000	58,47%
I.E. ANDRES BELLO	5	Cama Floja - Los Jardines - La Trampa - Caño Honda - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,6	49,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 971.000	$ 1.047.000	$ 40.782.000	$ 125.640.000	162	$ 166.422.000	36	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.752.000	$ 16.752.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 96.273.000	57,85%
	6	Las Torres - Bajo Caramal - Galilán - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.625.000	$ 2.184.000	$ 85.050.000	$ 262.080.000	162	$ 347.130.000	40	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 34.944.000	$ 34.944.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 200.802.000	57,85%
	7	Sede Galilán Caramal - Sede Guayamal - I. E. Andrés Bello y Viceversa	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.082.000	$ 1.179.000	$ 45.864.000	$ 141.480.000	162	$ 187.344.000	53	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.864.000	$ 18.864.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 108.351.000	57,84%
	8	Las Palmas - Cuatro Esquinas - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 885.000	$ 965.000	$ 37.530.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	19	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 88.735.000	57,85%

Calle 18 N° 30b – 27 Urb. Altos del Country Ciudad Jardín
Mail: inscolar2025@gmail.com
Celular: 3184435582

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025 | **MAYO-2025**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2026	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	9	Sede Bibiana Talero - Los Cheeros - Escuela el Recreo - La Paz I.E. Andrés Bello y Viceversa.	15,5	31	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	10	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 88.735.000	57,85%
	10	La Comuna - El Paraiso - La Tangui - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,6	21	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	21	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.488.000	$ 15.488.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 89.020.000	57,85%
	11	Campo Cinco - Guaimaral - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	14	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.488.000	$ 15.488.000	$ 0	13,33%	10,07%	95	67	$ 89.020.000	57,85%
I.E. SAN JOSE DE LA PESQUERA	12	Salón Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000	27	15	4,5,6,7,8,11,12, 19,21,22,25,26, 27,28,29	$ 14.475.000	$ 14.475.000	$ 0	12,50%	9,44%	97	65	$ 90.985.000	59,11%
	13	Puente Jorobado - El Vivero - La Cesa - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	13	26	Terrestre	3 Buses	114	42	120	$ 2.970.000	$ 3.209.000	$ 124.740.000	$ 385.080.000	162	$ 509.820.000	86	15	4,5,6,7,8,11,12, 19,21,22,25,26, 27,28,29	$ 48.135.000	$ 48.135.000	$ 0	12,50%	9,44%	97	65	$ 301.235.000	59,09%
	14	Kilómetro 81 - Puente Caranal - Las Acacias - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	58	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	42	15	4,5,6,7,8,11,12, 19,21,22,25,26, 27,28,29	$ 19.410.000	$ 19.410.000	$ 0	12,50%	9,44%	97	65	$ 121.570.000	59,11%
	15	Barranquillita - Mazaguaros - Puerto Nuevo - Nuevo Jerusalén - I.E. San José de la Pesquera y Viceversa	10,3	20,6	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.040.000	$ 2.212.000	$ 85.680.000	$ 265.440.000	162	$ 351.120.000	27	15	4,5,6,7,8,11,12, 19,21,22,25,26, 27,28,29	$ 33.180.000	$ 0	$ 33.180.000	12,50%	9,45%	97	65	$ 207.340.000	59,06%
I.E. SIMON RODRIGUEZ - BAYONEROS	16	Puente Caranal - Sede Villa Hermosa - Sede Santa Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	16,09	32,18	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 833.000	$ 898.000	$ 34.986.000	$ 107.760.000	162	$ 142.746.000	36	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 14.368.000	$ 14.368.000	$ 0	13,33%	10,07%	94	66	$ 81.662.000	57,22%
	17	La Pradera - Sede Juan José Rondón Sector Caño Rico - Finca la Fe en la Vereda la Pica - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.220.000	$ 1.324.000	$ 51.240.000	$ 158.880.000	162	$ 210.120.000	28	15	4,5,6,7,11,12,1 9,21,22,25,26,2 7,28,29	$ 19.860.000	$ 19.860.000	$ 0	12,50%	9,45%	95	67	$ 121.413.000	57,78%
	18	Puente Caranal - Bocas de Caranal - Isla Contigua a Mazaguaros y Viceversa	10,1	20,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 1.065.000	$ 1.150.000	$ 44.730.000	$ 138.000.000	162	$ 182.730.000	20	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.400.000	$ 0	$ 18.400.000	13,33%	10,07%	95	67	$ 105.660.000	57,83%
	19	El Placer - Cajeres Bayonero - Carretero - Sede Simón Rodríguez - Bayoneros y Viceversa	25	46	Fluvial	3 Botes	86	42	120	$ 3.060.000	$ 3.300.000	$ 128.520.000	$ 396.000.000	162	$ 524.520.000	66	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 52.800.000	$ 0	$ 52.800.000	13,33%	10,07%	97	65	$ 310.020.000	59,11%
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Veredas Caño Arenas – Mapoteta – Gavilcas - La Esperanza - El Placer - El Caucho I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	31,6	63,5	Fluvial	5 Botes	104	42	120	$ 5.620.000	$ 6.294.000	$ 236.040.000	$ 755.280.000	162	$ 991.320.000	78	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 100.704.000	$ 0	$ 100.704.000	13,33%	10,16%	96	68	$ 575.916.000	58,10%
	21	Las Veredas Los Angelitos - La Aranosa - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa.	7,7	15,4	Fluvial	3 Botes	63	42	120	$ 2.756.000	$ 2.972.000	$ 115.752.000	$ 356.640.000	162	$ 472.392.000	54	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 47.552.000	$ 0	$ 47.552.000	13,33%	10,07%	96	68	$ 275.240.000	58,48%
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	6,1	12,2	Fluvial	1 Bote	22	42	120	$ 982.000	$ 1.060.000	$ 41.664.000	$ 127.200.000	162	$ 168.864.000	17	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.960.000	$ 0	$ 16.960.000	13,33%	10,04%	96	66	$ 98.904.000	58,57%
	23	Puente Jorobado - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,6	23,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	40	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ 0	13,33%	10,07%	94	66	$ 107.496.000	57,22%
	24	Puerto Matus - La Pelona - Diamante I.E. Aguachica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 940.000	$ 1.014.956	$ 39.480.000	$ 121.794.600	162	$ 161.274.600	36	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.239.280	$ 16.239.280	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 95.302.525	59,09%
	25	Los Chorros - La Tranquita - I.E. Aguachica y Viceversa	6,8	13,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 915.000	$ 988.000	$ 38.430.000	$ 118.560.000	162	$ 156.990.000	26	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.808.000	$ 15.808.000	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 92.770.000	59,09%
	26	El Pozo - Fundación - Santa Ana - Brisas Del Palmar - I.E. Aguachica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	86	42	120	$ 2.460.000	$ 2.699.000	$ 103.320.000	$ 323.880.000	162	$ 424.980.000	30	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 43.184.000	$ 43.184.000	$ 0	13,33%	10,17%	97	65	$ 249.245.000	58,89%

Calle 18 N° 39b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
interconsescolar2025@gmail.com
Celular: 3136405660

46

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025 | **MAYO-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. AGUACHICA	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.230.000	$ 2.498.000	$ 93.660.000	$ 299.760.000	162	$ 393.420.000	51	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 39.968.000	$ 39.968.000	$ 0	13,33%	10,16%	97	65	$ 231.050.000	58,73%
	28	Sede El Martil - El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	34	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 20.704.000	$ 20.704.000	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 121.570.000	59,11%
	29	Sede La Islandia - I.E. Aguachica y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 918.500	$ 990.000	$ 38.577.000	$ 118.896.000	162	$ 157.473.000	16	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.852.800	$ 15.852.800	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 93.071.000	59,10%
	30	La Trampa - El Encanto - Puerto Caimán - I.E. Aguachica y Viceversa	14,1	28,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	34	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 20.704.000	$ 20.704.000	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 121.570.000	59,11%
	31	Rosa Blanca - I.E. Aguachica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 918.900	$ 990.000	$ 38.593.800	$ 118.800.000	162	$ 157.393.800	20	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 0	13,33%	10,06%	97	65	$ 93.040.800	59,12%
	32	Bajo Carsnal - I.E. Aguachica y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus	33	42	120	$ 1.200.000	$ 1.294.000	$ 50.400.000	$ 155.280.000	162	$ 205.680.000	38	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 20.704.000	$ 20.704.000	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 121.570.000	59,11%
	33	El Oasis - I.E. Aguachica y Viceversa	5,25	10,5	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.098.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	27	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.864.000	$ 18.864.000	$ 0	13,33%	10,07%	97	65	$ 110.751.000	59,10%
I.E. PEDRO MEL JIMENEZ	34	Alto Primores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.900.000	$ 2.070.000	$ 79.800.000	$ 248.400.000	162	$ 328.200.000	42	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 33.120.000	$ 33.120.000	$ 0	13,33%	10,09%	99	66	$ 191.580.000	58,37%
	35	Mallepiña - Las Cruces - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	20,5	41	Terrestre																						
	36	La Cal -Sede El Progreso de los Niños - El Lloa - Alto Primores - El Futuro - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	36,2	72,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.098.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	33	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.912.000	$ 18.912.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 109.860.000	58,48%
	37	La Tienda de Don Uriel - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Reserva Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	19,8	39,6	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.236.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	31	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 19.808.000	$ 19.808.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 115.068.000	58,48%
	38	Mata de Coco - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colonos - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	24,8	45,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.345.000	$ 52.500.000	$ 161.400.000	162	$ 213.900.000	36	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 21.520.000	$ 21.520.000	$ 0	13,33%	10,06%	99	66	$ 125.130.000	58,50%
	39	El Paraiso - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	20	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 19.760.000	$ 19.760.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 114.780.000	58,47%
	40	La Gloria - El Paraiso - Vista Hermosa - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000	17	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.080.000	$ 16.080.000	$ 0	13,33%	10,06%	96	66	$ 93.486.000	58,50%
	41	Centro Poblado Puerto Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.253.000	$ 1.351.000	$ 52.626.000	$ 162.120.000	162	$ 214.746.000	34	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 21.616.000	$ 21.616.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 125.580.000	58,48%
	42	La "Y" Colonos - Finca Don Orono - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Viceversa	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	45	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 19.760.000	$ 19.760.000	$ 0	13,33%	10,07%	96	66	$ 114.780.000	58,47%
	43	Finca Buenaventura - Sede Alto Bonito - Puente Caimán - El Carmen - IE Pedro Nel Jiménez y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 858.200	$ 923.000	$ 35.984.400	$ 110.760.000	162	$ 146.720.400	15	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 14.768.000	$ 14.768.000	$ 0	13,33%	10,07%	99	66	$ 85.892.400	58,48%
C.E. INDIGENA EL VIGIA	44	Soledad - C.E. Indigena El Vigia y Viceversa	10,5	21	Fluvial	2 Botes - 2 Recorridos	74	42	120	$ 2.900.000	$ 3.250.000	$ 121.800.000	$ 390.000.000	162	$ 511.800.000	49	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 52.000.000	$ 0	$ 52.000.000	13,33%	10,16%	103	69	$ 320.050.000	62,53%
	45	Canclones - El Campamento - C.E. Indigena El Vigia y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.060.000	$ 1.180.000	$ 44.520.000	$ 141.600.000	162	$ 186.120.000	57	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 18.880.000	$ 18.880.000	$ 0	13,33%	10,14%	103	58	$ 118.560.000	62,58%
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Caranal - Kilometro 81 - Las Bancas - Barrio Santo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	20,6	41,2	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 853.600	$ 920.000	$ 35.851.200	$ 110.400.000	162	$ 146.251.200	24	16	4,5,6,7,8,11,12, 19,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 14.720.000	$ 14.720.000	$ 0	13,33%	10,06%	98	64	$ 87.371.200	59,74%

Calle 18 N° 30b – 29 urbanizacion Ciudad verde
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular | 3184495580

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
I.E LICEO DEL LLANO	47	El Trancal - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	42	42	120	$ 1.380.000	$ 1.470.000	$ 57.120.000	$ 176.400.000	162	$ 233.520.000
	48	La Pica - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	12	42	120	$ 926.000	$ 988.000	$ 38.892.000	$ 118.760.000	162	$ 158.652.000
	49	Totumal - Campamento - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 989.000	$ 1.060.000	$ 41.538.000	$ 127.200.000	162	$ 168.738.000
	50	Guamalito - Matecacao - La Unión - Puerto Matus - Matecacao I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	24	48	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Rafael - San Lorenzo - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 858.000	$ 923.000	$ 36.052.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000
	52	NEE - Mata Oscura - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	34	68	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 918.000	$ 980.000	$ 38.556.000	$ 118.800.000	162	$ 157.356.000
	53	NEE - La Esmeralda - I.E. Urbanas de Arauquita y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	8	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puente Jenobade - Tres Cruces - Sede La Aranosa - Salón Comunal - Sede La Aranosa y Viceversa	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 926.000	$ 998.000	$ 38.892.000	$ 119.760.000	162	$ 158.652.000
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Sede Rafael Núñez - La Brasilia Paso Malo - Peralonso - Sede Rómulo Gallegos y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 934.000	$ 1.005.000	$ 39.228.000	$ 120.600.000	162	$ 159.828.000
Municipio de Cravo Norte							**97**			**$ 6.264.000**	**$ 6.779.000**	**$ 263.088.000**	**813.480.000**		**$ 1.076.568.000**
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	Vereda El Barruco - Relleno Sanitario - Sede Educativa La Granja - Manga De Coleo - Sede El Triunfo - Sede José Teodoro Hurtado - Sede José Antonio Galán y Viceversa	15	30	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.640.000	$ 1.776.000	$ 68.880.000	$ 213.120.000	162	$ 282.000.000
	2	Finca Altamira - Fundo Santa Fe - Sede Educativa San José - Finca Cabiona y Viceversa	12,8	25,6	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 784.000	$ 827.000	$ 32.928.000	$ 99.240.000	162	$ 131.328.000
	3	Finca Mi Parcelita - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Cosecha - Sede Agualinda y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Camioneta	10	42	120	$ 790.000	$ 844.000	$ 32.760.000	$ 101.280.000	162	$ 134.040.000
	4	Bocas del Casanare - Sede La Virgen y Viceversa	20,7	41,4	Fluvial	1 Bote	12	42	120	$ 1.060.000	$ 1.150.000	$ 44.520.000	$ 138.000.000	162	$ 182.520.000
	5	Finca El Algarrobo - El Aeropuerto - La Campechana - I.E. José Antonio Galán y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 790.000	$ 852.000	$ 33.180.000	$ 102.240.000	162	$ 135.420.000
	6	Finca Menati - Sede La Virgen y Viceversa	20,4	40,8	Fluvial	1 Bote	11	42	120	$ 1.230.000	$ 1.330.000	$ 51.660.000	$ 159.600.000	162	$ 211.260.000
Municipio de Fortul							**1.317**			**$ 47.871.000**	**$ 51.752.000**	**$ 2.010.582.000**	**6.210.240.000**		**$ 8.220.822.000**
	1	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 800.000	$ 835.000	$ 33.600.000	$ 100.200.000	162	$ 133.800.000
	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	10	20	Terrestre	1 Microbús	11	42	120	$ 805.000	$ 868.000	$ 33.810.000	$ 104.160.000	162	$ 137.970.000
	3	Caño Seco - Los Duarte - Hato Rancho Rojo Cementerio Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	13,1	26,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 930.000	$ 1.004.000	$ 39.060.000	$ 120.480.000	162	$ 159.540.000

Institución Educativa	No. Ruta	MAYO-2026 Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E LICEO DEL LLANO	47	46	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 23.520.000	$ 23.520.000	$ 0	13,33%	10,07%	98	64	$ 139.440.000	59,71%
	48	17	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.968.000	$ 15.968.000	$ 0	13,33%	10,06%	98	64	$ 94.780.000	59,74%
	49	22	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.960.000	$ 16.960.000	$ 0	13,33%	10,05%	98	64	$ 100.880.000	59,80%
	50	16	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.312.000	$ 15.312.000	$ 0	13,33%	10,07%	98	64	$ 90.846.000	59,73%
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	10	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 14.768.000	$ 14.768.000	$ 0	13,33%	10,07%	98	64	$ 87.840.000	59,74%
	52	22	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 0	13,33%	10,07%	98	64	$ 93.996.000	59,73%
	53	20	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 15.312.000	$ 15.312.000	$ 0	13,33%	10,07%	98	64	$ 90.846.000	59,73%
C.E. SAN JUAN BOSCO	54	29	15	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,25,26, 27,28,29	$ 14.970.000	$ 14.970.000	$ 0	12,50%	9,44%	89	73	$ 85.798.000	54,08%
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	47	16	4,5,6,7,8,11,12, 18,20,21,22,25, 26,27,28,29	$ 16.080.000	$ 16.080.000	$ 0	13,33%	10,06%	98	64	$ 95.508.000	59,76%
Municipio de Cravo Norte		**90**	**16**		**$ 122.022.000**	**$ 77.392.000**	**$ 44.640.000**	**16,00%**	**11,33%**			**$ 632.699.000**	**58,79%**
I.E. JOSE ANTONIO GALAN	1	36	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 31.968.000	$ 31.968.000	$ 0	15,00%	11,34%	99	83	$ 170.112.000	60,32%
	2	14	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 14.868.000	$ 14.868.000	$ 0	15,00%	11,33%	97	65	$ 77.573.000	59,07%
	3	14	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.192.000	$ 15.192.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 77.492.000	57,81%
	4	4	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 20.700.000	$ 0	$ 20.700.000	15,00%	11,34%	92	70	$ 102.020.000	55,90%
	5	16	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.336.000	$ 15.336.000	$ 0	15,00%	11,32%	98	64	$ 80.892.000	59,73%
	6	7	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 23.940.000	$ 0	$ 23.940.000	15,00%	11,33%	97	65	$ 124.810.000	59,08%
Municipio de Fortul		**1113**	**17,7435897**		**$ 913.710.000**	**$ 913.710.000**	**$ 0**	**14,71%**	**11,11%**			**$ 4.759.451.000**	**57,89%**
	1	11	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.030.000	$ 15.030.000	$ 0	15,00%	11,23%	94	68	$ 77.020.000	57,56%
	2	11	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.624.000	$ 15.624.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 78.948.000	57,22%
	3	20	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,18,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 18.072.000	$ 18.072.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 91.268.000	57,21%

Calle 18 N° 30b – 23 Urbanización Ciudad Jardín
Interjansescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495563

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 664 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2026	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	MAYO-2026 Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Pluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	4	Las Delicias - Los Alpes - Barrancones - La Colorada - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	26,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	48	42	120	$ 1.475.000	$ 1.580.000	$ 61.950.000	$ 190.800.000	162	$ 252.750.000	37	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 28.620.000	$ 28.620.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 144.630.000	57,22%
	5	Paraiso - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	18,03	36,06	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 920.000	$ 995.000	$ 38.640.000	$ 119.400.000	162	$ 158.040.000	13	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.910.000	$ 17.910.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 90.380.000	57,19%
	6	Bajo Quirpal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 834.000	$ 1.007.000	$ 39.228.000	$ 120.840.000	162	$ 160.068.000	22	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.126.000	$ 18.126.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 91.562.000	57,22%
	7	Caserio La Primavera - Vereda La Salve - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.145.000	$ 1.235.000	$ 48.090.000	$ 148.200.000	162	$ 196.290.000	40	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 22.230.000	$ 22.230.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 112.310.000	57,22%
	8	Los Jardines - La Gaitana - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	21	42	120	$ 972.000	$ 1.045.000	$ 40.824.000	$ 125.400.000	162	$ 166.224.000	13	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.810.000	$ 18.810.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 95.164.000	57,25%
	9	El Mordisco - Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	20,34	40,68	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 965.000	$ 1.040.000	$ 40.530.000	$ 124.800.000	162	$ 165.330.000	14	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 94.610.000	57,22%
	10	Alto Jerdán - Palmatito - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 973.000	$ 1.050.000	$ 40.950.000	$ 126.000.000	162	$ 166.950.000	24	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.900.000	$ 18.900.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 95.550.000	57,23%
	11	Caranal - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.090.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	39	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 21.150.000	$ 21.150.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 106.880.000	57,22%
	12	Vereda San Francisco - La Veinte - I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	32	64	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 930.000	$ 1.005.000	$ 39.060.000	$ 120.600.000	162	$ 159.660.000	16	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.090.000	$ 18.090.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 91.320.000	57,20%
	13	Simmania - Puerto Gloria – I.E. Inocencio Chinca (Nuevo Caranal) - I.E. Alejandro Humboldt y Viceversa	24,4	48,8	Terrestre	1 Microbús	14	42	120	$ 855.000	$ 920.000	$ 35.910.000	$ 110.400.000	162	$ 146.310.000	14	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 16.560.000	$ 16.560.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 83.750.000	57,24%
I.E. TIERRA SECA	14	Nuevo Portul - San Pedro - Nevado - I.E. Tierra Seca y Viceversa	11	22	Terrestre	4 Buses	152	42	120	$ 4.260.000	$ 4.740.000	$ 178.920.000	$ 568.800.000	162	$ 747.720.000	132	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,26,26,27,28,29	$ 80.580.000	$ 80.580.000	$ 0	14,17%	10,78%	95	67	$ 430.140.000	57,53%
	15	Buenos Aires - Colinas - I.E. Tierra Seca y Viceversa	6	12	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.800.000	$ 1.975.000	$ 75.600.000	$ 237.000.000	162	$ 312.600.000	42	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,26,26,27,28,29	$ 33.575.000	$ 33.575.000	$ 0	14,17%	10,74%	95	67	$ 180.275.000	57,67%
	16	El Refugio - El Nevado -I.E. Tierra Seca Y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 975.000	$ 38.010.000	$ 117.000.000	162	$ 155.010.000	12	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,26,26,27,28,29	$ 16.575.000	$ 16.575.000	$ 0	14,17%	10,69%	95	67	$ 88.585.000	57,66%
	17	Pie de Cerro - Corrales - IE Tierra Seca y Viceversa	3,5	7	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 906.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	14	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,26,26,27,28,29	$ 16.643.000	$ 16.643.000	$ 0	14,17%	10,69%	95	67	$ 90.023.000	57,85%
I.E. PABLO VI	18	La Salve - El Salibon - Los Leños - Cristal - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,63	33,26	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 989.000	$ 1.095.000	$ 41.538.000	$ 127.800.000	162	$ 169.338.000	13	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.105.000	$ 18.105.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	64	$ 101.178.000	59,75%
	19	La Granada - Las Flores - I.E. Pablo VI y Viceversa	7,59	15,18	Terrestre	1 Microbús - 2 Recorridos	30	42	120	$ 1.510.000	$ 1.625.000	$ 63.420.000	$ 195.360.000	162	$ 258.780.000	20	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 27.675.000	$ 27.675.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	64	$ 154.588.000	59,74%
	20	La Pajuela - La Cabaña - I.E. Pablo VI y Viceversa	6,41	12,83	Terrestre																						
	21	Parque Central Portul - Palo de Agua - La Unión - Las Salve - I.E. Pablo VI y Viceversa	16,4	32,8	Terrestre	3 Busetas	56	42	120	$ 1.845.000	$ 1.990.000	$ 77.490.000	$ 238.800.000	162	$ 316.290.000	70	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 33.830.000	$ 33.830.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	64	$ 188.830.000	59,73%
	22	Invasión Nuevo Portul - I.E. Pablo VI y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.825.000	$ 1.970.000	$ 76.650.000	$ 236.400.000	162	$ 313.050.000	56	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 33.490.000	$ 33.490.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	64	$ 186.970.000	59,73%
	23	Portul - Sede Guzmán Diaz - Sede Simón Bolivar y Viceversa	16,2	32,4	Terrestre	1 Buseta - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.478.000	$ 1.580.000	$ 62.076.000	$ 190.800.000	162	$ 252.876.000	39	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 27.030.000	$ 27.030.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	64	$ 151.116.000	59,76%
	24	Casa Indigena Tame - Sede Metaguan y Viceversa	31	62	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.690.000	$ 1.820.000	$ 70.980.000	$ 218.400.000	162	$ 289.380.000	13	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 32.760.000	$ 32.760.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 185.820.000	57,23%
	25	La Comunidad Pensitos - La Y Batoyes Y Viceversa (Alimentador Ruta No. 24)	28	32	Terrestre	1 camioneta																					

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Interclaseescolar2025@gmail.com
Celular: 3184455340

43

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 654 DE 2025															MAYO-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Dias		Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Res total	Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
I.E. INDIGENA MAKAGUAN	26	La Comunidad Makaneos - Sede Makaguan y Viceversa	23,5	47	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.200.000	$ 1.284.000	$ 50.400.000	$ 155.250.000	162	$ 205.650.000	32	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 23.292.000	$ 23.292.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 117.888.000	57,22%
	27	La Comunidad la Cabaña - Sede Makaguan y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 824.000	$ 589.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	5	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 16.002.000	$ 16.002.000	$ 0	15,00%	11,33%	94	68	$ 80.838.000	57,21%
	28	Asentamiento Indigena La Rinconera - Nuevo Horizonte - Sede Makaguan y Viceversa	12,6	25	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 783.000	$ 844.000	$ 32.886.000	$ 101.280.000	162	$ 134.166.000	20	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.192.000	$ 15.192.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 76.774.000	57,22%
	29	Asentamiento Indigena Caño Flores - Sede Makaguan y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 822.000	$ 886.000	$ 34.524.000	$ 106.320.000	162	$ 140.844.000	15	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.948.000	$ 15.948.000	$ 0	15,00%	11,32%	94	68	$ 80.598.000	57,22%
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Parres - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbús	46	42	120	$ 1.750.000	$ 1.890.000	$ 73.500.000	$ 226.800.000	162	$ 300.300.000	43	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 34.020.000	$ 34.020.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 173.670.000	57,83%
	31	Caserio La Veinte - Caño Flórez - Guaiandey - La Primavera - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.380.000	162	$ 139.568.000	17	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.804.000	$ 15.804.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 80.722.000	57,85%
	32	San José - Filipinitas - Caño Azul - El Campin - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	25,4	50,8	Terrestre	2 Busetas	52	42	120	$ 1.900.000	$ 2.050.000	$ 79.800.000	$ 246.000.000	162	$ 325.800.000	47	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 36.900.000	$ 36.900.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 188.460.000	57,84%
	33	Tropicales - Las Pavitas - Muribe - Mate Caña - Tokio - Pavo Real - La Celoseda - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	36,4	72,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.950.000	$ 2.100.000	$ 81.900.000	$ 252.000.000	162	$ 333.900.000	34	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 37.800.000	$ 37.800.000	$ 0	15,00%	11,32%	95	67	$ 193.200.000	57,86%
	34	Los Cardonales - Buenos Aires - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	11,4	22,8	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.380.000	162	$ 139.568.000	17	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.804.000	$ 15.804.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 80.722.000	57,85%
	35	Rio Caramel - Torres Gemelas - La Ceiba - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Microbús	17	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.380.000	162	$ 139.568.000	20	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.804.000	$ 15.804.000	$ 0	15,00%	11,33%	95	67	$ 80.722.000	57,85%
	36	Los Malabares Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20	40	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 854.000	$ 920.000	$ 35.868.000	$ 110.400.000	162	$ 146.268.000	19	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 16.560.000	$ 16.560.000	$ 0	15,00%	11,32%	95	67	$ 84.628.000	57,86%
	37	Brisas de Caramel - La Embajada - Caño Azul - Villanueva - El Campin - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	18,4	36,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	24	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 18.540.000	$ 18.540.000	$ 0	15,00%	11,32%	95	67	$ 94.700.000	57,85%
	38	Santa Isabel - Caño Amarillo - San Joaquin - Cardenales - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	20,7	41,4	Terrestre	1 Buseta	23	42	120	$ 960.000	$ 1.030.000	$ 40.320.000	$ 123.600.000	162	$ 163.920.000	17	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 18.540.000	$ 18.540.000	$ 0	15,00%	11,31%	95	67	$ 94.910.000	57,90%
	39	Rio Cusay - Caracaro - Mata de Piña - Malabares - I.E. Paz y Esperanza y Viceversa	28,9	57,8	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 997.000	$ 1.070.000	$ 41.874.000	$ 128.400.000	162	$ 170.274.000	24	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 19.260.000	$ 19.260.000	$ 0	15,00%	11,31%	95	67	$ 99.584.000	57,90%
I.E. INOCENCIO CHINCA	40	Villa Lorena - Brisetas - Sede Alto Bello IE Inocencio Chinca y Viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	42	120	$ 848.000	$ 914.000	$ 35.616.000	$ 109.680.000	162	$ 145.296.000	20	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 15.538.000	$ 15.538.000	$ 0	14,17%	10,69%	94	68	$ 83.144.000	57,22%
C.E. PALMARITO	41	Parque Central Fortul - Invasión Nuevo Fortul - Sede Policarpa Salavarrieta y Viceversa (segundo recorrido inicia en la invasión nuevo Fortul)	11,8	23,6	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.580.000	$ 1.700.000	$ 66.360.000	$ 204.000.000	162	$ 270.360.000	72	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 30.600.000	$ 30.600.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 158.160.000	58,50%
Municipio de Puerto Rondón							182			$ 8.714.000	$ 9.156.000	$ 359.999.000	736.860.000		$ 970.848.000	158	17		$ 104.886.000	$ 104.886.000	$ 0	14,17%	10,69%			$ 815.826.000	62,89%
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Tongoleis - La Cacharna - San Ignacio - I.E. La Inmaculada y Viceversa	29	58	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.068.000	$ 41.664.000	$ 128.160.000	162	$ 169.824.000	28	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,26,27,28,29	$ 18.156.000	$ 18.156.000	$ 0	14,17%	10,69%	103	59	$ 106.812.000	62,90%
	2	Finca La Bellocera El Milagro - I.E. La Inmaculada y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,26,27,28,29	$ 17.510.000	$ 17.510.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 102.940.000	62,86%
	3	Finca Los Portales I.E. La Inmaculada y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	28	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,26,27,28,29	$ 17.510.000	$ 17.510.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 102.940.000	62,86%

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Interconsorcio 2025@gmail.com
Celular: 3184455580

88

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 684 DE 2025																MAYO-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Dia 2026	Costo Dia 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Plantillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
	4	Paraiso - El Tachuelo – I.E. La Inmaculada y Viceversa	29,8	59,6	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.980.600	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	56	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,26,27,28,29	$ 36.295.000	$ 36.295.000	$ 0	14,17%	10,70%	105	59	$ 213.395.000	62,88%
	5	El Palón - I.E. La Inmaculada y Viceversa	16,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 832.000	$ 895.000	$ 34.944.000	$ 107.400.000	162	$ 142.344.000	18	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,26,27,28,29	$ 15.215.000	$ 15.215.000	$ 0	14,17%	10,69%	103	59	$ 89.539.000	62,90%
Municipio de Saravena							1.979			$ 84.687.000	$ 89.941.000	$ 2.492.504.000	7.851.576.000		$ 10.174.080.000	1861	16,9636364		$ 1.061.122.000	$ 1.023.637.000	$ 37.485.000	15,81%	10,43%			$ 6.838.877.000	67,39%
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Banadia Medio - Rancho Pilón - Caño Clare Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.080.000	$ 1.175.000	$ 45.780.000	$ 141.000.000	162	$ 186.780.000	38	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 17.625.000	$ 17.625.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 104.530.000	55,96%
	2	Veredas Puerto Lleras - La Ye - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,63	31,26	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.850.000	$ 1.995.000	$ 77.700.000	$ 239.400.000	162	$ 317.100.000	56	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 29.925.000	$ 29.925.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 177.450.000	55,96%
	3	Vereda Charo Bajo Dos - Charo Bajo Uno - Monte Adentro – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 2.594.000	$ 2.800.000	$ 113.148.000	$ 348.000.000	162	$ 461.148.000	84	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 43.500.000	$ 43.500.000	$ 0	12,50%	9,43%	92	70	$ 258.148.000	55,96%
	4	Caño Rojo Medio - Bocas del Banadia – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 856.000	$ 923.000	$ 35.952.000	$ 110.760.000	162	$ 146.712.000	13	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 13.845.000	$ 13.845.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 82.102.000	55,96%
	5	El Porvenir - El Samuro - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.138.000	$ 1.227.000	$ 47.796.000	$ 147.240.000	162	$ 195.036.000	34	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 18.405.000	$ 18.405.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 109.146.000	55,96%
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	14,5	29	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.100.000	$ 2.360.000	$ 88.200.000	$ 283.200.000	162	$ 371.400.000	76	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 35.400.000	$ 35.400.000	$ 0	12,50%	9,53%	92	70	$ 208.200.000	55,52%
	7	Vereda Agua Santa - La Horqueta – I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,9	29,8	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 824.000	$ 888.000	$ 34.608.000	$ 106.680.000	162	$ 141.288.000	13	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 13.335.000	$ 13.335.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 79.058.000	55,96%
	8	La Esperanza – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	19,7	39,4	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 835.000	$ 900.000	$ 35.070.000	$ 108.000.000	162	$ 143.070.000	17	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 13.500.000	$ 13.500.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 80.070.000	55,97%
	9	Vereda La Unión – I.E. Antonio Nariño y Viceversa.	13,8	27,6	Terrestre	1 Buseta	20	42	120	$ 924.000	$ 996.000	$ 38.808.000	$ 119.520.000	162	$ 158.328.000	19	15	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,27,28	$ 14.940.000	$ 14.940.000	$ 0	12,50%	9,44%	92	70	$ 88.808.000	55,96%
I.E. JOSE ODEL LIZARAZO	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Reina - La Capilla – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	35	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 109.446.000	58,45%
	11	Estadero La Cabaña - La Reserva - Barrancones - Comunidad Despiazados - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	17,5	35	Terrestre	1 Microbus - 2 Recorridos	36	42	120	$ 1.250.000	$ 1.348.000	$ 52.500.000	$ 161.760.000	162	$ 214.260.000	35	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 22.916.000	$ 22.916.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 125.292.000	58,48%
	12	Vereda Alto Pajuila - La Chucua- I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	9,6	19,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.095.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	37	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.094.000	$ 20.094.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 109.818.000	58,47%
	13	Vereda San Rafael – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	10	20	Terrestre	1 Bus	34	42	120	$ 1.095.000	$ 1.182.000	$ 45.990.000	$ 141.840.000	162	$ 187.830.000	30	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.094.000	$ 20.094.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 109.818.000	58,47%
	14	Vereda el Consuelo - La Ye de Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias - I.E. José Odel Lizarazo - Alto Pajuila (Finca del Colegio la Cabaña) y Viceversa.	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	76	42	120	$ 3.150.000	$ 3.395.000	$ 132.300.000	$ 407.400.000	162	$ 539.700.000	74	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 57.715.000	$ 57.715.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	66	$ 315.630.000	58,48%
	15	Vereda El Consuelo - La Ye De Campo Alegre - Puente Banadia - Vereda Vias – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20	40	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.122.000	$ 1.210.000	$ 47.124.000	$ 145.200.000	162	$ 192.324.000	37	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.570.000	$ 20.570.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 112.464.000	58,48%
	16	Alpes 1 - Alpes 2 - Comuneros - I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa	9	18	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 896.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	24	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 16.456.000	$ 16.456.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	66	$ 89.988.000	58,48%

Calle 18 N° 30b – 23 Urbanización Ciudad Jardín
Mail: transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495380

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 554 DE 2025																	MAYO-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2026	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																			
	17	Vereda Guadualito Baja San Joaquín - Río Benadios - Estadero Las Delicias - Barrancones – I.E. José Odel Lizarazo y Viceversa.	20,3	40,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 928.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	28	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.034.000	$ 17.034.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 93.126.000	58,47%
	18	La Virgen, Cruce El Pescado Pamplona - Remboy Copetran - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	54	42	120	$ 1.480.000	$ 1.600.000	$ 62.412.000	$ 192.000.000	162	$ 254.412.000	46	16	4,5,6,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 25.600.000	$ 25.600.000	$ 0	13,33%	10,00%	99	63	$ 153.612.000	60,38%
	19	Remboy Copetran - 4 de Diciembre - Calle 20 - Carrera 13 - Sede Menor Vulnerable y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	55	42	120	$ 1.480.000	$ 1.605.000	$ 62.580.000	$ 192.600.000	162	$ 255.180.000	35	16	4,5,6,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 25.680.000	$ 25.680.000	$ 0	13,33%	10,00%	99	63	$ 154.065.000	60,38%
I.E. VILLA CECILIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Dique – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Busetas	62	42	120	$ 1.980.000	$ 2.135.000	$ 83.160.000	$ 256.200.000	162	$ 339.360.000	60	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 36.295.000	$ 36.295.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 196.450.000	58,48%
	21	Puerto Contreras – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	14,04	28,08	Terrestre	2 Buses - (2 Recorridos) y 1 Buseta	180	42	120	$ 4.395.000	$ 4.740.000	$ 184.590.000	$ 568.800.000	162	$ 753.390.000	180	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 80.580.000	$ 80.580.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 440.550.000	58,48%
	22	Vereda El Remolino – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	6,7	13,4	Terrestre	2 Busetas	50	42	120	$ 1.835.000	$ 1.980.000	$ 77.070.000	$ 237.600.000	162	$ 314.670.000	46	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 33.660.000	$ 33.660.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 183.990.000	58,47%
	23	La Playa – I.E. Villa Cecilia y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	30	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	66	$ 109.446.000	58,45%
	24	Saravena - Bello Horizonte - I.E. Villa Cecilia y Viceversa	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	35	42	120	$ 1.127.000	$ 1.215.000	$ 47.334.000	$ 145.800.000	162	$ 193.134.000	26	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.655.000	$ 20.655.000	$ 0	14,17%	10,69%	96	66	$ 112.944.000	58,48%
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	25	Finca Los Laureles I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	40	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ 0	14,17%	10,70%	90	72	$ 102.372.000	54,67%
	26	Las Vitaminas - Cooperativa - La Arrocera - El Terraplén - Calle 20, I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	33	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	92	70	$ 110.118.000	55,96%
	27	Puente Bajaba - Vereda Caño Negro - Saravena - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	17,81	35,62	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	37	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	92	70	$ 110.118.000	55,96%
	28	Buenos Aires - Cofavi - Tronquitos - 24 de Enero - Edificio el Castillo - Carrera 13 - Remboy Copetran - Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.328.000	$ 48.216.000	$ 159.360.000	162	$ 207.576.000	19	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 22.576.000	$ 22.576.000	$ 0	14,17%	10,88%	90	72	$ 111.960.000	53,94%
	29	Planta de Reciclaje de ECCAS - Estadero Los Kiosquitos - La Y de la Unión - Entrada 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	29	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.034.000	$ 17.034.000	$ 0	14,17%	10,70%	96	72	$ 87.114.000	54,70%
	30	Villahel - La Cumbre - Hugo Chávez - El Terraplén - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viceversa.	4,2	8,4	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.090.000	$ 1.179.000	$ 45.780.000	$ 141.480.000	162	$ 187.260.000	30	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ 0	14,17%	10,70%	90	72	$ 102.372.000	54,67%

Calle 18 N° 38a – 23 Urbanización Ciudad Jardín
mail.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184895340

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 864 DE 2025																MAYO-2026											
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																		
C.E. INDIGENA TUTUKANA SINAIAKA	31	NEE - Puerto Nariño - Sede Luces de Esperanza y Viceversa	21,2	42,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 879.000	$ 1.047.000	$ 49.740.000	$ 125.640.000	162	$ 188.580.000	38	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.799.000	$ 17.799.000	$ 0	14,17%	10,70%	95	67	$ 99.231.000	57,84%
	32	Vereda El Consuelo - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural. y Viceversa	8,47	16,94	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 925.000	$ 999.000	$ 38.850.000	$ 119.880.000	162	$ 158.730.000	28	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 16.983.000	$ 16.983.000	$ 0	14,17%	10,70%	90	72	$ 86.802.000	54,69%
	33	Casa Comunidad Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.076.000	$ 2.240.000	$ 87.276.000	$ 268.800.000	162	$ 356.076.000	63	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 38.080.000	$ 38.080.000	$ 0	14,17%	10,69%	100	62	$ 217.196.000	61,00%
	34	La Tanquilla - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa	10,6	21,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000	38	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.094.000	$ 20.094.000	$ 0	14,17%	10,70%	100	62	$ 114.568.000	60,99%
	35	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Calafitas. Calafitas 1 - Saravena Casa Indígena - Centro Educativo Tutukana Sinaiaka y Viceversa (Esta ruta se realiza cada 15 días)	58,9	117,8	Terrestre	1 Bus	38	5	11	$ 2.700.000	$ 2.911.000	$ 13.500.000	$ 32.021.000	16	$ 45.521.000	29	2	4,15,19,29	$ 5.822.000	$ 5.822.000	$ 0	18,18%	12,79%	14	2	$ 39.699.000	87,21%
		Alimentador Comunidad Guatralubo	5,3	10,6		1 Camioneta																					
		Alimentador Comunidad Sede San Miguel	22	44		1 Camioneta																					
	36	Sede Indígena San Emilio (Cutipao) - Corocito - Sede Indígena El Nevado (Vda Angosturas) - Corocito - Saravena - Sede Indígena Tutukana Sinaiaka y Viceversa. (Esta ruta se realiza cada 15 días)	162	324	Terrestre	1 Buseta	28	5	11	$ 3.250.000	$ 3.505.000	$ 16.250.000	$ 38.555.000	16	$ 54.805.000	28	2	4,15,19,30	$ 7.010.000	$ 7.010.000	$ 0	18,18%	12,79%	13	3	$ 44.290.000	80,81%
		Alimentador Comunidad Laguna Travesaño	19,5	39		1 Camioneta																					
		Alimentador Comunidad Cerro Cristal - Sector Alto del Cravo	8,4	16,8		1 Camioneta																					
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA	37	Vereda Los Placeres - Salcora – Miramar - Idema - Villabel - Tarrapaya I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000	38	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 20.043.000	$ 20.043.000	$ 0	14,17%	10,70%	89	73	$ 101.319.000	54,07%
	38	Invasión La Paz - 4 de Diciembre - La Unión - 20 de Julio Calle 20 - Cabeceras del Llano - Brisas del Llano - Bellaveya - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	5,8	11,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	76	42	120	$ 1.587.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	67	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 29.274.000	$ 29.274.000	$ 0	14,17%	10,70%	89	73	$ 146.008.000	54,07%
	39	Barrio San Luis - Las Flores - Barrio Anzhogar - Barrio Villa Fanny - Peralta Cerámica Italia - I.E. José Eustasio Rivera y Viceversa	4,5	9	Terrestre																						

Calle 18 N° 30b - 27 Urbanizacion Ciudad Jardin
Inter2.eraseecolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

42

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 564 DE 2025																MAYO-2026												
Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026																			
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO	40	Barrio Hugo Chávez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 12 Rafael Pombo Primaria - Terraplén - Carrera 20 - Calle 13 - Romboy Copetran - I.E.T.I Rafael Pombo y Viceversa	8	16	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	78	42	120	$ 1.597.000	$ 1.722.000	$ 67.074.000	$ 206.640.000	162	$ 273.714.000	78	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 29.274.000	$ 29.274.000	$ 0	14,17%	10,70%	92	70	$ 153.174.000	55,98%
	41	Terraplén de la 20 - Sede Pombo Primaria - Vía 20 con Calle 20 Esquina Vía a la Avenida 13 y llegada I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	4,5	9	Terrestre																							
	42	Puerta Rico - Sede Pablo Sedo - Alto Pescado - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	9,9	19,8	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	66	42	120	$ 1.585.000	$ 1.710.000	$ 66.990.000	$ 205.200.000	162	$ 273.270.000	53	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 29.223.000	$ 29.223.000	$ 0	14,17%	10,69%	92	70	$ 152.940.000	55,97%
	43	Parque del Prado - Parque José Vicente - Vía a la 20 y Avenida 13 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viceversa	3	6	Terrestre																							
I.E. ALTO CITACA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Citacá - Sede El Triunfo - Sede Alto Citacá y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	36	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 17.034.000	$ 17.034.000	$ 0	14,17%	10,70%	89	73	$ 86.112.000	54,07%
C.E. MARCO ANTONIO MANCERA	45	Sector Cañas Bravas Vereda el Remolino - Sector Caballongo de la Vereda Caballongos Sede Educativa Marco Antonio Mancera y Viceversa	10	20	Fluvial	2 Botes	44	42	120	$ 2.045.000	$ 2.205.000	$ 85.890.000	$ 264.600.000	162	$ 350.490.000	44	17	4,5,6,7,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29	$ 37.485.000	$ 0	$ 37.485.000	14,17%	10,70%	92	70	$ 196.140.000	55,98%
C.E. RICARDO NIETO CABALLERO	46	La Y de la Virgen - Sede Luis A Calvo Sede Ricardo Nieto Caballero y Viceversa	15,4	30,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	33	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 17.034.000	$ 17.034.000	$ 0	14,17%	10,70%	91	71	$ 88.116.000	55,33%
C.E. LA PAVA	47	La Unión - La Pava y Viceversa	5,1	10,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 887.000	$ 957.000	$ 37.254.000	$ 114.840.000	162	$ 152.094.000	23	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 16.269.000	$ 16.269.000	$ 0	14,17%	10,70%	93	69	$ 86.061.000	56,58%
Municipio de Tame							2.989			$ 88.607.000	$ 96.018.000	$ 3.721.494.000	11.522.160.000		$ 16.343.654.000	2436	17,6119403		$ 1.687.801.000	$ 1.687.801.000	$ 0	14,68%	11,07%			$ 8.493.913.000	52,28%
I.E. ERNESTO RINCON DUCON	1	La Capilla - Mata De Cacao - Bajo Duday - Puente Tabla - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	16,6	32,2	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.826.000	$ 1.969.000	$ 76.692.000	$ 236.280.000	162	$ 312.972.000	63	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 33.473.000	$ 33.473.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 196.801.000	62,58%
	2	Vereda La Rochela - Caño Guaspo - Batalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	11,3	22,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 908.000	$ 979.000	$ 38.136.000	$ 117.480.000	162	$ 155.616.000	32	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 16.643.000	$ 16.643.000	$ 0	14,17%	10,69%	103	59	$ 97.855.000	62,58%
	3	Bajo Florida - Nápoles - Limoncito - Caño Claro - Batalón - I.E. Ernesto Rincón Ducon y Viceversa	22,6	45,2	Terrestre	3 Busetas	84	42	120	$ 3.026.000	$ 3.265.000	$ 127.176.000	$ 391.800.000	162	$ 518.976.000	70	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 55.505.000	$ 55.505.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 326.341.000	62,58%
	4	Vereda Pueblo Seco - I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	18,6	37,2	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.100.000	$ 2.271.000	$ 88.200.000	$ 272.520.000	162	$ 360.720.000	50	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 38.607.000	$ 38.607.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 226.731.000	62,58%

Calle 18 N° 805 – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehiculos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
I.E. ANTONIO RICAURTE	6	Vereda Alto Cauca - Casa De Zinc – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	66	42	120	$ 2.023.000	$ 2.161.000	$ 84.966.000	$ 261.730.000	162	$ 346.696.000
	6	Sede Simón Bolivar (Tamacay) - Puerto Miranda – I.E. Ernesto Rincón Ducon Y Viceversa	14,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.162.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000
	7	La Balsa - Pozo Ancima - Aires de Campo Alegre – I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	14,5	29	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 901.000	$ 1.004.000	$ 39.102.000	$ 120.480.000	162	$ 159.582.000
	8	San José de Morichal - Morichito - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	9,2	18,4	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 898.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000
	9	Vereda Cravo Charo 2 - La Primavera - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte Y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Bus - 2 Recorridos	56	42	120	$ 1.486.000	$ 1.603.000	$ 62.412.000	$ 192.360.000	162	$ 254.772.000
	10	Puente Capachos Centro - La Macaguana - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	8,5	17	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000
	11	La Y Betoyes - Santa Inés Babaica - IE Antonio Ricaurte y Viceversa	22,2	44,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.114.000	$ 1.200.000	$ 46.788.000	$ 144.000.000	162	$ 190.788.000
	12	Macaguancito - Caño Guarapo - La Cabaña - Castilla la Nueva - Cravo Totumo - Vereda Corocito – I.E. Antonio Ricaurte y Viceversa	32,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 986.000	$ 1.064.000	$ 41.412.000	$ 127.680.000	162	$ 169.092.000
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	13	Vía Matecaña - Murilla - Tropicales - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000
	14	El Molino - Caño Guayabo - Santo Domingo - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13,6	27,2	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000
	15	Pueblo Seco - La Vereda La Independencia - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	13	26	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.146.000	$ 1.235.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000
	16	Caño Claro - Caño Tigre - La Vereda La Arenosa - Puerto Jordán - IPA y Viceversa	17,5	35	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 956.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000
	17	Nuevo Oriente - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 793.000	$ 855.000	$ 33.306.000	$ 102.600.000	162	$ 135.906.000
	18	Nuevo Sol - Puerto Jordán – IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbus	16	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000
	19	Normandía Veredas Lejanas - Cesar - Culiolo II - Caño Verde - IPA y Viceversa	32,4	64,8	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 1.023.000	$ 1.103.000	$ 42.966.000	$ 132.360.000	162	$ 175.326.000
	20	Puerto Alegre - Sede San José de Caranal - Ya da Ebeta Isabel - Trapiteles - IPA y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 937.000	$ 1.010.000	$ 39.354.000	$ 121.200.000	162	$ 160.554.000
	21	Santo Domingo - Palestina - Acacias - Puerto Jordán – IPA - Y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.146.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000
	22	Caserío Santo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.190.000	$ 2.360.000	$ 91.980.000	$ 283.200.000	162	$ 375.180.000

MAYO-2026

Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
36	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 37.077.000	$ 37.077.000	$ 0	14,17%	10,69%	103	59	$ 218.007.000	62,88%
41	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 20.094.000	$ 20.094.000	$ 0	14,17%	10,70%	103	59	$ 118.134.000	62,88%
26	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 17.068.000	$ 17.068.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 98.336.000	61,62%
14	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 16.456.000	$ 16.456.000	$ 0	14,17%	10,69%	101	61	$ 94.828.000	61,63%
50	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 27.251.000	$ 27.251.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 156.969.000	61,62%
26	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 17.034.000	$ 17.034.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 98.136.000	61,62%
33	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 20.400.000	$ 20.400.000	$ 0	14,17%	10,69%	101	61	$ 117.588.000	61,63%
27	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 25,26,27,28,29	$ 18.088.000	$ 18.088.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 104.186.000	61,62%
52	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 22.284.000	$ 22.284.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 121.256.000	61,62%
29	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 21.222.000	$ 21.222.000	$ 0	15,00%	11,33%	101	61	$ 115.467.000	61,62%
30	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 22.230.000	$ 22.230.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 120.987.000	61,53%
29	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 18.540.000	$ 18.540.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 100.860.000	61,62%
9	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.390.000	$ 15.390.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 83.751.000	61,62%
13	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 15.804.000	$ 15.804.000	$ 0	15,00%	11,33%	101	61	$ 85.990.000	61,62%
27	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 19.854.000	$ 19.854.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 108.043.000	61,62%
44	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 16.180.000	$ 16.180.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 88.044.000	61,63%
30	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 22.284.000	$ 22.284.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 121.256.000	61,62%
74	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 42.480.000	$ 42.480.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 219.420.000	58,46%

Calle 18 N° 20b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Mail: transescolar.2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 684 DE 2025 | **MAYO-2026**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Dias 2025	No. de Dias 2026	Costo Dia 2025	Costo Dia 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2026	Total Dias	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Dias Ejecutados 2026	Dias Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Dias Trabajados	Dias por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. FILIPINAS	23	Vereda el Rincón - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.879.000	$ 2.026.000	$ 78.918.000	$ 243.120.000	162	$ 322.038.000	28	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 36.468.000	$ 36.468.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 188.322.000	58,48%
	24	Laureles 1 - I.E. Filipinas y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.891.000	$ 1.824.000	$ 71.022.000	$ 218.880.000	162	$ 289.902.000	30	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 32.832.000	$ 32.832.000	$ 0	15,00%	11,33%	96	66	$ 169.518.000	58,47%
	25	Vereda El Milagro - I.E. Filipinas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.626.000	$ 1.753.000	$ 68.292.000	$ 210.360.000	162	$ 278.652.000	48	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 31.554.000	$ 31.554.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 162.954.000	58,48%
	26	Vereda las Galaxias - Sede la Alegría - I.E. Filipinas y Viceversa	9,4	18,8	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 905.000	$ 976.000	$ 38.010.000	$ 117.120.000	162	$ 155.130.000	31	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 17.568.000	$ 17.568.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 90.714.000	58,48%
	27	Sede El Paraíso - I.E. Filipinas y Viceversa	6,2	12,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 866.000	$ 906.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	162	$ 153.876.000	13	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 17.424.000	$ 17.424.000	$ 0	15,00%	11,32%	96	66	$ 89.988.000	58,48%
I.E. JOEL SIERRA GONZALEZ	28	Caranel Mordisco - La Vereda Tamacay Medio e Intermedias Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	16,6	33,2	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000	18	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 17.221.000	$ 17.221.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 99.269.000	61,62%
	29	Vereda Los Naranjos - Aguas Claras - Caballito - Malvinas – I.E. Joel Sierra González y Viceversa	18,5	37	Terrestre	1 Camioneta - 2 Recorridos	20	42	120	$ 1.127.000	$ 1.218.000	$ 47.334.000	$ 146.920.000	162	$ 193.254.000	30	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 20.672.000	$ 20.672.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 119.078.000	61,62%
	30	Capacitos - Sede Francisco Pizarro - Caño Grande - Sede Francisco Pizarro - El Nevado - Sede Francisco Pizarro y Viceversa	25	50	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.080.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000	30	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 18.173.000	$ 18.173.000	$ 0	14,17%	10,69%	102	60	$ 105.804.000	62,26%
	31	Morichal II - Caño Grande - Caballito - Brisas de Tamacay (Puente) y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	36	42	120	$ 1.649.000	$ 1.775.000	$ 69.258.000	$ 213.480.000	162	$ 282.738.000	32	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 30.243.000	$ 30.243.000	$ 0	14,17%	10,70%	101	61	$ 174.219.000	61,62%
	32	La Vereda Bajo Tamacay - El Tigre - I.E. Joel Sierra González y Viceversa	17,2	34,5	Terrestre	3 Busetas	78	42	120	$ 2.921.000	$ 3.149.000	$ 122.682.000	$ 377.880.000	162	$ 500.562.000	74	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 53.533.000	$ 53.533.000	$ 0	14,17%	10,69%	101	61	$ 306.473.000	61,83%
I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO	33	Nápoles - Piñalito - Rancho Grande - Los Andes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	22,4	44,8	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.169.000	$ 1.261.000	$ 49.098.000	$ 151.320.000	162	$ 200.418.000	34	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 21.437.000	$ 21.437.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 124.788.000	62,25%
	34	Vereda Siberia 1 - La Esperanza - Garrotazo - Temblados - Carraos - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	24	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 122.496.000	62,25%
	35	Vereda Holanda - Carraos – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	15,3	30,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.117.000	$ 1.204.000	$ 46.914.000	$ 144.480.000	162	$ 191.394.000	29	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 20.468.000	$ 20.468.000	$ 0	14,17%	10,69%	102	60	$ 119.154.000	62,26%
	36	Siberia II - Santo Domingo - Betoyes – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	39,3	78,6	Terrestre	2 Busetas y 1 Camioneta	56	42	120	$ 2.795.000	$ 3.014.000	$ 117.396.000	$ 361.680.000	162	$ 479.079.000	62	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 51.238.000	$ 51.238.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 298.230.000	62,25%
	37	la Y de Rondón - Casa Ladrillo – I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	22,5	45	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.235.000	$ 48.132.000	$ 148.200.000	162	$ 196.332.000	57	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 20.995.000	$ 20.995.000	$ 0	14,17%	10,69%	102	60	$ 122.232.000	62,26%
	38	Lusitania - Caño Limón - Casa Roja – I.E. Agustín Nieto Caballero Y Viceversa	33	46	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.297.000	$ 2.477.000	$ 96.474.000	$ 297.240.000	162	$ 393.714.000	77	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 42.109.000	$ 42.109.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 245.094.000	62,25%
	39	Floresita - Sede Barcelona - Costa Rica - I.E. Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17,3	34,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 955.000	$ 1.030.000	$ 40.110.000	$ 123.600.000	162	$ 163.710.000	39	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 17.510.000	$ 17.510.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 101.910.000	62,25%
	40	Rancho Grande - La Y de los Andes - Flor Amarillo - IE Agustín Nieto Caballero y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000	30	17	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 122.496.000	62,25%
	41	Caserío El Mordisco - Nuevo Horizonte - I.E. Panmerse Benilda Paredes y Viceversa	15,2	28,4	Terrestre	1 Buseta	24	42	120	$ 929.000	$ 1.002.000	$ 39.018.000	$ 120.240.000	162	$ 159.258.000	30	18	4,5,6,7,8,11,12, 13,14,19,20,21, 22,25,26,27,28, 29	$ 18.036.000	$ 18.036.000	$ 0	15,00%	11,33%	104	58	$ 101.142.000	63,51%

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Interstransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495340

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 854 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026						
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	42	La Veinte - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	6,3	12,6	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 814.000	$ 878.000	$ 34.188.000	$ 105.360.000	162	$ 139.548.000
	43	Alto Cauca - La Hermosa - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 939.000	$ 1.013.000	$ 39.438.000	$ 121.560.000	162	$ 160.998.000
	44	Muriba - Mateceña - Tolua - Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	19	38	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.560.000	162	$ 196.776.000
	45	Caserío San Francisco - I.E. Parmenio Bonilla Paredes y Viceversa	12	24	Terrestre	1 Microbús	19	42	120	$ 843.000	$ 909.000	$ 35.406.000	$ 109.080.000	162	$ 144.486.000
	46	Florida Bajo Puerto Nidia - I.E. Parmenio Bonilla y Viceversa	24,9	49,8	Terrestre	2 Buses	76	42	120	$ 2.284.000	$ 2.474.000	$ 96.348.000	$ 296.880.000	162	$ 393.228.000
I.E. INDIGENA BETOY	47	El Nevado - Corocito - La Cabaña - Corocito - Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	44,5	89	Terrestre	1 Buseta	26	42	120	$ 1.082.000	$ 1.145.000	$ 44.604.000	$ 137.400.000	162	$ 182.004.000
	48	Bode Cristóbal Colon - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.086.000	$ 1.182.000	$ 46.032.000	$ 141.840.000	162	$ 187.872.000
	49	Caño Limón - Camarne - Juleros - Velazqueros I.E. Indígena Betoy y Viceversa	17,2	34,4	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.900.000	$ 2.049.000	$ 79.800.000	$ 245.880.000	162	$ 325.680.000
	50	Asentamiento Kalivirnae - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	27,2	54,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 994.000	$ 1.072.000	$ 41.748.000	$ 128.640.000	162	$ 170.388.000
	51	Sede Santa Teresita - Betoyes - I.E. Indígena Betoy y Viceversa	8,7	17,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 895.000	$ 965.000	$ 37.590.000	$ 115.800.000	162	$ 153.390.000
	52	Macarieros - Betoyes - I.E. Indígena Guahibo Betoy y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 992.000	$ 1.069.000	$ 41.664.000	$ 128.280.000	162	$ 169.944.000
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	NEE - Centro Educativo de Formación Integral Alegre Despertar y Viceversa	23,7	47,4	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 845.000	$ 912.000	$ 35.490.000	$ 109.440.000	162	$ 144.930.000
	54	Vereda Mapoy - Laberia - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.280.000	$ 1.420.000	$ 53.760.000	$ 170.400.000	162	$ 224.160.000
	55	Vereda Rincón Hondo - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	15,6	31,2	Terrestre	1 Microbús	18	42	120	$ 948.000	$ 1.040.000	$ 39.732.000	$ 124.800.000	162	$ 164.532.000
	56	Vereda La Hormiga - Cravo Toturno - San Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16,6	29,8	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.958.000	$ 2.220.000	$ 82.236.000	$ 266.400.000	162	$ 349.896.000
	57	Cravo Corozo - Macarieros - El Culebrero - Santa Inés - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 936.000	$ 1.020.000	$ 39.312.000	$ 122.400.000	162	$ 161.712.000
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	El Pesebre - Tablón - Río Tame I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	42	66	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.196.000	$ 1.320.000	$ 50.232.000	$ 158.400.000	162	$ 208.632.000
	59	Banco Puraré - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	40,3	80,6	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 1.180.000	$ 1.300.000	$ 49.560.000	$ 156.000.000	162	$ 205.560.000
	60	Vereda Las Brisas - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses - 2 Reconidos	152	42	120	$ 3.200.000	$ 3.580.000	$ 134.400.000	$ 429.600.000	162	$ 564.000.000
	61	Vereda Santa Helena - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	13,5	35	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.096.000	$ 1.225.000	$ 46.032.000	$ 147.000.000	162	$ 193.032.000
I.E. LICEO TAME	62	La Verada Mararabe - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Busetas	56	42	120	$ 1.837.000	$ 1.981.000	$ 77.154.000	$ 237.720.000	162	$ 314.874.000
	63	Vereda Los Aceitos - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	38	42	120	$ 1.093.000	$ 1.179.000	$ 45.906.000	$ 141.480.000	162	$ 187.386.000
	64	Casa Ladrillo - Vereda La Perla - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	26,2	52,4	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 909.000	$ 1.066.000	$ 41.538.000	$ 127.920.000	162	$ 169.458.000

MAYO-2026

Institución Educativa	No. Ruta	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES	42	15	10	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 15.804.000	$ 15.804.000	$ 0	15,00%	11,33%	104	58	$ 88.024.000	62,51%
	43	32	10	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.234.000	$ 18.234.000	$ 0	15,00%	11,33%	104	58	$ 102.244.000	63,51%
	44	34	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 22.284.000	$ 22.284.000	$ 0	15,00%	11,32%	104	58	$ 124.972.000	63,51%
	45	31	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 16.362.000	$ 16.362.000	$ 0	15,00%	11,32%	104	58	$ 91.764.000	63,51%
	46	68	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 44.532.000	$ 44.532.000	$ 0	15,00%	11,32%	104	58	$ 249.736.000	63,51%
I.E. INDIGENA BETOY	47	11	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 20.610.000	$ 20.610.000	$ 0	15,00%	11,32%	101	61	$ 112.159.000	61,62%
	48	64	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 21.276.000	$ 21.276.000	$ 0	15,00%	11,32%	103	59	$ 118.134.000	62,88%
	49	70	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 36.882.000	$ 36.882.000	$ 0	15,00%	11,32%	103	59	$ 204.789.000	62,88%
	50	14	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.296.000	$ 19.296.000	$ 0	15,00%	11,32%	103	59	$ 107.140.000	62,88%
	51	25	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 17.370.000	$ 17.370.000	$ 0	15,00%	11,32%	103	59	$ 96.455.000	62,88%
	52	14	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.242.000	$ 19.242.000	$ 0	15,00%	11,32%	103	59	$ 106.873.000	62,89%
I.E. INOCENCIO CHINCA	53	16	17	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28	$ 15.504.000	$ 15.504.000	$ 0	14,17%	10,70%	102	60	$ 90.210.000	62,34%
	54	34	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 25.560.000	$ 25.560.000	$ 0	15,00%	11,40%	105	57	$ 143.220.000	63,86%
	55	22	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ 0	15,00%	11,36%	105	57	$ 105.252.000	63,97%
	56	57	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 39.960.000	$ 39.960.000	$ 0	15,00%	11,42%	105	57	$ 223.356.000	63,83%
	57	36	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 18.360.000	$ 18.360.000	$ 0	15,00%	11,35%	105	57	$ 102.572.000	64,05%
I.E. ORIENTAL FEMENINO	58	18	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 23.760.000	$ 23.760.000	$ 0	15,00%	11,39%	105	57	$ 133.392.000	63,94%
	59	20	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 23.400.000	$ 23.400.000	$ 0	15,00%	11,38%	105	57	$ 131.460.000	63,95%
	60	129	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 64.440.000	$ 64.440.000	$ 0	15,00%	11,43%	105	57	$ 359.940.000	63,82%
	61	29	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 22.050.000	$ 22.050.000	$ 0	15,00%	11,42%	105	57	$ 123.207.000	63,83%
I.E. LICEO TAME	62	48	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 35.658.000	$ 35.658.000	$ 0	15,00%	11,32%	105	57	$ 201.957.000	64,14%
	63	47	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 21.222.000	$ 21.222.000	$ 0	15,00%	11,33%	105	57	$ 120.183.000	64,14%
	64	19	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.188.000	$ 19.188.000	$ 0	15,00%	11,32%	105	57	$ 108.696.000	64,14%

Calle 18A N° 30b - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Mail: transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495350

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 564 DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms)		Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días		Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
			Ida	Ida y Vuelta				2025	2026						
I.E TECNICO INDUSTRIL PROILAN FARIAS	66	Vereda La Soledad - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Microbús	16	42	120	$ 811.000	$ 875.000	$ 34.062.000	$ 105.000.000	162	$ 139.062.000
	66	Vereda Caranal - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	34,3	68,6	Terrestre	1 Bus	36	42	120	$ 1.370.000	$ 1.530.000	$ 57.540.000	$ 183.600.000	162	$ 241.140.000
	67	Salón Comunal Vereda Saparay - I.E. Urbanas de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	28	42	120	$ 860.000	$ 1.070.000	$ 36.120.000	$ 128.400.000	162	$ 164.520.000
							Total Beneficiarios	9.989		Costo Total		$ 348.481.200	$ 377.291.405	$ 14.361.299.400	$ 44.403.299.600		$ 58.764.600.000
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($58.764.600.000)															

Institución Educativa	MAYO-2026									Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes total					
I.E TECNICO INDUSTRIL PROILAN FARIAS	5	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.750.000	$ 15.750.000	$ 0	15,00%	11,33%	105	57	$ 89.167.000	64,13%
	40	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 27.540.000	$ 27.540.000	$ 0	15,00%	11,42%	105	57	$ 153.930.000	63,83%
	17	18	4,5,6,7,8,11,12,13,14,19,20,21,22,25,26,27,28,29	$ 19.260.000	$ 19.260.000	$ 0	15,00%	11,42%	105	57	$ 107.730.000	63,05%
	9210	17.060095		$ 6.332.982.138	$ 5.642.574.488	$ 690.106.650	14,26%	10,78%			$ 34.906.300.926	68,40%

Atentamente,

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
DIRECTOR DE PROYECTO

Deicy Brigith Castillo Bregua
Coordinador de Área

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICACIONES GESPROY.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

En mi calidad de Interventoría externa, bajo contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifico que, la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, con Nit. 901.994.800-9, representada legalmente por EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de contratista del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante contrato de prestación de servicios N° 554 de 2025, ha ejecutado durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 al treinta (30) de mayo de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
DÍAS EJECUTADOS MES DE ABRIL DE 2026	17 DÍAS
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE ARAUCA	MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 1.189.667.050)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE ARAUQUITA	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($ 1.253.674.080)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	CIENTO VEINTIDOS MILLONES VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE ($ 122.022.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE FORTUL	NOVECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 913.710.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 104.686.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE SARAVENA	MIL SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/TE ($ 1.061.122.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE TAME	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($ 1.687.801.000)

Dado en Arauca el 10 de junio de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

Que el **CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025**, con Nit. **901.994.807-1,** representado legalmente por **RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ**, en calidad de contratista de la interventoría externa mediante contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifica el estado de ejecución del contrato en mención durante el periodo comprendido entre primero (01) de mayo de 2026 al treinta (30) de mayo de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2026
DÍAS EJECUTADOS MES DE MARZO DE 2026	TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO
VALOR EJECUTADO	CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($115.595.000,00)

Dado en Arauca el 10 de junio de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901994807	1	CONSORCIO INTER-TRANESCOLAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 30 B 27 URB CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184495560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376923232	9506154831	E	2026/06/02	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$16,942,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006453986	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$406,300	CCF67	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$3,250,000	$162,500
2	CC	1116807487	CASTILLO EREGUA DEICY BRIYITH	230301	30	$6,550,000	$1,048,000	ESSC24	30	$6,550,000	$818,800	CCF67	30	$6,550,000	$262,000	14-11	30	$6,550,000	$455,900	30	$6,550,000	$327,500
3	CC	1007272066	HURTADO ANGARITA ARDUL	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$406,300	CCF67	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$3,250,000	$162,500
4	CC	17596813	LINARES DIAZ JOHNATAN SMIT	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS037	30	$3,250,000	$406,300	CCF67	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$3,250,000	$162,500
5	CC	68294629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	30	$3,925,000	$628,000	EPS037	30	$3,925,000	$490,700	CCF67	30	$3,925,000	$157,000	14-11	30	$3,925,000	$273,200	30	$3,925,000	$196,300
6	CC	1116775561	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$3,925,000	$628,000	EPS041	30	$3,925,000	$490,700	CCF67	30	$3,925,000	$157,000	14-11	30	$3,925,000	$273,200	30	$3,925,000	$196,300
7	CC	1006455838	PADILLA VARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$3,250,000	$520,000	ESSC24	30	$3,250,000	$406,300	CCF67	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$3,250,000	$162,500
8	CC	1116803165	PICO SANABRIA YEISON EDUARDO	25-14	30	$3,250,000	$520,000	EPS037	30	$3,250,000	$406,300	CCF67	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$3,250,000	$162,500
9	CC	1006453560	SANTAMARIA NIETO ANDRES MAURICIO	230301	30	$7,100,000	$1,207,000	EPS005	30	$7,100,000	$887,500	CCF67	30	$7,100,000	$284,000	14-11	30	$7,100,000	$494,200	30	$7,100,000	$355,000
Total	**Afiliados(9)**					$37,750,000	$6,111,000			$37,750,000	$4,719,200			$37,750,000	$1,510,000			$37,750,000	$2,627,500		$37,750,000	$1,887,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$6,111,000	$0	$6,142,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,148,000	$0	$1,153,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,963,000	$0	$4,988,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,627,500	$0	$2,641,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,627,500	$0	$2,641,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,510,000	$0	$1,517,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,510,000	$0	$1,517,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,719,200	$0	$4,743,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$1,225,100	$0	$1,231,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,303,300	$0	$1,310,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$490,700	$0	$493,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,700,100	$0	$1,708,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,132,600	$0	$1,138,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$1,132,600	$0	$1,138,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$755,000	$0	$758,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$755,000	$0	$758,900
TOTAL				9	$16,855,300	$0	$16,942,200

INTER TRANSESCOLAR
2025

6. INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

Arauca, junio 10 de 2026

Referencia: Informe de inspecciones del mes de mayo de 2026 del contrato N°555 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y seguimiento contractual asignadas a la interventoría externa del Contrato No. 554 cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, durante el mes de mayo de 2026 se desarrollaron actividades de seguimiento a hallazgos previamente identificados en el municipio de Arauquita, así como inspecciones técnicas orientadas a la validación de vehículos postulados para ingreso a operación del servicio de transporte escolar.

Las actividades desarrolladas estuvieron encaminadas a verificar condiciones técnicas, mecánicas, operativas y documentales de los vehículos presentados, garantizando el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas para la prestación del servicio.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a hallazgos identificados en inspecciones anteriores efectuadas en el municipio de Arauquita.

Adicionalmente, en el centro poblado de Aguachica, jurisdicción del municipio de Arauquita, se llevaron a cabo inspecciones técnicas a dos vehículos presentados para ingreso a operación del servicio de transporte escolar, con el fin de emitir concepto técnico previo por parte de la interventoría.

Uno de los vehículos inspeccionados correspondía al municipio de Arauquita y el segundo vehículo provenía del municipio de Fortul, el cual se desplazó hasta el lugar para surtir el proceso de validación técnica y documental requerido para su posible vinculación a la operación.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Las actividades desarrolladas fueron soportadas mediante formatos de inspección y registro fotográfico correspondiente.

3. VEHÍCULOS INSPECCIONADOS PARA INGRESO A OPERACIÓN

N°	MUNICIPIO	PLACA	MODELO	TIPO DE VEHÍCULO	CONDUCTOR	LICENCIA	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	OBSERVACIÓN
1	Arauquita	LLU-847	2023	Microbús	Jhonced Mendoza Lasso	C1	Inspección de ingreso	No cuenta con franjas ni frase escolar trasera	Vehículo presentado para validación técnica y documental; se evidencia documentación al día
2	Fortul	XGD-152	2007	Bus	Juan Carlos López Villamizar	C2	Inspección de ingreso	Luz trasera derecha en mal estado	Vehículo presentado para validación técnica y documental; se evidencia documentación al día

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante el mes de mayo permitieron fortalecer el seguimiento técnico sobre el parque automotor vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar, especialmente frente al control de ingreso de nuevos vehículos a operación y al seguimiento de los hallazgos identificados en jornadas de inspección anteriores.

Las inspecciones realizadas permitieron verificar condiciones generales de funcionamiento, seguridad y documentación de los vehículos presentados para ingreso a operación, así como identificar hallazgos menores que deberán ser subsanados para garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio.

Respecto al seguimiento de los hallazgos identificados durante las inspecciones realizadas en el municipio de Arauquita los días 14, 16 y 17 de abril de 2026, se evidenció que a la fecha de elaboración del presente informe no han sido remitidas a esta interventoría la totalidad de las evidencias de subsanación requeridas. Si bien fueron recibidos algunos soportes relacionados con hallazgos de carácter mecánico y de seguridad, la información aportada corresponde únicamente a una parte de las observaciones formuladas, por lo que no es posible verificar el cierre total de los hallazgos identificados durante las jornadas de inspección.

INTER TRANSESCOLAR
2025

En consecuencia, esta interventoría emitió requerimiento formal a la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, solicitando la remisión inmediata del cien por ciento (100%) de las evidencias de subsanación pendientes, toda vez que dichas correcciones debieron ser ejecutadas durante el mes de mayo y reportadas integralmente a esta interventoría dentro de los primeros cuatro (04) días del mes de junio de 2026. El mencionado requerimiento se anexa al presente informe como soporte de las actuaciones de seguimiento adelantadas.

Los soportes correspondientes a las actividades realizadas reposan en formatos de inspección, evidencia fotográfica y demás documentos generados durante las jornadas adelantadas por la interventoría.

El presente informe se expide en cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría externa y para los fines contractuales y administrativos correspondientes.

Atentamente,

RICARDO ANDRES CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

Deicy Briyith Castillo Eregua.
Elaborado por **Deicy Briyith Castillo Eregua**
Coordinador de Área

ANEXOS

1. Formatos de inspección.
2. Tabla parque automotor inspeccionado abril subsanado.
3. Evidencia subsanaciones.
4. Oficio de requerimiento de subsanaciones.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. FORMATOS DE INSPECCIÓN

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ___	Microbus X	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Alvaquiry	Fecha: 10/03/2026
Placa: JJU-847	Modelo: 2023		Marca: Renault		# tarjeta propiedad: 10026785597		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhoced Mendoza 24550						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	06/08/26	Numero licencia de conducción: 1116499902	Poliza contractual:	4/12/2026
SOAT:	✓	05/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 10/11/2026	Poliza extracontractual:	4/12/2026
Tarjeta de Operación:	✓	31/10/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,		X		izquierda no sirve altas y bajas
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido.	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)		✓		
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		✓		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES: Avisto posibles de luces el mismo dia de inspección

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Jhoced Mendoza L.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.116 499.902

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus X	Camioneta __	Otro __	Municipio: Bucaramanga
Placa: JJV-847	Modelo: 2023	Marca: Renault	# tarjeta propiedad: 10026785597			Fecha: 19/05/2026
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhonced Mendoza Lasso					# Ruta: 26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	6/08/26	Numero licencia de conducción: 1116499902	Poliza contractual:	4/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C1 10/11/2026	Poliza extracontractual:	4/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	31/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION		FECHA VECIMIENTO
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/27
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		09/27
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		01/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		07/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006455830

Jhonced Mendoza L.
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116499902

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Fonseca	Fecha: 09/05/2026
Placa: XGD-152	Modelo: 2007		Marca: DODGE	# tarjeta propiedad: 10038027373			# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Lopez Villamizar						Ultimo cambio aceite: 10/05/2026

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/09/26	Numero licencia de conducción: 1006456515	Poliza contractual:	06/04/2027
SOAT:	✓	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/10/2021	Poliza extracontractual:	06/04/2027
Tarjeta de Operación:	✓	27/10/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGU	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS ,	✓	✓		Jules Maseta ~~Izquierda~~ mal estado derecha
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C2668+C4+C199, 2 Destornilladores de pala y estria ,1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas minimo 4 llaves	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido,	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			X	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Juan Carlos Romero
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1006456515

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Foloi	Fecha: 19/05/2026
Placa: X6D-152	Modelo: 2007		Marca: Agrale		# tarjeta propiedad: 10038027373		# Ruta: Foloi
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Forero Villamizar						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/09/26	Numero licencia de conducción: 1006956515	Poliza contractual:	06/04/2022
Vigencia del SOAT:	V	14/10/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/10/2024	Poliza extracontractual:	06/04/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	27/10/22	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/26
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		03/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/22
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos, exteriores limpios en orden y aseo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oiso Padilla
CEDULA: 1006.455.886

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 1006[illegible]515
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR
2025

2. TABLA PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO ABRIL SUBSANADO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		BOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUQUITA																						
UVM-297	2014	MICROBUS	ERIBERTO OBREGON ARGUELLO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SZU-149	2012	MICROBUS	DANIEL ANDRES CARRASCAL PANQUEVA	C1	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con botiquin, ni franjas ni frase escolar	Subsano ausencia de botiquin y agrego grenjas escolares traseras
WEQ-689	2014	MICROBUS	OLINTO MANTILLA RIVERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
TTQ-494	2014	MICROBUS	LUIS GUILLERMO GIRALDO PINZON	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	Agrego franja y frase escolar.
XMB-491	2007	MICROBUS	DAVID LEONARDO CASTELLANOS	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de barra de dirección corta en mal estado y no cuenta con frase escolar	Cambio terminales de dirección, evidencia en video
UVL-200	2011	BUSETA	OVIDIO ESCALANTE RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Llanta delantera derecha en mal estado (cambio)	Cambio llantas delanteras, evidencia en video.
SKY-261	2010	BUSETA	NAIN GALVAN APARICIO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SMK-621	2006	MICROBUS	JOSE PALMIRO CRUZ DIAZ	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TFQ-367	2012	MICROBUS	HERVIN VALBUENA GARCIA	C2	X		X			X		X			X		X			X	Luz derecha no funciona, no cuenta con frase ni franja escolar, se requiere alineación	Arreglo problemas de luces, evidencia en video
SWV-410	2013	MICROBUS	GERMAN SARMIENTO CARDOZO	C1	X		X		X			X			X		X			X	Bateria sin asegurar y no cuenta con frase escolar	Agrego franja y frase escolar. Aseguro bateria
NOY-148	2024	CAMIONETA	DIEGO ALFONSO AGUILAR BELEÑO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
SYU-676	2006	MICROBUS	JOSE RAMON RODRIGUEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de barra de dirección en mal estado	Cambio terminales de dirección y saco tecno mecánica.
SKL-578	2005	BUS	NELSON RAUL MARTINEZ BUITRAGO	C2	X		X		X			X			X		X		X			
XVO-808	2006	BUSETA	JHONCED MENDOZA LASSO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	
WLM-823	2015	MICROBUS	LUIS HERMES VILLALBA GUALDRON	C2	X		X		X			X			X		X		X			
SPP-825	2007	MICROBUS	HERMES HERREÑO MOSQUERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisión de bujes de tijera y buje de cajetin (lado derecho)	
TBK-670	2004	BUS	NOE GARZON SALDAÑA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Terminal de dirección en mal estado y no cuenta con frase escolar	Saco tecno mecánica y así subsano terminales de dirección, evidencia en video.
SMK-860	2007	MICROBUS	ARIEL MERCADO ALMAS	C2	X		X		X			X				X	X			X	Luz y pito de reversa en mal estado, ajustar terminales de direccion, No cuenta con rollo de micropore	Subsano ausencia de rollo de Micropore y arreglo problema de pito y luz de reversa, evidencia en video.
JQV-933	2026	BUSETA	NUMAEL ALEXIS BLANCO GONZALES	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con frase escolar	
XMC-616	2006	MICROBUS	LUIS MARIA HERRERA PALACIO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisar gomas del cajetin de dirección	Cambio gomas de cajetin de dirección. Evidencia en video
VCV-750	2012	BUSETA	OTONIEL SANTAMARIA GALEANO	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta en el botiquin con frasco de rehidratante oral, pares de guantes desechables, esparadrapo en tela, micropore, opesillo oculares, papel higienico, Inmovilizador de cabrestillo y de cuello. Terminales de dirección en mal estado junto con guaye de apagado de motor y revisar fuga hidráulica	Vehiculo salio de circulacion
XVN-407	2004	MICROBUS	WILSON ANDRES GALEANO ORTEGA	C1	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta rollo de micropore ni con chaleco reflectivo, no tiene franjas ni frase escolar, cambiar paleta pare	Subsano la ausencia de Micropore y chaleco reflectivo, cambio paleta de pare, evidencia en video y agrego franja y frase escolar
THR-212	2011	BUS	OSCAR DANILO HERNANDEZ NEIRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
USD-208	2007	BUS	WILLIAN ALEXIS LEAL MEDINA	C2	X		X		X			X				X	X			X	Luz media del lado derecho no funciona, no cuenta con frase escolar, panoramico con fisura y ajustar terminales de direccion. No cuenta en lo botiquin con rollo esparadrapo en tela	Subsano ausencia de esparadrapo en tela.
KYT-692	2023	MICROBUS	LEONARDO MANUEL URRUTIA GONZALE	C2	X		X		X			X				X	X		X		No cuenta con rehidratante oral, toallas higienicas, papel higienico e inmovilizador de cabestrillo	Subsano elementos de botiquin faltantes.
TFU-830	2012	BUS	MANUEL MARCOLINO MENA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bomper delantero en mal estado y no cuenta con frase escolar	
XVB-167	2006	BUS	FELIPE CEPEDA BOSA	C3	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado llanta delantera derecha y tuerca de espárrago trasero izq. floja	
SKM-141	2005	MICROBUS	GABRIEL ANGEL LOPEZ CORCOBADO	C1	X		X		X			X			X		X		X			
XJB-323	2009	BUS	LUIS EDUARDO VERGARA GONZALES	C2	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado luz alta del lado derecho	Cambio luz alta de lado derechos, evidencia factura.

Falta por Subsanar

Calle 18 N° 30b - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3189495360

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES															
N°	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		CERTIFICADO PROPIEDAD DE MOTORES		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Arauquita															
1	LA BARCINA	X		X		X		X		X		X			
2	LA INDIA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con nombre en la embarcación	
3	LA COLEGIADA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con pito al igual que linterna y tiene fisura en la parte baja de la embarcación	
4	LA UNICA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito al igual que linterna y falta en el botiquin rehidratente oral, toallas higienicas, paquete de algodón, esparadrapo en tela, opositos oculares, papel higienico y tijeras	Subsano ausencia de elementos del botiquín.
5	LA CAMPANA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito, falta en el botiquin suero fisiologico, gasa precortada, toallas higienicas y baja lenguas	Subsano ausencia de elementos del botiquín.
6	LA CHIQUI	X		X		X		X		X		X			
7	LA CHIKI	X		X		X		X		X		X			
8	LA PIRINOLA	X		X		X		X		X		X			
9	LA PECOSA	X		X		X		X		X		X			
10	LA VALENTINA	X		X		X		X		X		X			
11	LA PUPULAR	X		X		X		X		X		X		No cuenta con sujetador el extintor	Cambio de sujetador
12	LA SHAKIRA	X		X		X		X		X		X			
13	LA TOYOTA	X		X		X		X		X		X			
14	LA ESPERANZA	X		X		X		X		X		X			
15	LA NIÑA ELIZABEHT	X		X		X		X		X		X		No cuenta con helice de repuesto, juego de llaves 10 mm y 12 mm junto con las 2 bujias de repuesto, Casco de canoa requiere enfibrado y pera de combustible en mal estado	
16	LA MAYE	X		X		X		X			X	X		falta pito, no tiene helice y las 2 bujias de repuesto, falta en el botiquin venda elasticas 2x5 y 3x5. Capota de motor en mal estado (reparar)	Subsano ausencia de vendas elasticas

Falta por Subsanar

Cle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. EVIDENCIA SUBSANACIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

ARAUQUITA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SZU-149







- ✓ Subsano ausencia de botiquín y agrego franjas escolares traseras.

TTQ-494





- ✓ Agregó franja y frase escolar

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XMB-491



✓ Cambio terminales de dirección, evidencia en video

UVL-200



✓ Cambio llantas delanteras, evidencia en video.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TFQ-367



✓ Arreglo problemas de luces, evidencia en video

SWV-410





✓ Agrego franja y frase escolar, aseguro batería.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

SYU-876



✓ Cambio terminales de dirección y saco tecno mecánica.

TBK-670



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10961147

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EL ARAUCO "CDA EL ARAUCO"		
NIT:	900223897	No. de Certificado de Acreditación:	11-OIU-017-001
Fecha de expedición:	2026/05/30	Fecha de vencimiento:	2027/05/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TBK670	CLASE:	BUS
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2004
SERVICIO:	Publico	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	7540	NRO. MOTOR:	996209
NRO. CHASIS:	9GCNPR71P4B457405	VIN:	
LÍNEA:	NPR		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE Y TURISMO RUEDA POR EL MUNDO SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE
JUAN MANUEL PINILLA CORREDOR

✓ Saco tecno mecánica y así subsano terminales de dirección, evidencia en video.


SMK-860





- ✓ Subsano ausencia de rollo de Micropore y arreglo problema de pito y luz de reversa, evidencia en video.

XMC-616

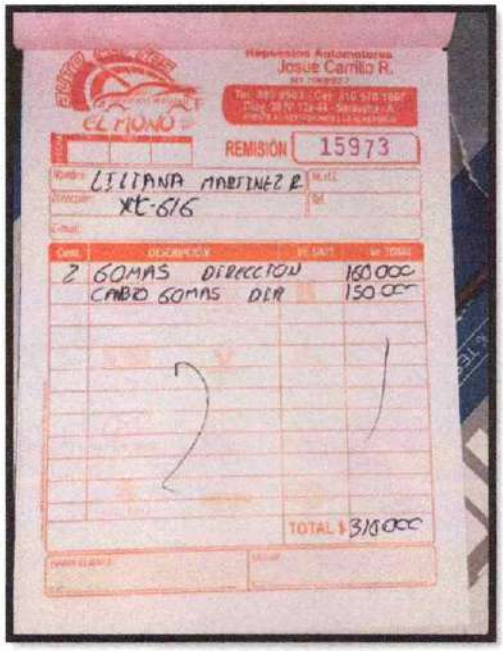

- ✓ Cambio gomas de cajetín de dirección. Evidencia en video

INTER TRANSESCOLAR
2025


XNV-407





- ✓ Subsano la ausencia de Micropore y chaleco reflectivo, evidencia en video y agrego franja y frase escolar.


USD-208



- ✓ Subsano ausencia de esparadrapo en tela.

INTER TRANSESCOLAR
2025

XJB-323

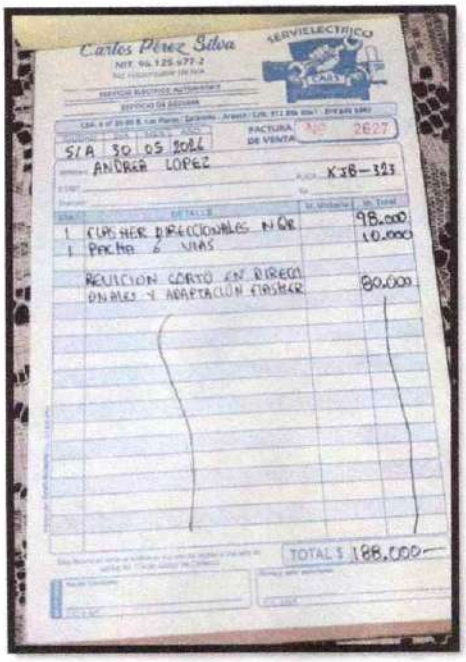

✓ Cambio luz alta de lado derechos, evidencia factura.

KYT-962





✓ Subsano elementos de botiquín faltantes.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025


LA UNICA





✓ Subsano ausencia de elementos del botiquín.

LA CAMPANA







✓ Subsano ausencia de elementos del botiquín.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

LA POPULAR



✓ Cambio de sujetador.

LA MAYE





✓ Subsano la ausencia de vendas elásticas 2x5 y 3x5.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

Gmail

RICARDO ANDRES CONDE <inter.transescolar2025@gmail.com>

Requerimiento de subsanaciones Municipio de Arauquita

1 message

RICARDO ANDRES CONDE <inter.transescolar2025@gmail.com> Thu, Jun 4, 2026 at 3:22 PM
To: utescolar2026@gmail.com

Arauca, junio 04 de 2026

Señor
EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
RL. UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026
TITULAR DEL CONTRATO 554 DE 2025
ARAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE EVIDENCIAS DE SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN INSPECCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.
REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°554 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Cordial saludo,

En desarrollo de las funciones de vigilancia, control y seguimiento en calidad de Interventoría Externa del Contrato No. 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nos permitimos requerir formalmente a la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026** la remisión inmediata de las evidencias correspondientes a la subsanación de los hallazgos identificados durante las inspecciones efectuadas por esta interventoría en el municipio de Arauquita los días **14, 16** y **17** de abril de 2026.

Como es de su conocimiento, durante las jornadas de inspección realizadas se identificaron diversos hallazgos relacionados con condiciones mecánicas, operativas y de seguridad de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de transporte escolar, los cuales fueron comunicados oportunamente al contratista, conductores y personal operativo correspondiente, con el propósito de que se implementaran las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la adecuada prestación del servicio.
En este sentido, la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026** dispuso del tiempo restante del mes de abril y de la totalidad del mes de mayo de 2026 para adelantar las acciones correctivas requeridas y gestionar la subsanación de los hallazgos identificados. Así mismo, las evidencias correspondientes debieron ser remitidas a esta interventoría en un cien por ciento (100%) dentro de los primeros cuatro (04) días del mes de junio de 2026, con el fin de permitir su revisión, validación y consolidación para la presentación oportuna de los informes de seguimiento ante la Gobernación de Arauca.

No obstante, a la fecha del presente oficio, esta interventoría no ha recibido la totalidad de las evidencias requeridas para verificar el cierre efectivo de los hallazgos identificados. Si bien se recibieron soportes relacionados con la subsanación de algunos elementos correspondientes a

botiquines, dichas evidencias representan aproximadamente un diez por ciento (10%) del total de los hallazgos reportados durante las inspecciones realizadas, razón por la cual no es posible considerar subsanadas las observaciones formuladas por esta interventoría.

Es importante precisar que las subsanaciones deben ser remitidas de manera integral y completa, incluyendo la totalidad de los hallazgos de carácter mecánico, operativo y de seguridad identificados durante las jornadas de inspección. La entrega parcial de evidencias no permite realizar una verificación adecuada de las acciones correctivas implementadas ni acreditar el cumplimiento efectivo de las observaciones efectuadas.

Por lo anterior, se **REQUIERE DE MANERA INMEDIATA** a la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026** para que remita la totalidad de los soportes documentales, registros fotográficos y demás evidencias que acrediten la subsanación completa de los hallazgos identificados durante las inspecciones realizadas en el Municipio de Arauquita, toda vez que esta interventoría debe consolidar, validar y presentar dicha información ante la Gobernación de Arauca como parte de las actividades de seguimiento, control y reporte contractual.

Se deja constancia de que el presente requerimiento forma parte de las actuaciones de seguimiento adelantadas por esta interventoría y constituye evidencia documental de la gestión realizada para solicitar la entrega de las subsanaciones pendientes correspondientes a las inspecciones efectuadas durante el mes de abril de 2026.

De manera que, atendiendo los lineamientos operativos del proceso contractual y el marco técnico y jurídico que regula el transporte escolar, se verificará exhaustivamente por parte de la Interventoría contratada el parque automotor ofertado **(anexo al presente documento)** integrado por buses=102; busetas=124; microbuses=51; camionetas=24; embarcación fluvial=34 plenamente identificados, de acuerdo con los requisitos mencionadas previamente y las obligaciones indicadas a continuación:

1. Los conductores de los vehículos deben tener vigentes las licencias de conducción categoría C1 y C2, según la clase de vehículo.
2. Los motoristas deben presentar documento que acredite que el tripulante es apto e idóneo para su desempeño a bordo de una embarcación, el cual es expedido por la Autoridad Marítima Nacional: documento público que lo autoriza para ejercer una actividad dentro de la tripulación en las embarcaciones menores.
3. Dotar al personal operativo (conductores y adultos acompañantes o monitores), con los elementos que los identifiquen de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Contar con sistema de GPS, e implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados al servicio de transporte escolar, en concordancia con lo que establece en el Decreto 348 de 2015.
5. Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los conductores de los vehículos y el establecimiento educativo.
6. Contar con personal idóneo capacitado en tema de manejo defensivo y seguridad vial, sistemas operativos (GPS) y manejo de menores.
7. Cumplir con las disposiciones normativas referentes a los límites de velocidad (Ley 1239 de 2008), dispositivos de seguridad en el vehículo, transporte fluvial, establecidos por el Ministerio de Transporte Nacional (Decreto 348 de 2015, Decreto 1079 de 2015, Decreto 431 de 2017 y Decreto 478 de 2021)
8. Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, los vehículos utilizados para el servicio de transporte escolar deberán tener pintada en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas de diez (10) centímetros de ancho en colores amarillos pantone 109 y negro, con inclinación de 45 grados y una altura mínima de sesenta (60) centímetros; así mismo en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en caracteres destacados, de una altura mínima de diez

(10) centímetros, deberá llevar la leyenda "ESCOLAR", la leyenda delantera deberá estar invertida para poder ser leída a través del retrovisor.

9. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual de Seguridad y Sanidad Fluvial elaborado por el Ministerio de Transporte (Resolución 667 del 13 abril de 1999), las embarcaciones fluviales deben llevar obligatoriamente el siguiente equipo: Un chaleco salvávidas por puesto apropiadamente y sujeto durante el recorrido (no se permiten de inflar o de corcho), una vara de mínimo tres (3) metros de largo para empujar la embarcación menor, una cuerda de mínimo quince (15) metros de largo, una bandera roja de 40 X 60 centímetros para ser utilizada cuando se requiera auxilio, un recipiente con agua potable, herramienta de emergencia y ancla adecuada para la embarcación.

10. El transporte fluvial de pasajeros se realizará en embarcaciones que cumplan con las especificaciones que el Ministerio de Transporte determine; así mismo debe contar con las pólizas de seguridad de responsabilizad civil contractual y extracontractual que ampare los riesgos en que incurra la empresa derivada de la prestación del servicio.

11. Antes y durante el recorrido, los pasajeros y tripulación de las embarcaciones menores deben llevar puesto y sujeto el salvavidas tipo chaleco, el cual deberá ser entregado por el motorista durante el embarque.

12. Está prohibido abastecer combustible a la embarcación menor y a los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar con los pasajeros a bordo.

13. En las embarcaciones menores que presten el servicio de transporte escolar no podrán ser transportados productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general peligrosos para la salud, integridad física y seguridad de los estudiantes; así mismo no se puede por ningún motivo transportar pasajeros que no se encuentren como beneficiarios del servicio de transporte escolar, particulares1 maletas, cajas y/o cualquier otro elemento en los vehículos que pongan en riesgo la integridad física de los estudiantes.

14. Realizar un plan de capacitación continuada al personal directo responsable del transporte de los estudiantes, con personal idóneo en el área de atención al cliente, primeros auxilios, manejo de situaciones de riesgo en emergencia y desastres naturales o antrópicos, respeto por normas de tránsito y llevar un registro de la temática especifica, responsable de la capacitación, cronograma, formato de control y seguimiento a la capacitación de su personal.

15. Dotar al personal responsable directo del transporte de los estudiantes (conductor) de medios o elementos tecnológicos de comunicación para el reporte inmediato de eventualidades o situaciones no previstas en el transcurso de la prestación del servicio a sus jefes directos y a las directivas de los establecimientos educativos.

16. Implementar sistemas encaminados al mejoramiento continuo y gestión de la calidad en el proceso de atención al beneficiario del servicio de transporte escolar,

17. Los vehículos deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Educación Nacional (revisión técnico-mecánica y de gases, y el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo).

18. En caso de daño o pérdida de algún vehículo, el contratista deberá garantizar la reposición o renovación con un vehículo de igual o mejores características, debiendo cumplir con las rutas, horarios y frecuencias establecidas por los establecimientos educativos.

19. Cumplir con lo establecido en el Parágrafo 2º del artículo 28 de la Ley 769 de 2002, desarrollado por la Resolución 572 de 2013 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes, mediante el cual se establece las características técnicas de los adhesivos que deben portar los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor.

20. Portar en cada uno de los vehículos dispuestos para la prestación del servicio de transporte escolar los documentos legales reglamentarios y tenerlos vigentes1 dentro de ellos licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguros obligatorios, licencia de conducción, copia de revisión técnico-mecánica, certificación de gases, copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que amparen la prestación del servicio; cada vehículo deberá poseer los amparos de riesgos a los pasajeros conforme a lo estipulado en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Decreto 1079 de 2015 y Decreto 431 de 2017.

96

21. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías solicitadas teniendo en cuenta el plazo de ejecución, valor, y/o suspensiones si hubiere lugar a ello (Vigente hasta el plazo de ejecución del contrato)
22. Con el fin de garantizar la protección de los estudiantes durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte escolar, los vehículos destinados a este servicio deberán llevar un adulto acompañante o monitor, quien deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios (formación acreditada); el adulto acompañante o monitor se encargará del cuidado de los estudiantes durante el recorrido, el ascenso y el descenso del vehículo.
23. Los datos de los estudiantes beneficiarios del servicio de transporte escolar deberán ser entregados previamente por los rectores y directores de los respectivos establecimientos educativos.
24. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte.
25. Los vehículos que transporten estudiantes con discapacidad, deben contar con asientos y cinturones de seguridad adecuados, que garanticen el transporte seguro, de igual forma deben contar con espacio en los sectores adyacentes a las puertas de ingreso y deberán prever un lugar para el acceso y transporte de sillas de ruedas, muletas u otros equipos que faciliten la movilidad de los pasajeros y adultos acompañantes; igualmente los adultos acompañantes o monitores de estos vehículos deberán contar con la cualificación adecuada para la atención a esta población.
26. La parada final del recorrido debe realizarse al interior del establecimiento educativo, si no es posible se fijará un lugar seguro, y el estudiante siempre debe estar guiado por el adulto acompañante o monitor. Una vez finalizado el servicio, el adulto acompañante o monitor debe verificar que al interior del vehículo no quede ningún estudiante.
27. Para presentación de las cuentas de cobro por parte del contratista deberá entregar informes de ejecución con visto bueno de la interventoría, quien verificará las certificaciones originales emitidas por parte de los rectores y/o directores de los establecimientos educativos beneficiarios.
28. Así como las demás que trata el Decreto 1079 de 2015 (Capitulo 6 - Sección 1 O, Capítulo 2 - Sección 2 - Subsección 1, Capitulo 2 - Secciones 4 y 5), Decreto 341 de 2017 (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 39, 41), Decreto 3112 de 1997 del Ministerio de Transporte, Decreto 478 de 2021 y demás normas que lo complementen o deroguen.
29. Licencia de tránsito del automotor.
30. Identificación de los vehículos utilizados para el transporte de estudiantes.
31. En ningún caso se admitirán estudiantes de pie. Cada escolar ocupará un (1) puesto de acuerdo con la capacidad vehicular establecida en la ficha de homologación del vehículo y de la licencia de tránsito.
32. Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda Escolar. La leyenda delantera deberá estar invertida para poder ser leída a través de un retrovisor.
33. Poseer dos puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares.
34. Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tendrán un dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas.
35. Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y dos colores rojos y un color ámbar central en la parte superior trasera, las que accionarán en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas.
36. Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del cinturón de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse y amortiguar el frenado del vehículo.
37. Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura será, como máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas colombianas.

B7

38. Contar con elementos sonoros.
39. Y demás que estipule la norma.

Finalmente, esta interventoría reitera la importancia de dar cumplimiento oportuno a los requerimientos efectuados, toda vez que el cierre efectivo de los hallazgos constituye un elemento fundamental para garantizar las condiciones técnicas, mecánicas y de seguridad exigidas para la correcta prestación del servicio de transporte escolar y para dar cumplimiento a las obligaciones de reporte establecidas ante la entidad contratante.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la remisión inmediata de la información requerida.

RICARDO ANDRES CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER TRANS-ESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

---

40. REQUERIMIENTO DE EVIDENCIAS DE SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN INSPECCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026..pdf
183K
