INTER TRANSESCOLAR
2025

INFORME DE GESTIÓN MES DE JULIO DE 2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°555 DE 2025

PERIODO:
DESDE 06/07/2026 HASTA 31/07/2026

CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL. 4
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 4
3. GARANTÍAS 5
4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 8
4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL. 8
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8
6. SUPERVISIÓN. 9
7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 9
8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 10
9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025. 10
10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 11
11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 11
12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025. 11
13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025 12
14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 12
15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 12
16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 13
17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 13
17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 14
18. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025 14
19. RAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 24
20. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025. 24
21. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024. 25
22. COMPONENTES CONTRACTUALES. 26
23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 27

INTER TRANSESCOLAR
2025

INTRODUCCIÓN

El **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** suscribió contrato de Interventoria N° 555 de 2025 con **INTER TRANSESCOLAR 2025**, representado legalmente por **RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, nombrando como supervisor del contrato a la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,** acta de inicio de fecha 14/10/2025, y con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES.

El presente informe relaciona el desarrollo y ejecución del contrato de Interventoría N° 555 de 2025 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, en el periodo comprendido del 06 al 31 de julio del año 2026. A continuación, se describe en forma clara y detallada criterios técnicos generales relacionados con las actividades ejecutadas y los controles realizados por la interventoría.

1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato 554 de 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✓ Hacer seguimiento técnico mediante la aplicación de indicadores sobre la forma de cómo se ejecute el contrato.
- ✓ Medir oportunamente la ejecución de las
- ✓ rutas que prestan el servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca.
- ✓ Tomar correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.
- ✓ Tomar decisiones relativas a la relación contractual.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025	
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025 RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
NIT	901.994.807-1
DIRECCIÓN	CALLE 18 No 30B -27 BARRIO CIUDAD JARDIN
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO	555 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN N° 4557 DEL 30/09/2025

INTER TRANSESCOLAR
2025

FECHA DE FIRMA CONTRATO 555 DE 2024	03/10/2025
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13/08/2026
SEPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

3. GARANTÍAS

POLIZAS LEGALIZACIÓN.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas Legalización N°. 49-44-101037390 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 03/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 03/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 05/10/2025, Aprobada el 06/10/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 0
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025 hasta 03/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de inicio N°. 49-44-101037390 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INTER TRANSESCOLAR
2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 2
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 14/02/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 14/08/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012016 del 14/10/2025, Aprobada el 06/11/2025			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 2
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 14/08/2026	$284.700.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N°1.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2029	$170.617.500.00	ANEXO: 3,4,5 y 6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 02/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 02/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 10/02/2026, Aprobada el 13/02/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	ANEXO: 3 y 4
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 02/10/2026	$284.700.000.00	

INTER TRANSESCOLAR
2025

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 2.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°1 N°. 49-44-101037390 del, Aprobada el 11/05/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO 8
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 09/10/2027	$113.745.000.00	
Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del, Aprobada el 11/05/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 6
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 09/10/2026	$350.181.000.00	

POLIZAS SEGÚN ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIO N° 3.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°3 N°. 49-44-101037390 del 06/07/2026, Aprobada el 16/07/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 29/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 9
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 09/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 09/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 29/10/2027	$113.745.000.00	

INTER TRANSESCOLAR
SAS

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025			
Pólizas según acta de suspensión y reinicio N°3 N°. 49-44-101037390 del 06/07/2026, Aprobada el 16/07/2026			
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**COMPAÑÍA**
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 29/04/2027	$227.490.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 29/10/2029	$170.617.500.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 29/04/2027	$341.235.000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 29/10/2027	$113.745.000.00	

Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101012018 del 06/07/2026, Aprobada el 16/07/2026			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 hasta 29/10/2026	$350.181.000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A. ANEXO: 7
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 hasta 29/10/2026	$350.181.000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 hasta 29/10/2026	$350.181.000.00	

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SPGR No.19325	$ 1.137.450.000,00

4.1 REGISTRO PRESUPUESTAL.

RP CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08-10-2025	SGR202526-00248	$1.137.450.000,00

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El servicio de Transporte escolar se presta a las instituciones educativas ubicadas en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca.



Municipios del departamento de Arauca

6. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato de interventoría N° 555 de 2025, está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental.

7. COMPONENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

	CONCEPTO	CANT	N° DE MESES	PARTICIPACION (H-MES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**					
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1.1.1	DIRECTOR	1,00	10,00	100%	$7.100.000,00	$71.000.000,00
1.1.2	COORDINADOR DE AREA - PROFESIONAL PARA LOS MUNICIPIOS	1,00	10,00	100%	$6.550.000,00	$65.500.000,00
1.1.3	PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.1.4	PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	1,00	10,00	50%	$7.850.000,00	$39.250.000,00
1.2	**PROFESIONAL TÉCNICO**					
1.2.1	TECNICOS DE APOYO OPERATIVO	4,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$130.000.000,00
1.2.2	TECNICO EN SEGURIDAD	1,00	10,00	100%	$3.250.000,00	$32.500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**$377.500.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**	**$755.000.000,00**
	IVA (19%)					**$143.450.000,00**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$898.450.000,00**
2	OTROS COSTOS					
2.1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA	2,00	9,00		$9.250.000,00	$166.500.000,00
2.2	ALQUILER DE OFICINA DOTADA CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	10,00		$7.250.000,00	$72.500.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS					**$239.000.000,00**
	TOTAL, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA					**$1.137.450.000,00**

INTER TRANSESCOLAR
2025

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

CARGO	PROFESIONAL	NUMERO CC	INGRESO	RETIRO
DIRECTOR DEL PROYECTO	ANDRES MAURICIO SANTAMARIA NIETO	1.006.453.560	14/10/2025	ACTIVO
CORDINADOR DE AREA	DEICY BRIYITH CASTILLO EREGUA	1.116.807.487	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO	CAMILO NIÑO FONSECA	1.116.775.561	14/10/2025	ACTIVO
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	CARMEN ROSA MIRANDA VALENCIA	68.294.629	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO EN SEGURIDAD	DIEGO ALEJANDRO PADILLA VARGAS	1.006.455.838	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 1	YEISON EDUARDO PICO SANABRIA	1.116.803.165	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 2	JOHNATAN SMIT LINARES DIAZ	17.596.813	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 3	ARDUL HURTADO ANGARITA	1.007.272.066	14/10/2025	ACTIVO
TECNICO 4	JEYSON ALEJANDRO BECERRA	1.006.453.986	14/10/2025	ACTIVO

9. RELACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DEL 2025.

EMPRESA	AÑO	MES	No. PLANILLA
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	OCTUBRE	9493295632
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2025	NOVIEMBRE	9496467101
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ENERO	9499556815
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	FEBRERO	9501261336
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MARZO	9502936354
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	ABRIL	9504613600
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	MAYO	9506154831
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	JUNIO	9506991620
CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025	2026	JULIO	9509399032

INTER TRANSESCOLAR
2025

10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

Se firmó el plan de inversión de anticipo del contrato de interventoría N°555 de 2025, por un valor de **340.850.000,00** con fecha del dieciséis (16) de octubre de 2025, donde intervinieron Ariel Pedraza Pinzón, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, en calidad de supervisor y RICARDO ANDRES CONDE BÉNITEZ, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
VALOR DEL CONTRATO	**$1.137.450.000,00**
VALOR GIRADO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO (29.97%)	**$340.850.000,00**
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	**$321.106.341,38**

11. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

El acta de inicio se suscribió con fecha de catorce (14) de octubre de 2025, teniendo en cuenta lo anterior, a corte del presente informe, se ha ejecutado en físico y financiero la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	DÍAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO
EJECUTADO OCTUBRE 2025	17 DÍAS	$ 65.503.833,33
EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	29 DIAS	$111.741.833,33
EJECUTADO ENERO 2026	16 DIAS	$ 61.650.666,67
EJECUTADO FEBRERO 2026	28 DÍAS	$107.888.666,67
EJECUTADO MARZO 2026	29 DIAS	$111.741.833,33
EJECUTADO ABRIL 2026	25 DÍAS	$ 96.329.166,67
EJECUTADO MAYO 2026	31 DÍAS	$119.448.166,67
EJECUTADO JUNIO 2026	15 DÍAS	$ 57.797.500,00
EJECUTADO JULIO 2026	26 DÍAS	$100.182.333,00
TOTAL %	**216 DÍAS**	**73,17 %**

832.283.999,67

12. DOCUMENTOS GENERADOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025.

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta De Inicio	14/10/2025	Inicio de actividades
2	Acta de suspensión N° 1	29/11/2025	Suspensión contrato
3	Acta de reinicio N° 1	16/01/2026	Reinicio de Actividades
4	Acta de suspensión N° 2	30/03/2026	Suspensión contrato
5	Acta de reinicio N° 2	06/04/2026	Reinicio de Actividades

INTER TRANSESCOLAR 2025

6	Acta de suspensión N° 3	16/06/2026	Suspensión contrato
7	Acta de reinicio N° 3	06/07/2026	Reinicio de Actividades

13. CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

En este cuadro se refleja los días calendario los cuales se programa la ejecución del contrato de interventoría externa vs lo ejecutado por el mismo.

Anexo N° 01 – GRAFICO DE CRONOGRAMA.

14. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 R/L: EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ
NIT	901.994.800-9
DIRECCION	CALLE 22 N° 19-66 PISO N° 2 OFICINA 203
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	554 – 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCIÓN N° 4573 DEL 01/10/2025
FECHA DE FIRMA CONTRATO PRINCIPAL	03/10/2025
ACTA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
CONTRATISTA INTERVENTORIA EXTERNA	CONSORCIO INTER -TRANSESCOLAR 2025 R/L: RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

15. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 03/10/2025 APROBADA EL 10/10/2025

INTER TRANSESCOLAR
2025

AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 0
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	03/10/2025 hasta 08/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025 hasta 08/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	03/10/2025 hasta 08/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N.° COQ.100001753**		**ANEXO: 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑÍA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2025 hasta 08/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 554 DE 2025 N° COQ-100006940 DEL 14/10/2025			
AMPARO	VIGENCIA		COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$11.752.900.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A ANEXO: 2
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/10/2025 hasta 19/03/2027	$17.629.350.000	
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2025 hasta 19/09/2027	$11.752.900.000	
PAGOS DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	14/10/2025 hasta 19/09/2029	$8.814.675.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N° COQ 100001753**		**ANEXO: 2**
AMPARO	**VIGENCIA**		**COMPAÑÍA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/10/2025 hasta 19/09/2026	$2.938.225.000	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

16. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

CDP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. CDP**	**VALOR**
28-08-2025	CDP SGR 202526-00258	$58.764.989.178,00

17.1 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

INTER TRANSESCOLAR
2025

RP CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025		
FECHA	**No. RP**	**VALOR**
08/10/2025	RP SGR202526-00247	$58.764.989.178,00

17. CUADRO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.

Hace parte integral del presente informe, el cuadro de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 554 de 2025. Teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ Total, de cantidad de estudiantes planillados ruta por ruta de todos los municipios del Departamento de Arauca y sus respectivas planillas del periodo del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar ejecutados durante la ejecución del contrato por el periodo del presente informe.
- ✓ Enumeración de los días calendario escolar los cuales se prestó el servicio de ruta escolar durante el periodo del presente informe
- ✓ Total, de valor ejecutado del contrato por ruta escolar
- ✓ Total, de días calendario escolar laborados por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, días calendario escolar pendientes por laborar por parte del contratista, teniendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Total, valor ejecutado ruta por ruta de los diferentes municipios del Departamento de Arauca, teniendo en cuenta el acta de inicio con fecha de catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.
- ✓ Porcentaje de ejecución del contrato, tiendo en cuenta el acta de inicio de fecha catorce de octubre de 2025 a corte del presente informe.

18. INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y DE CONTROL CONTRACTUAL.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, la Dirección del Proyecto adelantó seguimiento integral a la ejecución técnica, operativa, administrativa y contractual del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando el comportamiento general de la operación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial desarrollado en los siete (07) municipios del Departamento de Arauca, así como la correspondencia entre la ejecución reportada por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR**

INTER TRANSESCOLAR
2025

2026, y las verificaciones efectuadas por la interventoría en desarrollo de sus obligaciones contractuales.

En ejercicio de las funciones de dirección y control contractual, se efectuó revisión y consolidación de la información técnica y operativa correspondiente al periodo objeto del presente informe, verificando el cumplimiento general de las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, Documento Técnico, Estudios Previos y demás documentos que integran el proceso contractual. Para tal efecto, se adelantó análisis sobre informes mensuales de ejecución, certificaciones expedidas por establecimientos educativos oficiales, reportes de beneficiarios transportados, planillas de asistencia, novedades operativas, consolidado físico-financiero y documentación asociada a la operación de las rutas terrestres y fluviales ejecutadas durante el periodo en mención.

La Dirección del Proyecto efectuó seguimiento permanente a la continuidad de la prestación del servicio, verificando el comportamiento operativo de las rutas escolares, la disponibilidad funcional del parque automotor y fluvial, la ejecución de recorridos autorizados, la cobertura efectiva de estudiantes beneficiarios y la atención de situaciones operativas reportadas durante el periodo evaluado. Esta labor se desarrolló mediante articulación permanente con la Secretaría de Educación Departamental, rectores y coordinadores institucionales, personal operativo del contratista y equipo técnico de la interventoría, permitiendo consolidar trazabilidad suficiente respecto del comportamiento general de la ejecución contractual.

Así mismo, se adelantó control sobre la información documental y operativa presentada por el contratista para soportar la ejecución del servicio, verificando consistencia entre reportes operativos, consolidación de beneficiarios, ejecución de rutas, soportes de asistencia y certificaciones institucionales. Como resultado de dicho análisis, de esta manera, la Dirección del Proyecto formuló observaciones preventivas y requerimientos de ajuste frente a soportes ambiguos, inconsistencias menores de consolidación, novedades insuficientemente soportadas y situaciones que requerían precisión documental u operativa por parte del prestador del servicio, especialmente respecto de trazabilidad de novedades, consolidación de información operativa y claridad en algunos soportes asociados a la ejecución de rutas y beneficiarios.

En materia de control contractual, la Dirección del Proyecto verificó igualmente la correspondencia entre el avance físico reportado para el periodo y la ejecución financiera presentada evidenciando relación general entre la prestación efectiva del servicio y los valores causados por concepto de rutas terrestres y fluviales ejecutadas durante el mes de julio de 2026. Esta revisión comprendió seguimiento a la ejecución acumulada del contrato, comportamiento porcentual del avance

INTER TRANSESCOLAR
2025

contractual y coherencia general entre la ejecución técnica reportada y los soportes financieros allegados por el contratista.

Producto del seguimiento integral adelantado durante el periodo evaluado, la Dirección del Proyecto evidenció cumplimiento general de las obligaciones esenciales relacionadas con la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial, observándose continuidad operativa, mantenimiento de cobertura sobre la población estudiantil beneficiaria y atención general de las condiciones técnicas y contractuales previstas para la ejecución del contrato, sin perjuicio de las observaciones, ajustes y verificaciones permanentes formuladas por la interventoría en ejercicio de sus competencias contractuales.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO - COMPONENTE OPERATIVO, LOGÍSTICO Y DE VERIFICACIÓN EN CAMPO.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, la Coordinación del Proyecto adelantó seguimiento técnico-operativo y logístico a la ejecución de las rutas escolares terrestres y fluviales desarrolladas por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026,** verificando la continuidad de la operación, cumplimiento de recorridos autorizados, disponibilidad vehicular y adecuada prestación del servicio en los diferentes municipios del departamento de Arauca.

En desarrollo de las actividades de coordinación operativa, se efectuó seguimiento permanente a los reportes diarios y consolidados de ejecución, verificando la correspondencia entre las rutas programadas, las rutas efectivamente operadas, la cantidad de estudiantes beneficiarios movilizados y la información registrada en las planillas de asistencia y certificaciones expedidas por los establecimientos educativos oficiales. Esta labor permitió consolidar información relacionada con comportamiento operativo de las rutas, tiempos de recorrido, continuidad del servicio, novedades logísticas y atención de requerimientos institucionales presentados durante el mes de julio de 2026.

La Coordinación del Proyecto adelantó igualmente control sobre la disponibilidad y comportamiento operativo del parque automotor y fluvial dispuesto para la ejecución contractual, realizando seguimiento a la operación efectiva de vehículos y embarcaciones, cumplimiento de horarios institucionales, ocupación vehicular, disponibilidad del personal operativo y atención de novedades menores presentadas durante la prestación del servicio. Para tal efecto, se efectuó articulación permanente con el equipo técnico de apoyo operativo de la interventoría y con el personal institucional de los establecimientos educativos beneficiarios, consolidando evidencias y reportes relacionados con la ejecución material de las rutas escolares.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Así mismo, en desarrollo del seguimiento operativo adelantado durante el periodo evaluado, la Coordinación del Proyecto formuló observaciones preventivas y correctivos operativos frente a inconsistencias menores identificadas en algunos reportes de ejecución, novedades sin trazabilidad suficiente, soportes operativos ambiguos y situaciones que requerían mayor precisión documental por parte del prestador del servicio, particularmente respecto de consolidación de información de rutas, beneficiarios transportados y registro de novedades operativas. Dichos requerimientos fueron comunicados al contratista con el propósito de fortalecer los mecanismos de control operativo y garantizar mayor consistencia entre la operación ejecutada y los soportes allegados para el trámite parcial.

La Coordinación del Proyecto, realizó igualmente acompañamiento a las actividades de verificación desarrolladas por el equipo técnico de campo de la interventoría, consolidando información asociada a reportes operativos, seguimiento a novedades, comportamiento de rutas terrestres y fluviales y control general sobre la continuidad del servicio de transporte escolar durante el periodo evaluado.

Con fundamento en las verificaciones efectuadas durante el periodo objeto del presente informe, la Coordinación del Proyecto evidenció continuidad funcional en la operación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial, observándose atención general de las rutas autorizadas y mantenimiento de cobertura sobre la población estudiantil beneficiaria del Departamento de Arauca, sin perjuicio de los ajustes operativos y requerimientos preventivos formulados por la interventoria en desarrollo de las actividades de seguimiento contractual.

SEGUIMIENTO JURÍDICO Y CONTRACTUAL - COMPONENTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, el componente jurídico de la interventoría adelantó seguimiento legal, contractual y documental a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando la trazabilidad jurídica de la ejecución reportada y el cumplimiento general de las obligaciones documentales exigidas en el marco de las condiciones contractuales y de la normatividad aplicable a la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial en el Departamento de Arauca.

En desarrollo de las actividades de seguimiento jurídico y contractual, se efectuó revisión integral de la documentación allegada por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026,** verificando informe mensual de ejecución, certificaciones institucionales, reportes operativos, documentación del personal vinculado a la operación, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, pólizas contractuales, documentación habilitante del parque automotor y demás

INTER TRANSESCOLAR
2025

soportes exigidos en las Especificaciones Técnicas, la Ficha Técnica y el clausulado contractual aplicable al proyecto.

El componente jurídico adelantó verificación documental sobre el personal operativo terrestre y fluvial vinculado a la prestación del servicio, revisando afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, licencias de conducción, soportes de capacitación, correspondencia entre personal reportado y documentación allegada, así como cumplimiento general de requisitos asociados a conductores, auxiliares y acompañantes de ruta conforme a las condiciones previstas en las especificaciones técnicas del proceso contractual.

En desarrollo del control documental y contractual adelantado durante el periodo reportado, el componente jurídico formuló observaciones y requerimientos frente a soportes insuficientemente claros, documentación incompleta, inconsistencias menores de trazabilidad y situaciones que requerían precisión documental o aclaración contractual por parte del prestador del servicio, particularmente respecto de algunos soportes operativos, consolidación documental y consistencia de la información presentada para el trámite parcial. Dichos requerimientos fueron comunicados al contratista con el propósito de fortalecer la trazabilidad jurídica de la ejecución y garantizar mayor consistencia documental frente al avance físico y financiero reportado.

Así mismo, se realizó seguimiento al cumplimiento general de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones concordantes relacionadas con la ejecución del contrato y la prestación del servicio de transporte escolar, verificando correspondencia general entre la ejecución contractual reportada y las obligaciones legales aplicables al proyecto.

Producto del seguimiento adelantado durante el periodo objeto del presente informe, el componente jurídico evidenció cumplimiento general de las obligaciones documentales y contractuales asociadas a la ejecución del servicio, observándose trazabilidad suficiente entre la documentación revisada, los soportes allegados por el contratista y las verificaciones adelantadas por la interventoría, sin perjuicio de los controles permanentes y requerimientos preventivos formulados en ejercicio de las competencias de seguimiento contractual.

PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO - COMPONENTE FINANCIERO, CONTABLE Y DE CONSISTENCIA FÍSICO-PRESUPUESTAL.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, el Profesional de Apoyo Financiero adelantó la revisión del componente económico, contable y presupuestal asociado al presente informe del Contrato de Prestación de Servicios No. 554 de 2025, verificando la

INTER TRANSESCOLAR
2025

correspondencia entre la ejecución física reportada por el contratista, los valores causados por rutas terrestres y fluviales, la amortización del anticipo y el balance acumulado de ejecución contractual.

La revisión financiera no se limitó a una validación aritmética de los valores reportados, sino que comprendió el análisis de razonabilidad entre el servicio efectivamente ejecutado, los días de operación, la modalidad de ruta, la información de beneficiarios transportados y los documentos presentados. En ese sentido, se formularon observaciones al prestador del servicio frente a inconsistencias menores, soportes que requerían mayor claridad y datos que no permitían una verificación suficiente desde el componente financiero, solicitando su precisión, ajuste o complementación.

De igual manera, se efectuó seguimiento al comportamiento acumulado del contrato, con el propósito de mantener control sobre la ejecución financiera del contrato y evitar desajustes entre la prestación material del servicio y el reconocimiento económico correspondiente.

Con fundamento en la revisión efectuada, el componente financiero evidenció consistencia general entre la información económica presentada, el avance físico reportado y los soportes allegados para el trámite parcial, sin perjuicio de los ajustes, aclaraciones y verificaciones complementarias requeridas al contratista frente a información ambigua o insuficientemente soportada.

TÉCNICO EN SEGURIDAD – COMPONENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL, CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y PREVENCIÓN DEL RIESGO.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, el Técnico en Seguridad adelantó seguimiento específico a las condiciones de seguridad operacional, mecánicas, ambientales y preventivas asociadas a la prestación del servicio de transporte escolar terrestre y fluvial ejecutado por la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026**, verificando que la operación se desarrollara bajo parámetros compatibles con la naturaleza del servicio, la población beneficiaria y las exigencias normativas aplicables.

En desarrollo de sus actividades, se efectuó revisión sobre las condiciones generales del parque automotor y fluvial dispuesto para la operación, verificando elementos de seguridad, estado físico de los vehículos, condiciones básicas de operación, documentación habilitante, señalización, elementos preventivos, condiciones de aseo, control de capacidad, presencia de acompañantes cuando correspondía y observancia de protocolos mínimos durante el abordaje, permanencia y descenso de los estudiantes. Esta verificación se articuló con los reportes de campo y con la información consolidada por el equipo operativo de la interventoría.

Así mismo, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad vial y prevención del riesgo durante la operación de las rutas, especialmente frente a la correcta identificación de vehículos, condiciones de desplazamiento, comportamiento del personal operativo, atención de novedades y disponibilidad de elementos mínimos para la reacción ante contingencias. En las rutas fluviales, el seguimiento se orientó a verificar condiciones básicas de seguridad de las embarcaciones, disponibilidad de elementos de protección y correspondencia entre la operación reportada y las condiciones observadas en campo.

Durante la revisión del periodo reportado, el Técnico en Seguridad formuló observaciones preventivas y requerimientos de ajuste al prestador del servicio frente a aspectos que requerían mayor claridad, soportes ambiguos o situaciones que no permitían establecer plena verificabilidad documental u operacional, especialmente en relación con trazabilidad de mantenimientos, soportes de revisión, evidencias de seguridad y novedades reportadas. Dichas observaciones se orientaron a prevenir riesgos, fortalecer el control de la operación y asegurar que la información presentada fuera suficiente, clara y verificable.

Con fundamento en el seguimiento adelantado, se evidenció que durante el periodo objeto del presente informe, el servicio se desarrolló bajo condiciones generales de seguridad y continuidad operacional, sin perjuicio de la necesidad de mantener control permanente sobre el estado del parque automotor, las condiciones de las rutas, la documentación de seguridad y la atención oportuna de las novedades que puedan incidir en la protección de los estudiantes beneficiarios.

TÉCNICOS DE APOYO OPERATIVO – COMPONENTE DE VERIFICACIÓN EN CAMPO, RUTAS, PARQUE AUTOMOTOR Y SOPORTES DE EJECUCIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 y el treinta y uno (31) de julio de 2026, los Técnicos de Apoyo Operativo desarrollaron actividades de seguimiento y verificación en campo a la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de Arauca, en cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría dentro del Contrato No. 554 de 2025.

En desarrollo de estas actividades, se acompañó la jornada de inspección técnica realizada el día 28 de julio de 2026 al componente terrestre del contrato, efectuando la verificación de vehículos pertenecientes a rutas ubicadas en sectores cercanos al casco urbano del municipio de Arauca. Durante la jornada se verificaron aspectos relacionados con las condiciones generales de operación, identificación, capacidad, condiciones físicas, elementos básicos de seguridad, disponibilidad operativa, correspondencia con las rutas asignadas y coherencia entre lo reportado documentalmente y lo evidenciado en campo. Así mismo, se diligenciaron los

formatos de asistencia, y se registró la correspondiente evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas.

Como resultado de las verificaciones efectuadas, se identificaron hallazgos que fueron comunicados al contratista para la implementación de las acciones correctivas correspondientes, contribuyendo al fortalecimiento del seguimiento técnico y al cumplimiento de las condiciones de seguridad y operación exigidas para la adecuada prestación del servicio.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció continuidad general en la prestación del servicio, operación funcional de las rutas escolares y correspondencia razonable entre los reportes presentados y la ejecución observada, sin perjuicio de los ajustes y requerimientos formulados por la interventoría para mejorar la claridad y trazabilidad de la información operativa.

19. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

La interventoría adelantó una verificación exhaustiva sobre el personal vinculado por el contratista, teniendo como referencia los requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas del proceso, la Ficha Técnica del proyecto y la normatividad vigente en Colombia para la operación del servicio de transporte escolar. Con base en la revisión documental y operativa, se constató que los conductores acreditaron licencias de conducción vigentes y adecuadas para la categoría del vehículo operado, así como experiencia mínima en transporte especial, en concordancia con los perfiles previstos en el numeral 7.5.2 de la Ficha Técnica. Se verificó igualmente que cada conductor contara con capacitación reciente en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y en atención segura de estudiantes, aspectos exigidos por el marco técnico del transporte escolar y por las obligaciones específicas estipuladas para el contratista.

La verificación operativa en campo permitió confirmar que el personal asignado correspondía al reportado, que su presencia era efectiva durante el desarrollo de las rutas y que su desempeño se ajustó a los parámetros de seguridad, prudencia y atención establecidos en la normativa del transporte especial escolar. La interventoría corroboró la existencia de acompañantes en las rutas que así lo requerían, la adecuada interacción con los estudiantes, el cumplimiento de horarios y la atención oportuna de novedades. En conjunto, las evidencias documentales y operativas permitieron concluir que el personal dispuesto por el contratista cumplió íntegramente con las obligaciones contractuales, técnicas y legales necesarias para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.

INTER TRANSESCOLAR
2025

20. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PARQUE AUTOMOTOR


Durante el mes de julio de 2026, La interventoria desarrolló un control técnico integral sobre el parque automotor dispuesto para la ejecución del contrato, observando los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015, en la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, en la Resolución 12379 de 2012, demás normatividad relacionada, y las especificaciones técnicas del proceso contractual. En este marco, se verificó que las unidades operantes contaran con revisión técnico-mecánica vigente, póliza SOAT, tarjeta de operación, certificado de emisiones contaminantes cuando aplicaba, y demás documentación habilitante exigida para los servicios de transporte especial. Se constató igualmente la presencia de los elementos de identificación propios del transporte escolar, tales como rotulación frontal y lateral, luces preventivas, señalización interna, mecanismos de seguridad, equipamiento básico, cinturones en condiciones adecuadas y estados físicos compatibles con el tipo de operación.

La interventoria corroboró que la capacidad de cada vehiculo se ajustaba a lo estipulado en la Ficha Técnica del proyecto (buses, busetas, microbuses, camionetas), verificando que el número de estudiantes transportados no superara los límites permitidos y que la operación se ajustara al perfil de cada ruta. Se revisó la correspondencia entre las placas reportadas, las características técnicas, los propietarios inscritos y los vehículos efectivamente observados en campo, confirmando que el parque automotor operante coincidía con el declarado por la Unión Temporal Transporte Escolar 2026, sin evidenciarse sustituciones no autorizadas ni vehículos sin habilitación vigente.

En su conjunto, la verificación técnica y documental permitió concluir que el parque automotor dispuesto por el contratista prestador del servicio, cumplió de manera sostenida con los requisitos legales, contractuales y operativos exigidos para garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte escolar, manteniendo estándares de seguridad y operatividad compatibles con las exigencias reglamentarias y con los parámetros propios del objeto contratado.

INTER TRANSESCOLAR
2025

21. GRAFICOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025

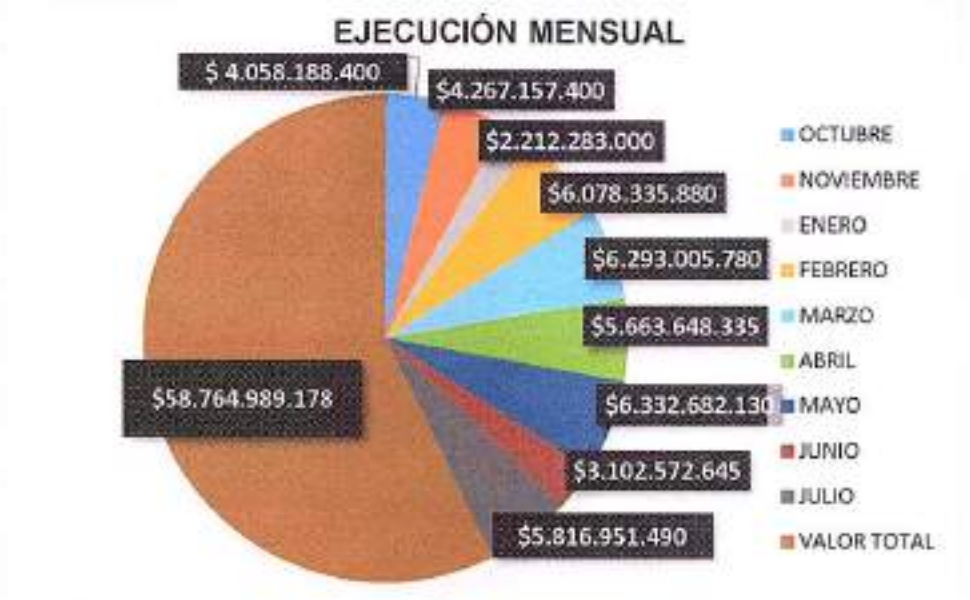



INTER TRANSESCOLAR
2025

22. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS TERRESTRES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.



23. GRAFICOS DE EJECUCIÓN RUTAS FLUVIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2025.




INTER TRANSESCOLAR
2025

NOTA: Los municipios de Fortul, Tame y Puerto Rondón, no cuentan con rutas fluviales.

24. GRAFICOS CANTIDAD DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 554 DE 2024.

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.763
ARAUQUITA	1.966
CRAVO NORTE	97
FORTUL	1.317
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.979
TAME	2.609
TOTAL	**9.889**


CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS



CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS SEGÚN PLANILLAS MES DE JULIO 2026	
MUNICIPIO	**CANTIDAD**
ARAUCA	1.733
ARAUQUITA	1.728
CRAVO NORTE	91
FORTUL	1.095
PUERTO RONDÓN	158
SARAVENA	1.870
TAME	2.352
TOTAL	**9.027**

INTER TRANSESCOLAR
2025

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES PLANILLADOS JULIO 2026

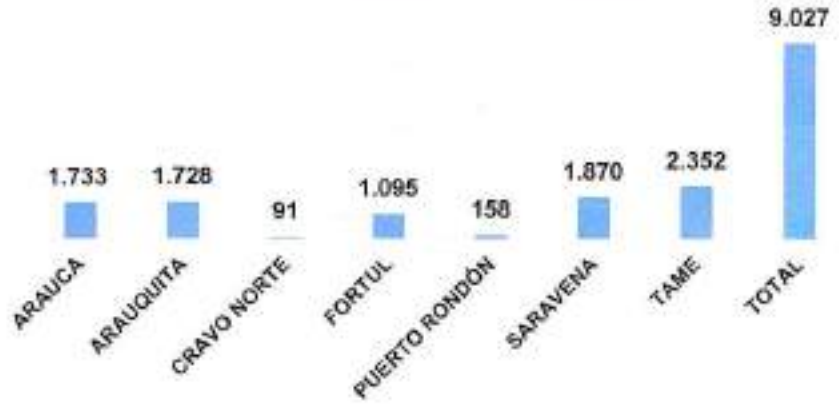

25. COMPONENTES CONTRACTUALES.

✓ **Componente Administrativo.**

La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, verificando la adecuada gestión documental, la presentación oportuna de informe periódico y la atención de los requerimientos formulados por la entidad contratante. Se revisó la consistencia entre los documentos remitidos por el contratista y la ejecución real del contrato, así como la correcta organización del expediente contractual, con el fin de garantizar trazabilidad, integridad y coherencia administrativa durante toda la vigencia contractual.

✓ **Componente Financiero y Contable**

En desarrollo del componente financiero y contable, la interventoría cumplió con la obligación de ejercer control y seguimiento a la ejecución de los recursos del contrato, verificando la relación entre el avance físico del servicio y los valores ejecutados.

✓ **Componente Jurídico**

En atención a las obligaciones jurídicas asignadas a la interventoría, se realizó la revisión, acompañamiento y verificación de las actuaciones contractuales generadas durante la ejecución. La interventoría dejó constancia de las observaciones jurídicas necesarias para garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y adecuada estructuración del expediente contractual, conforme a lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

INTER TRANSESCOLAR 2025

- ✓ **Componente Ambiental.**

En cumplimiento del componente ambiental y de seguridad operacional, la interventoría verificó que la prestación del servicio se desarrollara bajo condiciones de prevención y control de riesgos, conforme a las obligaciones establecidas para la vigilancia de la seguridad de los estudiantes y la mitigación de impactos asociados a la operación del transporte escolar.

- ✓ **Componente Procedimientos y Controles.**

En desarrollo de las funciones de control, seguimiento y evaluación previstas para la interventoría, se aplicaron los procedimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas mediante actividades sistemáticas de verificación documental, inspección operativa, análisis de información y registro de evidencias. Estas actuaciones permitieron identificar oportunamente novedades administrativas, financieras y contractuales, formular observaciones preventivas y realizar seguimiento a su atención, cumpliendo con la obligación de ejercer control integral sobre la ejecución del contrato y de suministrar a la entidad información confiable para la toma de decisiones.

26. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, durante el periodo de ejecución del presente informe, realizó las respectivas visitas e inspecciones al parque automotor que presta el servicio de transporte escolar terrestre en el municipio de Arauca.
- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, verificó vigencia de documentación del parque automotor, se realizaron pruebas de alcoholemia y se constató que cumplieran con los elementos pertinentes para la correcta prestación del servicio, en el municipio inspeccionado.
- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, durante la ejecución del periodo del presente informe, prestó el servicio de transporte escolar en condiciones favorables, dando cumplimiento a la prestación de cada una de las rutas escolares, en sus respectivos horarios y días calendario escolar, los soportes entregados para evidenciar dicho cumplimiento son las planillas mensuales de los estudiantes transportados por cada una de las instituciones educativas oficiales, las cuales se allegan a la supervisión del contrato de interventoría externa en originales.

INTER TRANSESCOLAR
2025

- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, presentó en su revisión documental las certificaciones por parte de los rectores de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca, donde manifiestan satisfacción en el cumplimiento del servicio prestado, dichas certificaciones corresponden a los días escolares ejecutados en el mes de julio de 2026.
- ✓ El CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025, interventoría externa, adjunta la planilla de pago de seguridad social del periodo del presente informe.
- ✓ La UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, prestó el servicio de rutas escolares a la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada una de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Arauca dando cumpliendo con los horarios establecidos de los días calendario escolar. En el presente informe se grafica la cantidad de estudiantes transportados durante la ejecución del contrato, en el periodo mencionado.

El presente informe de actividades, del contrato de interventoría N° 555 de 2025, se firma a los trece (13) días del mes de agosto del año 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L Consorcio Inter Trans-Escolar 2025

ANDRES MAURICIO SANTAMARIA
director de proyecto

Proyecto: Deicy Bdyith Castillo Eregua
Coordinador de Área

Proyecto aspectos jurídicos: Cristian Camilo Niño Fonseca
Profesional de Apoyo Jurídico

Proyecto aspectos financieros: Carmen Rosa Miranda Valencia
Profesional de Apoyo financiero

INTER TRANSESCOLAR
2025

ANEXOS

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
2. REGISTRO FOTOGRAFICO.
3. CUADRO DE EJECUCIÓN.
4. CERTIFICACIONES GESPROY.
5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
6. INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 555 DE 2025

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIO: CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2025

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	D. PROGRAMADO	D. EJECUTADO
OCTUBRE																																17	17
NOVIEMBRE																																31	29
ENERO																																16	16
FEBRERO																																28	28
MARZO																																29	29
ABRIL																																25	25
MAYO																																31	31
JUNIO																																15	15
JULIO																																26	26
AGOSTO																																31	31

	TOTAL DÍAS EJECUTADOS	216
	TOTAL DÍAS PROGRAMADOS	300
	TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	84
	TOTAL MESES PROGRAMADOS	10

DÍAS EJECUTADOS
DÍAS PROGRAMADOS
RECESO ESTUDIANTIL

Clle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

2. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025










Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025







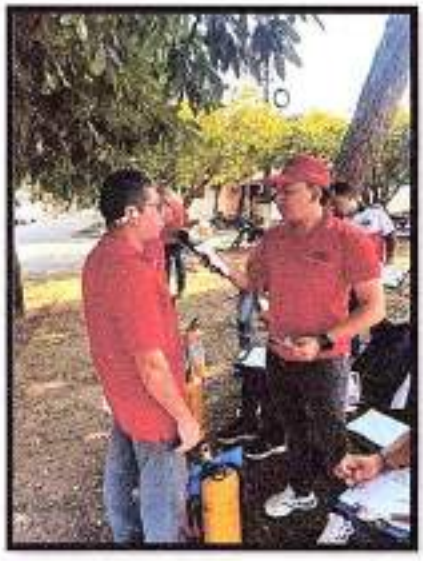

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025









Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

3. CUADRO DE EJECUCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días de Prestación del Servicio 2025	No. de Días de Prestación del Servicio 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Inscritos Pluralsoft	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Rec Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
MUNICIPIO DE ARAUCA							1.350			$ 62.791.000	$ 67.671.000	$ 2.331.462.000	$ 1.969.110.000		$ 10.961.280.000	1741	11.611.000		$ 1.429.803.000	$ 827.091.000	$ 102.236.000	13,07%	16,24%			$ 7.344.306.740	14,42%
I.E. JOSE ANUNCIO SILVA	1	Las Dragas - I.E. José Asunción Silva y Viaverena	22,7	45,4	Terrestre	1 Bus	50	42	108	$ 1.175.000	$ 1.230.000	$ 49.340.000	$ 111.200.000	142	$ 209.540.000	50	10		$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 162.000.000	31,00%
	2	La Raffa - Toto Pinzon - I.E. José Asunción Silva y alrededor (el siguiente recorrido inicia en la Finca El Bosque)	30	60	Terrestre	1 Buseta - 2 Escolares	90	42	108	$ 1.300.000	$ 1.400.000	$ 54.600.000	$ 153.000.000	162	$ 209.600.000	50	10		$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 160.000.000	31,00%
	3	Nubes 4 - Dosil El Cruce - I.E. José Asunción Silva (Recorrido Ida)	22,5	45	Terrestre	2 Escolar	90	42	108	$ 1.630.000	$ 1.990.000	$ 79.440.000	$ 214.200.000	162	$ 311.640.000	50	10		$ 33.200.000	$ 33.200.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 234.000.000	31,00%
	4	Entre la Reserva - I.E. José Asunción Silva y Viaverena	8,0	17,4	Terrestre	1 Buseta - 1 Escolares	50	40	100	$ 1.400.000	$ 1.200.000	$ 50.000.000	$ 150.000.000	140	$ 200.000.000	30	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 165.000.000	31,00%
	5	I.E. José Asunción Silva - Bosa Calle La Pera - I.E. José Asunción Silva y Viaverena	8,7	17,4	Terrestre												10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 165.000.000	31,00%
	6	Calle El 50 - Calle Nubes 4 y Viaverena	30	60	Terrestre	Kinder - 2 Bus	70	40	100	$ 1.250.000	$ 1.300.000	$ 51.912.000	$ 130.840.000	140	$ 211.752.000	30	10		$ 22.970.000	$ 23.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 172.124.000	31,70%
	7	Cuellar - Calle Caballeros - Calle la Yaya - Calle la Pista y Socorro	12,6	27,8	Rural	Bus - 2 Escolar	60	40	100	$ 1.300.000	$ 1.120.000	$ 43.424.000	$ 134.640.000	140	$ 178.560.000	40	10		$ 22.100.000	$ 0	$ 20.100.000	15,00%	11,33%	100	29	$ 140.500.000	31,70%
	8	Finca Islas Cielo - Calle El Tesal y Viaverena	9	18	Terrestre	Kinder - 2 Bus	70	42	100	$ 1.219.000	$ 1.310.000	$ 51.160.000	$ 157.080.000	142	$ 208.956.000	30	10		$ 22.970.000	$ 23.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	100	29	$ 172.000.000	31,70%
I.E. AGROPECUARIO MUNICIPAL ARAUCARIO	9	Lagunas - Antigua Principal de Puerto del Bridge - Las Dunas de Enero - Cruce - Puente Blanco - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena	10	20	Terrestre	1 Bus	38	42	112	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 44.072.000	$ 140.400.000	150	$ 182.072.000	40	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 140.000.000	27,00%
	10	Plaza del Union - Chiviros - Avenida Juan Pablo Chiviro - Subida HEV - Avenida Ronald - Cafe Gordos - Rio del Bolivia - Bruneja - Carolina Cuvis - Corozonal - Alcaldia Municipal - El Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena	14,0	28	Terrestre	1 Bus	38	42	112	$ 1.300.000	$ 1.150.000	$ 43.344.000	$ 140.100.000	150	$ 183.804.000	40	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 144.724.000	27,67%
	11	Barro Amarillo - Caicara - Barro Manrique - Hospital - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena	12,5	25,0	Terrestre	1 Bus	38	42	112	$ 1.300.000	$ 1.150.000	$ 43.344.000	$ 140.100.000	150	$ 183.804.000	40	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 144.724.000	27,67%
	12	Vereda Pajarito - El Encanto - La Arboleda Chiscano - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	42	112	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 43.576.000	$ 140.400.000	150	$ 183.976.000	40	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 140.000.000	27,00%
	13	La Raffa (Bar) - Arboleda - Calle Limon - La Arboleda Chiscano - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena	11,5	23,0	Terrestre	1 Bus	38	42	112	$ 1.300.000	$ 1.170.000	$ 43.576.000	$ 140.400.000	150	$ 183.976.000	40	10		$ 21.000.000	$ 21.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 140.000.000	27,00%
	14	Velasco - Arrecife - Gramalote - I.E. Agropecuario Municipal Arauca y Viaverena (Recorrido inicia en la Parada del Dorado)	44	88	Terrestre	1 Bus - 2 Escolares	78	42	112	$ 1.750.000	$ 1.900.000	$ 74.760.000	$ 220.500.000	154	$ 295.260.000	60	10		$ 24.900.000	$ 24.900.000	$ 0	15,00%	11,33%	127	30	$ 237.000.000	31,00%
	15	I.E. Agropecuario Municipal Arauca - Hospital San Vicente - Barrio Pedro Hernandez - Puente Blanco - Pendiente (Recorrido inicia los Martes y Jueves)	11,0		Terrestre	1 Bus	35	15	45	$ 630.000	$ 2.000.000	$ 12.000.000	$ 44.100.000	60	$ 57.600.000	50	5		$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 0	45,15%	33,34%	34	44	$ 44.000.000	76,67%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° 006 DE 2024															JULIO 2025										
Establecimiento Educativo	Nro. Ruta	Barrio/vereda	Distancia (KM) Ida	Distancia (KM) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2024	No. de Días 2025	Costo Día 2024	Costo Día 2025	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Presupuestado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Semanas	Planillas	% Valor Total 2026	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. METROPOLITANA	18	I.E. Agropecuaria Municipal Inducentro - Piloguita 1 Solo Ida - Madres y cuidador	14,8		Terrestre	1 Buseta	22	11	44	$ 700.000	$ 700.000	$ 11.200.000	$ 37.240.000	53	$ 48.520.000	0	0	1,9,14,16,21,23,28,30	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 0	12,93%	12,93%	53	11	$ 37.080.000	76,42%
	42	I.E. Agropecuaria Municipal Inducentro - Piloguita (Solo Ida - Madres y cuidador)	22,8		Terrestre	1 Camioneta	10	11	44	$ 570.000	$ 910.000	$ 6.130.000	$ 20.120.000	55	$ 26.250.000	11	6	1,9,14,16,21,23,28,30	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 0	16,25%	13,55%	53	44	$ 30.940.000	78,87%
	18	Villa Luz - Manantial - Divino Redentor - Divino [TEXTO] - Los Pantanos. - - La Floridada - Orgui - I.E. Agropecuaria Municipal Alejandro y Vivanova (Seguro incorporado en Cada Jornada)	14,0	28,0	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	35	42	168	$ 1.200.000	$ 1.670.000	$ 70.070.000	$ 264.460.000	192	$ 334.530.000	63	11	5,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 32.000.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	167	25	$ 205.000.000	77,34%
	19	Divino Fundadores - Pedro Nel Jiménez - I.E. Metropolitana y Vivanova (El seguro incorporado inicia en VIAL Luis - jornada Mañana)	13,6	27	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	168	$ 1.700.000	$ 1.670.000	$ 71.570.000	$ 224.420.000	182	$ 297.570.000	63	19	6,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 33.600.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	173	29	$ 234.340.000	78,67%
	20	Bombay Avenida 9° Valencia - Barrio Libertadores - Divino - I.E. Metropolitana y Vivanova (El seguro incorporado inicia en el sector los galpones - Jornada Mañana)	13,1	26,2	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	168	$ 1.700.000	$ 1.670.000	$ 71.570.000	$ 224.420.000	182	$ 297.570.000	100	19	6,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 33.600.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	173	29	$ 234.340.000	78,67%
	21	Barrio Fontibonito - Pedro Nel Jiménez - I.E. Metropolitana y Vivanova (El seguro incorporado inicia en Vida Luz) - Jornada Tarde	13,6	27	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	168	$ 1.700.000	$ 1.670.000	$ 71.570.000	$ 224.420.000	182	$ 297.570.000	63	19	6,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 33.600.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	173	29	$ 234.340.000	78,67%
	22	Bombay Avenida 9° Valencia - Barrio Libertadores - Divino - I.E. Metropolitana y Vivanova (El seguro incorporado inicia en el sector los galpones) - Jornada Tarde.	13,1	26,2	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	168	$ 1.700.000	$ 1.670.000	$ 71.570.000	$ 224.420.000	182	$ 297.570.000	28	19	6,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 33.600.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	173	29	$ 234.340.000	78,67%
	23	Ramon - Confluente - Alejandro - Pradera - I.E. Metropolitana y Vivanova - Jornada Tarde.	19,5	39	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	70	42	168	$ 1.820.000	$ 1.670.000	$ 76.440.000	$ 255.360.000	182	$ 331.840.000	49	19	6,7,9,12,14,19,21,26,28,30	$ 35.280.000	$ 35.000.000	$ 0	15,00%	11,92%	173	29	$ 205.250.000	78,67%
	24	Cotacito - La Palyca - El Tanto - Barbacoas - I.E. Metropolitana y Vivanova	15,5	31	Rural	1 Bote	22	42	168	$ 1.570.000	$ 1.550.000	$ 64.940.000	$ 198.000.000	182	$ 302.940.000	17	11	6,7,9,12,14,20,23,26,28,30	$ 14.000.000	0	$ 14.000.000	10,00%	0,11%	122	60	$ 168.540.000	74,88%
	25	Tienda Colorito - Barrio Guandulos - Sede José Gregorio Hernández - Laguna La Manguera - Sede Pedro Emilio Gómez - Sede José Gregorio Cotrofito - Vivanova	11,2	34,4	Rural	1 Bote	22	42	168	$ 1.570.000	$ 1.550.000	$ 64.940.000	$ 198.450.000	182	$ 303.450.000	28	11	6,7,9,12,14,20,23,26,28,30	$ 15.000.000	0	$ 15.000.000	10,00%	0,11%	122	60	$ 168.480.000	74,85%
C.E. BONDERRATE	16	Pueblo Viejo - Llano Alto - El Reuno - Vista Hermosa - Lagunas de Chiquinta - La Yuca - Barrio Arco - La Y - Caserío - C.S. Bonderrate y Vivanova (El seguro incorporado en las lagunas es variable)	8,64	17,28	Terrestre	2 Busetas	80	42	168	$ 1.980.000	$ 2.040.000	$ 79.458.000	$ 341.200.000	182	$ 511.658.000	56	12	6,7,9,12,13,15,20,23,26,27,28,29,30	$ 21.120.000	$ 24.120.000	$ 0	18,38%	7,55%	110	44	$ 233.210.000	72,20%
	17	Barrio Manantial - Sede Marco Fidel Suarez - Sede Cuernitos - Vereda La Cinta - Sede Diana Fidel Suarez y Vivanova	31	62	Terrestre	1 Bus	38	42	168	$ 1.860.000	$ 1.860.000	$ 69.770.000	$ 159.600.000	182	$ 300.370.000	70	13	6,7,9,12,13,15,20,23,26,27,28,29,30	$ 15.960.000	$ 19.000.000	$ 0	16,00%	7,55%	119	44	$ 147.000.000	72,31%
	26	Sector Las Cotorrillas - Los Pantanos - C.E. Bonderrate y Vivanova	13,5	27	Rural	1 Bote - 0 Busetas	44	42	168	$ 1.700.000	$ 1.942.000	$ 81.770.000	$ 331.240.000	182	$ 282.810.000	64	13	6,7,9,12,13,15,20,23,26,27,28,29,30	$ 22.104.000	0	$ 22.104.000	16,00%	7,55%	119	44	$ 211.770.000	72,50%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 164 DE 2025 — **JULIO-2025**

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Capacidad y Tipo de Vehículo	No. de Estudiantes	No. de Días Trabajados 2025	No. de Días Trabajados 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2025	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Conductores Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2025	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. SANTO ANGEL	39	Finca La Loseta - Vereda Clarinetero - Sede Marco Fidel Suárez y Viceversa	8.8	17	Rural	1 Bus	33	43	105	$ 360.000	$ 1.080.000	$ 41.904.000	$ 134.160.000	163	$ 155.520.000	33	13	6,7,8,9,10,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 12.816.000	$ 0	$ 12.816.000	10,00%	7,55%	118	44	$ 122.550.000	72,20%
	40	Finca La Loseta - Comunidad Indígena La Estrella – Sede El Triunfo y Viceversa	16	32	Terrestre	2 Camionetas	37	43	105	$ 1.040.000	$ 3.040.000	$ 65.736.000	$ 192.720.000	163	$ 247.920.000	37	14	6,7,8,9,10,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.696.000	$ 33.696.000	$ 0	11,67%	8,89%	118	43	$ 165.475.000	73,06%
I.E. SANTO ANGEL	31	Bocana del Hospital - Los Arroyitos - Sede San Emilio - Vereda Sede Bajo Angel y Viceversa	48	72	Terrestre	1 Bus	30	43	105	$ 1.333.000	$ 3.427.500	$ 69.968.500	$ 171.248.000	163	$ 229.999.500	72	19	6,7,8,9,10,14,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31	$ 21.405.000	$ 21.405.000	$ 0	12,50%	9,48%	117	46	$ 160.594.500	71,80%
	32	La V Santa Rosa - Comunidad Indígena Vereda Sede Bajo Angel y Viceversa	61	84	Terrestre	1 Camioneta	12	43	105	$ 650.000	$ 1.625.000	$ 30.953.000	$ 112.099.999	163	$ 146.146.999	14	13	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30	$ 11.270.000	$ 11.270.000	$ 0	10,00%	7,69%	113	47	$ 153.332.000	72,42%
	33	Sector el Hospital - Sede Nueva Radiadora - Sede Bajo Angel y Viceversa	73,6	15	Terrestre	1 Camioneta	12	43	105	$ 762.000	$ 1.944.000	$ 32.844.000	$ 134.280.000	163	$ 154.134.000	15	13	6,7,8,9,10,14,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31	$ 12.690.000	$ 12.690.000	$ 0	12,50%	9,48%	118	44	$ 58.080.000	72,31%
	34	Sede Centro Valle (Vereda Caserío) - Sede San Cayetano y Viceversa	12	24	Terrestre	2 Camionetas	15	43	105	$ 1.554.000	$ 3.540.000	$ 64.668.000	$ 187.103.000	163	$ 251.771.000	14	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 26.514.000	$ 26.514.000	$ 0	15,00%	11,32%	120	43	$ 162.450.000	72,00%
	35	Finca Isleta Cubeta - Sede Puerto Colombia y Viceversa	26	42	Rural	2 Buses	44	43	105	$ 2.600.000	$ 6.370.000	$ 93.280.000	$ 272.400.000	163	$ 365.680.000	55	11	6,7,8,9,10,13,14,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 38.500.000	$ 0	$ 38.500.000	10,00%	10,72%	131	31	$ 203.100.000	51,62%
	36	Puerto Bolívar - Cementerio Manzanares - Isla La Piedra - Sede Agropecuario Corazón y Viceversa	10	20	Rural	1 Bote	17	43	105	$ 1.010.000	$ 1.102.500	$ 44.940.000	$ 129.240.000	163	$ 163.180.000	15	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.730.000	$ 0	$ 20.730.000	15,00%	11,32%	136	28	$ 218.000.000	54,75%
	37	Bohemia Arriba - Sede Agropecuario Corazón – Vereda	10,5	33,4	Rural	1 Bote	16	43	105	$ 900.000	$ 1.260.000	$ 41.904.000	$ 120.120.000	163	$ 162.944.000	18	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.242.000	$ 0	$ 10.242.000	10,00%	11,32%	136	28	$ 213.000.000	54,77%
	38	Finca El Nance del Cielo - Finca La Nace - Sede El Valle - Vereda	12,2	20,4	Rural	1 Bote	12	43	105	$ 1.067.000	$ 1.151.000	$ 44.604.000	$ 156.120.000	163	$ 182.904.000	9	15	6,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.615.000	$ 0	$ 15.615.000	15,00%	10,67%	118	44	$ 182.250.000	72,33%
	39	Puente la Florida - Carmelo - Comunidad - Sede San Cayetano y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Camioneta	8	43	105	$ 670.000	$ 670.000	$ 28.810.000	$ 100.500.000	163	$ 129.980.000	9	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.750.000	$ 0	$ 15.750.000	15,00%	11,32%	120	43	$ 162.370.000	72,68%
	42	Sabaneta - Sede Recodo y Viceversa	8,2	16,2	Terrestre	1 Buseta	24	43	105	$ 500.000	$ 870.000	$ 37.800.000	$ 136.800.000	163	$ 154.000.000	28	13	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27	$ 12.600.000	$ 0	$ 12.600.000	10,00%	9,09%	115	47	$ 169.610.000	78,45%
	41	Caribe de Tinco la Isleta - Sede San Cayetano - Finca El Nance (Dunas Bávaro) - Sede San Cayetano	7	14	Terrestre	1 Camioneta	15	43	105	$ 750.000	$ 841.000	$ 35.868.000	$ 101.250.000	163	$ 134.160.000	17	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.150.000	$ 15.150.000	$ 0	15,00%	11,32%	109	40	$ 98.710.000	73,08%
C.E. INDÍGENA WAYÚU WAIPERO	42	Cerro Alto - Dispensa - Vía La Playita C.E. Indígena Sikuani Playitas y Viceversa	13,2	26,4	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	68	43	105	$ 2.280.000	$ 2.394.000	$ 97.752.000	$ 310.460.000	163	$ 385.280.000	33	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 38.316.000	$ 38.316.000	$ 0	14,97%	10,72%	125	42	$ 262.020.000	70,34%
	43	Los Pozos – Barrancones – C.E. Indígena Sikuani Playitas y Viceversa	34	68	Rural	1 Bus	33	43	105	$ 1.190.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 148.160.999	163	$ 193.009.000	30	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.796.000	$ 0	$ 33.796.000	14,97%	10,66%	125	42	$ 242.484.000	73,08%
	44	Reducción Indígena Corazón Isla de Cuervito C.E. Sikuani Playitas y Viceversa	56	76	Rural	1 Bus	33	43	105	$ 1.190.000	$ 1.218.000	$ 47.460.000	$ 148.160.999	163	$ 193.009.000	35	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 19.635.000	$ 0	$ 19.635.000	13,33%	10,67%	118	45	$ 243.388.000	72,85%
	45	Reloma Hospital - Cerrito - Arcoiris 3° - Manaure - Centro - Refugio de Ecos - C.E. Indígena Sikuani y Viceversa	60	20	Terrestre	1 Bus	30	43	105	$ 1.380.000	$ 1.200.000	$ 48.972.000	$ 159.960.000	163	$ 199.800.000	20	15	6,7,8,9,10,13,14,15,16,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.115.000	$ 23.115.000	$ 0	15,00%	10,67%	113	45	$ 247.884.000	72,64%
	46	Vereda Las Cruces - Inmediaciones - Vereda El Vigía - Vereda Cerro Bravo - C.E. El Tatuaje y Viceversa	12,5	25	Terrestre	1 Camioneta	17	43	105	$ 650.000	$ 651.000	$ 27.234.000	$ 114.660.000	163	$ 152.384.000	7	13	6,7,8,9,21,22,23,27,28,29,30,31	$ 11.484.000	$ 11.484.000	$ 0	10,00%	7,55%	113	48	$ 165.304.000	86,13%
	47	La V Kamarimas - Majoma - La Vorágine - C.E. El Tatuaje y Viceversa	15,2	30	Terrestre	2 Camionetas	23	43	105	$ 1.622.000	$ 1.700.000	$ 65.376.000	$ 210.720.000	163	$ 278.346.000	17	13	6,7,8,9,21,22,23,27,28,29,30,31	$ 21.971.000	$ 21.971.000	$ 0	15,00%	7,55%	113	48	$ 169.032.000	86,13%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025

ADICIÓN

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2026	Valor Total 2025	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Conductores Mandatos	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
IDE EL TRANSITO	48	Ruta La Paz A Vereda Cuito Seco - Escuela Bonan de Ida - I.E. El Tránsito y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Microbús	18	40	120	$ 900.000	$ 954.000	$ 91.120.000	$ 114.480.000	160	$ 191.600.000	16	12	5,7,8,9,11,12,15,19,20,21,26,28,30,31	$ 11.445.000	$ 11.445.000	$ 0	10,00%	5,55%	113	48	$ 134.982.000	66,17%
	49	Ruta Santa Ana Casarino A - Vereda Los Brasiles - Vereda Los Loanos - I.E. El Tránsito y Viceversa	7,41	14,82	Terrestre	1 Camioneta	10	40	120	$ 700.000	$ 840.000	$ 83.160.000	$ 100.800.000	160	$ 122.000.000	16	12	5,7,8,9,21,22,23,27,28,29,30,31	$ 10.080.000	$ 10.080.000	$ 0	10,00%	7,05%	113	48	$ 82.262.000	66,19%
	50	Ruta Caño Alegre - Vereda Mocoplé - Puerto Lucero - Sede Jardín de los Niños y Viceversa	16,5	33,6	Terrestre	1 Microbús	18	47	120	$ 950.000	$ 997.000	$ 93.264.000	$ 134.640.000	160	$ 152.000.000	16	12	6,7,8,9,14,15,16,21,22,23,27,28,29,30,31	$ 14.955.000	$ 14.955.000	$ 0	10,00%	9,44%	113	48	$ 113.940.000	72,94%
I.E. NIÑO LAS HELAS	51	Cuadro Bocas de Ele - Sede Las Vegas - Caño Verde - Las Vegas y Viceversa	17,6	34,2	Rural	1 Bus - 1 Microbús	28	42	122	$ 1.540.000	$ 1.680.000	$ 68.600.000	$ 169.932.000	150	$ 204.910.000	17	14	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.664.000	$ 0	$ 20.664.000	10,00%	11,33%	117	44	$ 148.940.000	71,58%
Municipio de Arauquita							1.064			$ 77.007.000	$ 78.470.700	$ 3.001.852.800	$ 4.471.670.800		$ 11.550.171.300	1.064	16.800.000.000		$ 1.364.400.000	$ 1.042.270.000	$ 322.130.000	11,60%	10,39%			$ 3.324.349.340	28,78%
I.E. JOSE MARIA CARBONELL	1	Finca El Roble - Landia - La Florida - El Hoyón - I.E. José María Carbonell y Viceversa	17,0	30,6	Terrestre	1 Bus	36	40	120	$ 1.100.000	$ 1.120.000	$ 53.536.000	$ 154.400.000	160	$ 110.000.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.160.000	$ 20.160.000	$ 0	10,00%	11,33%	113	36	$ 134.358.000	72,47%
	2	Los Khotos - El Triunfo - La Y Division Vieja - San Luis de los Palmares - I.E. José María Carbonell y Viceversa	25,2	50,4	Terrestre	1 Buseta	20	40	120	$ 1.317.000	$ 1.056.000	$ 48.714.240	$ 151.920.000	160	$ 114.264.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 18.720.000	$ 18.720.000	$ 0	10,00%	11,33%	113	36	$ 131.496.000	72,47%
	3	El Salitre - Sitio Del Alto - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	1 Bus	34	40	120	$ 1.100.000	$ 1.150.000	$ 49.500.000	$ 141.840.000	160	$ 107.970.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 21.216.000	$ 21.216.000	$ 0	10,00%	11,33%	113	36	$ 141.704.000	72,45%
	4	San Luciano - Vereda Tolumbi - La Esmeralda - I.E. José María Carbonell y Viceversa	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbús	17	40	120	$ 900.000	$ 912.000	$ 35.496.000	$ 109.440.000	160	$ 144.000.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 18.240.000	$ 18.240.000	$ 0	10,00%	11,33%	113	36	$ 108.382.000	72,48%
I.E. ANDRES BELLO	6	Kilometro 7 - La Cabaña - La Trampa - Cuito Bonito - La Trampa - I.E. Andrés Bello y Viceversa	24,8	49,6	Terrestre	1 Buseta	29	40	120	$ 1.031.000	$ 1.047.000	$ 40.752.000	$ 123.840.000	160	$ 168.432.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 16.752.000	$ 16.752.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 120.448.000	71,50%
	8	Los Tanes - Boca Caracol - Caldas - I.E. Andrés Bello y Viceversa	19,4	38,8	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	38	40	120	$ 2.025.000	$ 2.134.000	$ 85.320.000	$ 252.960.000	160	$ 347.100.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 34.944.000	$ 34.944.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 255.432.000	73,58%
	7	Caño Caldas Caracol - Caño Guayacanal - I.E. Andrés Bello y Viceversa	9,5	19,0	Terrestre	1 Bus	38	40	120	$ 1.000.000	$ 1.178.000	$ 45.864.000	$ 141.480.000	160	$ 107.340.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 18.864.000	$ 18.864.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 137.626.000	72,57%
	9	Las Palmas - Cuatro Bocanas - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	8,3	16,6	Terrestre	1 Buseta	33	40	120	$ 800.000	$ 968.000	$ 37.296.000	$ 116.160.000	160	$ 153.984.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 112.896.000	73,33%
	10	Caño Blanco Tolero - Los Cristos - Bocana el Reposo - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	40	120	$ 900.000	$ 903.000	$ 37.296.000	$ 110.880.000	160	$ 153.288.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 110.896.000	73,56%
	11	La Comuna - El Palmito - La Trampa - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	10,5	21	Terrestre	1 Buseta	24	40	120	$ 900.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	160	$ 153.816.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 15.480.000	$ 15.480.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 110.220.000	72,55%
	12	Kilometro 7 - Caño Guayacanal - La Paz - I.E. Andrés Bello y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buseta	24	40	120	$ 900.000	$ 968.000	$ 37.716.000	$ 116.160.000	160	$ 153.816.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,19,21,22,23,24,27,28,29	$ 15.480.000	$ 15.480.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 110.220.000	72,55%
I.E. SAN JOSE DE LA PRADERA	13	Sabre Comunal - Mata Oscura - I.E. San José de la Pradera y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Buseta	29	40	120	$ 900.000	$ 960.000	$ 37.080.000	$ 110.880.000	160	$ 153.300.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 15.440.000	$ 15.440.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	47	$ 110.780.000	72,64%
	15	Pueblo Jodeado - El Vivero - La Cruz - I.E. San José de la Pradera y Viceversa	19	38	Terrestre	2 Buses	112	40	120	$ 2.072.000	$ 2.208.000	$ 104.140.000	$ 265.000.000	160	$ 369.620.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 31.344.000	$ 31.344.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	46	$ 261.468.000	70,62%
	14	Kilometro 27 - Vereda Caracol - Las Acacias - I.E. San José de la Pradera y Viceversa	11,5	23	Terrestre	1 Bus	38	40	120	$ 1.200.000	$ 1.284.000	$ 61.440.000	$ 153.360.000	160	$ 209.880.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 29.784.000	$ 29.784.000	$ 0	10,00%	10,00%	113	46	$ 153.936.000	73,33%
	16	Santaguilla - Mangalarco - Puerto Rivera - Buena Unión - I.E. San José de la Pradera y Viceversa	12,5	25,6	Rural	2 Buses	44	40	120	$ 2.040.000	$ 2.040.000	$ 89.880.000	$ 265.440.000	160	$ 351.120.000	16	12	5,7,8,9,13,14,15,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 38.880.000	$ 0	$ 38.880.000	10,00%	10,00%	113	47	$ 280.940.000	79,82%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Km): Ida	Distancia (Km): Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días: 2025	No. de Días: 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planilados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Transeúntes	Planillas	% Valor Total 2025	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. SIMÓN RODRIGUEZ - BAYAMONDE	16	Puerta Coronel - Sede Villa Hermosa - Sede Campo Isabel - Sede Villa Hermosa y Viceversa	15,08	30,16	Terrestre	1 Microbús	19	40	100	$ 800.000	$ 840.000	$ 32.000.000	$ 84.000.000	140	$ 116.000.000	40	13	14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 11.044.000	$ 11.044.000	$ 0	10,00%	9,56%	110	40	$ 151.436.000	31,00%
	17	La Virginia - Sede Juan José Rondón - Sede Daño Rico - Finca la Fe en la Sede la Fe - Sede Juan José Rondón y Viceversa	18,8	37,6	Terrestre	1 Microbús + 2 Asientos	36	40	100	$ 1.200.000	$ 1.204.000	$ 51.240.000	$ 108.882.000	180	$ 210.120.000	28	17	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 22.509.000	$ 22.509.000	$ 0	14,17%	19,73%	111	41	$ 155.636.000	74,17%
	18	Puerto Coronel - Sede Los Cerdos - Sede Campo Alegre y Viceversa	12,1	24,2	Rural	1 Bus	22	40	100	$ 1.200.000	$ 1.188.000	$ 44.720.000	$ 108.000.000	180	$ 187.150.000	20	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 17.280.000	$ 0	$ 17.280.000	12,00%	8,44%	110	42	$ 132.000.000	73,44%
	19	El Placer - Espino - Bayamon - Carretera - Sede Orlena Rodriguez - Bayamon y Viceversa	23	46	Rural	2 Buses	68	40	100	$ 1.200.000	$ 1.196.000	$ 120.000.000	$ 208.000.000	180	$ 324.000.000	68	17	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 55.188.000	$ 0	$ 55.188.000	14,17%	10,33%	133	58	$ 308.000.000	75,46%
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	20	Las Veraza - Sede Arenas - Rancho - Oviedo - La Esperanza - El Paraiso - El Diluvio - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	33,8	67,5	Rural	3 Buses	104	40	100	$ 3.000.000	$ 3.004.000	$ 240.040.000	$ 720.000.000	180	$ 961.000.000	75	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 150.704.000	$ 0	$ 150.704.000	15,00%	10,50%	110	40	$ 721.706.000	75,73%
	21	Las Viviendo - Los Angelitos - Las Azucenas - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	7,7	15,4	Rural	2 Buses	63	40	100	$ 2.000.000	$ 2.012.000	$ 113.120.000	$ 304.800.000	180	$ 441.360.000	63	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 47.502.000	$ 0	$ 47.502.000	13,00%	10,07%	110	40	$ 300.988.000	71,00%
	22	Nueva Jerusalén - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	9,1	18,2	Rural	1 Bus	32	40	100	$ 950.000	$ 1.000.000	$ 40.480.000	$ 127.200.000	180	$ 188.880.000	16	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 15.960.000	$ 0	$ 15.960.000	15,00%	10,04%	110	40	$ 126.124.000	71,13%
	23	Rancho Jacobito - I.E. José Acevedo y Gómez y Viceversa	11,8	23,6	Terrestre	1 Bus	30	40	100	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 40.000.000	$ 110.400.000	160	$ 167.920.000	40	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 19.912.000	$ 19.912.000	$ 0	15,00%	10,07%	115	47	$ 132.000.000	10,46%
I.E. AGUASHICA	24	Puerto Mitre - La Palma - Damasco - I.E. Aguashica y Viceversa	13,7	27,4	Terrestre	1 Buseta	20	40	100	$ 940.000	$ 1.014.000	$ 39.480.000	$ 101.764.000	160	$ 151.244.000	32	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 18.288.000	$ 18.288.000	$ 0	15,00%	11,33%	134	58	$ 132.704.000	38,00%
	25	Las Chalas - La Trancas - I.E. Aguashica y Viceversa	8,8	17,6	Terrestre	1 Buseta	20	40	100	$ 910.000	$ 950.000	$ 38.400.000	$ 115.600.000	160	$ 159.000.000	20	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 17.784.000	$ 17.784.000	$ 0	15,00%	11,33%	134	58	$ 139.400.000	36,00%
	26	El Plan - Fundación Santa Ana - Bilbao - El Palmar - I.E. Aguashica y Viceversa	23,3	46,6	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	60	40	100	$ 2.400.000	$ 2.008.000	$ 100.880.000	$ 300.000.000	160	$ 424.880.000	38	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 48.582.000	$ 48.582.000	$ 0	15,00%	11,44%	134	58	$ 300.100.000	70,00%
	27	Sede San Miguel - La Victoria - El Diamante - I.E. Aguashica y Viceversa	15,5	31	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	50	40	100	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 80.000.000	$ 208.000.000	160	$ 288.000.000	50	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 44.994.000	$ 44.994.000	$ 0	15,00%	11,42%	134	58	$ 299.400.000	70,00%
	28	Sede El Salto - El Obispo - I.E. Aguashica y Viceversa	14,4	28,8	Terrestre	1 Bus	54	40	100	$ 1.200.000	$ 1.250.000	$ 60.400.000	$ 155.000.000	160	$ 228.880.000	34	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 29.292.000	$ 29.292.000	$ 0	15,00%	11,52%	134	58	$ 158.624.000	38,00%
	29	Sede La Alondra - I.E. Aguashica y Viceversa	5	10	Terrestre	1 Buseta	25	40	100	$ 910.000	$ 900.000	$ 35.917.000	$ 111.888.000	160	$ 167.474.000	18	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 17.834.400	$ 17.834.400	$ 0	15,00%	11,28%	134	58	$ 119.402.000	70,00%
	30	La Tolaima - El Diamante - Puerto Chalas - I.E. Aguashica y Viceversa	12,1	24,2	Terrestre	1 Bus	55	40	100	$ 1.200.000	$ 1.204.000	$ 50.480.000	$ 130.200.000	160	$ 205.880.000	34	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 29.292.000	$ 29.292.000	$ 0	15,00%	11,52%	134	58	$ 158.624.000	38,00%
	31	Final Diario - I.E. Aguashica y Viceversa	7	14	Terrestre	1 Buseta	20	40	100	$ 910.000	$ 900.000	$ 36.800.000	$ 113.600.000	160	$ 167.000.000	11	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 17.820.000	$ 17.820.000	$ 0	15,00%	11,33%	134	58	$ 118.774.000	70,10%
	32	Inés Chaviel - I.E. Aguashica y Viceversa	27	43	Terrestre	1 Bus	32	40	100	$ 1.200.000	$ 1.204.000	$ 50.400.000	$ 130.320.000	160	$ 205.880.000	38	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 29.292.000	$ 29.292.000	$ 0	15,00%	11,52%	134	58	$ 158.624.000	38,00%
	33	El Deca - I.E. Aguashica y Viceversa	9,88	19,8	Terrestre	1 Bus	38	40	100	$ 1.200.000	$ 1.176.000	$ 48.000.000	$ 141.480.000	160	$ 197.388.000	30	19	6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 31.332.000	$ 31.332.000	$ 0	15,00%	11,33%	134	58	$ 168.984.000	38,00%
	34	Alto Parraca - I.E. Pedro Mal Jiménez y Viceversa	13,5	27	Terrestre	1 Bus + 2 Asientos	70	40	100	$ 1.800.000	$ 2.000.000	$ 78.000.000	$ 248.400.000	160	$ 329.000.000	48	17	1, 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 33.156.000	$ 33.156.000	$ 0	14,17%	10,12%	122	40	$ 345.468.000	74,27%
	35	Mulaya - Las Cruces - I.E. Pedro Mal Jiménez y Viceversa	20,6	41	Terrestre																						
	36	La Cid Sede El Progreso de los Indios - La Loja Alta - Parraca El Palacio - I.E. Pedro Mal Jiménez y Viceversa	38,2	76,4	Terrestre	1 Bus	28	40	100	$ 1.200.000	$ 1.180.000	$ 48.052.000	$ 141.640.000	160	$ 197.972.000	28	17	7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	$ 33.084.000	$ 33.084.000	$ 0	14,17%	10,12%	122	40	$ 140.380.000	74,82%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	37	La Tienda de San Jose - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Ternera - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	12,0	24,0	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.140.000	$ 1.256.000	$ 48.216.000	$ 129.368.000	182	$ 168.776.000
	38	Mata de Caña - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	14,8	29,6	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.240.000	$ 1.340.000	$ 52.080.000	$ 137.852.000	182	$ 210.932.000
	39	El Recreo - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	10,6	20,6	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.140.000	$ 1.230.000	$ 47.880.000	$ 126.690.000	182	$ 196.596.000
	40	La Gloria - El Retiro - Vías Veredales - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	9,6	19,2	Terrestre	1 Sencillo	29	42	103	$ 950.000	$ 1.026.000	$ 39.900.000	$ 105.678.000	182	$ 163.578.000
	41	Centro - Retiro - Puerta Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	20	40	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.240.000	$ 1.291.000	$ 52.080.000	$ 132.973.000	182	$ 214.746.000
	42	La "Y" - Centro - Finca San Cayetano - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	7,2	14,4	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.140.000	$ 1.206.000	$ 47.880.000	$ 124.206.000	182	$ 196.296.000
	43	Pinar Buenaventura - Isaac Ana Buritica - Puente Colorado - El Pajonal - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	18	36	Terrestre	1 Sencillo	29	42	103	$ 900.000	$ 953.000	$ 37.800.000	$ 98.178.000	182	$ 146.130.400
C.E. RODEITO EL VIGIA	44	Salazar - C.E. Antiguos El Vigía y Diversas	10,0	21	Mixto	2 Buses - 1 Escolares	74	42	103	$ 2.600.000	$ 2.700.000	$ 131.040.000	$ 360.360.000	182	$ 511.560.000
	45	Campanos - El Campanero - C.E. Antiguos El Vigía y Diversas	8,0	17	Terrestre	1 Bus	55	42	103	$ 1.380.000	$ 1.380.000	$ 57.960.000	$ 142.094.000	182	$ 199.133.000
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Colonia - Apartado 81 - Los Encinos - Buena Suerte - I.E. Infantes en Avanzada y Diversas	22,0	47,0	Terrestre	1 Microbus	19	42	103	$ 800.000	$ 820.000	$ 33.600.000	$ 82.656.000	182	$ 149.251.000
	47	El Yolaza - I.E. Infantes Apartado y Diversas	21	42	Terrestre	1 Bus - 2 Escolares	42	42	103	$ 1.260.000	$ 1.470.000	$ 52.920.000	$ 129.948.000	182	$ 230.265.000
HELIMEN DEL LLANO	48	La Pita - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	14,2	28,4	Terrestre	1 Microbus	19	42	103	$ 826.000	$ 908.000	$ 34.692.000	$ 93.436.000	182	$ 165.452.000
	49	Tatama - Campanario - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	15,0	27,0	Terrestre	1 Buseta	24	42	103	$ 969.000	$ 1.100.000	$ 40.698.000	$ 113.300.000	182	$ 198.726.000
	50	Guayacán - Chalarcan - La Unión - Palo Negro - Manzanares - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	24	48	Terrestre	1 Microbus	19	42	103	$ 867.000	$ 957.000	$ 36.414.000	$ 98.553.000	182	$ 152.964.000
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Isidro - San Lorenzo - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	14,0	28	Terrestre	1 Microbus	19	42	103	$ 826.000	$ 920.000	$ 34.692.000	$ 94.760.000	182	$ 146.112.000
	52	E.E.R. - Vista Claras - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	24	48	Terrestre	1 Microbus	9	42	103	$ 918.000	$ 990.000	$ 38.556.000	$ 101.826.000	182	$ 157.248.000
	53	E.E.E. - La Esperanza - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	36	62	Terrestre	1 Microbus	8	42	103	$ 867.000	$ 957.000	$ 36.414.000	$ 98.553.000	182	$ 152.964.000
E.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puerto Arokamo - Tres Chorros - Doña La Arcadia - Doña Consuelo - Doña La Esperanza y Diversas	22,0	48,0	Terrestre	1 Buseta	22	42	103	$ 826.000	$ 908.000	$ 34.692.000	$ 93.436.000	182	$ 154.350.000
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Doña Rafael Rafael - La Brecha - Finca Klab - Hospicio - Doña Romula Gallegos y Viverdes	10,1	24,3	Terrestre	1 Buseta	22	42	103	$ 864.000	$ 1.000.000	$ 36.288.000	$ 103.000.000	182	$ 159.426.000
Municipio de Puerto Nare							67			$ 4.764.000	$ 5.775.000	$ 200.088.000	$ 595.350.000		$ 1.470.360.000
	1	Hacienda El Salvador - Refugio Sanchez - Doña Educativa La Granja - Manga De Coleo - Doña El Paraiso - Doña José Teodoro Rendón - Doña José Antonio Restrepo y Diversas	45	90	Terrestre	2 Microbuses	50	42	103	$ 1.600.000	$ 1.770.000	$ 67.200.000	$ 182.310.000	182	$ 330.300.000

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Cantidad de Beneficiarios Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Transporte	Planillas	% Valor Total 2026	% Valor Mes Inicial	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. PEDRO NEL JIMENEZ	37	La Tienda de San Jose - La "Y" de Guayacanes - San Juan de la Ternera - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	20	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 21.040.000	$ 21.040.000	$ 0	14,31%	16,70%	103	49	$ 147.288.000	74,89%
	38	Mata de Caña - Santa Isabel - Santa Clara - Los Colores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	34	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 22.360.000	$ 22.360.000	$ 0	14,47%	16,60%	102	48	$ 150.156.000	74,55%
	39	El Recreo - El Carmen - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	19	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 22.080.000	$ 22.080.000	$ 0	14,47%	16,70%	103	48	$ 148.308.000	74,55%
	40	La Gloria - El Retiro - Vías Veredales - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	19	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 17.085.000	$ 17.085.000	$ 0	14,47%	16,69%	102	48	$ 119.829.000	74,55%
	41	Centro - Retiro - Puerta Jordán - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	20	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 22.067.000	$ 22.067.000	$ 0	14,47%	16,69%	102	48	$ 150.726.000	74,04%
	42	La "Y" - Centro - Finca San Cayetano - Fundadores - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	47	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 20.995.000	$ 20.995.000	$ 0	14,47%	16,70%	102	48	$ 148.869.000	74,62%
	43	Pinar Buenaventura - Isaac Ana Buritica - Puente Colorado - El Pajonal - I.E. Pedro Nel Jiménez y Diversas	19	17	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 22.001.000	$ 22.001.000	$ 0	14,47%	16,69%	102	48	$ 169.830.000	74,62%
C.E. RODEITO EL VIGIA	44	Salazar - C.E. Antiguos El Vigía y Diversas	45	17	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 36.350.000	$0	$ 36.350.000	14,57%	16,82%	109	33	$ 404.350.000	76,64%
	45	Campanos - El Campanero - C.E. Antiguos El Vigía y Diversas	47	17	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 22.360.000	$ 22.080.000	$ 0	14,47%	16,79%	109	33	$ 147.189.000	76,68%
I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU	46	Puente Colonia - Apartado 81 - Los Encinos - Buena Suerte - I.E. Infantes en Avanzada y Diversas	34	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.040.000	$ 11.040.000	$ 0	13,89%	7,50%	115	43	$ 160.491.000	72,90%
	47	El Yolaza - I.E. Infantes Apartado y Diversas	48	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 17.640.000	$ 17.640.000	$ 0	13,89%	7,85%	115	43	$ 150.549.000	72,92%
HELIMEN DEL LLANO	48	La Pita - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	37	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.979.000	$ 11.959.000	$ 0	13,89%	7,50%	115	43	$ 165.734.000	72,90%
	49	Tatama - Campanario - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	21	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 13.702.000	$ 13.702.000	$ 0	13,89%	7,84%	115	43	$ 133.740.000	72,90%
	50	Guayacán - Chalarcan - La Unión - Palo Negro - Manzanares - I.E. Infantes de Apartado y Diversas	19	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.484.000	$ 11.484.000	$ 0	13,89%	7,50%	115	43	$ 163.542.000	72,90%
I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ	51	San Isidro - San Lorenzo - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	1	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.376.000	$ 11.076.000	$ 0	13,89%	7,55%	115	43	$ 157.002.000	72,90%
	52	E.E.R. - Vista Claras - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	10	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.880.000	$ 11.880.000	$ 0	13,89%	7,55%	115	43	$ 164.766.000	72,90%
	53	E.E.E. - La Esperanza - I.E. Infantes de Arboleda y Diversas	11	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 11.484.000	$ 11.484.000	$ 0	13,89%	7,50%	115	43	$ 163.542.000	72,90%
E.E. SAN JUAN BOSCO	54	Puerto Arokamo - Tres Chorros - Doña La Arcadia - Doña Consuelo - Doña La Esperanza y Diversas	39	15	7-8-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 14.970.000	$ 14.970.000	$ 0	13,89%	9,49%	111	51	$ 167.754.000	67,80%
C.E. ROMULO GALLEGOS	55	Doña Rafael Rafael - La Brecha - Finca Klab - Hospicio - Doña Romula Gallegos y Viverdes	46	17	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24-27-28-29-30-31	$ 17.985.000	$ 17.985.000	$ 0	14,47%	16,69%	119	56	$ 191.844.000	79,14%
Municipio de Puerto Nare						$ 15.737.000	$ 15.697.000	$ 13.360.000	0,97%	1,00%			$ 193.511.000	71,40%
	1	Hacienda El Salvador - Refugio Sanchez - Doña Educativa La Granja - Manga De Coleo - Doña El Paraiso - Doña José Teodoro Rendón - Doña José Antonio Restrepo y Diversas	50	13	8-7-9-10-14-15-16-17-21-22-23-24	$ 25.089.000	$ 25.089.000	$ 0	15,60%	9,69%	121	47	$ 359.184.000	74,18%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	Nro. Ruta	Recorrido	Distancias (Kms) Ida	Distancias (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	Nro. de Beneficiarios	Días de Ejecución 2025	Días de Ejecución 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Costo Anual	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Total Anticipo	Planillas	% Valor Total 2026	% Valor Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JOSE ANTONIO SALAS	3	Rosa Blanca - Rincón Santa Fe - Sede Estancia San José - Finca Cabrera y Viviendas	15,8	30,6	Terrestre	1 Camioneta	10	40	125	$ 764.500	$ 831.000	$ 32.060.000	$ 99.340.000	140	$ 131.325.000	10	10	4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22,23,24	$ 10.781.000	$ 10.781.000	$ 0	10,83%	8,19%	115	25	$ 85.767.000	77,66%
	5	Finca El Tenedor - Finca El Destino - El Peligro - La Bendición - La Cosecha - Sede Aguabella y Viviendas	26	40	Terrestre	1 Camioneta	10	40	125	$ 760.000	$ 844.000	$ 32.150.000	$ 101.330.000	140	$ 134.940.000	14	10	6,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24	$ 10.972.000	$ 10.972.000	$ 0	10,83%	8,19%	117	40	$ 96.998.000	71,82%
	4	Sector sur Cementerio - Sede La Virgen y Viviendas	20,7	41,4	Rural	1 Bus	10	40	125	$ 1.050.000	$ 1.160.000	$ 44.120.000	$ 138.000.000	140	$ 182.120.000	4	8	14,15,16,17,21,22,23,24	$ 9.200.000	$ 0	$ 9.200.000	8,67%	5,04%	108	33	$ 131.370.000	86,61%
	6	Finca El Pajaronal - El Arrebol - La Campesina - I.E. José Antonio Galán - Viviendas	8,7	17,4	Terrestre	1 Camioneta	10	40	125	$ 760.000	$ 850.000	$ 30.130.000	$ 102.340.000	140	$ 133.420.000	10	10	4,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24	$ 11.070.000	$ 11.070.000	$ 0	10,83%	8,19%	120	40	$ 99.690.000	74,94%
	8	Finca Mandi - Sede La Virgen y Viviendas	20,4	40,8	Rural	1 Bus	11	40	125	$ 1.150.000	$ 1.150.000	$ 51.980.000	$ 150.000.000	140	$ 211.280.000	7	8	14,15,16,17,21,22,23,24	$ 10.640.000	$ 0	$ 10.640.000	8,67%	5,04%	111	18	$ 117.620.000	88,79%
Municipio de Pedral							1.317			$ 87.431.000	$ 91.192.000	$ 2.211.903.000	$ 370.640.000		$ 2.720.697.000	9995	10.934	15.16	$ 917.414.000	$ 917.414.000	$ 0	10,10%	8,94%			$ 825.384.000	75,31%
I.E. ALEJANDRO HUMBOLDT	7	Santa Rosa - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	19,4	32,8	Terrestre	1 Microbus	14	40	130	$ 800.000	$ 900.000	$ 31.000.000	$ 100.000.000	140	$ 132.000.000	11	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 14.100.000	$ 14.100.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 97.800.000	73,47%
	2	San José Obrero - Progreso - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	10	20	Terrestre	1 Microbus	11	40	130	$ 800.000	$ 880.000	$ 31.000.000	$ 104.000.000	140	$ 135.920.000	8	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 14.704.000	$ 14.704.000	$ 0	14,17%	10,73%	170	40	$ 100.640.000	73,95%
	3	Cielo Sede - Las Brisas - Hato Nuevo - Hato Carretera Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	15,1	29,7	Terrestre	1 Buseta	25	40	130	$ 900.000	$ 1.000.000	$ 34.000.000	$ 130.400.000	140	$ 165.340.000	20	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.000.000	$ 17.000.000	$ 0	14,17%	10,73%	170	40	$ 116.000.000	70,34%
	4	Las Delicias - Las Vegas - Sabaneticos - La Gabriela - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	30,7	53,4	Terrestre	1 Buseta - 1 Escolar	48	40	130	$ 1.170.000	$ 1.300.000	$ 51.000.000	$ 156.000.000	140	$ 202.700.000	34	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 27.030.000	$ 27.030.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 184.380.000	72,80%
	8	Paraíso - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	15,03	30,06	Terrestre	1 Microbus	19	40	130	$ 800.000	$ 900.000	$ 30.640.000	$ 119.400.000	140	$ 155.940.000	11	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.810.000	$ 15.810.000	$ 0	14,17%	10,73%	170	40	$ 115.050.000	73,80%
	6	Bajo Quinput - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	14,03	28,06	Terrestre	1 Buseta	24	40	130	$ 900.000	$ 1.007.000	$ 36.234.000	$ 130.840.000	140	$ 163.980.000	22	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.119.000	$ 17.119.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 118.157.000	72,06%
	1	Caserío La Pichosera - Vereda La Rana - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	15,7	31,4	Terrestre	1 Bus	35	40	130	$ 1.145.000	$ 1.320.000	$ 46.280.000	$ 148.200.000	140	$ 196.280.000	44	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 22.660.000	$ 22.660.000	$ 0	14,17%	10,73%	170	40	$ 142.193.000	72,95%
	9	Las Juntas - La Soriana - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	17,3	35	Terrestre	1 Buseta	21	40	130	$ 970.000	$ 1.040.000	$ 40.834.000	$ 138.400.000	140	$ 180.334.000	33	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.765.000	$ 17.765.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 121.269.000	72,50%
	8	El Manzano - Central - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	22,34	45,68	Terrestre	1 Buseta	20	40	130	$ 960.000	$ 1.040.000	$ 42.330.000	$ 124.800.000	140	$ 169.330.000	14	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.680.000	$ 17.680.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 126.648.000	73,95%
	10	Alto Jordán - Pamplona - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	22,3	44,6	Terrestre	1 Buseta	23	40	130	$ 970.000	$ 1.050.000	$ 40.690.000	$ 135.000.000	140	$ 180.690.000	23	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.850.000	$ 17.850.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 121.600.000	73,90%
	11	General - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	14,6	29	Terrestre	1 Bus	28	40	130	$ 1.100.000	$ 1.170.000	$ 46.760.000	$ 140.000.000	140	$ 186.760.000	40	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 19.879.000	$ 19.879.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 126.200.000	73,98%
	12	Vereda San Francisco - La Gabriela - I.E. Alejandro Humboldt - Sede Cruces Oliveros Colorado - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	32	64	Terrestre	1 Microbus	14	40	130	$ 900.000	$ 1.000.000	$ 36.000.000	$ 130.000.000	140	$ 166.000.000	34	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.680.000	$ 17.680.000	$ 0	14,17%	10,73%	170	40	$ 118.440.000	73,94%
	13	Almacén - Puente Roto - I.E. Alejandro Humboldt - Sede Cruces Colorado - I.E. Alejandro Humboldt y Viviendas	24,1	48,2	Terrestre	1 Microbus	14	40	130	$ 900.000	$ 1.000.000	$ 36.810.000	$ 130.400.000	140	$ 146.210.000	31	17	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 16.660.000	$ 16.660.000	$ 0	14,17%	10,68%	170	40	$ 126.760.000	73,68%
I.E. TIERRA VERDE	14	Puente Real - San Pedro - Arrecife - I.E. Tierra Verde y Viviendas	11	22	Terrestre	2 Buses	100	40	130	$ 4.250.000	$ 4.740.000	$ 170.850.000	$ 568.500.000	140	$ 747.720.000	100	14	6,7,9,14,15,17,21,22,24,27,28,29,30,31	$ 66.360.000	$ 66.360.000	$ 0	11,67%	8,87%	170	44	$ 526.160.000	70,37%
	15	Puente Alto - Colinas - I.E. Tierra Verde y Viviendas	6	12	Terrestre	2 Busetas	80	40	130	$ 1.900.000	$ 1.970.000	$ 73.900.000	$ 230.000.000	140	$ 303.900.000	81	14	6,7,9,14,15,17,21,22,24,27,28,29,30,31	$ 37.950.000	$ 37.950.000	$ 0	11,67%	8,87%	170	44	$ 225.750.000	74,26%
	16	El Refugio - El Nevado - I.E. Tierra Verde y Viviendas	8	16	Terrestre	1 Buseta	24	40	130	$ 900.000	$ 970.000	$ 36.040.000	$ 110.000.000	140	$ 133.840.000	32	14	6,7,9,14,15,17,21,22,24,27,28,29,30,31	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 0	11,67%	8,87%	170	44	$ 152.160.000	72,32%
	17	Pie de Cerro - Cordero - I.E. Tierra Verde y viviendas	3,2	7	Terrestre	1 Buseta	24	40	130	$ 900.000	$ 970.000	$ 36.180.000	$ 107.400.000	140	$ 133.640.000	31	14	6,7,9,14,15,17,21,22,24,27,28,29,30,31	$ 13.000.000	$ 13.000.000	$ 0	11,67%	8,87%	170	44	$ 152.640.000	72,32%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Km) Ida	Distancia (Km) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	Hrs. de Clase 2025	Hrs. de Clase 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Calendario 2026	Días Ejecutados	Valor Total 2026	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2026	% Valor Mes 2026	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
I.E. PABLO VI	16	La Sara - El Sombrero - Los Leos - Cruce - I.E. Pablo VI - y Veranera	18.83	33.26	Terrestre	1 Buseta	21	43	120	$ 690.000	$ 1.069.500	$ 41.538.000	$ 127.800.000	162	$ 169.338.000	12	15	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 19.170.000	$ 19.170.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	21	$ 139.833.000	78,73%
	15	La Comuna - Las Flores - I.E. Pablo VI y Veranera	7.98	15.15	Terrestre	1 Microbús - 2 Escolares	44	43	120	$ 1.370.000	$ 1.620.000	$ 60.430.000	$ 180.360.000	153	$ 256.180.000	33	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.324.000	$ 29.304.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 199.344.000	78,72%
	22	La Pradera - La Victoria - I.E. Pablo VI y Veranera	8.41	17.03	Terrestre																						
	31	Parque Central Portal - Palo de Agua - La Sabana - Las Palmas - I.E. Pablo VI y Veranera	15.4	30.8	Terrestre	2 Buseta	80	43	120	$ 1.845.000	$ 1.969.000	$ 97.485.000	$ 236.280.000	153	$ 348.285.000	75	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.300.000	$ 33.300.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 242.985.000	69,72%
	33	Asentamiento Juanito Portal - I.E. Pablo VI y Veranera	14.8	29.6	Terrestre	2 Buseta	80	43	120	$ 1.825.000	$ 1.979.000	$ 78.450.000	$ 236.400.000	153	$ 314.850.000	34	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.480.000	$ 33.480.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 240.180.000	76,32%
	35	Portal Sabanas - Guaimaro Bajo - Delta Sector Bellavista y Veranera	15.2	30.4	Terrestre	1 Buseta - 2 Escolares	80	43	120	$ 1.440.000	$ 1.500.000	$ 60.570.000	$ 180.000.000	153	$ 240.570.000	28	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.660.000	$ 33.660.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 194.940.000	76,74%
I.E. HONDURAS NARAGUAN	24	Casa Hilgard Tabla - Cerro Naragua y Veranera	37	62	Terrestre	1 Buseta	35	43	120	$ 1.656.000	$ 1.820.000	$ 72.000.000	$ 218.400.000	153	$ 290.400.000	13	0	8,7,9,10	$ 0.400.000	$ 0.400.000	$ 0	4,12%	3,04%	99	54	$ 101.120.000	86,84%
	25	La Comunidad Pueblo - La Tabaya y Veranera (conectado Ruta No. 24)	29	58	Terrestre	1 Intercarro																					
	26	La Comunidad Palestina - Sitio Naragua y Veranera	31.5	47	Terrestre	1 Bus	36	43	120	$ 1.200.000	$ 1.254.000	$ 52.400.000	$ 150.330.000	153	$ 205.980.000	24	0	8,7,9,10	$ 0.470.000	$ 0.470.000	$ 0	4,12%	3,04%	99	54	$ 135.624.000	65,87%
	27	La Comunidad Nuevo Cabello - Sitio Naragua y Veranera	26	52	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 824.000	$ 869.000	$ 34.800.000	$ 100.680.000	153	$ 141.550.000	9	0	8,7,9,10	$ 0.440.000	$ 0.440.000	$ 0	4,12%	3,04%	99	54	$ 62.370.000	88,82%
	28	Asentamiento Indígena La Esperanza - Sitio Nuevo Naragua y Veranera	12.5	25	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 780.000	$ 844.000	$ 33.540.000	$ 101.280.000	153	$ 134.160.000	20	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.120.000	$ 15.120.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 69.900.000	74,31%
	29	Asentamiento Indígena Cerro Flores - Sitio Naragua y Veranera	13	26	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 820.000	$ 880.000	$ 34.320.000	$ 105.720.000	153	$ 140.044.000	12	18	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 0	15,00%	11,32%	123	91	$ 104.640.000	74,31%
I.E. PAZ Y ESPERANZA	30	Puerto Gloria - San Francisco - La Palma - El Milagro - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	19	38	Terrestre	1 Buseta y 1 Microbús	40	43	120	$ 1.150.000	$ 1.650.000	$ 73.600.000	$ 228.600.000	153	$ 302.200.000	42	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.150.000	$ 32.190.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 232.848.000	76,33%
	31	Asentamiento La Victoria - Cerro Flores - La Esperanza - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	19	38	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 814.000	$ 870.000	$ 34.450.000	$ 103.380.000	153	$ 138.540.000	18	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 14.520.000	$ 14.520.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 133.938.000	76,33%
	32	San José - Hormiguero - Cerro Azul - El Campo - Cristalina - Tres Esquinas - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	23.1	46.2	Terrestre	2 Buseta	61	43	120	$ 1.360.000	$ 2.000.000	$ 78.600.000	$ 240.000.000	153	$ 320.600.000	45	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 34.650.000	$ 34.650.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 251.756.000	78,53%
	33	Tapiceros - Los Pinos - Mundo Nuevo - Villa Clara - Nuevo Perú - La Granada - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	36.4	72.8	Terrestre	2 Buseta	58	43	120	$ 1.350.000	$ 2.100.000	$ 61.900.000	$ 252.000.000	153	$ 313.900.000	56	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 35.700.000	$ 35.700.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 247.908.000	79,01%
	34	Los Cardenales - Barrio Azul - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	11.4	22.8	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 810.000	$ 870.000	$ 34.180.000	$ 104.280.000	153	$ 139.040.000	16	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 14.520.000	$ 14.520.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 102.564.000	74,32%
	35	Río Caracol - Tabaco Carmen - La Cuba - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	13.1	26.4	Terrestre	1 Microbús	17	43	120	$ 814.000	$ 870.000	$ 34.180.000	$ 104.280.000	153	$ 139.040.000	15	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 14.520.000	$ 14.520.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 102.564.000	74,32%
	36	Los Naranjos - Villa Nueva - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	20	40	Terrestre	1 Microbús	18	43	120	$ 852.000	$ 870.000	$ 36.804.000	$ 113.400.000	153	$ 148.284.000	15	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 108.948.000	74,23%
	37	Brisas de Casimiro - La Embocada - Cerro Azul - Villanueva - El Campo - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	16.1	32.2	Terrestre	1 Buseta	28	43	120	$ 900.000	$ 1.530.000	$ 40.110.000	$ 122.850.000	153	$ 162.710.000	31	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.010.000	$ 17.010.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 121.464.000	74,65%
	38	Santa Isabel - Cerro Amarillo - San Ignacio - Las Esmeraldas - I.E. Paz y Esperanza y Veranera	22.1	41.4	Terrestre	1 Buseta	22	43	120	$ 960.000	$ 1.530.000	$ 41.280.000	$ 122.850.000	153	$ 163.930.000	19	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.010.000	$ 17.010.000	$ 0	14,37%	10,73%	123	91	$ 121.500.000	74,14%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Institución Educativo	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Estudiantes	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Terrestres	Marítimos	% Valor Total 2025	% Valor Mes total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecutado %
	38	Fin Costa - Cenaim - Vda de Pita - Mandarin - I.E. Paz y Esperanza y viceversa	28,0	57,6	Terrestre	1 Bestia	22	40	120	$ 997.000	$ 1.070.000	$ 41.874.000	$ 128.400.000	160	$ 170.274.000	24	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 19.190.000	$ 19.190.000	$ 0	14,17%	10,68%	123	41	$ 125.404.000	74,34%
I.E. INSURGENCIA CIMBRA	44	Vda Llanos - Chanchas - Bosa Alta Bajo - E. Insurgencia Cimbra y viceversa	8,1	16,2	Terrestre	1 Microbús	15	40	120	$ 643.000	$ 814.000	$ 38.016.000	$ 108.960.000	160	$ 113.286.000	30	17	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.530.000	$ 15.530.000	$ 0	14,17%	10,68%	123	41	$ 126.668.000	75,58%
C.E. PALMAPOTO	41	Parque Central Patio - Pueblo Nuevo Tenz - Bosa Palmeras Sabaneta y Viceversa respecto vuelta ida en la mañana nuevo Patio	11,0	20,4	Terrestre	1 Bus - 1 Escalera	70	40	120	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 80.000.000	$ 264.000.000	160	$ 210.280.000	70	18	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0	15,00%	11,33%	123	39	$ 234.888.000	78,46%
Municipio de Puerto Rondón							180			$ 3.714.000	$ 4.184.000	$ 223.890.000	720.960.000		$ 970.848.000	350	70		$ 89.084.000	$ 89.084.000	$ 0	14,63%	9,18%			$ 744.384.000	76,70%
I.E. LA INMACULADA	1	Entrada a Tarapoto - La Esperanza - Sin Ingreso - I.E. La Inmaculada y viceversa	28	56	Terrestre	1 Bestia	28	40	120	$ 993.000	$ 1.060.000	$ 31.884.000	$ 105.150.000	160	$ 169.829.000	28	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24	$ 12.554.000	$ 13.994.000	$ 0	12,62%	8,18%	124	36	$ 126.210.000	76,10%
	2	Finca La Esperanza - El Ortigal - I.E. La Inmaculada y viceversa	21	42	Terrestre	1 Bestia	28	40	120	$ 972.000	$ 1.000.000	$ 31.104.000	$ 120.000.000	160	$ 160.716.000	28	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24	$ 12.350.000	$ 13.260.000	$ 0	12,62%	8,18%	124	36	$ 126.570.000	78,68%
	3	Finca Los Portales - I.E. La Inmaculada y viceversa	14	28	Terrestre	1 Bestia	28	40	120	$ 969.000	$ 1.000.000	$ 32.112.000	$ 120.000.000	160	$ 160.716.000	28	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24	$ 12.350.000	$ 13.260.000	$ 0	12,62%	8,18%	124	36	$ 126.570.000	78,68%
	4	Rancho - El Tambo - I.E. La Inmaculada y Viceversa	23,6	50,6	Terrestre	2 Buses	56	40	120	$ 1.040.000	$ 2.116.000	$ 49.140.000	$ 338.560.000	160	$ 300.340.000	56	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24	$ 27.720.000	$ 27.720.000	$ 0	13,80%	9,88%	111	36	$ 256.230.000	76,80%
	5	El Recreo - I.E. La Inmaculada y Viceversa	15,3	32,6	Terrestre	1 Microbús	14	40	120	$ 633.000	$ 695.000	$ 34.944.000	$ 107.400.000	160	$ 142.344.000	14	13	6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24	$ 11.830.000	$ 11.830.000	$ 0	12,82%	8,47%	124	36	$ 109.224.000	76,11%
Municipio de Sin nombre							1.810			$ 64.987.000	$ 80.341.000	$ 2.600.664.000	7.697.920.000		$ 10.374.000.000	1810	14.34285686		$ 903.150.000	$ 913.450.000	$ 54.500.000	10,42%	8,81%			$ 7.284.697.000	70,24%
I.E. ANTONIO NARIÑO	1	Vereda Buenos Aires - Parcelas Finca - Calle Cinco Y Bello Horizonte - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,4	26,8	Terrestre	1 Bus	35	40	120	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 40.700.000	$ 140.400.000	160	$ 188.766.000	35	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 11.700.000	$ 11.700.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 126.893.000	67,40%
	2	Vereda Puerto Murillo - Km 7½ - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,65	31,29	Terrestre	2 Buses	56	40	120	$ 1.650.000	$ 1.980.000	$ 77.700.000	$ 316.800.000	160	$ 317.100.000	56	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 19.050.000	$ 19.050.000	$ 0	9,50%	6,29%	111	31	$ 212.343.000	67,04%
	3	Vereda Brisas Bajo Elvis - Churu Bajo Km Nueve Alberto - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	12,7	25,4	Terrestre	2 Buses	44	40	120	$ 1.054.000	$ 2.005.000	$ 115.140.000	$ 348.000.000	160	$ 481.148.000	44	13	6,7,8,9,10,13,14,17,20,22,24,27,28,30,31	$ 26.000.000	$ 29.900.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 213.348.000	67,00%
	4	Caño Tigre Medio - Brisas del Banadero - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	21	42	Terrestre	1 Microbús	14	40	120	$ 656.000	$ 809.000	$ 55.552.000	$ 113.760.000	160	$ 148.719.000	14	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 8.320.000	$ 8.320.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 89.440.000	67,04%
	5	El Recreo - El Barrio - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	12,3	36,4	Terrestre	1 Bus	35	40	120	$ 1.130.000	$ 1.227.000	$ 47.784.000	$ 147.240.000	160	$ 190.876.000	35	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 12.370.000	$ 12.370.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 120.468.000	67,00%
	6	Zona Industrial - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,8	30	Terrestre	2 Buses	70	40	120	$ 1.100.000	$ 2.280.000	$ 88.200.000	$ 316.200.000	160	$ 371.460.000	70	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 23.660.000	$ 23.660.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 237.918.000	67,04%
	7	Vereda Agua Santa La Antigua - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	14,8	29,6	Terrestre	1 Microbús	14	40	120	$ 637.000	$ 809.000	$ 34.860.000	$ 106.560.000	160	$ 141.288.000	14	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 8.660.000	$ 8.660.000	$ 0	9,30%	6,29%	111	31	$ 90.948.000	67,00%
	8	La Esperanza - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	15,7	29,4	Terrestre	1 Microbús	15	40	120	$ 633.000	$ 800.000	$ 39.975.000	$ 108.000.000	160	$ 142.878.000	17	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 9.600.000	$ 9.600.000	$ 0	9,60%	6,29%	111	31	$ 97.178.000	67,62%
	9	Vereda La Jarra - I.E. Antonio Nariño y Viceversa	13,8	27,5	Terrestre	1 Buseta	30	40	120	$ 631.000	$ 696.000	$ 30.000.000	$ 110.520.000	160	$ 138.228.000	19	13	6,7,8,9,20,24,27,28,30,31	$ 9.660.000	$ 9.660.000	$ 0	9,60%	6,29%	111	31	$ 127.500.000	67,60%
	10	Vereda Caño Rojo Medio - Caño Perla - La Cuesta - I.E. José Celi Lizarazo y Viceversa	7,6	15,2	Terrestre	1 Bus	35	40	120	$ 1.040.000	$ 1.170.000	$ 49.780.000	$ 140.400.000	160	$ 187.200.000	35	15	6,8,10,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 16.884.000	$ 16.884.000	$ 0	13,50%	10,67%	121	41	$ 158.601.000	74,19%
	11	Escuela La Estrella - La Reserva - Bienvenidos Campesinos Desplazados - I.E. José Celi Lizarazo y Viceversa	17,6	35	Terrestre	1 Microbús - 1 Escalera	35	40	120	$ 1.200.000	$ 1.368.000	$ 57.000.000	$ 191.700.000	160	$ 214.200.000	35	15	6,8,10,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 21.060.000	$ 21.060.000	$ 0	13,33%	10,67%	121	41	$ 198.000.000	74,21%
	12	Vereda Alto Pauta - La Chalupa - I.E. José Celi Lizarazo y Viceversa	9,8	19,2	Terrestre	1 Bus	35	40	120	$ 1.000.000	$ 1.152.000	$ 49.980.000	$ 141.840.000	160	$ 191.808.000	37	15	6,8,10,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 16.812.000	$ 18.012.000	$ 0	13,33%	10,67%	121	41	$ 180.969.000	74,20%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

Establecimiento Educativo	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículo	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad Estudiantes Matriculados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Tarifa/mes	Pasajeros	% Valor Total 2025	% Valor Mes Total	Total Días Trabajados	Días sin Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. JOSE OSIEL LONDOÑO	13	Vereda San Rafael - I.E. José Osiel Londoño y Alrededor	19	37	Terrestre	1 Bus	34	43	103	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 43.000.000	$ 141.640.000	103	$ 197.000.000	31	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.913.000	$ 10.913.000	0,0	10,00%	10,67%	101	41	$ 120.268.600	16,22%
	14	Vereda el Carmelo - La Ye de Campo Alegre - Puerto Estrella - Vereda Viel - I.E. José Osiel Londoño - Alto Pitalito (Fina del Colegio lo Confirma y Volvemos	30,4	60,8	Terrestre	2 Buses - 1 Camioneta	76	43	103	$ 3.150.000	$ 3.300.000	$ 135.300.000	$ 407.400.000	103	$ 529.700.000	76	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 44.220.000	$ 44.220.000	0,0	13,00%	10,00%	101	41	$ 400.525.000	14,21%
	15	Vereda El Carmelo - La Ye de Campo Alegre - Puerto Estrella - Vereda Viel - I.E. José Osiel Londoño y Alrededor	20	40	Terrestre	1 Bus	38	43	103	$ 1.100.000	$ 1.210.000	$ 47.300.000	$ 140.200.000	103	$ 192.331.000	38	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.360.000	$ 15.360.000	0,0	13,33%	10,67%	101	41	$ 142.704.000	14,30%
	16	Alto 1 - Alto 2 - Corrientes - I.E. José Osiel Londoño y Alrededor	9	18	Terrestre	1 Buseta	28	43	103	$ 880.000	$ 968.000	$ 37.840.000	$ 108.160.000	103	$ 152.676.000	28	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.448.000	$ 10.448.000	0,0	12,28%	10,67%	101	41	$ 114.155.000	74,74%
	17	Vereda Quebrada - Alto San Joaquín - Pie Bendito - Chaparro - Las Cintas Balcones - I.E. José Osiel Londoño y Alrededor	22,2	44,4	Terrestre	1 Buseta	29	43	103	$ 925.000	$ 1.017.500	$ 39.814.000	$ 120.250.000	103	$ 159.258.000	29	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.032.000	$ 10.032.000	0,0	12,33%	10,67%	101	41	$ 135.135.000	74,32%
	18	La Virgen - Casa El Pescado - Pampa Seca - Rombos Escobar - Carrera 13 - Sitio Mayor vulnerable y Alrededor	10,6	21	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	54	43	103	$ 1.400.000	$ 1.500.000	$ 60.417.000	$ 180.000.000	103	$ 264.417.000	47	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.800.000	$ 20.800.000	0,0	13,00%	10,00%	101	38	$ 189.841.000	78,15%
	19	Rombos Escobar - Ye de Occidente - Calle 20 - Carrera 12 - Calle Alto Vulnerable y Alrededor	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	53	43	103	$ 1.450.000	$ 1.600.000	$ 62.300.000	$ 185.500.000	103	$ 273.150.000	49	11	8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.000.000	$ 23.000.000	0,0	13,33%	10,08%	101	38	$ 196.196.000	78,15%
I.E. VILLA GEORIA	20	Vereda Puerto Rico - El Pescado - Oeste - I.E. Villa Gerlia y Alrededor	11	22	Terrestre	1 Bus y 1 Buseta	63	43	103	$ 1.300.000	$ 2.133.000	$ 85.100.000	$ 259.000.000	103	$ 329.000.000	63	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 30.030.000	$ 30.000.000	0,0	14,17%	10,70%	102	40	$ 353.000.000	74,63%
	21	Puerto Caldera - I.E. Villa Gerlia y Alrededor	14,24	28,08	Terrestre	2 Buses - 2 Busetas y 1 Buseta	182	43	103	$ 4.300.000	$ 4.740.000	$ 184.500.000	$ 568.600.000	103	$ 753.100.000	182	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 80.080.000	$ 80.080.000	0,0	14,07%	10,70%	122	40	$ 569.706.000	74,63%
	22	Vereda El Remolino - I.E. Villa Gerlia y Alrededor	8,7	17,4	Terrestre	2 Busetas	60	43	103	$ 1.100.000	$ 1.500.000	$ 71.013.000	$ 227.400.000	103	$ 314.010.000	60	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 23.040.000	$ 23.000.000	0,0	14,47%	10,70%	122	40	$ 235.470.000	74,92%
	23	La Pilar - I.E. Villa Gerlia y Alrededor	5,5	11	Terrestre	1 Bus	21	43	103	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 33.100.000	$ 141.400.000	103	$ 197.000.000	29	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 23.040.000	$ 23.040.000	0,0	14,57%	10,70%	122	40	$ 135.135.000	68,58%
	24	Entrada - Dale Adelante - I.E. Villa Gerlia y Alrededor	17,7	35,4	Terrestre	1 Bus	33	43	103	$ 1.107.000	$ 1.218.000	$ 47.300.000	$ 145.500.000	103	$ 193.134.000	29	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30	$ 23.020.000	$ 23.020.000	0,0	14,57%	10,68%	122	40	$ 134.934.000	69,84%
I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	25	Finca Los Lucitos - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Alrededor	9,12	18,24	Terrestre	1 Bus	38	43	103	$ 1.000.000	$ 1.170.000	$ 40.750.000	$ 141.680.000	103	$ 197.000.000	38	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.040.000	$ 23.023.000	0,0	14,57%	10,72%	110	40	$ 139.809.000	71,04%
	26	Las Brisas - Cooperativa - La Palosa - El Triangulo - Calle 20 - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Alrededor	15,4	30,8	Terrestre	1 Bus	38	43	103	$ 1.140.000	$ 1.236.000	$ 49.210.000	$ 149.600.000	103	$ 199.776.000	38	11	8,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.364.000	$ 23.364.000	0,0	15,38%	11,52%	110	40	$ 140.940.000	70,55%
	27	Puente Bajoba - Vereda Cuchi Negro - Sabaneta - Concentración de Desarrollo Rural y Alrededor	17,61	35,22	Terrestre	1 Bus	38	43	103	$ 1.140.000	$ 1.236.000	$ 49.210.000	$ 149.600.000	103	$ 199.776.000	38	11	8,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.364.000	$ 23.364.000	0,0	15,38%	11,52%	110	40	$ 140.940.000	70,55%
	28	Barrios Unidos - Cañon - Trinquete - El Ye - Cristo - Edificio el Sendero - Carrera 13 - Rombos - Cuesmar - Concentración de Desarrollo Rural y Alrededor	11,8	23,6	Terrestre	1 Bus	35	43	103	$ 1.140.000	$ 1.236.000	$ 49.210.000	$ 139.360.000	103	$ 267.976.000	33	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 23.016.000	$ 23.016.000	0,0	11,47%	10,00%	110	40	$ 140.460.000	78,97%
	29	Planta de Tratamiento de ECOAS - Estadero Los Naranjos - La Y de la Virgen - Entrada a los Balcones - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Alrededor	7	14	Terrestre	1 Buseta	28	43	103	$ 925.000	$ 1.017.500	$ 39.015.000	$ 120.250.000	103	$ 159.258.000	28	11	8,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.233.000	$ 17.834.000	0,0	11,11%	10,72%	110	40	$ 110.199.000	71,66%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 394 DE 2025

JULIO 2025

Establecimiento Educativo	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículo	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Transportes	Planillas	% Valor Total 2025	% Valor Total	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
	40	Madrid - La Cumbre - Hugo Chávez - El Triángulo - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viverista.	4,2	8,4	Turnestre	1 Bus	35	60	100	$ 1.080.000	$ 1.179.000	$ 48.780.000	$ 101.400.000	160	$ 167.280.000	35	17	9,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.040.000	$ 20.040.000	$ 0	14,37%	16,70%	115	45	$ 155.820.000	71,24%
	41	Mata - Puerto Nariño - Chiquinquirá - Los Ramones y Viverista	21,2	42,4	Turnestre	1 Bus	35	60	100	$ 970.000	$ 1.047.000	$ 48.740.000	$ 105.840.000	160	$ 168.580.000	35	17	9,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.790.000	$ 17.790.000	$ 0	14,37%	16,70%	115	45	$ 155.460.000	74,25%
	42	Vereda El Cimbarro - Barrio 20 de Julio - Barrio 4 de Diciembre - I.E. Concentración de Desarrollo Rural y Viverista	5,47	10,94	Turnestre	1 Bus	35	60	100	$ 833.000	$ 899.000	$ 33.320.000	$ 113.900.000	160	$ 168.150.000	35	17	9,7,8,9,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 15.980.000	$ 15.980.000	$ 0	14,37%	16,70%	115	45	$ 155.760.000	71,05%
	53	Casa Comunitaria Indígena - Centro Educativo Tatacoa - Divisa y Viverista	11	22	Turnestre	1 Bus y 1 Buseta	65	60	100	$ 2.070.000	$ 2.340.000	$ 87.570.000	$ 159.900.000	160	$ 268.470.000	65	11	7,8,9,10,14,15,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 34.540.000	$ 34.540.000	$ 0	9,17%	6,92%	135	45	$ 281.808.000	75,08%
	54	La Tatacoa - Centro Educativo Tatacoa - Divisa y Viverista	10,5	21,0	Turnestre	1 Bus	35	60	100	$ 1.300.000	$ 1.102.000	$ 46.800.000	$ 110.200.000	160	$ 157.000.000	35	11	7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 13.000.000	$ 13.000.000	$ 0	8,13%	4,55%	100	45	$ 139.320.000	71,28%
I.E. INDIGENA TUTUNDUMA SWAKARA	39	Comunidad Cerro Alto - Comunidad Casillas Calahua - Comunidad Indígena - Centro Educativo Tatacoa - Divisa y Viverista. Esta ruta se realiza cada 15 días	55,0	117,0	Turnestre	1 Bus	20	3	11	$ 2.700.000	$ 2.911.000	$ 10.800.000	$ 32.021.000	15	$ 48.021.000	17	5	0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	15	0	$ 48.021.000	100,00%
		Abastecimiento Comunidad Quebrada	5,0	10,0		1 Camioneta																					
		Abastecimiento Comunidad Cerro Alto Medio	20	40		1 Camioneta																					
	56	Cerro Indígena San Pedro (Guipas) - Cerro Indígena - Cerro Indígena El Mundo (Vía Aeropuerto) - Cerro Indígena Tatacoa Divisa y Viverista. Esta ruta se realiza cada 15 días.	165	330	Turnestre	1 Buseta	24	3	11	$ 3.250.000	$ 3.565.000	$ 10.350.000	$ 39.599.000	15	$ 54.000.000	20	1	3,15	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 0	6,66%	0,00%	15	0	$ 54.000.000	100,00%
		Abastecimiento Comunidad Laguna Tatacoa	10,0	20		1 Camioneta																					
		Abastecimiento Comunidad Cerro Central - Barrio Los Olivos	9,4	18,8		1 Camioneta																					
I.E. JOSE GUSTAVO GUERRA	51	Vereda Los Pavones - Colonia - Miraflores - Mata - Mulato - Triángulo - I.E. José Gustavo Rivera y Viverista	16,0	32	Turnestre	1 Bus	35	60	100	$ 1.280.000	$ 1.119.000	$ 48.000.000	$ 141.480.000	160	$ 167.300.000	35	16	9,7,8,9,14,15,16,17,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 18.624.000	$ 18.624.000	$ 0	13,35%	10,07%	115	45	$ 129.915.000	89,17%
	38	Invasión La Paz - Vía Circunvalar - La Unión - 20 de Julio - Calle 20 - Cementerio del Norte - Entrada del Norte - Bellavista - I.E. José Gustavo Rivera y Viverista	5,6	11,6	Turnestre	1 Bus + 1 Escolinda	70	60	100	$ 1.491.000	$ 1.722.000	$ 87.014.000	$ 159.640.000	160	$ 276.714.000	70	16	9,7,8,9,14,15,16,17,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 27.552.000	$ 27.552.000	$ 0	13,56%	10,07%	115	45	$ 190.599.000	68,17%
	55	Barrio San Luis - Los Pinos - Barrio Mulalo - Barrio Villa Fanny - Planeta Rica - Vía Jose Gustavo Rivera y Viverista	4,0	8	Turnestre																						
	46	Barrio Hugo Chavez - Barrio La Victoria - Barrio La Cumbre - Calle 10 - Salud Pública Privada - Terminal - Carrera 11 - Calle 13 - Bombay Coquetal - I.E.T.I. - Salud Pública y Viverista	5	10	Turnestre	1 Bus - 2 Escolindas	70	60	100	$ 1.167.000	$ 1.722.000	$ 81.914.000	$ 206.640.000	160	$ 274.714.000	70	16	9,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.600.000	$ 33.600.000	$ 0	16,39%	11,20%	115	45	$ 188.600.000	72,99%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. XXX DE 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Contratado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Terrestres	Fluviales	% Valor Total 2025	% Valor Pbto XXXI	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutados	Porcentaje Ejecución %
I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL PONBO	41	Terminal de la 20 - Sede Pontes Primaria - Via 20 con Cra 20(Descanse en la a la Avenida 10 a Negrón - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viviendas	4.5	9	Terrestre																						
	42	Puerta Roja - Sede Rafael Sanz - Alta Pensada - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viviendas	9.9	19.8	Terrestre	1 Bus - 2 Busetas	86	42	125	$ 1.580.000	$ 1.715.000	$ 66.360.000	$ 300.260.000	163	$ 373.370.000	93	93	8,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.942.000	$ 39.942.000	$ 0	10,29%	11,32%	118	43	$ 406.362.000	72,95%
	44	Parque del Prado - Parque José Vicente Via a la 20 - Puerta 12 - I.E.T.I. Rafael Pombo y Viviendas	3	6	Terrestre																						
I.E. ALTO GRANDA	44	Sede La Primavera - Sede Alto Grande - Sede La Trocha - Sede Alto Grande y Viviendas	11	22	Terrestre	1 Bus	36	42	125	$ 350.000	$ 1.900.000	$ 66.640.000	$ 100.340.000	142	$ 166.980.000	36	36	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.000.000	$ 16.650.000	$ 0	13,33%	10,57%	114	49	$ 171.105.000	39,68%
C.E. MARCO ANTONIO MANTILLA	46	Sector Cotos Grande - Vereda el Remolino - Sector Cocuyongo de la Vereda Condelgas - Sede Educativa Marco Antonio Mantilla y Veredales	18	30	Fluvial	2 Botes	44	42	125	$ 2.340.000	$ 2.339.000	$ 83.880.000	$ 264.600.000	152	$ 350.480.000	44	44	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 36.230.000	$ 0	$ 36.280.000	13,33%	10,57%	114	49	$ 244.050.000	30,60%
C.E. RICARDO NIETO BARBOSA	48	La Y de la Virgen - Sede Los Altos - Sede Rosario Arriba - Carolina y Viviendas	15.4	30.8	Terrestre	1 Bus	28	42	125	$ 320.000	$ 1.902.000	$ 58.016.000	$ 103.240.000	152	$ 158.356.000	10	11	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.000.000	$ 17.004.000	$ 0	13,33%	10,72%	116	38	$ 102.356.000	71,08%
C.E. LA PEUR	47	La Unión - La Pava y Viviendas	8.4	16.2	Terrestre	1 Bus	28	42	125	$ 667.000	$ 667.000	$ 37.254.000	$ 104.940.000	167	$ 152.004.000	25	25	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.220.000	$ 17.220.000	$ 0	13,33%	11,32%	118	49	$ 108.940.000	72,94%
Municipio de Tarso							2.003			$ 58.667.000	$ 96.010.000	$ 3.731.484.000	11.501.140.000		$ 15.343.694.000	2150	16.450.0701		$ 1.535.794.000	$ 1.535.794.000	$ 0	10,34%	10,01%			$ 11.766.837.000	77,14%
I.E. ERNESTO RINCON GUCOM	1	La Cayda - Vuka De Cacao - Sede Cuida - Puerto Tarso - I.E. Ernesto Rincon Guzmán y Viviendas	10.8	22.2	Terrestre	2 Busetas	38	42	125	$ 1.020.000	$ 1.000.000	$ 55.860.000	$ 230.280.000	152	$ 312.910.000	55	55	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.472.000	$ 33.472.000	$ 0	16,67%	10,72%	127	36	$ 244.007.000	77,90%
	2	Vereda La Yuquera - Caño Damián - Bolívar - I.E. Ernesto Rincón Guzmán Y Viviendas	11.2	22.4	Terrestre	1 Buseta	35	42	125	$ 560.000	$ 570.000	$ 30.126.000	$ 117.600.000	162	$ 139.410.000	30	30	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.043.000	$ 10.043.000	$ 0	16,67%	10,66%	127	35	$ 131.301.000	77,96%
	3	Baja Florida - Naranjos - Limoncito - Caño Claro - Bolívar - I.E. Ernesto Rincón Guzmán y Viviendas	22.6	45.2	Terrestre	2 Busetas	64	42	125	$ 3.220.000	$ 3.200.000	$ 121.170.000	$ 301.300.000	152	$ 545.970.000	78	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 0	16,67%	10,72%	127	36	$ 464.701.000	77,96%
	4	Vereda Puerto Tarso - I.E. Ernesto Rincón Guzmán Y Viviendas	13.8	27.6	Terrestre	1 Bote y 1 Buseta	66	42	125	$ 2.180.000	$ 2.211.000	$ 82.250.000	$ 273.920.000	162	$ 360.720.000	48	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 30.007.000	$ 30.007.000	$ 0	16,67%	10,72%	127	36	$ 231.229.000	77,96%
	5	Vereda Alto Grande - Casa De Zinc - I.E. Ernesto Rincón Guzmán Y Viviendas	14	28	Terrestre	1 Bote y 1 Buseta	66	42	125	$ 2.622.000	$ 2.181.000	$ 84.966.000	$ 251.132.000	162	$ 340.885.000	35	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 37.077.000	$ 37.077.000	$ 0	16,67%	10,86%	127	35	$ 276.951.000	77,98%
	6	Sede Javier Rodriguez - Chamizal - Puerto Vivanda - I.E. Ernesto Rincón Guzmán Y Viviendas	14.7	29.4	Terrestre	1 Bus	36	42	125	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 46.200.000	$ 141.540.000	162	$ 187.611.000	48	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.000.000	$ 20.004.000	$ 0	16,67%	10,72%	127	36	$ 148.023.000	77,96%
I.E. ANTONIO RIGAPITE	7	La Bilma - Playa Azul - Arco de Campo Alegre - I.E. Rafael Pombo y Viviendas	14.5	29	Terrestre	1 Buseta	35	42	125	$ 931.000	$ 1.004.000	$ 39.102.000	$ 150.480.000	162	$ 139.501.000	28	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.000.000	$ 17.004.000	$ 0	16,67%	10,72%	125	36	$ 120.436.000	77,33%
	8	San José de Rioverde - Medicito - El Arenito Rosario y Viviendas	6.8	13.4	Terrestre	1 Buseta	35	42	125	$ 680.000	$ 666.000	$ 27.710.000	$ 105.140.000	162	$ 133.616.000	15	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 10.000.000	$ 10.004.000	$ 0	16,67%	10,86%	130	36	$ 130.836.000	77,32%
	9	Vereda Cruz Chiquita - La Manguera - Vuelta Grande - I.E. Antonio Rosario Y Viviendas	20	40	Terrestre	1 Bus - 1 Recorrido	36	42	125	$ 1.400.000	$ 1.420.000	$ 60.480.000	$ 168.360.000	162	$ 234.772.000	48	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 27.254.000	$ 27.254.000	$ 0	16,67%	10,72%	130	36	$ 167.464.000	77,48%
	10	Puerto Esperanza - Centro - La Manguera - El Naranjo Rosario y Viviendas	8.8	17	Terrestre	1 Buseta	33	42	125	$ 600.000	$ 1.002.000	$ 30.240.000	$ 100.240.000	162	$ 130.338.000	22	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 17.004.000	$ 17.004.000	$ 0	16,67%	10,72%	130	36	$ 133.188.000	77,35%
	11	La 4 Cabañas - Santa Inés - Bellavista - El Arenito Rosario y Viviendas	23.2	46.4	Terrestre	1 Bus	33	42	125	$ 1.114.000	$ 1.200.000	$ 46.788.000	$ 144.900.000	162	$ 190.788.000	33	77	5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,27,28,29,30,31	$ 20.400.000	$ 20.400.000	$ 0	16,67%	10,86%	130	36	$ 167.388.000	77,36%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025

JULIO/2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Km) Ida	Distancia (Km) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Capacidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo/ Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planillados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total 2025	Terneros	Flexibles	% Valor Total 2025	% Valor Mensual	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA	12	Mantiguado - Cielo Cuenca - La Vaquita - Cuesta la Puma - Cielo Tiburón - Vivaldi Canelo - I.E. Angelo Rotondi y Viceversa	23,8	45,6	Terrestre	1 Buseta	25	40	120	$ 800.000	$ 1.000.000	$ 41.472.000	$ 127.680.000	160	$ 169.152.000	24	17	8,7,8,9,10,13,15,16,17, 21,22,23,24,27,28,2 9,30,31	$ 19.008.000	$ 19.008.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 130.786.000	77,34%
	13	Via Mondaña - Mocha - Tropicana - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	21,1	42,2	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.336.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	52	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 152.238.000	77,33%
	14	El Viñedo - Cielo Quijada - Jardín Domingo - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	13,9	27,8	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.200.000	$ 1.178.000	$ 48.936.000	$ 141.480.000	162	$ 187.368.000	23	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 20.040.000	$ 20.040.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 149.942.000	77,33%
	15	Pueblo Bravo - La Viveda - La Independencia - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	18	36	Terrestre	1 Bus	30	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.336.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	29	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 20.966.000	$ 20.966.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 151.972.000	77,25%
	16	Cielo Claro - Cielo Tigre - La Viveda - La Asencio - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	11,6	39	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 800.000	$ 1.000.000	$ 42.000.000	$ 126.000.000	151	$ 168.000.000	18	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 17.000.000	$ 17.000.000	$ 0	14,17%	10,70%	120	29	$ 126.000.000	77,35%
	17	Nuevo Destino - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	5,5	11	Terrestre	1 Particular	15	42	120	$ 700.000	$ 800.000	$ 29.400.000	$ 84.000.000	162	$ 113.400.000	8	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 14.525.000	$ 14.525.000	$ 0	14,17%	10,80%	129	29	$ 155.139.000	77,35%
	18	Nuevo Sol - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	1 Microbus	15	42	120	$ 874.000	$ 874.000	$ 34.188.000	$ 105.840.000	162	$ 139.548.000	13	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 18.026.000	$ 18.026.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 137.660.000	77,39%
	19	Bermeja - Nevado Lagos - Cielo Celeste II - Cielo Verde - IPA y Viceversa	22,0	44,0	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 1.000.000	$ 1.100.000	$ 42.000.000	$ 132.300.000	161	$ 168.000.000	22	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 18.700.000	$ 18.700.000	$ 0	14,17%	10,80%	129	29	$ 159.460.000	77,35%
	20	Puerto Alegre - Cielo San José de Caracol - Vía de Santa Isabel - Tropicales - IPA y Viceversa	11,2	36,4	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 800.000	$ 1.040.000	$ 34.384.000	$ 131.040.000	167	$ 168.000.000	46	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 17.170.000	$ 17.170.000	$ 0	14,17%	10,80%	129	29	$ 164.164.000	77,35%
	21	Cielo - Domingo - Palermo - Acacias - Puerta Jordán - IPA y Viceversa	17	34	Terrestre	1 Bus	25	42	120	$ 1.148.000	$ 1.238.000	$ 48.216.000	$ 148.680.000	162	$ 196.776.000	38	17	7,8,9,10,14, 15,16,1 7,21,22,23,24,27,28, 29,30,31	$ 21.046.000	$ 21.046.000	$ 0	14,17%	10,70%	129	29	$ 152.238.000	77,33%
I.E. FILIPINAS	22	Casona - Cielo Domingo - I.E. Filipinas y Viceversa	10,7	19,4	Terrestre	2 Buses	70	42	120	$ 2.160.000	$ 2.160.000	$ 84.840.000	$ 255.000.000	162	$ 373.169.976	73	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 37.760.000	$ 37.760.000	$ 0	10,12%	10,80%	113	43	$ 378.700.000	72,65%
	23	Vivaldo - Nevado - I.E. Filipinas y Viceversa	17,8	35,6	Terrestre	3 Microbuses	90	42	120	$ 1.816.000	$ 2.000.000	$ 76.216.000	$ 240.120.000	165	$ 351.036.000	28	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 50.416.000	$ 50.416.000	$ 0	10,23%	10,87%	113	43	$ 334.800.000	72,65%
	24	Lucerna - I.E. Filipinas y Viceversa	20	40	Terrestre	3 Microbuses	90	42	120	$ 1.816.000	$ 1.824.000	$ 71.832.000	$ 216.960.000	167	$ 304.992.000	26	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 39.184.000	$ 39.184.000	$ 0	10,23%	10,87%	113	43	$ 311.450.000	72,90%
	25	Vivaldo II - Ringo - I.E. Filipinas y Viceversa	10,2	20,4	Terrestre	2 Microbuses	70	42	120	$ 1.624.000	$ 1.700.000	$ 68.292.000	$ 210.000.000	167	$ 273.852.000	47	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 29.848.000	$ 29.848.000	$ 0	10,23%	10,87%	113	43	$ 309.272.000	72,85%
	26	Vivienda las Palmeras - Vivaldo de Ringo - I.E. Filipinas y Viceversa	8,4	16,8	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 905.000	$ 929.000	$ 35.910.000	$ 117.180.000	162	$ 153.139.000	32	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 15.818.000	$ 15.818.000	$ 0	10,23%	10,87%	113	43	$ 119.703.000	72,25%
	27	Vivaldo El Pinabete - I.E. Filipinas y Viceversa	5,2	10,4	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 896.000	$ 960.000	$ 37.716.000	$ 115.164.000	164	$ 153.018.000	13	18	8,9,10,14, 15,16,17 21,22,24,27,28,29,3 0,31	$ 15.488.000	$ 15.488.000	$ 0	10,23%	10,87%	113	43	$ 118.282.000	77,30%
I.E. ANEL SIERRA GONZALEZ	28	Cielorio Mendoza - La Vaquita Tamarindo Medio e Intermedio Materno - I.E. Anel Sierra González y Viceversa	16,8	33,7	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 839.000	$ 1.000.000	$ 39.438.000	$ 121.380.000	162	$ 160.800.000	18	18	8,7,8,9,10,13,14,15,16, 17,21,22,23,24,27,2 8,29,30,31	$ 18.234.000	$ 18.234.000	$ 0	10,39%	11,30%	117	39	$ 109.242.000	77,98%
	29	Vivaldo Los Naranjos - Aguas Claras - Cielo Azul - Vivaldo - I.E. José María Córdoba y Viceversa	16,8	67	Terrestre	1 Camioneta - 2 Busetas	20	42	120	$ 1.107.000	$ 1.248.000	$ 47.334.000	$ 149.520.000	162	$ 193.284.000	21	18	8,7,8,9,10,14,15,16, 17,21,22,23,24,27,2 8,29,30,31	$ 21.660.000	$ 21.660.000	$ 0	10,39%	11,30%	117	39	$ 139.854.000	77,40%
	30	Cielorio - Cielo Francisco Flores - Cielo Celeste - Cielo Francisco Flores - El Viñedo - Cielo Francisco Rojano y Viceversa	26	52	Terrestre	1 Buseta	25	42	120	$ 880.000	$ 1.000.000	$ 41.664.000	$ 120.120.000	162	$ 160.944.000	40	18	8,7,8,9,10,14,15,16, 17,21,22,23,24,27,2 8,29,30,31	$ 18.240.000	$ 18.240.000	$ 0	10,39%	11,30%	117	39	$ 139.998.000	78,00%
	31	Vivaldo II - Cielo Grande - Cielo Celeste - Brisas de Tamarindo - Flores y Viceversa	14,3	28,6	Terrestre	2 Microbuses	30	42	120	$ 1.640.000	$ 1.770.000	$ 68.880.000	$ 213.360.000	162	$ 282.726.000	30	18	8,7,8,9,10,14,15,16, 17,21,22,23,24,27,2 8,29,30,31	$ 32.922.000	$ 32.922.000	$ 0	10,39%	11,30%	117	39	$ 229.410.000	77,99%
	32	La Viveda - Bajo Tamarindo - El Tigre - I.E. José María Córdoba y Viceversa	17,2	34,3	Terrestre	2 Busetas	70	42	120	$ 2.000.000	$ 2.148.000	$ 122.682.000	$ 377.160.000	167	$ 500.262.000	70	18	8,7,8,9,10,14,15,16, 17,21,22,23,24,27,2 8,29,30,31	$ 58.667.000	$ 58.667.000	$ 0	10,39%	11,30%	117	39	$ 359.247.000	77,99%

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

| CUADRO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 004 DE 2025 | | |

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

CUADRO DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 004 DE 2025

JULIO 2025

Institución Educativa	No. Ruta	Recorrido	Distancia (Kms) Ida	Distancia (Kms) Ida y Vuelta	Tipo de Ruta	Cantidad y Tipo de Vehículos	No. de Beneficiarios	No. de Días 2025	No. de Días 2026	Costo Día 2025	Costo Día 2026	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Total Días	Valor Total Consolidado	Cantidad de Estudiantes Planeados	Cantidad Días Ejecutados 2025	Días Ejecutados	Valor Total Mes	Funcionarios	Pluses	% Valor Total 2025	% Valor Plan anual	Total Días Trabajados	Días por Ejecutar	Total Valor Ejecutado	Porcentaje Ejecutado %
I.E. HOGARES GAMBA	36	Hogares Mapoy Laberia - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	31,7	63,4	Terrestre	1 Bus	30	40	120	$ 1.260.000	$ 1.430.000	$ 50.760.000	$ 172.400.000	160	$ 224.160.000	31	13	17,20,24,25,31	$ 18.460.000	$ 18.460.000	$ 0	10,00%	8,24%	120	30	$ 172.040.000	77,19%
	35	Hogares Pinoco Puerto - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	19,8	31,2	Terrestre	1 Ejecutivo	15	40	120	$ 645.000	$ 1.040.000	$ 30.720.000	$ 124.800.000	160	$ 155.520.000	22	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 14.900.000	$ 14.900.000	$ 0	11,97%	8,55%	127	33	$ 108.120.000	77,68%
	38	Hogares La Hormiga Cuevo Soluno - Santa Rita - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	15,8	29,6	Terrestre	2 Buses	50	40	120	$ 1.000.000	$ 2.220.000	$ 50.400.000	$ 266.400.000	160	$ 345.840.000	64	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 31.080.000	$ 31.080.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 272.104.000	77,79%
	37	Cuevo Cerro Moyoreno - I.E. Cuevo Soluno - Santa Rita - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	14	28	Terrestre	1 Buses	25	40	120	$ 630.000	$ 1.000.000	$ 30.240.000	$ 120.000.000	160	$ 150.720.000	30	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 126.010.000	77,82%
I.E. ORIENTAL FEMENINO	39	El Pesebre - Tame Alto Tame - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	40	80	Terrestre	1 Buses	29	40	120	$ 1.100.000	$ 1.320.000	$ 52.752.000	$ 158.400.000	160	$ 208.800.000	14	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 18.480.000	$ 18.480.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 182.483.000	77,66%
	40	Barro Prieto - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	40,2	20,8	Terrestre	1 Buses	25	40	120	$ 1.160.500	$ 1.500.500	$ 46.560.000	$ 180.060.000	160	$ 226.560.000	11	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 19.300.000	$ 19.300.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 165.669.000	77,97%
	42	Vereda Los Bloques I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	13,5	27	Terrestre	2 Buses 2 Recorridos	120	40	120	$ 3.300.000	$ 3.600.000	$ 154.440.000	$ 432.000.000	160	$ 564.000.000	96	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 40.320.000	$ 40.320.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 408.758.000	77,79%
	41	Vereda Cerro Retiro - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	13,6	28	Terrestre	1 Bus	30	40	120	$ 1.000.000	$ 1.300.000	$ 43.200.000	$ 147.600.000	160	$ 190.800.000	26	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 17.150.000	$ 17.150.000	$ 0	11,97%	8,99%	127	33	$ 160.167.000	77,79%
I.E. LICEO TAME	43	La Victoria Alcaraván I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	10	24	Terrestre	2 Buses	50	40	120	$ 1.000.000	$ 1.200.000	$ 72.000.000	$ 207.360.000	160	$ 314.880.000	47	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 27.720.000	$ 27.720.000	$ 0	11,97%	8,91%	127	33	$ 243.089.000	77,66%
	45	Vereda Los Alpes I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	22	44	Terrestre	1 Bus	30	40	120	$ 1.000.000	$ 1.176.000	$ 40.800.000	$ 141.480.000	160	$ 197.880.000	46	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 0	11,97%	8,91%	127	33	$ 148.121.000	77,66%
	44	Casa Verde Vereda La Pista - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	20,2	32,4	Terrestre	1 Buses	29	40	120	$ 980.000	$ 1.296.000	$ 41.328.000	$ 167.616.000	160	$ 209.436.000	19	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 14.924.000	$ 14.924.000	$ 0	11,97%	8,91%	127	33	$ 130.140.000	77,66%
I.E TECNICO INDUSTRIAL PADILLA FARINO	46	Vereda La Soledad - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	11	22	Terrestre	1 Motocarro	10	40	120	$ 811.000	$ 870.000	$ 34.080.000	$ 105.000.000	160	$ 139.080.000	0	14	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 12.250.000	$ 12.250.000	$ 0	11,97%	8,91%	127	33	$ 106.407.000	77,66%
	48	Vereda Caserío - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	54,3	108,6	Terrestre	1 Bus	30	40	120	$ 1.305.000	$ 1.500.000	$ 67.320.000	$ 180.000.000	160	$ 247.320.000	44	11	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 19.950.000	$ 19.950.000	$ 0	10,00%	8,25%	120	34	$ 185.369.000	77,15%
	47	Cabra Carretera Vereda Diaprista - I.E. Urbanos de Tame y Viceversa	16	32	Terrestre	1 Buses	29	40	120	$ 960.000	$ 1.276.000	$ 40.320.000	$ 134.400.000	160	$ 174.720.000	19	13	3,7,10,11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31	$ 13.510.000	$ 13.510.000	$ 0	10,00%	8,24%	120	34	$ 130.330.000	77,17%
						Total Beneficiarios	0.000	Costo Total		$ 340.401.200	$ 377.331.400	$ 14.301.200.000	$ 44.400.239.000		$ 58.784.000.000	0027	10.6270667		$ 4.616.000.000	$ 4.100.410.100	$ 438.332.500	11,10%	8,00%			$ 49.814.329.500	84,80%
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUBRIOCHOS MIL PESOS M/CTE. ($58.764.000.000)																											

Atentamente,

ANDRES MAURICIO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE PROYECTO

Dery Brigith Castillo Erazo
Coordinador de Ruta

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. CERTIFICACIONES GESPROY.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

En mi calidad de Interventoría externa, bajo contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifico que, la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026, con Nit. 901.994.800-9, representada legalmente por EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ, en calidad de contratista del DEPARTAMENTO DE ARAUCA, mediante contrato de prestación de servicios N° 554 de 2025, ha ejecutado durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 al treinta y uno (31) de julio de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.764.500.000,00) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	UNA VEZ TERMINEN LOS 162 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
DÍAS EJECUTADOS MES DE JULIO DE 2026	18 DÍAS
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE ARAUCA	MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.079.803.900)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE ARAUQUITA	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.284.480.590)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE CRAVO NORTE	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($75.727.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE FORTUL	OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($817.414.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE PUERTO RONDON	OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($80.054.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE SARAVENA	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($953.738.000)
VALOR EJECUTADO MUNICIPIO DE TAME	MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.525.734.000)

Dado en Arauca el 13 de agosto de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Cle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR 2025

CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
NIT 901.994.807-1

CERTIFICACIÓN GESPROY

Que el **CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025**, con Nit. **901.994.807-1**, representado legalmente por **RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ**, en calidad de contratista de la interventoría externa mediante contrato de interventoría N° 555 de 2025, certifica el estado de ejecución del contrato en mención durante el periodo comprendido entre el seis (06) de julio de 2026 al treinta y uno (31) de julio de 2026, la siguiente información:

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR DE CONTRATO	MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.137.450.000,00).
PLAZO DE CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	14/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2026
DÍAS EJECUTADOS MES DE JUNIO DE 2026	VEINTISEIS (26) DÍAS CALENDARIO
VALOR EJECUTADO	CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 100.182.333,00)

Dado en Arauca el 13 de agosto de 2026.

RICARDO ANDRES CONDE BENITEZ
R/L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025

Cle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901996807	1	CONSORCIO INTERTRANSCOLAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAUCA	CL 18 30 B 37 LIRA CIUDAD JARDIN	ARAUCA-ARAUCA	3184459560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	560454851	95003799832	E	2026/08/14	2026/08/12	BANCOLOMBIA		$15,374,080

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1094453986	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	5	$541,667	$65,100	EPS001	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
2	CC	1094453986	BECERRA VILLARREAL JEYSON ALEJANDRO	230301	25	$2,708,334	$403,400	EPS001	25	$2,708,334	$308,600	CCF67	25	$2,708,334	$308,400	14-11	25	$2,708,334	$488,600	25	$2,708,334	$325,000
3	CC	1116867487	CASTILLO ENRIQUE DIDEY BRYTTH	230301	5	$1,091,667	$131,000	ESSC24	5	$1,091,667	$93,800	CCF67	5	$1,091,667	$0	14-11	5	$1,091,667	$0	5	$1,091,667	$0
4	CC	1116867487	CASTILLO ENRIQUE DIDEY BRYTTH	230301	25	$5,458,334	$873,400	ESSC24	25	$5,458,334	$683,300	CCF67	25	$5,458,334	$218,400	14-11	25	$5,458,334	$983,000	25	$5,458,334	$273,000
5	CC	1007172864	HURTADO AVGARITA MIGUEL	230301	5	$541,667	$65,100	EPS035	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
6	CC	1007172864	HURTADO AVGARITA MIGUEL	230301	25	$2,708,334	$403,400	EPS035	25	$2,708,334	$308,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$488,600	25	$2,708,334	$325,000
7	CC	1120696813	LINARES DIAZ JOHNATHAN SNET	230301	5	$541,667	$65,100	EPS037	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
8	CC	1120696813	LINARES DIAZ JOHNATHAN SNET	230301	25	$2,708,334	$403,400	EPS037	25	$2,708,334	$308,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$488,600	25	$2,708,334	$325,000
9	CC	60254629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	5	$654,167	$78,600	EPS037	5	$654,167	$55,700	CCF67	5	$654,167	$0	14-11	5	$654,167	$0	5	$654,167	$0
10	CC	60254629	MIRANDA VALENCIA CARMEN ROSA	25-14	25	$3,270,834	$523,400	EPS037	25	$3,270,834	$408,900	CCF67	25	$3,270,834	$130,900	14-11	25	$3,270,834	$327,700	25	$3,270,834	$163,700
11	CC	1116778561	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	5	$654,167	$78,600	EPS041	5	$654,167	$55,700	CCF67	5	$654,167	$0	14-11	5	$654,167	$0	5	$654,167	$0
12	CC	1116778561	NIÑO FONSECA CRISTIAN CAMILO	230301	25	$3,270,834	$523,400	EPS041	25	$3,270,834	$408,900	CCF67	25	$3,270,834	$130,900	14-11	25	$3,270,834	$327,700	25	$3,270,834	$163,700
13	CC	1006455038	PADILLA VARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	5	$541,667	$65,100	ESSC24	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
14	CC	1006455038	PADILLA VARGAS DIEGO ALEJANDRO	230301	25	$2,708,334	$403,400	ESSC24	25	$2,708,334	$308,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$488,600	25	$2,708,334	$325,000
15	CC	1116883165	PICO SAHARIA YEISON EDUARDO	25-14	5	$541,667	$65,100	EPS037	5	$541,667	$46,100	CCF67	5	$541,667	$0	14-11	5	$541,667	$0	5	$541,667	$0
16	CC	1116883165	PICO SAHARIA YEISON EDUARDO	25-14	25	$2,708,334	$403,400	EPS037	25	$2,708,334	$308,600	CCF67	25	$2,708,334	$108,400	14-11	25	$2,708,334	$488,600	25	$2,708,334	$325,000
17	CC	1006451860	SANTAMARIA HEITO ANDRES MAURICIO	230301	5	$1,183,334	$142,000	EPS005	5	$1,183,334	$100,600	CCF67	5	$1,183,334	$0	14-11	5	$1,183,334	$0	5	$1,183,334	$0
18	CC	1006451860	SANTAMARIA HEITO ANDRES MAURICIO	230301	25	$5,916,667	$946,700	EPS005	25	$5,916,667	$709,600	CCF67	25	$5,916,667	$236,700	14-11	25	$5,916,667	$591,900	25	$5,916,667	$296,000
Total			Afiliados(9)			$32,750,009	$5,709,800			$32,750,009	$4,468,000			$32,750,009	$1,258,900			$32,750,009	$2,190,300		$32,750,009	$1,573,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$5,789,800	$0	$5,824,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,100,500	$0	$1,107,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,689,300	$0	$4,717,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,190,300	$0	$2,203,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$2,190,300	$0	$2,203,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,258,900	$0	$1,266,600
COMFAR	CCF67	800,219,488	4	9	$1,258,900	$0	$1,266,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,468,000	$0	$4,495,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$1,159,800	$0	$1,166,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$1,234,000	$0	$1,241,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$484,600	$0	$487,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,609,600	$0	$1,619,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$944,300	$0	$950,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$944,300	$0	$950,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$629,600	$0	$633,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$629,600	$0	$633,500
TOTAL				9	$15,280,900	$0	$15,374,000

INTER TRANSESCOLAR
SAS

6. INFORME DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

Arauca, agosto 13 de 2026

Referencia: Informe de inspecciones del mes de julio de 2026 del contrato N°555 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y seguimiento contractual asignadas a la interventoría externa del **Contrato No. 554 de 2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, durante el mes de **julio de 2026** se desarrollaron actividades de inspección técnica al parque automotor terrestre vinculado a la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de Arauca, así como actividades de seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el contratista frente a los hallazgos identificados en inspecciones realizadas durante meses anteriores.

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a verificar las condiciones mecánicas, de seguridad, operativas y documentales de los vehículos inspeccionados, así como a constatar las evidencias de subsanación presentadas por el contratista respecto de los hallazgos identificados durante las inspecciones fluviales realizadas en el mes de junio de 2026 y de las inspecciones efectuadas en el municipio de Arauquita, fortaleciendo el control y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante el mes de julio de 2026, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento técnico y operativo orientadas a verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la prestación del servicio de transporte escolar.

El día veintiocho (28) de julio de 2026 se realizaron inspecciones técnicas al parque automotor terrestre del municipio de Arauca, verificando las condiciones mecánicas, de seguridad, operativas y documentales de los vehículos vinculados a la prestación del servicio.

INTER TRANSESCOLAR
2025

Como parte de la jornada, se practicaron pruebas de alcoholemia a conductores y monitores, con el propósito de verificar las condiciones de aptitud para la prestación del servicio, y se diligenció el correspondiente formato de asistencia a inspecciones, dejando constancia de la participación del personal operativo durante la actividad.

De manera complementaria, la interventoría recopiló y verificó las evidencias documentales y fotográficas correspondientes a las acciones de subsanación implementadas por el contratista respecto de los hallazgos identificados durante las inspecciones fluviales efectuadas en el municipio de Arauca en el mes de junio de 2026, así como de las subsanaciones pendientes derivadas de las inspecciones realizadas en el municipio de Arauquita, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas y realizar el respectivo seguimiento técnico.

Todas las actividades desarrolladas fueron soportadas mediante formatos de inspección, formatos de asistencia, registros de pruebas de alcoholemia y el correspondiente registro fotográfico.

3. INSPECCIONES REALIZADAS Y SEGUIMIENTO A HALLAZGOS

Durante la jornada desarrollada el 28 de julio de 2026 en el municipio de Arauca, la interventoría efectuó inspecciones técnicas al parque automotor terrestre destinado a la prestación del servicio de transporte escolar, verificando las condiciones mecánicas, de seguridad, operativas y documentales de los vehículos en servicio, conforme a las especificaciones técnicas del Contrato No. 554 de 2025 y a la normatividad vigente aplicable.

Como parte de las actividades desarrolladas, se realizaron pruebas de alcoholemia a conductores y monitores, así como el diligenciamiento del formato de asistencia a inspecciones, dejando constancia de la participación del personal operativo durante la jornada.

Como resultado de las inspecciones se identificaron diferentes hallazgos relacionados con elementos de seguridad, señalización reglamentaria, dotación de botiquines, equipos de carretera y demás condiciones técnicas exigidas para la operación del servicio. Los hallazgos evidenciados fueron comunicados en sitio tanto al contratista como a los conductores responsables de los vehículos inspeccionados, requiriendo la implementación de las acciones correctivas correspondientes y su subsanación en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad exigidas para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar.

Adicionalmente, durante el periodo evaluado se realizó la recopilación y verificación de las evidencias de subsanación correspondientes a los hallazgos identificados en las inspecciones fluviales efectuadas en el municipio de Arauca durante el mes de junio de

2026, así como de las subsanaciones pendientes derivadas de las inspecciones realizadas en el municipio de Arauquita, permitiendo efectuar el respectivo seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas implementadas por el contratista.

La relación detallada de los vehículos inspeccionados, los hallazgos identificados y las evidencias de subsanación verificadas hacen parte integral de los anexos del presente informe, junto con los formatos de inspección, formatos de asistencia, registros de alcoholemia y el correspondiente registro fotográfico.

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2026 permitieron fortalecer las acciones de vigilancia, control y seguimiento técnico adelantadas por la interventoría sobre la prestación del servicio de transporte escolar, mediante la ejecución de inspecciones al parque automotor terrestre y el seguimiento a las acciones correctivas implementadas por el contratista frente a hallazgos identificados en inspecciones realizadas en meses anteriores.

Durante las inspecciones efectuadas al parque automotor terrestre del municipio de Arauca se identificaron hallazgos relacionados con elementos de seguridad, señalización reglamentaria, dotación de botiquines y equipos de carretera, los cuales fueron puestos en conocimiento del contratista y de los conductores responsables durante la jornada de inspección, requiriendo su subsanación en el menor tiempo posible con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio.

Así mismo, la interventoría verificó las evidencias de subsanación presentadas por el contratista respecto de los hallazgos derivados de las inspecciones fluviales realizadas en el municipio de Arauca durante el mes de junio de 2026, así como de las subsanaciones pendientes correspondientes a las inspecciones efectuadas en el municipio de Arauquita, fortaleciendo el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas requeridas.

Como soporte de las actividades desarrolladas, se anexan al presente informe la relación consolidada de los vehículos inspeccionados, la relación de hallazgos identificados, los formatos de inspección, el formato de asistencia a inspecciones, los registros de las pruebas de alcoholemia, las evidencias de las subsanaciones verificadas y el correspondiente registro fotográfico, documentos que constituyen el respaldo técnico de las actividades ejecutadas por la interventoria durante el periodo evaluado.

INTER TRANSESCOLAR
2025

El presente informe se expide en cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría externa y para los fines contractuales y administrativos correspondientes.

Atentamente,

RICARDO ANDRÉS CONDE BENÍTEZ
R.L CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025
E-mail. Inter.transescolar2025@gmail.com
Cel- 3138322453

Deicy Briyith Castillo Eregua
Elaborado por **Deicy Briyith Castillo Eregua**
Coordinador de Área

ANEXOS

1. Relación parque automotor inspeccionado.
2. Formatos de inspección.
3. Formatos prueba de alcoholemia.
4. Formato de asistencia inspecciones.
5. Parque automotor subsanado en junio.
6. Parque automotor subsanado municipio de Arauquita.

INTER TRANSESCOLAR
2025

1. RELACIÓN PARQUE AUTOMOTOR INSPECCIONADO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUCA																						
WEF-675	2007	BUS	NEL SAID AREVALO VERGARA	C2	X		X		X			X			X		X		X		Extintor de 10 lb, se recomienda cambio a uno de capacidad mínima de 20 lb.	
JOW-648	2014	BUS	ROQUE JULIO VEGA MARQUEZ	C2	X		X		X			X			X		X		X		Extintor de 10 lb, se recomienda cambio a uno de capacidad mínima de 20 lb.	
GZY-858	2026	BUS	ALIRIO GALINDO BECERRA	C2	X		X		X			X			X		X		X			
UPR-020	2007	BUSETA	DARIO PEDRAZA QUINTERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	Franjas de identificación escolar no cumplen con la normatividad vigente	
SPJ-976	2009	BUS	ANDERSON AREVALO VERGARA	C2	X		X		X			X				X	X		X		Elementos del botiquín vencidos: Hisopos esponja, guantes, esparadrapo y vendas elásticas de 2"x5 yd y 3"x5 yd.	
TTO-515	2012	BUS	ALEXANDER AGUDELO CAMPOS	C2	X		X		X			X				X	X			X	Falsos de techo esponja vencido y no cuenta con la identificación reglamentaria tiene "ESCOLAR" trasero	
SZU-582	2017	BUS	MIGUEL ANGEL PINTO GUERRERO	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con pito de reversa	
THL-435	2011	BUS	JOSE LEON SARMIENTO	C3	X		X		X			X			X		X			X	Franjas e identificación reglamentaria "ESCOLAR" en mal estado, se recomienda su reemplazo conforme a la normatividad vigente	
UGD-977	2011	BUS	OMAR GIOVANNY CORDOBA VALDERRAMA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Falsos de identificación reglamentaria tiene "ESCOLAR" en la parte trasera	
EVP-074	2008	BUSETA	OMAR SEGURA SARMIENTO	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con botas ni caja de herramientas. Las franjas de identificación escolar no cumplen con la normatividad vigente. Falsos de refrigeración anil y pares de guantes vencidos. Paleta PARE/PARE en estado de deterioro se recomienda su reemplazo	
EVP-244	2008	BUS	MANUAL ALBERTO GRANADOS MUÑOZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Franjas de identificación escolar no cumplen con la normatividad vigente. Botiquín vencido. No cuenta con paleta PARE/SIGA reglamentaria	
XMB-374	2007	BUS	JHONATAN ALI PUERTA FLOREZ	C2	X		X		X			X				X	X			X	No cuenta con llanta de repuesto, cruceta, botas ni caja de herramientas. Franjas de identificación escolar no cumplen con la normatividad vigente. Suero fisiológico y guantes desechables vencidos	
XGD-344	2008	BUS	JUAN CARLOS ALMEIDA CERMEÑO	C2	X		X		X			X				X	X		X		Falsos techo esponja y gasa precortada vencidos	
TBM-191	2016	BUS	DIMITRIO D RANGEL	C2	X		X		X			X			X		X		X			
TTH-705	2012	BUS	LOMAR GONZALEZ MARTINEZ	C2	X		X		X			X			X		X			X	Franjas de identificación escolar no cumplen con la normatividad vigente. Palanca alterior en mal estado. Botiquín con elementos vencidos: frasco de isodine espuma, suero de rehidratación oral, gasa precortada, guantes desechables, paquete de algodón, isodine desechable y rollo de esparadrapo. Consigna entrega de la paleta PARE/PARE	
GZY-841	2026	CAMIONETA	JENARO NUÑEZ CUELLAR	C2	X		X		X			X			X		X		X		No cuenta con manual de primeros auxilios. Suero fisiológico y extintor vencidos. Se recomienda reemplazar el extinto de 5 lb por uno de capacidad mínima de 10 lb. Adicionalmente, no cuenta con pito de reversa	

Calle 26 N° 30b - 27 Urbanizacion Ciudad Jardin
Correo: transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184915668

INTER TRANSESCOLAR
2025

2. FORMATOS DE INSPECCIÓN.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28-07-26
Placa: WFG-675	Modelo: 2007		Marca: MITSUBISHI		# tarjeta propiedad: 10032908902		# Ruta: 19
Kilometraje: 91971	Nombre del conductor: Nel Saul Arevalo						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	27/07/27	Numero licencia de conducción: Nel saul Arcva	Poliza contractual:	20/05/2027
SOAT:	✓	13/03/27	Tipo de licencia y vigencia: 1116775317 C2 08/09/26	Poliza extracontractual:	20/05/2027
Tarjeta de Operación:	✓	23/05/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - BAJAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y uso)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETROFLECTIVOS DE 80 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad mínima de 10 libras)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: (Alicate (Pinza) de corte diagonal, Destornilladores de pala y punta, (1 mas pequeña y un juego de otras tres de pala y punta), Juego (Wrenches)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y uso)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS (IMPIA/PARABRISAS) (Sin aspa, revisión de agua durante el recorrido, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare no siga)	✓			

OBSERVACIONES:

Yerson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803168

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1116775317

INTER TRANSESCOLAR 2025

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/01/2028
Placa: WBF675	Modelo: 2007		Marca: Mitsubishi		# tarjeta propiedad: 10036780902		# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: Uriel Saul Arevalo Vivas						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	24/04/27	Numero licencia de conducción: 1116775317	Poliza contractual:	20/05/2027
Vigencia del SOAT:	✓	13/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/09/2026	Poliza extracontractual:	20/05/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/05/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		04/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		06/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		08/28
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		03/27
1	Paquete de Algodón	✓		10/28
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		07/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		03/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/28
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: JUNIO 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones: Compra de Extintores a 20 lb

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Alexander Padilla
CEDULA: 1006453839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1.116795317.

	FORMATO INSPECCIÒN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio:	Fecha: 28/07/26
Placa: JOW-648	Modelo: 2014		Marca: Mercedes		# tarjeta propiedad: 10021778258		# Ruta: 37
Kilometraje: 179396	Nombre del conductor: Roque Julio Vega						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	06/01/27	Numero licencia de conducción: 17588361	Poliza contractual:	01/12/2026
SOAT:	✓	16/12/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/09/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Tarjeta de Operación:	✓	11/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS, DIRECCIONALES, ESTACIONARIAS, STOPS (FRENOS), TESTIGOS DEL TABLERO, LUZ DE REVERSA, LUCES INTERNAS)	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Presión de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Carga del tanque y estado)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate (Corte-Cortafrío), 2 Destornilladores de pala y estrella, 1 Llave expansiva y un juego de Llaves fijas (mínimo 4 llaves fijas)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Aplica en hebillas, estado de correas, anclajes a piso y pestillo, pestillo de seguro)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos especiales)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No pega marcas de agua durante el recorrido, funcionamiento de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Para vehículos de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	HUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pase y Pate en mojo)	✓			

OBSERVACIONES:

Yelson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1168023165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Roque Julio Vega
CEDULA: 17'588.361

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Alonso	Fecha: 28/07/2026
Placa: JOC-648	Modelo: 2014		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10021478258		# Ruta: 21
Kilometraje:	Nombre del conductor: Roger Julio Vega Mendez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	06/01/24	Numero licencia de conducción: 17588361	Poliza contractual:	01/12/2016
Vigencia del SOAT:	✓	14/12/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 01/09/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2016
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isocine espuma (Etiquetado)	✓		03/28
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/28
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		06/29
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/29
6	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elastica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/29
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones: Cambio a 20 libras

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	X	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455938

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Roger Julio Vega
CEDULA: 17588361

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/07/26
Placa: G7Y-838	Modelo: 2026		Marca: Dun Feng		# tarjeta propiedad: 10038316922		# Ruta: 18
Kilometraje: 932	Nombre del conductor: Alirio Galindo Becerra						Ultimo cambio aceite: 27/07/26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	NA	Numero licencia de conducción: 96187080	Poliza contractual:	07/04/2027
SOAT:	✓	25/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/09/2027	Poliza extracontractual:	07/04/2027
Tarjeta de Operación:	✓	11/05/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DE HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Labrado 2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 18" CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según el vehiculo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CONTENIDO (Alicate CRIMPADOR (No. 2 Destornillador de pala y estrella (1 Llave expansiva y de varias formas (Llaves Mixtas)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	ASEO (Vehiculo sin basura, polvo, fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, grados de libertad)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No bajar niveles de agua durante el recorrido, funcionamiento de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PRANDAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 96187087

INTERTRANSESCOLAR 2005	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Dagua	Fecha: 28/07/2026
Placa: 624-838	Modelo: 2026		Marca: Foton		# tarjeta propiedad: 10038316922		# Ruta: 18
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alirio Guirado Becerra						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	N/A	Numero licencia de conducción: 96187080	Poliza contractual:	02/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	25/03/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/09/2024	Poliza extracontractual:	07/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	11/05/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		09/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/30
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		09/30
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2026
Fecha proxima a recargar: Julio 2027
Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	X	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	X	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oliver Pardo
CEDULA: 1006455818

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 96187080
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus	Buseta ✓	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/08/26
Placa: UPR-020	Modelo: 2007		Marca: Wolswager	# tarjeta propiedad: 10038059491			# Ruta: 19
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dario Pedraza						Ultimo cambio aceite: 21-04-26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	19-09-26	Numero licencia de conducción: 18927385	Poliza contractual:	07-04-27
SOAT:	✓	29-09-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07-10-2027	Poliza extracontractual:	07-04-27
Tarjeta de Operación:	✓	30-01-88	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique alamento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Antiamdad)	✓			
	CLUTCH (EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Ajuste)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Presión de profundidad de labrado y aire)	✓			
	GRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 18" CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MIXTA CON: 1 Alicate (Pelacables, Corte, y Destornillador de pala y punta, 1 Llave expansiva y un juego de llaves (Boca mixta) 1 Juego (Allen)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado, Presión de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, presión de ajuste)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el funcionamiento de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			No Aplica el Tamaño
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	NUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116883165

Dario Pedraza
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 18927385

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Olaya	Fecha: 28/07/2026
Placa: UBA-020	Modelo: 2007		Marca: Volkswagen		# tarjeta propiedad: 10019699967		# Ruta: 26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Dario Pedraza Quintero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	19/09/26	Numero licencia de conducción: 18927385	Poliza contractual:	07/04/2022
Vigencia del SOAT:	V	29/09/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/10/2024	Poliza extracontractual:	07/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	V	30/11/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		08/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		09/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		05/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		03/30
3	Toallas Higenicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		06/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		06/30
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Noviembre 2025

Fecha proxima a recargar: Noviembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Pedraza
CEDULA: 1006455838

Dario Pedraza Q
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 18927385

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/06/26
Placa: SPJ-896	Modelo: 2008		Marca: MITSUBISHI		# tarjeta propiedad: 10025775887		# Ruta: 45
Kilometraje: 317622	Nombre del conductor: Aner Yair Arevalo						Ultimo cambio aceite: 16-05-26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	V	21/01/27	Numero licencia de conducción: 17594379	Poliza contractual:	01/08/26
SOAT:	V	07/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/04/2027	Poliza extracontractual:	11/08/26
Tarjeta de Operación:	V	16/03/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate C/pelo+C/cort 10in, 2 Destornilladores de pala y cruz, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mixtas 4 hasta 19mm	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes hacia)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado no cortes, no tiene o pico y pasador, presión de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar residuos de agua durante el recorrido, funcionamiento de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PRANDAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DEL AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Aner Arevalo
CEDULA: 17594379

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Alcalá	Fecha: 28/04/2026
Placa: SPJ-876	Modelo: 2008		Marca: Mitsubishi		# tarjeta propiedad: 10025725587		# Ruta: 45
Kilometraje:	Nombre del conductor: Ancer Yair Arevalo Urrego						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	21/01/27	Numero licencia de conducción: 17594379	Poliza contractual:	01/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	7/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/04/2022	Poliza extracontractual:	01/08/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	16/03/26	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)	✓		09/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		02/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		07/30
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		NA
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela		✓	
1	Unidades de Baja lenguas	✓		09/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5		✓	
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		12/29
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: febrero 2025

Fecha proxima a recargar: febrero 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Rodas
CEDULA: 1006958818

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Ancer Yair Arevalo
CEDULA: 17594379

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Ayapel	Fecha: 28/07/26
Placa: TTO-515	Modelo: 2012		Marca: Mercedez		# tarjeta propiedad: 10018588537		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexander Acevedo Campos						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	02-05-27	Numero licencia de conducción: 17'0' 17597872	Poliza contractual:	01/12/26
SOAT:	✓	05-06-27	Tipo de licencia y vigencia: C2 11-05-2029	Poliza extracontractual:	01/12/26
Tarjeta de Operación:	✓	07/07/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	EXCESO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranuras de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCH O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plasticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS,	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	3 CONOS RETRACTILES DE 50 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate (2 pinzas, 1 cortante, 1 destornillador de pala y punta, 1 juego de llaves fijas (mínimo 4 llaves) Medidas	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, suftatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes o piso y pliegue, presión de inflado)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCAZA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No deje pasar agua durante el invierno, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Para ayudantes de la carretera)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Para supervisar frenada y estabilidad de la carroceria)		✓		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Para y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

Yelson Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803168

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17594372

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehículo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Olaya	Fecha: 28/02/2026
Placa: PTO-515	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10019584532		# Ruta: 22
Kilometraje:	Nombre del conductor: Alexander Cabrera Campos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	04/08/27	Numero licencia de conducción: 17594 872	Poliza contractual:	01/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	05/02/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 11/05/2029	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	07/07/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Iodine espuma (Etiquetado)	✓	X	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		04/27
1	Paquete de Algodón	✓		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/29
1	Unidades de Baja lenguas	✓		07/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		10/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025
Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026
Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oscar Padilla
CEDULA: 1006958838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 1759 4872

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28-02-26
Placa: S7U-392	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10030524987		# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Miguel Angel Pinto Gonzalez						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/02/27	Numero licencia de conducción: 1104130336	Poliza contractual:	01-12-26
SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/05/2028	Poliza extracontractual:	01-12-26
Tarjeta de Operación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N I A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DIR. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rengos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 18 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad mayor al estipulado)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MIXTA CON: 1 llaves (Abierta-Corona) 2 Destornilladores de pala y estrella (1 Uno pequeño y el otro de tres Pulgadas) 1 Juego (Alicates)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebilla, estado de bandas, anclajes a piso y paredes, prueba de retracción)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)		✓		
	PITO	✓			
	TACOMETRO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CONTRA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante la segunda, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en caja)	✓			

OBSERVACIONES:

Yeison Rico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116803165

Miguel Pinto
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Miguel Pinto
CEDULA: 1104130336

INTER TRANSESCOLAR 2007

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta ___	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Aldea	Fecha: 28/02/2026
Placa: SZU-392	Modelo: 2012		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10030524982		# Ruta: 12
Kilometraje:	Nombre del conductor: Miguel Angel Pinto Guerrero						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	09/04/26	Numero licencia de conducción: 1104130321	Poliza contractual:	01/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 07/05/2028	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	23/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		06/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		04/27
1	Paquete de Gasa precortada	✓		10/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		09/29
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		02/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		08/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		05/30
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Septiembre 2025

Fecha proxima a recargar: Septiembre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Alexis Padilla
CEDULA: 1006493928

MIGUEL PINTO
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: MIGUEL PINTO
CEDULA: 1104130376

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus ___	Camioneta	Otro	Municipio: ARAUCA	Fecha: 28/07/26
Placa: THL-425	Modelo: 2011		Marca: MINO		# tarjeta propiedad: 10016420522		# Ruta: 23
Kilometraje: 283717	Nombre del conductor: Jose León Sarmiento						Ultimo cambio aceite: 28-01-26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16-09-26	Numero licencia de conducción: 3273828	Poliza contractual:	01-12-2026
SOAT:	✓	05-11-26	Tipo de licencia y vigencia: C3 25/06/2027	Poliza extracontractual:	01-12-2026
Tarjeta de Operación:	✓	21-12-27	Restricciones: Prohibida Auditiva conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAPARABRISAS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAQUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Aire de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate (.250/(1/4 in) mm), 2 Destornilladores de pala y cruz, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mixtas, 1 Juego Medidas	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Borne, sin corrosión, sujeción)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Aprte de hebillas, estado de fibras, anclajes a piso y paredes, prueba de retracto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar rastros de agua durante el retroceso, funcionamiento de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Para) posterior de la carroceria)	✓			Para cambio
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			Para cambio
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	BLANCO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en riqio)	✓			

OBSERVACIONES:

Yesson Pico
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1116863165

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Jose León S
CEDULA: 327-3828

INTER TRANSESCOLAR 2009	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Abejorral	Fecha: 28/07/2026
Placa: THL-425	Modelo: 2011		Marca: H100		# tarjeta propiedad: 10016820522		# Ruta: 23
Kilometraje:	Nombre del conductor: José León Sanchez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	16/09/26	Numero licencia de conducción: 3273528	Poliza contractual:	01/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	5/01/26	Tipo de licencia y vigencia: C3 25/06/2027	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	21/12/26	Restricciones: conducir con lentes Pendiente 2026	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		agosto
3	Pares de Guantes desechables	✓		NO
3	Toallas Higienicas	✓		10/27
1	Paquete de Algodón	✓		10/26
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/27
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07/27
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		07/27
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		10/26
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: MAYO 2027

Fecha proxima a recargar: MAYO 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pedraza
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: José León S
CEDULA: 3273528

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio:	Fecha: 28/07/26
Placa: UQZ-777	Modelo: 2011		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10018996746		# Ruta: 13
Kilometraje: 343048	Nombre del conductor: Omar yovani Cordoba ✓						Ultimo cambio aceite: 28/06/26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/01/27	Numero licencia de conduccion: 17599101	Poliza contractual:	27/08/2026
SOAT:	✓	13/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/02/2028	Poliza extracontractual:	27/08/2026
Tarjeta de Operación:	✓	02/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduacion)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES (NO CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (vigencia del cargue al vencimiento)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMA CON: 1 Alicate Cutler (Oreja-Corte), 2 Destornilladores de pala y estrella, 1 Llave expansiva y un juego de llaves (que incluya 4 llaves) Mixtas	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y techos, prueba de retracción)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (Sin rayar, retiran el agua durante el recorrido, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	PRANDAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y delantera de la carroceria)		✓		
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Para y Para sin rayo)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681 3

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Omar Cordoba
CEDULA: 1759710 1

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 28/07/2026
Placa: UQZ-377	Modelo: 2011		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10018996745		# Ruta: 13
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Gilberto Cordoba Valderrama						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/01/22	Numero licencia de conducción: 17597101	Poliza contractual:	22/08/2026
Vigencia del SOAT:	✓	13/1/22	Tipo de licencia y vigencia: C2 19/02/2028	Poliza extracontractual:	22/08/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	7/02/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/24
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		08/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/24
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/24
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/30
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		09/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		11/27
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2025

Fecha proxima a recargar: Julio 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Oneso Padilla
CEDULA: 1006455878

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Omar Cordoba
CEDULA: 17597101

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta ✓	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Arauca
Placa: XVR076	Modelo: 2006		Marca: Hino	# tarjeta propiedad: 10037551392		Fecha: 28/07/26
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Segura Sarmiento					# Ruta: 26
						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14-02-27	Numero licencia de conducción: 17588488	Poliza contractual:	07-04-27
SOAT:	✓	02-08-26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13-02-27	Poliza extracontractual:	07-04-27
Tarjeta de Operación:	✓	22-08-27	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DE HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de parcetas plásticas)	LUCES DALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Llanta de uniformidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS		✓		
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según la de estudio)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMA CON: 1 dado de (3/8 o 1/2) de 12 pts, 1 Destornillador de pala y estrella, 1 Llave española y un juego de llaves fijas mixtas (Llaves Allenkey)		✓		
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sujetación)	✓			
	BANDAS (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, pruebas de retracción)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar rastros de agua durante el trayecto. Sincronizado de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			No cuenta con la medida
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en Hoy)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1596815

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Omar Segura S
CEDULA: 17588488

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ___	Buseta X	Microbus ___	Camioneta ___	Otro ___	Municipio: Olaya	Fecha: 28/07/2026
Placa: XVP-076	Modelo: 2006		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10037551392		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: Omar Segura Serrano						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/02/27	Numero licencia de conducción: 17588488	Poliza contractual:	07/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	2/08/26	Tipo de licencia y vigencia: C2 13/02/2024	Poliza extracontractual:	07/04/2022
Vigencia Tarjeta de ...ración:	✓	22/08/24	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		03/22
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		12/26
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		X	
1	Paquete de Gasa precortada	✓		04/26
3	Pares de Guantes desechables		X	
3	Toallas Higenicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón	✓		11/25
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		10/26
5	Unidades de Baja lenguas	✓		07/28
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		07 26
2	Tapabocas desechables	✓		NO
1	Rollo de Micropore	✓		NO
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Octubre 2025

Fecha proxima a recargar: Octubre 2026

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones: cambiar paleta pare y pare reglamentaria.

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Peñaloza
CEDULA: 1006455858

Omar Segura S
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: 17588488
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/07/26
Placa: XVP-244	Modelo: 2006		Marca: CHevrolet		# tarjeta propiedad: 730202		# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Alberto Granados						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/10/26
SOAT:	✓	09/06/27
Tarjeta de Operación:	✓	02/01/2028

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Numero licencia de conducción: 17597855	Poliza contractual:	06/10/2026
Tipo de licencia y vigencia: C2 03/12/2028	Poliza extracontractual:	06/10/2026
Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	DEPOSITO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAPARABRISAS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, ranges de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, luminosidad, estado de cercanas plásticas)	LUCES (ALTAS - MEDIAS)	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 18 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el estudio)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate CRISCO 6" (No. 2 Destornillador de pala y corto, 1 Llave inglesa y un juego de llaves fijas (mixtas) 8 Llaves Mixtas	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan grietas fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de bebinas, estado de correas, anclajes o pin y pasador, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Verificar su operatividad)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No deje rastros de agua durante el trayecto, funcionamiento de accesorios)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			falta Medidas
	FRAJE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759681?

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Manuel Granados
CEDULA: 17594855

INTER TRANSESCOLAR 2025	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Alejandria	Fecha: 28/07/2025
Placa: XUP-244	Modelo: 2006		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 130202		# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Manuel Alberto Cardozo Muñoz						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	14/10/26	Numero licencia de conducción: 17594855	Poliza contractual:	06/10/2026
Vigencia del SOAT:	✓	04/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/12/2028	Poliza extracontractual:	06/10/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	2/01/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		02/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		10/26
1	Paquete de Gasa precortada		X	
3	Pares de Guantes desechables	✓		08/26
3	Toallas Higienicas	✓		N/D
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		N/D
2	Unidades de Baja lenguas	✓		N/D
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		01/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/D
1	Rollo de Micropore	✓		11/27
2	Apósitos Oculares	✓		N/D
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/D
1	Tijeras	✓		N/D
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/D
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/D

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Enero 2025

Fecha proxima a recargar: Enero 2026

Capacidad en lb del extintor: 10 Libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo		X

Observaciones: Pendiente paleta Pare

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 17 594855

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio Arauca	Fecha: 28/01/26
Placa: XMB-374	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10037630944		# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhonatan Ali Portela						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	01/09/26	Numero licencia de conducción: 1116798892	Poliza contractual:	07/04/27
SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/01/2028	Poliza extracontractual:	07/04/27
Tarjeta de Operación:	✓	05/06/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	ESTADO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	—	✓		
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	—	✓		
	3 CONOS RETRACTILES DE 45 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	—	✓		
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MIXTA CON: 1 Alicate C/Aislamiento, 1 Pinza de punta y corte, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas (8 a 22) 1 Destornillador de pala y estrella		✓		
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	RINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes al piso y paredes, presión de inflado)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos pesados)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (Completos)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No deben rozar en algún sector o presentar fundamentalmente de deficiencias)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			NO cuenta con la medida
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pala y Pare en caja)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE: Johnatan Ali Portela
CEDULA: 1116798892

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Alvarado	Fecha: 23/07/2026
Placa: XMB-374	Modelo: 2007		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10033630944		# Ruta: 42
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jhonatan Dávila Patiño Flórez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	01/04/26	Numero licencia de conducción: 1116798892	Poliza contractual:	07/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	21/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/01/2028	Poliza extracontractual:	02/04/2022
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	5/04/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		11/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)		✓	
1	Frasco de Rehidralante oral (etiquetado)	✓		09/26
1	Paquete de Gasa procortada	✓		11/29
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		ND
1	Paquete de Algodón	✓		12/29
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		06/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		ND
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/29
2	Tapabocas desechables	✓		ND
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		ND
1	Rollos de Papel Higienico	✓		ND
1	Tijeras	✓		ND
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		ND
1	Inmovilizador de cuello	✓		ND

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2026

Fecha proxima a recargar: Julio 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dilson Patiño
CEDULA: 1002455839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA:

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Ayapel	Fecha: 28/07/26
Placa: XGD-344	Modelo: 2008		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10013B45521		# Ruta:
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Almeida Carmeño						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/05/27	Numero licencia de conducción: C2 10/01/29	Poliza contractual:	13/06/2027
SOAT:	✓	06-05-27	Tipo de licencia y vigencia: - 94450695	Poliza extracontractual:	13/06/2027
Tarjeta de Operación:	✓	08-05-27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DEL HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETRACTILES DE 90 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (capacidad según el vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMA CON: 1 juego combinado de llaves y destornillador de pala y estrella, 1 llave expansiva y un juego de llaves Allen de 1 hasta 10mm (Metrico)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN(1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes sin corrosión, sujetación)	✓			
	LUCES (Verificar no tengan quemadas)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estabilidad correcta, asegurado a piso y paredes, diseño no evasivo)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos agropecuarios)	✓			
	PITO	✓			
	TIMBRE DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS (UNIFORMIDAD EN BARRIDO) (No tiene rastros de agua después el barrido. Sin elementos de las plumillas)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y posterior de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	RUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pleno y Parte externa)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1590815

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: JUAN ALMEIDA
CEDULA: 94450695

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Dagua	Fecha: 28/01/2026
Placa: X6D-344	Modelo: 2008		Marca: Chevrolet		# tarjeta propiedad: 10013645521		# Ruta: 20
Kilometraje:	Nombre del conductor: Juan Carlos Almeida Colorado						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	30/05/27	Numero licencia de conducción: 94450695	Poliza contractual:	13/06/2022
Vigencia del SOAT:	✓	06/05/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 03/01/2029	Poliza extracontractual:	13/06/2024
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/05/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		✓	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		03/27
1	Paquete de Gasa precortada		✓	
3	Pares de Guantes desechables	✓		NA
3	Toallas Higienicas	✓		NA
1	Paquete de Algodón	✓		11/26
1	Rollo de Esparadrapo en lata	✓		01/27
2	Unidades de Baja lenguas	✓		NA
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		04/27
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		NA
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Julio 2026

Fecha proxima a recargar: Julio 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: JUAN ALMEIDA
CEDULA: 94450695

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: 41 2048	Fecha: 28/07/26
Placa: SM-191	Modelo: 2016		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10031346677		# Ruta: 11
Kilometraje:	Nombre del conductor: Demetrio Rangel						Ultimo cambio aceite: 29/03/26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	10/02/27	vigente	Numero licencia de conducción: 17583460	Poliza contractual:	07/04/27
SOAT:	24/01/27	vigente	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/10/2026	Poliza extracontractual:	07/04/27
Tarjeta de Operación:	08/09/27	vigente	Restricciones: conducir c/lentes	Poliza todo riesgo:	07

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DE HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAPARABRISAS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 TORBOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad acorde al vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate CORTACONEC DE 2 Destornillador de pala y estrella 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas (mínimo 6 llaves (Métricas)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	AVISOS (Verificar no tengan golpes rotulos)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de retinas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, puntos de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Velocidad operativa)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el barrido, sistema operativo de los plasticos)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	BUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759683

FIRMA CONDUCTOR 17583460
NOMBRE: Demetrio Rangel
CEDULA:

INTER TRANSESCOLAR 2005

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta __	Microbus __	Camioneta __	Otro __	Municipio: Aluria	Fecha: 28/02/2026
Placa: TSM-191	Modelo: 2016		Marca: Hino		# tarjeta propiedad: 10031546627		# Ruta: 11
Kilometraje:	Nombre del conductor: Demetrio Burgos						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	10/02/27	Numero licencia de conducción: 17583460	Poliza contractual:	07/04/2022
Vigencia del SOAT:	✓	28/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 08/10/2026	Poliza extracontractual:	07/04/2026
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	8/07/27	Restricciones: Conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manual de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		10/26
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	6		03/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		08/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		09/26
3	Pares de Guantes desechables	✓		12/27
3	Toallas Higienicas	✓		03/28
1	Paquete de Algodón	✓		04/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		02/29
2	Unidades de Baja lenguas	✓		09/26
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		11/26
2	Tapabocas desechables	✓		NA
1	Rollo de Micropore	✓		06/29
2	Apósitos Oculares	✓		NA
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NA
1	Tijeras	✓		NA
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NA
1	Inmovilizador de cuello	✓		NA

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: 6/10/2026

Fecha proxima a recargar: 6/10/2027

Capacidad en lb del extintor: 20 libras

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Otto padilla
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR 17583460
NOMBRE:
CEDULA:

	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus ✓	Buseta	Microbus ___	Camioneta	Otro	Municipio: Ibagué	Fecha: 28/07/26
Placa: TTN-723	Modelo: 2012		Marca: Mercedez		# tarjeta propiedad: 10018584505		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Lemar Gonzalez Martinez						Ultimo cambio aceite: 25/07/26

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revision Tecnicomecánica:	✓	25/04/27	Numero licencia de conducción: 17545655	Poliza contractual:	01/12/26
SOAT:	✓	20/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/05/2027	Poliza extracontractual:	01/12/26
Tarjeta de Operación:	✓	15/03/28	Restricciones: conducir con lentes	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N / A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL DE HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAPARABRISAS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS, MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (Labrado 2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 TRIANGULOS RETRACTILES DE 30 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad mayor a 4 libras)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMA CON: 1 Alicate CINCHADOR, 1 Destornillador de pala y corte, 1 Llave expansiva y un juego de llaves fijas mixtas (Llaves (Mixtas)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosion, sulfatacion)	✓			
	LUCES (Vehiculo no tengan golpes, rayas)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Vigente, hebillas, estado de correas, anclajes a piso y paredes, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehiculo operativo)	✓			
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el barrido, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carroceria)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior trasera y delantera de la carroceria)		✓		NO CUENTA CON EL AVISO
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO			✓	
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	PAUTERO (Vigente)	✓			
	PALETA (Pleno y Pare en rojo)	✓			

OBSERVACIONES: Palanqueras internas en mal estado

FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 17596813

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Lemar Gonzalez
CEDULA: 17545655

INTER TRANSESCOLAR SAS

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

Tipo de vehiculo	Bus X	Buseta	Microbus	Camioneta	Otro	Municipio: Bogotá	Fecha: 28/04/2026
Placa: TTN-723	Modelo: 2012		Marca: Mercedes Benz		# tarjeta propiedad: 10018584503		# Ruta: 09
Kilometraje:	Nombre del conductor: Lemar Gonzalez Martinez						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	25/04/27	Numero licencia de conducción: 17545655	Poliza contractual:	01/12/2026
Vigencia del SOAT:	✓	20/01/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 29/05/2021 Conducta Gen lentes	Poliza extracontractual:	01/12/2026
Vigencia Tarjeta de operación:	✓	31/07/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquin (estado y señalizacion)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios	✓		N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)		X	
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml minimo (Etiquetado)	✓		06/27
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)		✓	
1	Paquete de Gasa precortada		✓	
3	Pares de Guantes desechables		✓	
3	Toallas Higienicas	✓		NO
1	Paquete de Algodón		✓	
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		11/29
5	Unidades de Baja lenguas	✓		NO
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		03/27
2	Tapabocas desechables		✓	
1	Rollo de Micropore		✓	
2	Apósitos Oculares	✓		NO
1	Rollos de Papel Higienico	✓		NO
1	Tijeras	✓		NO
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		NO
1	Inmovilizador de cuello	✓		NO

Observaciones:

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga: Abril 2025

Fecha proxima a recargar: Abril 2027

Capacidad en lb del extintor: 20 lb/5 kg

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado	✓	
Presión del manómetro	✓	
Pasador y sujetador	✓	
Estado de manguera (si aplica)	✓	
Estado de la boquilla	✓	
Estado de la valvula	✓	
Estado del cilindro	✓	
Estado de la pintura	✓	
Calcomanias	✓	
Sello o anillo de verificación de recarga	✓	
Marcación con placa	✓	
Soporte/Base del extintor	✓	

Observaciones:

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones: Adecuado estado de pintura

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Diego Pardo
CEDULA: 1006455838

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE: Lemar Gonzalez
CEDULA: 17545655

FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO							CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus	Buseta	Microbus	Camioneta X	Otro	Municipio: Arauca	Fecha: 28/07/26
Placa: GJY-841	Modelo: 2026		Marca: KGC		# tarjeta propiedad: 10038873335		# Ruta: 32
Kilometraje: 1909	Nombre del conductor: Genaro NUÑEZ Cuellar						Ultimo cambio aceite:

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	N/A	Numero licencia de conducción: 4940093	Poliza contractual:	07/04/2027
SOAT:	✓	13/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/02/2027	Poliza extracontractual:	07/04/2027
Tarjeta de Operación:	✓	28/05/27	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO/ NO CUENTA	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	✓			
	LIQUIDO DE FRENOS	✓			
	ACEITE MOTOR	✓			
	NIVEL LIQ. HIDRAULICO	✓			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS	✓			
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACCELERADOR (Uniformidad)	✓			
	CLUTCH (CLOCHE O EMBRAGUE)	✓			
	FRENO (Agarre)	✓			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES ALTAS - MEDIAS	✓			
	DIRECCIONALES	✓			
	ESTACIONARIAS	✓			
	STOPS (FRENOS)	✓			
	TESTIGOS DEL TABLERO	✓			
	LUZ DE REVERSA	✓			
	LUCES INTERNAS	✓			
EQUIPO DE CARRETERA	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	✓			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS Y/O TUERCAS	✓			
	2 CONOS RETROFLECS DE 18 CM DE ALTO	✓			
	2 TACOS	✓			
	UN (1) BOTIQUIN	✓			
	UN (1) EXTINTOR (Capacidad según su vehículo)	✓			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON: 1 Alicate (Pinza) corte diagonal, 1 Destornillador de pala y estrella, 1 Llave ajustable y un juego de llaves (juego mínimo 4 llaves fijas)	✓			
	LINTERNA	✓			
	UN (1) CHALECO REFLECTIVO	✓			
	GATO	✓			
OTROS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	✓			
	BATERIA (Bornes, sin corrosión, sulfatación)	✓			
	PINES (Verificar no tengan golpes, fisuras)	✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, enrollers o seo y ganchos, prueba de impacto)	✓			
	PITO REVERSA (Vehículos especiales)		✓		
	PITO	✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	✓			
	ESTADO CARCASA LUCES	✓			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar manchas de agua durante el recorrido, funcionamiento de los motores)	✓			
	TAPIZADO	✓			
	FRANJAS ESCOLARES (Parte posterior de la carrocería)	✓			
	FRASE ESCOLAR (Parte superior frontal y delantera de la carrocería)	✓			
	ESTADO DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
	ESTADO DE SEGUROS Y CHAPA	✓			
	RETROVISORES	✓			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	✓			
	INTERIOR (Vigente)	✓			
	PALETA (Pare y Pare en riego)	✓			

OBSERVACIONES:

Johan Lopez Niño
FIRMA MECANICO
NOMBRE:
CEDULA: 1759081?

Genaro Nuñez
FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 4940093

INTER TRANSESCOLAR SAS	FORMATO INSPECCIÓN DE VEHICULO HSEQ						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025
Tipo de vehiculo	Bus __	Buseta __	Microbus __	Camioneta X	Otro __	Municipio: Bucaramanga	Fecha: 28/07/2026
Placa: GZY-841	Modelo: 2026		Marca: KYC		# tarjeta propiedad: 10038573335		# Ruta: 32
Kilometraje:	Nombre del conductor: Jairo Niño Cuellar						

DOCUMENTOS DEL VEHICULO	Estado	Fecha Vencimiento	DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	POLIZAS	
Revisión Tecnicomecánica:	✓	N/A	Numero licencia de conducción: 4940093	Poliza contractual:	7/04/2027
Vigencia del SOAT:	✓	13/04/27	Tipo de licencia y vigencia: C2 23/02/2027	Poliza extracontractual:	7/04/2027
Vigencia Tarjeta de Operación:	✓	28/05/28	Restricciones:	Poliza todo riesgo:	

EQUIPOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN

CANT.	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	INSPECCION CUMPLE	INSPECCION NO CUMPLE	FECHA VECIMIENTO
1	Caja de Botiquín (estado y señalización)	✓		N/A
1	Manuel de primeros auxilios		✓	N/A
1	Formato registro de elementos de botiquin	✓		N/A
1	Frasco Isodine espuma (Etiquetado)	✓		12/27
2	Bolsa de Suero fisiologico 100 ml mínimo (Etiquetado)		✓	
1	Frasco de Rehidratante oral (etiquetado)	✓		07/26
1	Paquete de Gasa precortada	✓		12/29
3	Pares de Guantes desechables	✓		10/30
3	Toallas Higienicas	✓		N/A
1	Paquete de Algodón	✓		10/30
1	Rollo de Esparadrapo en tela	✓		12/28
5	Unidades de Baja lenguas	✓		N/A
2	Venda elástica en rollo de 2X5 y 3X5	✓		08/30
2	Tapabocas desechables	✓		N/A
1	Rollo de Micropore	✓		04/30
2	Apósitos Oculares	✓		N/A
1	Rollos de Papel Higienico	✓		N/A
1	Tijeras	✓		N/A
1	Inmovilizador (Cabestrillo)	✓		N/A
1	Inmovilizador de cuello	✓		N/A

EXTINTOR

Fecha de la ultima recarga:	
Fecha proxima a recargar:	Vencido
Capacidad en lb del extintor:	

Estado Extintor	Bueno	Malo
Extintor recargado		
Presión del manómetro		
Pasador y sujetador		
Estado de manguera (si aplica)		
Estado de la boquilla		
Estado de la valvula		
Estado del cilindro		
Estado de la pintura		
Calcomanias		
Sello o anillo de verificación de recarga		
Marcación con placa		
Soporte/Base del extintor		

Observaciones: Cambio a 10 libras

ORDEN Y ASEO

DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Cabina limpia, espejos y exteriores limpios	✓	
Paleta Pare Y Pare en Color Rojo	✓	

Observaciones:

OBSERVACIONES GENERALES:

FIRMA HSEQ
NOMBRE: Dion Pedro
CEDULA: 1098658839

FIRMA CONDUCTOR
NOMBRE:
CEDULA: 4940093

3. FORMATOS PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Arauca

FECHA 28/07/2026

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Demetrio Rangel	17583460	Conductor		X	07:09 am	
2	Lemar González	17545655	Conductor		X	07:27 am	
3	JUAN ALMEIDA	94450695	CONDUCTOR		X	07:29 am	
4	Omar Segura S	17588488	Conducto		Y	07:30 am	Omar Segura S
5	Omar G. Cordoba	17597101	Conductor		Y	07:30 am	
6	Jose Leon Sarmiento	3273828	Conductor		Y	07:41 00	
7	Miguel Pinto G.	1164130336	conductor		Y	07:45 am	Miguel Pinto G.
8	ALEXANDER ACEVERO	17594872	Conductor		Y	07:58 am	
9	Alvaro Galindo	96187050	conductor		Y	8:50 am	
10	Gelis Rosario Rojas	17597055	conductor		Y	8:51 am	
11	Yaneth Cortes	1117798892	Conductor		Y	8:51 am	
12	Karen Avendaño	1192719937	Monitora		Y	8 23 am	Karen A.
13	Yenni Asmara	1116773108	Monitora		Y	8 24 am	Yenni Asmara
14	Damarys Aguirre Renoso	7776777709	Monitora		X	8 26 am	Damarys AR
15	MARLYN RUIZ COLINA	68.292.926	MONITORA		Y	8 27 am	MARLYN RUIZ COLINA
16	IVON MARIA ALVAREZ	1069169270	Monitora		Y	8 28 am	Ivon Alvarez
17	Maria Eugenia Anaya	69894732	Monitora		Y	8 29 am	Maria Eugenia
18	SUSI AGUIRRE NIEVES	1116808497	Monitora		Y	8 29 am	SUSI AGUIRRE
19	Delvis Violeta Guerra	68216513	monitora		Y	8 29 am	Delvis Guerra
20	Yesselis Astuto	1116 792 139	monitora		Y	8 29 am	Yesselis Astuto

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR	FORMATO DE REGISTRO PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°555 DEL 2025

REALIZADA POR Diego Alejandro Padilla Vargas MUNICIPIO Dagua

FECHA 28/02/2025

N°	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	RESULTADO +	RESULTADO -	HORA	FIRMA TRABAJADOR
1	Belkis Yomara Contreras	66798814	Monitora		X	8:30 AM	Belkis Contreras
2	Yuls Paola Trujillo	1007167674	Monitora		X	8:30 AM	Yuls Trujillo
3	Yuleide Cardenas	1007267040	monitora		X	8:30 AM	Yuleide Cardenas
4	Jaime Reinel	1007979063	Monitore		X	8:30 AM	Jaime Reinel
5	Livia Reyes	1125761029	Monitora		X	8:31 AM	
6	Yurani Arizmendi	1116801143	Monitor		X	8:31 AM	Yurani Arizmendi
7	Daniela CRUZ Contreras	1006954084	MONITORA		X	8:31 AM	Daniela CRUZ
8	Alexander Figueredo	1.121867317	Monitor		X	8:30 AM	
9	Rosi perez	1.116774481	monitora		X	8:30 AM	
10	Cuntei Ricardo Cuero	1006499319	Monitor		X	8:30 AM	
11	Dennisse Farfan F	1007459905	Monitora		X	830 AM	Dennisse F.
12	Fabio Londoño	1007959879	monitor		X	8:30 AM	Fabio L.
13	Luis Alvarado	1006456001	monitor		X	8:30 AM	
14	Ana Maria Gonzalez	1006456251	Monitora		X	830 AM	Ana Gonzalez
15	Arleidis Garzon	65299355	monitora		X	8:30 AM	Arleidis GARZÓN
16	Aner Arevalo	17594379	conductor		X	09:11 AM	
17	Nel Arevalo	1116775317	Conductor		X	09:10 PM	
18	Dano Pedroza	18927385	conductor		X	09 2000	Dano Pedroza
19	Roque Julio Vegas	17588361	conductor		X	09 9100	
20	JENAYD NUÑEZ	4940093	Conductor		X	09 22 AM	

FIRMA RESPONSABLE

INTER TRANSESCOLAR
2025

4. FORMATO DE ASISTENCIA INSPECCIONES.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardin
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 28/07/2026 **LUGAR DE INSPECCION** Municipio de Arauca

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Demetrio Rangel	17583460	3102310759	Conductor	11	Arauca	Agropecuaria	
Lemar Gonzalez	17545655	3176205300	conductor	9	Arauca	Agro pe	
JUAN ALMEIDA	94430695	3212974535	CONDUCTOR	20	ARAUCA	MATECAÑA	
Omar Segura S	17588458	3125840189	Conductor	26	Arauca	Monserrate	
OMAR G. Cardenas	17592101	3214072183	Conductor	13	Arauca	Agropecuaria	
Jose Jose G	3273825	3115213940	Conductor	23	Arauca	Matecaña	
Miguel Pinto C	1104130336	3214394432	conductor	17	Arauca	Agropecuaria	
ALEXANDRA ACEVEDO	17594871	3223592816	Conductor	22	Arauca	Bolivar	
Aner Arevalo	17594379	3222193042	conductor	15	Arauca	Gilwani	
Omar Pedroza	18977385	3208933[illegible]	conductor	26	Arauca	monserrate	
Roque Julio Vega	17588361	3114814312	conductor	21	Arauca	Matecaña	
Nel Arevalo	1116775317	3214918300	Conductor	19	Arauca	matecaña	
[illegible]	1116798892	3230102666	Conductor	42	Arauca	Monserrate	
IVAN ALVAREZ	1007167279	3227800491	MONITORA	21	ARAUCA	Matecaña	
SOS. AGUILERA NIEVES	1116.805491	3112046360	Monitora	16	Arauca	Agropecuaria	
MARLYN RUIZ COLINA	68.292.926	3164672333	MONITORA	12	ARAUCA	AGROPECUARIO	
Damarys Aguirre Renoge	1116777709	3102630088	Monitora	14	Arauca	Agropecuaria	
Karen Avendaño	1142719493	3192730[illegible]	Monitora	15	Arauca	Agropecuaria	
Maria Eugenia Arenas	68294732	3112109438	Monitora	23	Arauca	Matecaña	
Yaneide cardenas	1007207040	3228964924	Monitora	11	Arauca	Agropecuario	
Jaimar Reinel	1007979063	3234584960	Monitora	18	Arauca	Agropecuaria	
Yurani Arizmendi	1116801143	3024594188	Monitor	18	Arauca	Agropec	
Yenni Acevedo	1116773108	3183599042	MONITOR	10	ARAUCA	Agropec	
Alexander Figueredo	1.118695	3229689499	Monitor	19	Arauca	Bucaran	
Yuly Trujillo	1007167674	3102735454	Monitor	22	Arauca	Matecaña	

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 28/07/2026 **LUGAR DE INSPECCION** Municipio de Arauca.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL PROYECTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	CARGO	RUTA	MUNICIPIO	BARRIO/ VEREDA	FIRMA
Dahis Violeta Guerra	68296513	3219538727	Monitora.	20	Arauca.	Barranquitas	Dahis Guerra
Perlis Yorme Contreras	68278814	3228508637	Monitora	26	Arauca	Huntsville	Perlis Contreras
Daniela CRUZ C.	1006959089	3167319638	monitora	31	ARAUCA	Panchera	daniela c
Yoselin maTUTE	1116792.134	3138520527	moTiTora	28	Arauca	monserrate	Yoselin m
Raul Perez	1116.774.431	3118556701	monitor	13	Arauca	Obispeño	
JUAN MUNOZ	PH4X0695	3213 4	CONDUCTOR	ARAUCA	ARAUCA	MERCEDES	
ARLEDIS GARZON	68290385	3-2284129	Monitora	26	ARAUCA	Monserrate	Arledis Garzon

INTER TRANSESCOLAR
2025

5. PARQUE AUTOMOTOR SUBSANADO EN JUNIO.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES															
N°	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		CERTIFICADO PROPIEDAD DE MOTORES		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Arauca															
1	PIEDEMONT	X		X		X		X			X	X		No cuenta con Frasco de isodine espuma y 3 pares de guantes desechables. Arreglar capota de motor	Subsano capota de motor y subsano elementos de botiquin faltantes.
2	LA TARATARITA DEL LLANO	X		X		X		X			X	X		No cuenta con bolsa de suero fisiologico de 500 Ml y no tiene linterna. Falta numero de patente en la embarcación	Subsano ¿bolsa de suero fisiológico, linterna y agrego número de patente de navegación a la embarcación
3	LA NIÑA	X		X			X	X			X	X		No cuenta con botiquin y le falta juego de destornilladores. Emfibrar popa de la embarcación y falta certificado propiedad de motores	Subsano la falta de botiquin y herramientas, enfibro popa de embarcacion y saco el certificado propiedad de motores
4	LOS SABANALES	X		X		X		X		X		X		Falta numero de patente en la embarcación	Agrego número de patente en la embarcación
5	LA VENCEDORA	X		X		X		X		X		X		Falta numero de patente en la embarcación	Agrego número de patente en la embarcación

Cl 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

105


INTER TRANSESCOLAR
2025

ARAUCA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Intertransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

PIEDEMONT

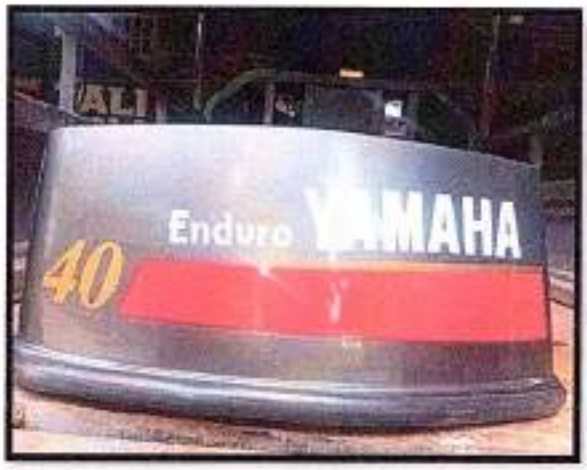






✓ Subsano capota de motor y subsano elementos de botiquín faltantes.

LA TARATARITA DEL LLANO



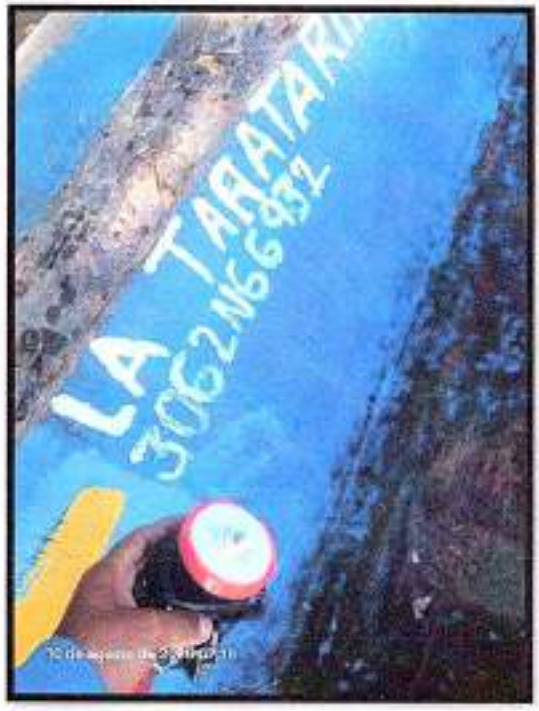


✓ Subsano bolsa de suero fisiológico, linterna y agrego número de patente de navegación a la embarcación.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

LA NIÑA



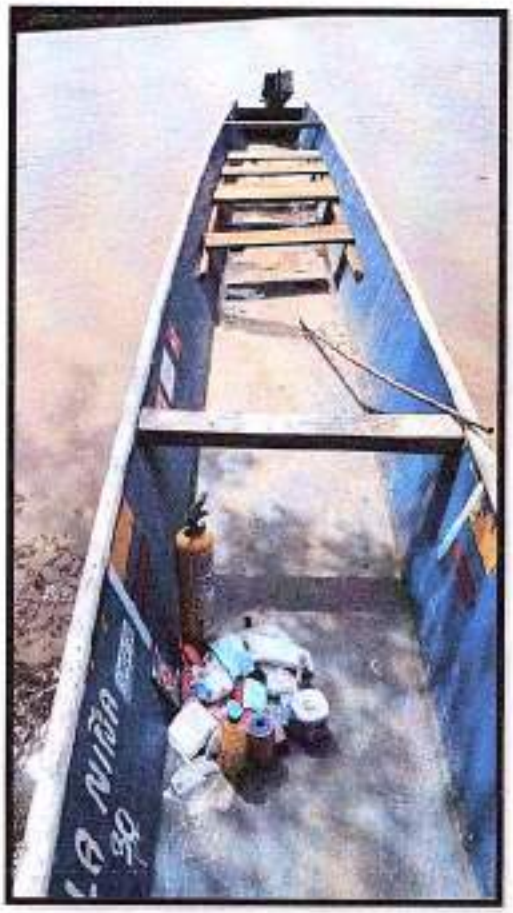



- ✓ Subsano la falta de botiquín y herramientas, enfibro popa de embarcación y saco el certificado propiedad de motores

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

LOS SABANALES



✓ Agrego número de patente en la embarcación

LA VENCEDORA



✓ Agrego número de patente en la embarcación

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

6. PARQUE AUTOMOTOR SUBSANADO MUNICIPIO DE ARAUQUITA.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

PARQUE AUTOMOTOR DE TRANPORTE ESCOLAR

PLACA DEL VEHICULO	AÑO DEL VEHICULO	TIPO DE VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	LICENCIA VIGENTE	TECNOMECANICA		SOAT VIGENTE		T. OPERACIÓN VIGENTE			POLIZAS VIGENTES			BOTIQUIN		EXTINTOR		INC. MECANICAS		INCONSISTENCIA GENERALES	SUBSANACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	VIGENTE	VENCIDO	VIGENTE	VENCIDO	NO	SI		
MUNICIPIO DE ARAUQUITA																						
WRO-999	2014	MICROBUS	QUINTO MANTILLA RIVERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	Agregar franja y frase escolar
XNS-431	2007	MICROBUS	DAVID LEONARDO CASTELLANOS	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con frase escolar	Agregar frase escolar
TFO-367	2012	MICROBUS	HERVIN WILBERNA GARCIA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con frase ni franja escolar	Agregar franja y frase escolar
NOY-146	2024	CAMIONETA	DIEGO ALFONSO AGUILAR BELEÑO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	Agregar franja y frase escolar
XVO-809	2000	BUSETA	JHONATS MENDOZA LASSO	C1	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franjas ni frase escolar	Agregar franja y frase escolar
SPP-825	2007	MICROBUS	HERMES HERREÑO MOSQUERA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Revisión de bujes de tijera y bujo de cajeta lado derecho	Cambio bujes de tijera, evidencia en video
TBE-618	2004	BUS	NOE GARZON SALDAÑA	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con frase escolar	Agregar franja y frase escolar
JCW-923	2020	BUSETA	NUMAEL ALEXIS BLANCO GONZALES	C2	X		X		X			X			X		X			X	No cuenta con franja escolar	Agregar franja y frase escolar
USD-208	2007	BUS	WILLIAM ALEXIS LEAL MEDINA	C2	X		X		X			X				X	X			X	Luz media del lado derecho no funciona, no cuenta con frase escolar, panoramico con fisura y ajustar terminales de direccion.	Cambios luces de media, agregar frase escolar y ajuste terminales. Evidencia en video
TRJ-630	2012	BUS	MANUEL MARCOLINO MENA	C2	X		X		X			X			X		X			X	Bumper delantero en mal estado y no cuenta con frase escolar	Sobrare bumper delantero y agregar frase escolar
XVB-187	2006	BUS	FELIPE CEPEDA ROSA	C3	X		X		X			X			X		X			X	En mal estado llanta delantera derecha y lateral de escalones trasero izq. roto	Cambio llantas delanteras y cortijo escalonaje

Calle 18 N° 30b - 27 Urbanización Ciudad Jardín
Correo electrónico
Celular: 3008005548

CONSORCIO INTER-TRANS ESCOLAR 2025

EMBARCACIONES

Nº	NOMBRE DE EMBARCACIONES	PATENTE NAVEGACION VIGENTE		INSPECCION VIGENTE		CERTIFICADO PROPIEDAD DE MOTORES		POLIZA VIGENTES		BOTIQUIN		EXTINTOR		OBSERVACIÓN	SUBSANACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Vigente	Malo	Vigente	Malo		
Municipio de Arauquita															
2	LA INDIA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con nombre en la embarcación	Agrego nombre en la embarcación
3	LA COLEGIADA	X		X		X		X		X		X		No cuenta con pito al igual que linterna y tiene fisura en la parte baja de la embarcación	Subsano la ausencia de pito y linterna, enfibro fisura de embarcación
4	LA UNICA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito al igual que linterna	Subsano la ausencia de pito y linterna
5	LA CAMPANA	X		X		X		X			X	X		No cuenta con pito	Subsano falta de pito
15	LA NIÑA ELIZABEHT	X		X		X		X		X		X		No cuenta con helice de repuesto, juego de llaves 10 mm y 12 mm junto con las 2 bujias de repuesto. Casco de canoa requiere enfibrado y pera de combustible en mal estado	Subsano ausencia de helice, llaves de repuestoy bujias. Enfibro parte baja de la embarcación
16	LA MAYE	X		X		X		X			X	X		falta pito, no tiene helice y las 2 bujias de repuesto. Capota de motor en mal estado (reparar)	Subsano capota de motor, bujias y pito

Cll 18 N° 30A – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184905580

INTER TRANSESCOLAR
2025

ARAUQUITA

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XMB-491



✓ Agrego frase escolar, evidencia en video

WEQ-689



✓ Agrego franja y frase escolar

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

TFQ-367



✓ Agrego franjas y frase escolar.



✓ Agrego franjas y frase escolar.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560


INTER TRANSESCOLAR
2025

XVO-808



✓ Agrego franjas y frase escolar.

SPP-825

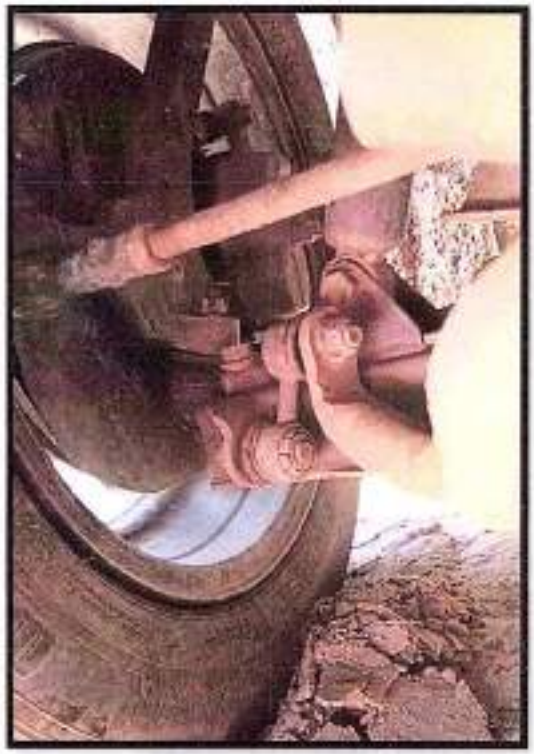

✓ Cambio bujes de tijera, evidencia en video.

INTER TRANSESCOLAR
2025

TBK-670



✓ Agrego franja y frase escolar.

JQV-933



Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

USD-208





✓ Cambios luces de media, agrego frase escolar y ajusto terminales. Evidencia en video

TFU-830





✓ Subsano bómper delantero y agrego frase escolar

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

XVB-167

CVS SERVITECAS

LLANTAS EL MORICHAL

CVS - SERVITECAS S.A.S
NIT 901.144.305-8 Responsable de Iva
Dir: Carrera 19 N° 33-39
Yopal - Casanare
Cel: 3174310956
Email: auxtransm@cvsservitecas.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEKM - 2220
Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764125003069 / 2026-01-26 vence 2027-01-26 de FEKM 1678 - 10000 vigencia en
CUFE
9623772378c1773e29fb7c5f12e14aa6515ddefed3e5d0c10e9de37fa8ac2a554163fbccc1c6ccc4d34ae
2688a9827

Nombre Deudor:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA			Fecha Emision:	03/07/2026
NIT:	834001001-8	Email:	cooperativa@cootranar.co	Fecha Vencimiento:	04/07/2026
Direccion:	CL 6 # 2-12 BRR SAN ISIDRO			Vendedor:	EDWIN MAURICIO ALV
Ciudad:	ARAUQUITA (ARAUCA)	Tel:	3212161648	Cel: 3186052223	Forma de Pago: Credito 1 Dias

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Iva	% Desc	Valor Total sin Iva
WO5002	295/80R22.5 WOGEN WG758 DIR PAV 18PR 152/149M	2	882,352.94	19	0.00	1,764,706.00
1	04/07/2026	2,005,559				

✓ Cambio llantas delanteras y corrigió espárragos

LA INDIA



✓ Agrego nombre en la embarcación.

INTER TRANSESCOLAR
2025

LA NIÑA ELIZABEHT





✓ Subsano ausencia de hélice, llaves de repuesto y bujías. Enfibro parte baja de la embarcación

LA UNICA




✓ Subsano la ausencia de linterna y pito

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
2025

LA MAYE

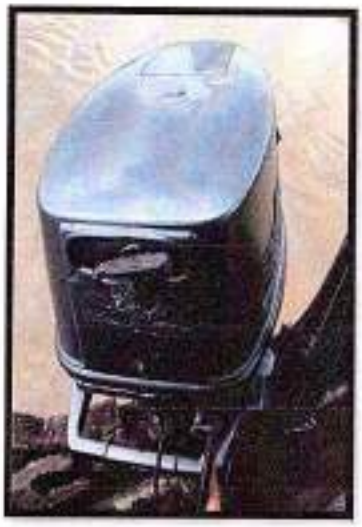



✓ Subsano capota de motor, bujías y pito.

LA CAMPANA





✓ Subsano falta de pito.

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Interntransescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560

INTER TRANSESCOLAR
IIES

LA COLEGIADA

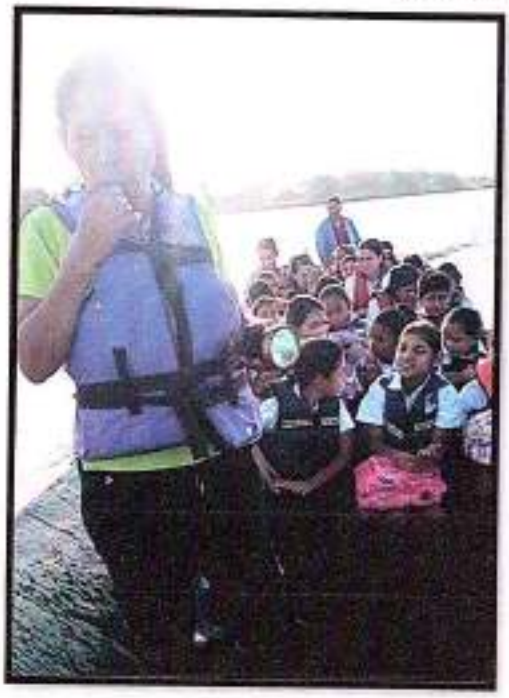

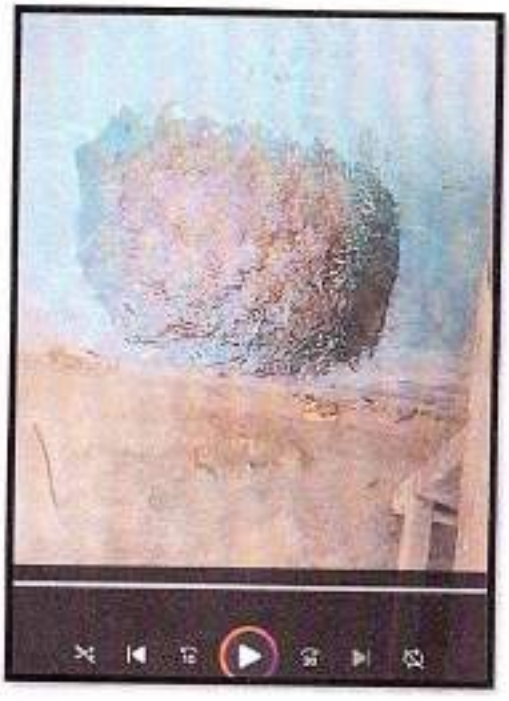

✓ Subsano la ausencia de pito y linterna, enfibro fisura de embarcación

Calle 18 N° 30b – 27 Urbanización Ciudad Jardín
Inter.transescolar2025@gmail.com
Celular: 3184495560
