CONTRATO ☐ CONVENIO ■

Proyectos: 3.1. Monitoreo y restauración de ecosistemas marino-costeros como soporte a la conectividad en el departamento. 6.1. Fortalecimiento de la producción y el consumo sostenible en el departamento de Córdoba. 6.2. Fomento y fortalecimiento de negocios y emprendimientos verdes en el departamento de Córdoba

LOCALIZACIÓN: Municipios del departamento de Córdoba

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 01 de Junio – 30 de junio de 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del convenio verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONVENIO:

CONVENIO N°:	012 DE 2026
TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	28 DE ENERO DE 2026
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN FLORA Y FAUNA
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO HOYOS BEGAMBRE
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.086.415.836
DESEMBOLSO 1 (40%):	N.A
PLAZO:	9 MESES
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 DE OCTUBRE DE 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	No se han suscrito suspensiones		
	Reinicio No. 1		
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**--**		
PRÓRROGAS:	No se han realizado prórrogas	--	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**--**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
NIT ASEGURADORA	860524654-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.aseguradorasolidaria.com.co			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	540 47 994000038369			**ANEXO No** 1
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	SI	30/01/2026	12/05/2027	$108.641.583,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SI	30/01/2026	12/05/2027	$391.109.701,00
Calidad del servicio	SI	30/01/2026	12/05/2027	$108.641.583,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	30/01/2026	12/11/2029	$54.320.791,80
POLIZA RCE No	540 74 994000008257 ANEXO N° 1			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	SI	28/01/2026	31/10/2026	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

Durante este período no se realizaron requerimientos y/o reportes de incumplimiento.

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad en zonas costeras.	Tres (3) organizaciones comunitarias del municipio de Los Córdobas y una (1) organización comunitaria del municipio de San Antero fortalecidas para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad: ▪ Doce (12) talleres (tres talleres por comunidad) en gestión y uso sostenible de la biodiversidad, estrategias de comercialización, marketing, valor agregado del producto, envasado y etiquetado, calidad del producto y normatividad. ▪ Entrega de tres (3) kits con materiales para fortalecer el componente de comercialización de las iniciativas productivas apoyadas en el municipio de Los Córdobas. ▪ Entrega de materiales para apoyo a una (1) iniciativa productiva sostenible en San Antero ▪ Siembra con especies nativas melíferas que favorezcan la actividad apícola y el manejo del paisaje. ▪ Tres (3) visitas técnicas de seguimiento y asesoría técnica a cada proyecto apoyado.	73%. Se reportan avances significativos en el desarrollo de talleres con las comunidades y las entregas de materiales para fortalecimiento de las organizaciones.
2	Acompañamiento y apoyo a los sectores productivos priorizados del departamento en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental	▪ Seis (6) talleres en producción sostenible, legalidad ambiental, contabilidad y marketing digital con tres (3) empresas de los sectores agrícola, pecuario y minero-energético del departamento. ▪ Asistencia técnica para la implementación de una biofábrica para elaboración de biopreparados en una empresa del sector agrícola del departamento, incluyendo la entrega de materiales, herramientas e insumos requeridos. ▪ Entrega de plántulas y abono orgánico para la implementación de barreras vivas con especies nativas en empresas de los sectores agropecuario y minero-energético. ▪ Entrega de puntos ecológicos para fomentar la gestión de residuos en empresas de los sectores atendidos	80%. Se reportan avances en el desarrollo los talleres con empresa del sector agrícola, con comunidades del área de influencia de empresas del sector minero energético y porcícola. Se realizó la entrega de plántulas, abono orgánico y puntos ecológicos.
3	Acompañamiento en la implementación de mecanismo de producción sostenible en planta de beneficio de sistema pecuario	▪ Tres (3) talleres sobre producción sostenible y mecanismos de producción en planta de beneficio del sector pecuario: uso eficiente del agua y la energía, manejo de efluentes, gestión de residuos sólidos. ▪ Una (1) jornada práctica para el aprovechamiento y valorización de residuos orgánicos, que contempla el suministro de materiales e insumos necesarios para su implementación.	84%. Desarrollo de dos talleres en producción sostenible y jornada práctica de aprovechamiento de residuos.
4	Implementación de acciones estratégicas para	▪ Un (1) evento - Seminario con expertos en temáticas relacionadas con la producción sostenible y tecnologías	72%. Se reporta el desarrollo del

	el fomento y fortalecimiento de la producción y el consumo sostenible.	limpias. ▪ Desarrollo de la convocatoria 2026 de los programas de reconocimiento ambiental Aval de Confianza y Lideram, vinculando diferentes sectores productivos del departamento de Córdoba ▪ Apoyo en la atención a solicitudes y trámites, recibidos en la CVS, relacionados con la producción y el consumo sostenible.	Seminario en Producción Sostenible y el desarrollo de la convocatoria Aval y Lideram 2026, lográndose la inscripción de 50 empresas.
5	Implementación de la estrategia nacional de residuos posconsumo en el departamento	Una (1) Jornada de recolección de residuos posconsumo, en la ciudad de Montería, con vinculación de, por lo menos, un municipio de la ecoregión San Jorge	95%. Se desarrollaron las Jornadas de recolección de residuos posconsumo en Montelíbano y Montería, se presentan resultados consolidados.
6	Implementación de acciones de fomento de la estrategia nacional de economía circular en el departamento	▪ Dos (2) talleres en Economía Circular, aprovechamiento y transformación de residuos, con actores claves. ▪ Concurso ambiental con Instituciones Educativas, que permita seleccionar las mejores estrategias de implementación de la economía circular, articulados con los PRAES ▪ Entrega de mobiliario en madera plástica (Parque infantil) para incentivar la economía circular en instituciones educativas del departamento. ▪ Encuentro Avances en Economía Circular en la Región ▪ Un (1) proyecto para el fomento del aprovechamiento y la valorización de residuos: Dos (2) Jornadas de fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos legales para el aprovechamiento de residuos; Una (1) campaña de sensibilización y visibilización de la labor del reciclador en la ciudad de Montería y entrega de mobiliario en madera plástica.	10%. Se realizó reunión de socialización con representantes de organizaciones de recicladores para el diseño y puesta en marcha de jornadas de fortalecimiento y campaña de sensibilización de la labor del reciclador.
7	Implementación del plan departamental de negocios verdes	▪ Dos (2) mesas de trabajo con empresarios de Negocios Verdes Córdoba y miembros del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes de Córdoba ▪ Diseño, elaboración y difusión de material para la promoción de los negocios verdes del departamento y del Programa de Negocios Verdes de la Corporación ▪ Aplicativo digital para la visualización, consulta y análisis de resultados de mediciones e indicadores de negocios verdes del departamento	57%. Se llevó a cabo una sesión del Comité Interinstitucional de Negocios Verdes de Córdoba, se diseñó el material promocional del programa y se avanza en la herramienta (Geovisor) de

			negocios verdes.
8	Implementación de acciones estratégicas para el encadenamiento comercial de negocios verdes con consumidores y/o actores del mercado	▪ Diseño y puesta en marcha de una estrategia de comunicación permanente para promocionar los bienes y servicios ofrecidos por los negocios verdes de la ventanilla de CVS. ▪ Feria para Negocios Verdes de Córdoba y rueda de relacionamiento. ▪ Apoyo a negocios verdes del departamento en la participación en tres eventos de orden local, regional y/o nacional	44%. Se reportan avances en la implementación de estrategia de promoción de negocios verdes. Se implementó la "Tienda de Negocios verdes" en Feria Nacional de la Ganadería.
9	Desarrollo de una herramienta de información, monitoreo y seguimiento a los negocios verdes verificados en el departamento	▪ Cálculo de las emisiones de GEI para sesenta (60) negocios verdes, del escenario de referencia y escenario actual, según métodos y tecnologías establecidas en los lineamientos del IPCC. ▪ Levantamiento de los criterios definidos en el estándar global de la IUCN para Soluciones Basadas en la Naturaleza, para los negocios verdes seleccionados. ▪ Informe con análisis de resultados y recomendaciones ▪ Reverificación y seguimiento a sesenta (60) Negocios verdes	55%. Durante este período se reportan avances en las visitas y cálculos para medición de indicadores y reverificación en total de 49 negocios verdes.
10	Identificación y verificación de nuevos negocios verdes en el departamento	▪ Catorce (14) nuevos negocios verdes identificados y verificados en el departamento de Córdoba ▪ Diseño e implementación de estrategias para promover la inscripción y registro de nuevos negocios verdes ante CVS. ▪ Elaboración y socialización de los planes de mejora para cada negocio verificado ▪ Elaboración y remisión de reportes e información del Programa de Negocios Verdes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	59%. En el período de este informe se reportan avances en la verificación de 6 nuevos negocios verdes en el departamento.
11	Desarrollo de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de negocios y emprendimientos verdes en el departamento.	▪ Cuatro (4) jornadas de fortalecimiento a emprendimientos y negocios verdes del departamento de Córdoba ▪ Atención de solicitudes y trámites recibidos en la CVS, correspondientes a la temática de negocios verdes.	90%. Se reportan avances el desarrollo de jornadas de fortalecimiento de negocios verdes y atención de solicitudes.


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG**	**Código: GJ-FO-30**
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	**Fecha:10/12/2025**

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES


HERRAMIENTA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO CONVENIO 012 DE 2026

AVANCE FISICO

				General		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
N°	**Actividad POAI**	**Mes de inicio**	**Mes de fin**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**	**% Programado**	**%Ejecutado**
3.1.5	Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad en las zonas costeras.	Mes 1	Mes 6	9,09%	6,62%	1,52%	0,91%	1,52%	0,45%	1,52%	0,18%	1,52%	2,45%	1,52%	2,63%	1,52%		0,00%		0,00%		0,00%	
6.1.1	Acompañamiento y apoyo a los sectores productivos priorizados del Departamento en la implementación de estrategias de sostenibilidad ambiental	Mes 2	Mes 5	9,09%	7,26%	0,00%	0,45%	2,27%	0,45%	2,27%	0,18%	2,27%	2,54%	2,27%	3,64%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
6.1.2	Acompañamiento en la implementación de mecanismo de producción sostenible en planta de beneficio de sistema pecuario.	Mes 5	Mes 7	9,09%	7,64%	0,00%	0,45%	0,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	7,00%	3,03%	0,00%	3,03%		3,03%		0,00%		0,00%	
6.1.3	Implementación de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la producción y el consumo sostenible.	Mes 3	Mes 7	9,09%	6,53%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	1,82%	0,45%	1,82%	3,18%	1,82%	2,00%	1,82%		1,82%		0,00%		0,00%	
6.1.4	Implementación de la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Posconsumo en el Departamento.	Mes 1	Mes 9	9,09%	8,62%	1,01%	1,82%	1,01%	1,35%	1,01%	5,00%	1,01%	0,45%	1,01%	0,00%	1,01%		1,01%		1,01%		1,01%	
6.1.5	Implementación de acciones de fomento de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) en el Departamento.	Mes 5	Mes 8	9,09%	0,90%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	2,27%	0,00%	2,27%		2,27%		2,27%		0,00%	
6.2.1	Implementación del Plan Departamental de Negocios Verdes.	Mes 1	Mes 9	9,09%	5,15%	1,01%	0,45%	1,01%	0,45%	1,01%	1,81%	1,01%	0,90%	1,01%	1,54%	1,01%		1,01%		1,01%		1,01%	
6.2.2	Implementación de acciones estratégicas para el encadenamiento comercial de Negocios Verdes, con consumidores y/o actores del mercado	Mes 1	Mes 9	9,09%	3,99%	1,01%	0,91%	1,01%	0,18%	1,01%	0,72%	1,01%	1,36%	1,01%	0,82%	1,01%		1,01%		1,01%		1,01%	
6.2.3	Desarrollo de una herramienta de información, monitoreo y seguimiento a los Negocios Verdes verificados en el Departamento.	Mes 1	Mes 7	9,09%	4,99%	1,30%	0,45%	1,30%	2,00%	1,30%	0,72%	1,30%	1,09%	1,30%	0,73%	1,30%		1,30%		0,00%		0,00%	
6.2.4	Identificación y verificación de nuevos Negocios Verdes en el Departamento.	Mes 3	Mes 9	9,09%	5,34%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	1,30%	0,63%	1,30%	1,18%	1,30%	2,63%	1,30%		1,30%		1,30%		1,30%	
6.2.5	Desarrollo de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de negocios y emprendimientos verdes en el Departamento.	Mes 3	Mes 5	9,09%	8,16%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	3,03%	1,81%	3,03%	5,45%	3,03%	0,0%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				100%	**65,23%**	**5,84%**	**7,27%**	**8,12%**	**6,33%**	**14,26%**	**11,59%**	**14,26%**	**26,05%**	**19,57%**	**13,99%**	**14,26%**	**0,00%**	**12,75%**	**0,00%**	**6,60%**	**0,00%**	**4,33%**	**0,00%**

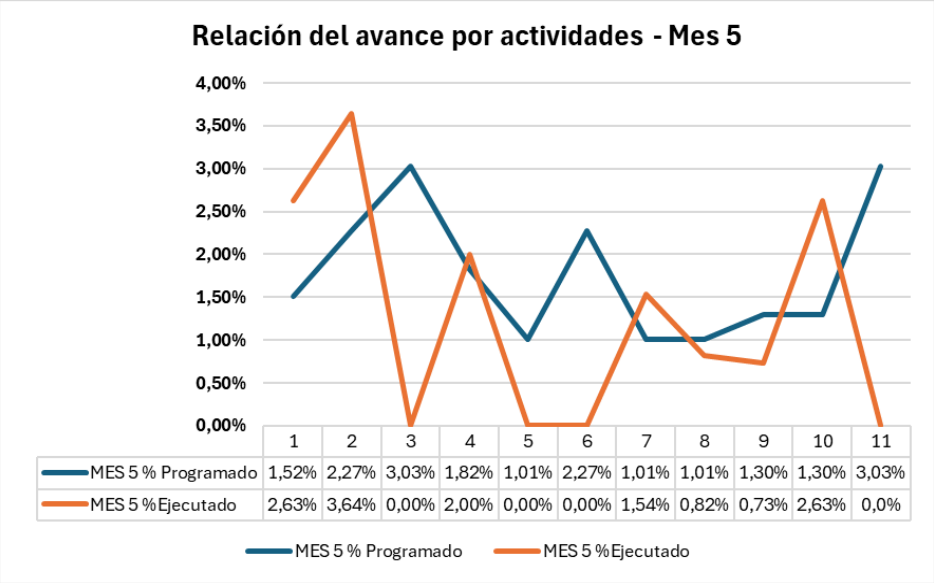

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MES 5 % Programado	1,52%	2,27%	3,03%	1,82%	1,01%	2,27%	1,01%	1,01%	1,30%	1,30%	3,03%
MES 5 %Ejecutado	2,63%	3,64%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	1,54%	0,82%	0,73%	2,63%	0,0%

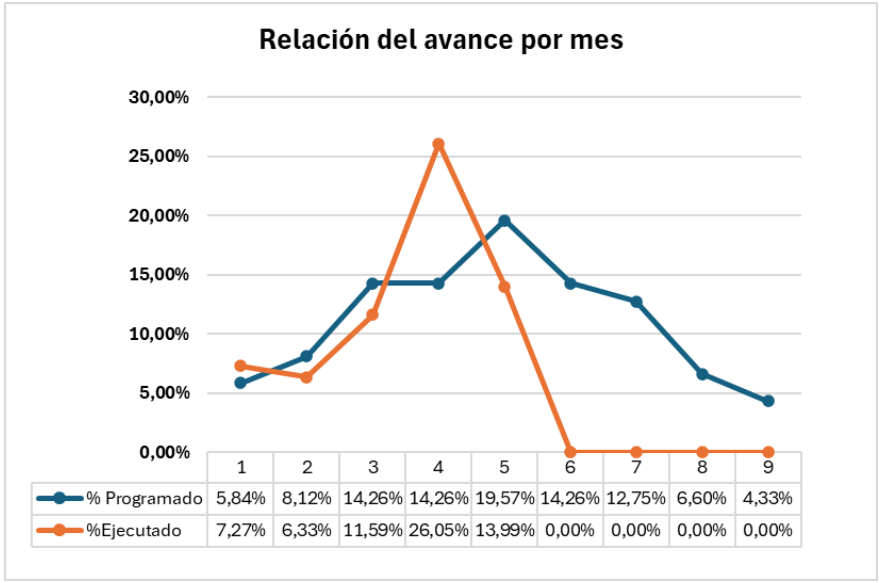

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Programado	5,84%	8,12%	14,26%	14,26%	19,57%	14,26%	12,75%	6,60%	4,33%
%Ejecutado	7,27%	6,33%	11,59%	26,05%	13,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Durante el quinto mes de ejecución del Convenio de Asociación 012 de 2026, se reporta un avance del 14% de las actividades conveniadas, lo que, sumado a lo ejecutado en meses anteriores, representa un 65% de avance general. Es importante señalar que, en este período, se evidencia un avance significativo en varias de las actividades conveniadas, entre estas: las actividades 1, 2, 4 y 10, en las que se superó el porcentaje programado. Asimismo, se resalta que, para algunas actividades como la 3, 5 y 11 se presentan avances menores a los programados inicialmente, pero esto obedece a que en períodos anteriores fue posible avanzar de manera importante en el desarrollo de las mismas. En términos generales, se considera que el convenio avanza de manera satisfactoria, y en cinco (5) meses de ejecución se ha superado el 60% de avance físico.

ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR TOTAL DEL CONVENIO: $1.086.415.836
VALOR ANTICIPO: N.A
% AVANCE FINANCIERO: 40%

RELACION DE ACTAS

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
SUSCRIPCIÓN	28/01/2026							
DESEMBOLSO 1	13/03/2026	N.A		N.A		$391.109.701		**$391.109.701**
TOTAL						**$391.109.701**		**$391.109.701**

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

A la fecha, se han presentado, por parte del Conveniante, los siguientes soportes como evidencia de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del Sistema de Gestión Integral:

REQUISITOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
Asegurar que el personal requerido para la ejecución del convenio cuente con la educación, formación y experiencia para garantizar el óptimo desarrollo del objeto contractual.	El personal contratado cumple con los requisitos de formación y experiencia.	Se remiten documentos del personal contratado.
Socializar con el equipo que realizará las	Reunión inicial	Se remitió registro de la

actividades definidas en el convenio, la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS.	socialización actividades del convenio, documentación básica del SGI de CVS.	actividad realizada.
Realizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios con respecto a las actividades adelantadas durante el convenio y que hacen parte de los resultados a entregar a la CVS.	Se presentaron encuestas de satisfacción y tabulación de resultados de actividades del convenio, reportando, en términos generales, un buen grado de satisfacción por parte de los usuarios.	--
Asegurar que los equipos de medición utilizados para el cumplimiento del objeto del convenio cuenten con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias y entregar copia de estas certificaciones a la CVS	Se presentaron certificados de calibración de básculas.	--
REQUISITOS DE SST	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO**	**OBSERVACIONES**
Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del convenio, para que garantice el cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de su ejecución y la normatividad vigente.	Se designó un representante de SST.	Se presentó hoja de vida y documentos anexos del responsable, información que fue remitida al profesional SST -CVS
Cumplir con el diseño de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el convenio.	Se presentó documentación del sistema	Se remitió información a Profesional SST CVS
Presentar a la CVS la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del convenio	Se presentó la matriz de riesgos	Información remitida a profesional del área de SST de CVS para revisión.
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se realizó reunión de inducción con personal del equipo de trabajo	Se presentó registro de asistencia y fotográfico de la actividad realizada
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos.	Se presenta acta de entrega de EPP a contratista.	--
Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del convenio se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto medico ocupacional favorable	Se verificó por parte del conveniante la vinculación del personal al sistema de seguridad social y el concepto médico	Se presentaron certificados de afiliación y certificados médicos ocupacionales de los contratistas. La documentación fue remitida

	favorable	a la profesional SST – CVS.
Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Se estructuró el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	La documentación fue presentada y remitida a la Profesional SST - CVS.
Presentar el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico de seguridad vial en los convenios en los cuales se haga uso de sistema de transporte.	Se presentó plan estratégico de seguridad vial y documentación.	La documentación fue remitida a la profesional SST – CVS.

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos	Se presentó información sobre las medidas implementadas para reducir, mitigar y corregir impactos ambientales significativos.	--
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del convenio	Se presentó información sobre las medidas implementadas para garantizar el uso eficiente del agua, energía, papel y manejo adecuado de residuos.	--
Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se presentó documentación solicitada.	--

Adicional a lo anterior, por parte del Conveniante se vienen presentando informes mensuales de las acciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones en el marco del Sistema de Gestión Integral.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Supervisión de actividad





Actividad 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad en zonas costeras – entrega de materiales en San Antero





Actividad 2. Acompañamiento y apoyo a los sectores productivos priorizados del departamento en implementación de estrategias de sostenibilidad









Actividad 4. Implementación de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la producción y el consumo sostenible – Seminario Académico en Producción Sostenible









Actividad 8. Acciones estratégicas para el encadenamiento comercial de negocios verdes con consumidores y/o actores del mercado – Tienda de Negocios Verdes en Feria Nacional de la Ganadería





Actividad 10. Identificación y verificación de nuevos negocios verdes en el departamento

En el el quinto mes de ejecución del Convenio de Asociación N° 012 de 2026, celebrado con la Fundación Flora y Fauna, se evidencia un avance consolidado del 65% en el desarrollo de las actividades conveniadas.

No se reportaron durante este período, por parte del Conveniante, situaciones que comprometieran el óptimo desarrollo del convenio.

Para constancia se firma a los 8 días del mes de julio del año 2026.

DORY LUZ JIMÉNEZ MONTIEL
Supervisor CVS

Fecha corte informe: 30 de junio de 2026
