INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 000-770 DE 2025
PERIODO DEL 13 DE ENERO DE 2026 AL 23 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE RECIBO FINAL

PARTE A: RESUMEN EJECUTIVO:

Tabla 1. *Generalidades Contrato de Consultoría No 000-770 DE 2025.*

GENERALIDADES	
CONTRATO DE CONSULTORIA No:	000-770 DE 2025
CONTRATISTA:	FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
NIT:	900942196-1
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR:	$ 203.321.000,00 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	4,00 MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No 1264 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 1597 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACION:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
POLIZAS:	No CMZ-100017304 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
APROBACION DE POLIZAS INICIALES:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO:	13 DE ENERO DE 2026
ANTICIPO:	$ 81.328.400,00 MCTE
PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01:	$151.580.600,00 MCTE DEL 13 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE MARZO DEL 2026, EQUIVALENTES AL 74,55% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No 01:	2,60 MESES DEL 13 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE MARZO DEL 2026, EQUIVALENTES AL 65,00%.
PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$44.318.870,00 MCTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 23 DE ABRIL DEL 2026, EQUIVALENTES AL 21,80% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	0,77 MESES DEL 01 DE ABRIL DEL 2026 AL 23 DE ABRIL DEL 2026, EQUIVALENTES AL 19,17%.
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO CON CORTE A 23 DE ABRIL /2026 - ACUMULADO - (PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL):	$195.899.470,00 MCTE DEL 13 DE ENERO DEL 2026 AL 23 DE ABRIL DEL 2026, EQUIVALENTES AL 96,35% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CON CORTE A 23 DE ABRIL/2026 – ACUMULADO - (PRESENTE ACTA PARCIAL No 01):	3,37 MESES DEL 13 DE ENERO DEL 2026 AL 23 DE ABRIL DEL 2026, EQUIVALENTES AL 84,17%.
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE ABRIL DE 2026
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$7.421.530,00 MCTE, EQUIVALENTES AL 3,65% DEL P.O.

Powered by CamScanner

PARTE B: INFORME BASICO:

INFORME DE LA LINEA TECNICA DE INTERVENTORIA:

Dentro de las actividades realizadas por la Interventoría Externa se encuentran:

Enero 2026:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Revisión de la oferta presentada por la firma Servicios y Suministros del Oriente OM SAS.
- Elaboración de estrategia de trabajo para el desarrollo del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025. Reunión con el equipo de trabajo para definir la estrategia a implementar. Se anexa instructivo para visitas.
- Diseño de Instrumentos de documentación para las actividades desarrolladas por la Interventoría. Diseño de los formatos de aplicación para visitas de campo y socialización con el equipo de trabajo. Se compartió vía correo electrónico los formatos tanto con el contratista como con la supervisión.
- Profundización y socialización con el equipo de trabajo en la Resolución No 00335 del 23 de diciembre de 2021, la cual estipula los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional.
- Diseño de mapa de procesos y socialización con el equipo de trabajo. Se anexa documento.
- Solicitud del Plan de Alistamiento y ajuste a las minutas para la Ración Preparada en Sitio (ALMUERZO Y COMPLEMENTOS AM - PM), asumida por parte del contratista del suministro. Los soportes hacen parte del expediente del Contratista para entregar a la supervisión.
- Se impartieron directrices al operador Servicios y Suministros del Oriente OM SAS acerca del manejo y uso de todos los alimentos de interés en salud pública (carnes de res/cerdo/pescados/pollo, huevos, enlatados, leche líquida, leche en polvo, leche y derivados lácteos y demás que consideren pertinentes), informando siempre a esta interventoría con anterioridad y enviando las fichas técnicas junto con la revisión Invima, para ser objeto de estudio y aprobación por parte nuestra.
- Recorrido inicial por las instituciones beneficiarias, planta de producción y centro de acopio (bodega) del contrato. Se compartió vía correo electrónico las novedades encontradas tanto con el contratista como con la supervisión.
- Acompañamiento durante entrega de dotación y capacitaciones del personal manipulador de alimentos. Se anexó registro fotográfico.
- Asistencia y participación de la socialización convocada por parte de la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal. Se anexó soportes.
- Elaboración y envío de Circular Informativa dirigida a todos los colegios beneficiarios del PAE en el Municipio de Arauca y otros como la UAESA, Coordinadores, Manipuladores,

Powered by CamScanner

Entes de Control, con el fin de dar a conocer los canales de comunicación disponibles para contactar a la Interventoría y al contratista del Suministro. Se anexó copia de recibido.

- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregaron en físico como soporte del Acta Parcial No 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregaron como soporte del Acta Parcial No 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Las situaciones no conformes y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista entregado a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Febrero 2026:

- Consulta permanente de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Aprobación final del Plan de Alistamiento y ajuste a las minutas para la Ración Preparada en Sitio (ALMUERZO Y COMPLEMENTOS AM – PM), asumida por parte del Contratista del suministro. Los soportes hacen parte del expediente del Contratista entregado a la supervisión.

- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregaron en físico como soporte del Acta Parcial No 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregaron como soporte del Acta Parcial No 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Las situaciones no conformes y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista entregado a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- La interventoría realizó la actividad "Toma de muestras de laboratorio", la cual se llevó a cabo la última semana del mes de febrero de 2026. Se tomaron cuatro (04) muestras de alimentos (producto terminado) para análisis en el laboratorio ASBIOQUIM SAS de la ciudad de Bogotá. La toma de muestras estuvo a cargo de la profesional en microbiología, Alba Celene Giraldo (se anexó registro fotográfico).

- Visitas a Proveedores. Aplicación de actas de visita y registro fotográfico. Los registros fueron compartidos vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregaron en físico como soporte del Acta Parcial No 01.

Powered by CamScanner

- La interventoría organizó la logística de la actividad "Aplicación del mecanismo de participación Encuestas de Satisfacción", para aplicación a los beneficiarios del PAE de la vigencia 2026 y docentes/coordinadores del programa en las instituciones educativas. La actividad se programó con fecha de inicio el 02 de marzo/2026.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Marzo 2026:

- Consulta permanente de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregaron en físico como soporte del Acta Parcial No 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregaron como soporte del Acta Parcial No 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Las situaciones no conformes y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista entregado a la supervisión.

- Acompañamiento durante capacitación del personal manipulador de alimentos, por parte de la profesional de la UAESA - Dra. Liliana Castro Castrillón. Se anexó registro fotográfico.

- Se recibieron los resultados de las cuatro (04) muestras de alimentos (producto terminado) tomadas en la última semana del mes de febrero de 2026, por parte del laboratorio ASBIOQUIM SAS de la ciudad de Bogotá, en los cuales se obtuvo la ACEPTACIÓN DE LOS CUATRO (04) RESULTADOS. Los resultados que se relacionan a continuación fueron compartidos vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se anexaron al informe Acta Parcial No 01:

Tabla 2. *Muestras tomadas por la interventoría.*

MUESTRAS TOMADAS POR LA INTERVENTORÍA						
No	CÓDIGO DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ANÁLISIS	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA RESULTADOS
1	37452	ARROZ BLANCO	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	24/2/2026	6/3/2026
2	37453	POLLO GUISADO	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	24/2/2026	5/3/2026
3	37454	MONEDITAS DE PLATANO VERDE	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	24/2/2026	5/3/2026
4	37455	ENSALADA COMÚN	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	24/2/2026	5/3/2026

- La interventoría realizó la actividad "aplicación del mecanismo de participación ciudadana ENCUESTA DE SATISFACCIÓN" diseñado para los titulares de derecho y docentes. El informe con los resultados arrojados fue compartido al contratista del suministro y a la supervisión. Tanto el informe como los formatos de encuesta originales se entregaron como soporte del Acta Parcial No 01.

Powered by CamScanner

- Envío de correspondencia física y magnética.
- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Abril 2026:

- Consulta permanente de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregan en físico como soporte del Acta de Recibo Final.
- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregan como soporte del Acta de Recibo Final.
- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Las situaciones no conformes y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.
- Envío de correspondencia física y magnética.
- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

La interventoría habilitada por Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 allegó todo el producto entregado en físico por los interventores de campo en el período comprendido entre el 13 de enero/26 al 30 de marzo/26 a la Supervisión, mediante Acta Parcial No 01. El producto de las visitas a partir del 01 de abril/26 al 23 de abril/26, hace parte del presente Informe Final. La interventoría revisó y elaboró los informes para trámite de Actas Parciales y Acta de Recibo Final, así como también Acta de Liquidación para el operador del Contrato de Suministro No 000-769 de 2025. Todos los documentos generados para el Contrato de Suministro No 000-769 de 2025 hacen parte de los expedientes que reposan en el archivo de la Oficina Jurídica.

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por la interventoría durante toda la ejecución del contrato, durante el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2026 al 23 de abril de 2026:

VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS, PLANTA/BODEGA, PROVEEDORES, PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ENERO/2026 AL 23 DE ABRIL/2026 (DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO):

Tabla 3. *Visitas realizadas por la interventoría en el periodo del 13 de enero/2026 al 23 de abril/2026.*

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA
	UDS / PLANTA / BODEGA			ENERO
0	RECORRIDO GENERAL (ALISTAMIENTO)	TODOS	TODOS	13-16/01/2026
1	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	18/01/2026
2	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	19/01/2026

Powered by CamScanner

3	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	19/01/2026
4	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	19/01/2026
5	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	19/01/2026
6	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	19/01/2026
7	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	19/01/2026
8	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	19/01/2026
9	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	19/01/2026
10	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	19/01/2026
11	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	19/01/2026
12	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	19/01/2026
13	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	19/01/2026
14	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	19/01/2026
15	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	19/01/2026
16	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	19/01/2026
17	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	19/01/2026
18	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	19/01/2026
19	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	19/01/2026
20	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	19/01/2026
21	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	19/01/2026
22	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	19/01/2026
23	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	20/01/2026
24	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	20/01/2026
25	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	20/01/2026
26	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/01/2026
27	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	20/01/2026
28	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	20/01/2026
29	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	21/01/2026
30	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	21/01/2026
31	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	21/01/2026
32	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	21/01/2026
33	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	21/01/2026
34	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	21/01/2026
35	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	22/01/2026
36	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	22/01/2026
37	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	22/01/2026
38	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	22/01/2026
39	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	22/01/2026
40	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	22/01/2026
41	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	22/01/2026
42	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	23/01/2026
43	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	23/01/2026
44	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	23/01/2026
45	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	23/01/2026
46	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	23/01/2026
47	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	23/01/2026
48	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	26/01/2026

Powered by CamScanner

49	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	26/01/2026
50	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	26/01/2026
51	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	26/01/2026
52	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	26/01/2026
53	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/01/2026
54	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	26/01/2026
55	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	27/01/2026
56	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	27/01/2026
57	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	27/01/2026
58	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	27/01/2026
59	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	27/01/2026
60	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	27/01/2026
61	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	27/01/2026
62	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	28/01/2026
63	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	28/01/2026
64	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	28/01/2026
65	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	28/01/2026
66	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	28/01/2026
67	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	28/01/2026
68	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	28/01/2026
69	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	29/01/2026
70	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	29/01/2026
71	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	29/01/2026
72	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	29/01/2026
73	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	29/01/2026
74	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	29/01/2026
75	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	30/01/2026
76	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	30/01/2026
77	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	30/01/2026
78	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	30/01/2026
79	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	30/01/2026
80	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	30/01/2026

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA FEBRERO
1	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	1/2/2026
2	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	2/2/2026
3	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	2/2/2026
4	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	2/2/2026
5	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	2/2/2026
6	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	2/2/2026
7	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	2/2/2026
8	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	3/2/2026
9	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	3/2/2026
10	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	3/2/2026
11	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	3/2/2026

Powered by CamScanner

12	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	3/2/2026
13	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	3/2/2026
14	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	3/2/2026
15	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	4/2/2026
16	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	4/2/2026
17	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	4/2/2026
18	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	4/2/2026
19	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRA	ALMUERZO	4/2/2026
20	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	4/2/2026
21	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	5/2/2026
22	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	5/2/2026
23	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	5/2/2026
24	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	5/2/2026
25	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	5/2/2026
26	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	5/2/2026
27	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	6/2/2026
28	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	6/2/2026
29	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	6/2/2026
30	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	6/2/2026
31	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	6/2/2026
32	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	6/2/2026
33	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	9/2/2026
34	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	9/2/2026
35	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	9/2/2026
36	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	9/2/2026
37	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	9/2/2026
38	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	9/2/2026
39	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	10/2/2026
40	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	10/2/2026
41	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	10/2/2026
42	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	10/2/2026
43	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	10/2/2026
44	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	10/2/2026
45	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	11/2/2026
46	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	11/2/2026
47	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	11/2/2026
48	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	11/2/2026
49	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	11/2/2026
50	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	11/2/2026
51	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	12/2/2026
52	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	12/2/2026
53	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	12/2/2026
54	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	12/2/2026
55	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	12/2/2026
56	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	12/2/2026
57	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	12/2/2026
58	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	13/2/2026
59	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	13/2/2026

Powered by CamScanner

60	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	13/2/2026
61	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	13/2/2026
62	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	13/2/2026
63	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	13/2/2026
64	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	16/2/2026
65	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	16/2/2026
66	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	16/2/2026
67	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	16/2/2026
68	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	16/2/2026
69	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	16/2/2026
70	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	16/2/2026
71	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	17/2/2026
72	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	17/2/2026
73	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	17/2/2026
74	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	17/2/2026
75	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	17/2/2026
76	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	17/2/2026
77	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	17/2/2026
78	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	18/2/2026
79	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	18/2/2026
80	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	18/2/2026
81	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	18/2/2026
82	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	18/2/2026
83	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	18/2/2026
84	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	19/2/2026
85	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	19/2/2026
86	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	19/2/2026
87	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	19/2/2026
88	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	19/2/2026
89	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	19/2/2026
90	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	20/2/2026
91	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	20/2/2026
92	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	20/2/2026
93	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	20/2/2026
94	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	20/2/2026
95	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/2/2026
96	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	20/2/2026
97	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	23/2/2026
98	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	23/2/2026
99	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	23/2/2026
100	CARNICERIA CRAVO SUR 2	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
101	DISTRIBUIDORA INSUPAN JD SAS	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
102	AGUAS Y REFRESCOS LA FUENTE	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
103	LACTEOS KROLAYNS ZOMAC SAS	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
104	MEGAFRUVER LA DESPENSA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
105	CHARCUTERIA VERFRUCOL ARAUCANA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
106	COMERCIALIZADORA BYC DEL	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026

Powered by CamScanner

	NORTE (IDEAL PUNTO MAYORISTA)			
107	DISTRIBUIDORA BARRANQUILLITA SAS ZESE	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/2/2026
108	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	24/2/2026
109	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	24/2/2026
110	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	24/2/2026
111	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	24/2/2026
112	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	24/2/2026
113	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	24/2/2026
114	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	25/2/2026
115	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	25/2/2026
116	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	25/2/2026
117	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	25/2/2026
118	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	25/2/2026
119	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	25/2/2026
120	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	26/2/2026
121	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	26/2/2026
122	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	26/2/2026
123	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	26/2/2026
124	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	26/2/2026
125	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	26/2/2026
126	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	27/2/2026
127	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	27/2/2026
128	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	27/2/2026
129	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	27/2/2026
130	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	27/2/2026
131	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	27/2/2026
132	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	27/2/2026
No.	**RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN**	**SEDE**	**MODALIDAD DE ENTREGA**	**FECHA VISITA**
	UDS / PLANTA / BODEGA			**MARZO**
1	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	2/3/2026
2	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	2/3/2026
3	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	2/3/2026
4	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	2/3/2026
5	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	2/3/2026
6	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	2/3/2026
7	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	3/3/2026
8	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	3/3/2026
9	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	3/3/2026
10	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	3/3/2026
11	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	3/3/2026
12	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	3/3/2026
13	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	4/3/2026
14	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	4/3/2026
15	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	4/3/2026
16	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	4/3/2026
17	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	4/3/2026

Powered by CamScanner

18	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	4/3/2026
19	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	5/3/2026
20	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	5/3/2026
21	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	5/3/2026
22	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	5/3/2026
23	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	5/3/2026
24	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	5/3/2026
25	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	6/3/2026
26	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	6/3/2026
27	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	6/3/2026
28	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	6/3/2026
29	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	6/3/2026
30	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	6/3/2026
31	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	9/3/2026
32	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	9/3/2026
33	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	9/3/2026
34	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	9/3/2026
35	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	9/3/2026
36	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/3/2026
37	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	9/3/2026
38	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	11/3/2026
39	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	11/3/2026
40	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	11/3/2026
41	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	11/3/2026
42	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	11/3/2026
43	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	11/3/2026
44	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	12/3/2026
45	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	12/3/2026
46	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	12/3/2026
47	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	12/3/2026
48	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	12/3/2026
49	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	12/3/2026
50	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	13/3/2026
51	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	13/3/2026
52	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	13/3/2026
53	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	13/3/2026
54	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	13/3/2026
55	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	13/3/2026
56	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	16/3/2026
57	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	16/3/2026
58	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	16/3/2026
59	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	16/3/2026
60	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	16/3/2026
61	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	16/3/2026
62	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	17/3/2026
63	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	17/3/2026
64	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	17/3/2026
65	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	17/3/2026

Powered by CamScanner

66	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	17/3/2026
67	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	17/3/2026
68	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	18/3/2026
69	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	18/3/2026
70	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	18/3/2026
71	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	18/3/2026
72	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	18/3/2026
73	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	18/3/2026
74	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	19/3/2026
75	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	19/3/2026
76	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	19/3/2026
77	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	19/3/2026
78	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	19/3/2026
79	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	20/3/2026
80	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	20/3/2026
81	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	20/3/2026
82	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	20/3/2026
83	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	20/3/2026
84	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	24/3/2026
85	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	24/3/2026
86	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	24/3/2026
87	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	24/3/2026
88	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	24/3/2026
89	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	24/3/2026
90	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	25/3/2026
91	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	25/3/2026
92	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	25/3/2026
93	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	25/3/2026
94	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	25/3/2026
95	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	25/3/2026
96	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	26/3/2026
97	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	26/3/2026
98	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	26/3/2026
99	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	26/3/2026
100	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/3/2026
101	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	26/3/2026
102	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	26/3/2026
103	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	27/3/2026
104	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	27/3/2026
105	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	27/3/2026
106	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	27/3/2026
107	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	27/3/2026
108	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	27/3/2026

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA
	UDS / PLANTA / BODEGA			ABRIL
1	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	6/4/2026

Powered by CamScanner

2	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	6/4/2026
3	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	6/4/2026
4	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	6/4/2026
5	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	6/4/2026
6	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	6/4/2026
7	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	6/4/2026
8	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	7/4/2026
9	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	7/4/2026
10	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	7/4/2026
11	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	7/4/2026
12	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	7/4/2026
13	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	7/4/2026
14	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJT	7/4/2026
15	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	8/4/2026
16	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	8/4/2026
17	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	8/4/2026
18	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	8/4/2026
19	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	8/4/2026
20	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	8/4/2026
21	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	8/4/2026
22	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	13/4/2026
23	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	13/4/2026
24	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	13/4/2026
25	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	13/4/2026
26	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	13/4/2026
27	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	13/4/2026
28	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	14/4/2026
29	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	14/4/2026
30	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	14/4/2026
31	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	14/4/2026
32	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	14/4/2026
33	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	14/4/2026
34	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	14/4/2026
35	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	16/4/2026
36	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	16/4/2026
37	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	16/4/2026
38	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	16/4/2026
39	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	16/4/2026
40	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	PANADERIA	16/4/2026
41	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	17/4/2026
42	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	17/4/2026
43	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	17/4/2026
44	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	17/4/2026
45	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	CAJM	17/4/2026

Powered by CamScanner

46	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	17/4/2026
47	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	17/4/2026
48	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	20/4/2026
49	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	CAJM	20/4/2026
50	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	20/4/2026
51	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	20/4/2026
52	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	20/4/2026
53	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	20/4/2026
54	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	20/4/2026
55	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	21/4/2026
56	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	21/4/2026
57	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	21/4/2026
58	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	21/4/2026
59	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	21/4/2026
60	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	21/4/2026
61	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	22/4/2026
62	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	22/4/2026
63	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	CAJM	22/4/2026
64	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	22/4/2026
65	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	22/4/2026
66	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	22/4/2026
67	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	23/4/2026
68	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	23/4/2026
69	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	23/4/2026
70	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	23/4/2026
71	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	23/4/2026
72	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	23/4/2026

CONSOLIDADO VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS, PLANTA/BODEGA, PROVEEDORES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ENERO/2026 AL 23 DE ABRIL/2026:

Tabla 4. *Consolidado visitas.*

ENERO	
80 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACION MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA	
UNIDADES DE SERVICIO	73
BODEGA-PLANTA	7
PROVEEDORES	0

FEBRERO	
132 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACION MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA	
UNIDADES DE SERVICIO	110
BODEGA-PLANTA	14
PROVEEDORES	8

Powered by CamScanner

MARZO	
108 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACION MEN AUDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNIDADES DE SERVICIO	96
BODEGA-PLANTA	12
PROVEEDORES	0

ABRIL	
72 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACION MEN AUDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNIDADES DE SERVICIO	64
BODEGA-PLANTA	8
PROVEEDORES	0

TOTAL VISITAS DEL 13 DE ENERO/2026 AL 23 DE ABRIL/2026	
392 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACION MEN AUDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNIDADES DE SERVICIO	343
BODEGA-PLANTA	41
PROVEEDORES	8

SE ACLARA QUE LA METODOLOGÍA TENIDA EN CUENTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EXTERNA PARA HACER LAS VISITAS DE CAMPO, SE BASO EN VISITAS NO CONCERTADAS, CON UNA DURACIÓN DE MÍNIMO UNA (01) HORA POR VISITA Y BAJO LA APLICACIÓN DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (RESOLUCIÓN No. 00335 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021).

DURANTE LOS DIAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ENERO/26 AL 23 DE ABRIL/26, SE TRABAJÓ CON LISTAS DE CHEQUEO, FORMATO DE GRAMAJES, PRUEBAS ORGANOLEPTICAS, FORMATOS DE VERIFICACIÓN ESTÁNDAR Y REGISTROS FOTOGRAFICOS EN CADA UNA DE LAS VISITAS REALIZADAS A INSTITUCIONES BENEFICIARIAS COMO PUNTOS DE CCT (COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA), COCINAS RPS (RACIÓN PREPARADA EN SITIO), PLANTA DE PRODUCCIÓN M70 Y BODEGA.

ANALISIS Y METODOLOGIA DE LAS VISITAS REALIZADAS:

La siguiente tabla evidencia el comportamiento que tuvieron aquellas sedes educativas que cuentan con Cocinas para preparación en sitio, Planta y Bodega, durante la aplicación de los instrumentos de verificación y recolección de información. En el cuadro adjunto se puede evidenciar que las visitas realizadas a los puntos de preparación arrojaron puntajes en sus actas muy favorables. Se resalta la buena disposición por parte del operador en la resolución de las situaciones no conformes que están a su alcance.

Tabla 5. *Resultados obtenidos en las visitas realizadas por la interventoría a puntos de preparación (Cocinas), Planta de Producción y Bodega, mediante aplicación de Formatos del MEN en el periodo del 13 de enero de 2026 al 23 de abril de 2026.*

INSTITUCION EDUCATIVA	No	SEDES	TIPO COMPLEMENTO	No DE VISITAS	RESULTADOS PROMEDIO FTO GRAMAJES	RESULTADOS PROMEDIO FTO VERIFICACIÓN
					% OBTENIDO	% OBTENIDO
I.E. FCO JOSÉ DE CALDAS	1	PRINCIPAL	CAJM	3	100,00%	97,54%

Powered by CamScanner

	2	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	2	100,00%	95,71%
	3	COSTA HERMOSA	CAJM	3	100,00%	96,66%
I.E. GENERAL SANTANDER	4	MIRAMAR	ALMUERZO	3	100,00%	95,83%
	5	SANTANDER PRIMARIA	CAJM/CAJT	3	100,00%	98,06%
	6	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM/CAJT	3	100,00%	93,68%
I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	7	LA COROCORA	CAJM	3	100,00%	98,09%
I.E. SANTA TERESITA	8	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	3	100,00%	92,97%
	9	DIVINO NIÑO	CAJM	3	100,00%	97,62%
	10	SANTA TERESITA	CAJM/CAJT	3	100,00%	97,10%
I.E. SIMÓN BOLÍVAR	11	PRINCIPAL	CAJM	3	100,00%	97,65%
	12	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	3	100,00%	97,47%
BODEGA	13	BODEGA	NO APLICA	3	No aplica	94,74%
PLANTA	14	PLANTA	CAJM/CAJT	3	No aplica	91,28%

Durante los recorridos a las sedes relacionadas en la tabla, se aplicó formato de evaluación estándar con el fin de evaluar diferentes variables como lo son: instalaciones físicas y sanitarias, almacenamiento de materias primas e insumos y producto terminado, condiciones de preparación, cumplimiento de menús-gramajes, personal manipulador de alimentos, condiciones de saneamiento, condiciones de transporte, equipos y utensilios, sistema de gestión de seguridad en el trabajo y sistema de gestión social.

Las situaciones no conformes correspondientes a infraestructura, dotación en cocinas y dotación de comedores, fueron trasladados a la supervisión de la Alcaldía del Municipio de Arauca con el fin de que sean tratados y solucionados con el ente competente.

PROMEDIO GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS Y BODEGA/PLANTA MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMATOS DEL MEN EN EL PERIODO DEL 13 DE ENERO/2026 AL 23 ABRIL MARZO/2026.

Tabla 6. *Promedio general de los resultados obtenidos.*

PORCENTAJE OBTENIDO EN PROMEDIO PARA PUNTOS DE PREPARACIÓN (COCINAS), PLANTA Y BODEGA, DESPUES DE APLICAR EL FTO ESTANDAR DE VERIFICACIÓN Y FTO DE GRAMAJES	FTO GRAMAJE	FTO VERIFICACIÓN ESTANDAR
	100,00%	96,03%

Así mismo, para la evaluación de las visitas de campo a puntos de preparación (cocinas) planta y bodega (aplicación de formato estándar de verificación y formato de gramajes), se tuvo en cuenta los lineamientos impartidos en la Resolución No. 00335 del 23 de diciembre de 2021 (minuta patrón) y se procedió a evaluar el servicio con una ponderación de 0% al 100%, interpretando los resultados de campo de acuerdo al semáforo: INSUFICIENTE (ROJO), ACEPTABLE (AMARILLO) Y BUENO (VERDE).

Powered by CamScanner

SEMAFORO	
0 - 50	INSUFICIENTE
51 - 75	ACEPTABLE
76 - 100	BUENO

Como se puede evidenciar en el cuadro **Promedio general de los resultados obtenidos,** la prestación del servicio del PAE en el municipio de Arauca estuvo en VERDE (BUENO), por tanto, se concluye que el operador Servicios y Suministros del Oriente OM SAS titular del Contrato de Suministro No 000-769 de 2025, cumplió de manera satisfactoria con los requerimientos impartidos para el PAE según la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) UApa. Los resultados por cada cocina, planta o bodega evaluados en el periodo de la presente Acta de Recibo Final, se pueden apreciar en los Soportes Técnicos de ejecución del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.

Nota: *Es importante aclarar que las cocinas de algunas de las Instituciones Educativas donde se desarrolla el programa, presentaban deterioro de equipos, menaje e infraestructura, por lo cual, en algunos casos, esto se reflejó en los puntajes de las visitas realizadas por esta interventoría. Así mismo, es importante resaltar, que el operador Servicios y Suministros del Oriente OM SAS ha realizado mantenimientos y reparaciones locativas de menor cuantía.*

Igualmente, se requiere la intervención de infraestructuras (paredes, techos, pisos), dotación de equipos (neveras, congeladores), dotación de menaje (platos, pocillos, cubiertos), dotación de sillas y mesas en comedores, lo cual ayudará a contribuir a la mejora en la prestación del servicio. Esto a cargo de las entidades competentes, resaltando que la Interventoría ha hecho las notificaciones sobre las debilidades encontradas en este segmento.

INFORME DE LA LINEA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta que el programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca requiere un control permanente que garantice el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto, y dada la naturaleza de dicho contrato, la administración municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, plantea la necesidad de contratar las labores de una interventoría técnica para la supervisión de las actividades del PAE.

CONDICIONES INICIALES - PLAZO DE EJECUCIÓN:

Tabla 7. *Condiciones iniciales de plazo del Contrato de Consultoria No 000-770de 2025.*

VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN
2026	4,00 MESES

- ✓ El plazo total para la ejecución del contrato será de 4,00 meses contados a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de las garantías únicas - pólizas.

Powered by CamScanner

CONDICIONES INICIALES – CUADRO DE COSTOS:

Tabla 8. *Condiciones iniciales cuadro de costos del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.*

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2026	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética con especialización en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	MES	3,50	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 10.288.235,29
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, Ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	MES	3,50	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 10.288.235,29
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	MES	3,50	100%	$ 2.351.260,50	$ 78.375,35	$ 32.917.647,06
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaría)	1,00	MES	3,50	100%	$ 1.525.210,08	$ 50.840,34	$ 5.338.235,29
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 58.832.352,94
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$ 117.664.705,88
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO				COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES	4,00				$ 1.932.773,11	$ 7.731.092,44
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	MES	4,00				$ 1.029.411,76	$ 4.117.647,06
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	UNIDAD	4,00				$ 756.302,52	$ 3.025.210,08
Alquiler de dos (2) vehículos para transporte de personal	DIAS	57,00				$ 672.268,91	$ 38.319.327,73
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 53.193.277,31
						SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	$ 170.857.983,19
						TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	$ 170.857.983,19
						IVA 19%	$ 32.463.016,81
						TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	$ 203.321.000,00

- ✓ El presupuesto total será de doscientos tres millones trescientos veintiún mil pesos MCTE.

EJECUCIÓN DEL PERÍODO (TIEMPO – PRESUPUESTO):

Tiempo y porcentaje de ejecución del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 (Acta Parcial No 01): 2,60 meses, comprendidos entre el 13 de enero de 2026 al 30 de marzo de 2026, equivalentes al 65,00%.

Tiempo y porcentaje de ejecución del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 (Presente Acta de Recibo Final): 0,77 meses, comprendidos entre el 01 de abril de 2026 al 23 de abril de 2026, equivalentes al 19,17%

Tiempo y porcentaje de ejecución acumulado del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 (del 13 de enero de 2026 al 23 de abril de 2026): 3,37 meses, equivalentes al 84,17%.

A continuación, se detalla el tiempo y el porcentaje de avance del contrato mensual, así mismo se aprecia el total en tiempo acumulado a la fecha y su porcentaje.

Powered by CamScanner

Tabla 9. *Ejecución en tiempo y porcentaje.*

MES EJECUCION	TIEMPO EN MESES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
ENERO/2026	0,60	15,00%	65,00% ACTA PARCIAL No 01
FEBRERO/2026	1,00	25,00%	
MARZO/2026	1,00	25,00%	
ABRIL/2026	0,77	19,17%	19,17% ACTA DE RECIBO FINAL
TOTAL TIEMPO EJECUTADO	**3,37**	**84,17%**	
TOTAL TIEMPO NO EJECUTADO	**0,63**	**15,83%**	

Nota: Se aclara que la fecha de terminación del contrato inicialmente estaba prevista para el 12 de mayo de 2026, sin embargo, teniendo en cuenta que las actividades pactadas mediante el Contrato de Suministro No 000-769 de 2025 finalizaron el día jueves 23 de abril de 2026, se dan por terminadas las actividades del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 en la misma fecha. Por lo tanto, con corte a 23 de abril de 2026 (fecha de terminación del contrato), se ejecutó el 84,17% del plazo total pactado, equivalente a 3,37 meses.

Presupuesto ejecutado del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 (Acta Parcial No 01): $151.580.600,00 MCTE, comprendido entre el 13 de enero de 2026 al 30 de marzo de 2026, equivalentes al 74,55% en términos presupuestales.

Tabla 10. *Presupuesto ejecutado Acta Parcial No 01.*

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2026	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética con especialización en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	MES	2,60	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 7.642.689,08
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	MES	2,60	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 7.642.689,08
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	MES	2,60	100%	$ 2.351.260,50	$ 78.375,35	$ 24.453.109,24
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	MES	2,60	100%	$ 1.525.210,08	$ 50.840,34	$ 3.965.546,22
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 43.704.033,61
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$ 87.408.067,23

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS				
Arriendo de oficina	MES	2,60	$ 1.932.773,11	$ 5.025.210,08
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	MES	2,60	$ 1.029.411,76	$ 2.676.470,59

Powered by CamScanner

Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	UNIDAD	0,00	$ 756.302,52	$ 0,00
Alquiler de dos (2) vehículos para transporte de personal	DIAS	48,00	$ 672.268,91	$ 32.268.907,56
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 39.970.588,24
			SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	$ 127.378.655,46
			TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	$ 127.378.655,46
			IVA 19%	$ 24.201.944,54
			TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	$ 151.580.600,00

Presupuesto ejecutado del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 (Presente Acta de Recibo Final): $44.318.870,00 MCTE, comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 23 de abril de 2026, equivalentes al 21,80% en términos presupuestales.

Tabla 11. *Presupuesto ejecutado presente Acta de Recibo Final.*

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2026	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética con especialización en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	MES	0,77	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 2.263.411,76
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	MES	0,77	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 2.263.411,76
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	MES	0,77	100%	$ 2.351.260,50	$ 78.375,35	$ 7.241.882,35
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	MES	0,77	100%	$ 1.525.210,08	$ 50.840,34	$ 1.174.411,76
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 12.943.117,65
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$ 25.886.235,29

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS				
Arriendo de oficina	MES	0,77	$ 1.932.773,11	$ 1.488.235,29
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	MES	0,77	$ 1.029.411,76	$ 792.647,06
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	UNIDAD	4,00	$ 756.302,52	$ 3.025.210,08
Alquiler de dos (2) vehículos para transporte de personal	DIAS	9,00	$ 672.268,91	$ 6.050.420,17
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 11.356.512,61
			SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	$ 37.242.747,90
			TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	$ 37.242.747,90
			IVA 19%	$ 7.076.122,10
			TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	$ 44.318.870,00

Powered by CamScanner

Presupuesto ejecutado acumulado del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025: $195.899.470,00 MCTE, comprendido entre el 13 de enero de 2026 al 23 de abril de 2026, equivalentes al 96,35% en términos presupuestales.

Tabla 12. *Presupuesto ejecutado acumulado del 13 de enero/2026 al 23 de abril/2026.*

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2026	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética con especialización en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	MES	3,37	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 9.906.100,84
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	MES	3,37	100%	$ 2.939.495,80	$ 97.983,19	$ 9.906.100,84
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	MES	3,37	100%	$ 2.351.260,50	$ 78.375,35	$ 31.694.991,60
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	MES	3,37	100%	$ 1.525.210,08	$ 50.840,34	$ 5.139.957,98
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 56.647.151,26
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$ 113.294.302,52

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS				
Arriendo de oficina	MES	3,37	$ 1.932.773,11	$ 6.513.445,38
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	MES	3,37	$ 1.029.411,76	$ 3.469.117,65
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	UNIDAD	4,00	$ 756.302,52	$ 3.025.210,08
Alquiler de dos (2) vehículos para transporte de personal	DIAS	57,00	$ 672.268,91	$ 38.319.327,73
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 51.327.100,84
			SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	$ 164.621.403,36
			TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	$ 164.621.403,36
			IVA 19%	$ 31.278.066,64
			TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	$ 195.899.470,00

Presupuesto NO ejecutado acumulado del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025: $7.421.530,00 MCTE, equivalentes al 3,65% en términos presupuestales. El valor del presupuesto no ejecutado se cargará como saldo a favor del Municipio de Arauca y se verá reflejado en el Acta de Liquidación.

Presupuesto facturado y cobrado a la fecha:

- $ 151.580.600,00 PESOS MCTE (Acta Parcial No 01).
- $ 44.318.870,00 PESOS MCTE (Presente Acta de Recibo Final).

Powered by CamScanner

Balance Financiero:

Tabla 13. *Balance financiero del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.*

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-770 DE 2025			
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 203.321.000,00		100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01 - PERIODO DEL 13 DE ENERO/2026 AL 30 DE MARZO/2026		$ 151.580.600,00	74,55%
VALOR EJECUTADO ENTRE EL 01 AL 23 DE ABRIL/2026		$ 44.318.870,00	21,80%
VALOR NO EJECUTADO (SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO)		$ 7.421.530,00	3,65%
SUMAS IGUALES	$ 203.321.000,00	$ 203.321.000,00	100,00%

Nota: Se aclara que la fecha de terminación del contrato inicialmente estaba prevista para el 12 de mayo de 2026, sin embargo, teniendo en cuenta que las actividades pactadas mediante el Contrato de Suministro No 000-769 de 2025 finalizaron el día jueves 23 de abril de 2026, se dan por terminadas las actividades del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025 en la misma fecha. El valor no ejecutado debido a la terminación anticipada de las actividades de la interventoría, se cargará como saldo a favor del Municipio de Arauca y se verá reflejado en el Acta de Liquidación del Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.


Presupuesto Ejecutado Acta Parcial No 01:

Tabla 14. *Presupuesto ejecutado según Acta Parcial No 01 (Del 13 de enero/2026 al 30 de marzo/2026).*

PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01 (PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 30 DE MARZO/2026)				
CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-770 DE 2025				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 01	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	% POR EJECUTAR
$ 203.321.000,00	$ 151.580.600,00	$ 51.740.400,00	74,55%	25,45%

Powered by CamScanner

Gráfica No 01 Presupuesto Ejecutado Acta Parcial No 01:

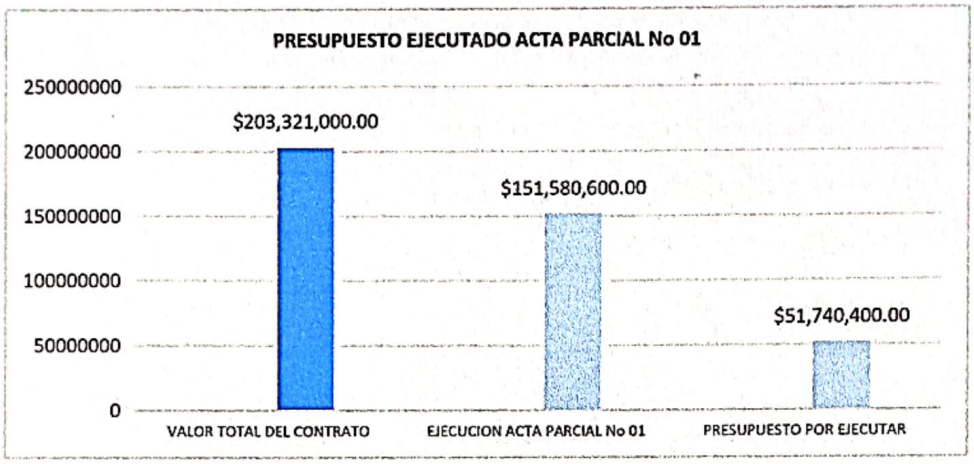


Presupuesto Ejecutado Presente Acta de Recibo Final:

Tabla 14. *Presupuesto ejecutado según Acta de Recibo Final (Del 01 de abril/2026 al 23 de abril/2026).*

PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (PERIODO DEL 01 DE ABRIL/2026 AL 23 DE ABRIL/2026)		
CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-770 DE 2025		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	% DE EJECUCION
$ 203.321.000,00	$ 44.318.870,00	21,80%

Gráfica No 02 Presupuesto Ejecutado Presente Acta de Recibo Final:

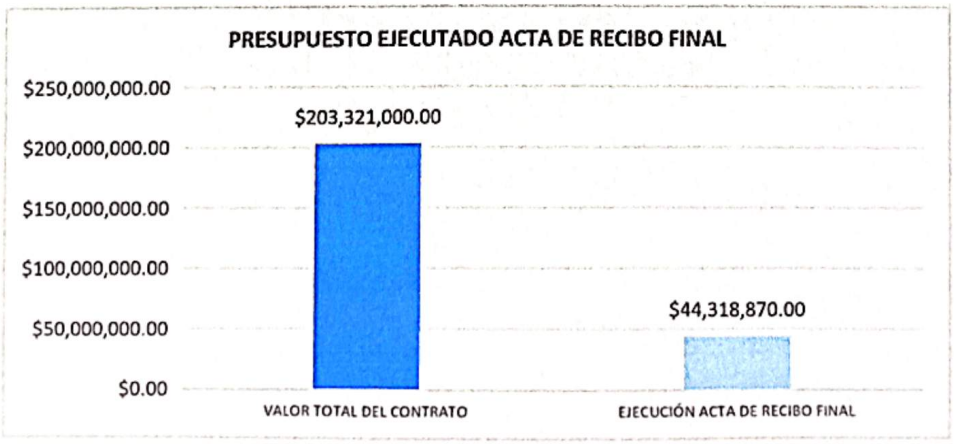


Powered by CamScanner

Presupuesto Total Ejecutado Acumulado:

Tabla 15. *Presupuesto total ejecutado acumulado (Del 13 de enero/2026 al 23 de abril/2026).*

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO (PERIODO DEL 13 DE ENERO/2026 AL 23 DE ABRIL/2026)						
CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-770 DE 2025						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO ACTA PARCIAL No 01	PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	VR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	VR NO EJECUTADO	% DE EJECUCION	% NO EJECUTADO
$ 203.321.000,00	$ 151.580.600,00	$ 44.318.870,00	$ 195.899.470,00	$ 7.421.530,00	96,35%	3,65%

Gráfica No 03 Presupuesto Total Ejecutado Acumulado:

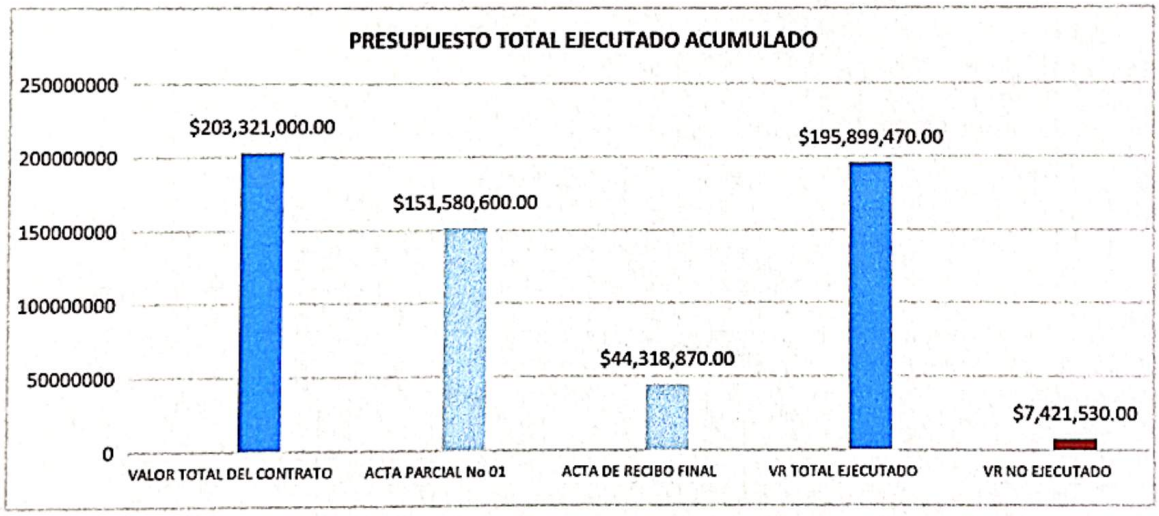

Anticipo: Ascendió a la suma de $81.328.400,00 MCTE (40% del P.O).

Para el manejo de los recursos de anticipo se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No 303-000-037-07 en Bancolombia a nombre de la Fundación Innovación Continua – FIC. La cuenta se manejó de forma conjunta con la supervisión del contrato. La interventoría realizó el trámite para solicitud del anticipo durante el mes de enero. Con fecha 17 de febrero de 2026 fueron desembolsados los recursos del anticipo solicitado.

A la fecha, esta interventoría soportó el 100% de la totalidad del anticipo entregado. Mediante Acta Parcial No 01 se soportó el 71,50% del anticipo entregado, los soportes del saldo restante hacen parte del expediente de la presente Acta de Recibo Final. Los recursos del anticipo fueron invertidos en pago de servicios profesionales, pago de seguridad social y pago de arriendos de oficina de interventoría. El anticipo se manejó de acuerdo a lo planeado en el Plan de Inversión del mismo.

Con fecha 22 de abril de 2026 se solicitó el cierre de la cuenta para manejo de anticipo. Los rendimientos generados por valor de dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos MCTE ($2.284,80 PESOS MCTE), fueron reembolsados a la Administración Municipal como consta en los soportes adjuntos al presente informe.

Powered by CamScanner

Amortización del Anticipo:

Tabla 16. *Amortización del anticipo Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.*

AMORTIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-770 DE 2025		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 81.328.400,00	
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No 01		$ 60.632.240,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL		$ 20.696.160,00
SUMAS IGUALES	$ 81.328.400,00	$ 81.328.400,00

Teniendo en cuenta la amortización del anticipo tenemos que:

- Se hizo entrega del ANTICIPO (40% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO), equivalente a $ 81.328.400,00 pesos MCTE.
- El Acta Parcial No 01 correspondiente al periodo comprendido entre 13 de enero de 2026 al 30 de marzo de 2026, ascendió a la suma de $ 151.580.600,00 pesos MCTE.
- Se amortizó la suma de $ 60.632.240,00 pesos MCTE del valor del ACTA PARCIAL No 01 (Amortización que corresponde al 40% del valor del Acta Parcial No 01).
- El valor neto pagado por el Acta Parcial No 01 luego de amortización del anticipo fue: $ 90.948.360,00 pesos MCTE.
- La presente Acta de Recibo Final correspondiente al periodo comprendido entre 01 de abril de 2026 al 23 de abril de 2026, ascendió a la suma de $ 44.318.870,00 pesos MCTE.
- Se amortizó la suma de $ 20.696.160,00 pesos MCTE del valor del ACTA DE RECIBO FINAL (Amortización que corresponde al saldo del anticipo pendiente por amortizar).
- El valor neto a pagar por el Acta de Recibo Final luego de amortización del anticipo es: $ 23.622.710,00 pesos MCTE.
- Saldo por amortizar del anticipo: $ 0,00 pesos MCTE.

INFORME DE LA LINEA JURIDICA:

PÓLIZA INICIAL No CMZ-100017304 EXPEDIDAS POR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.:

Tabla 17. *Póliza de legalización.*

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 24-12-2025 hasta 24-10-2026

Powered by CamScanner

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde 24-12-2025 hasta 24-10-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 24-12-2025 hasta 24-04-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 24-12-2025 hasta 24-04-2027

PÓLIZA AMPLIADA POR ACTA DE INICIO No CMZ-100017304 EXPEDIDAS POR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.:

Tabla 18. *Póliza ampliada por Acta de Inicio.*

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 26-12-2025 hasta 26-10-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde 26-12-2025 hasta 26-10-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 26-12-2025 hasta 26-04-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 26-12-2025 hasta 26-04-2027

Personal vinculado al contrato:

Tabla 19. *Personal vinculado al Contrato de Consultoría No 000-770 de 2025.*

CARGO	CANTIDAD	PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Directora de Interventoría	1	Nutricionista Dietista, Especialista en Gestión de Proyectos, Especialista en Seguridad Alimentaria, Máster en Dirección de Operaciones y Calidad	Claudia Isabel Lizcano Rubio
Coordinadora de Procesos de Interventoría	1	Ingeniera de Alimentos, Especialista en Seguridad Alimentaria	Janneth Trujillo Alvernia
Profesionales en Campo	4	Ingeniera de Alimentos	Karen Rojas Sanabria
		Microbióloga con énfasis en Alimentos	Alba Celene Giraldo Giraldo
		Nutricionista Dietista	Kelly Johana Sierra Caruso
		Nutricionista Dietista	Ana Judith Lizcano Mora
Auxiliar Administrativo	1	Administradora de Empresas	Gisselle Reyes Lizcano
Profesional de Apoyo	1	Tecnólogo Agropecuario	Solanlly Guzmán Eregua

Para efectos del trámite del Acta de Recibo Final, hacen parte del presente informe los comprobantes de pago del período facturado, así como también las planillas de pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales para los periodos marzo-abril y abril-mayo.

Powered by CamScanner

Otros documentos que se adjuntan al informe de la presente Acta de Recibo Final:

1. Plan de Inversión del anticipo con sus soportes del Contrato de Interventoría No 000-770 de 2025. Se aclara que mediante Acta Parcial No 01 se soportó el 71,50%, por lo tanto, se adjuntan documentos del saldo pendiente por soportar:

   - ✓ Soportes de anticipo (saldo pendiente).
   - ✓ Certificación cierre de cuenta para manejo del anticipo.
   - ✓ Extractos bancarios con rendimientos financieros.
   - ✓ Comprobante de reembolso de rendimientos financieros.

2. Documentos Administrativos – Financieros y Jurídicos del Contrato de Interventoría No 000-770 de 2025:

   - ✓ Certificación paz y salvo SGSSS, Parafiscales y ARL de la FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA -FIC-, con sus respectivos soportes de ley.
   - ✓ Planilla de pagos de Seguridad Social del periodo marzo-abril 2026 / abril-mayo 2026, del equipo de la Interventoría.
   - ✓ Comprobantes de pago del periodo abril 2026 del equipo de la Interventoría.
   - ✓ Certificado COMFIAR.

3. Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Interventoría No 000-770 de 2025:

   - ✓ Registros fotográficos visitas de interventoría.
   - ✓ Actas de visitas realizadas por la Interventoría a Instituciones Educativas.
   - ✓ Medio magnético con formatos de la UApA y Formatos propios diseñados por la Interventoría para la evaluación y recolección de la información en campo.
   - ✓ Otros.

Arauca, 23 de junio de 2026.

CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
Directora de Interventoría
Cto de Consultoría No 000-770 de 2025
R/L Fundación Innovación Continua - FIC
Nit. 900.942.196-1

Proyectó:
JANNETH TRUJILLO A
Coord. Procesos de Interventoría

Powered by CamScanner
