Colpensiones	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA - OTROSÍ	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-011
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

DATOS DEL SOLICITANTE:	
Supervisor	DAVID BLANDON ROMAÑA – Gerente de Tecnologías de la Información con asignación de funciones de Director de Relacionamiento TI con el Negocio
Vicepresidencia / Oficina, Gerencia y Dirección	Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio / Gerencia de Tecnologías de la Información / Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información.
TIPO DE SOLICITUD:	
Adición Valor	N/A
Prórroga Plazo	SI
Adición y Prórroga	N/A
Modificación contenido de alguna cláusula	SI
Suspensión	N/A
CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA No:	Contrato No. 021 de 2022
OBJETO:	Implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
CONTRATISTA:	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía contractual, distribuido de la siguiente forma: Ítem 1. Licenciamiento, suscripción y Soporte, el plazo de ejecución será de doce (12) meses, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES. Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales, el plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022 previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES. Fecha del acta de inicio: 21 de abril de 2022. Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2022.

	Otrosí No. 1: Suscrito el 27 de diciembre de 2022, prorrogó el plazo de ejecución para el ítem 2 hasta el 30 de junio de 2023. Otrosí No. 2: Suscrito el 30 de junio de 2023, prorrogó el plazo de ejecución para el ítem 2 hasta el 30 de noviembre de 2023.
VALOR DEL CONTRATO/ ACEPTACIÓN DE OFERTA:	El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.053.971.455) incluido IVA y todos los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y todos los costos que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato.
ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA	A corte del 8 de noviembre de 2023 este es el estado de ejecución financiera:

Valor total contrato	Valor pagado	Valor pendiente por ejecutar	% Ejecución
$ 1.053.971.455	$ 691.904.213	$ 362.067.242	66 %

JUSTIFICACIÓN:

Antecedentes

A través del contrato No. 021 de 2022, se presta el servicio de implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

La ejecución comprende la realización de las labores requeridas para implementar los casos de uso y las funcionalidades de automatización del modelo documental, lo cual comprende:

- Adquisición de nuevo licenciamiento.
- Suscripción y soporte que amplíe las capacidades de las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.
- Instalación del licenciamiento y configuración de las nuevas capacidades en los ambientes productivos y no productivos.
- Levantamiento de los requerimientos por Historias de Usuario o Casos de Uso.
- Elaboración del diseño de arquitectura de las soluciones.
- Transferencia de conocimiento.
- Pruebas técnicas.
- Elaboración de la documentación.
- Empleo de metodologías ágiles en la ejecución de cada entregable.

De acuerdo con el Anexo No. 1. Especificaciones, Condiciones Técnicas, del contrato No. 021 de 2022, los requerimientos técnicos y funcionales son los siguientes, con su respectivos pagos y estado de avance con corte al 08 de noviembre de 2023:

Item 1. Licenciamiento, suscripción y Soporte				
Caso de Uso (CU)	Descripción	% ejecutado	% por ejecutar	Valor y Estado de pago
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	100%	0%	PAGO REALIZADO Valor Total de Requerimiento con IVA: $691.904.213 - Pago Realizado sobre la entrega de licencias e instalación en ambiente de Integración. Actividad de entrega concluida al 100%: Se realizó la entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, que se validó por el custodio del licenciamiento en COLPENSIONES (Dirección de Infraestructura Tecnológica).

Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales				
Caso de Uso (CU)	Descripción	% ejecutado	% por ejecutar	Valor y Estado de pago
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR	83%	17%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $98.305.907 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la implementación de casos de uso de automatización del
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC	73%	27%	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP	74%	26%	
CU 05	Automatización del modelo documental de	73%	27%	

	la DPJ			modelo documental recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago.
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC	79%	21%	
CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH	66%	34%	
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT	68%	32%	
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD	72%	28%	
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR	71%	29%	
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ	71%	29%	
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN	71%	29%	
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE	70%	30%	
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS	72%	28%	
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL	72%	28%	
CU 16	Implementación de la funcionalidad de Cargador paramétrico. Instalación y configuración de Cargador Masivo (IBM Content Collector for File Systems) en ambiente Producción y No Producción.	61%	39%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $63.168.515 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de cargador

				paramétrico recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago. Las Instalaciones de Content Collector en los diferentes ambientes cuentan con el siguiente avance: Ambiente de Desarrollo 100%, Integración 100%, Calidad 97% y Producción 30%.
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	64%	36%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $54.929.143 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago

CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	69%	31%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $62.581.100 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	71%	29%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $34.597.281 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones Pendiente por culminar ejecución para el pago

CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	70%	30%	PENDIENTE POR PAGAR Valor Total de Requerimiento con IVA: $48.485.296 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share Instalación y configuración del IBM External Share.	82%	18%	PENDIENTE POR PAGAR Instalado external share en ambiente de desarrollo Pendiente avanzar con la instalación en los ambientes de Integración, QA y producción, para dar continuidad de la configuración del External Share. Forma de pago: Este caso de uso se debe pagar en conjunto con el caso de uso 16, hasta que no estén los dos casos de uso terminados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión no se pagará. Las Instalaciones de External Shared - en los diferentes ambientes cuentan con el siguiente avance: Ambiente de Desarrollo 100%, Integración 100%, Calidad 97% y Producción 30%

Con corte al 8 de noviembre de 2023 el avance de ejecución del cronograma del proyecto es el siguiente:

Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar
Cronograma del Proyecto	75%	25%

Seguimiento ejecución contractual

A la fecha se ha presentado dificultad en el avance de la ejecución contractual, por lo que la supervisión (Dirección de Relacionamiento TI) adelantó reuniones de entendimiento con el Contratista (Dacartec), para lograr el diagnóstico inicial a la situación presentada y como resultado de dichas reuniones, se identificaron dificultades no atribuibles al Contratista debido a fallos del producto IBM Content Collector, los cuales han sido escalados por el Contratista (Dacartec), al laboratorio de IBM por medio de PMRs, lo anterior ha causado los desvíos de la ejecución y despliegue técnico por el Contratista.

Se presenta a continuación el estado de cada caso de uso:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Estado
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	Cerrado
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSG	En proceso de pruebas la solución del PMR No. TS01378043, generada por IBM para concluir la instalación de Content Collector en ambiente QA; con lo cual se logró terminar la instalación en QA con la maniobra manual sobre la variable de entorno indicada por el Laboratorio de IBM. En proceso de ajustes incidente en content navigator, como resultado de ajustes y mejoras en ambiente de integración posterior a la reinstalación de Content Collector ICC. Líder técnico validará la
CU 03	Automatización del modelo documental de la OCR	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP	
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ	
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC	

	CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH	implementación de medidas de control efectivas para prevenir reinicios sin reporte previo por el Contratista. no fue posible avanzar en pruebas de configuración. Se realizó reinstalación de content collector en ambiente de integración se realizan prueba unitaria del procedimiento por parte de contratista para comprobar su efectividad. Se avanza en configuraciones de CU#2 e ingesta automática con el propósito de realizar pruebas de componente collector en ambiente de QA, el cual que presentó defectos durante la implementación en ambiente de integración.
	CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT	
	CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD	
	CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR	
	CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ	
	CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN	
	CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE	
	CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS	
	CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL	
	CU 16	Cargador paramétrico	En proceso de validación uso de dEn proceso de validación por Dacartec acceso de Content Collector a directorios de carpetas para la carga masiva, debido, sobre solución planteada por IBM a defecto de componente para cargue de documentos a bloqueante técnico con PMR TS014092301 sobre el acceso del Content Collector al directorio de carpetas En proceso de ajustes incidente en content navigator, como resultado de ajustes y mejora de ambiente de integración posterior a la reinstalación. Líder técnico validará la implementación de medidas de control efectivas para prevenir reinicios sin reporte previo por el Contratista., Se realizó reinstalación de content collector en ambiente de integración se realizan prueba unitaria del procedimiento para comprobar su efectividad.

CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	Se confirma por Dacartec configuración en ambiente de desarrollo para verificar funcionamiento con equipo PETI GDOC. Dacartec se encuentra en validación de pruebas internas para entregar en ambiente de integración. Se identifican ajustes de configuración del diseño de datos de los objetos a reclasificar.
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	En proceso de pruebas funcionales de la configuración ambiente de integración. Se cerraron pruebas funcionales en ambiente de integración, por lo cual se valida y emite viabilidad del área técnica para avanzar a despliegue ambiente de QA.
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	Se realizó sesión con DSI y DIT para notificar demoras en configuraciones a realizar por Dacartec, debido a lentitud de desempeño en ambiente INT incremento de 1 a 6 segundos en tiempos de respuesta 600% de incremento. Se encuentra en reinstalación de ambiente de integración por y ampliación de capacidad, para dar continuidad a pruebas unitarias.
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	Se realizó sesión con DSI y DIT para notificar demoras en configuraciones a realizar por Dacartec, debido a lentitud de desempeño en ambiente INT incremento de 1 a 6 segundos en tiempos de respuesta 600% de incremento. Se encuentra en reinstalación de ambiente de integración por y ampliación de capacidad, para dar continuidad a pruebas unitarias.
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	Implementación escritorio external share en Integración y QA. En proceso de pruebas validación de la configuración en ambiente QA de la funcionalidad de compartir a terceros por medio de External Share y validación de plugin de Copias desarrollado en Cto . 152-2020 por la dependencia funcional que conlleva.

Prórroga (Necesidad Actual)

El contratista Dacartec identificó fallos del componente de IBM Content Collector así:

- En pruebas integrales unitarias realizadas en julio de 2023, se detectó un defecto en el componente Content Collector en la instalación en ambiente de QA, el cual no permite conexión entre el servidor de Content Collector y el servidor de Filenet (Backend), dicho defecto (incidente) fue registrado el 2 de agosto de 2023 con el PMR No. TS01378043 por Dacartec a IBM y fue solucionado luego de 55 días por IBM, el 26 de septiembre de 2023.

- En el despliegue en ambiente de integración de la ingesta automática para los CU02 al CU15, se detectó el error "Problema de acceso a la unidad remota desde Content Collector, accediendo con los usuarios locales (de aplicación) con error de permisos de acceso" por lo cual se radicó por parte de Dacartec el PMR No. TS014092301 a IBM, el cual a 8 de noviembre, cuenta con 64 días calendario en estado abierto, sin solución.

Al 8 de noviembre de 2023 se cuenta con un avance del 75%; quedando un 25% pendiente de finalización de actividades.

La finalización del 25% de actividades restantes y la nivelación del desvío depende de la resolución por parte de IBM de las siguientes causas:

A. El defecto de producto Content Collector conexión entre servidores PMR No. TS01378043. identificado por el contratista Dacartec y radicado a IBM el 2 de agosto de 2023.
B. El defecto de producto Content Collector para acceso usuarios (de aplicación) a rutas externas. PMR No. TS014092301 identificado por el contratista Dacartec y radicado a IBM el 5 de septiembre de 2023.

Considerando los tiempos de atención y gestión por parte del fabricante del producto IBM, frente a la necesidad institucional y tomando en consideración que el primer defecto fue abierto el 2 de agosto de 2023 y que el segundo defecto fue abierto el 5 de septiembre de 2023, se hace necesario 1.5 meses adicionales al cierre del contrato el 30 de noviembre de 2023, para validar el cierre de estos defectos.

Una vez se cuente con el producto Content Collector, correctamente instalado y superado los defectos señalados, el contratista Dacartec requiere de 6.5 meses adicionales para concluir el 25% de las actividades restantes, las cuales dependen para su culminación de este producto.

Por lo anterior se estima conveniente prorrogar el plazo de ejecución en 8 meses más, para mitigar el riesgo de desvío por resolución de defecto de producto, y concluir el 25% de las actividades pendientes de finalización, por lo que se solicita ampliar el plazo para concluir actividades hasta el 31 de julio de 2024.

Las fechas de compromiso del nuevo cronograma por parte de contratista Dacartec se indican en la siguiente tabla:

No	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados	Fecha estimada de cumplimiento DD/MM/AAAA
1	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 15	28/06/2024
2	Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System y adicionalmente implementar el escritorio sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 CU 21	CU 16: 31/03/2024 CU 21: 15/05/2024
3	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17	15/04/2024
4	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18	31/01/2024
5	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20	15/05/2024
6	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19	15/05/2024

La Supervisión revisó el nuevo cronograma remitido por contratista Dacartec, donde se solicitó prórroga en el plazo de ejecución hasta el 31 de Julio de 2024, lo cual se considera viable para darle continuidad a la implementación de los casos de uso y de esta forma dar cumplimiento al objeto contractual.

	Redistribución presupuestal De acuerdo con el estado de ejecución financiera a la fecha, el contrato cuenta con un valor por ejecutar correspondiente a $362.067.242, lo cual hace necesario realizar la redistribución presupuestal de estos recursos que se proyectan ejecutar en el año 2024.
DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN - OTROSÍ:	• Modificar la cláusula tercera. PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar hasta el 31 de julio de 2024 la fecha de finalización del ítem 2, por lo tanto, la cláusula tercera quedará así: *"TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es hasta 31 de julio de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía contractual, distribuido de la siguiente forma:* *Ítem 1. Licenciamiento, suscripción y Soporte, el plazo de ejecución será de trece (12) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES.* *Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales, el plazo de ejecución será hasta el 31 de julio de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía del contrato por parte de COLPENSIONES.* *PARÁGRAFO PRIMERO: Para iniciar la ejecución se deberá aprobar la garantía establecida en el presente contrato, la cual estará vigente durante el plazo de ejecución hasta su terminación o liquidación según corresponda.* *PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula, de suscribirse un acta de inicio, el plazo de ejecución del contrato se contabilizará desde el momento en el cual dicha acta sea suscrita entre el supervisor de COLPENSIONES y EL CONTRATISTA."* • Modificar la cláusula. OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, liberando recursos por valor de $362.067.242 del certificado de disponibilidad No. 1000007639 del 16 diciembre de 2023 - Presupuesto RPM vigencia año 2023 y adicionar la suma de $362.067.242 con el certificado de disponibilidad No. 1000008505 del 23 de octubre de 2023 - Presupuesto RPM para la vigencia año 2024. Por lo anterior, la cláusula quedará así: *"OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato cuenta con los recursos amparados en el certificado de disponibilidad No. 1000007011 - Presupuesto RPM del 4 de enero de 2022, el certificado de disponibilidad No. 1000007639 - Presupuesto RPM del 16 diciembre de 2022 y el certificado de disponibilidad No. 1000008505 - Presupuesto RPM del 23 octubre de 2023.*

	<table><tr><th>RPM</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Total</th></tr><tr><td>1000007011</td><td>$ 691.904.213</td><td>-</td><td>-</td><td>$ 691.904.213</td></tr><tr><td>1000007639</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>1000008505</td><td>-</td><td>-</td><td>$ 362.067.242</td><td>$ 362.067.242</td></tr><tr><td>Total</td><td>$ 691.904.213</td><td>-</td><td>$ 362.067.242</td><td>$1.053.971.455</td></tr></table>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	CD No 1000008505 del 23 de octubre de 2023 - RPM
ANEXOS:	• Informe Parcial de Ejecución y Supervisión • Formulario Información de Conocimiento del Cliente • Documento en el cual el contratista acepta los términos de la modificación solicitada. • Certificado de cumplimiento de aportes parafiscales. • Certificado de Existencia y Representación Legal

Firmado en Bogotá D.C., a los 14 días del mes noviembre de 2023

DAVID BLANDÓN ROMAÑA
Gerente de Tecnologías de la Información
Con asignación de funciones Director de Relacionamiento TI con el Negocio

LUIS ALFREDO CHAPARRO MUÑOZ
Vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información

Elaboró: José Johann Garavito - Profesional Master - DRT
Rodrigo Bello Melo - Profesional Master - DRT
Jorge Javier Calderón - Profesional Master - DRT
Absel Dario Marquez Moncada - Profesional Master - DRT

Revisó: David Blandón Romaña
Gerente de Tecnologías de la Información

COLPENSIONES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CD No. 1000008505

Fecha de Documento: 23/10/2023 Fecha de Contabilización: 23/10/2023

Descripción

Otrosí CT 21/2022 servicios documentales

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe una partida presupuestal disponible, libre de afectación, para amparar los compromisos que se detallan en este documento, de acuerdo con la siguiente imputación:

Item 001	Presupuesto futuro		
Rubro	23001/142/2024/3000/1201	Valor	$362.067.242
Descripción Rubro:	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN,/VP.PLANEACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMAC/VIGENCIA 2024/Inversión/Tecno, ampl. sedes, proy. humana, pos. institucion		
Descripción Item:	**Otrosí CT 21/2022 servicios documentales**		

Importe Total: La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Valor: $362.067.242

Fecha de Impresión: 23/10/2023 Página 1 de 1

VP.PLAN. Y TEC.INF.	Jose Evelio Briceño Camacho	Elisa Morón Baute
Solicitó	Elaboró	Aprobó (Ordenador del Gasto)

Revisó: Victor Henry Urrego Hoyos Olga Elizabeth Suarez Durán

Colpensiones	FORMULARIO INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA JURIDICA)	CÓDIGO:	AGE-GRI-FMT-001
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	10/06/2021

1. DATOS GENERALES

Razón Social: DACAREC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S Sigla: DACARTEC ANDINA

Tipo de identificación: NIT: ■ SED/Sin Nit: ☐ C; Número 900.256.903 D.V. 1

2. DATOS LOCALIZACION

Dirección oficina principal o sede: CALLE 99 No. 11B - 66 Barrio: CHICO

Pais: COLOMBIA Dpto./Estado: BOGOTA Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 601 3161706 Celular: 3166307496 E-mail: dacartec.info@grupodiusframi.com.co SITIO WEB: www.dacartec.com.co

3. REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres: DAVID CANO TORRES

Tipo de identificación: CC: ☐ CE: ■ No. 413.693

Fecha de expedición: DD 23 MM 10 AAAA: 2020 Lugar de Expedición: BOGOTA

Dirección del representante legal (donde ejerce sus funciones): CALLE 99 No. 11B - 66

Teléfono: 601 3161706

Cargo: GERENTE GENERAL

4. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EL FORMULARIO (DEBEN DILIGENCIAR ADICIONALMENTE FORMULARIO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL)

Apellidos y Nombres:	Identificación
CANO TORRES DAVID	C.E. 413.693

5. SOCIOS / Accionistas (participación legal mayor o igual al 5%)

Apellidos y Nombres:	Identificación	% Participación	PPE*
DESARROLLOS INFORMATICOS DIUSFRAMI S.L.U	CIF B 85612950	100%	NO

6. PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (PPE)

¿Usted, la empresa o sus socios o accionistas manejan recursos públicos?	SI: ☐	NO: ■
¿Usted a alguno de los socios o accionistas detentan algún grado de poder público?	SI: ☐	NO: ■
¿Usted o alguno de los Socios o accionistas gozan de reconocimiento público?	SI: ☐	NO: ■

*En caso de manifestar SI en alguna pregunta favor diligenciar la casilla PPE de la casilla 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle o caracteristicas de la Actividad económica, negocio, etc..)

☐ DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOFTWARE

☐ VENTA LICENCIAMIENTO DE SOFWARE

8. INFORMACION FINANCIERA

Ingresos Mensuales:	983.520.763	Total Egresos:	10.441.241.821
Otros Ingresos:	58.722.476	Total Pasivos:	5.619.252.045
Originados en la actividad diferente a la principal :		Total Patrimonio:	3.976.608.961
Total Ingresos mensuales:	1.042.243.239	Explique Otros Ingresos:	
Total Activos:	9.595.861.006	FINANCIEROS, RECUPERACIONES E INDEMNIZACIONES	
Manejo Recursos Públicos	SI: ☐ NO: ■		

9. REFERENCIAS

FINANCIERA				COMERCIAL			
Nombre de la entidad:				Nombre del establecimiento:			
BANCO ITAU				SUPERINTENDENCIA FINANCIERA			
Clase de producto o No. De cuenta: CUENTA A HORROS 808009026				Dirección: Calle 7 No. 4 - 49			
Pais:	Dpto/Estado	Ciudad:	Teléfono:	Pais:	Dpto/Estado	Ciudad:	Teléfono:
COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA	5818181	COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA	601594 02 00

10. DECLARACIÓN

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por la Administradora Colombiana de Pensiones— Colpensiones, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.E. 413.693

OCTUBRE 23 DE 2023
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Dacartec Internacional Servicies Andina S.A.S.
Nit.: 900256903-1
Conmutador (+57 1) 316 1706
Calle 99 No. 11B - 66
Bogotá – Colombia

Bogotá, Oct 23 de 2023

Señores:
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES
Ciudad:

Ref: Contrato 021 de 2022

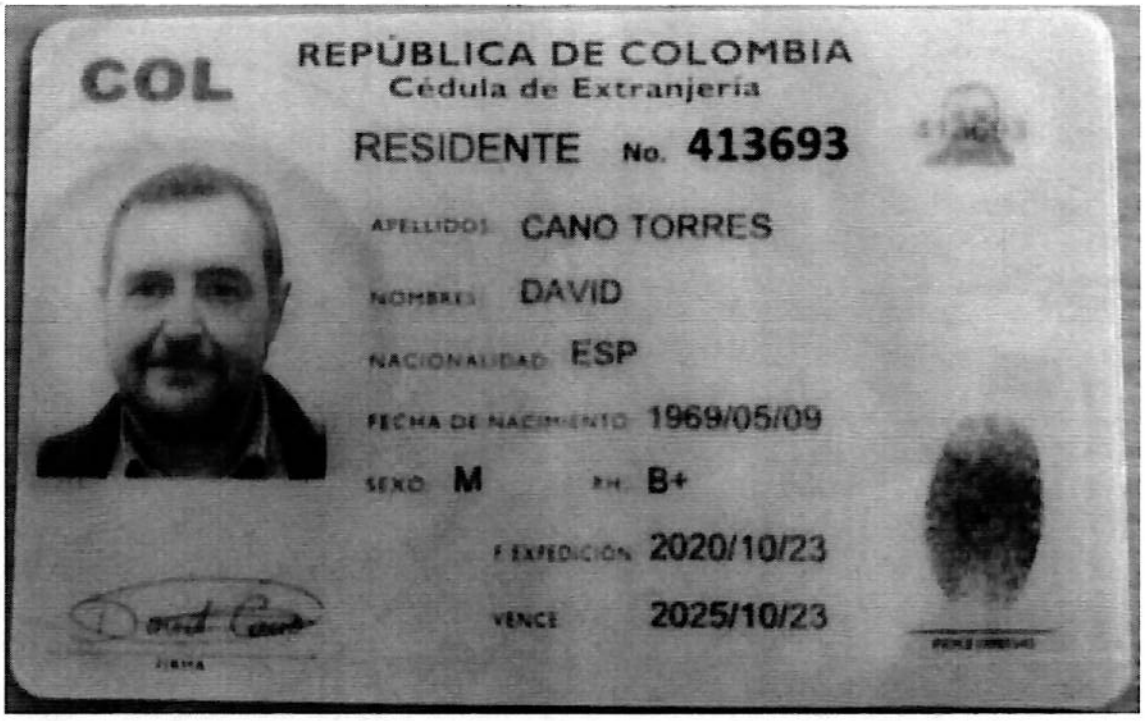
Respetados señores:

Atentamente aceptamos ampliar la fecha de Vigencia del contrato No.021 de 2022 celebrado entre la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S.A.S, hasta el 31 de julio de 2024, para el Ítem 2. Implementación de nuevos servicios documentales.

El resto del clausulado y contenido del contrato se mantendrá igual.

Cordialmente:

David Cano Torres
Representante Legal
Dacartec International Sevices Andina S.A.S.
Nit: 900.256.903-1


COL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería
RESIDENTE No. 413693
APELLIDOS CANO TORRES
NOMBRES DAVID
NACIONALIDAD ESP
FECHA DE NACIMIENTO 1969/05/09
SEXO M RH B+
F. EXPEDICIÓN 2020/10/23
VENCE 2025/10/23
FIRMA


P454347
El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.
www.migracioncolombia.gov.co
Director Migración Colombia
Juan Francisco Espinosa P.
I<COL413693<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
6905093M2510239ESP<<<<<<<<<<<4
CANO<TORRES<<DAVID<<<<<<<<<<<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946134506

(415)7707212489984(8020) 000001494613450 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 6 9 0 3	1	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DACARTEC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 11 B 66

42. Correo electrónico david.cano@grupodiusframi.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 1 7 0 6	3 1 0 2 6 2 6 1 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 0 9 0 1 3 0	6 2 0 1	2 0 0 9 0 1 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 14 : 54: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CANO TORRES DAVID
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS
CON NIT 900.256.903-1
C E R T I F I C A

La administración de la compañía me ha suministrado la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptadas en Colombia.

El alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación corresponde a la verificación del pago de los aportes a los sistemas de salud de noviembre del 2023 y las pensiones y riesgo profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a octubre de 2023 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 deldecreto 862 del 26 de abril de 2013

El pago de los aportes es responsabilidad de la administración como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de estas obligaciones.

Certifico que Dacartec International Services Andina SAS, se encuentra al día en el pago de aportes de sus trabajadores, todos se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar y la empresa ha realizado en forma oportuna los pagos durante los últimos seis (6) meses de los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscales.

La presente se expide en Bogotá D.C., el primero (1) de noviembre de 2023 a solicitud de la administración

EDWIN DARIO LOZANO NARIÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 38686-T

Colpensiones	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato 021 de 2022		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS Representante Legal: DAVID CANO TORRES identificado con la cédula de extranjería No. 413.693		
Identificación del Contratista	NIT 900.256.903-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	David Blandón Romaña	Teléfono / Extensión	1627
Dependencia y cargo del Supervisor	Gerencia de Tecnologías de la Información / Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio / Director de Relacionamiento TI con el Negocio (a)		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.		
Fecha de inicio	Jueves, 21 de abril de 2022	Fecha de terminación	Jueves, 30 de noviembre de 2023
Valor del Contrato / Aceptación de Oferta	El valor del contrato es hasta por la suma de MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.053.971.455) incluido IVA y todos los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y todos los costos que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato.		
Período objeto del informe:	Julio 26 de 2023 a 8 de noviembre de 2023		

Antecedentes

A través del contrato No. 021 de 2022, se presta el servicio de implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

La ejecución comprende la realización de las labores requeridas para implementar los casos de uso y las funcionalidades de automatización del modelo documental, lo cual comprende:

- Adquisición de nuevo licenciamiento.
- Suscripción y soporte que amplíe las capacidades de las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.
- Instalación del licenciamiento y configuración de las nuevas capacidades en los ambientes productivos y no productivos.
- Levantamiento de los requerimientos por Historias de Usuario o casos de uso.
- Elaboración del diseño de arquitectura de las soluciones.
- Transferencia de conocimiento.
- Pruebas técnicas.
- Elaboración de la documentación.
- Empleo de metodologías ágiles en la ejecución de cada entregable.

De acuerdo con el Anexo No. 1. Especificaciones, Condiciones Técnicas, del contrato No. 021 de 2022, los requerimientos técnicos y funcionales son los siguientes:

No.	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados
1	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Share. El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.	CU 01
2	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 015
3	Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System y adicionalmente implementar un escritorio del Gestor Documental para usuarios externos sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 y CU 21
4	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17
5	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18
6	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20
7	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19

Cada uno de los anteriores numerales se estructuró por casos de uso para el control en la ejecución del cronograma del Contrato No. 021 de 2022.

A continuación, se remite el avance de cada caso de uso y su estado de pago:

Caso de Uso (CU)	Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar	Valor y Estado de pago
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	100%	0%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $691.904.213 - Pago Realizado sobre la entrega de licencias e instalación en ambiente de Integración. Actividad de entrega concluida al 100%: Se realizó la entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, que se validó por el custodio del licenciamiento en COLPENSIONES (Dirección de Infraestructura Tecnológica).

				Infraestructura Tecnológica).
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR (Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales)	83%	17%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $98.305.900 Forma de pago: Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la implementación de casos de uso de automatización del modelo documental recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC (Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones)	73%	27%	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP (Dirección de planeación)	74%	26%	
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ (Dirección de Procesos Judiciales)	72%	28%	
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC (Dirección de Acciones Constitucionales)	79%	21%	
CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH (Gerencia de Talento Humano)	66%	34%	
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT (Dirección de Desarrollo del Talento Humano)	68%	32%	
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD (Gerencia Administrativa)	72%	28%	
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR (Dirección de prospectiva y estudios)	71%	29%	
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ (Gerencia de Defensa Judicial)	71%	29%	
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN (Dirección Financiera)	71%	29%	
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE (Despacho de la Presidencia)	70%	30%	
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS (Despacho de Bienes y Servicio)	72%	28%	

CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL (Oficina asesora de asuntos legales)	72%	28%	
CU 16	Cargador paramétrico	**61%**	**39%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $63.168.515 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago. Las Instalaciones de Content Collector en los diferentes ambientes cuentan con el siguiente avance: Ambiente de Desarrollo 100%, Integración 100%, Calidad 97% y Producción 30%.
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un Reclasificador masivo	**64%**	**36%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $54.929.143 - PENDIENTE DE PAGO Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	**69%**	**31%**	Valor Total de Requerimiento con IVA: $62.581.100 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago

CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	71%	29%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $34.597.281 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones Pendiente por culminar ejecución para el pago.
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	70%	30%	Valor Total de Requerimiento con IVA: $48.485.296 Forma de pago: Este pago se realizará una vez se efectúe la entrega a satisfacción de la configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato en ambiente de Producción y previa validación, pruebas y certificación por parte de las áreas de negocio de Colpensiones. Pendiente por culminar ejecución para el pago.
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	82%	18%	Instalado external share en ambiente de desarrollo Pendiente avanzar con la instalación en los ambientes de Integración, QA y producción, para dar continuidad de la configuración del External Share. Forma de pago: Este caso de uso se debe pagar en conjunto con el caso de uso 16, hasta que no estén los dos casos de uso terminados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión no se pagará. Las Instalaciones de External Shared - en los diferentes ambientes cuentan con el siguiente avance: Ambiente de Desarrollo 100%, Integración 100%, Calidad 97% y Producción 30%

A corte del 08 de noviembre de 2023, el avance de ejecución del cronograma del proyecto es el siguiente:

Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar
Cronograma del Proyecto	75%	25%

Seguimiento ejecución contractual

Debido a la dificultad de avance en la ejecución contractual, la supervisión adelantó reuniones de entendimiento, para lograr el análisis y seguimiento al desarrollo del contrato con la Dirección de Relacionamiento TI, como resultado de dichas reuniones, se han adelantado los esfuerzos en conjunto con el Contratista y DRT para superar las dificultades de calidad de producto, así como los escalamientos a laboratorio de IBM, y desvíos de ejecución y despliegue técnico por el contratista, las cuales se describen en el siguiente cuadro:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Entrega información y reuniones de socialización	Estado
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	Durante la instalación de Content Collector (**ICC**) se presenta error en conexión de servidor ICC con servidor P8 FileNet; por lo cual contratista solicitó soporte por producto a IBM por medio de PMR TS013787043 el 02 agosto de 2023. (63 días en revisión a octubre 4 de 2023). 14 septiembre 2023 IBM emite una nueva opción de solución con un archivo .bat que automáticamente debería solucionar el error, el cual falla. El dia 20 septiembre 2023 el contratista en nueva validación realiza prueba con acción manual para "Setear manualmente las variable de entorno", lo que permite continuar con instalación de ICC, encontrando error relacionada con usuarios y servicios nativos de ICC, los cuales a su vez también se presentaron como error en configuración de ICC en ambiente QA, por lo que contratista elevará consulta a IBM antes de cerrar el PMR.	Entrega del licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector, para lo cual se debe hacer entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, validada por el custodio del licenciamiento en Colpensiones (Dirección de Infraestructura Tecnológica). Instalación Content Collector y External Share en ambientes de Desarrollo e Integración. El 22 de noviembre de 2022, se dio recibo a satisfacción por parte del custodio del licenciamiento (DIT) previa validación.
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR	El 19 de julio de 2022 se envió comunicado del supervisor con Radicado 2022_9871927, solicitando nivelación de actividades. El contratista informa el 28 de julio de 2022 con radicado 2022_10388311, ampliación del recurso humano y mejorar el tiempo de la metodología. El 24 de agosto de 2022 se envió comunicado del supervisor con radicado 2022_12029066, reportando las diferencias del entendimiento del Contratista de los requerimientos funcionales de cada caso de uso versus especificaciones técnicas del	- Automatización del modelo documental para 14 áreas: En proceso de pruebas la solución del PMR No. TS01378043, generada por IBM para concluir la instalación de Content Collector en ambiente QA; con lo cual se logró terminar la instalación en QA con la maniobra manual sobre la variable de entorno indicada por el Laboratorio de IBM. En proceso de ajustes incidente en
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC		
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP		
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ		
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC		

CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH	contrato. El 9 de septiembre de 2022 con Radicado 2022_12923353 Dacartec presenta propuesta para solucionar diferencias de 8 puntos en su entendimiento de los requerimientos funcionales. El 04 de octubre de 2022 con Radicado 2022_14372407 La Supervisión solicita a Dacartec estado de avance de las soluciones propuestas y estado del contrato. Dacartec confirma el 19 de octubre con Radicado 2022_15267277 estado de avance y de causas de desviación. El 02 de febrero de 2023 con radicado 2023_1780572 solicita a Dacartec revisión de las desviación de avances sobre el cronograma del otrosi 1 El contratista gestionó el 02 de agosto de 2023 apoyo de IBM por error en configuración de conexión con servidor de FileNet P8 con servidor de Content Collector en ambiente QA; con el PMR No. TS01378043. El contratista gestionó el 06 de septiembre 2023 apoyo de IBM por error en acceso a rutas externas de Content Collector en ambiente Integración durante la configuración dentro de la Ingesta Automática de los CU02 al CU15, con PMR No. TS014092301. El Contratista indica que a fin de mes de Septiembre presentará el total de los flujos y las configuración de los flujos en Récords así como el estado de las configuraciones en FileNet para los CU3 al CU15 en ambiente Integración. .	content navigator, como resultado de ajustes y mejoras en ambiente de integración posterior a la reinstalación de Content Collector ICC. Líder técnico validará la implementación de medidas de control efectivas para prevenir reinicios sin reporte previo por el Contratista. no fue posible avanzar en pruebas de configuración. Se realizó reinstalación de content collector en ambiente de integración se realizan prueba unitaria del procedimiento por parte de contratista para comprobar su efectividad. Se avanza en configuraciones de CU#2 e ingesta automática con el propósito de realizar pruebas de componente collector en ambiente de QA, el cual que presentó defectos durante la implementación en ambiente de integración.
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT		
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD		
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR		
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ		
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN		
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE		
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS		
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL		
CU 16	Cargador paramétrico	El contratista gestionó el 05 de septiembre 2023 apoyo de IBM por error en acceso a rutas externas de Content Collector en ambiente Integración durante la configuración dentro de la Carga paramétrica, con PMR TS014092301. IBM reportó que el laboratorio continúa en revisión del caso y solicitó información a Dacartec para validación de configuraciones, Dacartec se compromete entregar la información el 29 sep 2023.	En proceso de validación uso de dEn proceso de validación por Dacartec acceso de Content Collector a directorios de carpetas para la carga masiva, debido, sobre solución planteada por IBM a defecto de componente para cargue de documentos a bloqueante técnico con PMR TS014092301 sobre el acceso del Content Collector al directorio de carpetas En proceso de ajustes incidente en content navigator, como resultado de ajustes y mejora de ambiente de integración posterior a la reinstalación. Líder técnico validará la implementación de medidas de control efectivas para prevenir reinicios sin reporte previo por el Contratista.,

a

			Se realizó reinstalación de content collector en ambiente de integración se realizan prueba unitaria del procedimiento para comprobar su efectividad.
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	El contratista reporta 21 jul 2023 y se programa pruebas para el 25 Jul 2023. sin embargo por solicitud del contratista se reprograma a causa de disponibilidad de su especialista. Se realiza sesión en conjunto con contratista 18 agosto de 2023 para validar inclusión de dato en diccionario de datos. Se confirma con contratista el 29 agosto de 2023 que termina pruebas de adición en diccionario de datos y se programar prueba de la funcionalidad para el 1 de septiembre de 2023. 27 de septiembre 2023 se evidencio que contratista no tiene al 100% el despliegue de las configuraciones en el ambiente de integración, se programa para 02 de octubre validación.	Se confirma por Dacartec configuración en ambiente de desarrollo para verificar funcionamiento con equipo PETI GDOC. Dacartec se encuentra en validación de pruebas internas para entregar en ambiente de integración. Se identifican ajustes de configuración del diseño de datos de los objetos a reclasificar.
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	El contratista solicita reprogramar sesión de prueba para el 15 o 16 de Agosto, debido a que se contratista está en ajustes de las observaciones dadas por Colpensiones El contratista confirma el 11 de septiembre de 2023 la entrega de despliegue en ambiente de integración. 29 de septiembre 2023 se realiza prueba iniciales en ambiente integración, se requiere definiciones por parte de contratista sobre almacenamiento para esta funcionalidad.	En proceso de pruebas funcionales de la configuración ambiente de integración. Se cerraron pruebas funcionales en ambiente de integración, por lo cual se valida y emite viabilidad del área técnica para avanzar a despliegue ambiente de QA.
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	El 7 septiembre de 2023 se realiza pruebas en Connector for Email, se reporta fallo; El contratista indica tener solucionado para prueba de ser posible para el 15 de septiembre de 2023 Se adelanta pruebas en ambiente integración de funcionalidad encontrando pendientes de configuración. El contratista Dacartec confirmó que aún se encuentran realizando los ajustes faltantes y no confirmó fecha de entrega, pendiente configuraciones y funcionalidad de declaración en récords en ambiente integración.	Se realizó sesión con DSI y DIT para notificar demoras en configuraciones a realizar por Dacartec, debido a lentitud de desempeño en ambiente INT incremento de 1 a 6 segundos en tiempos de respuesta 600% de incremento. Se encuentra en reinstalación de ambiente de integración por y ampliación de capacidad, para dar continuidad a pruebas unitarias.

CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	Se realiza instalacion y configuracion de cliente en equipo de Colpensiones el 29 de agosto de 2023, se realiza prueba en ambiente integración el 30 de agosto de 2023 encontrando que solo con usuarios de administración funciona la sincronización correctamente, se solicita a contratista revisar El contratista está validando error en cliente de Navigator Sync que impide la normal sincronización.	Se realizó sesión con DSI y DIT para notificar demoras en configuraciones a realizar por Dacartec, debido a lentitud de desempeño en ambiente INT incremento de 1 a 6 segundos en tiempos de respuesta 600% de incremento. Se encuentra en reinstalación de ambiente de integración por y ampliación de capacidad, para dar continuidad a pruebas unitarias.
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	Se realiza primera iteración de pruebas funcionales el 05 de julio de 2023. , identificándose ajustes sobre el escritorio interno configurado. Se realiza una segunda iteración de pruebas el 7 de julio de 2023 para validar los ajustes del escritorio. Validación en ambiente QA de la configuración de plugin de copias, desarrollado dentro de Cto 152-2020, por la dependencia que tiene con esta funcionalidad.	Implementación escritorio external share en Integraciòn y QA. En proceso de pruebas validación de la configuración en ambiente QA de la funcionalidad de compartir a terceros por medio de External Share y validación de plugin de Copias desarrollado en Cto . 152-2020 por la dependencia funcional que conlleva.

Conforme a las actividades del ítem 2 del contrato 021 de 2022 antes mencionadas, se identifica que el contratista viene realizando esfuerzos tendientes al cumplimiento del objeto contractual, proporcionando el equipo, información, constancia e interés en buscar las alternativas que permitan superar las barreras de calidad y entendimiento técnico.

Descuento por aplicabilidad de ANS

De acuerdo con la sesión de Supervisión realizada el día 10 de mayo de 2023, se le informó al Contratista el cálculo del porcentaje (%) de aplicación de los ANS para las diferentes actividades del cronograma que el contratista entregó en el Otrosí No. 1, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO No. 3. Acuerdos de Nivel de Servicio, del Cto 021 de 2022. La relación de los descuentos por cada pago se relacionan en la siguiente tabla:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Valor Pago (Con IVA)	Estado Pago	Descuento por ANS
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	$691.904.213	Realizado	No aplica
CU 02 al CU 15	Automatización del modelo documental para 14 áreas	$98.305.900	Pendiente	7 %

CU 16 y CU 21	Cargador paramétrico y Configuración de un escritorio con External Share	$63.168.515	Pendiente	7 %
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo	$54.929.143	Pendiente	7 %
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	$62.581.100	Pendiente	7 %
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	$34.597.281	Pendiente	7 %
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	$48.485.296	Pendiente	7 %

Los anteriores descuentos se efectuarán con el pago de las facturas que tendrán lugar una vez el contratista entregue los productos a satisfacción de parte de Colpensiones conforme a lo estipulado en el contrato.

Prórroga (Necesidad Actual)

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución las actividades de configuración de las soluciones y considerando que el contratista ha venido avanzando en el Otrosí No 2 con una ejecución avance real del 74% se realizó solicitud de prórroga y se presentó el cronograma de trabajo actualizado el 30 de septiembre de 2023, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, y culminar el 26% pendiente de ejecución.

Las fechas de compromiso del nuevo cronograma se indican en la siguiente tabla:

No	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados	Fecha estimada de cumplimiento DD/MM/AAAA
1	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Share. El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.	CU 01	Desde 21/04/2022 hasta 30/04/2023 Licenciamiento 12 meses
2	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 015	28/06/2024
3	Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System y adicionalmente implementar el escritorio sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 CU 21	CU 16: 31/03/2024 CU 21: 15/05/2024

4	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17	15/04/2024
5	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18	31/01/2024
6	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20	15/05/2024
7	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19	15/05/2024

Se revisó por la supervisión el nuevo cronograma remitido por el Contratista, donde se esté solicitó prórroga en el plazo de ejecución hasta el **31 de Julio de 2024**, lo cual se considero viable para darle continuidad a la implementación de los casos de uso y dar cumplimiento al objeto contractual

Conforme a las actividades antes mencionadas, se identifica que el contratista viene realizando esfuerzos permanentes tendientes al cumplimiento del objeto contractual, proporcionando el equipo, información, constancia e interés en buscar las alternativas que permitan superar las barreras de calidad y entendimiento técnico.

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica(n) que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato/aceptación de oferta en mención (anteriormente descritas).
2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales.
3. Apruebo (aprobamos) los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas.
4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

EJECUCIÓN FINANCIERA

A corte del 8 de noviembre de 2023 el estado de ejecución financiera es el siguiente:

Valor total contrato	Valor ejecutado y pagado	Saldo contrato (Saldo Comprometido para ejecución en el 2022)	% Ejecución
$ 1.053.971.455	$ 691.904.213	$ 362.067.242	66 %

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Colpensiones	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-008
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	28/08/2020

ANEXOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS	Ninguno

Certifico de manera parcial la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:

DAVID BLANDON ROMAÑA

Gerente de Tecnologías de la Información con asignación
de funciones de Director de Relacionamiento TI con el Negocio
Supervisor

Lugar y Fecha: Bogotá D.C., a los 14 días del mes noviembre de 2023

Proyectó: José Johann Garavito - Profesional Master - DRT
Jorge Eduardo Alzate Cortes - Profesional Master - DRT
Absel Dario Marquez Moncada - Profesional Master - DRT
Jorge Javier Calderón - Profesional Master - DRT

Revisó: David Blandón Romaña
Gerente de Tecnologías de la Información
Gina Paola Vergel Arévalo – Asesora VPT
