

Id	Modo de tarea	EDT	Texto	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**1**		**CTO No. 4600106098 - MANTENIMIENTO MEDELLIN**	**108 días**	**mié 2/09/26**	**jue 31/12/26**	
2		**1.1**		**INICIO**	**0 días**	**mié 2/09/26**	**mié 2/09/26**	
3		**1.2**		**SECRETARIA DE CULTURA**	**108 días**	**mié 2/09/26**	**jue 31/12/26**	
4		1.2.1	1	MANILA	108 días	mié 2/09/26	jue 31/12/26	2CC+45 días
5		1.2.2	2	MIRAFLORES	45 días	lun 14/09/26	mié 4/11/26	2CC+57 días
6		1.2.3	3	MORAVIA	43 días	mié 21/10/26	mar 8/12/26	2CC+76 días
7		**1.3**		**DAGRD**	**88,13 días**	**mar 8/09/26**	**mié 16/12/26**	
8		1.3.1	4	CAMPO VALDES	67 días	mar 8/09/26	lun 23/11/26	2CC+13 días
9		1.3.2	5	LIBERTADORES	72 días	vie 25/09/26	mié 16/12/26	2CC+169 días
10		1.3.3	6	BOMBEROS GUAYABAL	44 días	lun 14/09/26	mar 3/11/26	2CC+41 días
11		**1.4**		**DESARROLLO ECONOMICO**	**41,63 días**	**mar 22/09/26**	**lun 9/11/26**	
12		1.4.1	7	BUENOS AIRES	17 días	lun 28/09/26	vie 16/10/26	2CC+143 días
13		1.4.2	8	POPULAR	30 días	lun 5/10/26	lun 9/11/26	2CC+144 días
14		1.4.3	9	MANRIQUE	26 días	mar 29/09/26	mié 28/10/26	2CC+151 días
15		1.4.4	10	SANTA CRUZ	25 días	lun 5/10/26	mar 3/11/26	2CC+155 días
16		1.4.5	11	LAURELES	30 días	mar 22/09/26	lun 26/10/26	2CC+161 días
17		1.4.6	12	BANCO ED. VELASQUEZ	26 días	mar 29/09/26	mié 28/10/26	2CC+166 días
18		**1.5**		**INCLUSION SOCIAL**	**100,5 días**	**jue 3/09/26**	**jue 24/12/26**	
19		1.5.1	13	SAN CRISTOBAL	54 días	lun 26/10/26	jue 24/12/26	2CC+176 días
20		1.5.2	14	CIUDADELA BELENCITO	65 días	jue 3/09/26	lun 16/11/26	2CC+30 días
21		1.5.3	15	REFUGIO DE ANCIANOS SAN CRISTOBAL	58 días	lun 21/09/26	mié 25/11/26	2CC+184 días


Proyecto: C:\Users\carga\OneD
Fecha: mar 25/08/26



Id	Modo de tarea	EDT	Texto	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22		1.5.4	16	AMAUTA	38 días	lun 28/09/26	mar 10/11/26	2CC+137 días
23		**1.6**		**MOVILIDAD**	**78 días**	**jue 10/09/26**	**lun 7/12/26**	
24		1.6.1	17	SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE CARIBE	78 días	jue 10/09/26	lun 7/12/26	2CC
25		**1.7**		**SALUD**	**67,88 días**	**mar 15/09/26**	**mar 1/12/26**	
26		1.7.1	18	BODEGA SAN JUAN	44 días	mié 16/09/26	jue 5/11/26	2CC+57 días
27		1.7.2	19	SS CAVA DISTRITAL	67,88 días	mar 15/09/26	mar 1/12/26	2CC+165 días
28		**1.8**		**SECRETARIA DE PARTICIPACION**	**61 días**	**lun 21/09/26**	**sáb 28/11/26**	
29		1.8.1	20	SS AVILA	75,38 días	lun 21/09/26	lun 14/12/26	2CC+158 días
30		1.8.2	21	SS EL COMPROMISO	90,38 días	lun 14/09/26	mié 23/12/26	2CC+45 días
31		1.8.3	22	SS GRANIZAL	74,25 días	jue 3/09/26	jue 26/11/26	2CC+45 días
32		**1.9**		**S. GESTION HUMANA**	**53,5 días**	**mar 25/08/26**	**vie 23/10/26**	
33		1.9.1	23	MASCERCA CASTILLA	28 días	mar 22/09/26	vie 23/10/26	2CC+157 días
34		1.9.2	24	MASCERCA GUAYABAL	25,5 días	mar 25/08/26	lun 21/09/26	2CC+52 días
35		**1.10**		**S. MEDIO AMBIENTE**	**64,88 días**	**dom 11/10/26**	**mié 23/12/26**	
36		1.10.1	25	MA GUAYABAL	66 días	dom 11/10/26	mié 23/12/26	2CC+57 días
37		**1.11**		**S. INFRAESTRUCTURA**	**96,75 días**	**mié 9/09/26**	**sáb 26/12/26**	
38		1.11.1	26	SIF - PLANTA LA IGUANA	84 días	mié 9/09/26	sáb 12/12/26	2CC+52 días
39		1.11.2		VIVERO EL POBLADO	96,75 días	mié 9/09/26	sáb 26/12/26	2CC+45 días
40		**2**		**FIN**	**0 días**	**jue 24/12/26**	**jue 24/12/26**	**35**

Proyecto: C:\Users\carga\OneD
Fecha: mar 25/08/26




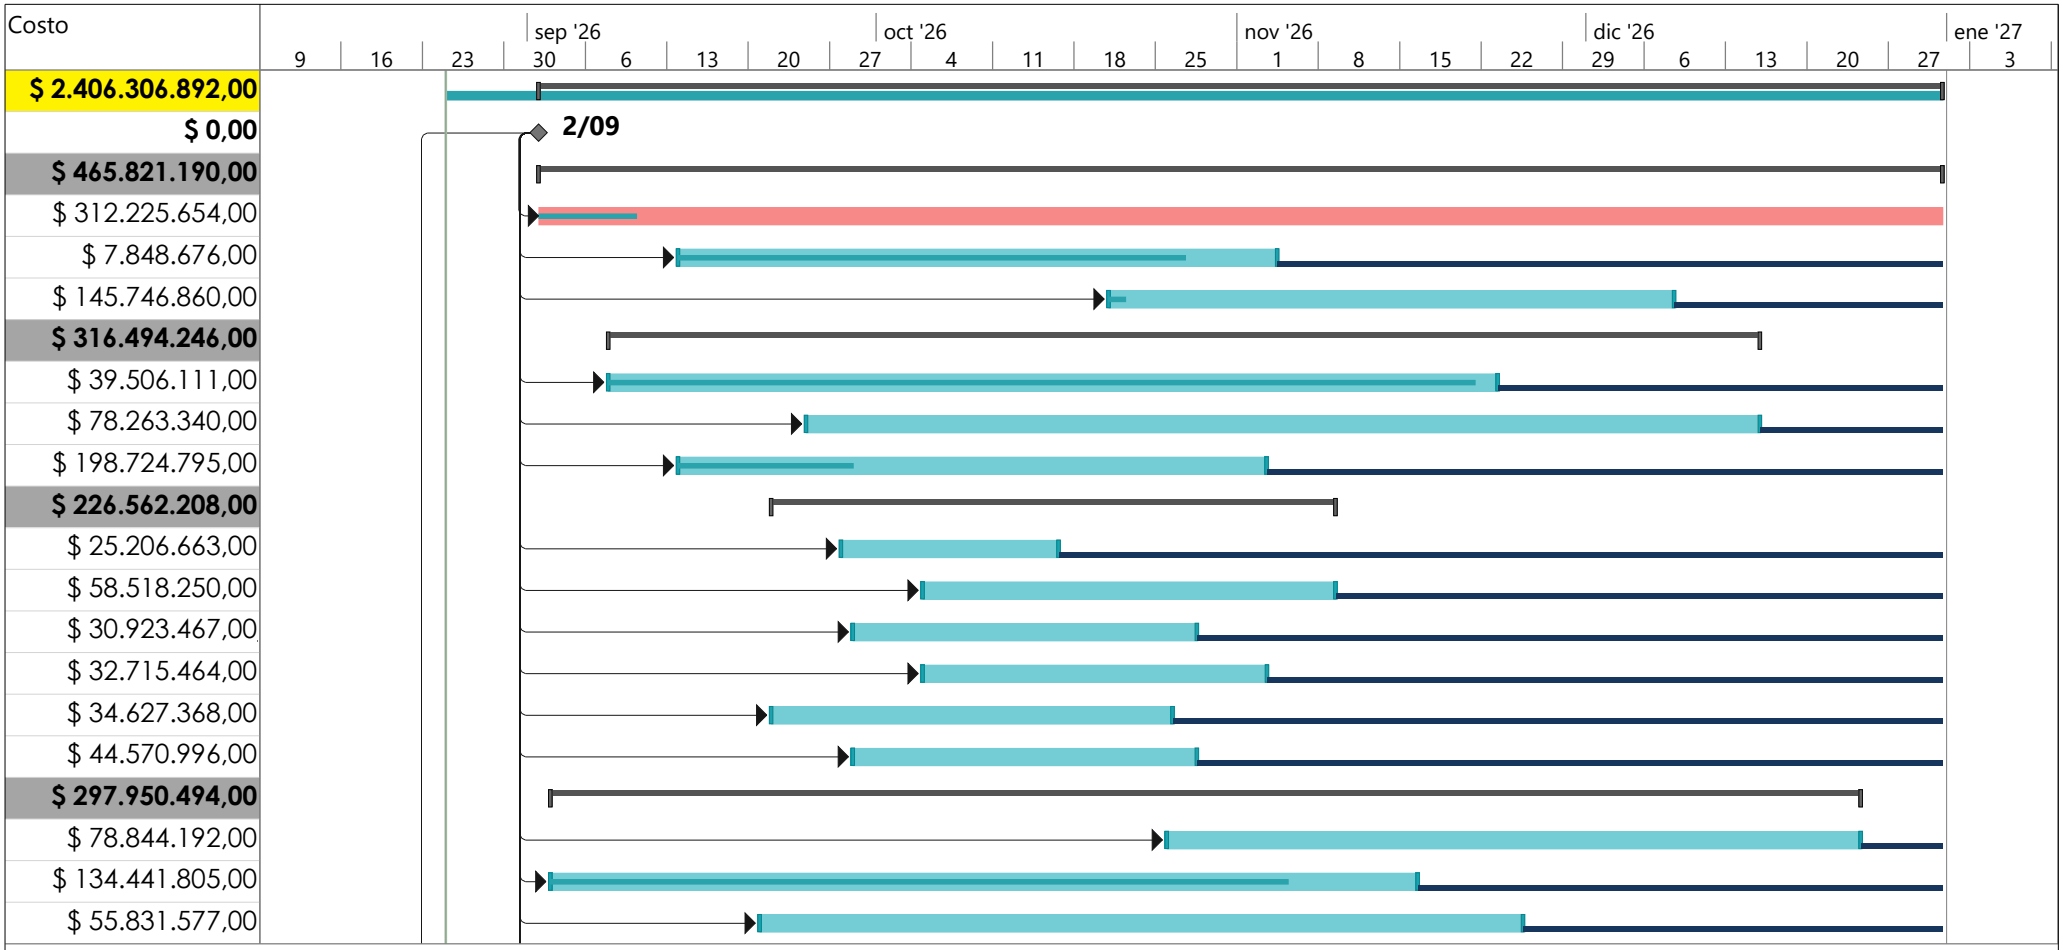

Proyecto: C:\Users\carga\OneD
Fecha: mar 25/08/26

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	

Costo
$ 28.832.920,00
$ 163.400.006,00
$ 163.400.006,00
$ 117.168.427,00
$ 29.757.124,00
$ 87.411.303,00
$ 268.810.872,00
$ 89.385.971,00
$ 100.361.920,00
$ 79.062.981,00
$ 39.999.818,00
$ 33.554.801,00
$ 6.445.017,00
$ 59.691.501,00
$ 59.691.501,00
$ 450.408.130,00
$ 237.186.882,00
$ 213.221.248,00
$ 0,00

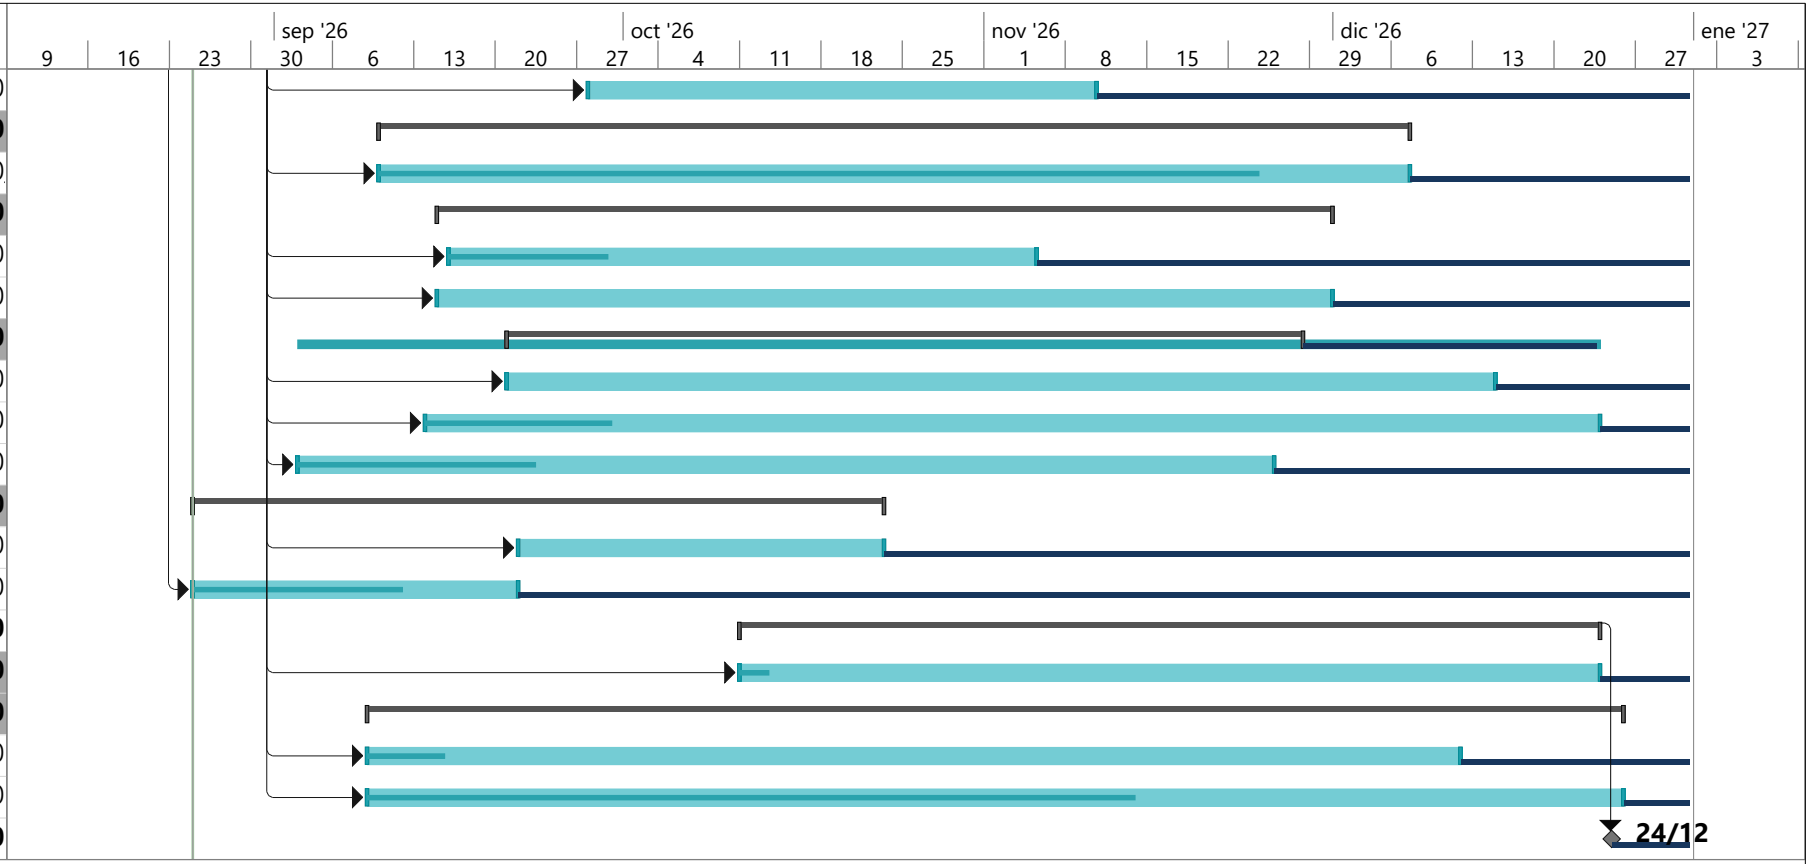

Proyecto: C:\Users\carga\OneD
Fecha: mar 25/08/26

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	
