INFORME DE SUPERVISION No. 1.

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA

CONTRATO CP-PR-2026-040

SUPERVISOR:
HERNANDO JAVIER ÁLVAREZ BRACHO

PERIODO: 01 DE JUNIO DEL 2026- 01- JULIO DE 2026

JULIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. Resumen 6
3.2. Localización 6
3.3. Objetivo 7
3.4. Beneficiarios 7
3.5. Alcance 7
4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 8
4.1. Ejecución del proyecto y acumulado 9
5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN 9
5.1 Porcentaje de ejecución del proyecto y acumulado 13
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
Actividad N° 1 15
Actividad N° 2 15
Actividad N° 3 15
Actividad N° 4 16
Actividad N° 5 16
Actividad N° 6 16
Actividad N° 7 17
Actividad N° 8 17
Actividad N° 9 17
Actividad N° 11 18
Actividad N° 12 18
Actividad N° 13 19
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 30
8. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS 31
9. RELACIÓN DE PAGOS 32
10. ESTADO FINANCIERO 32
11. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO 32
11.1 Estado del anticipo 33
12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 34

1. INTRODUCCIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato No. **CP-PR-2026-040**, celebrado entre **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS** y la **FUNDACIÓN PARA LA CORPORACIÓN ACCIÓN Y GESTIÓN – FUCORAG**, cuyo objeto es **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"**, me permito presentar el presente informe de supervisión, correspondiente al período comprendido entre el **01 de junio y el 30 de junio de 2026**, en cumplimiento de las funciones asignadas y de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato de supervisión.

Durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a los componentes técnicos, administrativos, legales y financieros del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance físico del proyecto, la ejecución de las actividades programadas y la adecuada presentación de los soportes documentales por parte del contratista, de conformidad con el cronograma de ejecución y los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

El presente informe consolida la información general del contrato, la descripción del proyecto, el avance físico alcanzado, el informe técnico de supervisión, el registro fotográfico de las actividades verificadas, el estado de las garantías, la información financiera, el seguimiento al anticipo y las conclusiones derivadas del proceso de supervisión, con el propósito de evidenciar el estado de ejecución y el cumplimiento del objeto contractual durante el período evaluado.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($685.980.000,00)		
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/05/2026		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/06/2026		
FECHA DE TEMINACIÓN DEL CONTRATO	01/10/2026		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO	01/06/2026	01/10/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL	3326	07/05/2026

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Resumen

El proyecto **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"** tiene como propósito desarrollar estrategias pedagógicas, preventivas y de sensibilización orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida, la promoción de la sexualidad responsable y la prevención del embarazo adolescente e infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población adolescente del municipio.

Para el cumplimiento de este propósito, el proyecto contempla la ejecución de intervenciones de orientación profesional y pedagógica, el desarrollo de talleres, charlas y jornadas comunitarias, la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios, así como la implementación de metodologías participativas que promuevan la toma de decisiones responsables y el fortalecimiento de habilidades para la vida. Igualmente, comprende la generación de soportes técnicos como planes de trabajo, material pedagógico, registros de asistencia, evidencias fotográficas e informes de ejecución que permiten verificar el cumplimiento de las actividades programadas.

3.2. Localización

El proyecto se desarrolla en el **municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena**, priorizando actividades en las comunas **Mar Caribe, Ciénaga Grande, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte**, donde se concentra la población beneficiaria objeto de intervención. La ejecución contempla igualmente la articulación con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y líderes sociales de los sectores priorizados para facilitar el desarrollo de las jornadas de sensibilización.

COMUNAS
Comuna Mar caribe
Comuna Ciénaga grande
Comuna San juan del Córdoba
Comuna San Juan del Córdoba
Comuna Nuevo Horizonte

3.3. Objetivo

Fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades de los adolescentes del municipio de Ciénaga para la construcción de su proyecto de vida, promoviendo la sexualidad responsable, el autocuidado, la prevención del embarazo adolescente y de las infecciones de transmisión sexual, mediante el desarrollo de campañas de sensibilización y estrategias pedagógicas participativas.

3.4. Beneficiarios

El proyecto está dirigido a **500 adolescentes** del municipio de Ciénaga, seleccionados mediante procesos de identificación y verificación adelantados con el apoyo de líderes comunitarios de las comunas priorizadas. La población beneficiaria corresponde principalmente a adolescentes vinculados a instituciones educativas y comunidades de los sectores intervenidos por el proyecto.

3.5. Alcance

El alcance del proyecto comprende la ejecución de campañas de sensibilización mediante intervenciones de orientación profesional y pedagógica, talleres, charlas y actividades comunitarias enfocadas en el fortalecimiento del proyecto de vida y la sexualidad responsable. Asimismo, incluye la elaboración y entrega de material pedagógico, el registro documental de las actividades desarrolladas, la recolección de evidencias, el seguimiento a la participación de los beneficiarios y la presentación de los informes de ejecución que soportan el cumplimiento del objeto contractual.

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

En cumplimiento de las funciones de supervisión y con fundamento en la revisión del informe de ejecución, los soportes documentales y las evidencias aportadas por el contratista, se verificó que, con corte al período objeto del presente informe, el proyecto **"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"** registra un **avance físico acumulado del 25%**, correspondiente al desarrollo de las actividades previstas para la etapa inicial de ejecución.

Durante el proceso de supervisión se constató la ejecución de actividades relacionadas con la planeación y organización del proyecto, la identificación de la población e instituciones priorizadas, el diseño de contenidos y material pedagógico, así como el avance en la articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios para la implementación de las jornadas de sensibilización. Igualmente, se verificó el inicio del proceso de selección y caracterización de beneficiarios, así como las primeras intervenciones pedagógicas y jornadas de sensibilización dirigidas a la población objetivo, conforme al cronograma aprobado.

Como resultado de la revisión de los informes de actividades, registros de asistencia, evidencias fotográficas y demás soportes presentados por el contratista, se verificó el siguiente estado de ejecución:

Actividad	**Estado de ejecución**	**Avance verificado**
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100%
Identificación de población e instituciones priorizadas	Ejecutada	100%
Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100%
Articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios	En ejecución	60%
Selección y caracterización de beneficiarios	En ejecución	25%
Intervenciones de orientación profesional y pedagógica	Iniciadas	20%
Jornadas de sensibilización en barrios priorizados	Iniciadas	20%
Avance físico acumulado del proyecto	**Verificado**	**25%**

El porcentaje de avance físico anteriormente descrito fue corroborado por esta supervisión mediante la revisión de los soportes técnicos y documentales aportados por el contratista, evidenciándose que las actividades ejecutadas corresponden con la programación establecida para el primer período de ejecución y permiten concluir que el contrato avanza conforme a lo previsto en el cronograma aprobado.

4.1. Ejecución del proyecto y acumulado

Como resultado del seguimiento efectuado al contrato, esta supervisión verificó que la ejecución del proyecto se desarrolla conforme al cronograma establecido para la estrategia **"Ruta de Sensibilización 2026"**, cuya meta corresponde a la realización de **50 sesiones** de intervención dirigidas a la población beneficiaria.

Con base en la revisión del informe de ejecución, los registros de asistencia, evidencias fotográficas y demás soportes documentales aportados por el contratista, se constató que durante el período evaluado fueron ejecutadas **11 sesiones de sensibilización en la Comuna Mar Caribe**, iniciándose igualmente las actividades programadas en la **Comuna Ciénaga Grande**, de conformidad con la programación establecida para esta fase del proyecto.

En consecuencia, el estado de ejecución acumulado verificado por esta supervisión es el siguiente:

Concepto	**Cantidad verificada**
Sesiones programadas totales	50
Sesiones ejecutadas durante el período	11 sesiones (Comuna Mar Caribe) e inicio de actividades en Comuna Ciénaga Grande
Avance físico acumulado	25 %
Estado de ejecución	Conforme al cronograma aprobado

De acuerdo con la verificación realizada, el porcentaje de ejecución alcanzado corresponde a la programación prevista para el primer período contractual, evidenciándose el cumplimiento de las actividades inicialmente programadas y el avance progresivo del proyecto hacia las siguientes fases de intervención, sin identificarse desviaciones que comprometan el cumplimiento de las metas establecidas para el contrato.

5. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

Contrato No. CP-PR-2026-040

"Desarrollo de Campañas de Sensibilización Denominada: Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable, Dirigida a la Población Adolescente del Municipio de Ciénaga, Magdalena"

Periodo objeto de seguimiento: 01 de junio de 2026 – 01 de julio de 2026

1. DESARROLLO TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

En ejercicio de las funciones de supervisión asignadas frente al Contrato No. CP-PR-2026-040, celebrado entre SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS y la FUNDACIÓN PARA LA CORPORACIÓN ACCIÓN Y GESTIÓN – FUCORAG, la supervisión adelantó, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 01 de julio de 2026, el seguimiento técnico correspondiente a cada una de las actividades reportadas por el contratista en su Informe de Actividades No. 1. A continuación se describe el desarrollo de dicho seguimiento, actividad por actividad, conforme al cronograma de ejecución aprobado para el proyecto.

Actividad 1. Planeación y organización del proyecto

El contratista reportó la realización de las actividades de planificación y organización necesarias para el inicio de la ejecución del proyecto, comprendiendo la estructuración del plan de trabajo, la programación de actividades, la definición de la metodología de intervención y la coordinación logística para el desarrollo de las jornadas de sensibilización.

Frente a esta actividad, la supervisión realizó seguimiento a la etapa de alistamiento del proyecto mediante la revisión del plan de trabajo y el cronograma operativo presentados por el contratista, verificando su correspondencia con el objeto contractual, los objetivos generales y específicos del proyecto y los plazos establecidos en la minuta (fecha de inicio 01/06/2026 y fecha de terminación 01/10/2026). Se verificó igualmente la coherencia entre la metodología de intervención definida por el contratista —participativa, vivencial y reflexiva— y los lineamientos técnicos aprobados para el proyecto.

Como resultado del seguimiento, se constató que el plan de trabajo y el cronograma fueron estructurados de forma completa y presentados oportunamente, por lo cual esta actividad se encuentra ejecutada en un 100%, según lo reportado por el contratista, evidenciándose el cumplimiento de la obligación contractual de elaborar el plan operativo y el cronograma de actividades.

Actividad 2. Identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas

El contratista adelantó el proceso de identificación y priorización de la población beneficiaria, así como de las instituciones educativas y organizaciones comunitarias

llamadas a participar en el desarrollo de las actividades, conforme a los criterios de focalización de la Secretaría de Salud para los 500 adolescentes (15 a 19 años) del municipio de Ciénaga.

La supervisión efectuó revisión de los criterios de focalización aplicados por el contratista y de su correspondencia con la población priorizada por la entidad, así como del acercamiento realizado con las instituciones educativas, líderes comunitarios y actores sociales de las cuatro comunas objeto de intervención (Mar Caribe, Ciénaga Grande, San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte). Se validó que dicho proceso se adelantara de manera articulada con los líderes comunitarios, conforme a lo reportado por el contratista.

Se evidenció que la actividad presenta un avance del 100%, encontrándose culminada la fase de identificación institucional y comunitaria, lo cual constituye la base para el proceso de selección y caracterización de beneficiarios que se desarrolla de manera continua durante la ejecución del contrato.

Actividad 3. Diseño y elaboración de contenidos y material pedagógico

Según lo reportado por el contratista, se diseñaron y adecuaron los contenidos temáticos, las herramientas metodológicas y los materiales pedagógicos de apoyo a las intervenciones de orientación profesional y a las jornadas de sensibilización.

La supervisión realizó seguimiento a la pertinencia del material pedagógico frente a los objetivos del proyecto, verificando que los contenidos desarrollados —organizados en las fases de "Rompehielos y Autocuidado", "Sexualidad Responsable y Mitos" y "Diseñando el Proyecto de Vida"— respondieran a las necesidades identificadas en la población adolescente beneficiaria y guardaran coherencia con el enfoque de derechos sexuales y reproductivos establecido en el objetivo general del proyecto. Se constató la existencia del material didáctico entregado a los participantes como soporte de las jornadas realizadas.

Como resultado, se evidenció el cumplimiento del 100% reportado para esta actividad, verificándose que el material pedagógico elaborado se ajusta a los lineamientos técnicos y metodológicos aprobados para el proyecto.

Actividad 4. Articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios

El contratista desarrolló acciones de coordinación y articulación con directivos de instituciones educativas, líderes comunitarios y demás actores locales, con el fin de concertar la programación, la logística y el desarrollo de las actividades en los sectores priorizados.

La supervisión hizo seguimiento a esta gestión de articulación, verificando el nivel de avance reportado por el contratista (60%) frente al total de instituciones y liderazgos comunitarios previstos para las cuatro comunas objeto del proyecto. Se revisó la coordinación adelantada con los líderes de las comunas Mar Caribe, Ciénaga Grande, San

Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte, como soporte para el desarrollo progresivo de las jornadas.

Se concluye que la actividad se encuentra en ejecución conforme al cronograma, con un avance del 60% coherente con la etapa actual del proyecto, quedando pendiente su culminación en las comunas donde las jornadas aún no han iniciado.

Actividad 5. Selección y caracterización de la población beneficiaria

De acuerdo con el informe del contratista, se inició el proceso de identificación, verificación de información y caracterización de los adolescentes beneficiarios, en coordinación con los líderes comunitarios de las comunas priorizadas.

La supervisión verificó el inicio de este proceso, constatando que se adelanta de manera mancomunada con los líderes de barrio y comuna, con el correspondiente proceso de verificación de datos, conforme a lo señalado por el contratista. Se realizó seguimiento al avance reportado (25%) frente a la meta de 500 adolescentes beneficiarios contemplados en el proyecto.

Se evidencia que esta actividad se encuentra en etapa inicial de ejecución (25%), lo cual resulta coherente con el hecho de que la selección de beneficiarios es un proceso continuo que se desarrolla de manera paralela a las jornadas de sensibilización en cada comuna.

Actividad 6. Desarrollo de intervenciones de orientación profesional y pedagógica

El contratista reportó el inicio de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica mediante espacios formativos dirigidos a la población adolescente, estructurados en las fases de Rompehielos y Autocuidado, Sexualidad Responsable y Mitos, y Diseño del Proyecto de Vida.

Frente a esta actividad, la supervisión realizó acompañamiento y seguimiento a la ejecución de las jornadas reportadas por el contratista como Actividad N° 1 y N° 3 a N° 13, desarrolladas entre el 02 y el 26 de junio de 2026 en las comunas Mar Caribe y Ciénaga Grande, cada una con una asistencia promedio de 15 adolescentes y una duración de 2 horas, bajo metodología participativa, vivencial y reflexiva. Se verificaron los listados de asistencia y los registros fotográficos correspondientes a cada jornada, así como la correspondencia de las temáticas desarrolladas con los contenidos pedagógicos diseñados para el proyecto.

Como resultado del seguimiento, se constató la ejecución de las intervenciones reportadas por el contratista, con un avance del 20% frente a la totalidad de jornadas programadas, sin observarse novedades frente a la metodología aprobada.

Actividad 7. Ejecución de jornadas de sensibilización en barrios priorizados

Según el informe del contratista, se dio inicio a las jornadas de sensibilización comunitaria

en los barrios priorizados, mediante actividades participativas de prevención, promoción y educación, apoyadas con material informativo.

La supervisión efectuó revisión de los soportes de ejecución de las jornadas comunitarias adelantadas durante el mes de junio, verificando el cumplimiento del cronograma de la "Ruta de Sensibilización 2026", que contempla una meta total de 50 sesiones. Se constató que, con corte al periodo informado, se ejecutaron 11 sesiones en la comuna Mar Caribe y se dio inicio a la fase de intervención en la comuna Ciénaga Grande, lo que corresponde a un porcentaje de ejecución acumulado del 25% frente a la meta total. Se verificaron los cronogramas de jornadas, las evidencias de convocatoria y el material divulgativo entregado a la comunidad.

Se concluye que la actividad avanza conforme a lo programado, con un cumplimiento del 20% para el componente específico de jornadas en barrios, dentro del marco general de ejecución del 25% acumulado del proyecto.

5.1 Porcentaje de ejecución del proyecto y acumulado

Con base en la revisión de los soportes técnicos aportados por el contratista y el seguimiento realizado por la supervisión a cada una de las actividades descritas en el numeral anterior, se verificó el siguiente estado de avance físico del proyecto con corte al periodo objeto del presente informe (01 de junio a 01 de julio de 2026):

Actividad	Estado de ejecución	Avance verificado
Planeación y organización del proyecto	Ejecutada	100%
Identificación de población e instituciones priorizadas	Ejecutada	100%
Diseño de contenidos y material pedagógico	Ejecutada	100%
Articulación con instituciones educativas y líderes comunitarios	En ejecución	60%
Selección y caracterización de beneficiarios	En ejecución	25%
Intervenciones de orientación profesional y pedagógica	Iniciada	20%
Jornadas de sensibilización en barrios	Iniciada	20%

priorizados		
Avance físico acumulado del proyecto	**En ejecución**	**25%**

Adicionalmente, frente a la meta de 50 sesiones de sensibilización previstas en la "Ruta de Sensibilización 2026", se verificó la ejecución de 11 sesiones en la comuna Mar Caribe durante el mes de junio, con inicio de la intervención en la comuna Ciénaga Grande, lo que arroja un porcentaje de ejecución acumulado del 25% al cierre del primer periodo de ejecución.

La supervisión constató que dicho porcentaje corresponde al cumplimiento de las actividades previstas para la etapa inicial del proyecto (planeación, organización, identificación y diseño de contenidos), quedando pendiente de ejecución el 75% restante, correspondiente principalmente a la ampliación de cobertura de las jornadas de sensibilización en las comunas de San Juan del Córdoba y Nuevo Horizonte, así como a la culminación del proceso de selección y caracterización de la totalidad de los beneficiarios.

Con fundamento en lo anterior, la supervisión concluye que el proyecto se desarrolla conforme a la programación establecida, sin evidenciarse atrasos frente al cronograma aprobado para el periodo, y con las condiciones técnicas, logísticas y operativas necesarias para dar continuidad a las siguientes fases de ejecución dentro del plazo contractual.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Actividad N° 1

- **Fecha:** 02/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva..**

Actividad N° 2

- **Fecha:** 04/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología: Participativa, vivencial y reflexiva.**

Actividad N° 3

- **Fecha:** 06/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).

- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 4

- **Fecha:** 08/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 5

- **Fecha:** 10/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 6

- **Fecha:** 12/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe

- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 7

- **Fecha:** 14/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 8

- **Fecha:** 16/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva.

Actividad N° 9

- **Fecha:** 18/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe

- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 10

- **Fecha:** 20/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 11

- **Fecha:** 22/06/26
- **Lugar:** Comuna Mar Caribe
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 12

- **Fecha:** 24/06/26
- **Lugar:** Comuna Ciénaga Grande

- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..

Actividad N° 13

- **Fecha:** 26/06/26
- **Lugar:** Comuna Ciénaga Grande
- **Tema:** Sensibilización sobre Proyecto de Vida y Sexualidad Responsable
- **Población Objetivo:** Adolescentes de la comunidad (edades entre 15 y 19 años).
- **Asistencia Promedio:** 15 adolescentes.
- **Duración:** 2 horas.
- **Metodología:** Participativa, vivencial y reflexiva..






BAÑOS
Totto


















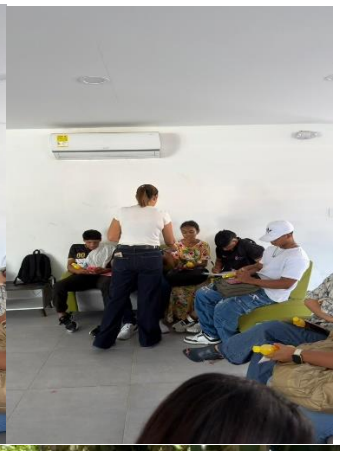
























7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Como resultado del seguimiento efectuado durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de junio de 2026**, esta supervisión realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, mediante la revisión de los informes de ejecución, los soportes técnicos, administrativos y financieros, los registros de asistencia, las evidencias fotográficas y demás documentos que respaldan el desarrollo de las actividades ejecutadas.

Del análisis realizado se evidenció que el contratista adelantó las actividades programadas para la etapa inicial del proyecto, correspondientes a la planeación y organización de la ejecución, la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas, el diseño del material pedagógico, la articulación con actores institucionales y comunitarios, la selección y caracterización de beneficiarios, el inicio de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica y la ejecución de las primeras jornadas de sensibilización en las comunas priorizadas, conforme al cronograma de trabajo establecido.

Durante el proceso de supervisión se constató que las actividades desarrolladas guardan correspondencia con el objeto contractual y con los lineamientos técnicos definidos para el proyecto, evidenciándose un avance físico acumulado del **25 %**, acorde con la programación prevista para el primer período de ejecución. Asimismo, se verificó que los soportes documentales presentados por el contratista respaldan las actividades ejecutadas y permiten evidenciar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período evaluado.

En consecuencia, esta supervisión conceptúa que, con corte al presente informe, el contratista **ha dado cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales verificadas durante el período reportado**, sin evidenciar incumplimientos que comprometan la continuidad de la ejecución del contrato. No obstante, se recomienda mantener el seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma, la actualización de los soportes técnicos y administrativos y la ejecución progresiva de las actividades programadas para los siguientes períodos, con el fin de garantizar el logro de las metas establecidas.

8. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se realizó la verificación de las garantías constituidas por el contratista para amparar la ejecución del Contrato No. **CP-PR-2026-040**, constatando que la **Póliza de Cumplimiento No. 85-40-101067692-0**, expedida por **Seguros del Estado S.A.**, se encuentra debidamente aprobada por la entidad contratante y ampara los riesgos exigidos en el contrato.

Durante el período objeto del presente informe, la supervisión verificó la vigencia de las garantías, su correspondencia con las condiciones contractuales y la permanencia de los amparos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, evidenciando que la póliza se encuentra vigente y no se presentaron modificaciones, siniestros, reclamaciones ni situaciones que afectaran su validez durante el período evaluado.

La información correspondiente a las garantías del contrato se presenta a continuación:

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No. PÓLIZA	**46-44-101014689**
FECHA EXPEDICIÓN	**11/05/2026**
FECHA APROBACIÓN	**19-05-2026**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento	**07/05/2026**	**07/01/2027**	**$137.196.000,00**
Calidad del servicio	**07/05/2026**	**07/09/2026**	**$137.196.000,00**
Buen manejo del anticipo	**07/05/2026**	**07/09/2026**	**$342.990.000,00**
Salarios y prestaciones sociales	**07/05/2026**	**07/09/2029**	**$68.598.000,00**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	**Seguros del Estado S.A.**
No. Póliza	**46-40-101007620**
Certificado No.	
Fecha Expedición	**11/05/2026**
Fecha Aprobación	**01/06/2026**
Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	**07/05/2026**
Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	**07/09/2026**
Valor	**$350.181.000,00**

9. RELACIÓN DE PAGOS

El día **14 y 20 de mayo de 2026**, se expidió el certificado relación de pagos generada por anticipo al Contrato Electrónico **CP-PR-2026-040**, correspondiente al proyecto denominado **"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA: PROYECTO DE VIDA Y SEXUALIDAD RESPONSABLE, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA"**, en el cual se relacionan los pagos efectuados, conforme se detalla a continuación:

No.	Número De Orden De Pago	No. De Factura	Fecha De Pago	Valor De Pago
1	**225421326**		**2026-05-14**	**$ 92.990.000**
2			**2026-05-20**	**$ 249.000.000**

10. ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	$685.980.000
Valor Total Pagado	$ 342.990.000
Valor Ejecutado	$ 171.490.684,77

11. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

En desarrollo de las funciones de supervisión, durante el período objeto del presente informe se realizó seguimiento a la ejecución de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, verificando su destinación en el desarrollo de las actividades contempladas dentro del objeto contractual.

La supervisión efectuó la revisión de la información financiera, los informes de ejecución y los soportes presentados por el contratista, evidenciando que los recursos del anticipo han sido destinados al desarrollo de las actividades correspondientes a la etapa inicial del proyecto, tales como la planeación y organización de la ejecución, la articulación institucional, la elaboración del material pedagógico, la selección y caracterización de beneficiarios y el inicio de las jornadas de sensibilización, de conformidad con la programación establecida para el período evaluado.

Con fundamento en la ejecución física y financiera verificada durante el período reportado, esta supervisión no evidenció situaciones que permitan inferir un uso diferente al previsto contractualmente para los recursos del anticipo. No obstante, el seguimiento a la amortización y legalización total del anticipo continuará realizándose durante los siguientes períodos de ejecución, conforme al avance del contrato y a la documentación que sea presentada por el contratista.

11.1 Estado del anticipo

Concepto	**Información**
Valor del contrato	$ 586.675.737,00
Porcentaje de anticipo	50%
Valor del anticipo	$ 293.337.868,50
Estado	En ejecución
Seguimiento de la supervisión	Se realizó seguimiento a la inversión del anticipo mediante la revisión de los informes de ejecución y los soportes técnicos, administrativos y financieros presentados por el contratista.

12. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo, financiero y documental realizado durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de junio de 2026**, esta supervisión verificó que el contratista adelantó las actividades correspondientes a la etapa inicial del proyecto, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas para el período evaluado y la ejecución de las actividades conforme al cronograma aprobado.

Durante el proceso de supervisión se constató la ejecución de las actividades relacionadas con la planeación y organización del proyecto, la identificación de la población objetivo e instituciones priorizadas, el diseño y elaboración del material pedagógico, la articulación con actores institucionales y comunitarios, la selección y caracterización de beneficiarios, así como el inicio de las intervenciones de orientación profesional y pedagógica y de las jornadas de sensibilización dirigidas a la población adolescente del municipio de Ciénaga. La revisión de los informes de ejecución, registros de asistencia, evidencias fotográficas, cronogramas y demás soportes documentales permitió verificar la correspondencia entre las actividades ejecutadas y el objeto contractual.

Asimismo, la supervisión verificó la vigencia de las garantías constituidas por el contratista, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y la información financiera correspondiente al contrato, efectuando seguimiento a la ejecución de los recursos y a la utilización del anticipo con base en la documentación presentada durante el período objeto del presente informe.

Con fundamento en la información revisada y en las verificaciones realizadas, se evidenció un **avance físico acumulado del 25 %**, correspondiente a la ejecución de las actividades programadas para el primer mes del contrato, porcentaje que guarda correspondencia con el cronograma de ejecución y las metas establecidas para esta etapa del proyecto.

En consecuencia, esta supervisión conceptúa que, con corte al presente informe, la ejecución contractual se desarrolla de manera satisfactoria y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato, recomendando dar continuidad a la ejecución del proyecto y mantener el seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma, la ejecución de las metas programadas y la presentación oportuna de los soportes técnicos, administrativos y financieros que respalden el desarrollo de las actividades.

Finalmente, se deja constancia de que la información contenida en el presente informe corresponde a las verificaciones realizadas por la supervisión durante el período evaluado y se encuentra soportada en la documentación técnica, administrativa, financiera y demás evidencias presentadas por el contratista para el desarrollo del proyecto.

Cordialmente;



HERNANDO JAVIER ALVAREZ BRACHO
C.C. No. 1.004.375.537
Cargo
Apoyo a la Supervisión
