

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
0	Cronograma	629 días	mié 3/12/25	lun 23/08/27	19%
1	Reunión de Inicio de Contrato	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	100%
2	Adjudicación y Firma de polizas	0 días	mar 23/12/25	mar 23/12/25	100%
3	Entrega Documentación Primer Pago	1 día	mar 23/12/25	mar 23/12/25	100%
4	**PAGO ANTICIPO**	**15 días**	**mié 24/12/25**	**mié 7/01/26**	**100%**
5	**Toma de información y procesamiento proyecto "REALIZAR EL**	**629 días**	**mié 3/12/25**	**lun 23/08/27**	**19%**
6	Elaboracion del Documento 1 - Plan de Implemetación del Pr	18 días	jue 8/01/26	lun 2/02/26	100%
7	**VUELOS**	**169 días**	**mar 23/12/25**	**mar 9/06/26**	**79%**
8	Solicitud permisos de vuelo a la FAC	4 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25	100%
9	Preparación de equipos y desplazamiento a la zona de trab	16 días	mar 3/02/26	mar 24/02/26	100%
10	Instalación y calibración de equipos	9 días	mié 25/02/26	lun 9/03/26	100%
11	Traslado de aeronave hasta la zona de proyecto	0 días	lun 9/03/26	lun 9/03/26	100%
12	Reconocimiento de Red Tercer Orden Río Cauca	18 días	mié 25/02/26	vie 20/03/26	100%
13	Establecimiento de bases de vuelo (Red Tercer Orden)	30 días	lun 23/03/26	vie 1/05/26	100%
14	Red de Cuarto Orden Primaria (Construccion y Posicionami	27 días	mar 14/04/26	dom 10/05/26	74%
15	Red de Cuarto Orden Primaria (Cálculo y Entrega)	15 días	lun 11/05/26	lun 25/05/26	0%
16	**PAGO 1**	**15 días**	**mar 26/05/26**	**mar 9/06/26**	**0%**
17	Vuelo LiDAR Avion	10 días	lun 9/03/26	vie 20/03/26	92%
18	Siniestro Aeronave	0 días	vie 20/03/26	vie 20/03/26	100%
19	Evaluación, instalación y calibración de equipos despues de	21 días	sáb 21/03/26	vie 10/04/26	100%
20	Segunda Etapa de Vuelo LiDAR Helicopetro	30 días	sáb 11/04/26	dom 10/05/26	92%
21	**GEORREFERENCIACION**	**190 días**	**lun 23/03/26**	**lun 28/09/26**	**24%**
22	Preparación de equipos y desplazamiento a la zona de trab	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	100%
23	**BLOQUE 1**	**85 días**	**lun 23/03/26**	**lun 15/06/26**	**25%**
24	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	0%
25	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	dom 17/05/26	dom 31/05/26	0%
26	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	56 días	lun 23/03/26	dom 17/05/26	50%
27	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	lun 18/05/26	lun 1/06/26	0%
28	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 1/06/26	vie 12/06/26	0%
29	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	mar 2/06/26	lun 15/06/26	0%
30	**BLOQUE 2**	**88 días**	**lun 23/03/26**	**jue 18/06/26**	**27%**
31	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	2 días	lun 18/05/26	mar 19/05/26	0%
32	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	mié 20/05/26	mié 3/06/26	0%

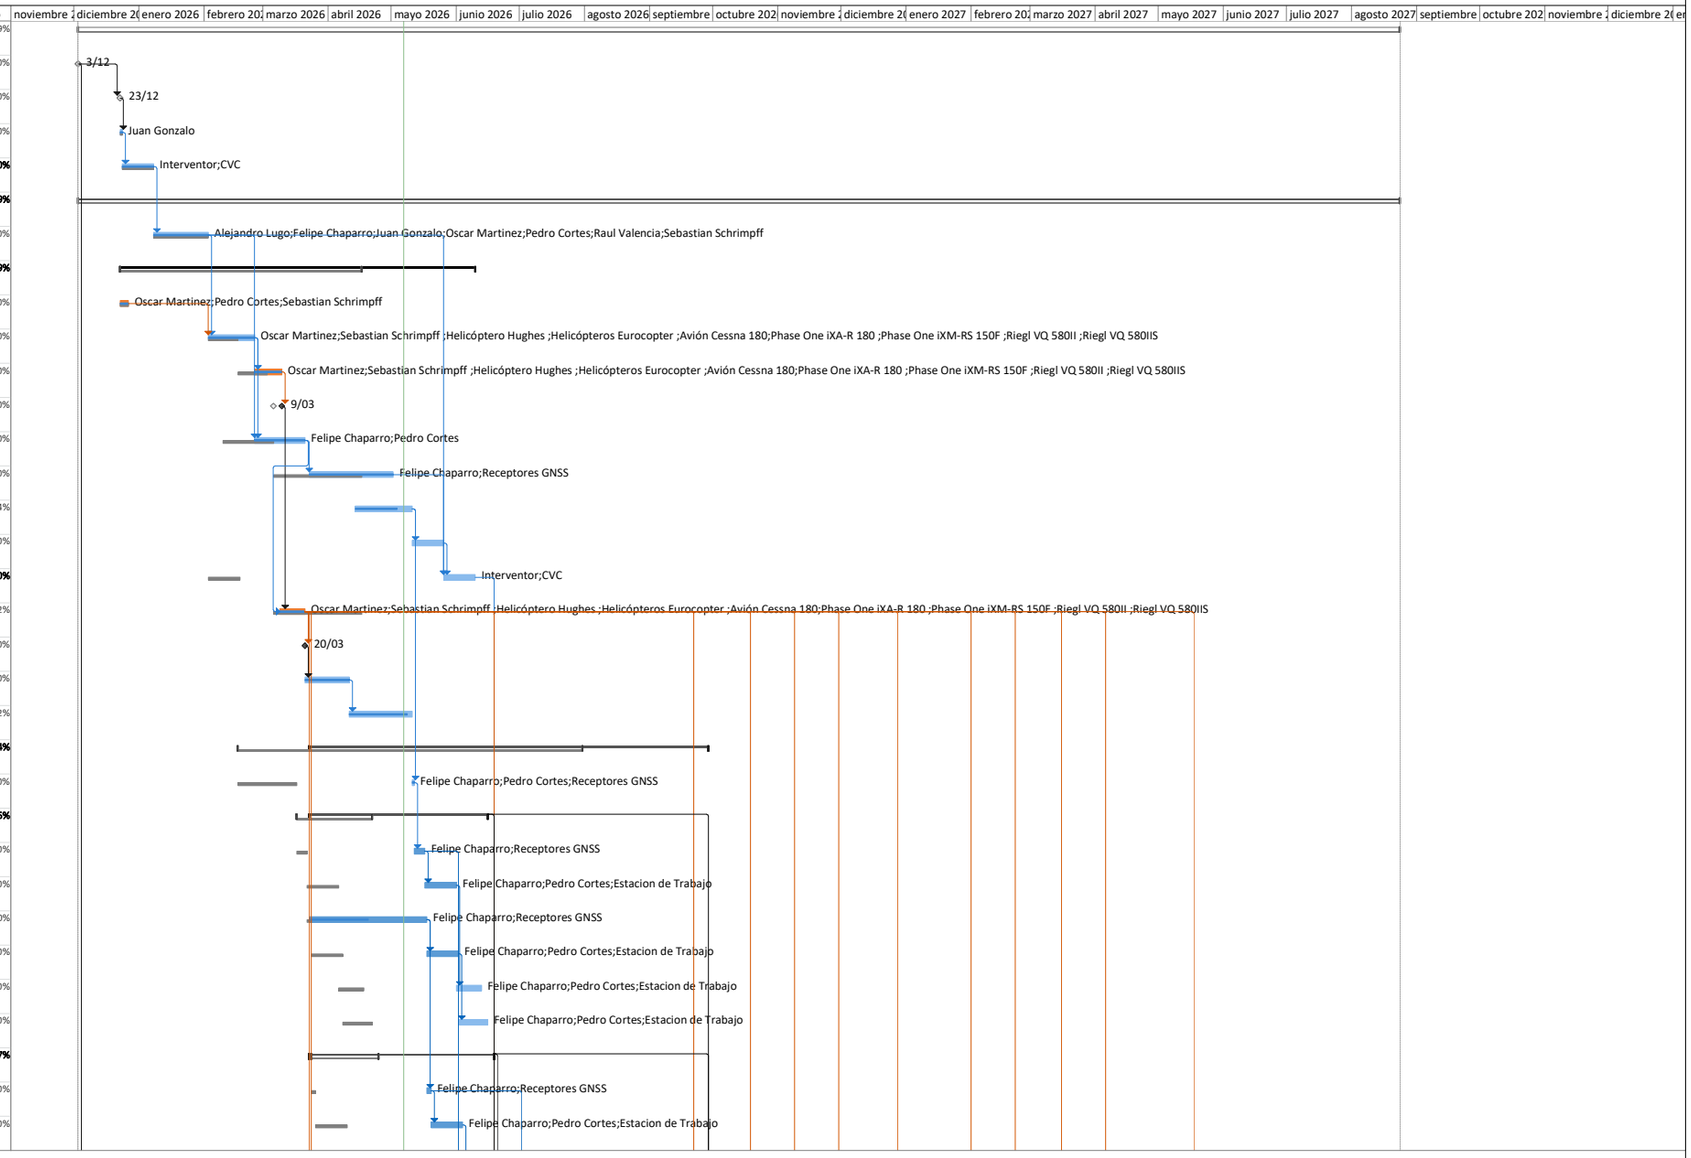

-CVC-
Fecha: jue 7/05/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
33	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	59 días	lun 23/03/26	mié 20/05/26	50%
34	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	jue 21/05/26	jue 4/06/26	0%
35	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	jue 4/06/26	mié 17/06/26	0%
36	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	vie 5/06/26	jue 18/06/26	0%
37	**PAGO 2**	**10 días**	**vie 19/06/26**	**dom 28/06/26**	**0%**
38	**BLOQUE 3**	**92 días**	**lun 23/03/26**	**lun 22/06/26**	**27%**
39	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	4 días	jue 21/05/26	dom 24/05/26	0%
40	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	lun 25/05/26	lun 8/06/26	0%
41	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	62 días	lun 23/03/26	sáb 23/05/26	50%
42	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	dom 24/05/26	dom 7/06/26	0%
43	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	mar 9/06/26	lun 22/06/26	0%
44	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	lun 8/06/26	vie 19/06/26	0%
45	**BLOQUE 4**	**96 días**	**lun 23/03/26**	**vie 26/06/26**	**27%**
46	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	5 días	dom 24/05/26	jue 28/05/26	0%
47	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	vie 29/05/26	vie 12/06/26	0%
48	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	65 días	lun 23/03/26	mar 26/05/26	50%
49	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	mié 27/05/26	mié 10/06/26	0%
50	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 15/06/26	vie 26/06/26	0%
51	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	jue 11/06/26	mié 24/06/26	0%
52	**BLOQUE 5**	**103 días**	**lun 23/03/26**	**vie 3/07/26**	**27%**
53	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	10 días	mié 27/05/26	vie 5/06/26	0%
54	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	sáb 6/06/26	sáb 20/06/26	0%
55	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	68 días	lun 23/03/26	vie 29/05/26	50%
56	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	sáb 30/05/26	sáb 13/06/26	0%
57	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 22/06/26	vie 3/07/26	0%
58	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	lun 15/06/26	vie 26/06/26	0%
59	**BLOQUE 6**	**103 días**	**lun 23/03/26**	**vie 3/07/26**	**28%**
60	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	8 días	sáb 30/05/26	sáb 6/06/26	0%
61	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	dom 7/06/26	dom 21/06/26	0%
62	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	71 días	lun 23/03/26	lun 1/06/26	50%
63	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	mar 2/06/26	mar 16/06/26	0%
64	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 22/06/26	vie 3/07/26	0%
65	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	mié 17/06/26	mar 30/06/26	0%

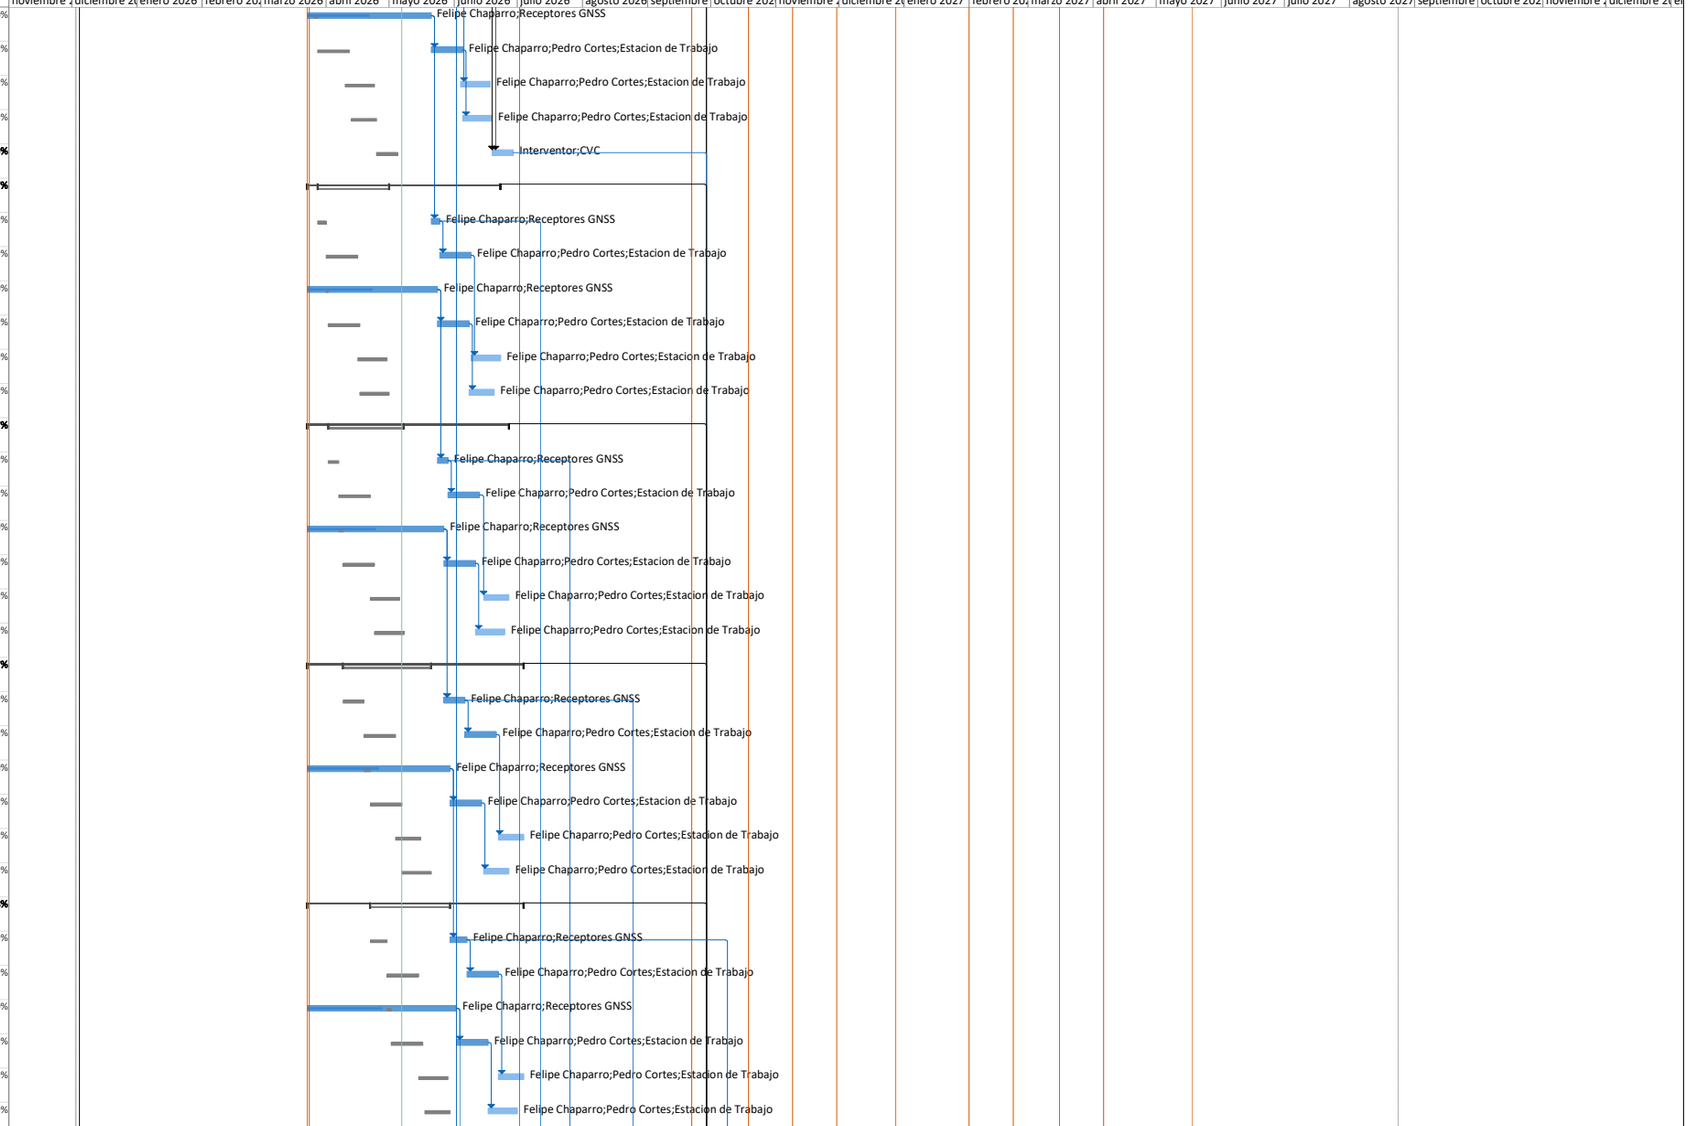

-CVC-
Fecha: jue 7/05/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | Hito de línea base | Progreso
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Línea base | Resumen de línea base | Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
66	**BLOQUE 7**	**110 días**	**lun 23/03/26**	**vie 10/07/26**	**28%**
67	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	10 días	mar 2/06/26	jue 11/06/26	0%
68	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	vie 12/06/26	vie 26/06/26	0%
69	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	74 días	lun 23/03/26	jue 4/06/26	50%
70	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	vie 5/06/26	vie 19/06/26	0%
71	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 29/06/26	vie 10/07/26	0%
72	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	lun 22/06/26	vie 3/07/26	0%
73	**BLOQUE 8**	**115 días**	**lun 23/03/26**	**mié 15/07/26**	**28%**
74	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	12 días	vie 5/06/26	mar 16/06/26	0%
75	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	mié 17/06/26	mié 1/07/26	0%
76	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	77 días	lun 23/03/26	dom 7/06/26	50%
77	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	lun 8/06/26	lun 22/06/26	0%
78	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	jue 2/07/26	mié 15/07/26	0%
79	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	mar 23/06/26	lun 6/07/26	0%
80	**BLOQUE 9**	**159 días**	**lun 23/03/26**	**vie 28/08/26**	**17%**
81	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	54 días	lun 8/06/26	vie 31/07/26	0%
82	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	sáb 1/08/26	sáb 15/08/26	0%
83	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	131 días	lun 23/03/26	vie 31/07/26	31%
84	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	sáb 1/08/26	sáb 15/08/26	0%
85	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	lun 17/08/26	vie 28/08/26	0%
86	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	lun 17/08/26	vie 28/08/26	0%
87	**BLOQUE 10**	**190 días**	**lun 23/03/26**	**lun 28/09/26**	**17%**
88	Posicionamiento de Red Geodesica de Orden Cuatro Aux	30 días	sáb 1/08/26	dom 30/08/26	0%
89	Calculo de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	15 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	0%
90	Posicionamiento de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	161 días	lun 23/03/26	dom 30/08/26	26%
91	Calculo de los puntos de Fotocontrol y Chequeo	15 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	0%
92	Entrega de la Red Geodesica de Orden Cuatro Auxiliar	10 días	mar 15/09/26	lun 28/09/26	0%
93	Entrega de Puntos de Fotocontrol y Chequeo	10 días	mar 15/09/26	lun 28/09/26	0%
94	**PAGO 3**	**10 días**	**mar 29/09/26**	**jue 8/10/26**	**0%**
95	**BATIMETRIA**	**379 días**	**mié 3/12/25**	**lun 17/05/27**	**1%**
96	Preparación de equipos y desplazamiento a la zona de trab	129 días	mié 3/12/25	lun 1/06/26	6%
97	**BLOQUE 1**	**49 días**	**mar 2/06/26**	**lun 20/07/26**	**0%**
98	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	20 días	mar 2/06/26	dom 21/06/26	0%

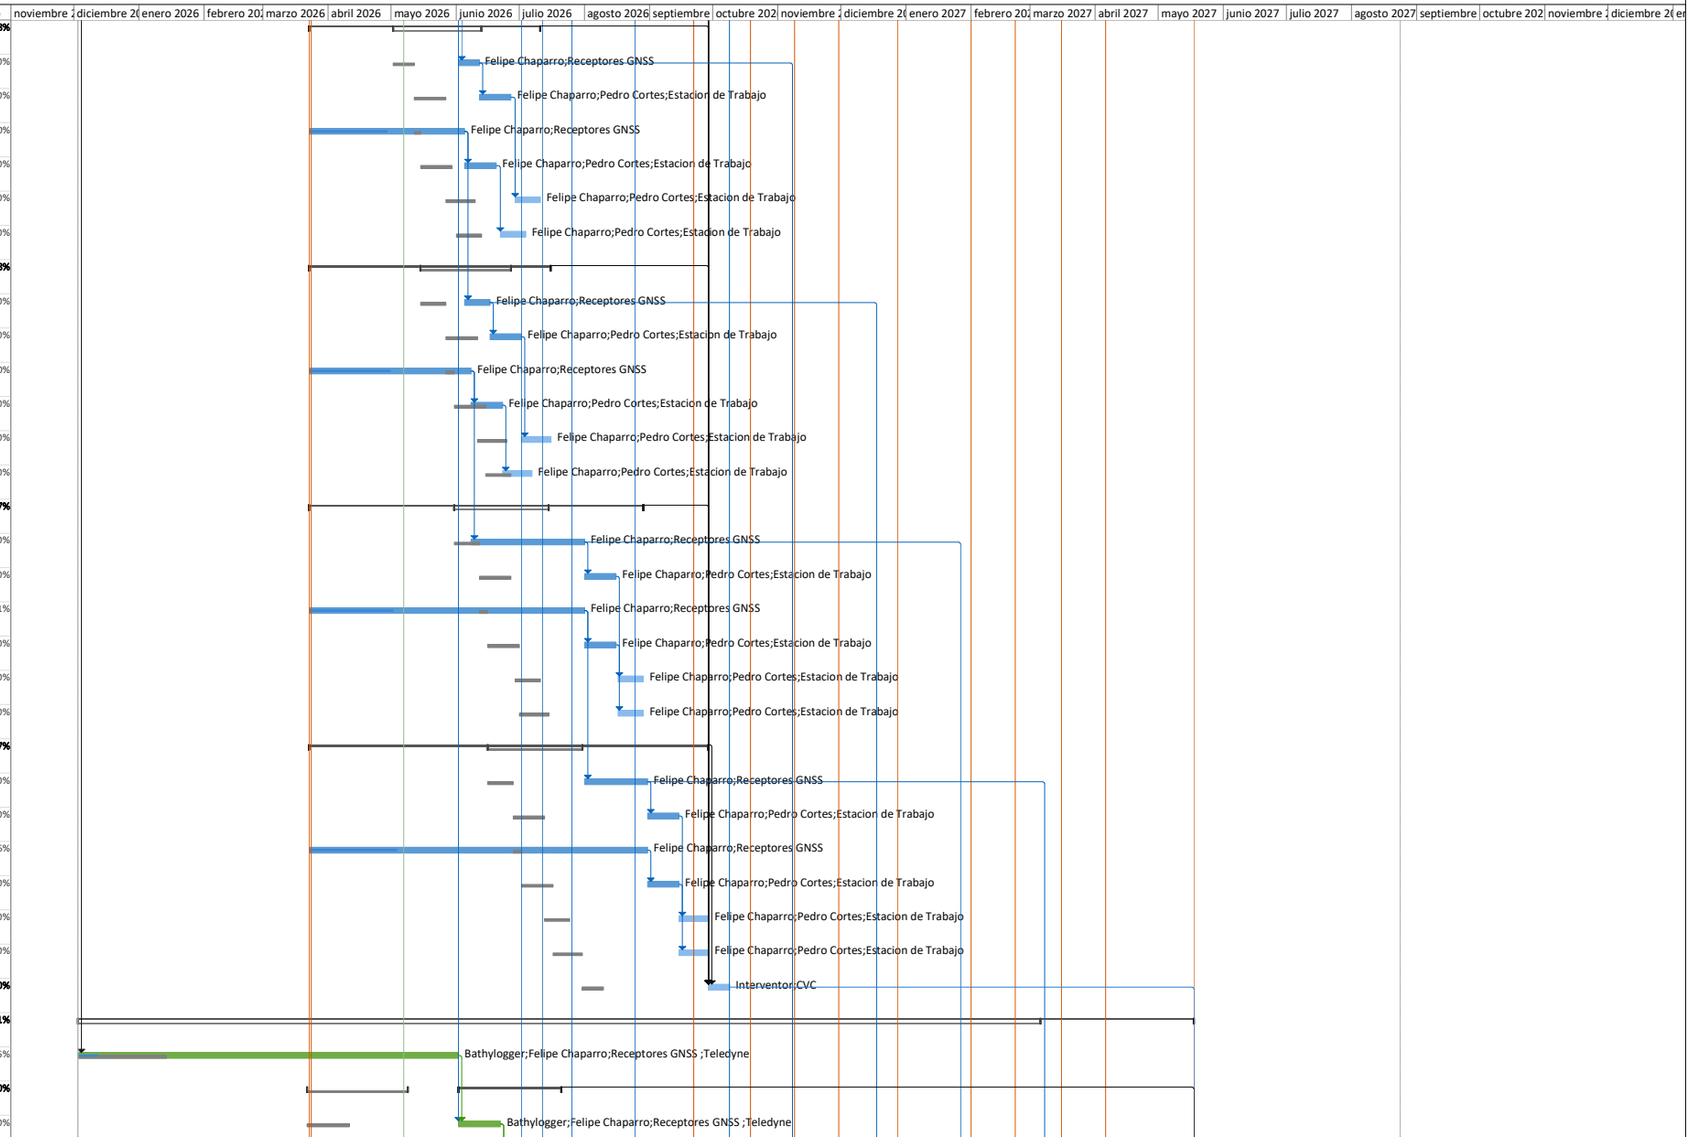


-CVC-
Fecha: jue 7/05/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
99	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	lun 22/06/26	vie 26/06/26	0%
100	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	lun 22/06/26	mié 1/07/26	0%
101	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	jue 2/07/26	lun 6/07/26	0%
102	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	7 días	lun 29/06/26	mar 7/07/26	0%
103	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	10 días	mar 7/07/26	lun 20/07/26	0%
104	**BLOQUE 2**	**27 días**	**jue 2/07/26**	**mar 28/07/26**	**0%**
105	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	jue 2/07/26	lun 6/07/26	0%
106	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	mar 7/07/26	sáb 11/07/26	0%
107	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	5 días	mar 7/07/26	sáb 11/07/26	0%
108	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	dom 12/07/26	jue 16/07/26	0%
109	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	11 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	0%
110	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	8 días	vie 17/07/26	mar 28/07/26	0%
111	**BLOQUE 3**	**31 días**	**dom 12/07/26**	**mar 11/08/26**	**0%**
112	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	7 días	dom 12/07/26	sáb 18/07/26	0%
113	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	dom 19/07/26	jue 23/07/26	0%
114	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	7 días	dom 19/07/26	sáb 25/07/26	0%
115	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	dom 26/07/26	jue 30/07/26	0%
116	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	8 días	vie 24/07/26	mar 4/08/26	0%
117	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	8 días	vie 31/07/26	mar 11/08/26	0%
118	**BLOQUE 4**	**51 días**	**dom 26/07/26**	**lun 14/09/26**	**0%**
119	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	20 días	dom 26/07/26	vie 14/08/26	0%
120	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	0%
121	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	sáb 15/08/26	lun 24/08/26	0%
122	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	mar 25/08/26	sáb 29/08/26	0%
123	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	9 días	jue 20/08/26	mar 1/09/26	0%
124	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	11 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	0%
125	**BLOQUE 5**	**64 días**	**mar 25/08/26**	**mar 27/10/26**	**0%**
126	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	30 días	mar 25/08/26	mié 23/09/26	0%
127	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	jue 24/09/26	lun 28/09/26	0%
128	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	15 días	jue 24/09/26	jue 8/10/26	0%
129	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26	0%
130	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	10 días	mar 29/09/26	lun 12/10/26	0%
131	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	10 días	mié 14/10/26	mar 27/10/26	0%

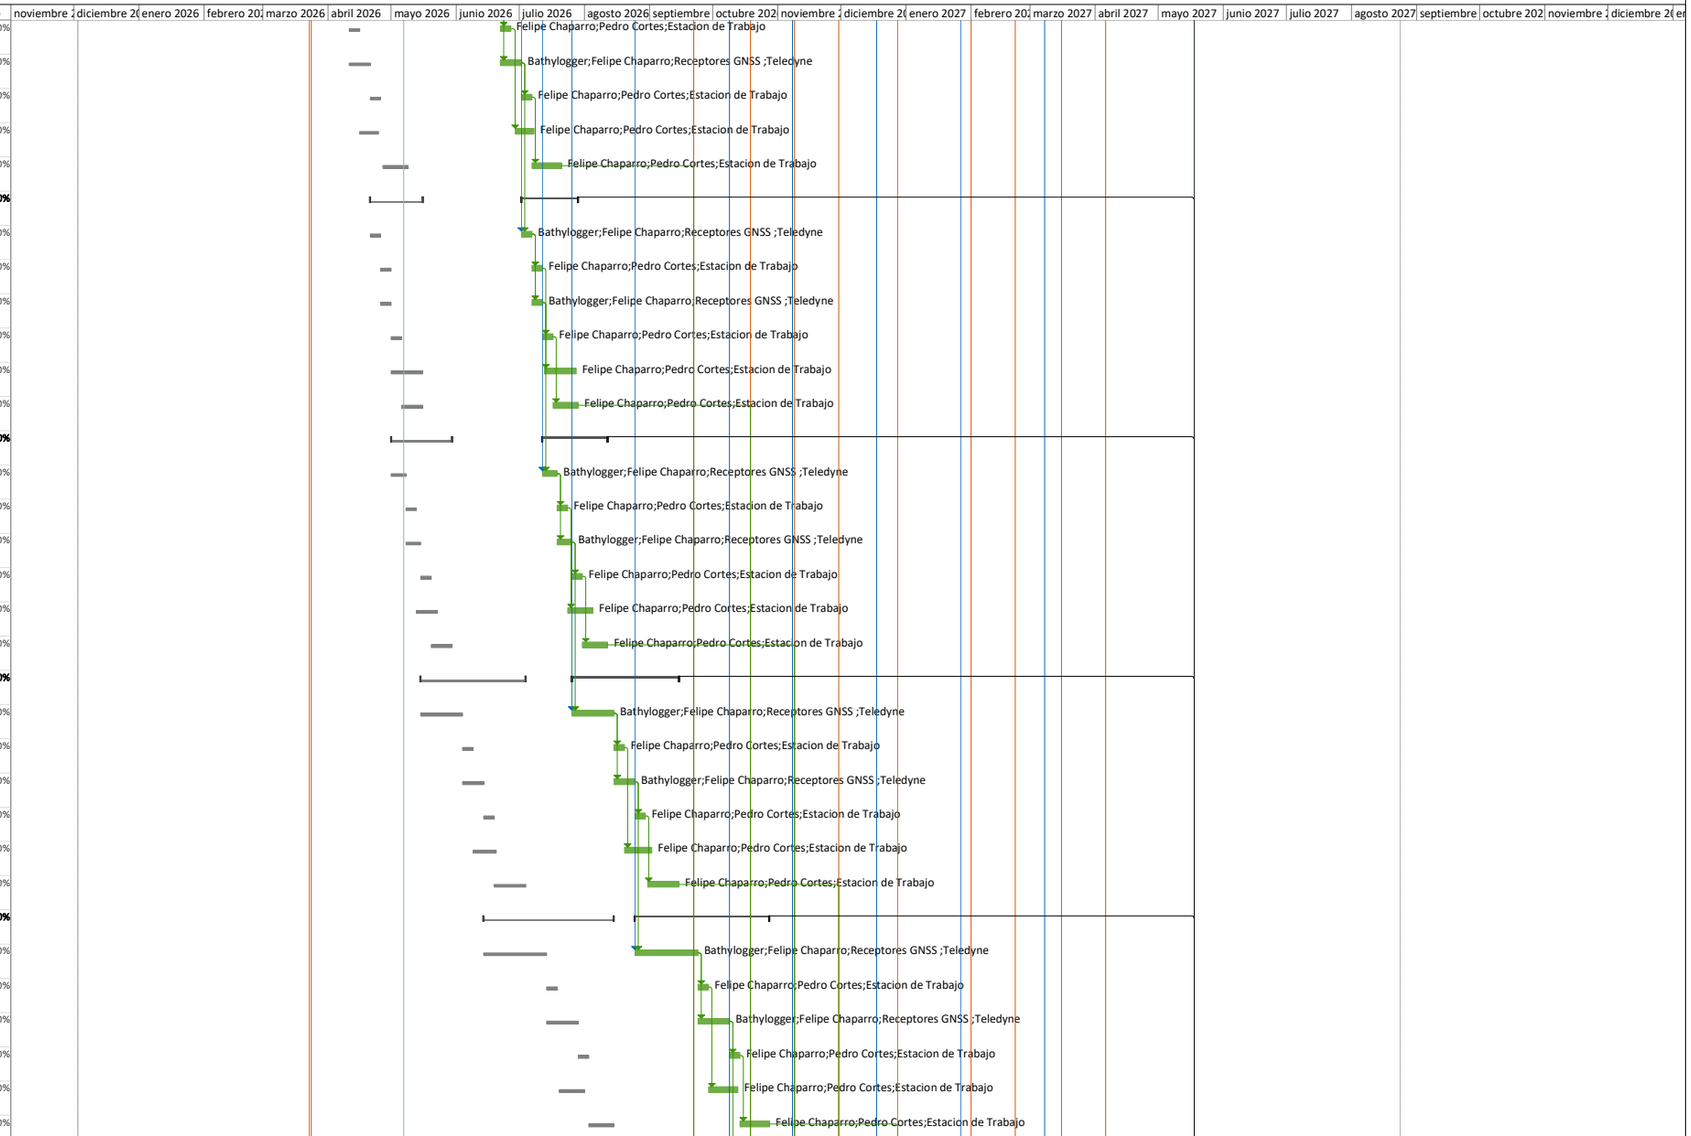


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
132	**BLOQUE 6**	**47 días**	**vie 9/10/26**	**mar 24/11/26**	**0%**
133	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	20 días	vie 9/10/26	mié 28/10/26	0%
134	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	jue 29/10/26	lun 2/11/26	0%
135	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	jue 29/10/26	sáb 7/11/26	0%
136	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	5 días	dom 8/11/26	jue 12/11/26	0%
137	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	10 días	mar 3/11/26	lun 16/11/26	0%
138	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	8 días	vie 13/11/26	mar 24/11/26	0%
139	**BLOQUE 7**	**67 días**	**dom 8/11/26**	**mié 13/01/27**	**0%**
140	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	30 días	dom 8/11/26	lun 7/12/26	0%
141	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	mar 8/12/26	sáb 12/12/26	0%
142	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	0%
143	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	15 días	vie 18/12/26	vie 1/01/27	0%
144	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	11 días	lun 14/12/26	lun 28/12/26	0%
145	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	8 días	lun 4/01/27	mié 13/01/27	0%
146	**BLOQUE 8**	**68 días**	**vie 18/12/26**	**mar 23/02/27**	**0%**
147	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	30 días	vie 18/12/26	sáb 16/01/27	0%
148	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	dom 17/01/27	jue 21/01/27	0%
149	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	dom 17/01/27	mar 26/01/27	0%
150	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	15 días	mié 27/01/27	mié 10/02/27	0%
151	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	8 días	vie 22/01/27	mar 2/02/27	0%
152	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	9 días	jue 11/02/27	mar 23/02/27	0%
153	**BLOQUE 9**	**69 días**	**mié 27/01/27**	**lun 5/04/27**	**0%**
154	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	30 días	mié 27/01/27	jue 25/02/27	0%
155	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	vie 26/02/27	mar 2/03/27	0%
156	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	vie 26/02/27	dom 7/03/27	0%
157	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	15 días	lun 8/03/27	lun 22/03/27	0%
158	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	15 días	mié 3/03/27	mar 23/03/27	0%
159	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	10 días	mar 23/03/27	lun 5/04/27	0%
160	**BLOQUE 10**	**71 días**	**lun 8/03/27**	**lun 17/05/27**	**0%**
161	Levantamiento de Secciones Transversales Batimetricas	30 días	lun 8/03/27	mar 6/04/27	0%
162	Calculo de Secciones Transversales Batimetricas	5 días	mié 7/04/27	dom 11/04/27	0%
163	Levantamiento de batimetria mediante ecosonda o vade	10 días	mié 7/04/27	vie 16/04/27	0%
164	Calculo de batimetria mediante ecosonda o vadeo	15 días	sáb 17/04/27	sáb 1/05/27	0%

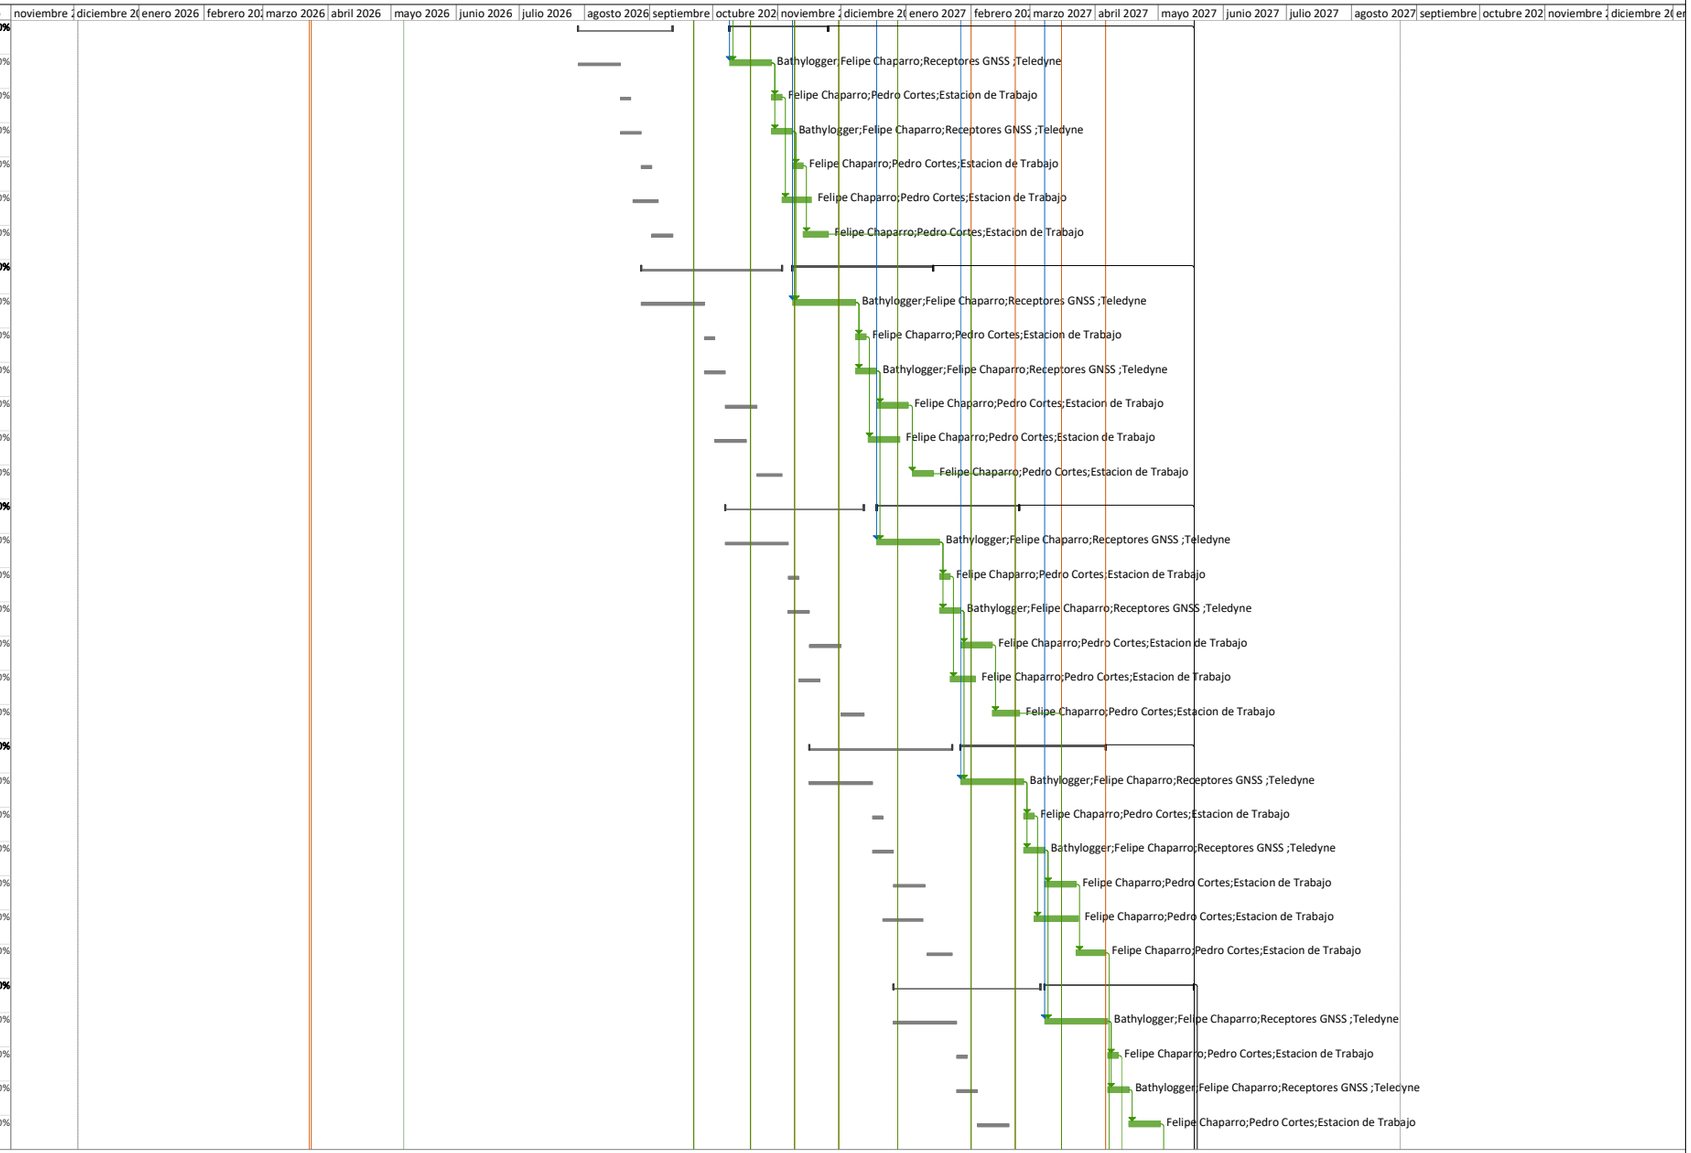


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
165	Entrega de Secciones Transversales Batimétricas	10 días	lun 12/04/27	vie 23/04/27	0%
166	Entrega de de batimetria mediante ecosonda o vadeo	11 días	lun 3/05/27	lun 17/05/27	0%
167	**PROCESAMIENTO LIDAR Y FOTOGRAMETRICO**	**519 días**	**lun 23/03/26**	**lun 23/08/27**	**10%**
168	Procesamiento GNSS/INS	55 días	mar 24/03/26	lun 8/06/26	82%
169	Procesado y transformación de imágenes crudas	56 días	lun 23/03/26	lun 8/06/26	60%
170	Generación de nube de puntos	40 días	mar 9/06/26	lun 3/08/26	0%
171	Corrección de trayectorias	15 días	mar 4/08/26	lun 24/08/26	0%
172	Bloques de nube de puntos	15 días	mar 25/08/26	lun 14/09/26	0%
173	**BLOQUE 1**	**79 días**	**mar 15/09/26**	**mié 2/12/26**	**0%**
174	Clasificación de nube de puntos	5 días	mar 15/09/26	lun 21/09/26	0%
175	Generación de Ortofoto RGB	19 días	mar 22/09/26	vie 16/10/26	0%
176	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	24 días	lun 19/10/26	jue 19/11/26	0%
177	Generación de TIN para Hidráulica	3 días	vie 20/11/26	mar 24/11/26	0%
178	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	mié 25/11/26	jue 26/11/26	0%
179	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	vie 27/11/26	lun 30/11/26	0%
180	Entrega de productos finales	2 días	mar 1/12/26	mié 2/12/26	0%
181	**BLOQUE 2**	**85 días**	**mar 22/09/26**	**mar 15/12/26**	**0%**
182	Clasificación de nube de puntos	4 días	mar 22/09/26	vie 25/09/26	0%
183	Generación de Ortofoto RGB	15 días	lun 19/10/26	vie 6/11/26	0%
184	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	6 días	vie 20/11/26	vie 27/11/26	0%
185	Generación de TIN para Hidráulica	3 días	lun 30/11/26	mié 2/12/26	0%
186	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	jue 3/12/26	vie 4/12/26	0%
187	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	5 días	lun 7/12/26	vie 11/12/26	0%
188	Entrega de productos finales	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26	0%
189	**BLOQUE 3**	**100 días**	**lun 28/09/26**	**mar 5/01/27**	**0%**
190	Clasificación de nube de puntos	4 días	lun 28/09/26	jue 1/10/26	0%
191	Generación de Ortofoto RGB	15 días	lun 9/11/26	vie 27/11/26	0%
192	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	15 días	lun 30/11/26	vie 18/12/26	0%
193	Generación de TIN para Hidráulica	3 días	lun 21/12/26	mié 23/12/26	0%
194	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	jue 24/12/26	vie 25/12/26	0%
195	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	5 días	lun 28/12/26	vie 1/01/27	0%
196	Entrega de productos finales	2 días	lun 4/01/27	mar 5/01/27	0%
197	**BLOQUE 4**	**131 días**	**vie 2/10/26**	**mar 9/02/27**	**0%**

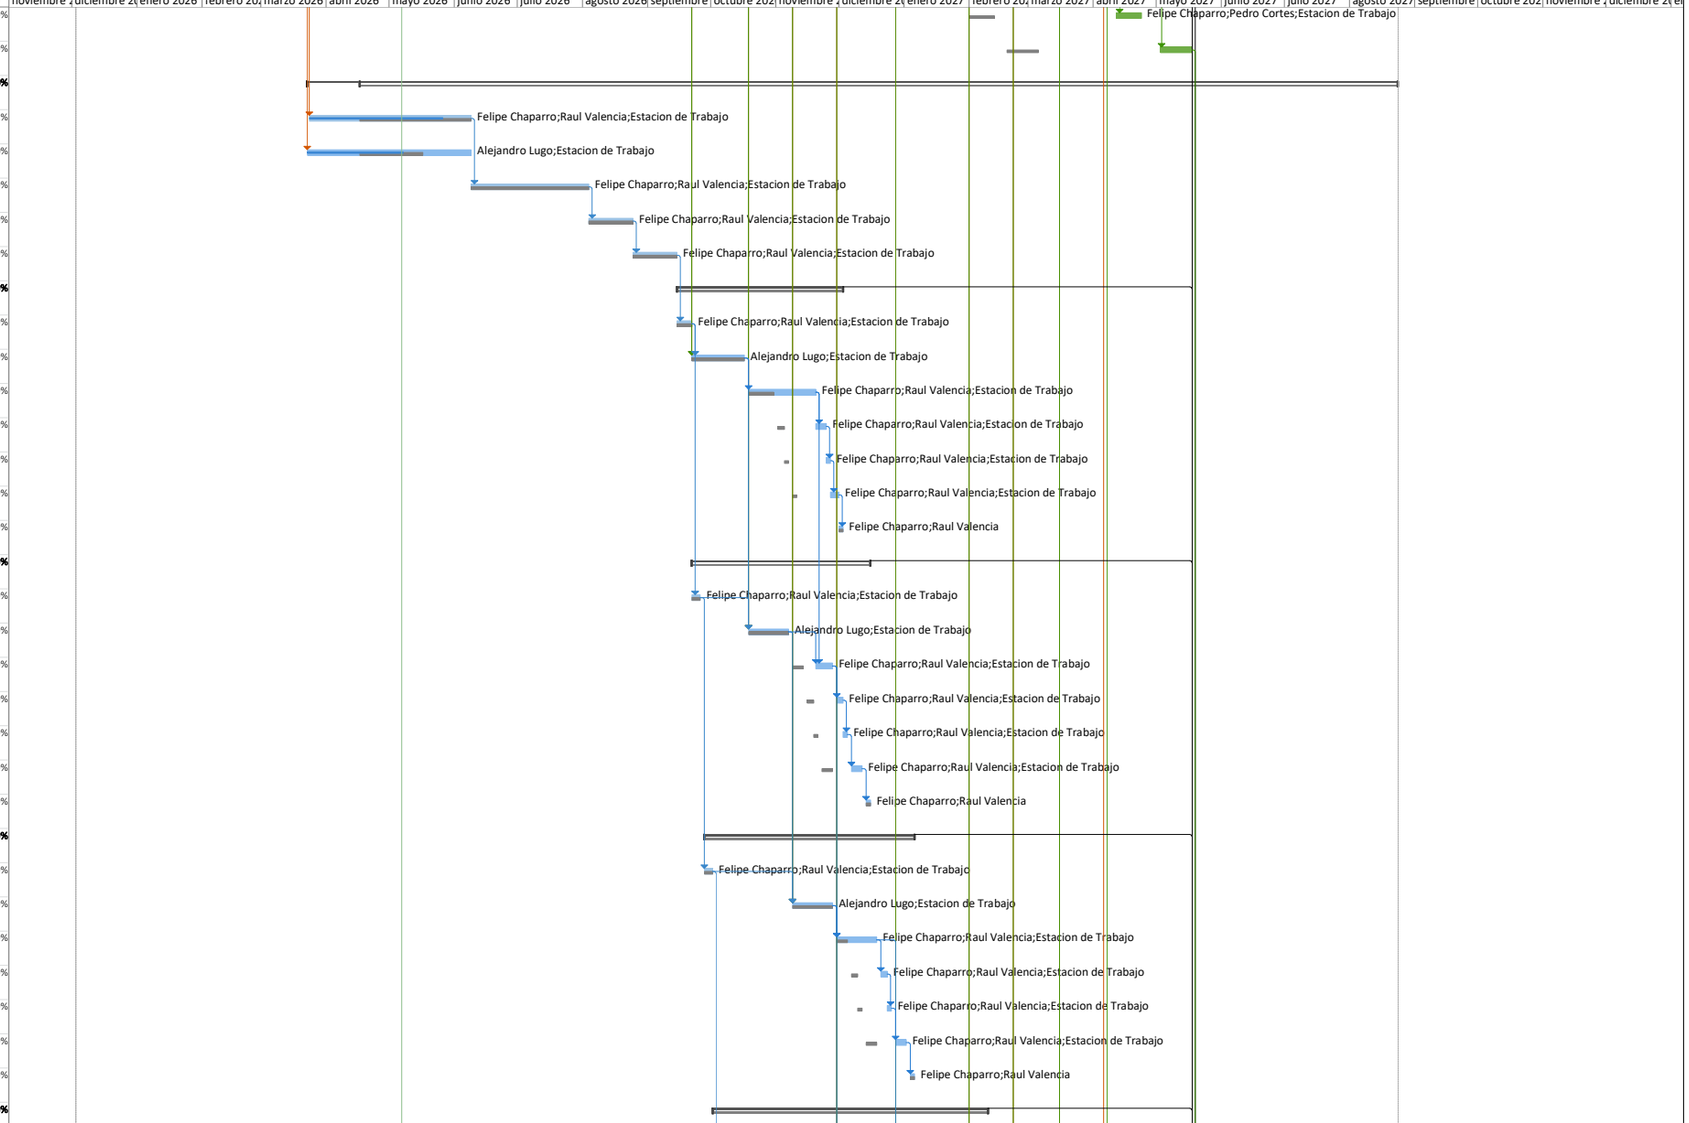

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
198	Clasificación de nube de puntos	6 días	vie 2/10/26	vie 9/10/26	0%
199	Generación de Ortofoto RGB	20 días	lun 30/11/26	vie 25/12/26	0%
200	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	22 días	lun 28/12/26	mar 26/01/27	0%
201	Generación de TIN para Hidráulica	3 días	mié 27/01/27	vie 29/01/27	0%
202	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	lun 1/02/27	mar 2/02/27	0%
203	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	3 días	mié 3/02/27	vie 5/02/27	0%
204	Entrega de productos finales	2 días	lun 8/02/27	mar 9/02/27	0%
205	**BLOQUE 5**	**170 días**	**lun 12/10/26**	**mar 30/03/27**	**0%**
206	Clasificación de nube de puntos	13 días	lun 12/10/26	mié 28/10/26	0%
207	Generación de Ortofoto RGB	25 días	lun 28/12/26	vie 29/01/27	0%
208	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	29 días	lun 1/02/27	jue 11/03/27	0%
209	Generación de TIN para Hidráulica	7 días	vie 12/03/27	lun 22/03/27	0%
210	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	mar 23/03/27	mié 24/03/27	0%
211	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	jue 25/03/27	vie 26/03/27	0%
212	Entrega de productos finales	2 días	lun 29/03/27	mar 30/03/27	0%
213	**BLOQUE 6**	**174 días**	**jue 29/10/26**	**mar 20/04/27**	**0%**
214	Clasificación de nube de puntos	7 días	jue 29/10/26	vie 6/11/26	0%
215	Generación de Ortofoto RGB	15 días	lun 1/02/27	vie 19/02/27	0%
216	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	18 días	vie 12/03/27	mar 6/04/27	0%
217	Generación de TIN para Hidráulica	4 días	mié 7/04/27	lun 12/04/27	0%
218	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	mar 13/04/27	mié 14/04/27	0%
219	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	jue 15/04/27	vie 16/04/27	0%
220	Entrega de productos finales	2 días	lun 19/04/27	mar 20/04/27	0%
221	**BLOQUE 7**	**184 días**	**lun 9/11/26**	**mar 11/05/27**	**0%**
222	Clasificación de nube de puntos	10 días	lun 9/11/26	vie 20/11/26	0%
223	Generación de Ortofoto RGB	16 días	lun 22/02/27	lun 15/03/27	0%
224	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	14 días	mié 7/04/27	lun 26/04/27	0%
225	Generación de TIN para Hidráulica	5 días	mar 27/04/27	lun 3/05/27	0%
226	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	mar 4/05/27	mié 5/05/27	0%
227	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	jue 6/05/27	vie 7/05/27	0%
228	Entrega de productos finales	2 días	lun 10/05/27	mar 11/05/27	0%
229	**PAGO 4**	**10 días**	**mar 18/05/27**	**jue 27/05/27**	**0%**
230	**BLOQUE 8**	**194 días**	**lun 23/11/26**	**vie 4/06/27**	**0%**

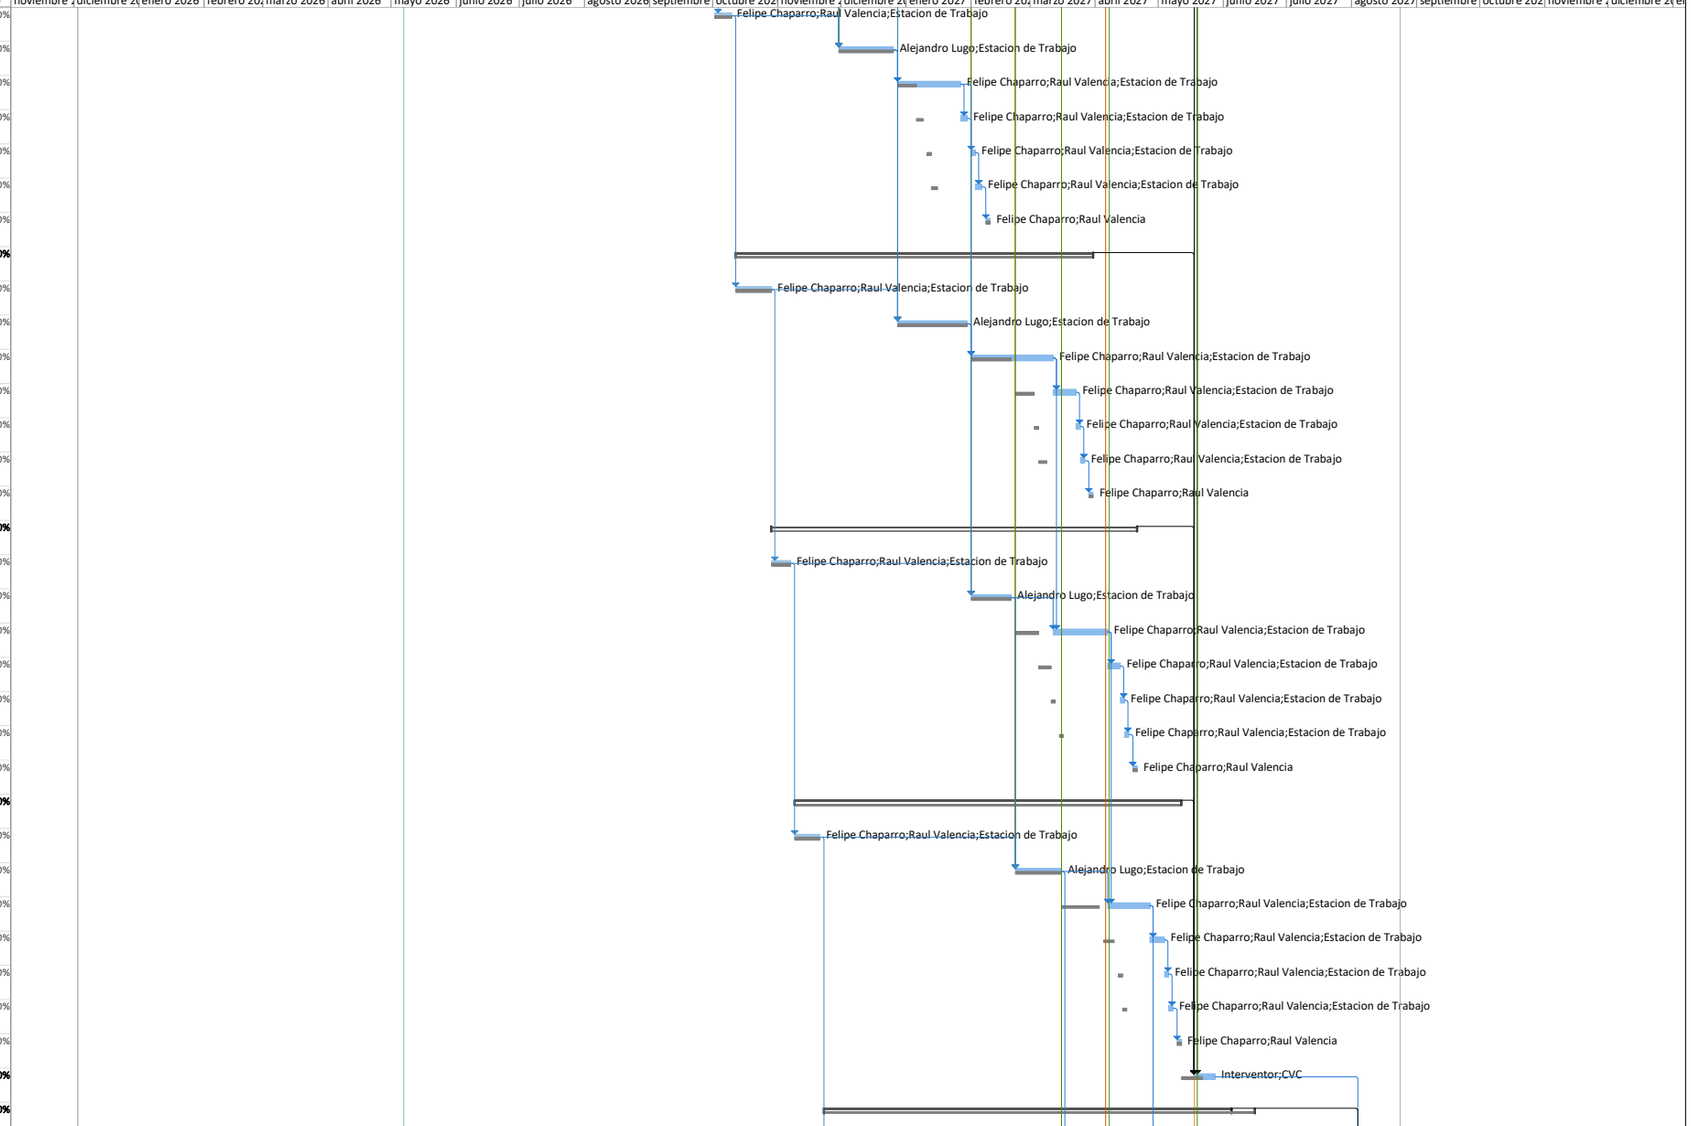

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
231	Clasificación de nube de puntos	14 días	lun 23/11/26	jue 10/12/26	0%
232	Generación de Ortofoto RGB	15 días	mar 16/03/27	lun 5/04/27	0%
233	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	15 días	mar 27/04/27	lun 17/05/27	0%
234	Generación de TIN para Hidráulica	8 días	mar 18/05/27	jue 27/05/27	0%
235	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	vie 28/05/27	lun 31/05/27	0%
236	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	mar 1/06/27	mié 2/06/27	0%
237	Entrega de productos finales	2 días	jue 3/06/27	vie 4/06/27	0%
238	**BLOQUE 9**	**197 días**	**vie 11/12/26**	**vie 25/06/27**	**0%**
239	Clasificación de nube de puntos	13 días	vie 11/12/26	mar 29/12/26	0%
240	Generación de Ortofoto RGB	15 días	mar 6/04/27	lun 26/04/27	0%
241	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	15 días	mar 18/05/27	lun 7/06/27	0%
242	Generación de TIN para Hidráulica	8 días	mar 8/06/27	jue 17/06/27	0%
243	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	vie 18/06/27	lun 21/06/27	0%
244	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	mar 22/06/27	mié 23/06/27	0%
245	Entrega de productos finales	2 días	jue 24/06/27	vie 25/06/27	0%
246	**BLOQUE 10**	**217 días**	**mié 30/12/26**	**mar 3/08/27**	**0%**
247	Clasificación de nube de puntos	12 días	mié 30/12/26	jue 14/01/27	0%
248	Generación de Ortofoto RGB	20 días	mar 18/05/27	lun 14/06/27	0%
249	Integracion de datos batimétricos al dato LIDAR	25 días	mar 15/06/27	lun 19/07/27	0%
250	Generación de TIN para Hidráulica	5 días	mar 20/07/27	lun 26/07/27	0%
251	Generación MDT, MDS, MDTi	2 días	mar 27/07/27	mié 28/07/27	0%
252	Curvas de nivel LiDAR+Batimetría mediante nube de pun	2 días	jue 29/07/27	vie 30/07/27	0%
253	Entrega de productos finales	2 días	lun 2/08/27	mar 3/08/27	0%
254	**PAGO 5**	**10 días**	**mié 4/08/27**	**vie 13/08/27**	**0%**
255	**APROBACION DE LA INTERVENTORIA**	**10 días**	**mié 4/08/27**	**vie 13/08/27**	**0%**
256	**PAGO 6**	**10 días**	**sáb 14/08/27**	**lun 23/08/27**	**0%**

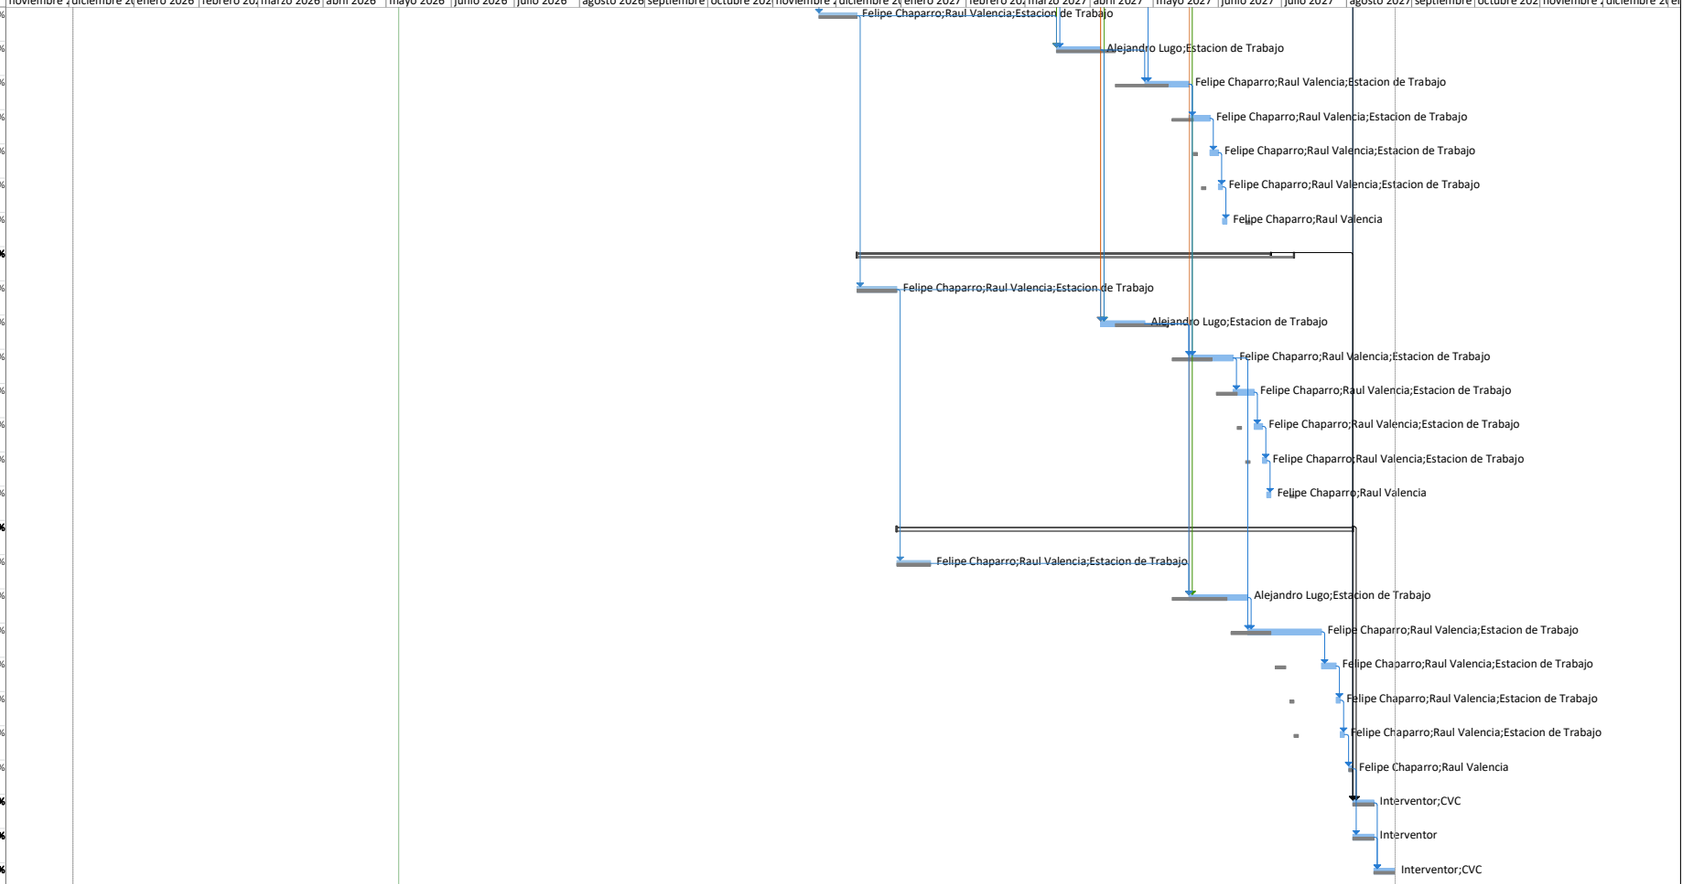

-CVC-
Fecha: jue 7/05/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | Hito de línea base | Progreso
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Línea base | Resumen de línea base | Progreso manual
