PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL TOLIMA, CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO	Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. LOTE 1 EQUIPOS
CONTRATISTA	CONSORCIO SENA -IAP
CC o NIT	902.020.606-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 45 Sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, Contiguo a la Casa de la Moneda
FECHA DE INICIO	31/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.884.351.750 COP
PRÓRROGA NRO. CO1.CTRMOD.21498439	Por medio de la presente modificación se prorroga el pazo de ejecución contractual el 5 meses.
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 2.884.351.750 COP
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA un solo pago, de acuerdo con los bienes recibidos, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 31/12/2025 al 8/04/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101208587		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2025	30/06/2026	$ 313.380.450,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2025	31/12/2028	$ 156.690.225,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/12/2025	SI AMPARA O AÑOS 5 MESES Y 30 DIAS	$ 313.380.450,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.CTRMOD.21498439 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101208587		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2025	30/06/2026	$ 313.380.450,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	30/12/2025	31/12/2028	$ 156.690.225,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/12/2025	SI AMPARA O AÑOS 5 MESES Y 30 DIAS	$ 313.380.450,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025
2. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informe de avance de supervisión
3. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.	El contratista ha cumplido con los lineamientos que se le han indicado por parte de la supervisión	Informes de supervisión
4. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
5. El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas o cuentas de cobro. Las cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.	El contratista no ha presentado facturas de cobro hasta la fecha de este informe	El contratista no ha presentado facturas de cobro hasta la fecha de este informe
6.Reportar de manera inmediata cualquier anomalía o eventualidad al supervisor del contrato	No se han presentado anomalías por parte del contratista	No se han presentado anomalías por parte del contratista
7.Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025
8.Garantizar el objeto del presente contrato y atender los reclamos, cuando se presenten fallas imputables a la ejecución del mismo, según lo estipulado en la propuesta.	El contratista ha cumplido con los lineamientos que se le han indicado por parte de la supervisión	Informes de supervisión
9.El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.	El contratista ha cumplido con los lineamientos que se le han indicado por parte de la supervisión	Informes de supervisión
10.Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	El contratista no ha manifestado interés en realizar cambios en la propuesta	El contratista no ha manifestado interés en realizar cambios en la propuesta

11.Presentar al supervisor del contrato dentro de tres días siguientes al inicio de ejecución del contrato el cronograma de actividades con las fechas estimadas en las que va a desarrollar las actividades que den cumplimiento al objeto contractual y obligaciones derivadas de este.	se ha suministrado el cronograma de actividades	Documento cronograma de actividades
12.Presentar a la supervisión del contrato una vez iniciado el mismo, el cronograma de entrega de los ítems objeto de adquisición según lote 1 y 2 del presente proceso	se ha suministrado el cronograma de actividades	Documento cronograma de actividades
13.Entregar los bienes requeridos por la entidad con las características técnicas solicitadas, cumpliendo con oportunidad y calidad en la entrega de los bienes.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
14.Suministrar garantía por los Ítems y/o bienes entregados por el plazo de ejecución del contrato y dos años adicionales.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
15.Brindar capacitación presencial en sitio de instalación de los equipos mínimo a 10 personas designadas por el Centro de Industria y construcción para el uso y mantenimiento de los equipos.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
16.Entregar fichas técnicas y manuales de usuario de los equipos objeto del contrato en idioma Español físicos y digitales.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
17.Los equipos, maquinaria y materiales deben ser descargados y ubicados en su respectivo punto de instalación, cumpliendo con el plano suministrado por la entidad, según Anexo Vista en planta ubicación de equipos	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
18.El proveedor deberá instalar y realizar la acometida o conexión eléctrica hasta el tablero de distribución ubicado en el espacio para la instalación de la planta de cada una de las maquinas, cumpliendo con la normatividad Retie y NTC 2050 y neumática (si se necesita)	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión

19.El proveedor deberá entregar a la entidad una muestra de 12 unidades, la cual debe ser producida en sitio por los equipos suministrados e instalados. Esto para verificar la puesta a punto de toda la línea de producción. El material de producción será aportado por el contratista, utilizando las mismas especificaciones de los materiales de formación solicitados en el proceso en el lote 2	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
20.En caso de cambiar en la ejecución contractual a alguna de las personas acreditadas dentro del personal mínimo habilitante, deberá presentar la hoja de vida del nuevo integrante junto con sus soportes al supervisor del contrato con el fin que sea avalada y autorizada la nueva hoja de vida, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el requisito habilitante	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
21.Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Aportar relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	El contratista ha suministrado relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Correo al supervisor del contrato
2. Aportar listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
3. Entregar certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA)	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
4. Suministrar certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
5. Entregar procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional, firmado por el Coordinador de alturas, e Interventor, lo cual se será previo a la actividad. Estos permisos se firmarán diarios y en campo	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
6. Presentar el Plan de Emergencias y elementos para la atención de una emergencia (Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización).	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
7. Entregar planilla vigente de pago de Seguridad Social vigente, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada (presentar mensualmente. Por el tiempo de duración del contrato)	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025 **Certificación por Persona Jurídica suscrita por Representante Legal (Adjunto)**

8. Contar con Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas (SI APLICA) aportando Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
9. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes en la ejecución de las actividades objeto de contratación	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
1.Gestionar y/o suministrar certificado RETIE o el equivalente vigente de la instalación eléctrica del Sistema Solar Fotovoltaico y sus productos.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
2. Evaluar e informar a los proveedores sobre la preferencia de adquisición de equipos de uso final de energía que tengan la etiqueta de eficiencia energética, o su equivalente, tipo A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de encendido y apagado:	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
3. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
4.Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	El contratista ha resguardado 11 ítems de los 13 que debe suministrar en las instalaciones del centro de industria y construcción nave 2 primer piso.	Informes de supervisión
5.El contratista deberá encargarse del manejo adecuado y seguro de los residuos resultantes de la actividad, presentando el procedimiento a realizar.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Documento de solicitud de prorroga

6. Los proveedores de bienes deberán abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista no ha iniciado actividades instalación de equipos	Informes de supervisión
7.El contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a las orientaciones, exigencias y requerimientos que haga el SENA, a través del Supervisor del contrato, en aplicación de la política Ambiental Institucional y de las normas ambientales nacionales vigentes. Además, debe cumplir las normas básicas en cuanto a recipientes, transporte interno y sitios de almacenamiento de residuos sólidos no especiales, Decreto 1713 de 2002 artículos 68, 72, 74, 76, 77 modificado por el Decreto 1140 de 2003.	El contratista suministró los documentos requeridos para la iniciación del contrato.	Secop II proceso SASI-CIC-9226-576-2025

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
08/04/2025	**No aplica**	**0**	**0**	$ 2.884.351.750	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado. Abril 6 de 2026	Certificación de aportes de parafiscales personas jurídica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con la solicitud del contratista en la que manifiesta:
“

Ing. Arnulfo Rodríguez buen día, por medio del presente y teniendo en cuenta los acontecimientos registrados en el desarrollo del contrato número CO1.PCCNTR.8718690 el cual tiene por objeto “*Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. LOTE 1 EQUIPOS*”, del cual se realizó la primera entrega el 7 de abril de 2026, de 11 de los 13 ítems contemplados en el marco del contrato mencionado anteriormente relacionadas en *Acta de Entrega* adjunta al presente correo; de igual forma nos permitimos poner en conocimiento que los 2 equipos pendientes se encuentran en tránsito marítimo desde el puerto de Shanghái - China hacia el puerto de Buenaventura – Colombia el cual fue despachado el 13 de marzo de 2026, de acuerdo con la información remitida por la agencia logística Schryver se espera arribo de la carga el 15 de abril de 2026 (se adjunta imagen soporte de información).
Es de resaltar que la totalidad de los equipos ya se encuentran pagados al 100% del costo.
Ingeniero, de acuerdo a lo expuesto anteriormente de manera respetuosa el Consorcio Sena IAP solicita conceder pago parcial del 50% equivalente a $ $ 1.442.175.875,00, la petición anterior se realiza con el fin de solventar compromisos financieros adquiridos y de igual forma contar con flujo suficiente para la culminación exitosa del presente contrato.
“

Acta primera entrega:

CONSORCIO SENA IAP
NIT 902020606 - 0

ACTA DE ENTREGA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025

Ibagué, 08 DE ABRIL 2026

Señor
Arnulfo Rodriguez Góngora
Instructor – Supervisora contrato
Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Ibagué, Tolima


El presente de manera atenta hace entrega parcial de los siguientes equipos correspondiente al lote No 1:

Item	NOMBRE OBJETO A CONTRATAR	Descripción del bien	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	MAQUINA AUTOMATICA CORTADORA LASER DE CELDAS SOLARES MODELO: 015-20A	UNIDAD	1
4	PROBADORES DIGITALES	PROBADOR DE CELDAS SOLARES 1299 (OTCT-A)	UNIDAD	1
5	PROBADORES DIGITALES	PROBADOR DE PANELES SOLARES MODELO: OTMT-A	UNIDAD	1
6	PROBADORES DIGITALES	PROBADOR DE DEFECTOS EL SEMIAUTOMATICO PARA PANEL SOLAR, MODELO: OEL-S2400	UNIDAD	1
7	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	MAQUINA ENMARCADORA DE PANELES SOLARES SEMIAUTOMÁTICA (OTK-A)	UNIDAD	1
8	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	ESTACION DE SOLDADURA PARA CELDAS SOLARES (3 PUESTOS DE TRABAJO)	UNIDAD	1
9	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	ESTACION LAY UP MATERIAL ALUMINIO	UNIDAD	1
10	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	CORTADORA MANUAL EVA/TPT	UNIDAD	1
11	ESTANTE PARA EL MANEJO DE MATERIAL	TRANSPORTADOR (ESTANTE) MODULOS VIDRIO/SOLAR	UNIDAD	2
12	ESTANTE PARA EL MANEJO DE MATERIAL	TRANSPORTADOR (ESTANTE) DE MATERIAL DE PRODUCCIÓN	UNIDAD	2
13	ESTANTE PARA EL MANEJO DE MATERIAL	TRANSPORTADOR DE CELDAS SOLARES	UNIDAD	2

Firma quien entrega
C.C 14136206
Tel.3003967956

Firma Quien recibe
C.C 93238271
Tel. 3102859410

Certificado de despacho desde china 13 de marzo de 2026:

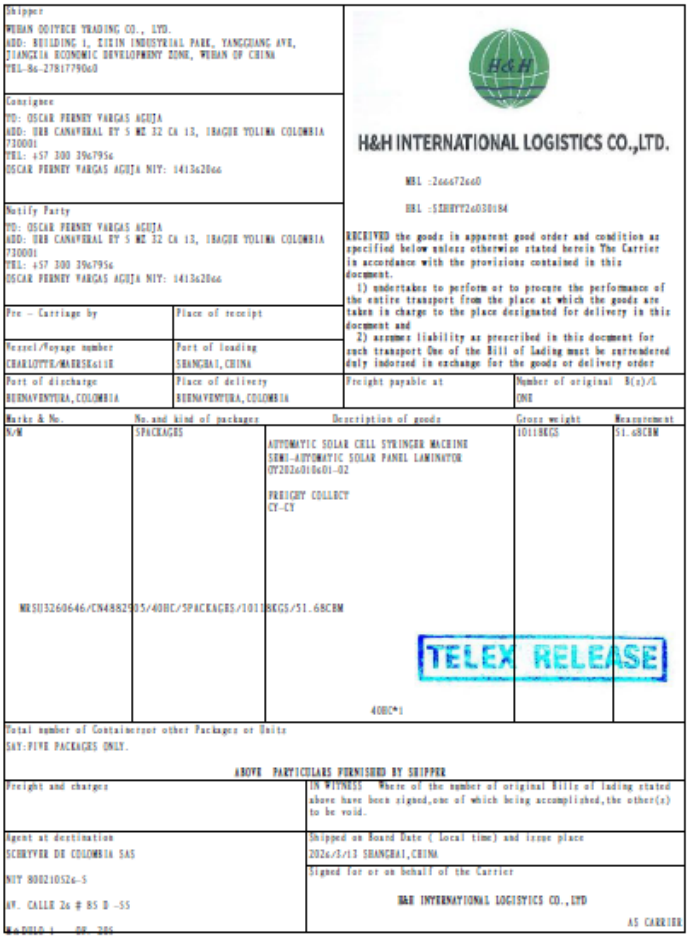

Shipper
WUHAN ODYTECH TRADING CO., LTD.
ADD: BUILDING 1, DIXIN INDUSTRIAL PARK, YANGCHANG AVE, JIANGXIA ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUHAN OF CHINA
TEL:86-27817790c0

Consignee
TO: OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA
ADD: URB CANAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13, IBAGUE YOLIMA COLOMBIA 730001
TEL: +57 300 3967956
OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA NIY: 1413a28e6

Notify Party
TO: OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA
ADD: URB CANAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13, IBAGUE YOLIMA COLOMBIA 730001
TEL: +57 300 3967956
OSCAR FERNEY VARGAS AGUJA NIY: 1413a28e6

H&H INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.

MBL :2666726c0

HBL :SZHHYT26030184

RECEIVED the goods in apparent good order and condition as specified below unless otherwise stated herein The Carrier in accordance with the provisions contained in this document.
1) undertakes to perform or to procure the performance of the entire transport from the place at which the goods are taken in charge to the place designated for delivery in this document and
2) assumes liability as prescribed in this document for such transport One of the Bill of Lading must be surrendered duly indorsed in exchange for the goods or delivery order

Pre – Carriage by	Place of receipt
Vessel/Voyage number	**Port of loading**
CHARLOTTE/MAERSK618E	SHANGHAI,CHINA
Port of discharge	**Place of delivery**
BUENAVENTURA,COLOMBIA	BUENAVENTURA,COLOMBIA

Freight payable at

Number of original B(s)/L
ONE

Marks & No.	No.and kind of packages	Description of goods	Gross weight	Measurement
N/M	5PACKAGES	AUTOMATIC SOLAR CELL STRINGER MACHINE SEMI-AUTOMATIC SOLAR PANEL LAMINATOR OY2026010c01-02 FREIGHY COLLECT CY-CY MRSU3260646/CN4882905/40HC/5PACKAGES/1011BKGS/51.68CBM	1011BKGS	51.68CBM
		40HC*1		

TELEX RELEASE

Total number of Containersor other Packages or Units
SAY:FIVE PACKAGES ONLY.

ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Freight and charges

IN WITNESS Where of the number of original Bills of lading stated above have been signed,one of which being accomplished,the other(s) to be void.

Agent at destination
SCHRYVER DE COLOMBIA SAS

NIY 800210526-5

AV. CALLE 26 # 85 D -55

Shipped on Board Date (Local time) and issue place
2026/3/13 SHANGHAI,CHINA

Signed for or on behalf of the Carrier
H&H INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
AS CARRIER

ABOVE PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

IN WITNESS Where of the number of original Bills of lading stated above have been signed,one of which being accomplished,the other(s) to be void.

Shipped on Board Date (Local time) and issue place
2026/3/13 SHANGHAI,CHINA

Signed for or on behalf of the Carrier
H&H INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
AS CARRIER

INFORMACIÓN	DATOS DE LA OPERACIÓN
Booking	6388
Fecha Del Booking	9/03/2026
Modalidad	IMPORTACION MARITIMA
Unidad de Carga	1 CONT X 40 HQ
Descripción de Carga	MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA ENCADENAR CÉLULAS SOLARES
Cliente	VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Shipper	WUHAN OOITECH TRADING CO.,LTD
Consignee	VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Origen	SHANGHAI // BUENAVENTURA
Destino	COLOMBIA
MBL/MAWB	PENDIENTE
HBL/HAWB	SZHHYT26030184
ETD	13/03/2026
ETA	15/04/2025
Su Referencia	IMPORTACION - OT2026010601-02
FECHA	**INFORME**
lunes, 9 de marzo de 2026	Muy buenos días, Sr. Oscar: Gracias por la nueva asignación. A continuación, compartimos los detalles correspondientes de su importación: HBL No.: SZHHYT26030184 POL: Shanghái POD: Buenaventura Volumen: 1 x 40HQ Corte: 10-Mar Motonave: CHARLOTTE MAERSK / 611E ETD: 13-marzo ETA: 15-abril Días Libres: 21 Unidad: 1 x 40HQ Seguiremos atentos a los avances y les informaremos cualquier novedad.

De acuerdo con la información suministrada, y considerando los reportes de avances logísticos presentados por el contratista, así como en atención a la solicitud realizada, en mi calidad de supervisor autorizo el pago parcial correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato, equivalente a la suma de $1.442.175.875,00.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago parcial conforme lo solicitado por el contratista.

8. OBSERVACIONES

Se adjunta a este documento:

- Certificado de aportes parafiscales
- Correo de solicitud de pago parcial

- Acta de entrega parcial de equipos
- Informe cronológico de supervisión
- Certificado de despacho desde china de los equipos faltantes de 2 items.

Para constancia se firma el 8 de abril de 2026

ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA
Supervisor del contrato

JORGE JAIME MENDOZA VELASQUEZ
Subdirector (E) Centro de Industria y Construcción
SENA – Regional Tolima

Revisó:
Elaboró: Arnulfo Rodríguez Góngora - Supervisor
