Viernes, 10 de julio de 2026

INFORME SOBRE EL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO – CONTRATO CONSULTORÍA No. 785 DE 2025

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

4.9.1.1 Objeto del seguimiento

En desarrollo del Contrato de Consultoría No. 785 de 2025, el manejo del anticipo durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 estuvo orientado a garantizar la disponibilidad efectiva de los recursos, su adecuada trazabilidad bancaria y la formalización documental previa a su aplicación. Aunque la notificación del pago del anticipo por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU había sido comunicada desde el 29 de diciembre de 2025, el Consorcio dejó constancia de que la ejecución del plan de inversión solo podía iniciarse una vez los recursos se encontraran efectivamente acreditados en la cuenta bancaria dispuesta para su manejo, circunstancia que fue informada mediante oficio CGPM-128-2026 del 26 de enero de 2026 y reiterada en el comité del 20 de enero de 2026.

En el transcurso de febrero de 2026 se adelantaron las actuaciones administrativas, financieras y de soporte requeridas para materializar la inversión del anticipo. Mediante oficio CGPM-146-2026 del 4 de febrero de 2026 se remitieron a la Interventoría los extractos y movimientos bancarios de la cuenta destinada al manejo de estos recursos. Posteriormente, a través del oficio CGPM-160-2026 del 9 de febrero de 2026, se presentó la reprogramación del Plan de Inversión del Anticipo y se radicó la solicitud de desembolso correspondiente a la Orden de Giro No. 1. Ante la ausencia de confirmación del giro, el 10 de febrero de 2026 se presentó derecho de petición solicitando información sobre el estado del desembolso del veinte por ciento (20%) del valor contractual, luego de lo cual el ICCU remitió el comprobante de la orden de pago el 12 de febrero de 2026 y el desembolso se hizo efectivo en la cuenta del Consorcio el 13 de febrero de 2026.

Una vez acreditados los recursos, la información financiera y documental asociada al anticipo continuó su trámite ante la Interventoría para efectos de validación y autorización. En ese marco, mediante oficio CTO883-134-26 del 16 de febrero de 2026, la Interventoría formuló observaciones técnicas y financieras al Plan de

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

Inversión y a las órdenes de giro presentadas, las cuales fueron atendidas por el Consultor a través de los oficios CGPM-191-2026 del 17 de febrero de 2026 y CGPM-205-2026 del 20 de febrero de 2026, con la remisión de los soportes correspondientes y de las Órdenes de Giro Nos. 1 a 7 debidamente suscritas. Finalmente, mediante oficio CTO883-140-26 del 25 de febrero de 2026, la Interventoría aprobó las siete (7) órdenes de giro por valor de $913.871.917 y autorizó su trámite ante la entidad financiera, reiterando la necesidad de remitir mensualmente los soportes que permitieran mantener la trazabilidad de los recursos del anticipo.

No obstante, lo anterior, durante los días 25 al 27 de febrero de 2026 se presentó una contingencia operativa asociada a la plataforma transaccional de Bancolombia, circunstancia que impidió la ejecución inmediata de los pagos aprobados. En consecuencia, al cierre del mes de febrero se encontraba acreditado el desembolso del anticipo en la cuenta del Consorcio y aprobadas por la Interventoría las órdenes de giro correspondientes, quedando la ejecución material de los pagos autorizados para los primeros días del mes de marzo de 2026.

Para el desembolso No.2 (Orden de Giro #8) durante el mes de junio del 2026 a través del comunicado CGPM-481-2026, se remitió la solicitud de desembolso No.02 por un valor de $8.640.581,72. En esta propuesta inicial se tuvo en cuenta los gastos bancarios o deducciones de ley acumulados en la cuenta destinada para el manejo de estos recursos.

El día 25 de junio del 2026, la interventoría dio respuesta mediante el comunicado CTO883-354-26 realizando observaciones a la solicitud anteriormente realizada, por lo cual esta consultoría el día 30 de junio de 2026 remitió la respuesta mediante el comunicado CGPM-585-2026 incorporando las observaciones de la interventoría, presentando el estado actual del anticipo corregido y realizando la nueva solicitud del desembolso por un valor de $12.382.599,00.

Sin embargo, la Interventoría al realizar la revisión a los documentos, solicita un ajuste al valor del desembolso y requiere de un alcance al comunicado CGPM-585-2026, por lo cual esta consultoría mediante el comunicado CGPM-640-2026 remite la solicitud con el valor del desembolso modificado a $12.382.899,00 tal como se solicitó.

La destinación del anticipo se estructuró sobre componentes directamente asociados con la ejecución del objeto contractual, incluyendo requerimientos de personal, proveedores, arrendamientos, transportes, trabajo de campo, laboratorio de suelos, papelería y dotación, conceptos que guardan relación con las

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

necesidades operativas, técnicas y logísticas del contrato y que se encuentran soportados en los comprobantes de egreso allegados al expediente documental; así:

Plan Inversión del Anticipo Aprobado por la Interventoría:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social	$ 140.974.566,00	**14,60**
2	Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería	$ 389.424.113,00	**40,30**
3	Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduría, servicios públicos)	$ 9.000.000,00	**0,90**
4	Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo	$ 23.000.000,00	**2,40**
5	Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios	$ 399.481.348,00	**41,30**
6	Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías	$ 2.000.000,00	**0,20**
7	Gastos de Dotaciones y Elementos de protección del personal	$ 3.000.000,00	**0,30**
TOTAL ANTICIPO		**$ 966.880.027,00**	**100%**

Cronograma para el Plan de Inversión del Anticipo:

No.	DESCRIPCION	VALOR	1	2
1	Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social	$ 140.974.566,00	$ 104.966.456,00	$ 36.008.110,00
2	Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería	$ 389.424.113,00	$ 389.424.113,00	$ 0,00
3	Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduría, servicios públicos)	$ 9.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
4	Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo	$ 23.000.000,00	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00
5	Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios	$ 399.481.348,00	$ 399.481.348,00	$ 0,00
6	Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
7	Gastos de Dotaciones y Elementos de protección del personal	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00
TOTAL ANTICIPO		**$ 966.880.027,00**	**$ 913.871.917,00**	**$ 53.008.110,00**

Estado Actual del Anticipo Mes de Junio:

No.	DESCRIPCION	VALOR	DESEMBOLSO 1	IMPUESTO DE TIMBRE	SALDO PROGRAMACIÓN INICIAL	DESCUENTO DEL IMPUESTO DE TIMBRE	Saldo por ejecutar (DESEMBOLSO 2)
1	Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social	$ 140.974.566,00	$ 104.966.456,00	$ 40.625.211,00	$ 36.008.110,00	$ 23.625.211,00	$ 12.382.899,00
2	Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería	$ 389.424.113,00	$ 389.424.113,00		$ 0,00		
3	Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduría, servicios públicos)	$ 9.000.000,00	$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	
4	Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo	$ 23.000.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	
5	Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios	$ 399.481.348,00	$ 399.481.348,00		$ 0,00		
6	Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	
7	Gastos de Dotaciones y Elementos de protección del personal	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00		$ 0,00		
TOTAL ANTICIPO		**$ 966.880.027,00**	**$ 913.871.917,00**		**$ 53.008.110,00**	**$ 40.625.211,00**	**$ 12.382.899,00**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

4.9.2 Seguimiento al programa de inversión

El Programa de Inversión del Anticipo durante el mes de febrero de 2026 estuvo enfocado en organizar la aplicación progresiva de los recursos conforme a la dinámica real de inicio de su disponibilidad y a las necesidades operativas del contrato. En ese sentido, la reprogramación presentada por el Consultor respondió a la necesidad de armonizar el flujo de inversión con la acreditación efectiva de los recursos y con los requerimientos técnicos y administrativos propios de la etapa de estudios y diseños que se desarrollaba en el período informado.

La programación de inversión contempló la aplicación del anticipo en actividades y rubros indispensables para la ejecución contractual, priorizando aquellos componentes relacionados con la puesta en marcha y continuidad de las labores técnicas de campo, el soporte especializado, la operación administrativa y la disponibilidad de insumos necesarios para el desarrollo de los estudios y diseños. En tal sentido, la estructura de inversión se orientó a cubrir compromisos vinculados con personal técnico y profesional, obligaciones con proveedores, apoyos logísticos, transporte, trabajo de campo y laboratorio de suelos, así como elementos de funcionamiento y apoyo administrativo, todo ello dentro del marco del objeto contractual y bajo control documental.


Durante el mes de febrero del 2026, el seguimiento al programa de inversión se soportó en la remisión de extractos bancarios, movimientos de la cuenta del anticipo, reprogramación del plan y presentación sucesiva de las órdenes de giro sometidas a revisión de la Interventoría. De esta manera, el comportamiento del programa de inversión no se limitó a una proyección teórica, sino que avanzó hacia su formalización y validación, hasta obtener al cierre de febrero la aprobación de las siete órdenes de giro por parte de la Interventoría, paso previo a su ejecución financiera efectiva.

Así, al cierre del mes de febrero de 2026, el Programa de Inversión del Anticipo presentaba un estado de consolidación administrativa y financiera, con recursos ya desembolsados por la entidad en la cuenta del Consorcio, órdenes de giro aprobadas para su aplicación y soportes documentales en proceso de incorporación mensual para garantizar la trazabilidad de cada movimiento. Este comportamiento permitió mantener coherencia entre la disponibilidad del recurso, su programación de uso y el control documental requerido para su seguimiento dentro del informe mensual.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

Para tal efecto, se denota a continuación los totales desembolsados de cada Órden de Giro, éstas son de la 1 – 7, así.

- **ORDEN DE GIRO No: 1**

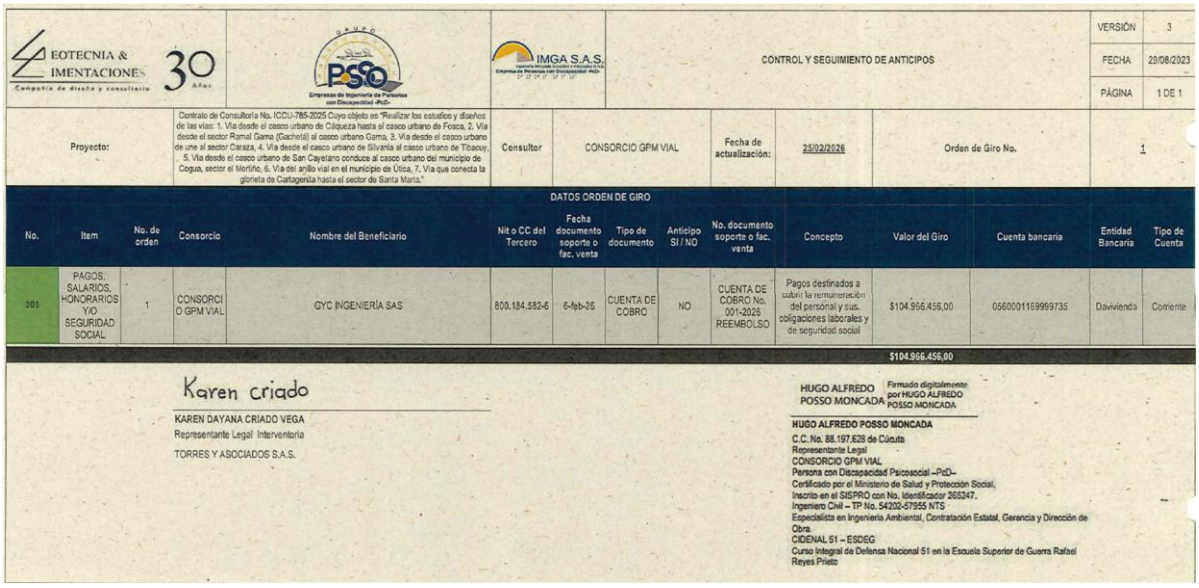

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años – Compañía de diseño y consultorio					IMGA S.A.S.				CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS				VERSIÓN	3	
													FECHA	29/08/2023	
													PÁGINA	1 DE 1	
Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."				Consultor	CONSORCIO GPM VIAL		Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.		1		
DATOS ORDEN DE GIRO															
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	
001	PAGOS, SALARIOS, HONORARIOS Y/O SEGURIDAD SOCIAL	1	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 001-2026 REEMBOLSO	Pagos destinados a cubrir la remuneración del personal y sus obligaciones laborales y de seguridad social	$104.966.456,00	056000116999735	Davivienda	Corriente	
											$104.966.456,00				


Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57055 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra.
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

- **ORDEN DE GIRO No: 2**

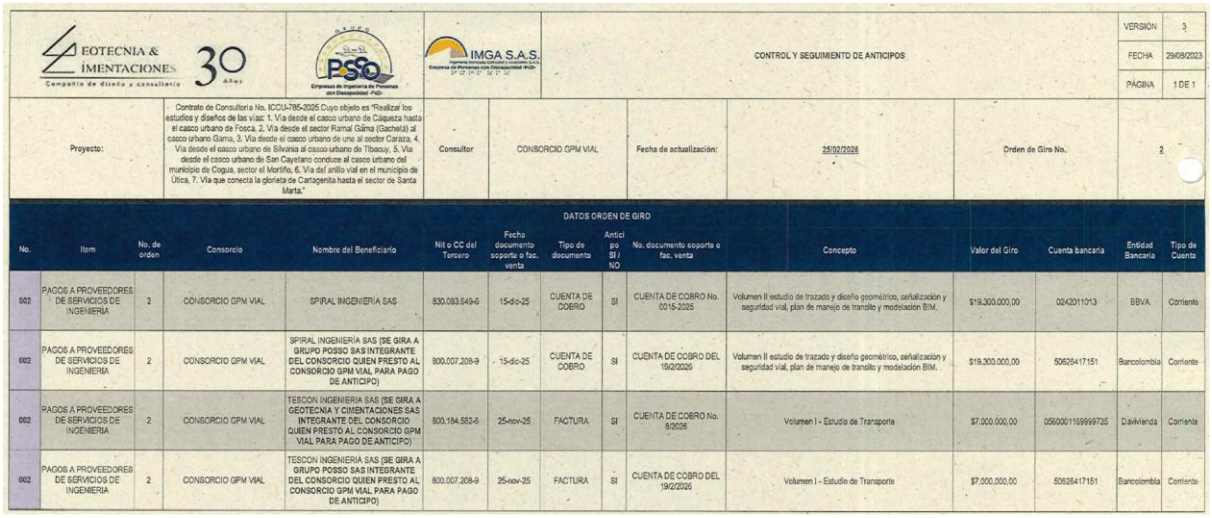

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años – Compañía de diseño y consultorio					IMGA S.A.S.				CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS				VERSION	3	
													FECHA	29/08/2023	
													PÁGINA	1 DE 1	
Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las viac 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."				Consultor	CONSORCIO GPM VIAL		Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.		2		
DATOS ORDEN DE GIRO															
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	2	CONSORCIO GPM VIAL	SPIRAL INGENIERIA SAS	830.083.549-5	15-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 0015-2025	Volumen II estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, plan de manejo de tránsito y modelación BIM.	$19.300.000,00	0242011013	BBVA	Corriente	
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	2	CONSORCIO GPM VIAL	SPIRAL INGENIERIA SAS (SE GIRA A GRUPO POSSO SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.007.208-9	15-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO DEL 19/2/2026	Volumen II estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, plan de manejo de tránsito y modelación BIM.	$19.300.000,00	50626417151	Bancolombia	Corriente	
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	2	CONSORCIO GPM VIAL	TESCON INGENIERIA SAS (SE GIRA A GEOTECNIA Y CIMENTACIONES SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.184.582-6	25-nov-25	FACTURA	SI	CUENTA DE COBRO No. 8/2026	Volumen I - Estudio de Transporte	$7.000.000,00	056000116999735	Davivienda	Corriente	
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA	2	CONSORCIO GPM VIAL	TESCON INGENIERIA SAS (SE GIRA A GRUPO POSSO SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.007.208-9	25-nov-25	FACTURA	SI	CUENTA DE COBRO DEL 19/2/2026	Volumen I - Estudio de Transporte	$7.000.000,00	50626417151	Bancolombia	Corriente	

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

- **ORDEN DE GIRO No: 3**


EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años Compañía de diseño y consultorio				IMGA S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS						VERSIÓN	3	
													FECHA	29/08/2023	
													PÁGINA	1 DE 1	
Proyecto:			Contrato de Consultoría No. ICCIA-795-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Calarcá hasta el casco urbano de Fresia. 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama. 3. Vía desde el casco urbano de una al sector Caraza. 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy. 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Morrito. 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica. 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagena hasta el sector de Santa María."			Consultor	CONSORCIO GPM VIAL		Fecha de actualización:	25/02/2026		Orden de Giro No.		3	
DATOS ORDEN DE GIRO															
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	
003	GASTOS ADMINISTRATIVOS (ARRENDAMIENTOS, CONTADURÍA, SERVICIOS PÚBLICOS)	3	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 003-2026	Arrendamiento de espacio y/u oficinas para funcionamiento administrativo y técnico de la consultoria	$4.500.000,00	056000116999735	Davivienda	Corriente	
											$4.500.000,00				
Karen criado KAREN DAYANA CRIADO VEGA Representante Legal de Interventoria TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.										HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA HUGO ALFREDO POSSO MONCADA C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta Representante Legal CONSORCIO GPM VIAL Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD– Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247, Ingeniero Civil – TP No. 54203-57955 NTS Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra CIDENAL 51 – ESDEG Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto					

- **ORDEN DE GIRO No: 4**

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años Compañía de diseño y consultorio				IMGA S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-			CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS						VERSIÓN	3	
													FECHA	29/08/2023	
													PÁGINA	1 DE 1	
Proyecto:			Contrato de Consultoría No. ICCIA-795-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Calarcá hasta el casco urbano de Fresia. 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama. 3. Vía desde el casco urbano de una al sector Caraza. 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy. 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Morrito. 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica. 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagena hasta el sector de Santa María."			Consultor	CONSORCIO GPM VIAL		Fecha de actualización:	25/02/2026		Orden de Giro No.		4	
DATOS ORDEN DE GIRO															
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo	No. documento soporte	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	
004	GASTOS DE TRANSPORTE Y/O ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL, TRANSPORTE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	4	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 004-2026	Alquiler de vehículos para personal y transporte de maquinaria	$11.500.000,00	056000116999735	Davivienda	Corriente	
											$11.500.000,00				
Karen criado KAREN DAYANA CRIADO VEGA Representante TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.										HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA HUGO ALFREDO POSSO MONCADA C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta Representante Legal CONSORCIO GPM VIAL Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD– Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247, Ingeniero Civil – TP No. 54203-57955 NTS Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra CIDENAL 51 – ESDEG Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto					

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

- **ORDEN DE GIRO No: 5**

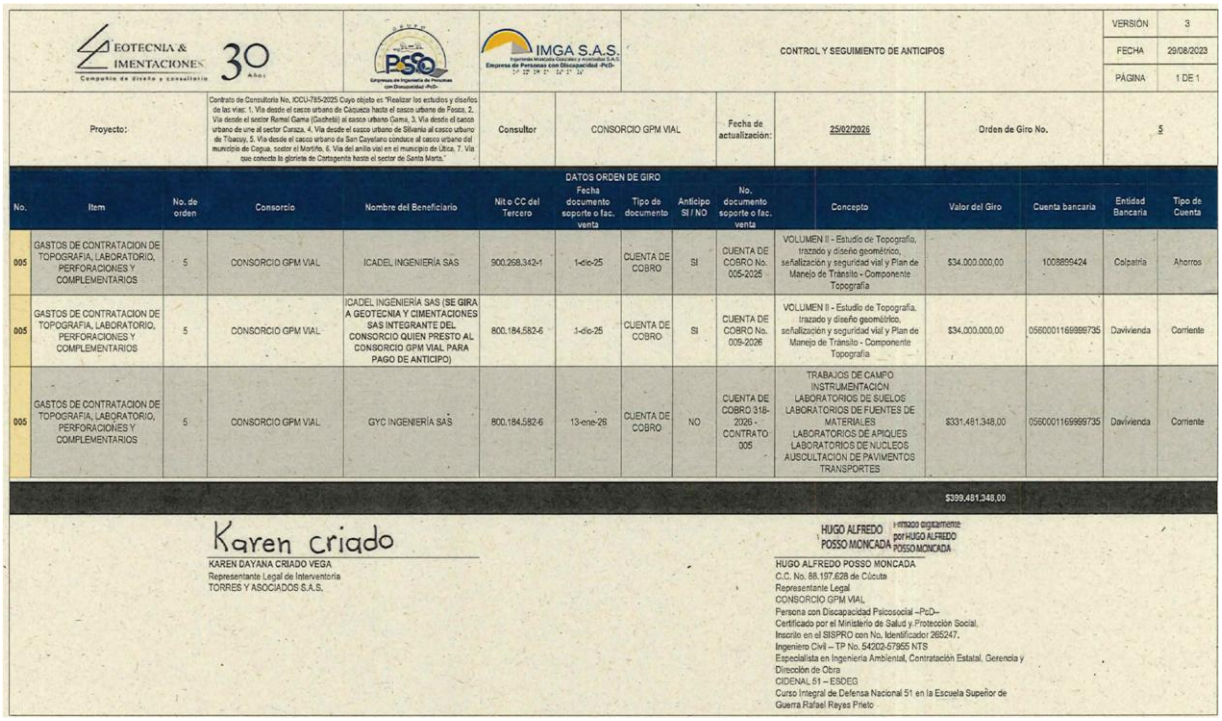

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS

VERSIÓN 3 | FECHA 29/08/2023 | PÁGINA 1 DE 1

Proyecto: Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es: "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Morlito, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Utica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."

Consultor: CONSORCIO GPM VIAL | Fecha de actualización: 25/02/2026 | Orden de Giro No.: 5

DATOS ORDEN DE GIRO

No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	ICADEL INGENIERÍA SAS	900.268.342-1	1-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 005-2025	VOLUMEN II - Estudio de Topografía, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial y Plan de Manejo de Transito - Componente Topografía	$34.000.000,00	1008899424	Colpatria	Ahorros
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	ICADEL INGENIERÍA SAS (SE GIRA A GEOTECNIA Y CIMENTACIONES SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.184.582-6	1-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 009-2026	VOLUMEN II - Estudio de Topografía, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial y Plan de Manejo de Transito - Componente Topografía	$34.000.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	13-ene-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO 318-2026 - CONTRATO 005	TRABAJOS DE CAMPO INSTRUMENTACIÓN LABORATORIOS DE SUELOS LABORATORIOS DE FUENTES DE MATERIALES LABORATORIOS DE APIQUES LABORATORIOS DE NUCLEOS AUSCULTACION DE PAVIMENTOS TRANSPORTES	$331.481.348,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$399.481.348,00			


Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

- **ORDEN DE GIRO No: 6**

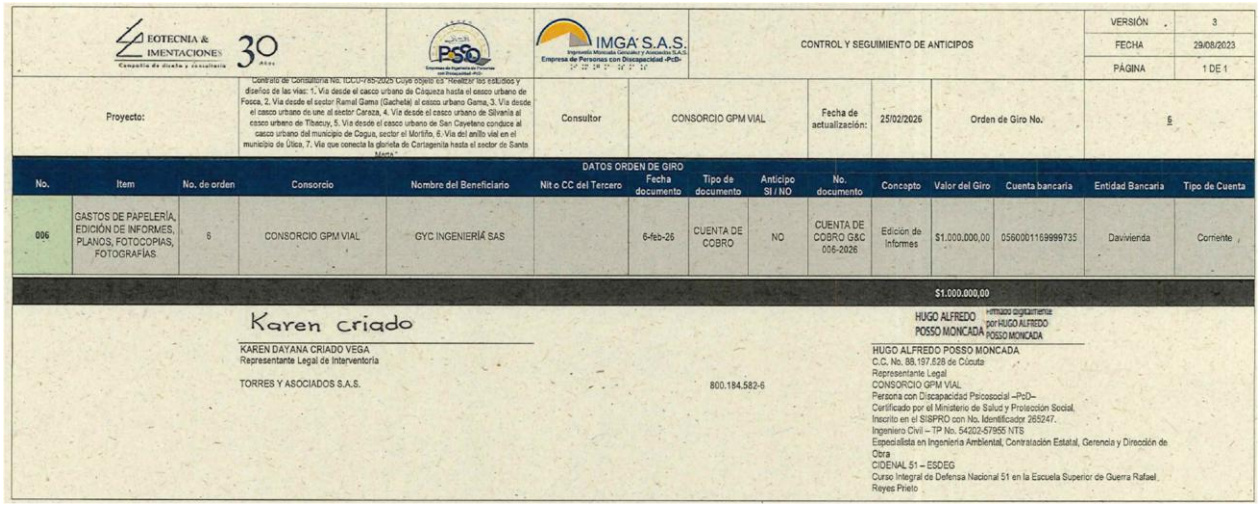

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS

VERSIÓN 3 | FECHA 29/08/2023 | PÁGINA 1 DE 1

Proyecto: Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es: "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Morlito, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Utica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."

Consultor: CONSORCIO GPM VIAL | Fecha de actualización: 25/02/2026 | Orden de Giro No.: 6

DATOS ORDEN DE GIRO

No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
006	GASTOS DE PAPELERÍA, EDICIÓN DE INFORMES, PLANOS, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS.	6	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS		6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO G&C 006-2026	Edición de Informes	$1.000.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$1.000.000,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.


800.184.582-6

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

- **ORDEN DE GIRO No: 7**

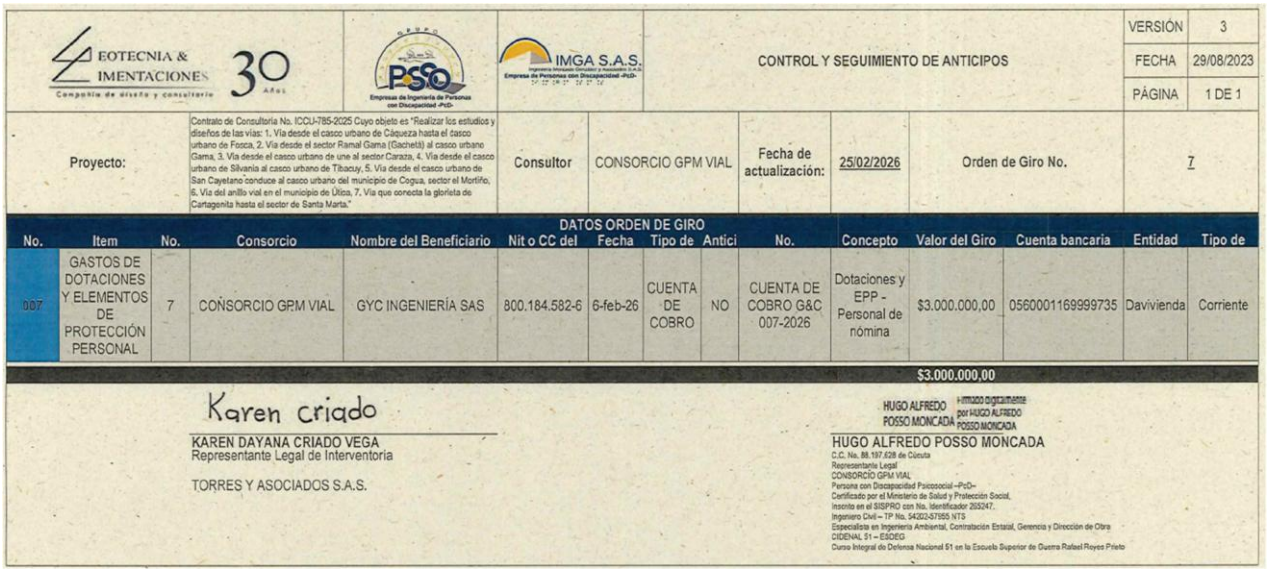

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años					IMGA S.A.S.	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS							VERSIÓN	3		
													FECHA	29/08/2023		
													PÁGINA	1 DE 1		
Proyecto:			Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Sachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."			Consultor	CONSORCIO GPM VIAL		Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.		7			
DATOS ORDEN DE GIRO																
No.	Item	No.	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del	Fecha	Tipo de	Antici	No.	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad	Tipo de		
007	GASTOS DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO G&C 007-2026	Dotaciones y EPP - Personal de nómina	$3.000.000,00	056000116999735	Davivienda	Corriente		
											$3.000.000,00					
Karen criado KAREN DAYANA CRIADO VEGA Representante Legal de Interventoria TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.										HUGO ALFREDO POSSO MONCADA HUGO ALFREDO POSSO MONCADA HUGO ALFREDO POSSO MONCADA C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta Representante Legal CONSORCIO GPM VIAL Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD– Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247. Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra CIDENAL 51 – ESDEG Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto							

De conformidad con las órdenes de giro anteriormente relacionadas, debidamente aprobadas y desembolsadas a los respectivos proveedores, el saldo del Plan de Inversión del Anticipo que deberá ser considerado en la segunda solicitud de desembolso corresponde al valor que se presenta a continuación.

Es pertinente precisar que, aun cuando el anticipo contractual fue establecido en un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, al momento de su desembolso la Entidad — ICCU efectuó el descuento correspondiente al impuesto de timbre por valor de $40.625.211, según consta en el egreso de regalías No. 2025000003.

Por tal razón, aunque el valor nominal del anticipo asciende a $966.880.027, el valor neto efectivamente desembolsado correspondió a $926.254.816.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

EGRESO REGALIAS Nro: ERG - 2025000003

Nit: 900258711-1

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	OPR	2025000002	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO GPM VIAL
DIRECCION TV 60 # 115-58 TOB OFI 601
BANCO **CUENTA**
PAGADO A CONSORCIO GPM VIAL
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU-CTO-785-20**
DESCRIPCION

CC o NIT 901985761 **DV** 1
TELEFONO 3004400789
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 00.00
TIPO PAGO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VÍA DESDE EL- PAGO ANTICIPO DEL 20%

SON CERO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
PGOSGR	901985761	Ejecución proyectos de inversión SGR	00.00	926,254,816
CXPSGR	901985761	Ejecución proyectos de inversión SGR	926,254,816.00	00
		SUMAS IGUALES	**926,254,816.00**	**926,254,816.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000016	2025000017	-00RG-2402-0602-2024000050021-00RG	Proyecto. -Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca. FUENTE: 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	966,880,027.00
TOTAL PRESUPUESTO				**966,880,027.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO OPR-2025000002

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IMPUESTO TIMBRE DECRETO 0175 2025	901985761 CONSORCIO GPM VIAL	4,062,521,121	1	40,625,211.00
TOTAL DEDUCCIONES				**40,625,211.00**

Desembolso real al Consultor

Descuento realizado con ocasión al impuesto de timbre

Valor del anticipo respecto al 20% valor total del contrato

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

Así lo anterior, es menester de esta consultoría mencionar que, de acuerdo con lo anterior, el saldo del Plan de Inversión del Anticipo en la cuenta se encuentra bajo la suma de **$12.382.899,00**; teniendo en cuenta lo siguiente:

	ANTICIPO:	**$ 926.254.816**

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
2/03	PAGO A PROV ICADEL INGENIERIA	$	34.000.000,00
2/03	PAGO A PROV SPIRAL INGENIERIA	$	19.300.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	1.000.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	34.000.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	4.500.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	331.481.348,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	104.966.756,00
2/03	PAGO A PROVE INGENIERIA MONC	$	7.000.000,00
2/03	PAGO A PROVE INGENIERIA MONC	$	19.300.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	7.000.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	3.000.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	11.500.000,00
2/03	PAGO A PROVE GEOTECNIA Y CIM	$	336.824.113,00
		$	**913.872.217,00**

28/02	ABONO INTERESES AHORROS	$	121.815,75
1/03	ABONO INTERESES AHORROS	$	7.613,98
12/03	ABONO INTERESES AHORROS	$	132,22
31/03	ABONO INTERESES AHORROS	$	223,44
8/04	ABONO INTERESES AHORROS	$	94,08
30/04	ABONO INTERESES AHORROS	$	254,95
11/05	ABONO INTERESES AHORROS	$	127,49
31/05	ABONO INTERESES AHORROS	$	231,79
09/06	ABONO INTERESES AHORROS	$	104,31
30/06	ABONO INTERESES AHORROS	$	243,36
		$	**130.841,37**

9/04	**PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**$**	**129.785,39**
12/05	**PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**$**	**349,03**
10/06	**PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**$**	**359,28**

SALDO TOTAL EN BANCO	**$**	**12.382.899,00**

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

De otra parte, se identificaron deducciones bancarias y gravámenes aplicados a la cuenta por un valor total de **$3.922.028,86.** Estos movimientos corresponden principalmente a comisiones por servicios de pago a proveedores y a otros bancos, cuotas de manejo de la sucursal virtual y del plan de canal de negocios (junto con sus respectivos cobros de IVA), retenciones en la fuente aplicadas, y los importes asociados al Gravamen a los Movimientos Financieros (Impuesto de Gobierno 4x1000).

Consignación de rendimientos financieros

Conforme a los soportes de pago aportados, se evidencia que el 9 de abril de 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del contrato para el mes de marzo, por valor de $129.785,39, bajo el concepto “Reintegro de Rendimientos Financieros”. Dicha operación fue efectuada mediante pago PSE a través de Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos), con débito desde la cuenta de ahorros de Bancolombia terminada en 6330, registrándose como transacción exitosa bajo el comprobante No. 155235137. En consecuencia, se acredita documentalmente la devolución de los rendimientos financieros causados, dejando trazabilidad suficiente de su consignación.

Adicional, se evidencia que el 12 de mayo del 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del contrato para el mes de abril, por valor de $349,03, bajo el concepto “Reintegro de Rendimientos Financieros”. Dicha operación fue efectuada mediante pago PSE a través de Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos), con débito desde la cuenta de ahorros de Bancolombia terminada en 6330, registrándose como transacción exitosa bajo el comprobante No. 159080086. En consecuencia, se acredita documentalmente la devolución de los rendimientos financieros causados, dejando trazabilidad suficiente de su consignación.

De igual manera, se anexan los soportes en los que el día 10 de junio del 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del contrato para el mes de mayo, por valor de $359,28, bajo el concepto “Reintegro de Rendimientos Financieros”. Dicha operación fue efectuada mediante pago PSE a través de Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos), con débito desde la cuenta de ahorros de Bancolombia terminada en 6330, registrándose como transacción exitosa bajo el comprobante No. 162291340. En consecuencia, se acredita documentalmente la devolución de los rendimientos financieros causados, dejando trazabilidad suficiente de su consignación.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

Para el presente mes, se anexan los soportes en los que el día 9 de julio del 2026 se realizó la consignación de los rendimientos financieros generados por los recursos del contrato para el mes de mayo, por valor de $347,67, bajo el concepto “Reintegro de Rendimientos Financieros”. Dicha operación fue efectuada mediante pago PSE a través de Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos), con débito desde la cuenta de ahorros de Bancolombia terminada en 6330, registrándose como

transacción exitosa bajo el comprobante No. 16406388. En consecuencia, se acredita documentalmente la devolución de los rendimientos financieros causados, dejando trazabilidad suficiente de su consignación.

ESTADO ANTICIPO MES ABRIL 2026

Durante el mes de abril de 2026 no se adelantaron acciones, movimientos ni modificaciones relacionadas con el Plan de Inversión del Anticipo, razón por la cual las condiciones del mismo se mantienen conforme a lo reportado y aprobado en el informe correspondiente al mes de marzo de 2026.

En ese sentido, los saldos, porcentajes, valores ejecutados, recursos disponibles y demás aspectos financieros asociados al anticipo corresponden a las mismas cifras y condiciones previamente informadas para el periodo inmediatamente anterior, sin que se presenten variaciones durante el mes objeto de seguimiento.

No obstante, la Consultoría adelantó las gestiones pertinentes para la consignación de los rendimientos financieros causados durante el mes de abril de 2026 que fueron consignados el día 12 de mayo del 2026.

ESTADO ANTICIPO MES DE MAYO 2026

Durante el mes de mayo de 2026 no se adelantaron acciones, movimientos ni modificaciones relacionadas con el Plan de Inversión del Anticipo, razón por la cual las condiciones del mismo se mantienen conforme a lo reportado y aprobado en el informe correspondiente al mes de abril de 2026.

En ese sentido, los saldos, porcentajes, valores ejecutados, recursos disponibles y demás aspectos financieros asociados al anticipo corresponden a las mismas cifras y condiciones previamente informadas para el periodo inmediatamente anterior, sin que se presenten variaciones durante el mes objeto de seguimiento.

No obstante, la Consultoría se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para

la consignación de los rendimientos financieros causados durante el mes de mayo de 2026, así como las actuaciones administrativas y financieras requeridas para el trámite correspondiente al cobro del segundo giro del anticipo, de conformidad con las condiciones contractuales aplicables.

ESTADO ANTICIPO MES DE JUNIO 2026

Durante el mes de junio de 2026 se realizó la solicitud del segundo desembolso (Orden de Giro No.8) correspondiente al valor restante conforme al Plan de Inversión del Anticipo aprobado por un valor de $12.382.599,00. Con el fin de garantizar la continuidad de los flujos de caja y el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto, este desembolso se solicita para el rubro de Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social.

A la fecha la consultoría se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Interventoría para realizar el traslado de los recursos existentes y proceder con el cierre de la cuenta destinada al anticipo.

No obstante, la Consultoría se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para la consignación de los rendimientos financieros causados durante el mes de junio de 2026, así como las actuaciones administrativas y financieras requeridas para el trámite correspondiente al cobro del segundo giro del anticipo, de conformidad con las observaciones que realice la interventoría en la presente solicitud.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

ANEXOS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

EGRESO REGALIAS Nro: ERG - 2025000003

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

EGRESO REGALIAS Nro: ERG - 2025000003

Nit: 900258711-1

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	OPR	2025000002	30-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO GPM VIAL
DIRECCION TV 60 # 115-58 TOB OFI 601
BANCO **CUENTA**
PAGADO A CONSORCIO GPM VIAL
DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** **Numer** **ICCU-CTO-785-20**
DESCRIPCION

CC o NIT 901985761 **DV** 1
TELEFONO 3004400789
TIPO CUENTA Cta Cte
VALOR PAGO 00.00
TIPO PAGO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS: 1. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL SECTOR RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CASCO URBANO GAMA, 3. VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VÍA DESDE EL- PAGO ANTICIPO DEL 20%

SON CERO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
PGOSGR	901985761	Ejecución proyectos de inversión SGR	00.00	926,254,816
CXPSGR	901985761	Ejecución proyectos de inversión SGR	926,254,816.00	00
		SUMAS IGUALES	**926,254,816.00**	**926,254,816.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000016	2025000017	-00RG-2402-0602-2024000050021-00RG	Proyecto. -Estudios y diseños de la red vial regional para mejorar la competitividad del departamento de Cundinamarca. FUENTE: 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	966,880,027.00
TOTAL PRESUPUESTO				**966,880,027.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO OPR-2025000002

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
IMPUESTO TIMBRE DECRETO 0175 2025	901985761 CONSORCIO GPM VIAL	4,062,521,121	1	40,625,211.00
TOTAL DEDUCCIONES				**40,625,211.00**

Elaboró: TANIA

Revisó:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

HOJA 1 de 1		
Fecha		
8	enero	26
DD	MM	AA

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

ICCU
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 785 DE 2025

PROGRAMACION INICIAL ☐

REPROGRAMACION ☑

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS: 1. VÍA DESDE EK CASCO URBABI DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CSCO URBANO DE GAMA, 3. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO RBABO DE TIBACUY, 5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTIÑO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA., 7. VÍA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA"3

INTERVENTOR	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.
VALOR CONTRATO	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.834.400.134,00)
PORCENTAJE DE ANTICIPO	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR ANTICIPO	$ 966.880.027,00
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO

B. DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social	$ 140.974.566,00	**14,60**
2	Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería	$ 389.424.113,00	**40,30**
3	Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos públicos)	$ 9.000.000,00	**0,90**
4	Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo	$ 23.000.000,00	**2,40**
5	Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios	$ 399.481.348,00	**41,30**
6	Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías	$ 2.000.000,00	**0,20**
7	Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal	$ 3.000.000,00	**0,30**
	TOTAL ANTICIPO	**$ 966.880.027,00**	**100%**

NOTAS
a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de coordinadores en Bogotá D.C., a los:

SEIS 6 días del mes de FEBRERO de 2026

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal de Consultoría
CONSORCIO GPM VIAL

Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Karen Criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

CRONOGRAMA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

HOJA 1 de 1		
Fecha		
8	enero	26
DD	MM	AA

CRONOGRAMA INVERSIÓN ANTICIPO

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. 785 DE 2025

PROGRAMACION INICIAL ☐

REPROGRAMACION ☑

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS: 1. VÍA DESDE EK CASCO URBABI DE CAQUEZA HASTA EL CASCO URBANO DE FOSCA, 2. VÍA DESDE EL RAMAL GAMA (GACHETÁ) AL CSCO URBANO DE GAMA, 3. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE UNE AL SECTOR CARAZA, 4. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE SILVANIA AL CASCO RBABO DE TIBACUY, 5. VIA DESDE EL CASCO URBANO DE CAYETANO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, SECTOR EL MORTIÑO, 6. VIA DEL ANILLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ÚTICA., 7. VÍA QUE CONECTA LA GLORIETA DE CARTAGENITA HASTA EL SECTOR DE SANTA MARTA"3

INTERVENTOR	TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.
VALOR CONTRATO	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.834.400.134,00)
PORCENTAJE DE ANTICIPO	20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR ANTICIPO	$ 966.880.027,00
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO

B. DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCION	VALOR	1	2
1	Pagos Salarios, Honorarios y/o Seguridad Social	$ 140.974.566,00	$ 104.966.456,00	$ 36.008.110,00
2	Pagos a Proveedores de Servicios de Ingeniería	$ 389.424.113,00	$ 389.424.113,00	$ 0,00
3	Gastos Administrativos (Arrendamientos, contaduria, servicos públicos)	$ 9.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
4	Gastos de transporte y/o alquiler de vehículos para personal, transporte maquinaria trabajos en campo	$ 23.000.000,00	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00
5	Gastos de contratación de equipos, topografía, laboratorio, perforaciones y complementarios	$ 399.481.348,00	$ 399.481.348,00	$ 0,00
6	Gastos de papelería, edición de informes, planos, fotocopias, fotografías	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
7	Gastos de Dotaciones y Eliementos de protección del personal	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00
	TOTAL ANTICIPO	**$ 966.880.027,00**	**$ 913.871.917,00**	**$ 53.008.110,00**

NOTAS
a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el instructivo de coordinadores en Bogotá D.C., a los:

TRECE 13 días del mes de FEBRERO de 2026

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

ORDENES DE GIRO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

16 02 2026 066.756

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	10

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
8 84582 6			ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PERSONAL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de marzo de 2026	16-feb.-26	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PERSONAL	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	104.966.756	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PERSONAL	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	104.966.756
		TOTAL DEL DOCUMENTO	104.966.756	104.966.756

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:02:48 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 104.966.756,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años — Compañía de diseño y consultoría	GRUPO POSSO — Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-	IMGA S.A.S. Ingeniería Mercadeo Gerencia y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN: 3 / FECHA: 29/08/2023 / PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	**Consultor**	CONSORCIO GPM VIAL	**Fecha de actualización:**	25/02/2026	Orden de Giro No.	1

DATOS ORDEN DE GIRO

No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
001	PAGOS, SALARIOS, HONORARIOS Y/O SEGURIDAD SOCIAL	1	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 001-2026 REEMBOLSO	Pagos destinados a cubrir la remuneración del personal y sus. obligaciones laborales y de seguridad social	$104.966.456,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$104.966.456,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal Interventoría
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra.
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

02 03 2026 .424.113

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	11

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
8 84582 6			ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PROVEEDORES
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar.-26	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PROVEEDORES	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	336.824.113	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PROVEEDORES	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	336.824.113
11200501	ANTICIPO	SPIRAL INGENIERIA SAS	0	19.300.000
13300501	ANTICIPO	SPIRAL INGENIERIA SAS	19.300.000	0
11200501	DEV ANTICIPO SPIRAL	GRUPO POSSO S A S	0	19.300.000
23809501	PAGO ANTICIPO 1 7	GRUPO POSSO S A S	19.300.000	0
11200501	DEV ANTICIPO TESCON	GRUPO POSSO S A S	0	7.000.000
23809501	PAGO PAGO VOLUMEN I. ANTICIPO 20% TF 2 3 2	GRUPO POSSO S A S	7.000.000	0
11200501	DEV ANTICIPO TESCON	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	7.000.000
23809501	PAGO PAGO VOLUMEN I. ANTICIPO 20% TF 2 3 1	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	7.000.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	389.424.113	389.424.113

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 30 Años — Consorcio de diseño y consultoría	Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-	IMGA S.A.S. Ingeniería Montilla González y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN: 3 / FECHA: 29/08/2023 / PÁGINA: 1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoria No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vias: 1. Vía desde el casco urbano de Caqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	**Consultor**	CONSORCIO GPM VIAL	**Fecha de actualización:**	25/02/2026	**Orden de Giro No.**	2

DATOS ORDEN DE GIRO													
No.	**Item**	**No. de orden**	**Consorcio**	**Nombre del Beneficiario**	**Nit o CC del Tercero**	**Fecha documento soporte o fac. venta**	**Tipo de documento**	**Anticipo SI / NO**	**No. documento soporte o fac. venta**	**Concepto**	**Valor del Giro**	**Cuenta bancaria**	**Entidad Bancaria**	**Tipo de Cuenta**
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	2	CONSORCIO GPM VIAL	SPIRAL INGENIERÍA SAS	830.083.649-6	15-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 0015-2025	Volumen II estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, plan de manejo de transito y modelación BIM.	$19.300.000,00	0242011013	BBVA	Corriente
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	2	CONSORCIO GPM VIAL	SPIRAL INGENIERÍA SAS (SE GIRA A GRUPO POSSO SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.007.208-9	15-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO DEL 19/2/2026	Volumen II estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial, plan de manejo de transito y modelación BIM.	$19.300.000,00	50626417151	Bancolombia	Corriente
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	2	CONSORCIO GPM VIAL	TESCON INGENIERIA SAS (SE GIRA A GEOTECNIA Y CIMENTACIONES SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.184.582-6	25-nov-25	FACTURA	SI	CUENTA DE COBRO No. 8/2026	Volumen I - Estudio de Transporte	$7.000.000,00	056000169999735	Davivienda	Corriente
002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	2	CONSORCIO GPM VIAL	TESCON INGENIERIA SAS (SE GIRA A GRUPO POSSO SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.007.208-9	25-nov-25	FACTURA	SI	CUENTA DE COBRO DEL 19/2/2026	Volumen I - Estudio de Transporte	$7.000.000,00	50626417151	Bancolombia	Corriente

EOTECNIA & IMENTACIONES
Compañía de diseño y consultorio
30 Años

Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-

IMGA S.A.S.
Ingeniería Moncada Gonzalez y Asociados S.A.S.
Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS

VERSIÓN	3
FECHA	29/08/2023
PÁGINA	1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."			**Consultor**	CONSORCIO GPM VIAL		**Fecha de actualización:**	25/02/2026		**Orden de Giro No.**	2		

002	PAGOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA	2	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 002-2026 - CONTRATO 004	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION; VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO; VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRAULICA Y SOCAVACIÓN; VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS, VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL, VOLUMEN XI. ESTUDIO AMBIENTAL PARA VÍA A TRAZAR; VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$336.824.113,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$389.424.113,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoria

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:02:29 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Spiral Ingenieria

Identificación destinatario
830083649

Producto destino
242 - 0001000110 - 13

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco Bbva

Valor
COP $ 19.300.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:14:06 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Grupo Posso

Identificación destinatario
800007208

Producto destino
506 - 264171 - 51

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 19.300.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:14:50 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Grupo Posso

Producto destino
506 - 264171 - 51

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Identificación destinatario
800007208

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 7.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:03:09 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 7.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:02:07 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 336.824.113,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

16 02 2026 4.500.000

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	12

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT		
8[illegible]184582 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984

POR CONCEPTO DE
ANTICIPO CONTRATO 005-2025 ARRENDAMIENTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	16-feb.-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 ARRENDAMIENTOS	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	4.500.000	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 ARRENDAMIENTOS	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	4.500.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.500.000	4.500.000

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 30 AÑOS — Compañía de diseño y consultoría	GRUPO POSSO — Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-	IMGA S.A.S. Ingeniería Moncada González y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN	3
				FECHA	29/08/2023
				PÁGINA	1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gacheta) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	Consultor	CONSORCIO GPM VIAL	Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.	3

DATOS ORDEN DE GIRO														
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
003	GASTOS ADMINISTRATIVOS (ARRENDAMIENTOS, CONTADURÍA, SERVICIOS PÚBLICOS)	3	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 003-2026	Arrendamiento de espacio y/u oficnas para funcionamiento administrativo y técnico de la consultoría	$4.500.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$4.500.000,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoria

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.525 de Cucuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS.
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratacion Estatal, Gerencia y Direccion de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.500.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

16 02 2026 11.500.000

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	13

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT		
8 84582 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984

POR CONCEPTO DE
ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRANSPORTES

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de marzo de 2026	16-feb.-26	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRANSPORTES	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	11.500.000	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRANSPORTES	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	11.500.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.500.000	11.500.000

ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 30 Años — Compañía de diseño y consultorio	GRUPO PSSO — Empresas de Ingeniería de Peruanas con Discapacidad -PcD-	IMGA S.A.S. Ingeniería Moncada González y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN	3
				FECHA	29/08/2023
				PÁGINA	1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachela) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de ume al sector Caraza. 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Utica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa María."	Consultor	CONSORCIO GPM VIAL	Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.	4

No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	DATOS ORDEN DE GIRO Tipo de documento	Anticipo	No. documento soporte	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
004	GASTOS DE TRANSPORTE Y/O ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL, TRANSPORTE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	4	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO No. 004-2026	Alquiler de vehículos para personal y transporte de maquinaria	$11.500.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$11.500.000,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:01:32 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 11.500.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

02 03 2026 399.481.348

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	14

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
8[illegible]184582 6			ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIOS DE SUELOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar.-26	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIOS DE SUELOS	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	331.481.348	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 005-2025 TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIOS DE SUELOS	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	331.481.348
11200501	ANTICIPO	ICADEL INGENIERIA SAS	0	34.000.000
13300501	ANTICIPO	ICADEL INGENIERIA SAS	34.000.000	0
11200501	DEV ANTICIPO ICADEL	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	34.000.000
23809501	PAGO ANTICIPO 1 ICADEL 6	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	21.040.000	0
23809501	PAGO ANTICIPO 2 ICADEL 6	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	12.960.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	399.481.348	399.481.348

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 30 Años — Compañía de diseño y consultoría / GRUPO PSSO — Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD- / IMGA S.A.S. — Ingeniería Moncada González y Asociados S.A.S. — Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN	3
		FECHA	29/08/2023
		PÁGINA	1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoria No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vias: 1. Via desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Via desde el sector Ramal Gama (Gacheta) al casco urbano Gama, 3. Via desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Via desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Via desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Via del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Via que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	Consultor	CONSORCIO GPM VIAL	Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.	5

DATOS ORDEN DE GIRO

No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento soporte o fac. venta	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento soporte o fac. venta	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	ICADEL INGENIERÍA SAS	900.268.342-1	1-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 005-2025	VOLUMEN II - Estudio de Topografia, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial y Plan de Manejo de Tránsito - Componente Topografia	$34.000.000,00	1008899424	Colpatria	Ahorros
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	ICADEL INGENIERÍA SAS (SE GIRA A GEOTECNIA Y CIMENTACIONES SAS INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUIEN PRESTO AL CONSORCIO GPM VIAL PARA PAGO DE ANTICIPO)	800.184.582-6	1-dic-25	CUENTA DE COBRO	SI	CUENTA DE COBRO No. 009-2026	VOLUMEN II - Estudio de Topografia, trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial y Plan de Manejo de Tránsito - Componente Topografia	$34.000.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
005	GASTOS DE CONTRATACION DE TOPOGRAFIA, LABORATORIO, PERFORACIONES Y COMPLEMENTARIOS	5	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	13-ene-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO 318-2026 - CONTRATO 005	TRABAJOS DE CAMPO INSTRUMENTACIÓN LABORATORIOS DE SUELOS LABORATORIOS DE FUENTES DE MATERIALES LABORATORIOS DE APIQUES LABORATORIOS DE NUCLEOS AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS TRANSPORTES	$331.481.348,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$399.481.348,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoria
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761

Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:13:35 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Icadel Ingenieria

Producto destino
100 - 88994 - 24

Banco
Scotiabank Colpatria S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Identificación destinatario
900268342

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 34.000.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:01:06 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 34.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.57.225.105

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:12:13 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 331.481.348,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

16 02 2026 1.000.000

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

UN MILLON DE PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	15

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT		
800184582 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984

POR CONCEPTO DE
ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de marzo de 2026	16-feb.-26	ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PAPELERIA	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	1.000.000	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 PAPELERIA	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	1.000.000

GEOTECNIA & CIMENTACIONES 30 Años	PSSO	IMGA S.A.S. Ingeniería Moncada Gonzalez y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN 3
				FECHA 29/08/2023
				PÁGINA 1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoría No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	Consultor	CONSORCIO GPM VIAL	Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No.	6

DATOS ORDEN DE GIRO														
No.	Item	No. de orden	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del Tercero	Fecha documento	Tipo de documento	Anticipo SI / NO	No. documento	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta
006	GASTOS DE PAPELERÍA, EDICIÓN DE INFORMES, PLANOS, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS	6	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS		6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO G&C 006-2026	Edición de Informes	$1.000.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$1.000.000,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S. 800.184.582-6

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:12:54 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

16 02 2026 3.000.000

GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

CONSORCIO GPM VIAL

Nit 901985761

COMPROBANTE DE EGRESO	16

BENEFICIARIO
GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S

NIT		
800184582 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 128 B 57 C 06	Bogota D.C	3157006984

POR CONCEPTO DE
ANTICIPO CONTRATO 004-2025 DOTACION

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 2 de marzo de 2026	16-feb.-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ANDREA CATALINA SANTANA BUSTOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 DOTACION	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	3.000.000	0
11200501	ANTICIPO CONTRATO 004-2025 DOTACION	GEOTECNIA & CIMENTACIONES	0	3.000.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.000.000	3.000.000

Valor en Letras
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EOTECNIA & IMENTACIONES 30 Años — Compañía de diseño y consultoría	GRUPO PSSO — Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-	IMGA S.A.S. Ingeniería Mondada González y Asociados S.A.S. Empresa de Personas con Discapacidad -PcD-	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	VERSIÓN 3 FECHA 29/08/2023 PÁGINA 1 DE 1

Proyecto:	Contrato de Consultoria No. ICCU-785-2025 Cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños de las vías: 1. Vía desde el casco urbano de Cáqueza hasta el casco urbano de Fosca, 2. Vía desde el sector Ramal Gama (Gachetá) al casco urbano Gama, 3. Vía desde el casco urbano de une al sector Caraza, 4. Vía desde el casco urbano de Silvania al casco urbano de Tibacuy, 5. Vía desde el casco urbano de San Cayetano conduce al casco urbano del municipio de Cogua, sector el Mortiño, 6. Vía del anillo vial en el municipio de Útica, 7. Vía que conecta la glorieta de Cartagenita hasta el sector de Santa Marta."	Consultor	CONSORCIO GPM VIAL	Fecha de actualización:	25/02/2026	Orden de Giro No. 7

DATOS ORDEN DE GIRO													
No.	Item	No.	Consorcio	Nombre del Beneficiario	Nit o CC del	Fecha	Tipo de	Antici	No.	Concepto	Valor del Giro	Cuenta bancaria	Entidad	Tipo de
007	GASTOS DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7	CONSORCIO GPM VIAL	GYC INGENIERÍA SAS	800.184.582-6	6-feb-26	CUENTA DE COBRO	NO	CUENTA DE COBRO G&C 007-2026	Dotaciones y EPP - Personal de nómina	$3.000.000,00	0560001169999735	Davivienda	Corriente
											$3.000.000,00			

Karen criado

KAREN DAYANA CRIADO VEGA
Representante Legal de Interventoría

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO GPM VIAL
Persona con Discapacidad Psicosocial –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO con No. Identificador 265247.
Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obra
CIDENAL 51 – ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio Gpm Vial - Nit: 901985761
Viernes, 06 de marzo de 2026, 3:01:49 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Nombre del destinatario
Geotecnia Y Ciment

Identificación destinatario
800184582

Producto destino
201 - 405609 - 01

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.57.225.105

CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

9 Jul 2026 11:30
NIT 901985761
Usuario: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Comercio
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Referencia 1
02

Fecha
9 Jul 2026 11:30

Referencia 2
8600343131

Número de factura
166406388

Referencia 3
6412

Descripción del pago
Reintegro de Rendimientos Financieros

Valor del Pago
$347,67

Número de comprobante
TR260709163011AegAQO

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 6330**

DAVIVIENDA

Resumen de pago PSE-166406388

Concepto: Reintegro de Rendimientos Financieros

Valor pagado: $ 347.67 COP

Estado: pending

Fecha de pago:09/07/2026 16:28:41

- -

Instituto De Infraestructura Y Conceciones De Cund

Dirección: CRA 3A 54A 22

Teléfono: 7490000

- -

Identificador: PSE-166406388

SALDO EN CUENTA DE ANTICIPO

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.

SALDO ACTUAL	$	8,460,917.81

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel.: 601 7477763
Calle 128B No. 57C - 06
E–mail: consorciogpmvial@gmail.com
Bogotá D.C.
