Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL **01 de JULIO de 2026 AL 31 de JULIO de 2026**

CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.9352770/2376 - 2026**

REGISTRO BPyP No.: **2025 00005 0006**

FECHA INICIACIÓN: 06 de ABRIL de 2026

FECHA TERMINACIÓN: **05 de ABRIL de 2027**

CONTRATISTA: **CONSORCIO AGRO RESILIENTE BOYACA 2026**

SUPERVISOR: **SARA LORENA VEGA FLOREZ**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ BPIN 2025000050006"

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Presentar informes mensuales con el fin de dar seguimiento a las actividades del proyecto dando cumplimiento a lo establecido dentro del cronograma de actividades propuestas por la coordinación técnica	Elaboración y entrega de informes mensuales que evidencien el avance y cumplimiento de las actividades programadas.		X		
2	Dar cumplimiento al objeto del presente proceso, así como al alcance del mismo con relación a las actividades propuestas para ello dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de selección.	Ejecución de las actividades contratadas de acuerdo con el objeto, alcance, propuesta y plazos establecidos.		X		
3	Tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las actividades contempladas en el alcance del objeto lo dispuesto en el documento técnico del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ BPIN 2025000050006", así como los anexos que hacen parte del mismo, especialmente los que se contemplan en el presente estudio previo.	Desarrollo de las actividades conforme al documento técnico, anexos y demás lineamientos establecidos para el proyecto.		X		
4	Emplear para la ejecución del contrato el personal adecuado e idóneo para la ejecución del mismo.	Disposición del personal necesario, competente e idóneo para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.		X		
5	El contratista deberá asumir la totalidad de los gastos de transporte que se ocasionen por las actividades propias de la ejecución contractual a cada uno de los municipios priorizados por la entidad conforme al alcance del objeto del proceso.	Cumplimiento de los desplazamientos de personal requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales en los municipios priorizados por la entidad, de acuerdo a la programación entregada.		X		

6	Reconocer y cancelar oportunamente al personal contratado los honorarios pactados conforme a lo dispuesto en la propuesta y los documentos del proceso	De acuerdo al personal contratado se da cumplimiento al pago oportuno de honorarios de acuerdo con las condiciones establecidas.		X		
7	Observar con estricto cumplimiento de la normatividad vigente para la vinculación del personal mínimo requerido, así como cumplir con los aportes a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales según corresponda	Cumplimiento al pago de seguridad social y soportes de acuerdo a la normatividad vigente.		X		
8	El contratista se obliga a ejecutar el objeto y las obligaciones derivadas del contrato con el personal solicitado en el presente proceso, que cuenten con la idoneidad y experiencia, previa coordinación con el funcionario designado para ejercer la vigilancia y control	De acuerdo a los perfiles solicitados se da cumplimiento a la experiencia e idoneidad requerida.		X		
9	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Durante el Presente periodo se atienden las solicitudes adicionales derivadas del contrato, la normativa vigente y aquellas necesarias para su adecuada ejecución.		X		

Firma: _____

Nombre: **SARA LORENA VEGA FOREZ**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **MARIA FERNANDA MONROY KAYE**

CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

JUANA VIVIANA CORTES

FECHA 22-09-2026

Gobernación de Boyacá · Siembra · Consorcio AgroResiliente Boyacá 2026

Informe
Ejecutivo de Avance

N°.4 / JULIO DE 2026

BPIN 2025000050006".



Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática **en el Departamento de Boyacá**

Contenido

1. Introducción....4
2. Objetivos....5
2.2 Objetivo General....5
2.3 Objetivos específicos....5
3. Cronograma....6
4. Indicadores del proyecto....7
5. Informe de Avance Físico....9
5.1 Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.....9
5.2 Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.....10
5.2.1 Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico).....10
5.2.2 Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados.....12
5.2.3 Reportar compendios de evidencia de Transporte.....13
6. Informe de Avance financiero....15
6.2 Actividad 2. Implementar El Manejo Sostenible De Cultivos Con Vocación Productiva Para El Fortalecimiento De La Agricultura Familiar Y De Comercialización....15
7. Informe de Avance jurídico....23
7.1 Obligaciones Legales Y Contractuales Del Contratista....23
7.2 Relación De Contratos Asociados Al Proyecto....24
7.3 Cumplimiento Sistema De Seguridad Social.....27
8. Conclusiones....28

Índice de Tablas

Tabla 1. Cronograma de actividades 6
Tabla 2. Indicadores 7
Tabla 3. Avance de ejecución de la Actividad No.1 9
Tabla 4. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados. 10
Tabla 5. Avance de ejecución de la Actividad No.2 13
Tabla 6. Detalle Actividad 2 15
Tabla 7. Detalle de Mano de Obra Calificada 15
Tabla 8. Detalle de Maquinaria y Equipos 17
Tabla 9. Detalle de Materiales 18
Tabla 10. Detalle de Materiales 19
Tabla 11. Detalle de Materiales 20
Tabla 12. Detalle de Transporte 20
Tabla 13. Avance por Actividad 22
Tabla 14. Personal Administrativo Contratado 25
Tabla 15. Personal Operativo Contratado 25

Índice de Figuras

Figura 1. Registro fotográfico de Toma de análisis de suelos 12
Figura 2. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2. 21
Figura 3. Gráfica del porcentaje de avance financiero del proyecto. 22

1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar el desarrollo de las actividades de entrega de materiales para la construcción de tanques, insumos, herramientas y maquinaria del proyecto *"Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá"*, articulado con la Actividad 2: Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización. Estas acciones estuvieron orientadas en la respectiva entrega en los municipios de Almeida, Boavita, Buenavista, Campohermoso, Chiscas, Chita, Ciénega, Coper, Corrales, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Jericó, La Uvita, La Victoria, Muzo, Otanche, Páez, San Eduardo, San Mateo, Santana, Sativanorte, Soatá, Socotá, Somondoco, Susacón, Sutatenza, Tenza, Tinjacá y Ventaquemada.

Desde el componente técnico, se presenta el reporte de 800 resultados de análisis de suelos de los 40 municipios luego de realizados los muestreos en cada uno de los predios de os beneficiarios del proyecto. Estos resultados y recomendaciones son entregados y socializados durante el acompañamiento técnico en cada unidad productiva familiar, con el fin de establecer planes de fertilización que fortalezcan la efectividad de la aplicación de fertilizantes, enmiendas, esperando un incremento en la productividad de los cultivos, mejores rendimientos y disminución de costos de inversión por parte de las familias.

Finalmente, se presentan los resultados derivados de las actividades ejecutadas, incluyendo la consolidación de las actas de entrega materiales para la construcción de tanques, insumos, herramientas y maquinaria los municipios y los resultados de la toma de análisis de suelos. Estos resultados permiten establecer bases sólidas para este inicio de la fase de implementación, asegurando la articulación entre el componente técnico, social y productivo, así como la sostenibilidad de las acciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina frente a los desafíos asociados a la variabilidad climática en el territorio.

2. Objetivos

2.2 Objetivo General

Fortalecer la capacidad de adaptación de las unidades de agricultura familiar y campesina en el mantenimiento de cultivos establecidos ante la variabilidad climática en el Departamento de Boyacá.

2.3 Objetivos específicos

Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.

Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.

Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.

3. Cronograma

Tabla 1. Cronograma de actividades

Objetivos Específicos	Indicador de producto MGA WEB.	Actividad	Rubro	Periodo 0											
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.	Producto 1.1: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto Principal del Proyecto). Medido a través de: Número de productores Cantidad: 800	Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	Mano de obra calificada (Talento Humano)	■	■										
			Mano de obra calificada (Talento Humano)	■											
			Materiales	■	■										
			Otros Servicios (Espacios)	■	■										
		Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	Mano de obra calificada (Talento Humano)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Maquinaria y equipos			■	■								
			Materiales			■	■								
			Materiales			■	■								
			Mano de obra calificada (Analisis)				■								
			Transporte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.	Producto 2: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores Medido a través de: Número de pequeños productores rurales Cantidad: 800	Actividad 3. Capacitar en la cosecha y manejo eficiente del recurso hídrico para la productividad ante la variabilidad climática	Mano de obra calificada (Talento Humano)							■	■				
			Maquinaria y equipos							■	■				
			Materiales							■	■				
			Otros Servicios (Espacios)							■	■				
			Transporte							■	■				
		Actividad 4. Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.	Mano de obra calificada (Talento Humano)					■	■						
			Maquinaria y equipos					■	■						
			Materiales					■	■						
			Otros Servicios (Espacios)					■	■						
			Transporte					■	■						
Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.	Producto 3.1: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Medido a través de: Número de asociaciones Cantidad: 1	Actividad 5. Fortalecimiento de procesos asociativos y estrategias de comercialización en pequeños productores.	Mano de obra calificada (Talento Humano)										■	■	
			Maquinaria y equipos										■	■	
			Materiales										■	■	
			Otros Servicios (Espacios)										■	■	
			Transporte										■	■	
		Actividad 6. Realizar el apoyo a la supervisión	Mano de obra calificada (Talento Humano)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Desarrollo de acciones de cierre y liquidacion	N/A												

Nota: Fuente Plan operativo - 2. Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026

4. Indicadores del proyecto

Tabla 2. Indicadores

Objetivos Específicos	Indicador de producto MGA WEB.	Actividad	Valor Total Actividad	Rubro	Valor Rubro	Indicador	Cantidad
Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.	Producto 1.1: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto Principal del Proyecto). Medido a través de: Número de productores Cantidad: 800	Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	$ 405.721.665	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 61.777.639	No. de informes de planeacion y desarrollo tecnico	2
				Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 174.817.220	No. de informes de implementacion y acompañamiento tecnico	1
				Materiales	$ 141.621.251	No. de actas de formalizacion de acuerdos con los beneficiarios	800
				Otros Servicios (Espacios)	$ 27.505.555	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
		Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	$ 21.540.621.343	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 2.057.060.396	No. de informes de implementacion y acompañamiento tecnico	10
				Maquinaria y equipos	$ 11.613.007.270	No. de actas de entrega de equipos	800
				Materiales	$ 7.101.057.452	No. de actas de enrega de insumos para fertilizacion	800
				Materiales	$ 275.002.969	No. de actas de entrega de herramientas	
				Mano de obra calificada (Analisis)	$ 283.145.423	No. de analisis de suelo	800
				Transporte	$ 211.347.833	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	11
Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.	Producto 2: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores Medido a través de: Número de pequeños productores rurales Cantidad: 800	Actividad 3. Capacitar en la cosecha y manejo eficiente del recurso hídrico para la productividad ante la variabilidad climática	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1
		Actividad 4. Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1

Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.	Producto 3.1: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Medido a través de: Número de asociaciones Cantidad: 1	Actividad 5. Fortalecimiento de procesos asociativos y estrategias de comercialización en pequeños productores.	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1
		Actividad 6. Realizar el apoyo a la supervisión.	$ 339.751.680	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 339.751.680	No. de informes tecnicos, financieros y juridicos de supervision	12
Total			$ 23.069.995.735	**Total**	$ 23.069.995.735	**Total**	**1.189**

Nota: Fuente Plan operativo - 2. Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026

5. Informe de Avance Físico

5.1 Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.

De acuerdo con lo planteado por el documento técnico para la consecución y selección de las familias beneficiarias del proyecto, de da por finalizada la actividad, en este caso no se reporta ejecución en el periodo del presente informe.

Tabla 3. Avance de ejecución de la Actividad No.1

Actividad	Descripción	Entregable	Cantidad	Avance	%Avance	%Avance Total
Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	Realizar eventos de Sensibilización en municipios priorizados	Informe eventos de sensibilización	40	40	100	1.025
	Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria	Actas de Compromiso	800	800	100	0.733

Nota: Fuente equipo operador

El indicador de avance de la actividad se da de acuerdo con el número de actas de compromiso firmadas por las familias que desean participar de forma voluntaria y eventos de sensibilización, el avance de la actividad es de 100%.

5.2 Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.

5.2.1 Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico).

Durante el periodo reportado del presente informe, se realizó actividad de entrega de Materiales para la construcción de tanques Zamorano, insumos, Herramienta y maquinaria en los municipios de acuerdo como lo muestra la siguiente tabla entregando 20 kits por municipio para un total de 500 tanques construidos, 500 Motoazadas entregadas y 520 kits de insumos entregados a las familias como se resume en la Tabla 4 a continuación:

Tabla 4. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados.

MUNICIPIO	TANQUES	MOTOAZADAS	INSUMOS Y HERRAMIENTAS
ALMEIDA	20	20	20
BOAVITA	20	20	20
BUENAVISTA	20	20	20
CAMPOHERMOSO	20	20	20
CHISCAS	20	20	20
CHITA	0	20	20
CIÉNEGA	20	20	20
COPER	20	20	20
CORRALES	20	Entregado en Junio	Entregado en Junio
GUACAMAYAS	20	20	20
GUATEQUE	20	20	20
GUAYATÁ	20	20	20
JERICÓ	0	20	20
LA UVITA	20	20	20
LA VICTORIA	20	0	0
MUZO	20	0	0

OTANCHE	20	0	0
PÁEZ	20	20	20
SAN EDUARDO	20	20	20
SAN MATEO	20	20	20
SANTANA	Entregado en Junio	Entregado en Junio	20
SATIVANORTE	20	20	20
SOATÁ	20	20	20
SOCOTÁ	0	20	20
SOMONDOCO	0	20	20
SUSACÓN	20	20	20
SUTATENZA	20	20	20
TENZA	20	20	20
TINJACÁ	20	20	20
VENTAQUEMADA	20	20	20
TOTAL	**500**	**500**	**520**

Nota: Fuente equipo operador

En este sentido la ampliación de la información se reporta en el 3. Informe de implementación en el manejo sostenible de cultivos que reposa en el anexo 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos.

Se hace entrega de 500 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de la motoazada de 7HP en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.2 ACTAS ENTREGA DE MOTOAZADAS.

De la misma manera se hace entrega de 500 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la construcción de tanques Zamorano de 22 mil litros en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/1.2.2 ACTAS ENTREGA DE TANQUES CONSTRUIDOS

Se hace entrega de 520 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de insumos y herramienta básica en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.3 ACTAS ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS.

5.2.2 Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados.

Se reportan 800 resultados de análisis de suelos de los 40 municipios luego de realizados los muestreos en cada uno de los predios de os beneficiarios del proyecto como se muestra en la siguiente figura. Estos resultados y recomendaciones son entregados y socializados durante el acompañamiento técnico en cada unidad productiva familiar, con el fin de establecer planes de fertilización que fortalezcan la efectividad de la aplicación de fertilizantes, enmiendas, esperando un incremento en la productividad de los cultivos, mejores rendimientos y disminución de costos de inversión por parte de las familias.

Figura 1. Registro fotográfico de Toma de análisis de suelos



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Los resultados reposan en el Anexo 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.4 RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS/ Municipio de interés.

5.2.3 Reportar compendios de evidencia de Transporte.

De acuerdo al desarrollo y ejecución de la actividad para el periodo del presente informe se reporta la utilización de transporte para el cumplimiento de las demás actividades del proyecto y se presenta documento de reporte de transporte correspondiente a la subactividad mencionada. El soporte se encuentra en la carpeta 3. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos. /1.2.5 Reportar compendios de evidencia de Transporte/ 4. Reporte de transporte julio 2026.

Tabla 5. Avance de ejecución de la Actividad No.2

Actividad	Descripción	Entregable	Cantidad	Avance	%Avance	%Avance Total
Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico)	Informes técnicos de implementación	10	3	30	2.67
	Realizar actas de entrega de maquinaria (Motoazadas) y equipos (Tanque y Maguera)	Actas de entrega de Motoazadas y tanques y manguera	800	700	87.5	44.04
	Realizar actas de entrega de kit de Insumos agrícolas y herramientas	Actas de entrega de kit de Insumos agrícolas y herramientas	800	700	87.5	27.97
	Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados	Resultados de análisis de suelos	800	800	100	1.22
	Reportar compendios de evidencia de Transporte	Reportes de transporte	11	4	36.36	0.33

Nota: Fuente equipo operador

El Porcentaje de avance en ejecución física de la actividad No.2 al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **81.67%.**

El Porcentaje de avance en ejecución física de proyecto al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **78.13%.**

6. Informe de Avance financiero

Ejecución Presupuestal con Cargo a las Actividades

6.2 Actividad 2. Implementar El Manejo Sostenible De Cultivos Con Vocación Productiva Para El Fortalecimiento De La Agricultura Familiar Y De Comercialización

Respecto a la actividad ya mencionada, tiene un valor de $21.540.621.343 la cual se discrimina a saber:

Tabla 6. Detalle Actividad 2

Actividad	Valor Actividad	Rubro	Valor Rubro
Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización	$21.540.621.343	Mano de Obra Calificada (Talento humano)	$2.057.060.395,59
		Maquinaria y Equipos	$11.613.007.269,91
		Materiales	$7.101.057.451,84
		Materiales	$275.002.969,44
		Mano de Obra Calificada (Análisis)	$283.145.422,81
		Transporte	$211.347.833,46

Nota: Fuente Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026.

A continuación, se presenta de manera detallada lo que compone cada rubro de esta actividad con el fin de dar cumplimiento financiero a la misma:

Rubro "Mano de Obra Calificada"

Tabla 7. Detalle de Mano de Obra Calificada

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Técnico de acompañamiento Grupo 3-Perfil A: Tecnólogo y/o Técnico con formación en áreas de la zootecnia y/o veterinaria y/o ciencias	40	$ 2.655.230	$ 106.209.200

	agrarias y/o agropecuarias y/o afines, experiencia mayor a 36 meses, dedicación 100%.			
2	Profesional Apoyo Técnico Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas de conocimiento de la zootecnia y/o medicina veterinaria y/o ingenierías agronómica o afines, experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	5	$ 4.164.591	$ 20.822.955
3	Coordinador Técnico Grupo 2-Perfil A: Especialista, con pregrado áreas de la zootecnia, medicina veterinaria y/o ingeniería agronómica encargado de la coordinación técnica, con experiencia entre 34 a 43 meses profesional relacionada, dedicación 100%.	3	$ 4.687.329	$ 14.061.987
4	Profesional de Planeación y Logística Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en el área de la ingeniería, administración de empresas, logística o afines, con experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	1	$ 4.164.591	$ 4.164.591
5	Director Técnico: Grupo 1-Perfil C: Especialista, con pregrado en administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería agrícola, agronómica, agroforestal, o afines con experiencia entre 24 a 44 meses de experiencia relacionada, dedicación 100%.	1	$ 7.131.387	$ 7.131.387
6	Profesional para el desarrollo de procesos sociales y comercialización: Grupo 2 Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas de la zootecnia y/o veterinaria y/o agricultura y/o agroecología y/o agroforestería y/o economía y/o administración y/o contaduría y/o afines, con experiencia de 25 a 34 meses de experiencia laboral, dedicación 100%.	1	$ 4.164.591	$ 4.164.591
7	Coordinador de articulación territorial y asociatividad rural campesina Grupo 1-Perfil D: Especialista en gerencia de proyectos, con pregrado en el área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y afines, con experiencia 12 a 24 meses de experiencia relacionada, dedicación 100%.	1	$ 6.040.908	$ 6.040.908
8	Profesional de apoyo al desarrollo de procesos: Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas del conocimiento: ciencias sociales y humanas, ingeniería civil, Ingeniería Agroindustrial o afines, bellas artes, ciencias de la educación, con experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	2	$ 4.164.591	$ 8.329.182
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 170.924.801
			IVA 19%	$ 32.475.712,19
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 203.400.513,19
			ADMINISTRACION	$ 2.063.054,42
			TOTAL EJECUTADO	**$ 205.463.567,61**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Mano de Obra Calificada y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Maquinaria y Equipos”

Tabla 8. Detalle de Maquinaria y Equipos

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motoazada A gasolina 7 HP. 2 velocidades y reversa + accesorio de adaptacion a motobomba.Art. 468-1 Estatuto Tributario	500	$ 4.277.160	$ 2.138.580.000
2	Manguera Agrominera calibre 60 negra de 2 pulgadasx 100 Mts cada una de las familias Art. 424. E.T. Componente Sistema de Captacion de agua e Irrigacion	500	$ 648.703	$ 324.351.500
3	Tanque: Suministro e instalación en situ de tanques para recoleccion de agua; Elaboración de Geobolsa en geomembrana de 1mm ASTM GM1, diámetro =4,8m altura=1,2, Cordón plástico para amarre de la geo bolsa en la malla. Art. 424. E.T. Componente Sistema de Captacion de agua e Irrigacion	520	$ 9.186.627	$ 4.777.046.040
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 7.239.977.540
			IVA 5%	$ 106.929.000
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 7.346.906.540
			ADMINISTRACION	$ 80.000.000,00
			TOTAL EJECUTADO	**$ 7.426.906.540,00**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Maquinaria y Equipos y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Materiales”

Tabla 9. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bioinsumo, Inoculante biologico que mezcla de ácidos orgánicos, potaso reductores y carbono orgánico, especializados en la inoculación de suelos, acondicionamiento de Rizósfera y Descomposición de Materia Orgánica, presentacion x 4 Litros.	2080	$ 200.408	$ 416.848.640
2	Agente microbial antagonista de fitopatogenos; producto con una mezcla de diferentes especies del hongo antagonista Trichoderma spp. (T. harzianum, T.koningi y T. viridae) los cuales inhiben el crecimiento y desarrollo de hongos fitopatógenos del suelo y follaje, presentacion x 500 grs.	2080	$ 210.272	$ 437.365.760
3	Bioinsecticida; producto biológico, a base de tazas cepas del hongo Metarhizium anisopliae y esporas de la bacteria Bacillus popilliae especializadas en el control de insectos y larvas de algunos coleópteros, presentacion x 500 grs	2080	$ 264.632	$ 550.434.560
4	Fertilizante complejo NPK para aplicación foliar, concentrado soluble, presentacion x 1 litro	2080	$ 277.876	$ 577.982.080
5	Biofungicida y biobactericida, único con base en Bacillustatinas producidas a partir de Bacillus amyloliquefaciens y Carbono Orgánico oxidable de rápida asimilación, presentacion x litro	2600	$ 280.747	$ 729.942.200
6	Bioinsecticida a base de del hongo Beauveria bassiana y esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis especializadas en el control de insectos plaga, x 500 grs	2600	$ 285.502	$ 742.305.200
7	Agente microbial antagonista de hongos fitopatógenos y nematicida a base de hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp., ideal para el control de hongos y nematodos fitoparásitos. Presentacion x 500 grs.	2600	$ 283.935	$ 738.231.000
8	Fertilizante complejo quelatado; potasio Soluble en Agua (K2O) , Calcio (CaO) , Boro (B), para aplicación foliar o al suelo, presentacion x litro	2080	$ 174.131	$ 362.192.480
			SUBTOTAL FACTURA	$ 4.555.301.920
			ADMINISTRACION	$ 50.095.353,12
			TOTAL EJECUTADO	**$ 4.605.397.273,12**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Materiales y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Materiales”

Tabla 10. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Machete 3 canales cacha plástica 18", bi-material	520	$ 37.739	$ 19.624.280
2	Azadon Cafetero 3753 No. 2 con cabo.	520	$ 58.286	$ 30.308.720
3	Pala Cargadora Redonda N°2 (con cabo)	520	$ 52.835	$ 27.474.200
4	Paladraga	520	$ 136.227	$ 70.838.040
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 148.245.240
			IVA 19%	$ 28.166.595,60
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 176.411.835,60
			ADMINISTRACION	$ 2.000.000
			TOTAL EJECUTADO	**$ 178.411.835,60**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Materiales y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro "Mano de Obra Calificada"

Tabla 11. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toma y Análisis de muestras de suelo, incluye embalaje y envio a laboratorio. Acidez Intercambiable, Aluminio intercambiable, Azufre disponible, Calcio Intercambiable, Carbóno Organico, Conductividad Electrica, Fosforo Disponible, Hierro, Magnesio Intercambiable, Manganeso, Mg/K, pH, Potacio Intercambiable, Sodio Intercambiable, Relación Ca/K, Relación Ca/Mg, (Ca+Mg)/K, Capacidad de intercambio Cationico, Cobre, Zinc, Textura. E.T. Numeral 24 Artículo 476.	800	$ 349.930	$ 279.944.000
SUBTOTAL FACTURA CON IVA				$ 279.944.000,00
ADMINISTRACION				$ 3.123.363,20
TOTAL EJECUTADO				**$ 283.067.363,20**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Mano de obra calificada y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

Rubro "Transporte"

Tabla 12. Detalle de Transporte

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de vehículo de 2.000 CC o superior, incluye conductor, combustible, rodamiento y demás costos asociados.	2	$ 7.981.596	$ 15.963.192
SUBTOTAL SIN IVA				$ 15.963.192


IVA 19%	$ 3.033.006,48
SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 18.996.198,48
ADMINISTRACION	$ 211.942,49
TOTAL, EJECUTADO	**$ 19.208.140,97**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Transporte y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

A la fecha de presentación de este informe se presenta un avance financiero de esta actividad 82.20%

Figura 2. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2.

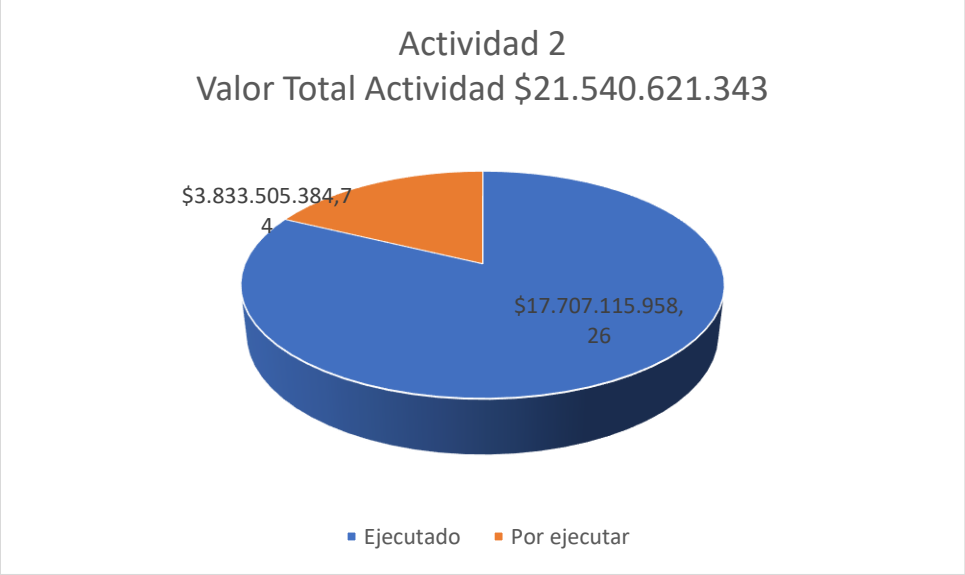

Nota: Fuente equipo operador


Tabla 13. Avance por Actividad

Actividad	Valor Programado	Valor Ejecutado Julio	Valor Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% por Ejecutar
1	$ 405.721.665		$371.051.844,90	91.45%	$ 34.669.820,10	8.55%
2	$ 21.540.621.343	$12.718.454.720,50	$17.707.115.958,26	82.20%	$ 3.833.505.384,74	17.80%
3	$ 261.300.349			0%	$ 261.300.349,00	100%
4	$ 261.300.349			0%	$ 261.300.349,00	100%
5	$ 261.300.349			0%	$ 261.300.349,00	100%
TOTAL	$ 22.730.244.055	$12.718.454.720,50	$18.078.167.803,16	79.53%	$ 4.652.076.251,84	20.47%

Nota: Fuente equipo operador

Como se puede observar en la tabla el proyecto presenta un avance de 79.53%.

Figura 3. Gráfica del porcentaje de avance financiero del proyecto.

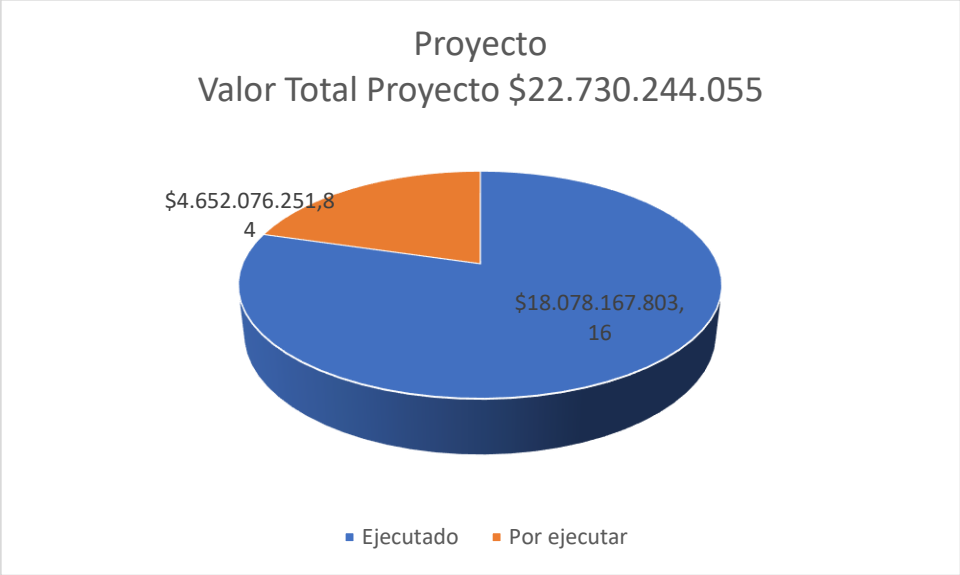

Nota: Fuente equipo operador

Los soportes correspondientes se encuentran dispuestos en la carpeta: 4. INFORME DE AVANCE - JULIO 2026/ ANEXOS/ ANEXOS FINANCIEROS.

7. Informe de Avance jurídico

El presente informe jurídico se elabora desde la perspectiva del CONTRATISTA, Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026, con el propósito de documentar y presentar el estado jurídico de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9352770/2376, particularmente en lo relacionado con las garantías constituidas, los contratos asociados a la operación del proyecto, el contexto técnico y normativo aplicable y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del contratista. El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública y su ejecución se desarrolla dentro del marco jurídico aplicable a la contratación estatal, integrado, entre otras disposiciones, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que regulan el Sistema General de Regalías, así como por las demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resulten aplicables a la naturaleza y alcance del proyecto.

7.1 Obligaciones Legales Y Contractuales Del Contratista

El CONTRATISTA ha orientado la ejecución del contrato al cumplimiento integral de las obligaciones previstas en la minuta contractual, los estudios y documentos que hacen parte del proceso de contratación y demás instrumentos que regulan la ejecución del proyecto. Dentro de dichas obligaciones se encuentran, entre otras, la ejecución técnica y material del objeto contractual, el cumplimiento del plan operativo aprobado, la presentación oportuna de los informes y soportes requeridos, la vinculación del personal idóneo y suficiente para el desarrollo de las actividades, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias, de seguridad social y demás cargas legales derivadas de la ejecución contractual.

En relación con la Actividad No. 2 prevista en el contrato, se adelantó la ejecución material correspondiente a la entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, insumos, herramientas y maquinaria, de conformidad con la programación y distribución establecida para los municipios beneficiarios del proyecto. En desarrollo de esta actividad, se efectuó la entrega de veinte (20) kits por municipio, conforme a las cantidades, especificaciones y condiciones previstas dentro de la planeación contractual, constituyéndose dicha actuación en una manifestación concreta y verificable de la ejecución material de las obligaciones asumidas por el contratista. Estas subactividades se ejecutan de manera parcial en el periodo reportando en las actas de entrega las cantidades en su totalidad según el presupuesto del proyecto para 25 municipios según información reportada en el componente técnico del informe.

Debe precisarse que el cumplimiento de las obligaciones contractuales no se circunscribe exclusivamente a la acreditación de la vinculación del personal, la celebración de contratos laborales o de prestación de servicios, ni al pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones derivadas de la administración del recurso humano. Por el contrario, el cumplimiento contractual comprende igualmente la ejecución efectiva, real y verificable de las actividades que integran el objeto contractual, dentro de las cuales se encuentra

la adquisición, disposición y entrega de los insumos, materiales, herramientas y demás elementos previstos para el desarrollo del proyecto.

En ese sentido, la ejecución de las actividades programadas y la entrega efectiva de los bienes e insumos contemplados contractualmente constituyen elementos materiales que permiten acreditar el avance en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, sin perjuicio de los soportes documentales, administrativos, financieros y técnicos que respaldan cada una de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución del contrato.

Por consiguiente, el CONTRATISTA ha venido dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo, tanto desde el componente administrativo y documental como desde la perspectiva de la ejecución material del objeto contractual, manteniendo la trazabilidad de las actuaciones adelantadas y de los recursos humanos, técnicos y operativos destinados al desarrollo del proyecto.

7.2 Relación De Contratos Asociados Al Proyecto

En desarrollo de las obligaciones contractuales y de conformidad con la estructura presupuestal aprobada para la ejecución del proyecto, se presenta la relación de los contratos celebrados para atender los requerimientos de personal administrativo y operativo, indicando para cada caso el valor contractual, plazo de ejecución y perfil requerido, de acuerdo con las necesidades propias de la operación.

La contratación del personal se ha efectuado atendiendo los perfiles y requerimientos establecidos para la ejecución del proyecto y observando los valores contemplados dentro del presupuesto contractual, particularmente aquellos determinados mediante el factor multiplicador correspondiente al componente de personal mínimo requerido para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

En consecuencia, los contratos asociados al componente administrativo y operativo cuentan con la respectiva asignación económica y responden a necesidades concretas de la ejecución contractual, sin que se evidencie la existencia de contrataciones sin cuantía económica dentro de dicho componente, en concordancia con la estructura presupuestal definida para el proyecto.

De igual manera, la vinculación del personal y la ejecución de los respectivos contratos se han desarrollado bajo observancia de las disposiciones legales aplicables, procurando garantizar el cumplimiento de los deberes derivados de la relación contractual, así como de las obligaciones laborales, de seguridad social, tributarias y demás cargas que resulten exigibles conforme a la naturaleza de cada vínculo.

Tabla 14. Personal Administrativo Contratado

Perfil	Nombres y Apellidos	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Valor Mensual
Profesional Financiero	Magda Cecilia Camacho Leal	SGR- 2025000050006-CL-01	06/04/2026	31/3/2027	$ 49.212.625
Analista Contable y Financiero	Claudia Yineth Neira Daza	SGR- 2025000050006-CL-02	06/04/2026	3/10/2026	$ 26.241.543,88
Coordinador Jurídico	María José Bolívar Barrera	SGR- 2025000050006-CL-03	06/04/2026	31/3/2027	$ 49.212.625

Nota: Fuente equipo operador

Tabla 15. Personal Operativo Contratado

Perfil	Nombres y Apellidos	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Valor Mensual
Coordinador de articulación territorial y asociatividad rural campesina	Carlos Andrés Arias Daza	SGR- 2025000050006-CL-04	6/4/2026	31/3/2027	$ 63.423.111,55
Director Técnico	Jorge Rolando Reina Mesa	SGR- 2025000050006-CL-05	8/4/2026	31/3/2027	$ 74.450.166,87
Coordinador Técnico	Neldy Tatiana Rodríguez Celis	SGR- 2025000050006-CL-06	6/4/2026	28/2/2027	$ 45.053.779,34
Coordinador Técnico	Diego Pérez	SGR- 2025000050006-CL-07	6/4/2026	18/9/2026	$ 45.053.790,18
Coordinador Técnico	William Alean	SGR- 2025000050006-CL-08	6/4/2026	18/9/2026	$ 45.053.801,01
Técnico de acompañamiento Almeida	Deisy Giselle Veloza	SGR- 2025000050006-CL-09	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Betéitiva	Carlos Riveros Lemus	SGR- 2025000050006-CL-10	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Boavita	Juan Manuel Velasco Fuentes	SGR- 2025000050006-CL-11	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Briceño	Deisy Alejandra Rugeth	SGR- 2025000050006-CL-12	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Buenavista	Rodrigo Ballesteros Torres	SGR- 2025000050006-CL-13	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Busbanzá	Edward Jiménez	SGR- 2025000050006-CL-14	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Campohermoso	Faber Rodrigo Parra Mora	SGR- 2025000050006-CL-15	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chiscas	Juan de Jesús Ardila	SGR- 2025000050006-CL-16	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chita	Martha Luzmila Cotrina Silva	SGR- 2025000050006-CL-17	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chivatá	Viviana Rodríguez	SGR- 2025000050006-CL-18	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ciénega	Omar Prieto	SGR- 2025000050006-CL-19	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19

Técnico de acompañamiento Coper	Kevin Fabian Murcia Carrillo	SGR- 2025000050006-CL-20	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Corrales	Edwin Quintana	SGR- 2025000050006-CL-21	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Cucaita	Amed Alexander Bernal	SGR- 2025000050006-CL-22	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guacamayas	Frankiln Mora	SGR- 2025000050006-CL-23	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guateque	Kevin Tomas Mora Colmenares	SGR- 2025000050006-CL-24	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guayatá	Yesika Moreno Morales	SGR- 2025000050006-CL-25	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Jericó	Cristihan Panqueva Riaño	SGR- 2025000050006-CL-26	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento La Uvita	Carlos Eduardo Caceres Medina	SGR- 2025000050006-CL-27	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento La Victoria	Luis Emiro Florido	SGR- 2025000050006-CL-28	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Muzo	María Custodia Pinedo Solosa*	SGR- 2025000050006-CL-29	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Otanche	Loren Michel Velasco Coronado	SGR- 2025000050006-CL-30	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Páez	Yesica Paola Cárdenas Cristancho*	SGR- 2025000050006-CL-31	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Paya	Ainer Noel Piraban Cristancho	SGR- 2025000050006-CL-32	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Paz de Río	Neyla Santos Triana	SGR- 2025000050006-CL-33	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Pesca	Rosana Lemus	SGR- 2025000050006-CL-34	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ráquira	Jhoan Augusto Castiblanco Murcia*	SGR- 2025000050006-CL-35	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento San Eduardo	Naren Stiven Cendales Martínez	SGR- 2025000050006-CL-36	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento San Mateo	José Darwin Jair Amaya	SGR- 2025000050006-CL-37	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Santana	Cesar Carrero	SGR- 2025000050006-CL-38	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Sativanorte	Ana Milena Camacho Amado	SGR- 2025000050006-CL-39	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Soatá	Daniel Enoc Bossa	SGR- 2025000050006-CL-40	13/4/2026	21/9/2026	$ 24.971.593,04
Técnico de acompañamiento Socotá	John Jairo Diaz Botia	SGR- 2025000050006-CL-41	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Somondoco	Hugo Ernesto Alfonso	SGR- 2025000050006-CL-42	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Sora	Rafael Raba Roberto	SGR- 2025000050006-CL-43	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Susacón	José Joaquín Mesa Lizarazo	SGR- 2025000050006-CL-44	21/4/2026	25/9/2026	$ 24.343.376,86
Técnico de acompañamiento Sutatenza	Ruth Lucely Novoa	SGR- 2025000050006-CL-45	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Tenza	Edgar Valero	SGR- 2025000050006-CL-46	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Tinjacá	Henry Gonzalo Díaz	SGR- 2025000050006-CL-47	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ventaquemada	Nanci Yohana Pamplona Montañez	SGR- 2025000050006-CL-48	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19

Profesional para el desarrollo de procesos sociales	Wilmer Alfonso Velasquez Rey	SGR- 2025000050006-CL-49	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22
Profesional de apoyo al desarrollo de procesos	Ibette Yirley Ruíz Sánchez	SGR- 2025000050006-CL-50	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22
Profesional de apoyo al desarrollo de procesos	Nelson Alejandro Rincón	SGR- 2025000050006-CL-51	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22
Profesional de Planeación y Logística	Yised Marcela Monroy Kaye	SGR- 2025000050006-CL-52	6/4/2026	28/2/2027	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Néstor Duarte Molano	SGR- 2025000050006-CL-53	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Adriana Palacios	SGR- 2025000050006-CL-54	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Juan Carlos Reyes	SGR- 2025000050006-CL-55	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Sergio Rodríguez	SGR- 2025000050006-CL-56	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Gabriel Alejandro Niño	SGR- 2025000050006-CL-57	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80

Nota: Fuente equipo operador

7.3 Cumplimiento Sistema De Seguridad Social.

El Contratista certifica que se ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones en materia de Seguridad Social Integral, asegurando que todas las personas vinculadas al proyecto se encuentran debidamente afiliadas y al día en sus aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normativa vigente.

De manera continua y se verifica que cada integrante del equipo cuente con la cobertura correspondiente al nivel de riesgo de sus actividades y que los pagos de aportes se realicen de forma oportuna, garantizando que ninguna labor operativa, administrativa o de campo se ejecute sin el cumplimiento previo de estas obligaciones. Este compromiso permanente con la seguridad social constituye un eje esencial de la correcta ejecución contractual y refleja el cumplimiento de los estándares legales, operativos y de gestión exigidos para proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Los soportes correspondientes se encuentran dispuestos en la carpeta: 4. INFORME DE AVANCE - JULIO 2026/ ANEXOS/ ANEXOS JURÍDICOS.

8. Conclusiones

La ejecución del proyecto fortalecer los sistemas productivos de agricultura familiar mediante la entrega de activos productivos destinados a mejorar la disponibilidad de agua, la eficiencia de las labores agrícolas y la capacidad productiva de los beneficiarios.

Las jornadas desarrolladas evidencian el cumplimiento de las actividades programadas para los municipios priorizados y constituyen una estrategia de adaptación frente a los efectos asociados a la variabilidad climática, contribuyendo al fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las unidades productivas rurales.

El proceso de entrega de materiales para la construcción de tanques tipo Zamorano permite la construcción in situ en cada uno de los predios de los beneficiarios seleccionados en los municipios priorizados por el proyecto, atendiendo inicialmente la necesidad de almacenamiento de agua para el suministro a los cultivos en épocas de escases de lluvias.

La entrega del kit de insumos herramientas y manguera sumado con la construcción del tanque a los beneficiarios tiene gran pertinacia en resolver problemáticas de fondo que se presentas en las unidades productivas familiares promoviendo el ahorro de recursos naturales y materiales en productividad de los cultivos priorizados por el proyecto en cada uno de los municipios.

Los porcentajes de avance en ejecución física y financiera del proyecto al periodo reportado del presente informe, son determinados por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **78.13%** y el porcentaje de avance el proyecto presenta un avance de **79.53%.**





INFORME TÉCNICO DE AVANCE

ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.

Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar.

Consorcio Agro Resiliente

Gobernación de Boyacá

JULIO 2026.

Contenido

1. Introducción.....6
2. Alcance de la actividad.....7
3. Metodología de ejecución.....8
4. Entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano.....10
5. Reporte de entrega de motoazadas y kit de herramientas.....25
6. Resultados obtenidos.....39

Índice de Tablas

Tabla 1. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados. 8

Índice de Figuras

Figura 1. Registro fotográfico de Toma de análisis de suelos.....7
Figura 2. Municipio de Guacamayas, fecha de entrega 22/05/2026. 11
Figura 3. Municipio de Boavita, fecha de entrega 07/07/2026. 11
Figura 4. Municipio de Chiscas, fecha de entrega 26/05/2026.....12
Figura 5.Municipio de La Uvita, fecha de entrega 07/07/2026. 12
Figura 6. Municipio de San Mateo, fecha de entrega 08/07/2026. 13
Figura 7. Municipio de Sativanorte, fecha de entrega 06/07/2026. 13
Figura 8. Municipio de Soata, fecha de entrega 19/06/2026. 14
Figura 9. Municipio de Susacón, fecha de entrega 06/07/2026. 14
Figura 10. Municipio de Chita, fecha de entrega 13/08/2026. 15
Figura 11. *Municipio de Corrales, fecha de* entrega 16/06/2026. 15
Figura 12. *Municipio de Socotá, fecha de* entrega 12/08/2026. 16
Figura 13. Municipio de Coper, fecha de entrega 23/06/2026.....16
Figura 14. Municipio de Briceño, fecha de entrega 29/05/2026. 17
Figura 15. Municipio de La victoria, fecha de entrega 23/06/2026. 17
Figura 16. Municipio de Muzo, fecha de entrega 16/06/2026.....18
Figura 17. Municipio de Otanche, fecha de entrega 15/07/2026. 18
Figura 18. Municipio de Tinjacá, fecha de entrega 25/07/2026. 19
Figura 19. Municipio de Campohermoso, fecha de entrega 08/07/2026. 19
Figura 20. Municipio de Páez, fecha de entrega 08/07/2026. 20
Figura 21. Municipio de San Eduardo, fecha de entrega 09/07/2026.....20
Figura 22. Municipio de Ventaquemada de entrega 20/06/2026. 21
Figura 23. Municipio de Ciénega, fecha de entrega 14/07/2026. 21
Figura 24. Municipio de Guayatá, fecha de entrega 04/08/2026. 22
Figura 25. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 30/07/2026. 22
Figura 26. Municipio de Sutatenza, fecha de entrega 30/07/2026. 23
Figura 27. Municipio de Tenza fecha de entrega 30/07/2026. 23
Figura 28. Municipio de Almeida fecha de entrega 30/07/2026. 24

Figura 29. Municipio de Buenavista, fecha de entrega 12/06/2026. 24
Figura 30. Municipio de Boavita, fecha de entrega 30/07/2026. 25
Figura 31. Municipio de Chiscas fecha de entrega 23/07/2026. 26
Figura 32. Municipio de Guacamayas, fecha de entrega 23/07/2026. 26
Figura 33. Municipio de La Uvita, fecha de entrega 07/08/2026. 27
Figura 34. Municipio de San Mateo, fecha de entrega 07/08/2026. 27
Figura 35. Municipio de Sativanorte, fecha de entrega 17/07/2026. 28
Figura 36. Municipio de Soata, fecha de entrega 30/07/2026. 28
Figura 37. Municipio de Susacón, fecha de entrega 17/07/2026. 29
Figura 38. Municipio de Chita, fecha de entrega 22/07/2026. 29
Figura 39. Municipio de Jericó, fecha de entrega 22/07/2026. 30
Figura 40. Municipio de Socotá, fecha de entrega 23/07/2026. 30
Figura 41. Municipio de Buenavista, fecha de entrega 06/08/2026. 31
Figura 42. Municipio de Coper, fecha de entrega 06/08/2026. 31
Figura 43. Municipio de Tinjacá, fecha de entrega 09/07/2026. 32
Figura 44. Municipio de Campohermoso, fecha de entrega 07/08/2026. 32
Figura 45. Municipio de Páez, fecha de entrega 07/08/2026. 33
Figura 46. Municipio de San Eduardo, fecha de entrega 06/08/2026. 33
Figura 47. Municipio de Santana, fecha de entrega 09/07/2026. 34
Figura 48. Municipio de Sora, fecha de entrega 01/07/2026. 34
Figura 49. Municipio de Ventaquemada, fecha de entrega 21/07/2026. 35
Figura 50. Municipio de Almeida, fecha de entrega 11/07/2026. 35
Figura 51. Municipio de Ciénega, fecha de entrega 01/08/2026. 36
Figura 52. Municipio de Guateque, fecha de entrega 31/07/2026. 36
Figura 53. Municipio de Guayatá, fecha de entrega 31/07/2026. 37
Figura 54. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 11/07/2026. 37
Figura 55. Municipio de Sutatenza, fecha de entrega 10/07/2026. 38
Figura 56. Municipio de Tenza, fecha de entrega 10/07/2026. 38

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito reportar los avances y resultados alcanzados en la ejecución de la **Actividad 2: Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización**, específicamente en el marco de la subactividad **"Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar"**. Esta intervención busca fortalecer las capacidades productivas de las familias rurales mediante la dotación de infraestructura y herramientas que contribuyan a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a las condiciones climáticas y económicas que afectan al sector agropecuario.

En este contexto, las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a brindar soluciones prácticas para el mejoramiento de las condiciones de producción de los beneficiarios, promoviendo un uso más eficiente de los recursos disponibles y favoreciendo la permanencia de las actividades agropecuarias como fuente de ingreso y seguridad alimentaria para las familias rurales. Estas estrategias se encuentran alineadas con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar mediante la incorporación de activos productivos y obras de apoyo que incrementen la capacidad de respuesta de los productores ante los desafíos asociados a la variabilidad climática y las limitaciones tecnológicas presentes en el territorio.

De esta manera, el presente informe reporta la entrega de materiales para la construcción de tanques para almacenamiento de agua, fundamental para mejorar la disponibilidad y gestión del recurso hídrico en los sistemas productivos, y la entrega de motoazadas, insumos y kits de herramientas, activos destinados a facilitar las labores agrícolas, optimizar los procesos productivos y fortalecer las capacidades operativas de los productores beneficiarios. ADICIONAL Se hace entrega de los resultados de los análisis de suelos realizados los predios de las familias beneficiarias con sus respectivas recomendaciones. Estas acciones constituyen un aporte significativo para la consolidación de sistemas productivos más eficientes, sostenibles y competitivos, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas dentro del proyecto y al fortalecimiento de la agricultura familiar en el departamento de Boyacá.

2. Alcance de la actividad

La actividad comprendió la continuación de la entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano como Suministro para instalación in situ de tanques para recolección de agua como componente Sistema de Captación de agua e Irrigación, además de las motoazadas, kits de herramientas e insumos agrícolas destinados al fortalecimiento de unidades productivas de agricultura familiar.

De igual manera se reportan 800 resultados de análisis de suelos de los 40 municipios luego de realizados los muestreos en cada uno de los predios de los beneficiarios del proyecto como se muestra en la siguiente figura. Estos resultados y recomendaciones son entregados y socializados durante el acompañamiento técnico en cada unidad productiva familiar, con el fin de establecer planes de fertilización que fortalezcan la efectividad de la aplicación de fertilizantes, enmiendas, esperando un incremento en la productividad de los cultivos, mejores rendimientos y disminución de costos de inversión por parte de las familias.

Figura 1. Registro fotográfico de Toma de análisis de suelos



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Los resultados reposan en el Anexo 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.4 RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS/ Municipio de interés.

3. Metodología de ejecución

Como parte de las actividades logísticas contempladas en el proyecto, se desarrollaron jornadas de distribución de materiales, insumos, herramientas y maquinaria en los municipios priorizados. Para ello, el equipo logístico y técnico realizó desplazamientos territoriales con el propósito de verificar la identidad de los beneficiarios, formalizar la entrega de los elementos mediante la firma de actas, efectuar el respectivo registro fotográfico y brindar recomendaciones para su adecuada utilización.

La estrategia de entrega se ejecutó en dos fases: una orientada a la distribución de materiales para la construcción de tanques de almacenamiento y otra destinada a la entrega de maquinaria, herramientas e insumos productivos. En ambas jornadas se promovió entre los beneficiarios una cultura de corresponsabilidad respecto al uso, cuidado, custodia y conservación de los bienes entregados, enfatizando la prohibición de su venta o destinación a fines diferentes a los establecidos por el proyecto. Asimismo, durante el evento oficial de entrega de maquinaria se socializaron las características técnicas, funcionalidades y recomendaciones de operación y mantenimiento de la motoazada, con el propósito de asegurar su correcto aprovechamiento y prolongar su vida útil.

Durante el periodo reportado del presente informe, se realizó actividad de entrega de Materiales para la construcción de tanques Zamorano, insumos, Herramienta y maquinaria en los municipios de acuerdo como lo muestra la siguiente tabla entregando 20 kits por municipio para un total de 500 tanques construidos, 500 Motoazadas entregadas y 520 kits de insumos entregados a las familias como se resume en la Tabla 1 a continuación:

Tabla 1. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados.

MUNICIPIO	TANQUES (Fecha de entrega)	MOTOAZADAS (Fecha de entrega)	INSUMOS Y HERRAMIENTAS
ALMEIDA	20 (30/07/2026)	20 (11/07/2026)	20 (11/07/2026)
BOAVITA	20 (07/07/2026)	20 (30/07/2026)	20 (30/07/2026)
BUENAVISTA	20 (12/06/2026)	20 (06/08/2026)	20 (06/08/2026)
CAMPOHERMOSO	20 (08/07/2026)	20 (07/08/2026)	20 (07/08/2026)
CHISCAS	20 (26/05/2026)	20 (23/07/2026)	20 (23/07/2026)

CHITA	0	20 (22/07/2026)	20 (22/07/2026)
CIÉNEGA	20 (14/07/2026)	20 (01/08/2026)	20 (01/08/2026)
COPER	20 (23/06/2026)	20 (06/08/2026)	20 (06/08/2026)
CORRALES	20 (16/06/2026)	Entregado en Junio	Entregado en Junio
GUACAMAYAS	20 (22/05/2026)	20 (23/07/2026)	20 (23/07/2026)
GUATEQUE	20 (04/08/2026)	20 (31/07/2026)	20 (31/07/2026)
GUAYATÁ	20 (04/08/2026)	20 (31/07/2026)	20 (31/07/2026)
JERICÓ	0	20 (22/07/2026)	20 (22/07/2026)
LA UVITA	20 (07/07/2026)	20 (07/08/2026)	20 (07/08/2026)
LA VICTORIA	20 (23/06/2026)	0	0
MUZO	20 (10/06/2026)	0	0
OTANCHE	20 (15/07/2026)	0	0
PÁEZ	20 (08/07/2026)	20 (07/08/2026)	20 (07/08/2026)
SAN EDUARDO	20 (09/07/2026)	20 (06/08/2026)	20 (06/08/2026)
SAN MATEO	20 (08/07/2026)	20 (07/08/2026)	20 (07/08/2026)
SANTANA	Entregado en Junio	Entregado en Junio	20 (09/07/2026)
SATIVANORTE	20 (06/07/2026)	20 (17/07/2026)	20 (17/07/2026)
SOATÁ	20 (19/06/2026)	20 (30/07/2026)	20 (30/07/2026)
SOCOTÁ	0	20 (23/07/2026)	20 (23/07/2026)

SOMONDOCO	0	20 (11/07/2026)	20 (11/07/2026)
SUSACÓN	20 (06/07/2026)	20 (17/07/2026)	20 (17/07/2026)
SUTATENZA	20 (30/07/2026)	20 (10/07/2026)	20 (10/07/2026)
TENZA	20 (30/07/2026)	20 (10/07/2026)	20 (10/07/2026)
TINJACÁ	20 (25/07/2026)	20 (09/07/2026)	20 (09/07/2026)
VENTAQUEMADA	20 (20/06/2026)	20 (21/07/2026)	20 (21/07/2026)
TOTAL	**500**	**500**	**520**

Nota: Fuente equipo operador

El Porcentaje de avance en ejecución física de la actividad No.2 al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de 81.67%.

4. Entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano

Durante esta actividad se realizó la entrega de materiales para construcción de tanques zamorano de acuerdo con el cronograma logístico del equipo técnico propuesto en el informe técnico (anterior) del mes de mayo y es así como se abordaron municipios de las 5 zonas establecidas y se llevó a cabo la entrega en cada municipio, como evidencia se tienen las actas de entrega de materiales y las fotos que a continuación se ilustran por cada municipio.

De la misma manera se hace entrega de 500 las actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la construcción de tanques Zamorano de 22 mil litros en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/1.2.2 ACTAS ENTREGA DE TANQUES CONSTRUIDOS.

4.1. Municipio de Guacamayas.

La actividad se llevó a cabo en la plaza de mercado municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios. El desarrollo de la actividad se realizó sin ningún contratiempo creando satisfacción por parte de los beneficiarios quienes trasladaron los materiales a cada una de sus fincas.

Figura 2. Municipio de Guacamayas, fecha de entrega 22/05/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.2. Municipio de Boavita.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios. El desarrollo de la actividad se realizó sin ningún contratiempo creando satisfacción por parte de los beneficiarios quienes trasladaron los materiales a cada una de sus fincas.

Figura 3. Municipio de Boavita, fecha de entrega 07/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.3 Municipio de Chiscas.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el

profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios. El desarrollo de la actividad se realizó sin ningún contratiempo creando satisfacción por parte de los beneficiarios quienes trasladaron los materiales a cada una de sus fincas.

Figura 4. Municipio de Chiscas, fecha de entrega 26/05/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.4 Municipio de la Uvita.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios. El desarrollo de la actividad se realizó sin ningún contratiempo creando satisfacción por parte de los beneficiarios quienes trasladaron los materiales a cada una de sus fincas.

Figura 5.Municipio de La Uvita, fecha de entrega 07/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.5 Municipio de San Mateo.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 6. Municipio de San Mateo, fecha de entrega 08/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.6 Municipio de Sativanorte.

La actividad se llevó a cabo en un parqueadero de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 7. Municipio de Sativanorte, fecha de entrega 06/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.7 Municipio de Soata.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 8. Municipio de Soata, fecha de entrega 19/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.8 Municipio de Susacón.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 9. Municipio de Susacón, fecha de entrega 06/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.9 Municipio de Chita.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 10. Municipio de Chita, fecha de entrega 13/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.10 Municipio de Corrales.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 11. *Municipio de Corrales, fecha de* entrega 16/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.11 Municipio de Socotá.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldía, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 12. ***Municipio de Socotá, fecha de*** **entrega 12/08/2026.**



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.12 Municipio de Coper.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 13. Municipio de Coper, fecha de entrega 23/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.13 Municipio de Briseño.

La actividad se llevó a cabo en el parque principal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 14. Municipio de Briceño, fecha de entrega 29/05/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.14 Municipio de La Victoria.

La actividad se llevó a cabo en una bodega de la alcaldia, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 15. Municipio de La victoria, fecha de entrega 23/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.15 Municipio de Muzo.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 16. Municipio de Muzo, fecha de entrega 16/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.16 Municipio de Otanche.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 17. Municipio de Otanche, fecha de entrega 15/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.17 Municipio de Tinjacá.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 18. Municipio de Tinjacá, fecha de entrega 25/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.18 Municipio de Campohermoso.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 19. Municipio de Campohermoso, fecha de entrega 08/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.19 Municipio de Páez

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 20. Municipio de Páez, fecha de entrega 08/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.20 Municipio de San Eduardo.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 21. Municipio de San Eduardo, fecha de entrega 09/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.21 Municipio de Ventaquemada.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 22. Municipio de Ventaquemada de entrega 20/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.22 Municipio de Cienega.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 23. Municipio de Ciénega, fecha de entrega 14/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.23 Municipio de Guayatá

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 24. Municipio de Guayatá, fecha de entrega 04/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.24 Municipio de Somondoco.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 25. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.25 Municipio de Sutatenza.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 26. Municipio de Sutatenza, fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.26 Municipio de Tenza.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 27. Municipio de Tenza fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.27 Municipio de Almeida.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 28. Municipio de Almeida fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

4.28 Municipio de Buenavista.

La actividad se llevó a cabo en el polideportivo municipal, se contó con el acompañamiento de funcionarios encargados del sector agropecuario del municipio, el equipo logístico, el técnico del proyecto, el profesional de acompañamiento y los 20 beneficiarios.

Figura 29. Municipio de Buenavista, fecha de entrega 12/06/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5. Reporte de entrega de motoazadas y kit de herramientas.

La entrega de motoazadas, kits de herramientas e insumos agrícolas tuvo como finalidad fortalecer los procesos de mantenimiento y manejo agronómico de los cultivos priorizados. Estos activos productivos permiten mejorar la eficiencia operativa de los productores, facilitando labores de preparación de suelo, control cultural, mantenimiento de cultivos y manejo productivo. Asimismo, contribuyen a mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos frente a condiciones climáticas variables. Dicha actividad se desarrolló conforme a la propuesta realizada en el cronograma del informe correspondiente al mes de mayo.

Se hace entrega de 500 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de la motoazada de 7HP en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.2 ACTAS ENTREGA DE MOTOAZADAS.

Se hace entrega de 500 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de insumos y herramienta básica en los anexos que reposan en 4. INFORME DE AVANCE JULIO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.3 ACTAS ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Municipio de Boavita.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevo a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizo con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se conto con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 30. Municipio de Boavita, fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.2 municipio de Chiscas

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 31. Municipio de Chiscas fecha de entrega 23/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.3 municipio de Guacamayas.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 32. Municipio de Guacamayas, fecha de entrega 23/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.4 Municipio de la Uvita.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 33. Municipio de La Uvita, fecha de entrega 07/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.5 Municipio de San Mateo.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 34. Municipio de San Mateo, fecha de entrega 07/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.6 Municipio de Sativanorte.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 35. Municipio de Sativanorte, fecha de entrega 17/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.7 Municipio de Soata.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 36. Municipio de Soata, fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.8 Municipio de Susacón.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 37. Municipio de Susacón, fecha de entrega 17/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.9 Municipio de Chita.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 38. Municipio de Chita, fecha de entrega 22/07/2026.




Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.10 Municipio de Jericó

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 39. Municipio de Jericó, fecha de entrega 22/07/2026.

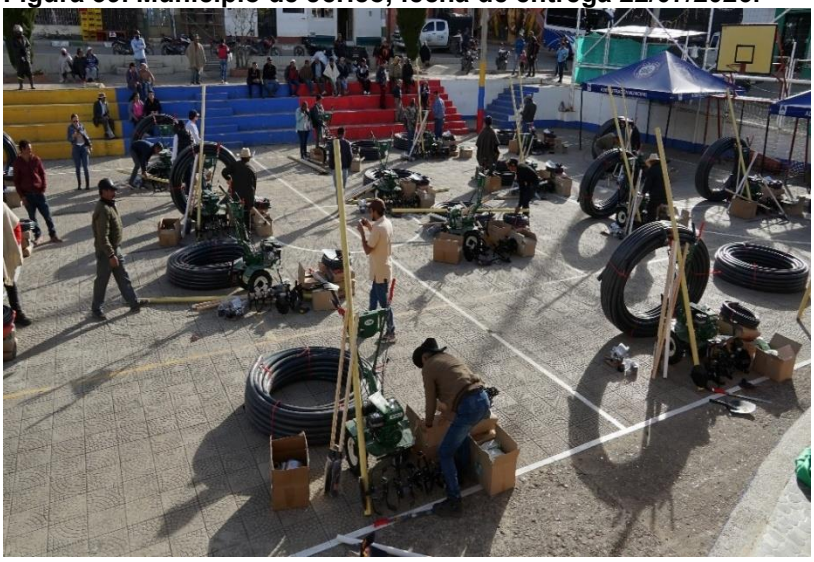

Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.11 Municipio de Socotá

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en un predio del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 40. Municipio de Socotá, fecha de entrega 23/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.12 Municipio de Buenavista.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 41. Municipio de Buenavista, fecha de entrega 06/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.13 Municipio de Coper.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 42. Municipio de Coper, fecha de entrega 06/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.14 Municipio de Tinjacá.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 43. Municipio de Tinjacá, fecha de entrega 09/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.15 Municipio de Campo Hermoso.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 44. Municipio de Campohermoso, fecha de entrega 07/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.16 Municipio de Paéz.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 45. Municipio de Páez, fecha de entrega 07/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.17 Municipio de San Eduardo.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 46. Municipio de San Eduardo, fecha de entrega 06/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.18 Municipio de Santana.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 47. Municipio de Santana, fecha de entrega 09/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.19 Municipio de Sora.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 48. Municipio de Sora, fecha de entrega 01/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.20 Municipio de Ventaquemada.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 49. Municipio de Ventaquemada, fecha de entrega 21/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.21 Municipio de Almeida.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 50. Municipio de Almeida, fecha de entrega 11/07/2026.




Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.22 Municipio de Ciénaga.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 51. Municipio de Ciénega, fecha de entrega 01/08/2026.

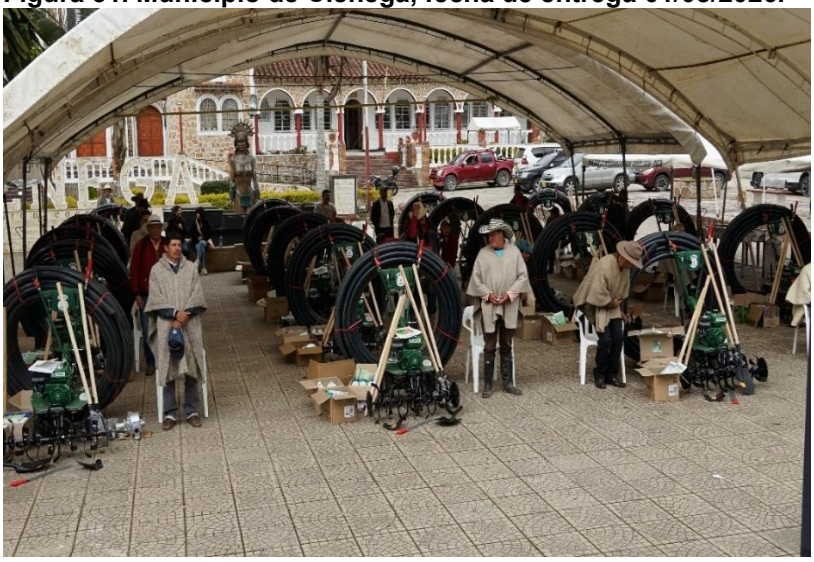

Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.23 Municipio de Guateque.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el Parque principal del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 52. Municipio de Guateque, fecha de entrega 31/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.24 Municipio de Guayatá.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 53. Municipio de Guayatá, fecha de entrega 31/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.25 Municipio de Somondoco.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 54. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 11/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.26 Municipio de Sutatenza.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en el polideportivo del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 55. Municipio de Sutatenza, fecha de entrega 10/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5.27 Municipio de Tenza.

La entrega de motoazadas y kit de herramientas, se llevó a cabo en la plaza de mercado del municipio, donde se realizó con un acto protocolario por parte de la alcaldía municipal y se contó con el acompañamiento de un representante de la gobernación de Boyacá, el equipo profesional y técnico del consorcio de esta zona y las 20 familias beneficiadas.

Figura 56. Municipio de Tenza, fecha de entrega 10/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

6. Resultados obtenidos

La ejecución de la Actividad 2 permite avanzar en el fortalecimiento de los sistemas productivos de agricultura familiar mediante la entrega de activos productivos destinados a mejorar la disponibilidad de agua, la eficiencia de las labores agrícolas y la capacidad productiva de los 800 beneficiarios.

Las jornadas desarrolladas evidencian el cumplimiento de las actividades programadas para los municipios priorizados y constituyen una estrategia de adaptación frente a los efectos asociados a la variabilidad climática, contribuyendo al fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las unidades productivas rurales.

El proceso de entrega de materiales para la construcción de tanques zamorano permitirá la construcción in situ en cada uno de los predios de los beneficiarios seleccionados en los municipios priorizados por el proyecto, atendiendo inicialmente la necesidad de almacenamiento de agua para el suministro a los cultivos en épocas de escases de lluvias.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL **01 de AGOSTO de 2026 AL 31 de AGOSTO de 2026**

CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.9352770/2376 - 2026**

REGISTRO BPyP No.: **2025 00005 0006**

FECHA INICIACIÓN: 06 de ABRIL de 2026

FECHA TERMINACIÓN: **05 de ABRIL de 2027**

CONTRATISTA: **CONSORCIO AGRO RESILIENTE BOYACA 2026**

SUPERVISOR: **SARA LORENA VEGA FLOREZ**

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ BPIN 2025000050006"

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Presentar informes mensuales con el fin de dar seguimiento a las actividades del proyecto dando cumplimiento a lo establecido dentro del cronograma de actividades propuestas por la coordinación técnica	Elaboración y entrega de informes mensuales que evidencien el avance y cumplimiento de las actividades programadas.		X		
2	Dar cumplimiento al objeto del presente proceso, así como al alcance del mismo con relación a las actividades propuestas para ello dentro de los plazos convenidos y conforme a la propuesta presentada dentro del proceso de selección.	Ejecución de las actividades contratadas de acuerdo con el objeto, alcance, propuesta y plazos establecidos.		X		
3	Tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las actividades contempladas en el alcance del objeto lo dispuesto en el documento técnico del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ BPIN 2025000050006", así como los anexos que hacen parte del mismo, especialmente los que se contemplan en el presente estudio previo.	Desarrollo de las actividades conforme al documento técnico, anexos y demás lineamientos establecidos para el proyecto.		X		
4	Emplear para la ejecución del contrato el personal adecuado e idóneo para la ejecución del mismo.	Disposición del personal necesario, competente e idóneo para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.		X		
5	El contratista deberá asumir la totalidad de los gastos de transporte que se ocasionen por las actividades propias de la ejecución contractual a cada uno de los municipios priorizados por la entidad conforme al alcance del objeto del proceso.	Cumplimiento de los desplazamientos de personal requeridos para el desarrollo de las actividades contractuales en los municipios priorizados por la entidad, de acuerdo a la programación entregada.		X		

6	Reconocer y cancelar oportunamente al personal contratado los honorarios pactados conforme a lo dispuesto en la propuesta y los documentos del proceso	De acuerdo al personal contratado se da cumplimiento al pago oportuno de honorarios de acuerdo con las condiciones establecidas.		X		
7	Observar con estricto cumplimiento de la normatividad vigente para la vinculación del personal mínimo requerido, así como cumplir con los aportes a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales según corresponda	Cumplimiento al pago de seguridad social y soportes de acuerdo a la normatividad vigente.		X		
8	El contratista se obliga a ejecutar el objeto y las obligaciones derivadas del contrato con el personal solicitado en el presente proceso, que cuenten con la idoneidad y experiencia, previa coordinación con el funcionario designado para ejercer la vigilancia y control	De acuerdo a los perfiles solicitados se da cumplimiento a la experiencia e idoneidad requerida.		X		
9	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Durante el Presente periodo se atienden las solicitudes adicionales derivadas del contrato, la normativa vigente y aquellas necesarias para su adecuada ejecución.		X		

Firma: _____
Nombre: **SARA LORENA VEGA FOREZ**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **MARIA FERNANDA MONROY KAYE**
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUANA VIVIANA CORTES
FECHA 22-09-2026

Gobernación de Boyacá · Siembra · Consorcio AgroResiliente Boyacá 2026

Informe
Ejecutivo de Avance

N°.5 / AGOSTO DE 2026

BPIN 2025000050006”.



Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática **en el Departamento de Boyacá**

Contenido

1. Introducción 5

2. Objetivos 6

2.2 Objetivo General 6

2.3 Objetivos específicos 6

3. Cronograma 7

4. Indicadores del proyecto 8

5. Informe de Avance Físico 10

5.1 Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados. 10

5.2 Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización. 11

5.2.1 Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico). 11

5.2.2 Reportar compendios de evidencia de Transporte. 12

5.3 Actividad 4 Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad. 13

6. Informe de Avance financiero 16

6.1 Actividad 2. Implementar El Manejo Sostenible De Cultivos Con Vocación Productiva Para El Fortalecimiento De La Agricultura Familiar Y De Comercialización 16

6.2 Actividad 4. Capacitar En Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Y Gestión De La Inocuidad 22

7. Informe de Avance jurídico 29

7.1 Obligaciones Legales Y Contractuales Del Contratista 29

7.2 Relación De Contratos Asociados Al Proyecto 30

7.3 Cumplimiento Sistema De Seguridad Social. 33

8. Conclusiones 35

Índice de Tablas

Tabla 1. Cronograma de actividades 7
Tabla 2. Indicadores 8
Tabla 3. Avance de ejecución de la Actividad No.1 10
Tabla 4. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados. 11
Tabla 5. Avance de ejecución de la Actividad No.2 12
Tabla 6. Avance de ejecución de la Actividad No.4 14
Tabla 7. Detalle Actividad 2 16
Tabla 8. Detalle de Mano de Obra Calificada 17
Tabla 9. Detalle de Maquinaria y Equipos 18
Tabla 10. Detalle de Materiales 19
Tabla 11. Detalle de Materiales 20
Tabla 12. Detalle de Transporte 21
Tabla 13. Detalle Actividad 4 22
Tabla 14. Detalle de Mano de Obra Calificada 23
Tabla 15. Detalle de Maquinaria y Equipos 24
Tabla 16. Detalle de Materiales 24
Tabla 17. Detalle de Otros Servicios 25
Tabla 18. Detalle de Transporte 26
Tabla 19. Avance por Actividad 27
Tabla 20. Personal Administrativo Contratado 31
Tabla 21. Personal Operativo Contratado 31
Tabla 22. Personal Operativo Contratado Actividad No. 4 33

Índice de Tablas

Figura 1. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2. 22

Figura 2. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2. 27

Figura 3. Gráfica del porcentaje de avance financiero del proyecto. 28

1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad presentar el desarrollo de las actividades en su etapa final de entrega de materiales para la construcción de tanques, insumos, herramientas agrícolas y maquinaria menor correspondientes al proyecto *"Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá"*, articulado con la Actividad 2: Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización. Estas acciones estuvieron orientadas en la respectiva entrega en los municipios de Briceño, La Victoria, Muzo, Otanche, Paya, Chita, Jericó, Socotá y Somondoco.

Desde el componente técnico, se presenta el proceso de implementación de cultivos y asistencia técnica en siembras, seguimiento a cultivos establecidos y cosechas. Esta actividad permitió evaluar aspectos relacionados con las condiciones productivas de los predios los cultivos priorizados, disponibilidad. Lo anterior permitió garantizar la pertinencia técnica, productiva y social de la intervención en las unidades productivas priorizadas dentro del municipio.

Finalmente, se presentan los resultados derivados de las actividades ejecutadas, incluyendo la consolidación de las actas de entrega materiales para la construcción de tanques, insumos, herramientas y maquinaria los municipios y los resultados de la toma de análisis de suelos. Estos resultados permiten establecer bases sólidas para este inicio de la fase de implementación, asegurando la articulación entre el componente técnico, social y productivo, así como la sostenibilidad de las acciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina frente a los desafíos asociados a la variabilidad climática en el territorio.

2. Objetivos

2.2 Objetivo General

Fortalecer la capacidad de adaptación de las unidades de agricultura familiar y campesina en el mantenimiento de cultivos establecidos ante la variabilidad climática en el Departamento de Boyacá.

2.3 Objetivos específicos

Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.

Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.

Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.

3. Cronograma

Tabla 1. Cronograma de actividades

Objetivos Específicos	Indicador de producto MGA WEB.	Actividad	Rubro	Periodo 0											
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.	Producto 1.1: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto Principal del Proyecto). Medido a través de: Número de productores Cantidad: 800	Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	Mano de obra calificada (Talento Humano)	■	■										
			Mano de obra calificada (Talento Humano)	■											
			Materiales	■	■										
			Otros Servicios (Espacios)	■	■										
		Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	Mano de obra calificada (Talento Humano)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			Maquinaria y equipos			■	■								
			Materiales			■	■								
			Materiales			■	■								
			Mano de obra calificada (Analisis)				■								
			Transporte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.	Producto 2: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores Medido a través de: Número de pequeños productores rurales Cantidad: 800	Actividad 3. Capacitar en la cosecha y manejo eficiente del recurso hídrico para la productividad ante la variabilidad climática	Mano de obra calificada (Talento Humano)							■	■				
			Maquinaria y equipos							■	■				
			Materiales							■	■				
			Otros Servicios (Espacios)							■	■				
			Transporte							■	■				
		Actividad 4. Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.	Mano de obra calificada (Talento Humano)					■	■						
			Maquinaria y equipos					■	■						
			Materiales					■	■						
			Otros Servicios (Espacios)					■	■						
			Transporte					■	■						
Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.	Producto 3.1: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Medido a través de: Número de asociaciones Cantidad: 1	Actividad 5. Fortalecimiento de procesos asociativos y estrategias de comercialización en pequeños productores.	Mano de obra calificada (Talento Humano)										■	■	
			Maquinaria y equipos										■	■	
			Materiales										■	■	
			Otros Servicios (Espacios)										■	■	
			Transporte										■	■	
		Actividad 6. Realizar el apoyo a la supervisión	Mano de obra calificada (Talento Humano)				■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Desarrollo de acciones de cierre y liquidacion	N/A												

Nota: Fuente Plan operativo - 2. Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026

4. Indicadores del proyecto

Tabla 2. Indicadores

Objetivos Específicos	Indicador de producto MGA WEB.	Actividad	Valor Total Actividad	Rubro	Valor Rubro	Indicador	Cantidad
Objetivo específico 1: Mejorar el acceso de activos productivos y el área sembrada de la agricultura familiar y campesina.	Producto 1.1: Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto Principal del Proyecto). Medido a través de: Número de productores Cantidad: 800	Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	$ 405.721.665	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 61.777.639	No. de informes de planeacion y desarrollo tecnico	2
				Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 174.817.220	No. de informes de implementacion y acompañamiento tecnico	1
				Materiales	$ 141.621.251	No. de actas de formalizacion de acuerdos con los beneficiarios	800
				Otros Servicios (Espacios)	$ 27.505.555	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
		Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	$ 21.540.621.343	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 2.057.060.396	No. de informes de implementacion y acompañamiento tecnico	10
				Maquinaria y equipos	$ 11.613.007.270	No. de actas de entrega de equipos	800
				Materiales	$ 7.101.057.452	No. de actas de enrega de insumos para fertilizacion	800
				Materiales	$ 275.002.969	No. de actas de entrega de herramientas	
				Mano de obra calificada (Analisis)	$ 283.145.423	No. de analisis de suelo	800
				Transporte	$ 211.347.833	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	11
Objetivo específico 2: Fortalecer las prácticas y capacidades técnicas en el proceso productivo de las líneas productivas que se adapten a la variabilidad climática.	Producto 2: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores Medido a través de: Número de pequeños productores rurales Cantidad: 800	Actividad 3. Capacitar en la cosecha y manejo eficiente del recurso hídrico para la productividad ante la variabilidad climática	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1
		Actividad 4. Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1

Objetivo específico 3: Impulsar procesos socio organizacionales y de comercialización de los esquemas asociativos.	Producto 3.1: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad Medido a través de: Número de asociaciones Cantidad: 1	Actividad 5. Fortalecimiento de procesos asociativos y estrategias de comercialización en pequeños productores.	$ 261.300.349	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 48.258.497	No. de capacitaciones desarrolladas	40
				Maquinaria y equipos	$ 19.415.686	No. de evidencias del alquiler de equipos	40
				Materiales	$ 140.367.321	No. de informes de adquisicion de materiales para capacitacion	1
				Otros Servicios (Espacios)	$ 51.026.850	No. de evidencias de la prestacion del servicio de espacios	40
				Transporte	$ 2.231.995	No. de evidencias de la prestacion del servicio de transporte	1
		Actividad 6. Realizar el apoyo a la supervisión.	$ 339.751.680	Mano de obra calificada (Talento Humano)	$ 339.751.680	No. de informes tecnicos, financieros y juridicos de supervision	12
Total			$ 23.069.995.735	**Total**	$ 23.069.995.735	**Total**	**1.189**

Nota: Fuente Plan operativo - 2. Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026

5. Informe de Avance Físico

5.1 Actividad 1. Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.

De acuerdo con lo planteado por el documento técnico para la consecución y selección de las familias beneficiarias del proyecto, de da por finalizada la actividad, en este caso no se reporta ejecución en el periodo del presente informe.

Tabla 3. Avance de ejecución de la Actividad No.1

Actividad	Descripción	Entregable	Cantidad	Avance	%Avance	%Avance Total
Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población objetivo para promover la intervención de los cultivos priorizados.	Realizar eventos de Sensibilización en municipios priorizados	Informe eventos de sensibilización	40	40	100	1.025
	Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria	Actas de Compromiso	800	800	100	0.733

Nota: Fuente equipo operador

El indicador de avance de la actividad se da de acuerdo con el número de actas de compromiso firmadas por las familias que desean participar de forma voluntaria y eventos de sensibilización, el avance de la actividad es de 100%.

5.2 Actividad 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.

5.2.1 Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico).

Durante el periodo reportado del presente informe, se presenta el proceso de implementación de cultivos y asistencia técnica en siembras, seguimiento a cultivos establecidos y cosechas. Esta actividad permitió evaluar aspectos relacionados con las condiciones productivas de los predios los cultivos priorizados, disponibilidad. Lo anterior permitió garantizar la pertinencia técnica, productiva y social de la intervención en las unidades productivas priorizadas dentro del municipio.

Se culmina con actividad de entrega de Materiales para la construcción de tanques Zamorano, insumos, Herramienta agrícola y maquinaria menor en los municipios faltantes de acuerdo como lo muestra la siguiente tabla entregando 20 kits por municipio para un total de 100 tanques, 100 Motoazadas entregadas y 100 kits de insumos entregados a las familias como se resume en la Tabla 4 a continuación:

Tabla 4. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados.

MUNICIPIO	TANQUES	MOTOAZADAS	INSUMOS Y HERRAMIENTAS
BRICEÑO	Entregado en Junio	20	20
LA VICTORIA	Entregado en Julio	20	20
MUZO	Entregado en Julio	20	20
OTANCHE	Entregado en Julio	20	20
PAYA	20	20	20
CHITA	20	Entregado en Julio	Entregado en Julio
JERICÓ	20	Entregado en Julio	Entregado en Julio
SOCOTÁ	20	Entregado en Julio	Entregado en Julio
SOMONDOCO	20	Entregado en Julio	Entregado en Julio
TOTAL	**100**	**100**	**100**

Nota: Fuente equipo operador

En este sentido la ampliación de la información se reporta en el 4. Informe de implementación en el manejo sostenible de cultivos que reposa en el anexo 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos. / 4. Informe Implementación en el manejo sostenible de sistemas productivos.

Se hace entrega de 100 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de la motoazada de 7HP en los anexos que reposan en 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.2 ACTAS ENTREGA DE MOTOAZADAS /Municipio de interés.

De la misma manera se hace entrega de 100 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la construcción de tanques Zamorano de 22 mil litros en los anexos que reposan en 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/1.2.2 ACTAS ENTREGA DE TANQUES CONSTRUIDOS /Municipio de interés.

Se hace entrega de 100 actas firmadas recibiendo a satisfacción por los beneficiarios del proyecto de la entrega de insumos y herramienta básica en los anexos que reposan en 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos/ 1.2.3 ACTAS ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS /Municipio de interés.

5.2.2 Reportar compendios de evidencia de Transporte.

De acuerdo al desarrollo y ejecución de la actividad para el periodo del presente informe se reporta la utilización de transporte para el cumplimiento de las demás actividades del proyecto y se presenta documento de reporte de transporte correspondiente a la subactividad mencionada. El soporte se encuentra en la carpeta 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 1.2 ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos. /1.2.5 Reportar compendios de evidencia de Transporte/ 4. Reporte de transporte agosto 2026.

Tabla 5. Avance de ejecución de la Actividad No.2

Actividad	Descripción	Entregable	Cantidad	Avance	%Avance	%Avance Total
Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura	Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar (Componente técnico)	Informes técnicos de implementación	10	4	40	3.56

familiar y de comercialización.	Realizar actas de entrega de maquinaria (Motoazadas) y equipos (Tanque y Maguera)	Actas de entrega de Motoazadas y tanques y manguera	800	800	100	50.33
	Realizar actas de entrega de kit de Insumos agrícolas y herramientas	Actas de entrega de kit de Insumos agrícolas y herramientas	800	800	100	31.97
	Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados	Resultados de análisis de suelos	800	800	100	1.22
	Reportar compendios de evidencia de Transporte	Reportes de transporte	11	5	45.45	0.41

Nota: Fuente equipo operador

El Porcentaje de avance en ejecución física de la actividad No.2 al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **93.73%.**

5.3 Actividad 4 Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.

El objetivo general de la actividad se centra en desarrollar estrategias de capacitación que promuevan la sostenibilidad en el departamento, fortaleciendo la capacidad instalada y facilitando la extrapolación de los resultados hacia los beneficiarios del proyecto enfocado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Las BPA son fundamentales para asegurar una producción agrícola responsable y sostenible, enfocándose en la protección del medio ambiente, la salud humana y la mejora de la calidad de los productos agrícolas.

Este enfoque busca que los productores adopten prácticas agrícolas que mejoren la eficiencia de sus recursos, reduzcan el impacto ambiental y optimicen la productividad, contribuyendo al desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

Esta actividad de capacitación en BPA se adelantó de acuerdo con el diseño metodológico, basado en el método teórico-práctico según el documento técnico del proyecto, que permite que los productores comprendan primero los fundamentos científicos, normativos y ambientales antes de aplicar las técnicas en sus propios contextos productivos, guiados por el equipo técnico del proyecto y trabajo autónomo de cada uno de los beneficiarios del municipio. Este diseño reposa en el anexo 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 2.2 ACTIVIDAD 4 Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad. /1. DISEÑADOR METODOLOGICO. /DISEÑO METODOLOGICO BPA_Actividad_4.pdf, que además se refuerza con la entrega Guía metodológica tipo carilla con una Adaptación de contenidos, diseño, diagramación, incluye impresión en 35 hojas (70 Paginas) entregada a cada uno de los 800 beneficiarios del proyecto. El diseño de esta cartilla reposa en anexo 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 2.2 ACTIVIDAD 4 Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad. /1. DISEÑADOR METODOLOGICO. / Guía metodológica BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Act 4.pdf.

El desarrollo de la adopción de BPA se inicia con jornadas teóricas en un lugar adecuado, con capacidad para más de 20 personas. En consecuencia, las jornadas se desarrollan de manera participativa en cuatro (4) momentos: Bienvenida, presentación de la actividad, presentación de los beneficiarios del proyecto (momento A), desarrollo de la temática de BPA (momento B), trabajo grupal (momento C), socialización de resultados y retroalimentación (momento D), finalmente compromisos y cierre de la actividad (momento E).

Para el periodo reportado en el presente informe la actividad se realizó en 20 de los municipios priorizados por el proyecto los cuales son Betéitiva, Buenavista, Busbanzá, Chiscas, Chivatá, Ciénega, Coper, Corrales, Cucaita, Guacamayas, Pesca, Ráquira, Santana, Soatá, Sora, Susacón, Sutatenza, Tenza, Tinjacá y Ventaquemada. Para ampliar información acerca del desarrollo de la actividad dirigirse al anexo 5. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2026/ 2.2 ACTIVIDAD 4 Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad. /Municipio de interés, en donde se puede encontrar un informe por cada uno de los municipios en mención con su respectivo listado de asistencia.

Tabla 6. Avance de ejecución de la Actividad No.4

Actividad	Descripción	Entregable	Cantidad	Avance	%Avance	%Avance Total
Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación	Realizar capacitación en los municipios priorizados sobre Buenas	Informes de capacitación en BPA Gestión de la Inocuidad.	40	20	50	0.56

productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.	Prácticas Agrícolas (BPA) y Gestión de la Inocuidad.					

Nota: Fuente equipo operador

El Porcentaje de avance en ejecución física de la actividad No.2 al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **50%.**

El Porcentaje de avance en ejecución física del proyecto al periodo reportado del presente informe, es determinado por la cantidad de entregables correspondientes a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **90.09%.**

6. Informe de Avance financiero

Ejecución Presupuestal con Cargo a las Actividades

6.1 Actividad 2. Implementar El Manejo Sostenible De Cultivos Con Vocación Productiva Para El Fortalecimiento De La Agricultura Familiar Y De Comercialización

Respecto a la actividad ya mencionada, tiene un valor de $21.540.621.343 la cual se discrimina a saber:

Tabla 7. Detalle Actividad 2

Actividad	Valor Actividad	Rubro	Valor Rubro
Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización	$21.540.621.343	Mano de Obra Calificada (Talento humano)	$2.057.060.395,59
		Maquinaria y Equipos	$11.613.007.269,91
		Materiales	$7.101.057.451,84
		Materiales	$275.002.969,44
		Mano de Obra Calificada (Análisis)	$283.145.422,81
		Transporte	$211.347.833,46

Nota: Fuente Ppto-Boy-AFC-V10-06-04-2026.

A continuación, se presenta de manera detallada lo que compone cada rubro de esta actividad con el fin de dar cumplimiento financiero a la misma:

Rubro “Mano de Obra Calificada”

Tabla 8. Detalle de Mano de Obra Calificada

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Técnico de acompañamiento Grupo 3-Perfil A: Tecnólogo y/o Técnico con formación en áreas de la zootecnia y/o veterinaria y/o ciencias agrarias y/o agropecuarias y/o afines, experiencia mayor a 36 meses, dedicación 100%.	40	$ 2.655.230	$ 106.209.200
2	Profesional Apoyo Técnico Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas de conocimiento de la zootecnia y/o medicina veterinaria y/o ingenierías agronómica o afines, experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	5	$ 4.164.591	$ 20.822.955
3	Coordinador Técnico Grupo 2-Perfil A: Especialista, con pregrado áreas de la zootecnia, medicina veterinaria y/o ingeniería agronómica encargado de la coordinación técnica, con experiencia entre 34 a 43 meses profesional relacionada, dedicación 100%.	3	$ 4.687.329	$ 14.061.987
4	Profesional de Planeación y Logística Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en el área de la ingeniería, administración de empresas, logística o afines, con experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	1	$ 4.164.591	$ 4.164.591
5	Director Técnico: Grupo 1-Perfil C: Especialista, con pregrado en administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería agrícola, agronómica, agroforestal, o afines con experiencia entre 24 a 44 meses de experiencia relacionada, dedicación 100%.	1	$ 7.131.387	$ 7.131.387
6	Profesional para el desarrollo de procesos sociales y comercialización: Grupo 2 Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas de la zootecnia y/o veterinaria y/o agricultura y/o agroecología y/o agroforestería y/o economía y/o administración y/o contaduría y/o afines, con experiencia de 25 a 34 meses de experiencia laboral, dedicación 100%.	1	$ 4.164.591	$ 4.164.591
7	Coordinador de articulación territorial y asociatividad rural campesina Grupo 1-Perfil D: Especialista en gerencia de proyectos, con pregrado en el área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas y afines, con experiencia 12 a 24 meses de experiencia relacionada, dedicación 100%.	1	$ 6.040.908	$ 6.040.908
8	Profesional de apoyo al desarrollo de procesos: Grupo 2-Perfil B: Especialista, con pregrado en áreas del conocimiento: ciencias sociales y humanas, ingeniería civil, Ingeniería Agroindustrial o afines, bellas artes, ciencias de la educación, con experiencia entre 25 a 34 meses, dedicación 100%.	2	$ 4.164.591	$ 8.329.182
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 170.924.801

IVA 19%	$	32.475.712,19
SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$	203.400.513,19
ADMINISTRACION	$	2.063.054,42
TOTAL EJECUTADO	**$**	**205.463.567,61**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Mano de Obra Calificada y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

Rubro "Maquinaria y Equipos"

Tabla 9. Detalle de Maquinaria y Equipos

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Motoazada A gasolina 7 HP. 2 velocidades y reversa + accesorio de adaptacion a motobomba.Art. 468-1 Estatuto Tributario	100	$ 4.277.160	$ 427.716.000
2	Manguera Agrominera calibre 60 negra de 2 pulgadasx 100 Mts cada una de las familias Art. 424. E.T. Componente Sistema de Captacion de agua e Irrigacion	100	$ 648.703	$ 64.870.300
3	Tanque: Suministro e instalación en situ de tanques para recoleccion de agua; Elaboración de Geobolsa en geomembrana de 1mm ASTM GM1, diámetro =4,8m altura=1,2, Cordón plástico para amarre de la geo bolsa en la malla. Art. 424. E.T. Componente Sistema de Captacion de agua e Irrigacion	80	$ 9.186.627	$ 734.930.160
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 1.227.516.460
			IVA 5%	$ 21.385.800
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 1.248.902.260
			ADMINISTRACION	$ 20.000.000,00
			TOTAL EJECUTADO	**$ 1.268.902.260,00**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Maquinaria y Equipos y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Materiales”

Tabla 10. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bioinsumo, Inoculante biologico que mezcla de ácidos orgánicos, potaso reductores y carbono orgánico, especializados en la inoculación de suelos, acondicionamiento de Rizósfera y Descomposición de Materia Orgánica, presentacion x 4 Litros.	400	$ 200.408	$ 80.163.200
2	Agente microbial antagonista de fitopatogenos; producto con una mezcla de diferentes especies del hongo antagonista Trichoderma spp. (T. harzianum, T.koningi y T. viridae) los cuales inhiben el crecimiento y desarrollo de hongos fitopatógenos del suelo y follaje, presentacion x 500 grs.	400	$ 210.272	$ 84.108.800
3	Bioinsecticida; producto biológico, a base de tazas cepas del hongo Metarhizium anisopliae y esporas de la bacteria Bacillus popilliae especializadas en el control de insectos y larvas de algunos coleópteros, presentacion x 500 grs	400	$ 264.632	$ 105.852.800
4	Fertilizante complejo NPK para aplicación foliar, concentrado soluble, presentacion x 1 litro	400	$ 277.876	$ 111.150.400
5	Biofungicida y biobactericida, único con base en Bacillustatinas producidas a partir de Bacillus amyloliquefaciens y Carbono Orgánico oxidable de rápida asimilación, presentacion x litro	500	$ 280.747	$ 140.373.500
6	Bioinsecticida a base de del hongo Beauveria bassiana y esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis especializadas en el control de insectos plaga, x 500 grs	500	$ 285.502	$ 142.751.000
7	Agente microbial antagonista de hongos fitopatógenos y nematicida a base de hongos Trichoderma sp. y Paecilomyces sp., ideal para el control de hongos y nematodos fitoparásitos. Presentacion x 500 grs.	500	$ 283.935	$ 141.967.500
8	Fertilizante complejo quelatado; potasio Soluble en Agua (K2O) , Calcio (CaO) , Boro (B), para aplicación foliar o al suelo, presentacion x litro	400	$ 174.131	$ 69.652.400
			SUBTOTAL FACTURA	$ 876.019.600

ADMINISTRACION	$ 9.000.000,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 885.019.600,00**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Materiales y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Materiales”

Tabla 11. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Machete 3 canales cacha plástica 18", bi-material	100	$ 37.739	$ 3.773.900
2	Azadon Cafetero 3753 No. 2 con cabo.	100	$ 58.286	$ 5.828.600
3	Pala Cargadora Redonda N°2 (con cabo)	100	$ 52.835	$ 5.283.500
4	Paladraga	100	$ 136.227	$ 13.622.700
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 28.508.700
			IVA 19%	$ 5.416.653,00
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 33.925.353,00
			ADMINISTRACION	$ 514.034,22
			TOTAL EJECUTADO	**$ 34.439.387,22**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Materiales y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro "Transporte"

Tabla 12. Detalle de Transporte


ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de vehículo de 2.000 CC o superior, incluye conductor, combustible, rodamiento y demás costos asociados.	2	$ 7.981.596	$ 15.963.192
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 15.963.192
			IVA 19%	$ 3.033.006,48
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 18.996.198,48
			ADMINISTRACION	$ 211.942,49
			TOTAL EJECUTADO	**$ 19.208.140,97**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Transporte y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

A la fecha de presentación de este informe se presenta un avance financiero de esta actividad 93.41%

Figura 1. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2.

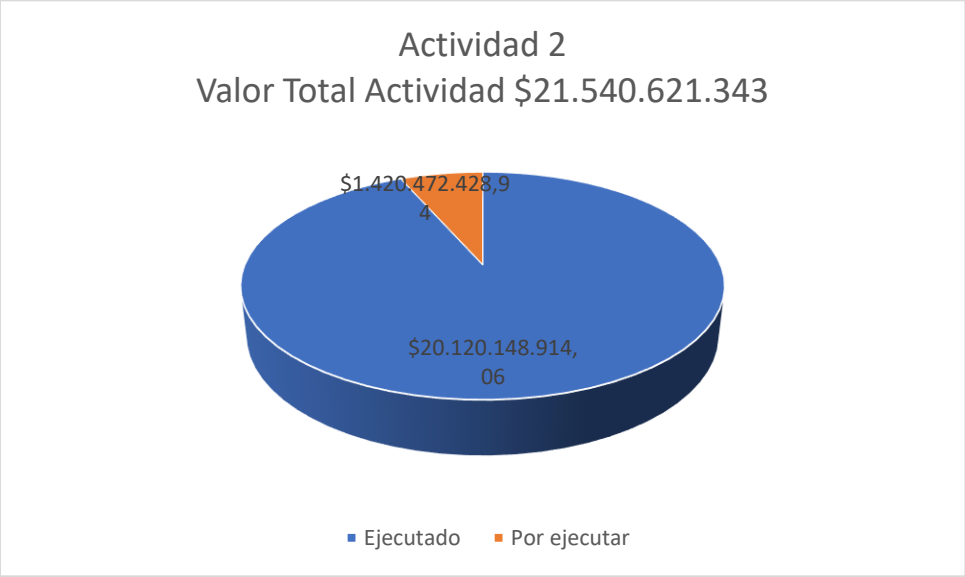

Nota: Fuente equipo operador

6.2 Actividad 4. Capacitar En Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Y Gestión De La Inocuidad

Respecto a la actividad ya mencionada, tiene un valor de $261.300.349 la cual se discrimina a saber:

Tabla 13. Detalle Actividad 4

Actividad	Valor Actividad	Rubro	Valor Rubro
Capacitar en buenas prácticas agrícolas (BPA) y gestión de la inocuidad	$21.540.621.343	Mano de Obra Calificada (Talento humano)	$48.258.497
		Maquinaria y Equipos	$19.415.686
		Materiales	$140.367.321
		Otros servicios (espacios)	$51.026.850
		Transporte	$2.231.995

Nota: Fuente equipo operador

A continuación, se presenta de manera detallada lo que compone cada rubro de esta actividad con el fin de dar cumplimiento financiero a la misma:

Rubro "Mano de Obra Calificada"

Tabla 14. Detalle de Mano de Obra Calificada

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Instructor Grupo 2 - Perfil C: Especialista, con pregrado en zootencica y/o medicina veterinaria y/o agronomía y/o ingeniería agronómica y/o ambiental y/o afines, con experiencia entre de 16 a 25 meses, Dedicacion 100%	800	$ 22.783	$ 18.226.400
2	Profesional diseño metodológico Grupo 2 - Perfil C: Especialsita, con pregrado en zootencica y/o medicina veterinaria y/o agronomía y/o ingeniería agronómica y/o ambiental y/o afines, con experiencia entre de 16 a 25 meses, Dedicacion 100%	80	$ 22.783	$ 1.822.640
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 20.049.040
			IVA 19%	$ 3.809.317,60
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 23.858.357,60
			ADMINISTRACION	$ 266.190,08
			TOTAL EJECUTADO	**$ 24.124.547,68**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Mano de Obra Calificada y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

Rubro "Maquinaria y Equipos"

Tabla 15. Detalle de Maquinaria y Equipos

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de equipos de computo 14" Pulgadas Core I3 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB	60	$ 62.899	$ 3.773.940
2	Alquiler de video beam Mínimo 3500 lúmenes	60	$ 71.285	$ 4.277.100
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 8.051.040
			IVA 19%	$ 1.529.697,60
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 9.580.737,60
			ADMINISTRACION	$ 106.893,25
			TOTAL EJECUTADO	**$ 9.687.630,85**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Maquinaria y Equipos y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

Rubro "Materiales"

Tabla 16. Detalle de Materiales

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Guía del formador a formadores, con el contenido para multiplicar la Instrucción a otros formadores en el Departamento. Adaptación de contenidos, diseño, diagramación, Corrección de estilo documental, incluye impresión en 35 hojas (70 Paginas) pegado a tamaño carta, la hojas de bond 90 y la portada en propalcote de 200 plastificada en brillante. 1 guia x 400 Beneficiarios	400	$ 145.515	$ 58.206.000
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 58.206.000
			IVA 19%	$ 11.059.140,00

SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 69.265.140,00
ADMINISTRACION	$ 772.798,09
TOTAL EJECUTADO	**$ 70.037.938,09**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Materiales y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Otros Servicios”

Tabla 17. Detalle de Otros Servicios

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de espacios físico Para los procesos de capacitación con capacidad para 30 personas, incluye suministro de mobiliario y adecuadas condiciones de ventilación e iluminación	60	$ 352.656	$ 21.159.360
			SUBTOTAL SIN IVA	$ 21.159.360
			IVA 19%	$ 4.020.278,40
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 25.179.638,40
			ADMINISTRACION	$ 280.931,74
			TOTAL EJECUTADO	**$ 25.460.570,14**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Otros servicios y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006”.

Rubro “Transporte”

Tabla 18. Detalle de Transporte

ITEM	ITEM	CANT	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tunja-Chivata-Tunja	1	$ 40.719	$ 40.719
2	Tunja-Cucaita-Tunja	1	$ 50.299	$ 50.299
3	Tunja-Sora-Tunja	1	$ 100.599	$ 100.599
4	Tunja-Guacamayas-Tunja	1	$ 35.928	$ 35.928
5	Tunja-Paya-Tunja	1	$ 69.461	$ 69.461
6	Tunja-Campohermoso-Tunja	1	$ 43.114	$ 43.114
7	Tunja-Páez-Tunja	1	$ 59.880	$ 59.880
8	Tunja-San Eduardo-Tunja	1	$ 83.832	$ 83.832
9	Tunja-Ciénega-Tunja	1	$ 11.976	$ 11.976
10	Tunja-Boavita-Tunja	1	$ 26.347	$ 26.347
11	Tunja-La Uvita-Tunja	1	$ 67.066	$ 67.066
12	Tunja-San Mateo-Tunja	1	$ 43.114	$ 43.114
13	Tunja-Sativanorte-Tunja	1	$ 16.766	$ 16.766
14	Tunja-Soata-Tunja	1	$ 38.323	$ 38.323
15	Tunja-Susacón-Tunja	1	$ 136.527	$ 136.527
16	Tunja-Briceño-Tunja	1	$ 23.952	$ 23.952
17	Tunja-Buenavista-Tunja	1	$ 35.928	$ 35.928
18	Tunja-Coper-Tunja	1	$ 83.832	$ 83.832
19	Tunja-La Victoria-Tunja	1	$ 100.599	$ 100.599
20	Tunja-Muzo-Tunja	1	$ 38.323	$ 38.323
			SUBTOTAL FACTURA CON IVA	$ 1.106.585
			ADMINISTRACION	$ 12.288,40

	TOTAL EJECUTADO	**$ 1.118.873,40**

Nota: Fuente equipo operador

Esta información se presenta mediante la factura, y se interviene el Rubro de Transporte y serán cargados al contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.9352770/2376 Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026 para la operación integral del proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá BPIN 2025000050006".

A la fecha de presentación de este informe se presenta un avance financiero de esta actividad 49.92%

Figura 2. Gráfica del porcentaje de avance financiero Actividad No.2.



Nota: Fuente equipo operador

Tabla 19. Avance por Actividad


Actividad	Valor Programado	Valor Ejecutado Agosto	Valor Ejecutado Acumulado	% Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% por Ejecutar
1	$ 405.721.665		$371.051.844,90	91.45%	$ 34.669.820,10	8.55%
2	$ 21.540.621.343	$ 2.413.032.955,80	$ 20.120.148.914,06	93.41%	$ 1.420.472.428,94	6.59%

3	$ 261.300.349			0%	$ 261.300.349,00	100%
4	$ 261.300.349	$ 130.429.560,16	$ 130.429.560,16	49.92%	$ 130.870.788,84	50.08%
5	$ 261.300.349			0%	$ 261.300.349,00	100%
TOTAL	$ 22.730.244.055	$ 2.543.462.515,96	$ 20.621.630.319,12	90.72%	$ 2.108.613.735,88	9.28%

Nota: Fuente equipo operador

Como se puede observar en la tabla el proyecto presenta un avance de 90.72%

Figura 3. Gráfica del porcentaje de avance financiero del proyecto.

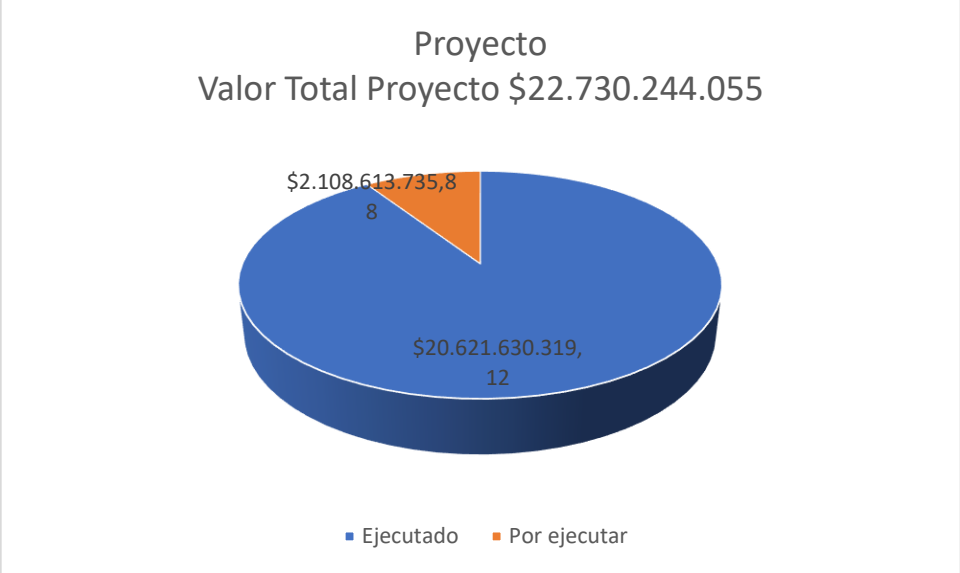

Nota: Fuente equipo operador

Los soportes correspondientes se encuentran dispuestos en la carpeta: 5. INFORME DE AVANCE - AGOSTO 2026/ ANEXOS/ ANEXOS FINANCIEROS.

7. Informe de Avance jurídico

El presente informe jurídico se elabora desde la perspectiva del CONTRATISTA, Consorcio Agro Resiliente Boyacá 2026, con el propósito de documentar y presentar el estado jurídico de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9352770/2376, particularmente en lo relacionado con las garantías constituidas, los contratos asociados a la operación del proyecto, el contexto técnico y normativo aplicable y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del contratista. El contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública y su ejecución se desarrolla dentro del marco jurídico aplicable a la contratación estatal, integrado, entre otras disposiciones, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que regulan el Sistema General de Regalías, así como por las demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resulten aplicables a la naturaleza y alcance del proyecto.

7.1 Obligaciones Legales Y Contractuales Del Contratista

El CONTRATISTA ha orientado la ejecución del contrato al cumplimiento integral de las obligaciones previstas en la minuta contractual, los estudios y documentos que hacen parte del proceso de contratación y demás instrumentos que regulan la ejecución del proyecto. Dentro de dichas obligaciones se encuentran, entre otras, la ejecución técnica y material del objeto contractual, el cumplimiento del plan operativo aprobado, la presentación oportuna de los informes y soportes requeridos, la vinculación del personal idóneo y suficiente para el desarrollo de las actividades, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias, de seguridad social y demás cargas legales derivadas de la ejecución contractual.

En relación con la Actividad No. 2 prevista en el contrato, se adelantó la ejecución material correspondiente a la entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, insumos, herramientas y maquinaria, de conformidad con la programación y distribución establecida para los municipios beneficiarios del proyecto. En desarrollo de esta actividad, se efectuó la entrega de veinte (20) kits por municipio, conforme a las cantidades, especificaciones y condiciones previstas dentro de la planeación contractual, constituyéndose dicha actuación en una manifestación concreta y verificable de la ejecución material de las obligaciones asumidas por el contratista.

Con respecto a la Actividad No.4, se adelantó con la contratación del personal de un diseñador metodológico y cinco instructores los cuales se distribuyen en 5 zonas, cada uno atiende la capacitación en la temática correspondiente en ocho de los municipios, mediante un contrato de prestación de servicios.

Debe precisarse que el cumplimiento de las obligaciones contractuales no se circunscribe exclusivamente a la acreditación de la vinculación del personal, la celebración de contratos laborales o de prestación de servicios, ni al pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás obligaciones derivadas de la administración del recurso humano. Por el

contrario, el cumplimiento contractual comprende igualmente la ejecución efectiva, real y verificable de las actividades que integran el objeto contractual, dentro de las cuales se encuentra la adquisición, disposición y entrega de los insumos, materiales, herramientas y demás elementos previstos para el desarrollo del proyecto.

En ese sentido, la ejecución de las actividades programadas y la entrega efectiva de los bienes e insumos contemplados contractualmente constituyen elementos materiales que permiten acreditar el avance en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, sin perjuicio de los soportes documentales, administrativos, financieros y técnicos que respaldan cada una de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución del contrato.

Por consiguiente, el CONTRATISTA ha venido dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo, tanto desde el componente administrativo y documental como desde la perspectiva de la ejecución material del objeto contractual, manteniendo la trazabilidad de las actuaciones adelantadas y de los recursos humanos, técnicos y operativos destinados al desarrollo del proyecto.

7.2 Relación De Contratos Asociados Al Proyecto

En desarrollo de las obligaciones contractuales y de conformidad con la estructura presupuestal aprobada para la ejecución del proyecto, se presenta la relación de los contratos celebrados para atender los requerimientos de personal administrativo y operativo, indicando para cada caso el valor contractual, plazo de ejecución y perfil requerido, de acuerdo con las necesidades propias de la operación.

La contratación del personal se ha efectuado atendiendo los perfiles y requerimientos establecidos para la ejecución del proyecto y observando los valores contemplados dentro del presupuesto contractual, particularmente aquellos determinados mediante el factor multiplicador correspondiente al componente de personal mínimo requerido para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

En consecuencia, los contratos asociados al componente administrativo y operativo cuentan con la respectiva asignación económica y responden a necesidades concretas de la ejecución contractual, sin que se evidencie la existencia de contrataciones sin cuantía económica dentro de dicho componente, en concordancia con la estructura presupuestal definida para el proyecto.

De igual manera, la vinculación del personal y la ejecución de los respectivos contratos se han desarrollado bajo observancia de las disposiciones legales aplicables, procurando garantizar el cumplimiento de los deberes derivados de la relación contractual, así como de las obligaciones laborales, de seguridad social, tributarias y demás cargas que resulten exigibles conforme a la naturaleza de cada vínculo.

Tabla 20. Personal Administrativo Contratado

Perfil	Nombres y Apellidos	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Valor Total
Profesional Financiero	Magda Cecilia Camacho Leal	SGR- 2025000050006-CL-01	06/04/2026	31/3/2027	$ 49.212.625
Analista Contable y Financiero	Claudia Yineth Neira Daza	SGR- 2025000050006-CL-02	06/04/2026	3/10/2026	$ 26.241.543,88
Coordinador Jurídico	María José Bolívar Barrera	SGR- 2025000050006-CL-03	06/04/2026	31/3/2027	$ 49.212.625

Nota: Fuente equipo operador

Tabla 21. Personal Operativo Contratado

Perfil	Nombres y Apellidos	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Valor Total
Coordinador de articulación territorial y asociatividad rural campesina	Carlos Andrés Arias Daza	SGR- 2025000050006-CL-04	6/4/2026	31/3/2027	$ 63.423.111,55
Director Técnico	Jorge Rolando Reina Mesa	SGR- 2025000050006-CL-05	8/4/2026	31/3/2027	$ 74.450.166,87
Coordinador Técnico	Neldy Tatiana Rodríguez Celis	SGR- 2025000050006-CL-06	6/4/2026	28/2/2027	$ 45.053.779,34
Coordinador Técnico	Diego Pérez	SGR- 2025000050006-CL-07	6/4/2026	18/9/2026	$ 45.053.790,18
Coordinador Técnico	William Alean	SGR- 2025000050006-CL-08	6/4/2026	18/9/2026	$ 45.053.801,01
Técnico de acompañamiento Almeida	Deisy Giselle Veloza	SGR- 2025000050006-CL-09	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Betéitiva	Carlos Riveros Lemus	SGR- 2025000050006-CL-10	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Boavita	Juan Manuel Velasco Fuentes	SGR- 2025000050006-CL-11	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Briceño	Deisy Alejandra Rugeth	SGR- 2025000050006-CL-12	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Buenavista	Rodrigo Ballesteros Torres	SGR- 2025000050006-CL-13	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Busbanzá	Edward Jiménez	SGR- 2025000050006-CL-14	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Campohermoso	Faber Rodrigo Parra Mora	SGR- 2025000050006-CL-15	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chiscas	Juan de Jesús Ardila	SGR- 2025000050006-CL-16	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chita	Martha Luzmila Cotrina Silva	SGR- 2025000050006-CL-17	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Chivatá	Viviana Rodríguez	SGR- 2025000050006-CL-18	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ciénega	Omar Prieto	SGR- 2025000050006-CL-19	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Coper	Kevin Fabian Murcia Carrillo	SGR- 2025000050006-CL-20	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19

Técnico de acompañamiento Corrales	Edwin Quintana	SGR- 2025000050006-CL-21	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Cucaita	Amed Alexander Bernal	SGR- 2025000050006-CL-22	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guacamayas	Frankiln Mora	SGR- 2025000050006-CL-23	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guateque	Kevin Tomas Mora Colmenares	SGR- 2025000050006-CL-24	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Guayatá	Yesika Moreno Morales	SGR- 2025000050006-CL-25	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Jericó	Cristihan Panqueva Riaño	SGR- 2025000050006-CL-26	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento La Uvita	Carlos Eduardo Caceres Medina	SGR- 2025000050006-CL-27	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento La Victoria	Luis Emiro Florido	SGR- 2025000050006-CL-28	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Muzo	María Custodia Pinedo Solosa*	SGR- 2025000050006-CL-29	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Otanche	Loren Michel Velasco Coronado	SGR- 2025000050006-CL-30	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Páez	Yesica Paola Cárdenas Cristancho*	SGR- 2025000050006-CL-31	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Paya	Ainer Noel Piraban Cristancho	SGR- 2025000050006-CL-32	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Paz de Río	Neyla Santos Triana	SGR- 2025000050006-CL-33	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Pesca	Rosana Lemus	SGR- 2025000050006-CL-34	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ráquira	Jhoan Augusto Castiblanco Murcia*	SGR- 2025000050006-CL-35	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento San Eduardo	Naren Stiven Cendales Martínez	SGR- 2025000050006-CL-36	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento San Mateo	José Darwin Jair Amaya	SGR- 2025000050006-CL-37	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Santana	Cesar Carrero	SGR- 2025000050006-CL-38	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Sativanorte	Ana Milena Camacho Amado	SGR- 2025000050006-CL-39	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Soatá	Daniel Enoc Bossa	SGR- 2025000050006-CL-40	13/4/2026	21/9/2026	$ 24.971.593,04
Técnico de acompañamiento Socotá	John Jairo Diaz Botia	SGR- 2025000050006-CL-41	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Somondoco	Hugo Ernesto Alfonso	SGR- 2025000050006-CL-42	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Sora	Rafael Raba Roberto	SGR- 2025000050006-CL-43	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Susacón	José Joaquín Mesa Lizarazo	SGR- 2025000050006-CL-44	21/4/2026	25/9/2026	$ 24.343.376,86
Técnico de acompañamiento Sutatenza	Ruth Lucely Novoa	SGR- 2025000050006-CL-45	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Tenza	Edgar Valero	SGR- 2025000050006-CL-46	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Tinjacá	Henry Gonzalo Díaz	SGR- 2025000050006-CL-47	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Técnico de acompañamiento Ventaquemada	Nanci Yohana Pamplona Montañez	SGR- 2025000050006-CL-48	6/4/2026	18/9/2026	$ 25.521.282,19
Profesional para el desarrollo de procesos sociales	Wilmer Alfonso Velasquez Rey	SGR- 2025000050006-CL-49	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22

Profesional de apoyo al desarrollo de procesos	Ibette Yirley Ruíz Sánchez	SGR- 2025000050006-CL-50	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22
Profesional de apoyo al desarrollo de procesos	Nelson Alejandro Rincón	SGR- 2025000050006-CL-51	6/4/2026	31/3/2027	$ 43.723.781,22
Profesional de Planeación y Logística	Yised Marcela Monroy Kaye	SGR- 2025000050006-CL-52	6/4/2026	28/2/2027	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Néstor Duarte Molano	SGR- 2025000050006-CL-53	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Adriana Palacios	SGR- 2025000050006-CL-54	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Juan Carlos Reyes	SGR- 2025000050006-CL-55	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Sergio Rodríguez	SGR- 2025000050006-CL-56	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80
Profesional Apoyo Técnico	Gabriel Alejandro Niño	SGR- 2025000050006-CL-57	6/4/2026	18/9/2026	$ 40.028.813,80

Nota: Fuente equipo operador

Tabla 22. Personal Operativo Contratado Actividad No. 4

Perfil	Nombres y Apellidos	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Valor Mensual
Diseñador Metodológico BPA	Iván Cáceres	SGR- 2025000050006-CL-63	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920
Instructor BPA	Henry Reyes	SGR- 2025000050006-CL-61	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920
Instructor BPA	Jhonatan Carrillo	SGR- 2025000050006-CL-62	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920
Instructor BPA	Julio Sánchez	SGR- 2025000050006-CL-58	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920
Instructor BPA	Wilson Ávila	SGR- 2025000050006-CL-60	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920
Instructor BPA	Alexandra Sánchez	SGR- 2025000050006-CL-59	1/8/2026	30/9/2026	$4.337.920

Nota: Fuente equipo operador

7.3 Cumplimiento Sistema De Seguridad Social.

El Contratista certifica que se ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones en materia de Seguridad Social Integral, asegurando que todas las personas vinculadas al proyecto se encuentran debidamente afiliadas y al día en sus aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normativa vigente.

De manera continua y se verifica que cada integrante del equipo cuente con la cobertura correspondiente al nivel de riesgo de sus actividades y que los pagos de aportes se realicen de forma oportuna, garantizando que ninguna labor operativa, administrativa o de campo se ejecute sin el cumplimiento previo de estas obligaciones. Este compromiso permanente con la seguridad

social constituye un eje esencial de la correcta ejecución contractual y refleja el cumplimiento de los estándares legales, operativos y de gestión exigidos para proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Los soportes correspondientes se encuentran dispuestos en la carpeta: 5. INFORME DE AVANCE - AGOSTO 2026/ ANEXOS/ ANEXOS JURÍDICOS.

8. Conclusiones

La ejecución del proyecto fortalecer los sistemas productivos de agricultura familiar mediante la entrega de activos productivos destinados a mejorar la disponibilidad de agua, la eficiencia de las labores agrícolas y la capacidad productiva de los beneficiarios.

Las jornadas desarrolladas evidencian el cumplimiento de las actividades programadas para los municipios priorizados y constituyen una estrategia de adaptación frente a los efectos asociados a la variabilidad climática, contribuyendo al fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las unidades productivas rurales.

El proceso de entrega de materiales para la construcción de tanques tipo Zamorano culminó en su totalidad y permitó la construcción in situ en cada uno de los predios de los beneficiarios seleccionados en los municipios priorizados por el proyecto, atendiendo inicialmente la necesidad de almacenamiento de agua para el suministro a los cultivos en épocas de escases de lluvias.

La entrega del kit de insumos herramientas y manguera sumado con la construcción del tanque a los beneficiarios tiene gran pertinacia en resolver problemáticas de fondo que se presentas en las unidades productivas familiares promoviendo el ahorro de recursos naturales y materiales en productividad de los cultivos priorizados por el proyecto en cada uno de los municipios.

Los porcentajes de avance en ejecución física y financiera del proyecto al periodo reportado del presente informe, son determinados por la cantidad de entregables correspondiente a las actividades y al valor total de las mismas, en este orden de ideas el porcentaje de avance físico para el periodo reportado es de **90.09%** y el porcentaje de avance el proyecto presenta un avance de **90.72%**.

INFORME TÉCNICO DE AVANCE

ACTIVIDAD 2. Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización.

Implementar el manejo sostenible de sistemas productivos de la agricultura familiar.

Consorcio Agro Resiliente

Gobernación de Boyacá

AGOSTO 2026.

Contenido

1. Introducción.....6
2. Alcance de la actividad.....7
3. Metodología de ejecución.....7
4. Entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano.....8
   - **Municipio de Paya**.....9
   - **Municipio de Chita**.....10
   - **Municipio de Jericó**.....12
   - **Municipio de Socotá**.....14
   - **Municipio de Somondoco**.....15
5. Reporte de entrega de motoazadas, insumos y herramientas.....17
   - **Municipio de Briceño**.....17
   - **Municipio de La Victoria**.....19
   - **Municipio de Muzo**.....21
   - **Municipio de Otanche**.....23
   - **Municipio de Paya**.....25
6. Avance en la Construcción de Tanques Zamorano.....26
7. Caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF).....31
8. Novedades y Situaciones Extraordinarias de los Beneficiarios.....33
9. Resultados Obtenidos.....39
10. Conclusiones.....33

Índice de Tablas

Tabla 1. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados. 8

Tabla 2. Entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano. 9

Tabla 3. Entrega de motoazadas, insumos y herramientas. 17

Tabla 4. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano 27

Tabla 5. Consolidado de registros de caracterización de las UPF 31

Tabla 6. Consolidado de novedades de los beneficiarios 32

Tabla 7. Avance acumulado en la entrega de motoazadas y kit agrícola 35

Tabla 8. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano 36

Índice de Figuras

Figura 1. Ruta de desplazamiento Duitama - Paya. 10
Figura 2. Municipio de Paya, fecha de entrega 20/08/2026. 10
Figura 3. Ruta de desplazamiento Duitama - Chita. 11
Figura 4. Municipio de Chita, fecha de entrega 13/08/2026. 12
Figura 5. Ruta de desplazamiento Duitama - Jericó. 13
Figura 6. Municipio de Jericó, fecha de entrega 13/08/2026. 13
Figura 7. Ruta de desplazamiento Duitama - Socotá. 14
Figura 8. Municipio de Socotá, fecha de entrega 12/08/2026. 15
Figura 9. Ruta de desplazamiento Duitama - Somondoco. 16
Figura 10. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 30/07/2026. 16
Figura 11. Ruta de desplazamiento Duitama - Briceño. 18
Figura 12. Municipio de Briceño, fecha de entrega 18/08/2026. 19
Figura 13. Ruta de desplazamiento Duitama - La Victoria. 20
Figura 14. Municipio de La Victoria, fecha de entrega 15/08/2026. 21
Figura 15. Ruta de desplazamiento Duitama - Muzo. 22
Figura 16. Municipio de Muzo, fecha de entrega 14/08/2026. 23
Figura 17. Ruta de desplazamiento Duitama - Otanche. 24
Figura 18. Municipio de Otanche, fecha de entrega 18/08/2026. 25
Figura 19. Municipio de Paya, fecha de entrega 20/08/2026. 26
Figura 20. Tanque construido municipio de Guacamayas. Zona 1. 28
Figura 21. Tanque construido municipio de Corrales. Zona 2. 29
Figura 22. Tanque construido municipio de Tinjacá. Zona 3. 29
Figura 23. Tanque construido municipio de Santana. Zona 4. 30
Figura 24. Tanque construido municipio de Chivatá. Zona 5. 30
Figura 25. Avance acumulado en el suministro de materiales. 34
Figura 26. Avance acumulado en el suministro de motoazadas y kits 35

Figura 27. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano 36
Figura 28. Cobertura territorial de la caracterización y seguimiento de UPF 37
Figura 29. Número de UPF registradas por municipio 38
Figura 30. Distribución de cultivos identificados en las UPF caracterizadas 38

1. Introducción

El presente informe técnico de avance tiene como propósito presentar las actividades desarrolladas durante el mes de agosto de 2026, en el marco de la Actividad 2. “Implementar el manejo sostenible de cultivos con vocación productiva para el fortalecimiento de la agricultura familiar y de comercialización”, correspondiente al proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina ante la variabilidad climática en el departamento de Boyacá”, BPIN 2025000050006.

La Actividad 2 está orientada al fortalecimiento de los sistemas productivos de agricultura familiar y campesina mediante el acceso a activos productivos, insumos para el manejo sostenible de los cultivos, infraestructura para la gestión del recurso hídrico, análisis de las condiciones del suelo y acompañamiento técnico a los productores. Durante agosto de 2026 se continuó con la implementación de los componentes previstos para esta actividad, destacándose la entrega de materiales para la construcción de tanques Zamorano, como parte del sistema de captación y almacenamiento de agua; la entrega de motoazadas destinadas a facilitar las labores de preparación y manejo del suelo; y la entrega de bioinsumos agrícolas orientados al acondicionamiento del suelo, nutrición vegetal y manejo biológico de plagas y enfermedades en los cultivos priorizados. Estos elementos hacen parte integral del Kit Agrícola orientado a mejorar la eficiencia de las labores productivas y promover prácticas de manejo más sostenibles.

De manera complementaria, durante el periodo se avanzó en actividades asociadas al seguimiento de la construcción y funcionamiento de los tanques, entrega de material técnico y gestión de los análisis de suelo, como insumos para orientar las decisiones de manejo agronómico de las unidades productivas beneficiarias. Estas actuaciones permiten articular la dotación de activos productivos con el conocimiento de las condiciones particulares de los sistemas agrícolas y con el proceso de acompañamiento técnico previsto por el proyecto.

Como parte del avance técnico del acompañamiento, durante agosto de 2026 se continuó con las visitas de campo para la caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF). Como resultado de este proceso, al corte del periodo reportado se cuenta con registros de caracterización correspondientes a 19 municipios, los cuales fueron consolidados para el seguimiento de las unidades productivas beneficiarias.

En consecuencia, el presente informe consolida los avances alcanzados durante agosto en los diferentes componentes de la Actividad 2, diferenciando las acciones relacionadas con infraestructura para el manejo del recurso hídrico, entrega de maquinaria agrícola, entrega de bioinsumos, análisis de suelos, caracterización y seguimiento de las UPF y demás actuaciones de acompañamiento técnico, con el propósito de evidenciar su contribución al manejo sostenible de los cultivos y al fortalecimiento de la capacidad productiva y adaptativa de las familias beneficiarias frente a la variabilidad climática.

2. Alcance de la actividad

Durante el mes de agosto de 2026, se dio continuidad a la ejecución de la Actividad 2 en los municipios priorizados, mediante la entrega e implementación de los componentes del Kit Agrícola, el seguimiento a los sistemas de almacenamiento de agua y el desarrollo de acciones asociadas al análisis de suelos y acompañamiento de las unidades productivas beneficiarias.

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con la programación establecida para el periodo y las condiciones particulares de cada unidad productiva, dando continuidad al proceso de implementación y seguimiento del manejo sostenible de los cultivos priorizados.

3. Metodología de ejecución

Para el desarrollo de las actividades de entrega se realizó inicialmente la articulación entre el equipo del Consorcio Agro Resiliente, conformado por la Gerencia Técnica del proyecto, coordinadores de zona, profesionales de acompañamiento y técnicos de acompañamiento, y las respectivas administraciones municipales y/o los delegados designados por las alcaldías como enlaces para la gestión de las jornadas.

A partir de esta articulación se concertaron las fechas, horarios y puntos de encuentro, se coordinó la convocatoria de los beneficiarios y se adelantó la logística requerida para el alistamiento, cargue y traslado de los materiales, equipos e insumos desde la base de operaciones del Consorcio, ubicada en la Ciudadela Industrial de la ciudad de Duitama, hasta cada uno de los municipios programados.

Para la entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, una vez dispuestos los elementos en el punto de encuentro establecido, se realizó la verificación de los beneficiarios y se procedió con la entrega de los materiales correspondientes, efectuando el diligenciamiento de los respectivos soportes y registros de la actividad.

Por su parte, las jornadas de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas estuvieron antecedidas por un evento protocolario organizado en coordinación con la administración municipal. El evento contempló la entonación de los himnos, seguida de las palabras del alcalde municipal o representante de la administración municipal, la intervención del representante del Consorcio Agro Resiliente y las palabras de un beneficiario, como parte de la apertura y contextualización de la jornada.

Finalizado el componente protocolario, se procedió con la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los beneficiarios convocados. Durante este procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, dejando constancia de su recepción a través de la suscripción del acta de entrega correspondiente. Asimismo, se realizaron los registros requeridos como soporte de la actividad.

Para el desarrollo de la caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF), las visitas de acompañamiento se programan y distribuyen durante el mes de acuerdo con las directrices establecidas por la Gerencia del proyecto y la disponibilidad de los beneficiarios.

En este proceso participan los técnicos de acompañamiento, encargados de realizar las visitas y recopilar la información en campo; los profesionales de acompañamiento, quienes efectúan la revisión y validación de la información en territorio; y los coordinadores de zona, quienes, revisan y validan la información, también articulan y coordinan la programación de las actividades en territorio. La información obtenida es consolidada y depurada para su incorporación en la matriz de seguimiento del proyecto.

Las actividades descritas fueron desarrolladas de acuerdo con la programación establecida para cada municipio, realizando los ajustes operativos requeridos según las condiciones de desplazamiento, disponibilidad de los actores locales, ubicación de los puntos de encuentro y dinámica de las actividades de acompañamiento en campo.

Tabla 1. Consolidado de entregas del proyecto en los municipios priorizados.

ITEM	MUNICIPIO	TANQUES (Fecha de Entrega)	MOTOAZADAS (Fecha de Entrega)	INSUMOS Y HERRAMINETAS (Fecha de Entrega)
1	**Briceño**	20 (29/05/2026)	20 (18/08/2026)	20 (18/08/2026)
2	**La Victoria**	20 (23/06/2026)	20 (15/08/2026)	20 (15/08/2026)
3	**Muzo**	20 (10/06/2026)	20 (14/08/2026)	20 (14/08/2026)
4	**Otanche**	20 (15/07/2026)	20 (18/08/2026)	20 (18/08/2026)
5	**Paya**	20 (20/08/2026)	20 (20/08/2026)	20 (20/08/2026)
6	**Chita**	20 (13/08/2026)	20 (22/07/2026)	20 (22/07/2026)
7	**Jericó**	20 (13/08/2026)	20 (22/07/2026)	20 (22/07/2026)
8	**Socotá**	20 (12/08/2026)	20 (23/07/2026)	20 (23/07/2026)
9	**Somondoco**	20 (30/07/2026)	20 (11/07/2026)	20 (11/07/2026)
TOTAL		**100**	**100**	**100**

Nota: Fuente equipo operador

4. Entrega de materiales para construcción de tanques Zamorano

Durante el mes de agosto de 2026 se continuó con la entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano en las unidades productivas familiares beneficiarios del proyecto. Para el periodo reportado, esta actividad se desarrolló en los municipios de Chita, Jericó, Paya, Socotá y Somondoco, con la entrega de materiales a 20 beneficiarios por municipio, para un total de 100 beneficiarios atendidos. Las jornadas se ejecutaron conforme a la metodología descrita en el numeral anterior y a la programación establecida para cada municipio,

dejando como soporte los respectivos registros y actas de entrega. La entrega de estos materiales hace parte del componente del Kit Agrícola orientado al fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico en las unidades productivas beneficiarias. Como soporte de las actividades realizadas se cuenta con los respectivos registros fotográficos y actas de entrega suscritas en cada municipio.

A continuación, se presenta la descripción de las jornadas desarrolladas en cada municipio durante el periodo objeto del presente informe.

Tabla 2. Entrega de materiales para la construcción de tanques Zamorano durante agosto de 2026.

ITEM	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	FECHA DE ENTREGA
1	**Paya**	20	20/08/2026
2	**Chita**	20	13/08/2026
3	**Jericó**	20	13/08/2026
4	**Socotá**	20	12/08/2026
5	**Somondoco**	20	30/07/2026
TOTAL		**100**	**-**

Nota: Fuente equipo operador.

Municipio de Paya

El 20 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Paya la entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto.

La actividad se desarrolló en el coliseo cubierto, ubicado en el casco urbano del municipio, dispuesto como punto de encuentro para la recepción y distribución de los materiales.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre desde la base de operaciones del Consorcio, ubicada en la Ciudadela Industrial de la ciudad de Duitama, hasta el municipio de Paya, en un recorrido aproximado de 130 km.

El trayecto siguió la ruta Duitama - Sogamoso - El Crucero - Toquilla - Páramo de La Sarna - Labranzagrande - Alto del Oso - Paya, combinando vías principales y corredores de acceso hacia la provincia de La Libertad. Una vez en el municipio, los materiales fueron dispuestos en el punto previamente establecido para efectuar su entrega a los beneficiarios, conforme a la metodología definida para esta actividad.

La jornada contó con el acompañamiento del alcalde municipal, funcionarios de la Administración Municipal, representantes de sus dependencias, integrantes de ASMUPo, vinculados a la UMATA, el equipo territorial del proyecto y los beneficiarios convocados. Los registros fotográficos obtenidos durante la actividad evidencian el desarrollo de la jornada, la participación institucional y la disposición de los materiales entregados.

Figura 1. Ruta de desplazamiento Duitama - Paya para la entrega de materiales de tanques Zamorano.



Nota: El recorrido corresponde a la ruta terrestre empleada para el desplazamiento desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de la ciudad de Duitama, hasta el municipio de Paya. Distancia aproximada del trayecto, 130 km.

Figura 2. Municipio de Paya, fecha de entrega 20/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Chita

El 13 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Chita la jornada de entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, beneficiando a 20 productores vinculados al

proyecto. La actividad se desarrolló en el punto previamente establecido para la recepción y distribución de los materiales, conforme a la programación definida para el municipio.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre desde la base de operaciones del Consorcio, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Chita, en un recorrido estimado de aproximadamente 163 km. De acuerdo con la ruta considerada para el transporte, el trayecto comprendió Duitama - Santa Rosa de Viterbo - Floresta - Busbanzá - Corrales - Gámeza - Tasco - Socha - Socotá - Chita, utilizando vías nacionales y secundarias, con tramos pavimentados y en afirmado. Las características del recorrido y las condiciones de acceso al municipio fueron consideradas dentro de la logística para el desplazamiento de los vehículos que transportaron los materiales.

La jornada contó con el acompañamiento de la Secretaria de Gobierno como representante de la administración municipal, la Doctora Alejandra Monguí, el equipo territorial del proyecto y los beneficiarios convocados, permitiendo desarrollar la entrega conforme a la programación prevista. Los registros generados durante la actividad constituyen el soporte de la entrega de materiales realizada a las unidades productivas familiares beneficiarios del municipio.

Una vez en el municipio, los materiales fueron dispuestos en el punto establecido para la jornada y posteriormente entregados a los 20 beneficiarios, conforme a la metodología de ejecución descrita en el numeral anterior. La actividad quedó respaldada mediante los respectivos soportes de entrega y registros fotográficos.

Figura 3. Ruta de desplazamiento Duitama - Chita para la entrega de materiales de tanques Zamorano.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Chita. El recorrido corresponde a una distancia aproximada de 163 km y contempla vías nacionales y secundarias con tramos pavimentados y en afirmado.

Figura 4. Municipio de Chita, fecha de entrega 13/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Jericó

El 13 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Jericó la jornada de entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad se desarrolló en el punto previamente establecido para la recepción y distribución de los materiales, con participación del equipo territorial del proyecto y los beneficiarios convocados. Para esta jornada no se contó con el acompañamiento del alcalde ni de funcionarios de la Administración Municipal.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Jericó, en un recorrido estimado de aproximadamente 105 km. La ruta considerada comprendió el corredor Duitama - Santa Rosa de Viterbo - Belén - Paz de Río - Socha - Socotá - Jericó, utilizando vías nacionales y secundarias y, en su tramo final, el corredor vial que comunica a Socotá con Jericó.

Una vez en el municipio, los materiales fueron dispuestos en el punto establecido para la jornada y posteriormente entregados a los 20 beneficiarios, conforme a la metodología de ejecución descrita en el numeral 3. La actividad quedó respaldada mediante los respectivos soportes de entrega y registros fotográficos.

Figura 5. Ruta de desplazamiento Duitama - Jericó para la entrega de materiales de tanques Zamorano.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Jericó. El recorrido corresponde a una distancia aproximada de 105 km.

Figura 6. Municipio de Jericó, fecha de entrega 13/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Socotá

El 12 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Socotá la jornada de entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad se desarrolló en el punto previamente establecido para la recepción y distribución de los materiales y contó con el acompañamiento del secretario de Gobierno municipal, el equipo territorial del proyecto y los beneficiarios convocados.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Socotá, en un recorrido estimado de aproximadamente 80 km. La ruta considerada comprendió el corredor Duitama–Santa Rosa de Viterbo–Belén–Paz de Río–Socha–Socotá, utilizando la red vial que comunica el corredor central del departamento con la provincia de Valderrama y el acceso final por la vía Socha–Socotá.

Una vez en el municipio, los materiales fueron dispuestos en el punto establecido para la jornada y posteriormente entregados a los 20 beneficiarios, conforme a la metodología de ejecución descrita en el numeral 3. La actividad quedó respaldada mediante los respectivos soportes de entrega y registros fotográficos, en los cuales se evidencia el desarrollo de la jornada y el acompañamiento institucional.

Figura 7. Ruta de desplazamiento Duitama - Socotá para la entrega de materiales de tanques Zamorano.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Socotá. El recorrido corresponde a una distancia aproximada de 80 km.

Figura 8. Municipio de Socotá, fecha de entrega 12/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Somondoco

El 30 de julio de 2026 se realizó en el municipio de Somondoco la jornada de entrega de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad se desarrolló en el punto previamente establecido para la recepción y distribución de los materiales, con participación del equipo territorial del proyecto y los beneficiarios convocados, conforme a la metodología de ejecución definida para este componente.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Somondoco, en un recorrido estimado de aproximadamente 160 km. Como ruta referencial se considera el corredor Duitama - Tunja - Soracá - Boyacá - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - Guateque - Somondoco, utilizando vías nacionales y secundarias que permiten el acceso hacia la provincia de Oriente y posteriormente al municipio de Somondoco.

Una vez en el municipio, los materiales fueron dispuestos en el punto establecido para la jornada y posteriormente entregados a los 20 beneficiarios, conforme a la metodología descrita en el numeral 3. La actividad quedó respaldada mediante los respectivos soportes de entrega y registros fotográficos, como evidencia de la ejecución de la jornada.

Figura 9. Ruta de desplazamiento Duitama - Somondoco para la entrega de materiales de tanques Zamorano.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Somondoco. El recorrido corresponde a una distancia aproximada de 160 km.

Figura 10. Municipio de Somondoco, fecha de entrega 30/07/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

5. Reporte de entrega de motoazadas, insumos y herramientas.

Durante el mes de agosto de 2026 se continuó con la entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los productores beneficiarios del proyecto, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de las unidades productivas familiares y al desarrollo de las actividades previstas para el mantenimiento de los cultivos priorizados.

Para el periodo reportado, las entregas se desarrollaron en los municipios de Briceño, La Victoria, Muzo, Otanche y Paya, atendiendo 20 beneficiarios por municipio, para un total de 100 productores beneficiados. De acuerdo con el consolidado de entregas, en estos municipios se realizó la entrega de 100 motoazadas y 100 dotaciones de insumos y herramientas agrícolas.

Las jornadas se desarrollaron conforme a la metodología de ejecución descrita en el numeral 3, mediante la articulación previa del equipo del Consorcio Agro Resiliente con los actores territoriales, la programación de los puntos de encuentro y el traslado de los elementos desde la base de operaciones ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama. Para este componente, las actividades estuvieron acompañadas de un espacio protocolario de apertura y posteriormente se efectuó la entrega individual de los equipos, insumos y herramientas a los beneficiarios convocados.

Durante el procedimiento de entrega se realizó la verificación de los elementos suministrados mediante el respectivo checklist y la suscripción de las actas de entrega, dejando los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos. Este procedimiento permitió verificar la recepción de los elementos asignados a cada productor y mantener la trazabilidad de las entregas realizadas durante el periodo.

A continuación, se presenta la descripción de las jornadas desarrolladas en cada municipio durante el periodo objeto del presente informe.

Tabla 3. Entrega de motoazadas, insumos y herramientas, durante agosto de 2026.

ITEM	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	FECHA DE ENTREGA
1	**Briceño**	20	18/08/2026
2	**La Victoria**	20	15/08/2026
3	**Muzo**	20	14/08/2026
4	**Otanche**	20	18/08/2026
5	**Paya**	20	20/08/2026
TOTAL		**100**	-

Nota: Fuente equipo operador

Municipio de Briceño

El 18 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Briceño la jornada de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas, beneficiando a 20 productores vinculados al

proyecto. La actividad contó con el acompañamiento del alcalde municipal, el secretario de Agricultura, el secretario de Planeación, concejales del municipio, el equipo del proyecto y los beneficiarios convocados, evidenciando la articulación institucional para el desarrollo de la jornada.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre de los equipos, insumos y herramientas desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Briceño. De acuerdo con la ruta referencial establecida para el transporte, se consideró un recorrido aproximado de 92 km, a través del corredor Duitama - Paipa - Tibasosa - Sogamoso - Nobsa - Corrales - Beteitiva - Socotá - Tasco - Briceño, utilizando vías nacionales y secundarias, con presencia de tramos pavimentados y en afirmado.

La jornada inició con el evento protocolario previsto para este componente, que comprendió la entonación de los himnos, seguida de las palabras de la Administración Municipal, las intervenciones de los representantes institucionales participantes, las intervenciones del delegado de la Gobernación de Boyacá, de un representante de los beneficiarios y del director del proyecto.

Finalizado el acto protocolario, se procedió con la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los 20 beneficiarios. Durante este procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, se realizó la firma de las actas de entrega y se formalizó la recepción de los bienes asignados a cada productor. La actividad quedó respaldada mediante los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos.

Figura 11. Ruta de desplazamiento Duitama - Briceño para la entrega de motoazadas, insumos y herramientas.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Briceño. El recorrido corresponde a una distancia aproximada de 92 km y contempla vías nacionales y secundarias, con tramos pavimentados y en afirmado.

Figura 12. Municipio de Briceño, fecha de entrega 18/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de La Victoria

El día 15 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de La Victoria la jornada de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad contó con el acompañamiento de la secretaria de Agricultura, el secretario de Gobierno, concejales del municipio, el equipo del proyecto y los beneficiarios convocados. El alcalde municipal no participó en la jornada debido a una situación de salud, por lo que el acompañamiento de la Administración Municipal estuvo a cargo de los funcionarios presentes.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre de los equipos, insumos y herramientas desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de La Victoria. Como ruta referencial se consideró el corredor Duitama - Paipa - Tunja - Sáchica - Tinjacá - Chiquinquirá - Pauna - Quípama - La Victoria, con un recorrido estimado de aproximadamente 250 km. El trayecto combina vías nacionales y secundarias y, particularmente en el acceso hacia La Victoria, sectores con superficie en afirmado, condición que incrementa los tiempos de desplazamiento y debe ser considerada dentro de la logística para el transporte de los equipos e insumos.

La jornada inició con el evento protocolario establecido para este componente, que comprendió la entonación de los himnos y las palabras de bienvenida por parte de la Administración Municipal, seguida de las intervenciones de los representantes institucionales y del proyecto previstas en la programación. Asimismo, se contempló la participación de un representante de los beneficiarios y, como cierre de este espacio, se realizó la fotografía oficial de la jornada.

Finalizado el componente protocolario, se procedió con la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los 20 beneficiarios. Durante el procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, se efectuó la firma de las actas de entrega y se formalizó la recepción de los bienes asignados a cada productor. La actividad quedó respaldada mediante los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos.

Figura 13. Ruta de desplazamiento Duitama - La Victoria para la entrega de motoazadas, insumos y herramientas.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de La Victoria. Para efectos de la caracterización logística se considera un recorrido aproximado de 250 km, a través del corredor Duitama - Paipa - Tunja - Sáchica - Tinjacá - Chiquinquirá - Pauna - Quípama - La Victoria, utilizando vías nacionales y secundarias, con presencia de tramos pavimentados y en afirmado.

Figura 14. Municipio de La Victoria, fecha de entrega 15/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Muzo

El día 14 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Muzo la jornada de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad se desarrolló en el punto previamente establecido para la recepción y distribución de los elementos, con participación del equipo del proyecto y los beneficiarios convocados. En ausencia de información documental adicional sobre los funcionarios que acompañaron la jornada, mantendría por ahora este componente de manera general.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre de los equipos, insumos y herramientas desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Muzo. Como ruta referencial se consideró el corredor Duitama–Paipa–Tunja–Sáchica–Tinjacá–Chiquinquirá–Maripí–Muzo, con un recorrido estimado de aproximadamente 195 km. El trayecto combina vías nacionales y secundarias y presenta condiciones de acceso más complejas en el sector occidental del departamento, asociadas a la topografía y a las características de la red vial secundaria. La documentación técnica disponible reconoce precisamente la existencia de corredores desde Chiquinquirá hacia el occidente de Boyacá y vías de acceso hacia Muzo.

La jornada inició con el evento protocolario previsto para este componente, que comprendió la entonación de los himnos, seguida de las palabras de bienvenida de la Administración Municipal y las intervenciones de los representantes institucionales y del proyecto. En este espacio se contó con la participación de la alcaldesa municipal, la secretaria de Agricultura y concejales, además de las intervenciones previstas por parte del delegado de la Gobernación de Boyacá, representantes de los beneficiarios y la dirección del proyecto. Como cierre del componente protocolario se realizó la fotografía oficial de la jornada, dando paso posteriormente al procedimiento de entrega.

Finalizado el acto protocolario, se procedió con la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los 20 beneficiarios. Durante este procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, se efectuó la firma de las actas de entrega y se formalizó la recepción de los bienes asignados a cada productor. La actividad quedó respaldada mediante los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos, como evidencia del desarrollo de la jornada y de la entrega efectuada.

Figura 15. Ruta de desplazamiento Duitama - La Muzo para la entrega de motoazadas, insumos y herramientas.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Muzo. Para efectos de la caracterización logística se considera un recorrido aproximado de 195 km, a través del corredor Duitama - Paipa - Tunja - Sáchica - Tinjacá - Chiquinquirá - Maripí - Muzo, utilizando vías nacionales y secundarias. La distancia y el tiempo de desplazamiento son aproximados y pueden variar de acuerdo con el trazado utilizado y las condiciones de transitabilidad de la vía.

Figura 16. Municipio de Muzo, fecha de entrega 14/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Otanche

El 18 de agosto de 2026 se realizó en el municipio de Otanche la jornada de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas, beneficiando a 20 productores vinculados al proyecto. La actividad contó con el acompañamiento de la secretaria de Agricultura, algunos concejales del municipio, el equipo del proyecto y los beneficiarios convocados. El alcalde municipal no participó en la jornada, por lo que el acompañamiento de la Administración Municipal estuvo representado por los funcionarios y actores locales presentes.

Para el desarrollo de la actividad se efectuó el desplazamiento terrestre de los equipos, insumos y herramientas desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Otanche. Como ruta referencial se consideró el corredor Duitama - Paipa - Tunja - Sáchica - Tinjacá - Chiquinquirá - Pauna - San Pablo de Borbur - Otanche, con un recorrido estimado de aproximadamente 210 km. El trayecto comprende vías nacionales y secundarias y, en su aproximación a la provincia de Occidente, presenta condiciones variables de traslado asociadas a la topografía y al estado de la red vial, aspectos considerados dentro de la logística para el transporte de los equipos y demás elementos.

La jornada inició con el evento protocolario establecido para este componente, comenzando con la entonación de los himnos y continuando con las palabras de bienvenida en representación de la Administración Municipal. Posteriormente, se desarrollaron las intervenciones de la secretaria de Agricultura, los concejales presentes, el delegado de la Gobernación de Boyacá, un representante de los beneficiarios y la dirección del proyecto, quienes destacaron el propósito de la intervención y la importancia de los elementos entregados para el fortalecimiento de las unidades productivas familiares. Finalizadas las intervenciones, se realizó la fotografía oficial de la jornada, dando paso al procedimiento de entrega.

Posteriormente, se efectuó la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los 20 beneficiarios. Durante este procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, se adelantó la firma de las actas de entrega y se formalizó la recepción de los bienes asignados a cada productor. La jornada quedó respaldada mediante los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos, garantizando la trazabilidad de la actividad desarrollada.

Figura 17. Ruta de desplazamiento Duitama - Otanche para la entrega de motoazadas, insumos y herramientas.



Nota: La figura representa de manera referencial la ruta terrestre considerada desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Otanche. Para efectos de la caracterización logística se considera un recorrido aproximado de 210 km, a través del corredor Duitama - Paipa - Tunja - Sáchica - Tinjacá - Chiquinquirá - Pauna - San Pablo de Borbur - Otanche, utilizando vías nacionales y secundarias. La distancia y el tiempo de desplazamiento son aproximados y pueden variar de acuerdo con el trazado utilizado y las condiciones de transitabilidad de la vía.

Figura 18. Municipio de Otanche, fecha de entrega 18/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Municipio de Paya

El 20 de agosto de 2026 se desarrolló en el municipio de Paya la jornada de entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a 20 productores beneficiarios del proyecto. La actividad contó con el acompañamiento del alcalde municipal, Juvenal Pérez Vega, funcionarios de la Administración Municipal, representantes del sector agropecuario local, el equipo del proyecto y los beneficiarios convocados, consolidando un espacio de articulación institucional para el desarrollo de la jornada.

Para la ejecución de la actividad se realizó el desplazamiento de los equipos, insumos y herramientas desde la base de operaciones del Consorcio Agro Resiliente, ubicada en la Ciudadela Industrial de Duitama, hasta el municipio de Paya. Como ruta referencial se consideró el corredor Duitama - Sogamoso - El Crucero - Toquilla - Páramo de La Sarna - Labranzagrande - Alto del Oso - Paya, con una distancia aproximada de 130 km. Para este trayecto, las referencias de distancia por carretera consultadas sitúan el recorrido Duitama–Paya alrededor de los 129 km, por lo que 130 km resulta adecuado como valor redondeado para la caracterización logística del informe.

La jornada inició con los actos protocolarios establecidos para este componente, comenzando con la entonación de los himnos y continuando con las palabras de bienvenida del alcalde municipal. Posteriormente se desarrollaron las intervenciones de los representantes de la Administración Municipal y del sector agropecuario, el delegado de la Gobernación de Boyacá, un representante de los beneficiarios y la dirección del proyecto, quienes contextualizaron el propósito de la jornada y la contribución de los elementos suministrados al fortalecimiento de las unidades productivas familiares. Finalizadas las intervenciones, se realizó la fotografía oficial de la jornada.

Posteriormente se efectuó la entrega individual de las motoazadas, insumos y herramientas agrícolas a los 20 beneficiarios. Durante el procedimiento se verificaron los elementos suministrados mediante el respectivo checklist, se adelantó la firma de las actas de entrega y se formalizó la recepción de los bienes asignados a cada productor. La actividad quedó respaldada mediante los correspondientes soportes documentales y registros fotográficos.

Figura 19. Municipio de Paya, fecha de entrega 20/08/2026.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

6. Avance en la Construcción de Tanques Zamorano

Como parte del seguimiento a los materiales suministrados para la construcción de los tanques Zamorano, se realizó la consolidación del avance de esta actividad en las Unidades Productivas Familiares (UPF) beneficiarias del proyecto. Este seguimiento permitió establecer el número de tanques construidos por municipio y los periodos en los cuales se desarrolló su construcción.

Al corte del 31 de agosto de 2026, se reporta la construcción de 800 tanques Zamorano, correspondientes a los 800 beneficiarios de los 40 municipios priorizados por el proyecto, alcanzando un avance acumulado del 100 % frente a la meta establecida. La Tabla 4 presenta el consolidado por municipio, indicando el número de beneficiarios atendidos, los tanques construidos, el rango de fechas de construcción y el porcentaje de avance alcanzado.

Tabla 4. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano – corte agosto de 2026

N°	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	TANQUES CONSTRUIDOS	AVANCE %
1	Almeida	20	20	100
2	Beteitiva	20	20	100
3	Boavita	20	20	100
4	Briceño	20	20	100
5	Buenavista	20	20	100
6	Busbanzá	20	20	100
7	Campohermoso	20	20	100
8	Chiscas	20	20	100
9	Chita	20	20	100
10	Chivatá	20	20	100
11	Ciénega	20	20	100
12	Coper	20	20	100
13	Corrales	20	20	100
14	Cucaita	20	20	100
15	Guacamayas	20	20	100
16	Guateque	20	20	100
17	Guayatá	20	20	100
18	Jericó	20	20	100
19	La Uvita	20	20	100
20	La Victoria	20	20	100
21	Muzo	20	20	100
22	Otanche	20	20	100
23	Páez	20	20	100
24	Paya	20	20	100
25	Paz de Río	20	20	100
26	Pesca	20	20	100
27	Ráquira	20	20	100
28	San Eduardo	20	20	100
29	San Mateo	20	20	100
30	Santana	20	20	100
31	Sativanorte	20	20	100
32	Soata	20	20	100
33	Socotá	20	20	100
34	Somondoco	20	20	100
35	Sora	20	20	100
36	Susacón	20	20	100
37	Sutatenza	20	20	100
38	Tenza	20	20	100
39	Tinjacá	20	20	100
40	Ventaquemada	20	20	100
TOTAL		**800**	**800**	**100**

Nota: Fuente equipo operador

Durante el proceso de construcción se presentaron algunas novedades de carácter técnico, principalmente relacionadas con la necesidad de ampliar las áreas de explanación debido a las condiciones topográficas y características del suelo de algunas UPF. Asimismo, durante las pruebas de estanqueidad se identificaron casos de infiltración asociados a fisuras en la geomembrana o a puntos de unión con accesorios del sistema, particularmente en las conexiones de las tuberías de salida y válvulas. Estas situaciones fueron objeto de ajuste y subsanación durante el proceso de construcción y seguimiento técnico, sin afectar el cumplimiento final de la actividad.

En consecuencia, al cierre del periodo reportado se encuentran construidos los 800 tanques Zamorano programados, alcanzando un cumplimiento acumulado del 100 % de la meta prevista para el proyecto.

Figura 20. Tanque construido municipio de Guacamayas. Zona 1.




Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Figura 21. Tanque construido municipio de Corrales. Zona 2.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Figura 22. Tanque construido municipio de Tinjacá. Zona 3.

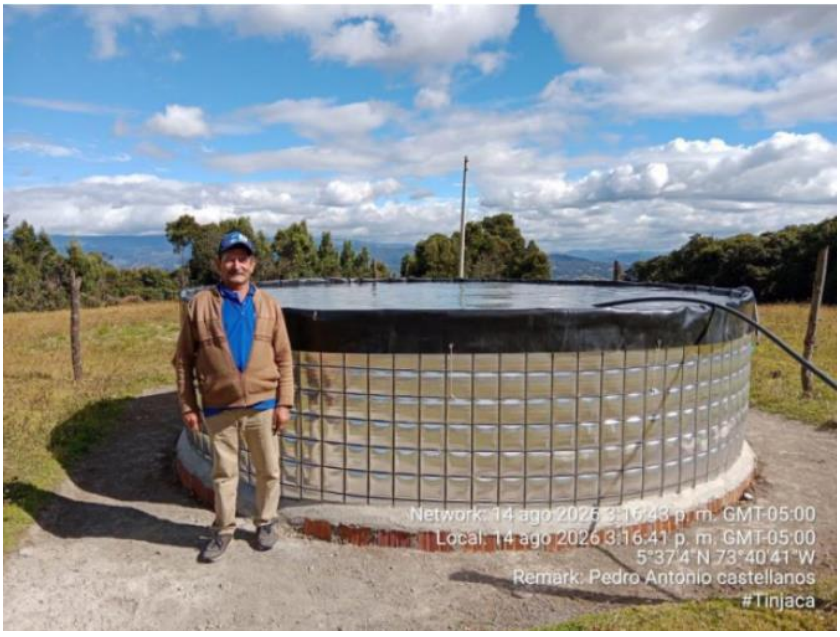

Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Figura 23. Tanque construido municipio de Santana. Zona 4.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

Figura 24. Tanque construido municipio de Chivatá. Zona 5.



Nota. Fuente: Equipo Técnico del Proyecto, 2026.

7. Caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF)

Durante el periodo reportado se continuó con la caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF) mediante visitas de acompañamiento programadas a lo largo del mes, buscando mantener una periodicidad que permita identificar y registrar los avances y cambios presentados entre las diferentes visitas realizadas a cada unidad productiva, de acuerdo con las directrices establecidas por la Gerencia del proyecto.

La programación inicia con la concertación de las visitas entre los técnicos de acompañamiento y los beneficiarios, para lo cual se realiza previamente contacto telefónico con el fin de verificar su disponibilidad y acordar la fecha de atención en la UPF. A partir de esta concertación, los técnicos estructuran la programación de las visitas, la cual es revisada por los profesionales de acompañamiento y coordinada conjuntamente con los coordinadores de zona, previo al desarrollo de las actividades en campo.

Una vez programadas las visitas, los técnicos se desplazan a las respectivas UPF y realizan el seguimiento de los cultivos registrados en el área destinada al proyecto, recopilando la información requerida sobre las condiciones encontradas en campo. Este seguimiento contempla variables relacionadas con la identificación y ubicación de la UPF, cultivo o línea productiva, situación del cultivo, área destinada, producción del último ciclo, área cosechada, rendimiento y las observaciones técnicas correspondientes.

La información recopilada durante las visitas es incorporada inicialmente a la base de datos de seguimiento, donde posteriormente se adelanta un proceso de revisión, validación y depuración por parte de los profesionales de acompañamiento y coordinadores de zona. Una vez verificada su consistencia, la información es trasladada a la matriz consolidada de seguimiento, que constituye el instrumento utilizado para organizar y analizar la información productiva obtenida durante el acompañamiento a las UPF.

Al corte de agosto de 2026, se avanzó en el proceso de revisión, depuración y consolidación de la información recopilada durante las visitas de acompañamiento, contando con información organizada correspondiente a 19 municipios. Este consolidado constituye la información revisada y disponible a la fecha de corte y continuará siendo actualizado conforme avance la validación e incorporación de los registros obtenidos en campo.

Tabla 5. Consolidado de registros de caracterización de las Unidades Productivas Familiares (UPF) por municipio – corte agosto de 2026.

No	MUNICIPIO	REGISTRO DE LINEAS PRODUCTIVAS	CÓDIGOS ÚNICOS DE UPF
1	Almeida	48	20
2	Boavita	58	20
3	Chita	23	20
4	Chivatá	35	20
5	Ciénega	20	20

6	**Coper**	20	20
7	**Guacamayas**	40	20
8	**Guateque**	32	20
9	**Guayatá**	28	20
10	**La Uvita**	47	20
11	**La Victoria**	14	14
12	**Muzo**	20	20
13	**Pesca**	20	20
14	**San Mateo**	20	20
15	**Sativanorte**	40	20
16	**Soata**	32	20
17	**Susacón**	20	20
18	**Sutatenza**	50	20
19	**Tenza**	31	20
TOTAL		**598**	**374**

Nota: Fuente equipo operador.

El proceso de revisión, validación y depuración de la información continúa de manera progresiva, a partir de los registros generados durante las visitas de acompañamiento, con el propósito de mantener actualizada la matriz y fortalecer el seguimiento de las condiciones productivas de las UPF vinculadas al proyecto.

8. Novedades y Situaciones Extraordinarias de los Beneficiarios

Durante la ejecución y seguimiento del proyecto se identificaron situaciones extraordinarias relacionadas con algunos beneficiarios, las cuales requieren ser registradas con el propósito de mantener actualizada la información de las Unidades Productivas Familiares y efectuar el correspondiente seguimiento administrativo y técnico.

Al corte de agosto de 2026, se reportaron las siguientes novedades:

Tabla 6. Consolidado de novedades y situaciones extraordinarias de los beneficiarios – corte agosto de 2026.

No	Código	Municipio	Beneficiario	Novedad	Estado / actuación requerida
1	**GTQ004**	Guateque	Efraín Medina Salamanca	Fallecimiento	Fallecimiento reportado el 30 de agosto de 2026. Pendiente definir el procedimiento correspondiente frente a la continuidad de la intervención y los elementos entregados en el marco del proyecto.
2	**CHT014**	Chita	María Teresa Tunarosa de Fuentes	Fallecimiento	Se reporta el fallecimiento de la beneficiaria. Pendiente establecer la actuación correspondiente frente a su

					vinculación y los elementos entregados.
3	**CHT013**	Chita	Cayetano Córdoba Medina	Novedad asociada a la continuidad del beneficiario	Se encuentra en verificación la posibilidad de formalizar el acta de división. En caso de no concretarse, deberá definirse el procedimiento para la recuperación de los elementos previamente entregados.

Nota: Fuente equipo operador

Respecto del beneficiario GTQ004_Efraín Medina Salamanca, del municipio de Guateque, el equipo técnico informó su fallecimiento el 30 de agosto de 2026. Esta situación deberá ser objeto de seguimiento para establecer el procedimiento aplicable respecto de su vinculación al proyecto y de los elementos que le hubiesen sido entregados.

Para el municipio de Chita se registraron dos novedades. La primera corresponde a CHT014_ María Teresa Tunarosa de Fuentes, para quien se reportó su fallecimiento y se encuentra pendiente la definición de las actuaciones correspondientes. La segunda corresponde a CHT013_Cayetano Córdoba Medina, caso en el cual se adelanta la verificación para determinar la formalización del acta de división; de no concretarse esta actuación, deberá establecerse el procedimiento correspondiente para la recuperación de los elementos entregados en el marco del proyecto.

Las novedades registradas continuarán siendo objeto de seguimiento por parte del equipo responsable, dejando los respectivos soportes de las actuaciones que se adelanten y actualizando la información de los beneficiarios conforme se definan las medidas correspondientes

9. Resultados obtenidos

Durante el periodo reportado se evidenciaron avances en los diferentes componentes asociados a la implementación de la Actividad 2 del proyecto, relacionados con el suministro de materiales para tanques Zamorano, la construcción de esta infraestructura, la entrega de motoazadas, insumos y herramientas agrícolas y la consolidación de información derivada de la caracterización y seguimiento de las Unidades Productivas Familiares (UPF).

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al avance alcanzado al corte del 31 de agosto de 2026, diferenciando las actividades ejecutadas durante el periodo de aquellas cuyo seguimiento permite establecer un resultado acumulado frente a las metas previstas por el proyecto.


9.1 Avance en la entrega de materiales para la construcción de tanques Zamorano

Durante agosto de 2026 se continuó con el suministro de materiales destinados a la construcción de tanques Zamorano, completando las entregas requeridas para la atención de los beneficiarios programados en este componente.

Al corte del 31 de agosto de 2026, se alcanzó el suministro de materiales correspondiente a los 800 beneficiarios de los 40 municipios priorizados por el proyecto, representando un cumplimiento acumulado del 100 % de la meta prevista para esta actividad. Este resultado se encuentra igualmente reflejado en el avance de la etapa constructiva, toda vez que al cierre del periodo se reporta la construcción de los 800 tanques Zamorano programados.

En consecuencia, el suministro de materiales requerido para la construcción de los tanques Zamorano se encuentra completado al cierre de agosto de 2026, constituyéndose en uno de los componentes que alcanza la totalidad de la meta establecida para la Actividad No. 2.

Figura 25. Avance acumulado en el suministro de materiales para la construcción de tanques Zamorano – corte agosto de 2026

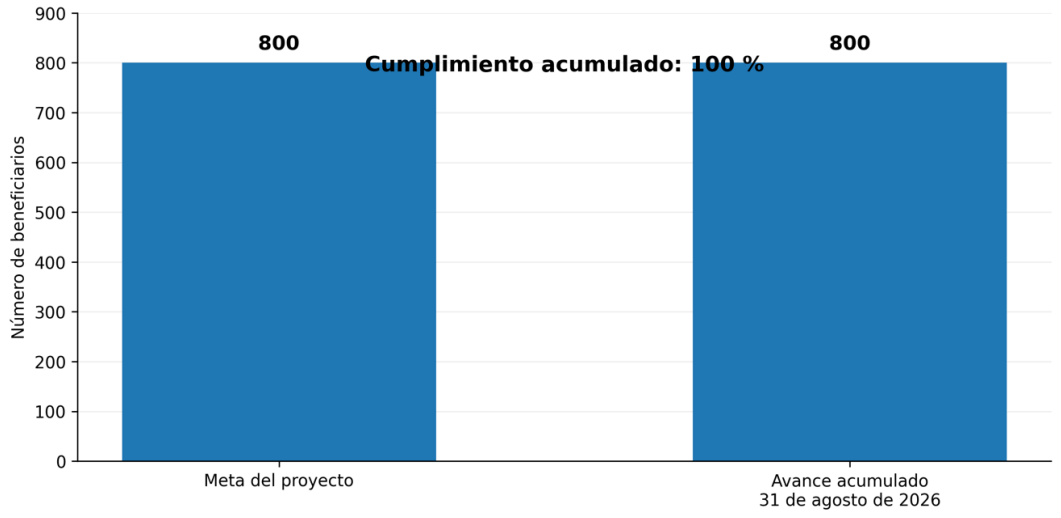

Nota: Fuente equipo operador

Para la figura:

800 beneficiarios atendidos / 800 beneficiarios programados = 100 %

9.2 Avance en la entrega de motoazadas, bioinsumos y herramientas agrícolas

Durante agosto de 2026 se continuó con la entrega de motoazadas, bioinsumos y herramientas agrícolas, atendiendo durante el periodo a 100 beneficiarios de los municipios programados. Estas entregas se incorporan al avance acumulado alcanzado por el proyecto en este componente.


Al corte del 31 de agosto de 2026, el avance acumulado corresponde a 800 beneficiarios atendidos de los 800 previstos, equivalente a un 100 % de cumplimiento frente a la meta del proyecto para este componente. De esta manera, al cierre del periodo reportado se encuentra completada la entrega de motoazadas, bioinsumos y herramientas agrícolas programada para la totalidad de los beneficiarios.

Tabla 7. Avance acumulado en la entrega de motoazadas y kit agrícola frente a la meta del proyecto – corte agosto de 2026.

No	Componente	Entregas Acumuladas	Meta	Cumplimiento
1	**Motoazadas**	800	800	100%
2	**Kit agrícola (bioinsumos y herramientas)**	800	800	100%

Nota: Fuente equipo operador

Figura 26. Avance acumulado en la entrega de motoazadas y kit agrícola frente a la meta del proyecto – corte agosto de 2026

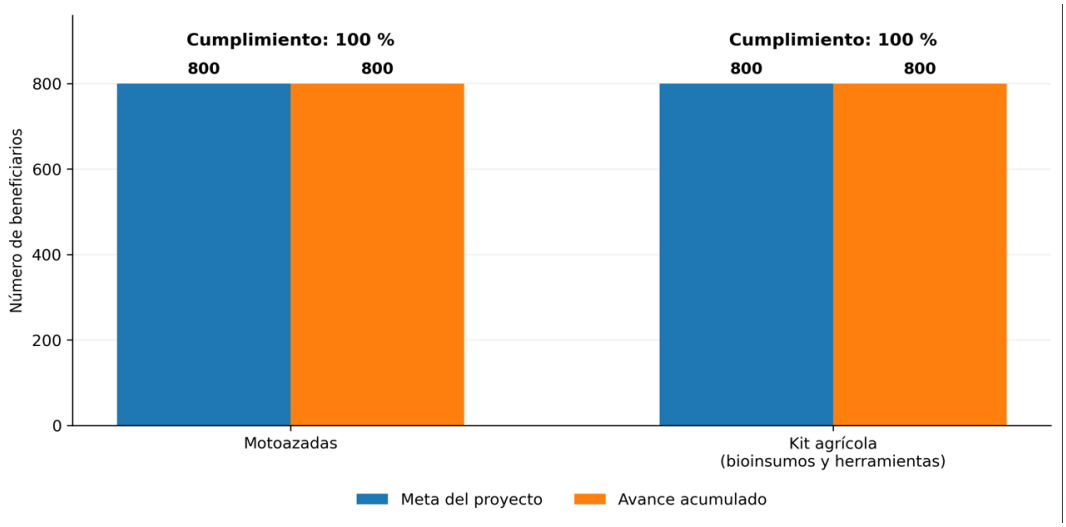

Nota: Fuente equipo operador

La Figura presenta el avance acumulado en la entrega de motoazadas y kit agrícola frente a la meta establecida para el proyecto. Al corte del 31 de agosto de 2026, ambos componentes alcanzan la atención de los 800 beneficiarios programados, evidenciando un cumplimiento del 100 % de la meta prevista.

9.3 Avance Acumulado en la Construcción de Tanques Zamorano.

Al corte del 31 de agosto de 2026, se reporta la construcción de 800 tanques Zamorano, correspondientes a los 800 beneficiarios de los 40 municipios priorizados por el proyecto. Este resultado representa un cumplimiento acumulado del 100 % frente a la meta establecida para este componente.

El resultado alcanzado evidencia la culminación de la construcción de los tanques programados para las Unidades Productivas Familiares (UPF). Las novedades técnicas identificadas durante el proceso constructivo fueron atendidas y subsanadas durante su ejecución y seguimiento, conforme a lo descrito en el numeral correspondiente al avance de construcción.


Tabla 8. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano frente a la meta del proyecto – corte agosto de 2026.

Componente	Avance acumulado	Meta	Cumplimiento
Tanques Zamorano construidos	800	800	100%

Nota: Fuente equipo operador.

Con el propósito de visualizar el resultado alcanzado en este componente, la Figura 27 presenta la comparación entre la meta establecida por el proyecto y el avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano al corte del 31 de agosto de 2026.

Figura 27. Avance acumulado en la construcción de tanques Zamorano frente a la meta del proyecto – corte agosto de 2026.

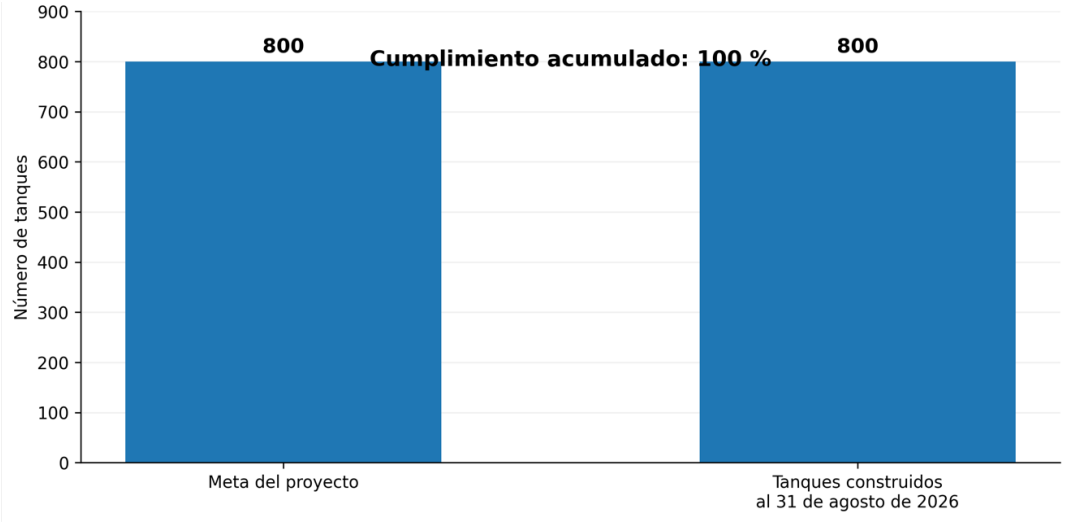


Nota: Fuente equipo operador

Como se observa en la figura, la construcción de tanques Zamorano alcanzó la totalidad de la meta programada, con 800 tanques construidos de 800 previstos, equivalente a un cumplimiento acumulado del 100 %. Este resultado evidencia la culminación del componente constructivo para los 800 beneficiarios de los 40 municipios priorizados, sin actividades pendientes de construcción al cierre del periodo reportado.

9.4 Avance en la caracterización de las unidades productivas familiares

Al corte de agosto de 2026, la matriz de caracterización y seguimiento contiene información correspondiente a 19 de los 40 municipios contemplados por el proyecto, equivalente a una cobertura territorial del 47,5 %. Los 21 municipios restantes representan el 52,5 % y no cuentan aún con información incorporada en la matriz consolidada al corte del periodo.


Figura 28. Cobertura territorial de la caracterización y seguimiento de UPF – corte agosto de 2026.

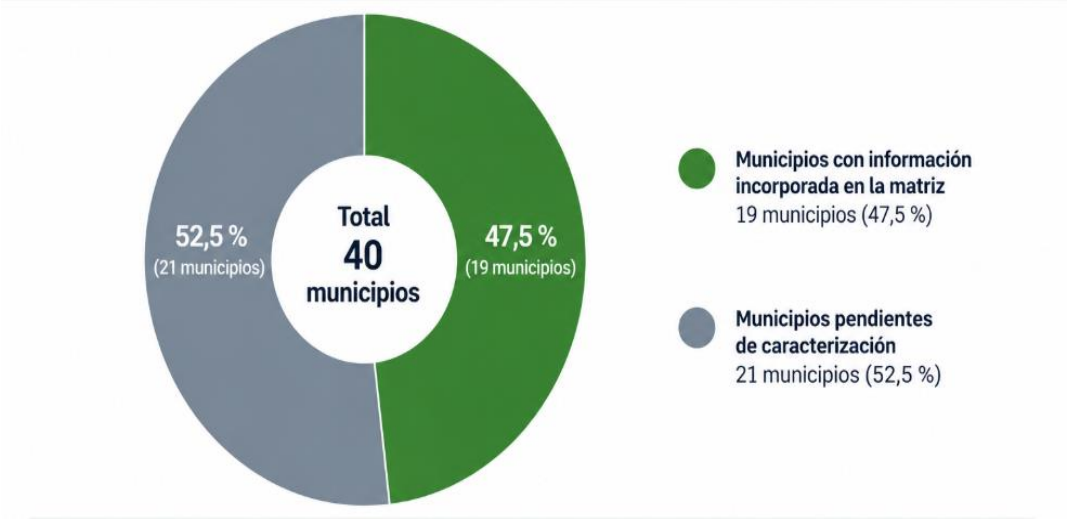

Nota: Fuente equipo operador

La información consolidada registra 374 códigos únicos de Unidades Productivas Familiares (UPF) en los 19 municipios con información disponible. La distribución por municipio se concentra principalmente en 20 UPF registradas; no obstante, se presentan diferencias en Boavita y La Uvita, con 21 registros cada uno; Chita, con 19; y La Victoria, con 14. Estas cifras corresponden al estado actual de la matriz y deberán ser objeto de validación durante la continuidad del proceso de seguimiento.

Figura 29. Número de Unidades Productivas Familiares (UPF) registradas por municipio – corte agosto de 2026.

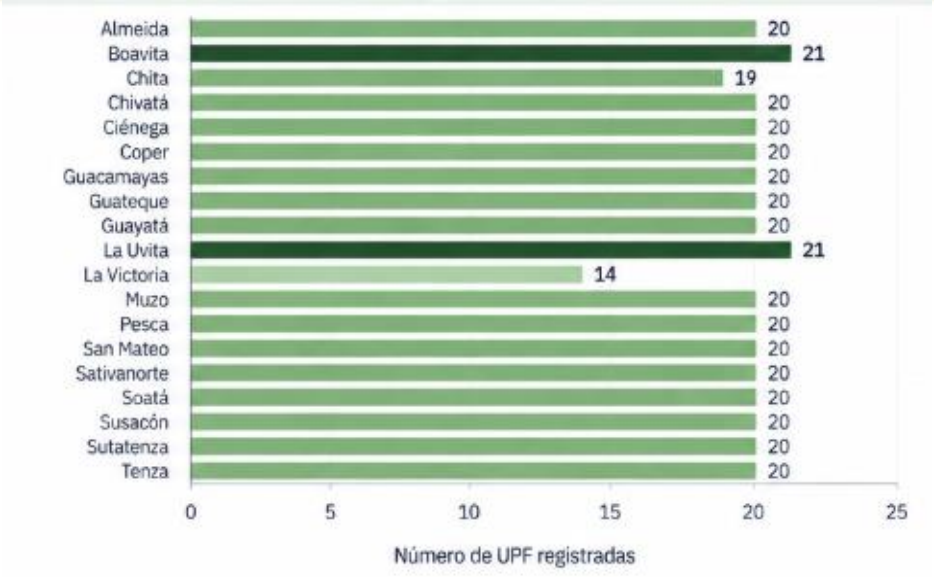


Nota: Fuente equipo operador

La información consolidada constituye la base para el seguimiento de variables relacionadas con cultivo o línea productiva, situación del cultivo, área destinada, producción del último ciclo, área cosechada y rendimiento. Su análisis continuará conforme se complete y valide la información de los municipios y UPF pendientes.

Adicionalmente, la información recopilada durante las visitas permitió identificar los cultivos presentes en las Unidades Productivas Familiares (UPF) caracterizadas. Debido a que una misma unidad productiva puede registrar más de un cultivo, la matriz consolidada contiene 598 registros de líneas productivas, asociados a los 374 códigos únicos de UPF registrados al corte de agosto de 2026.

A partir de estos registros se determinó la frecuencia de los diferentes cultivos encontrados en campo, permitiendo establecer su distribución dentro de las UPF caracterizadas

Figura 30. Distribución de cultivos identificados en las Unidades Productivas Familiares (UPF) caracterizadas – corte agosto de 2026.

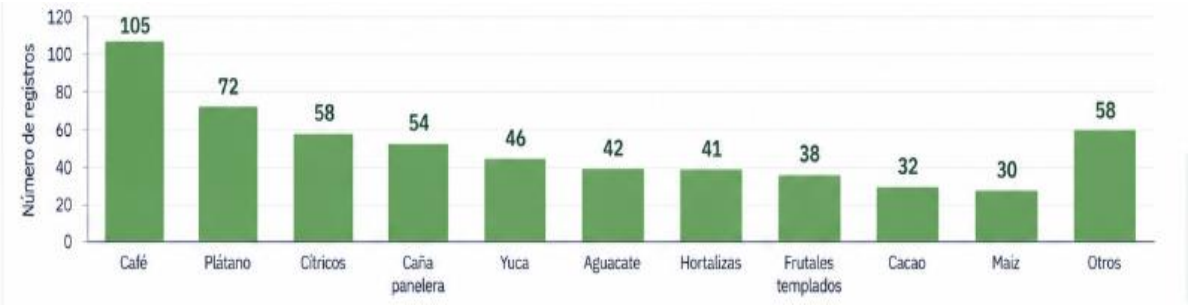

Nota: Fuente equipo operador

9.5 Novedades y situaciones extraordinarias de los beneficiarios

Al corte de agosto de 2026 se identificaron tres novedades asociadas a beneficiarios del proyecto, localizadas en los municipios de Guateque y Chita. De estas, dos corresponden a fallecimientos y una a una situación que requiere definición sobre la continuidad del beneficiario dentro del proyecto.

Los casos de fallecimiento corresponden a Efraín Medina Salamanca (GTQ004), del municipio de Guateque, reportado el 30 de agosto de 2026, y María Teresa Tunarosa de Fuentes (CHT_014), del municipio de Chita. Estas situaciones requieren la definición del procedimiento aplicable para garantizar la continuidad y trazabilidad de las acciones desarrolladas por el proyecto. La tercera novedad corresponde a Cayetano Córdoba Medina (CHT_013), del municipio de Chita. Para este caso se encuentra en verificación la procedencia de formalizar un acta de división o, de no ser viable, determinar el procedimiento correspondiente frente a los elementos previamente entregados.

Al cierre del periodo, las tres novedades permanecen en seguimiento técnico y administrativo, por lo que cualquier modificación en la condición de los beneficiarios o en la destinación de los elementos entregados deberá quedar respaldada mediante los respectivos soportes documentales.

10. Conclusiones

Durante agosto de 2026 se avanzó en la ejecución de las actividades previstas para el fortalecimiento de las unidades productivas familiares beneficiarios del proyecto. En el componente de infraestructura productiva se entregaron materiales para la construcción de tanques Zamorano a 100 beneficiarios de cinco municipios: Chita, Jericó, Paya, Socotá y Somondoco.

En el componente de dotación productiva se entregaron 100 motoazadas y 100 dotaciones de insumos y herramientas agrícolas a 100 beneficiarios de los municipios de Briceño, La Victoria, Muzo, Otanche y Paya, manteniendo una atención de 20 productores por municipio durante el periodo.

En relación con la caracterización y seguimiento de las UPF, al corte de agosto la matriz consolidada contiene información de 19 municipios, correspondiente al 47,5 % de los 40 municipios contemplados por el proyecto. La información disponible comprende 374 códigos únicos de UPF y 598 registros de líneas productivas, evidenciando la presencia de múltiples cultivos en algunas unidades productivas.

Finalmente, se identificaron tres novedades asociadas a beneficiarios, dos correspondientes a fallecimientos y una relacionada con la definición de continuidad dentro del proyecto. Estos casos requieren mantener el seguimiento técnico y administrativo y garantizar que las decisiones adoptadas queden respaldadas mediante los respectivos soportes documentales.

Este informe se presenta a los once (10) días del mes de septiembre del 2026.

Elaboró y Proyectó: Equipo Técnico Operativo.
Consorcio Agroresiliente 2026.
