
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

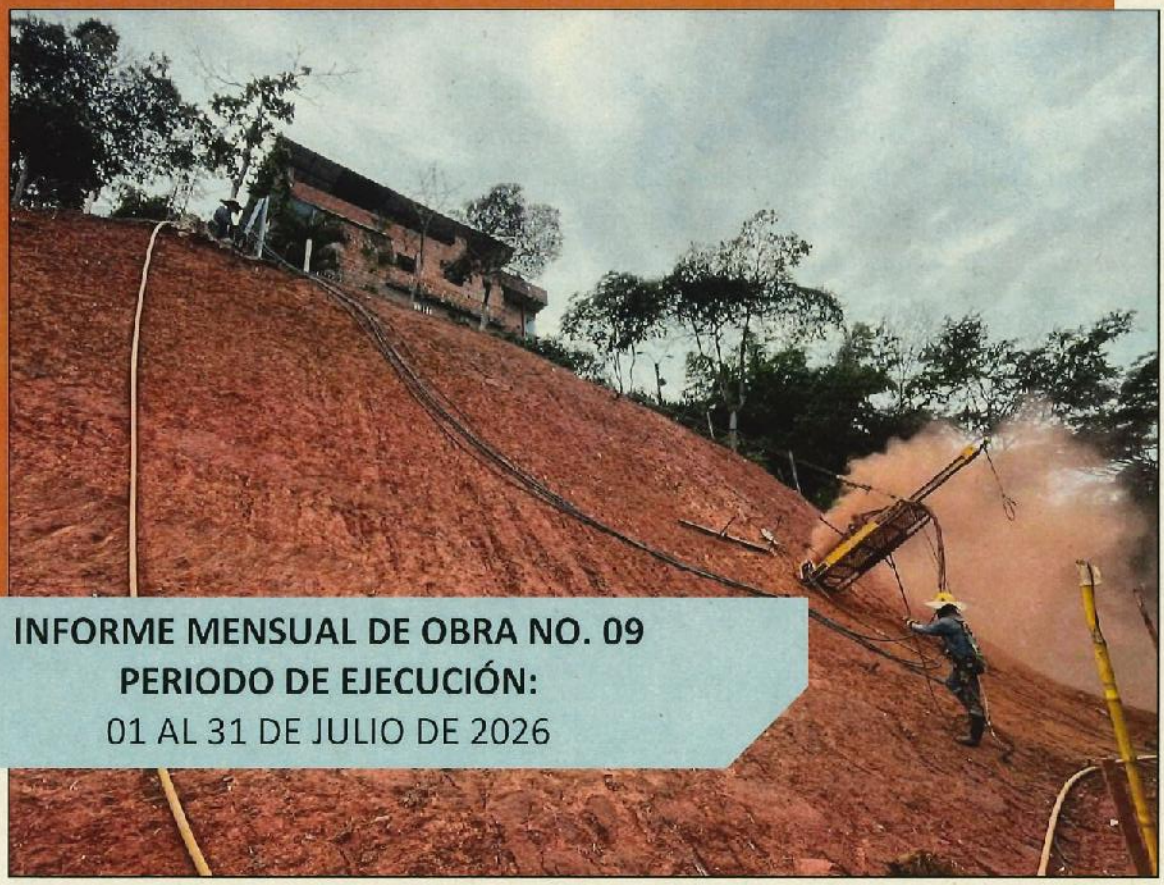

INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 09
PERIODO DE EJECUCIÓN:
01 AL 31 DE JULIO DE 2026

CONTRATISTA
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
2026

1. INTRODUCCIÓN

Los sectores ribereños y de ladera de Floridablanca presentan alta susceptibilidad a la erosión, socavación y movimientos en masa, debido a las características geológicas del terreno, la presencia de materiales poco consolidados y la expansión urbana hacia zonas frágiles. Estas condiciones han generado afectaciones en taludes, deterioro de la infraestructura y riesgo continuo para la comunidad.

En cumplimiento de la Acción Popular 2020-00080-00, el municipio ha priorizado intervenciones para la mitigación del riesgo en puntos críticos. En el sector Lagos II, la margen derecha del río Frío evidencia procesos de socavación que comprometen la estabilidad del cauce, por lo que se proyecta la construcción de estructuras en gaviones para controlar la erosión y recuperar el borde ribereño. De manera complementaria, en el barrio Los Arrayanes se implementará una pantalla con anclajes activos destinada a estabilizar el talud y prevenir desplazamientos del terreno.

Asimismo, se atenderán los sectores críticos de Santa Ana, Prados del Sur y aledaños, donde la erosión ha debilitado taludes cercanos a vías principales, generando riesgo de desprendimientos que afectan la movilidad y la seguridad vial. En esta zona se ejecutará una pantalla pasiva de anclajes para reforzar el talud y garantizar la protección del corredor vial.

Estas obras buscan reducir los riesgos asociados a la erosión y la inestabilidad de taludes, mejorar la seguridad de la población y contribuir a la consolidación de áreas urbanas vulnerables, en concordancia con los lineamientos de gestión del riesgo y el compromiso institucional del municipio.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. OBJETIVO GENERAL 4

2.1. Objetivos específicos 4

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

3.1. Frente Lagos II 5

3.2. Frente Arrayanes 6

3.3. Frente Santa Ana 7

3.4. Frente Prados del Sur 8

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9

4.1. Información general del contrato 9

4.2. Relación de actas del contrato 10

4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto 10

4.4. Cuadro de control de pólizas 10

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA 11

5.1. Relación de personal en obra 11

5.2. Relación de equipo utilizado 14

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 17

6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II 17
6.1.3. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos 21
6.1.4. Cantidades de obra ejecutadas 22

6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES 24
6.2.1. Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora 25
9.1.1. Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) 30
9.1.2. Cantidades de obra ejecutadas 33

9.2. Actividades de tipo técnico frente SANTA ANA/ PRADOS DEL SUR 36
9.2.1. Llenado con lechada cementicia para anclajes 37

9.2.2. Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m 38
9.2.3. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m 40
9.2.4. Cantidades de obra ejecutadas 41

9.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 44
9.3.1. Relación de actas 44
9.3.2. Bitácora de obra 44
9.3.3. Afiliación seguridad social 44
9.3.4. Seguimiento y control 45

9.4. Actividades tipo financiero 45
9.4.1. Variaciones financieras 45

9.5. Actividades de aseguramiento de la calidad 45

9.6. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST) 45

10. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 47

11. ANEXOS. 48

2. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra, consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 210.16224.6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POLPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", durante el periodo establecido entre el 1 y 31 de julio de 2026.

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. Objetivos específicos


- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y económico del contrato.
- Mostrar el avance financiero del proyecto en relación con lo programado en el plan inicial, evidenciando la ejecución presupuestal.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato contempla cuatro frentes de obra, correspondientes a los sectores de Lagos II, Arrayanes, Santa Ana y Prados del Sur. A continuación, se presenta la ubicación específica de cada uno de ellos.


3.1. Frente Lagos II

Este frente de obra se localiza en el Barrio Lagos II, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente sobre la calle 48 entre las carreras 5 y 6. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'00.9"N, 73°05'44.5"W.

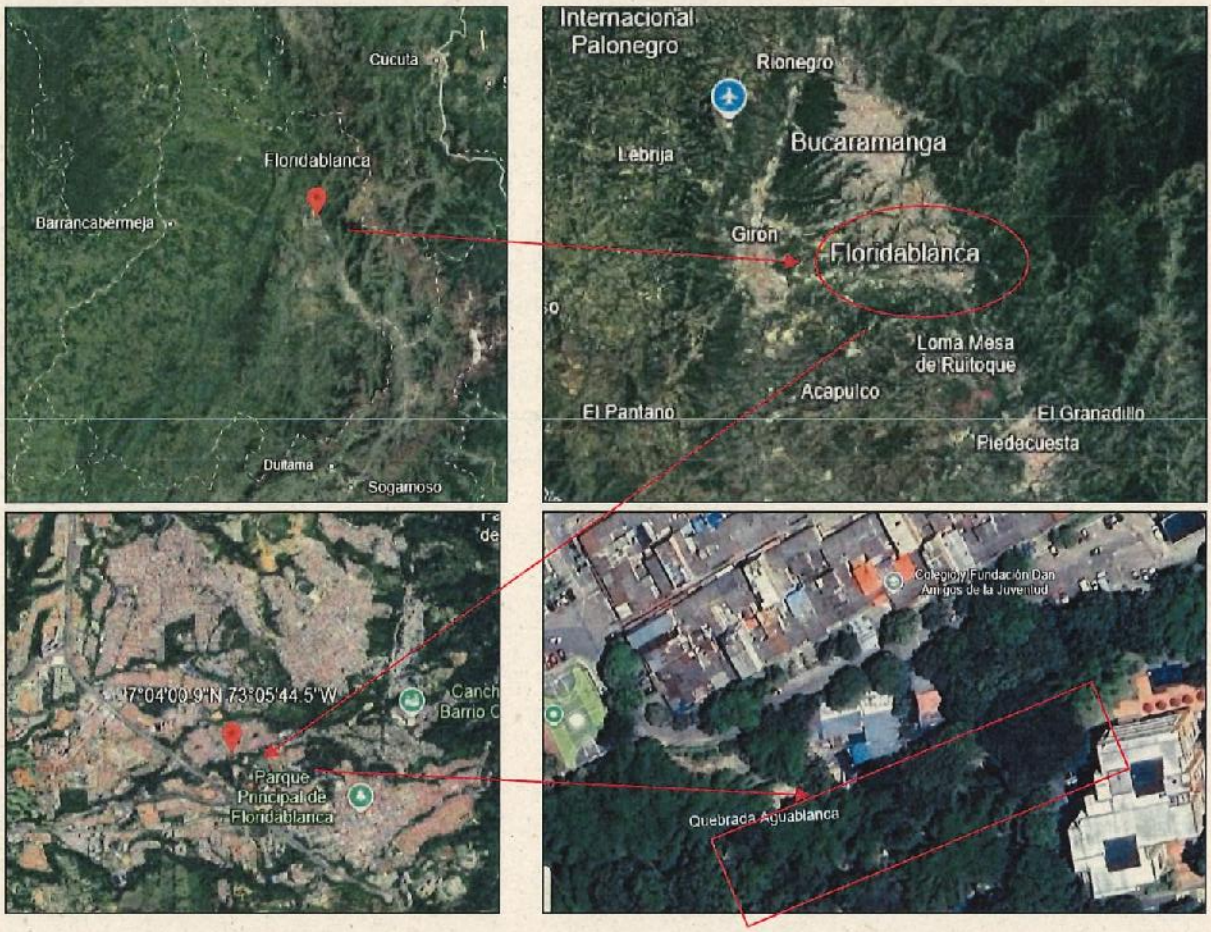


3.2. Frente Arrayanes

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Arrayanes, en el municipio de Floridablanca, Santander, sobre la calle 103 entre las carreras 54 y 55. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°05'42.1"N, 73°05'28.6"W.

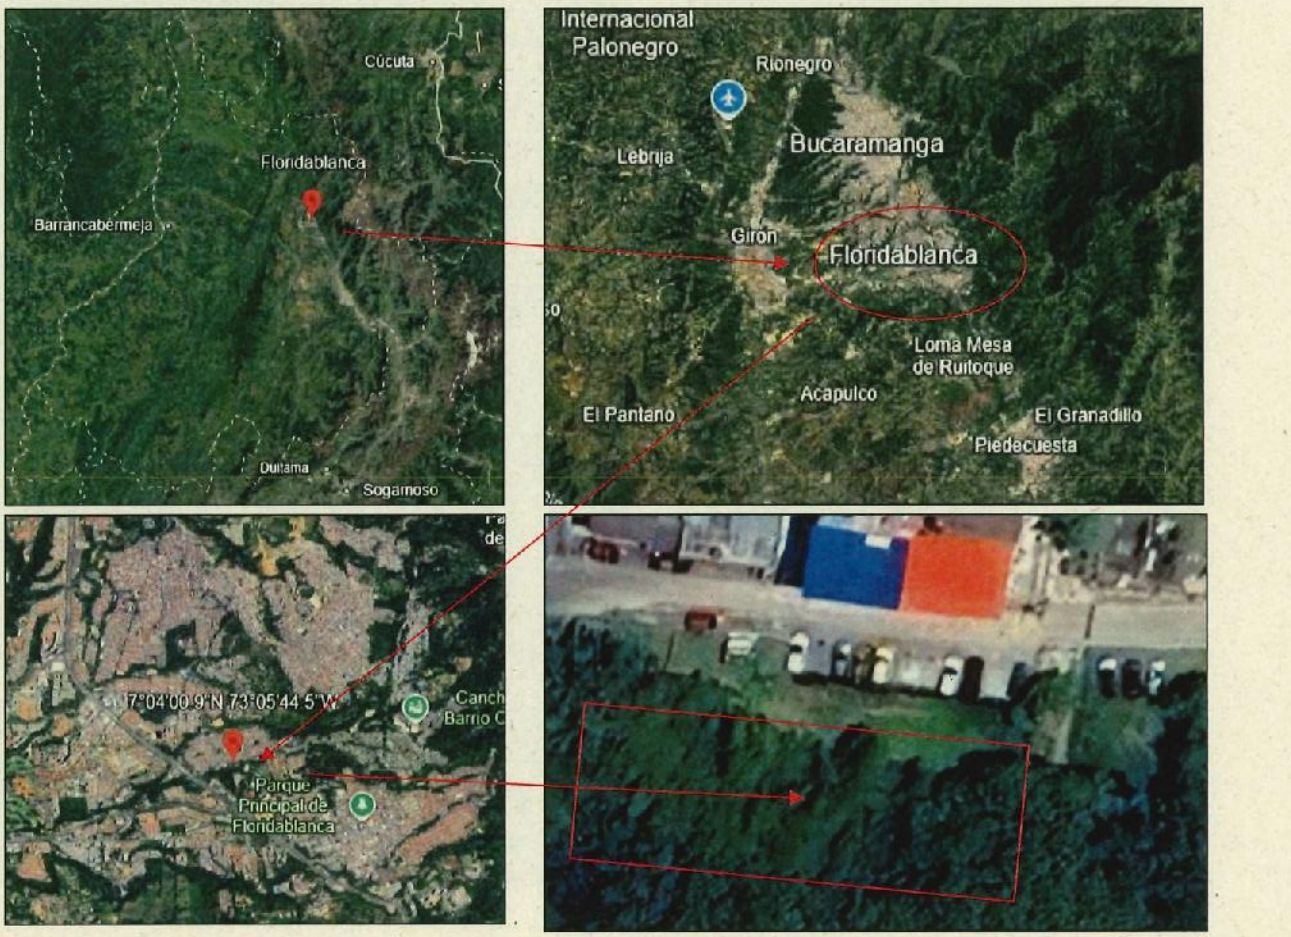

3.3. Frente Santa Ana

Este frente de obra se localiza en el Barrio Santa Ana, en el municipio de Floridablanca, Santander, aproximadamente sobre la calle 11 con carrera 5. La ubicación corresponde a las coordenadas 7°04'48.1"N, 73°05'52.9"W.

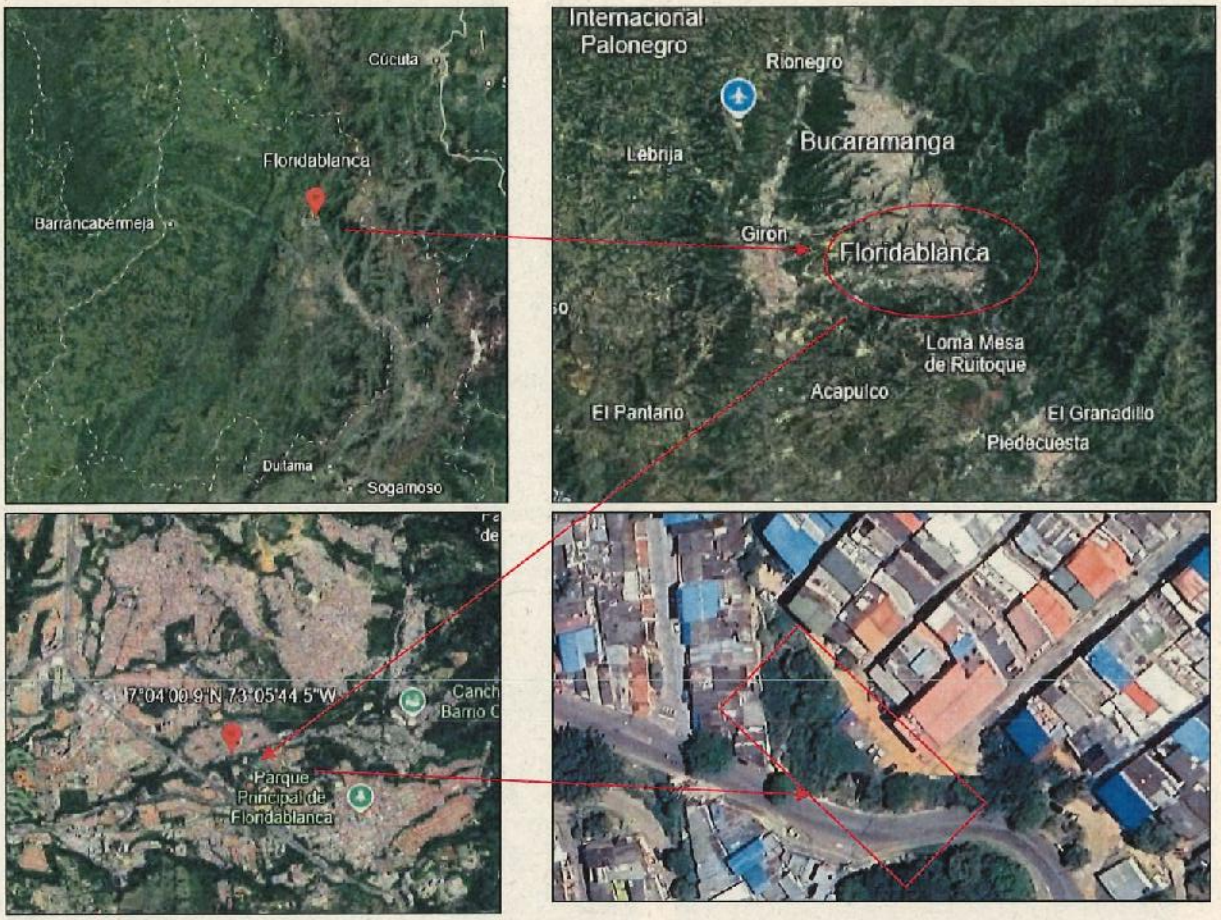

3.4. Frente Prados del Sur

Este frente de obra se encuentra en el Barrio Prados del Sur, en el municipio de Floridablanca, Santander, específicamente en el sector de la carrera 43 con calle 46. Su ubicación aproximada corresponde a las coordenadas 7°04'42.8"N, 73°05'46.5"W.



4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. Información general del contrato

Para contextualizar el alcance del proyecto y las responsabilidades contractuales asumidas; a continuación, se presenta la información general del contrato de obra. Esta sección consolida los datos esenciales relacionados con la identificación del contrato, su objeto, la entidad contratante y el contratista, proporcionando un marco claro sobre el alcance técnico del contrato, el recurso económico asignado y la temporalidad de este.

Tabla 1. Información contractual.

Información General del Contrato de Obra	
Contrato De Obra	210.16224.6
Objeto Del Contrato	Construcción de obras para el control de la erosión y mitigación del riesgo en los Barrios Santa Ana, Prados del Sur y Arrayanes, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II, en cumplimiento de la acción popular con radicado 2020-00080 00, para la consolidación de los mismos, municipio de Floridablanca departamento de Santander.
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional para la Defensa De La Meseta de Bucaramanga, CDMB.
Contratista	Consorcio Estabilización Floridablanca.
Representante Legal	Edgar Leonardo Gómez.
Nit Contratista	901.982.775-0
Interventoría	Unión Temporal Inter Pantallas 2025
Representante Legal	Néstor Javier Jácome Ortiz
Supervisor	Subdirector De Gestión Del Riesgo Y Seguridad Territorial.
Valor Inversión Total	$20.976.440.913,06
Plazo Ejecución Inicial	Doce (12) Meses
Departamento	Santander
Municipio	Floridablanca
Barrio	Lagos II, Arrayanes, Prados del Sur y Santa Ana,
Fecha de Inicio	15 octubre 2025
Fecha de Terminación	14 de octubre de 2026

4.2. Relación de actas del contrato

La siguiente tabla evidencia las actas administrativas del contrato, así como la fecha de constitución, las observaciones y el valor si así lo especifica.

Tabla 2. Actas a la fecha.

Relación De Actas			
Acta	**Fecha**	**Observaciones**	**Valor**
Inicio	15/10/2025		N/A
Recibo y pago parcial 1	15/12/2025		$1.890.355.955,04
Recibo y pago parcial 2	24/03/2026		$5.757.337.060,95
Recibo y pago parcial 3	15/07/2026		$5.424.124.986,79

4.3. Cambios técnicos y/o modificaciones del contrato y/o proyecto

Durante este periodo no se realizan modificaciones.

4.4. Cuadro de control de pólizas

Nombre de la aseguradora: Equidad Seguros

Tabla 3. Cuadro de control de pólizas N° 210.16224.6.

N.º de la Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
AB002678	Cumplimiento del contrato.	15-10-2025	15-02-2027
AB002678	Estabilidad y calidad de la obra.	15-10-20225	15-10-2031
AB002678	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	15-10-2025	15-02-2029
AB002682	Predios Labores y Operaciones.	15-10-2025	15-02-2026

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.1. Relación de personal en obra

Los profesionales relacionados en la tabla a continuación corresponden al personal mínimo exigido en el pliego de condiciones, según los perfiles y especialidades requeridos para la correcta ejecución del contrato, así como los profesionales adicionales para el fortalecimiento de la ejecución.

Tabla 4. Personal profesional.

#	Nombre	Cédula	Cargo	Dedicación
1.	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director De Obra	40%
2.	Oscar Andrés Sánchez Jerez	1.098.756.647	Residente De Obra	100%
3.	María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	40%
4.	Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesor Ambiental	40%
5.	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional Siso 1	40%
6.	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	
7.	Mayra Alejandra Quintero Delgado	1.095.831.315	Residente Auxiliar De Obra	100%
8.	Oscar Yesid Blanco Estupiñán	1.098.690.238	Residente Auxiliar De Obra	100%
9.	Sandra Bermúdez Cala	63.553.613	Profesional ambiental	
10.	María Alejandra Sánchez Murcia	1.075.256.800	Profesional Siso 2	

El siguiente personal corresponde al equipo operativo asignado en campo, encargado de ejecutar las actividades constructivas, de apoyo y control directamente en los frentes de obra.

Tabla 5. Personal Asignado frente Lagos II.

No	Nombre	Cargo	Empresa
1.	Helmer Caballero	Oficial de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

2.	Jhonathan Villamizar	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
3.	Freddy Leonardo Manrique	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
4.	Emiro Monares Cuadros	Ayudante de obra	INFRACORP
5.	Luis Ernesto Bermúdez	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
6.	Juan José Martínez	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
7.	Rivera Villalobos Huver David	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
8.	Cárdenas Mantilla John Jairo	Oficial	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
9.	Galvis Duran Diego Alejandro	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
10.	Cárdenas Mantilla Duvan Jesid	Oficial	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
11.	Suarez Manrique Juan Pablo	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
12.	Cárdenas John Rene	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
13.	Deibys Gonzalo Echeverria	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)
14.	Juan Carlos Almeida	Ayudante de obra	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS (Subcontratista)

Tabla 6. Personal Frente Arrayanes-Santa Ana- Prados del sur.


No	Nombre	Cargo	Empresa
1.	Jhonatan Medina	Operador de perforación II	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
2.	Alexander Prada	Oficial de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
3.	Jolman García	Ayudante de perforación II	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
4.	Olguer Sepúlveda	Operador de inyección	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
6.	Jireh Lizarazo	Operador de perforación I	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
7.	Elías Reatiga Riatiga	Ayudante de perforación I	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
8.	Carlos Arturo Moliner Jiménez	Ayudante de perforación II	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
9.	Leonardo Andrés Duarte Rojas	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
10.	José Alirio Valencia Tarazona	Oficial de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
11.	Camilo Javier Dávila	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
12.	Iván Darío Castilla romero	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
13.	Wilson Méndez	Ayudante de obra.	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
14.	Jose Nelson Silva Romero	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
15.	Eduar Alonso Reatiga Gonzalez	Almacenista	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
16.	Mathius Santiago Pertuz	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
17.	Jorge Leonardo Herrera	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
18.	Fabián Alberto Ramirez	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA


19.	Andrés Fernando Cuellar	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
20.	Camilo Andrés Cabana	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
21.	Mayra Bolaños	Oficios Varios	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
22.	Anny Lizeth Vargas	Oficios Varios	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
23.	Isaías García Jaimes	Operador de perforación	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
24.	Jesús Alberto Mayorga	Ayudante de perforación	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
25.	Vladimir Celis	Ayudante de obra	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

5.2. Relación de equipo utilizado.

Tabla 7. Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

Equipo		
Ítem	**Maquinaria / equipo**	**Registro fotográfico**
1	Retroexcavadoras	

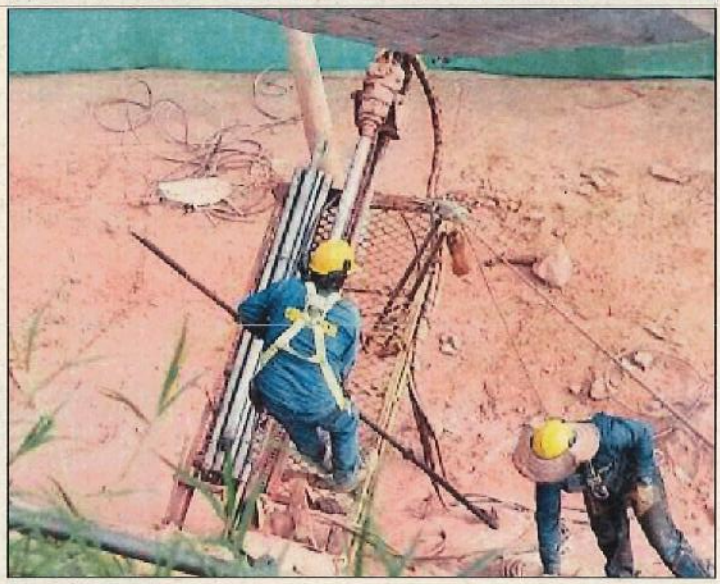		
2	Unidades de perforación neumática	
3	Compresores	

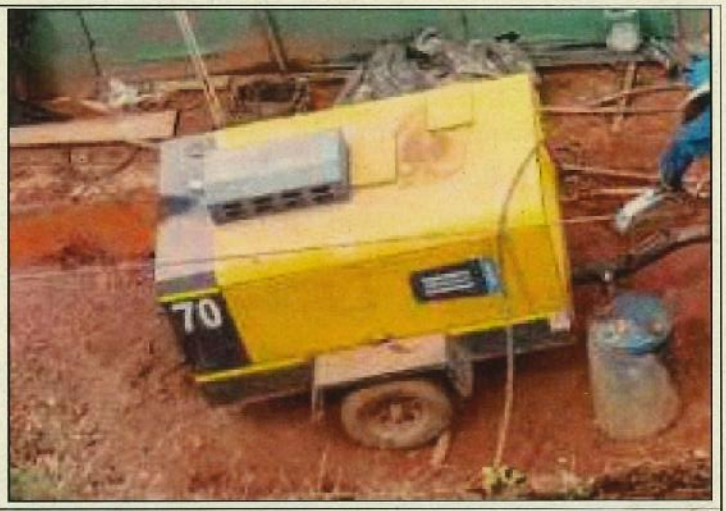		
4	Unidad de inyección	

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Con referencia al contrato No. 210.16224.6, se evidenciará técnica y visualmente cada una de las actividades desarrolladas durante el periodo de este informe para el control de la erosión y mitigación del riesgo en el barrio Arrayanes, Santa Ana y Prados del Sur, así como el control de la erosión y socavación de la margen derecha aguas abajo del rio frio en el sector Lagos II.

6.1. Actividades de tipo técnico frente LAGOS II



Vista general Lagos II

6.1.1. Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales


Se realizaron actividades de extendido, nivelación y compactación de material seleccionado de relleno tras el alineamiento de la estructura en gavión, garantizando la densidad de campo. La actividad debió acoplarse al nuevo nivel de coronación para lograr una terraza de apoyo estable a la cota real del terreno natural.



Suministro, conformación y compactación de rellenos estructurales

6.1.2. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi

Se lleva a cabo la aplicación del revestimiento en concreto de 3000 psi. Este proceso contempla el armado y alineación de la formaleta, verificando estanqueidad y geometría para garantizar espesor de 10 cm.

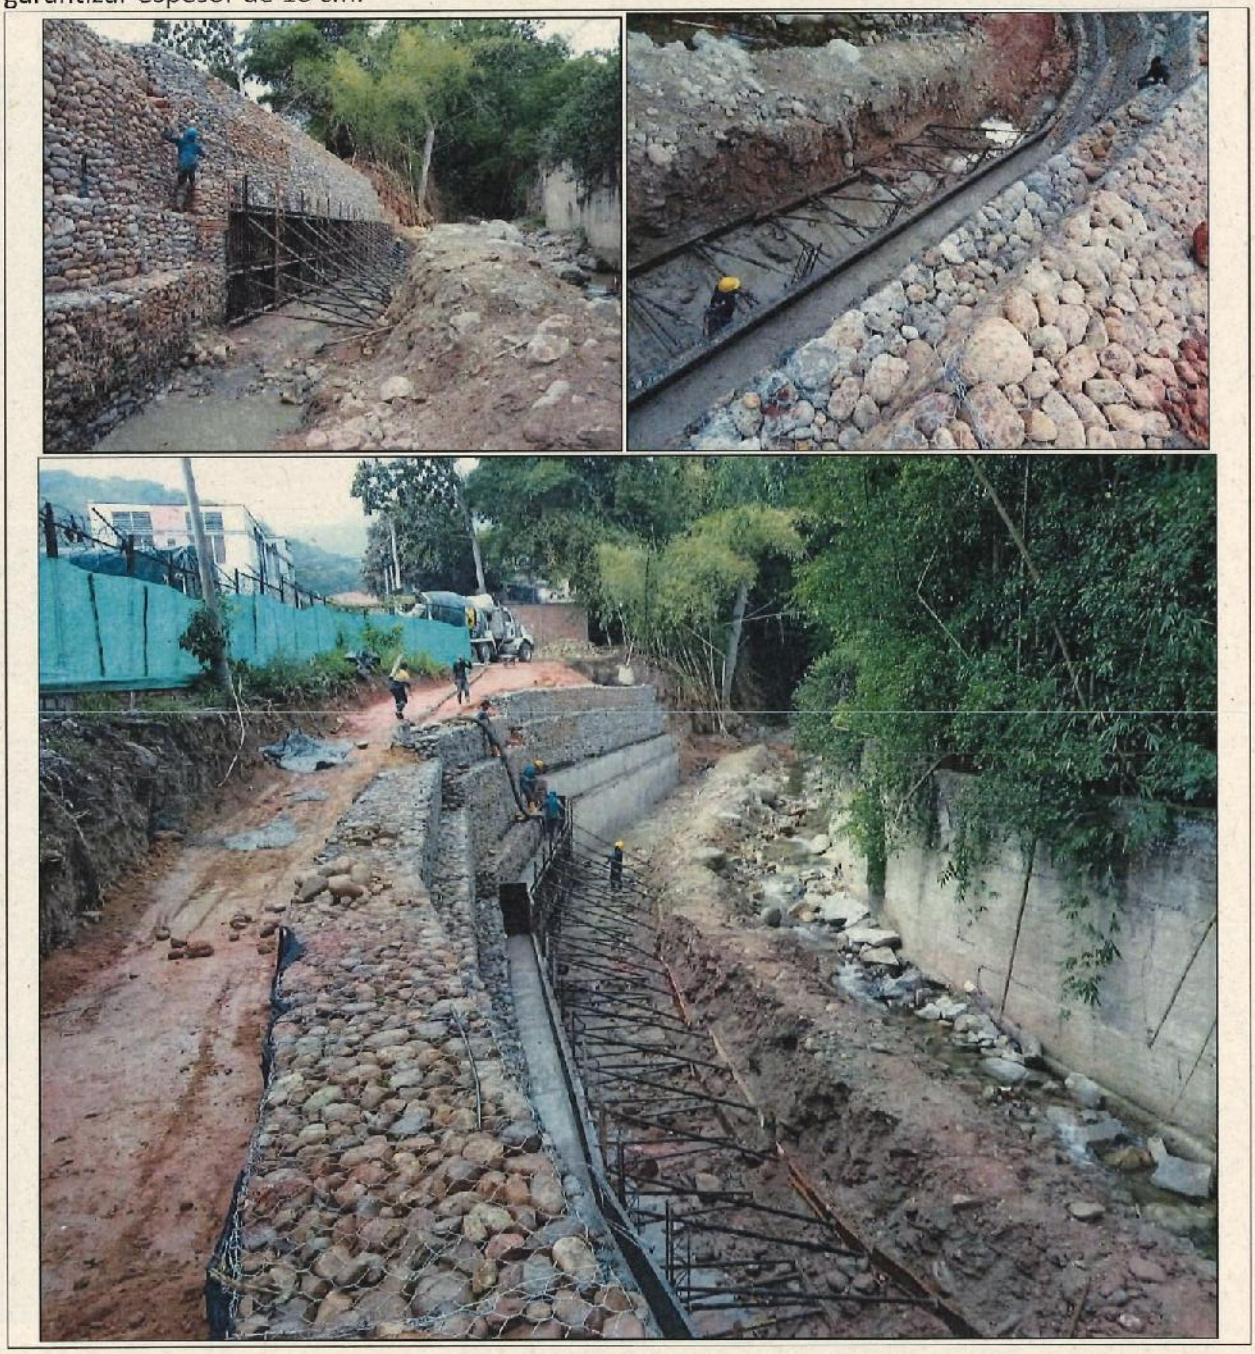






Suministro y colocación de concreto de 3000 psi

6.1.3. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos

Se realizó la instalación de lloraderos en tubería de PVC de 2" y 12,5 cm de longitud, ubicados en el tercer y cuarto nivel del muro de gaviones, con una separación horizontal de 1,00 m entre cada unidad, conforme a la distribución indicada en el diseño. Estos elementos tienen como finalidad permitir la evacuación del agua que pueda acumularse al interior y en el trasdós del muro, contribuyendo a disminuir la presión hidrostática y favoreciendo las condiciones de drenaje de la estructura. Los pasamuros fueron dispuestos de manera uniforme, garantizando su comunicación con el exterior del muro para facilitar la salida del agua.

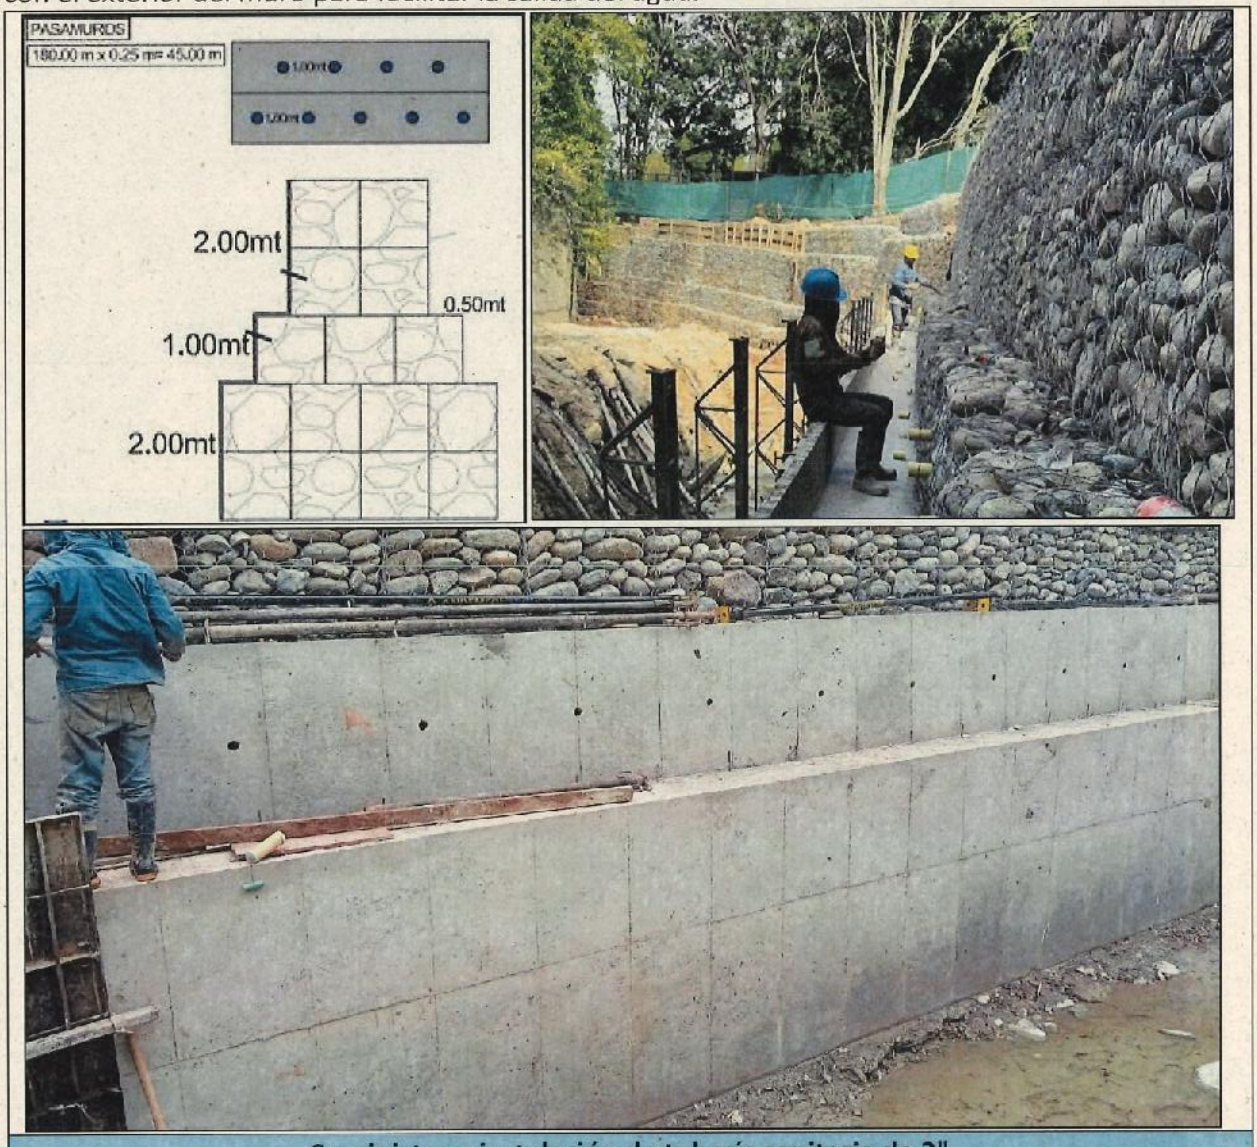

Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"

6.1.4. Cantidades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la relación de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco del contrato. La información consignada refleja el avance físico del proyecto con base en los registros de campo, controles de obra y mediciones realizadas durante el periodo reportado.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR LAGOS II DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00						
CONDICIONES CONTRACTUALES				INFORME 9. (1 AL 30 JULIO)	CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	% AVANCE
	SECCION PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	5,00	0,00	4,55	91,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1568,00	0,00	1568,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	392,00	0,00	391,85	99,96%
					Subtotal	**94,93%**
	SECCION SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	4461,00	0,00	4460,50	99,99%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	496,00	0,00	495,20	99,84%
2.01.A.06	Excavación mecánica bajo agua	m3	2974,00	0,00	2972,60	99,95%
2.01.A.07	Excavación en roca bajo agua	m3	331,00	0,00	327,65	98,99%
2.02	Terraplenes y Rellenos					
2.02.03	Suministro, conformacion y compactacion de rellenos estructurales	m3	6331,63	910,38	5505,59	86,95%

2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	152684,00	0,00	152541,27	99,91%
2.05	Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río	m3	1809,00	0,00	1806,60	99,87%
					Subtotal	**94,38%**
	SECCION TERCERA					
3.00	Concretos					
3.02.1	Suministro y colocación de Concreto ciclopeo 40% rajon de piedra y 60% concreto de 3000 psi	m3	588,00	0,00	588,00	100,00%
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	157,00	80,00	80,00	50,96%
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	588,00	0,00	540,00	91,84%
					Subtotal	**84,81%**
	SECCION CUARTA					
4.00	Aceros					
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	1521,00	0,00	1520,96	100,00%
					Subtotal	**100,00%**
	SECCION SEXTA					
6.00	Varios					%
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	204,00	0,00	0,00	0,00%
6.05	Filtro con tela					
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros .	m2	1176,00	0,00	1080,00	91,84%
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	2940,00	0,00	2700,00	91,84%
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	49,00	25,00	25,00	51,02%
					Subtotal	**87,91%**

6.2. Actividades de tipo técnico Frente ARRAYANES



Foto general frente Arrayanes

6.2.1. Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora

Se realizó la instalación de un geodren planar dispuesto verticalmente entre las líneas de anclajes activos, cuya función es captar las infiltraciones de agua subterránea e interna en el trasdós para canalizarlas de manera controlada hacia los drenes de abatimiento ubicados en la pata del talud. Para garantizar su fijación, estabilidad y posición previa al lanzado, el geodren planar se fijó a la superficie del terreno mediante pines de anclaje de 3/8'' en varilla corrugada.



Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna

7. Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m

Se realizó la instalación de malla electrosoldada, fijándola con pines de varilla corrugada de 3/8" en la cara del talud, actuando como elemento de refuerzo para controlar esfuerzos de retracción en la capa de concreto lanzado.





Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m

8. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas


Se ejecutó el fundido y colocación de concreto de 3.000 psi en zapatas de dimensiones 1,00 × 1,00 × 0,20 m, las cuales fueron construidas simultáneamente con la aplicación de la capa de 10 cm de concreto lanzado de la pantalla, garantizando la adecuada integración estructural y el comportamiento monolítico entre ambos elementos.




Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas

9. Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm

Se ejecutó la aplicación de concreto lanzado con mezcla húmeda de 3.000 psi y espesor de 10 cm sobre la superficie del talud, garantizando el recubrimiento del refuerzo y la conformación de la pantalla de estabilización de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

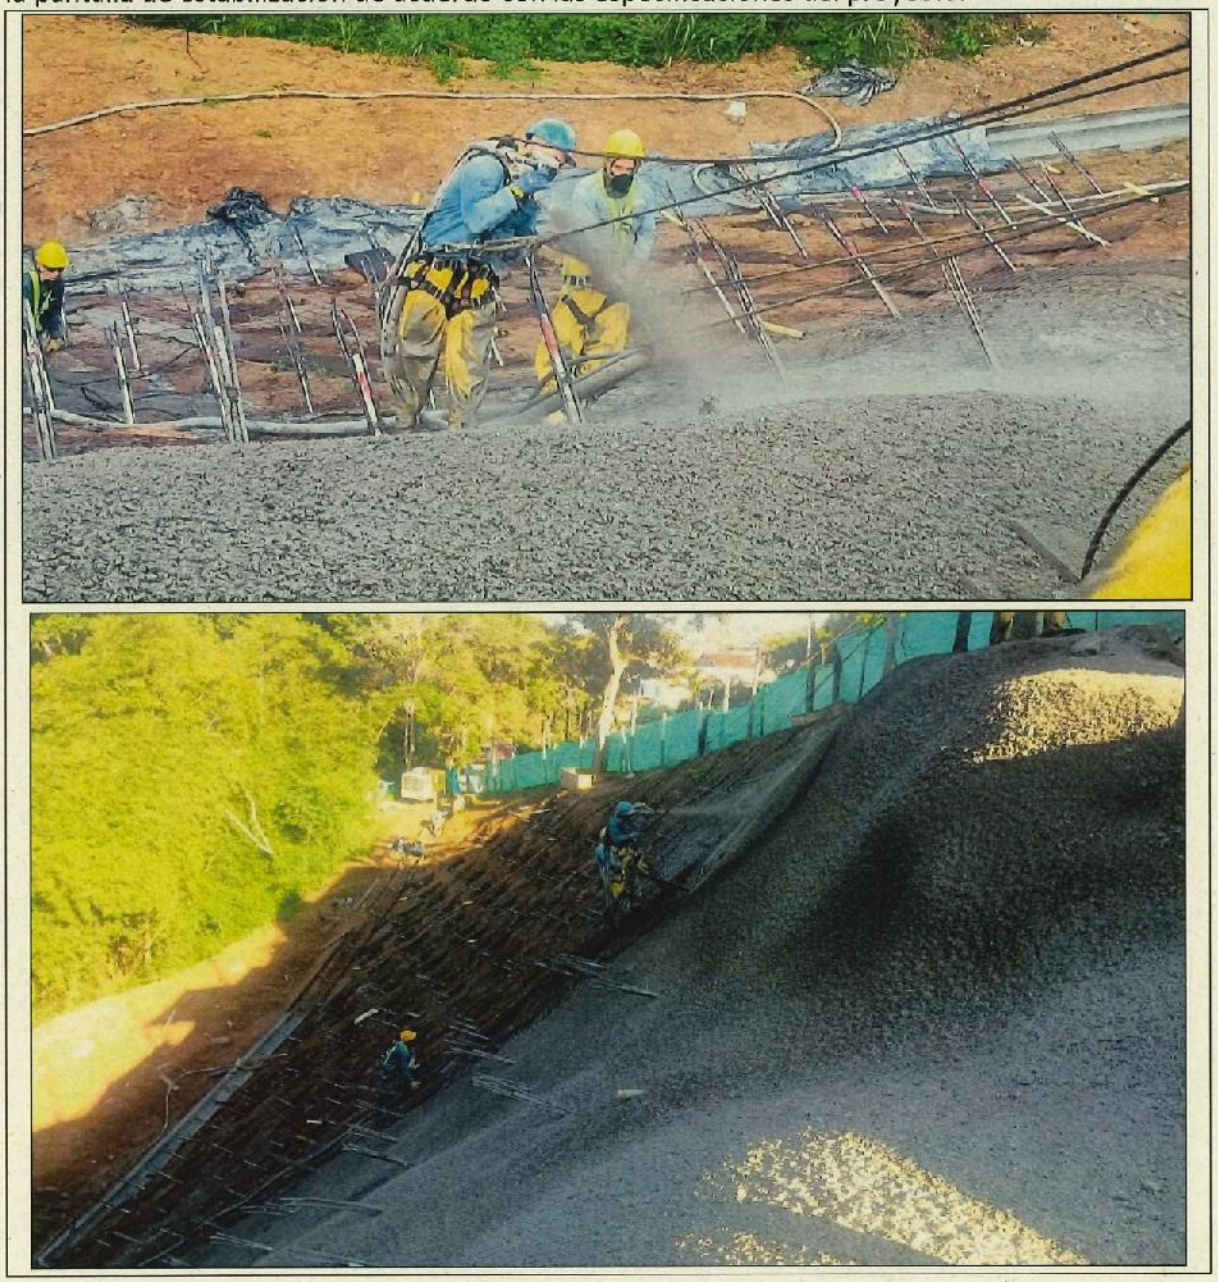

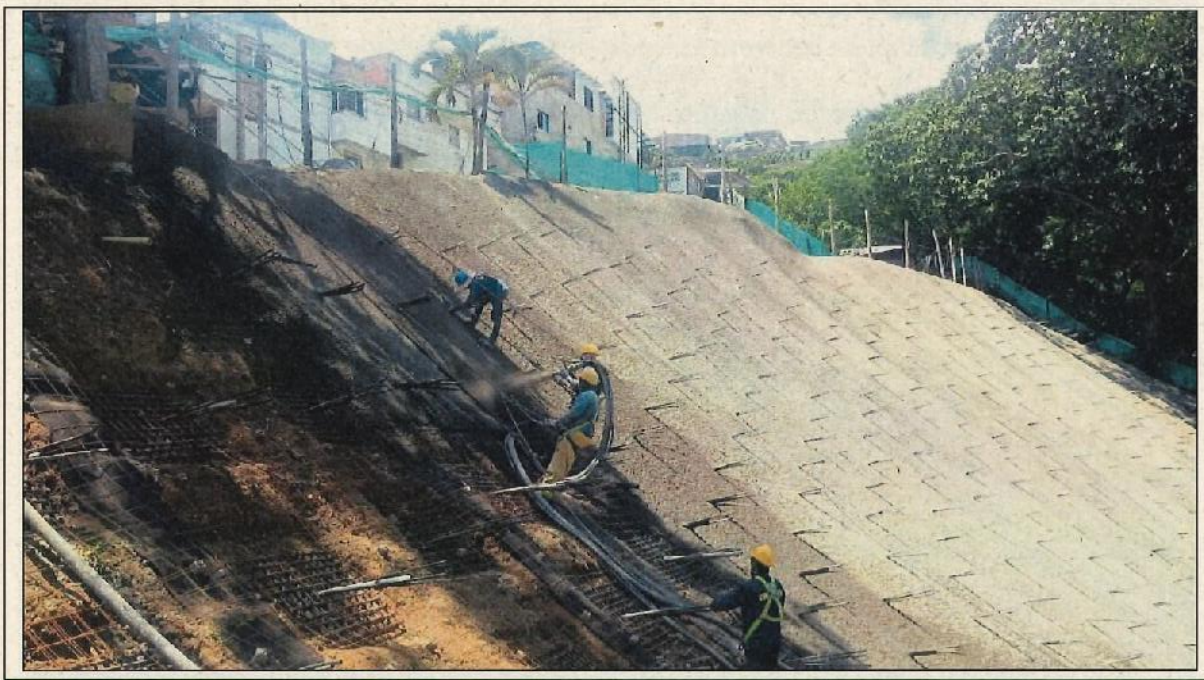


Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm

9.1.1. Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)


Se realizó la construcción de la canaleta en concreto, garantizando la correcta nivelación y acabado y capacidad de recolección y conducción de aguas superficiales evitando la infiltración y erosión en la corona y pie del talud.





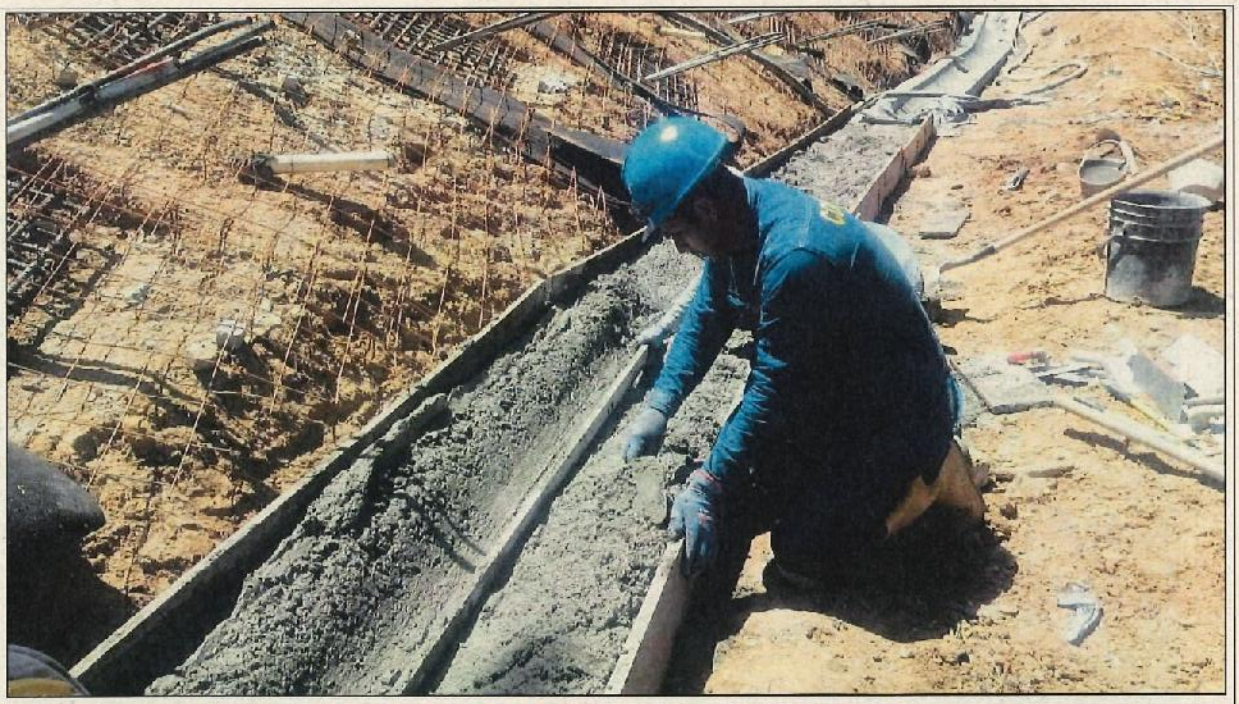



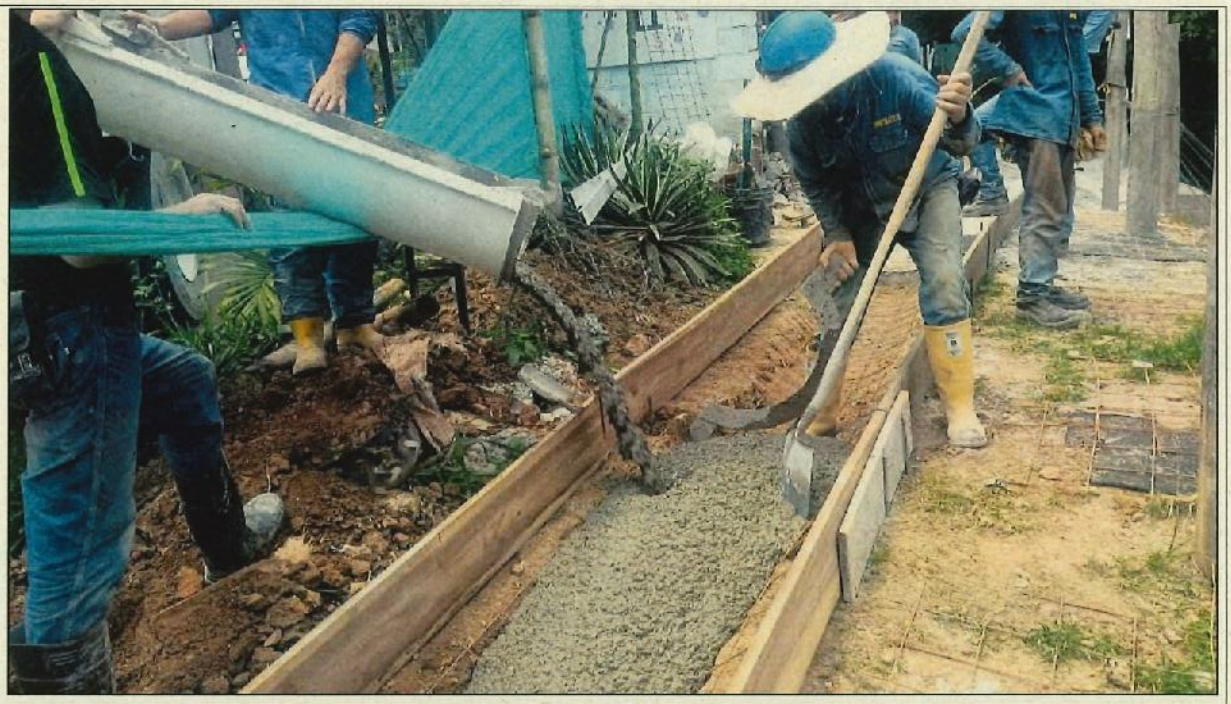

Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)

9.1.2. Cantidades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la relación de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco del contrato. La información consignada refleja el avance físico del proyecto con base en los registros de campo, controles de obra y mediciones realizadas durante el periodo reportado.

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL SECTOR CRÍTICO DEL BARRIO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER						
CONDICIONES CONTRACTUALES				INFORME 5. (1 AL 31 JULIO)	CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	% AVANCE
	SECCION PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	0,00	2,00	100,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m2	1380,00	0,00	1380,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	414,00	0,00	413,12	99,79%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1334,34	0,00	1333,80	99,96%
				Subtotal	**Subtotal**	**99,94%**
	SECCION SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre		69,00			
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	2668,69	0,00	2667,49	99,96%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	667,17	0,00	665,13	99,69%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	69,00	0,00	69,00	100,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	34743,10	0,00	32971,06	94,90%

2.04	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	1067,70	0,00	1065,26	99,77%
				Subtotal	**Subtotal**	**97,92%**
-	**SECCION TERCERA**	-	-	-	-	-
3.00	Concretos		346,00			
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	69,00	69,00	69,00	100,00%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m2	1380,00	1380,00	1380,00	100,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	173,00	0,00	172,50	99,71%
				Subtotal	**Subtotal**	**99,93%**
-	**SECCION CUARTA**	-	-	-	-	-
4.00	Aceros					
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	13911,00	0,00	13910,40	100,00%
4.02	Suministro y colocación de anclajes					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	345,00	0,00	345,00	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	345,00	0,00	0,00	0,00%
4.04	Suministro y colocación					
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	1380,00	1380,00	1380,00	100,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	345,00	0,00	0,00	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	345,00	0,00	0,00	0,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	345,00	0,00	0,00	0,00%
					Subtotal	**79,38%**
-	**SECCION QUINTA**	-	-	-	-	-
5.00	Perforaciones horizontales		360,00			

5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	225,00	0,00	225,00	100,00%
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	75,00	0,00	75,00	100,00%
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	5175,00	0,00	5175,00	100,00%
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1725,00	0,00	1725,00	100,00%
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	7200,00	0,00	7200,00	100,00%
				Subtotal	**Subtotal**	**100,00%**
I	**SECCION SEXTA**					
6.00	Varios					
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	133,00	130,00	130,00	97,74%
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	29,00	0,00	0,00	0,00%
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	435,00	435,00	435,00	100,00%
				Subtotal	**Subtotal**	86,27%


9.2. Actividades de tipo técnico frente SANTA ANA/ PRADOS DEL SUR



Foto general frente Santa Prados del sur

9.2.1. Llenado con lechada cementicia para anclajes


Se llevó a cabo el llenado de los anclajes utilizando lechada cementicia preparada de acuerdo con los parámetros de diseño con el fin de rellenar completamente el espacio entre el terreno y la barra de acero.

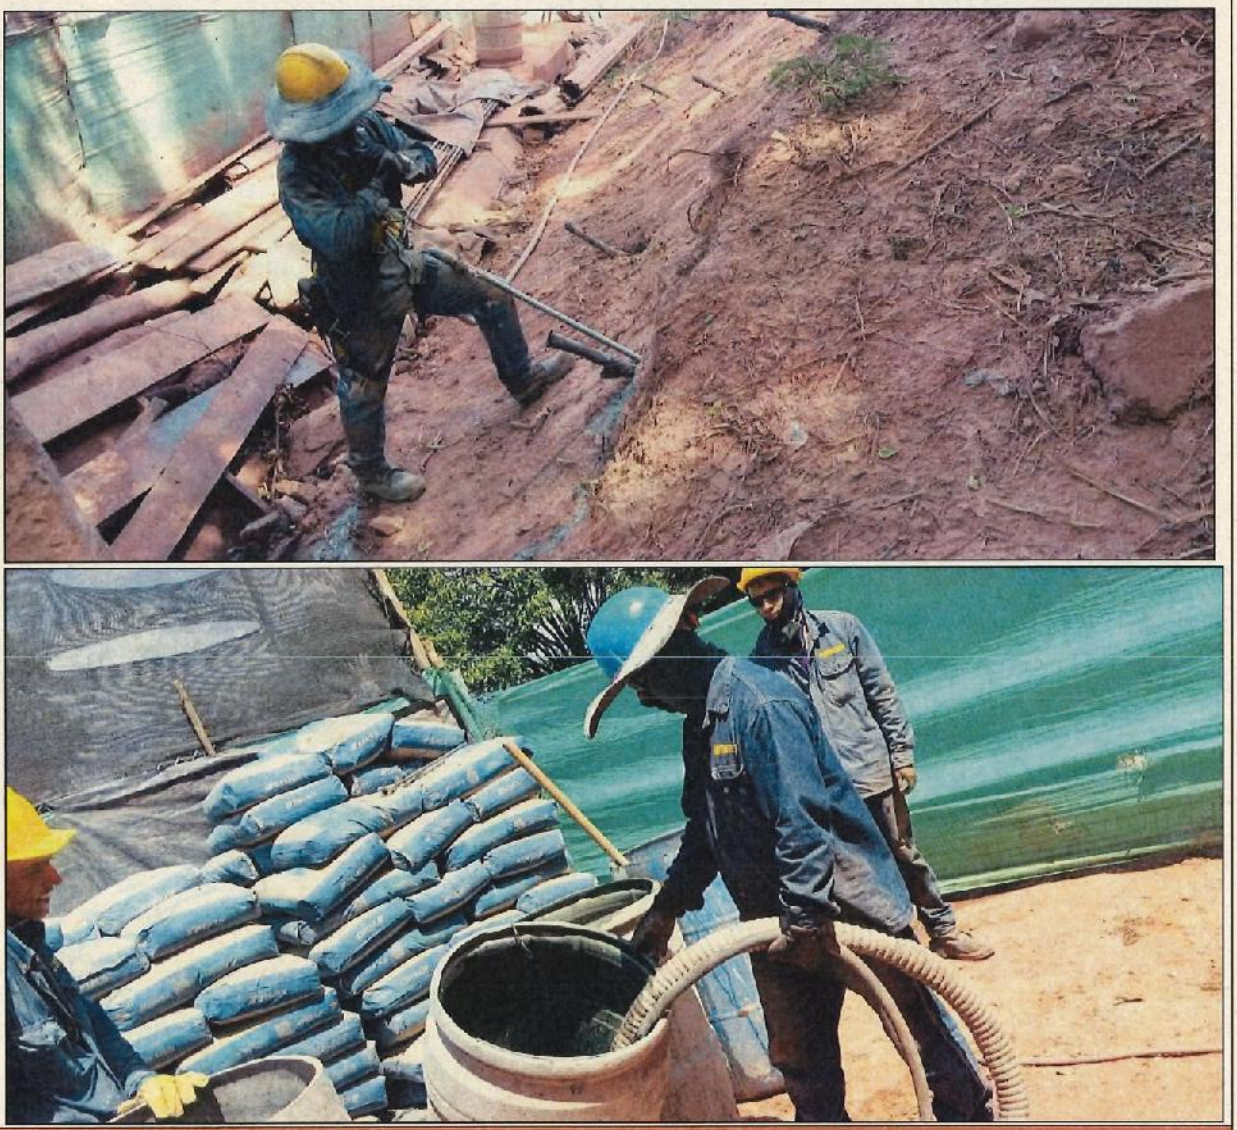


Llenado de anclajes.

9.2.2. Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m

Se instalaron anclajes pasivos de 32 mm de diámetro y 9m de longitud tal como lo especifican los planos estructurales. La actividad comprendió la instalación del elemento de refuerzo en las perforaciones previamente ejecutadas, garantizando su correcta ubicación para la posterior inyección con lechada cementicia.

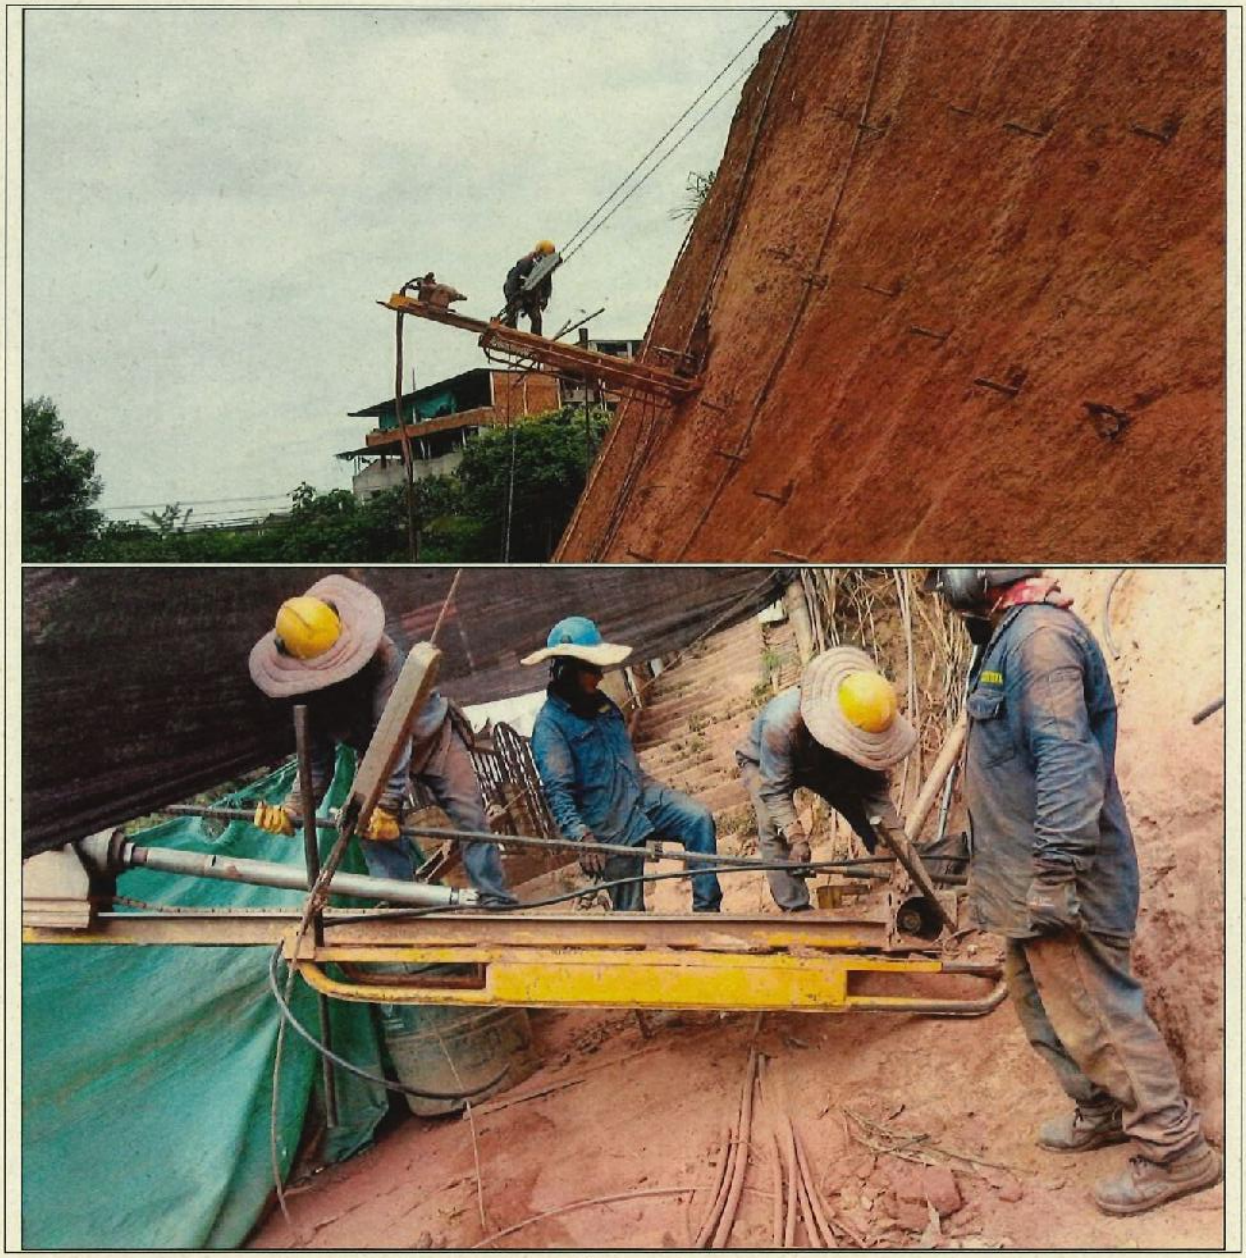

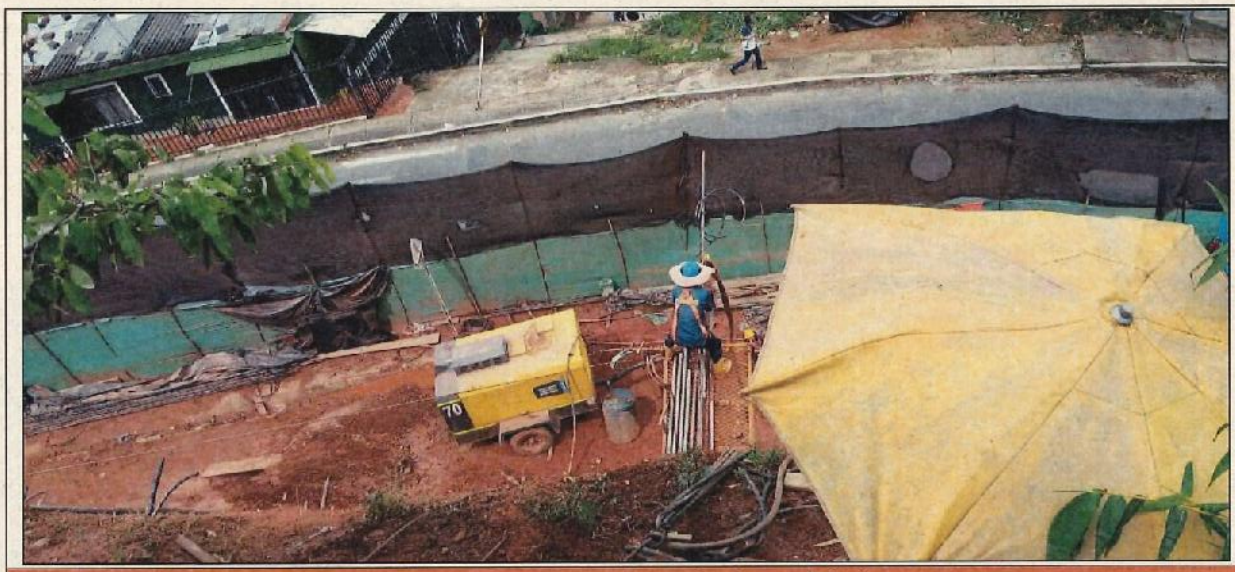


Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m

9.2.3. Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m

Se ejecutan perforaciones horizontales de 9 m de longitud mediante equipo de perforación descolgado, para la instalación de anclajes, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la adecuada preparación del barreno para su posterior inyección.



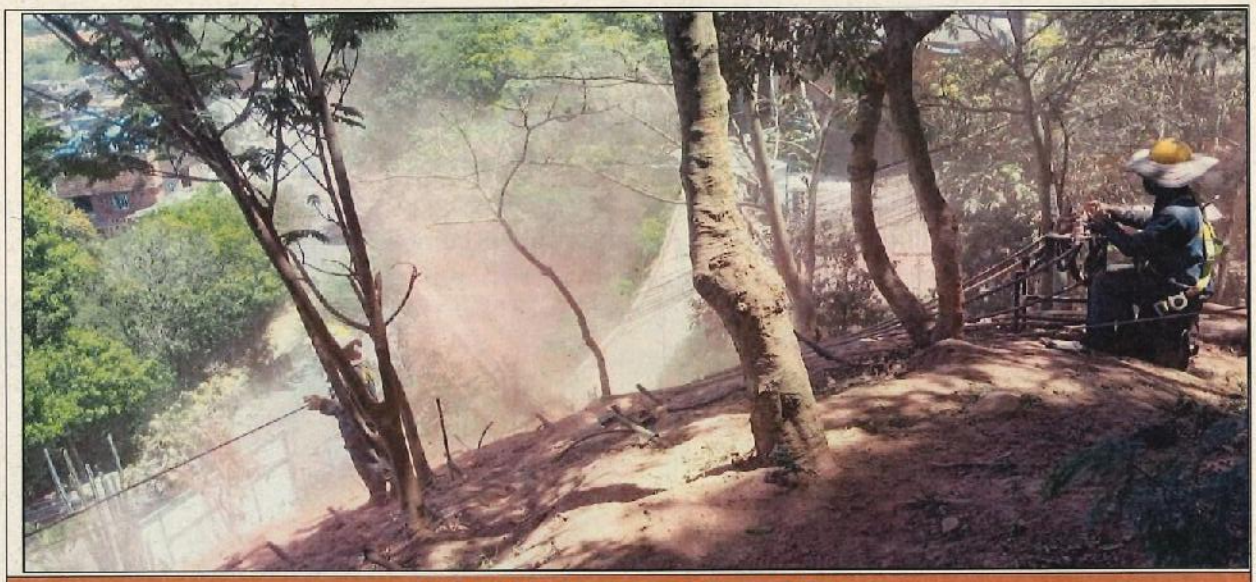

Perforación horizontal de anclajes.

9.2.4. Cantidades de obra ejecutadas

A continuación, se presenta la relación de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, correspondientes a las actividades desarrolladas en el marco del contrato. La información consignada refleja el avance físico del proyecto con base en los registros de campo, controles de obra y mediciones realizadas durante el periodo reportado.

Las cantidades relacionadas permiten evidenciar el progreso de las diferentes actividades ejecutadas en los frentes de trabajo, de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas presentadas durante la ejecución.

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS SECTORES CRITICOS DEL BARRIO SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
CONDICIONES CONTRACTUALES				INFORME 4. (1 AL 31 JULIO)	CANTIDADES ACUMULADAS
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	SECCION PRIMERA				
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	2,00	0,00	2,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00

1.04	Desmonte y limpieza	m2	2583,00	0,00	2583,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	645,75	0,00	583,68
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1033,16	0,00	640,12
				Subtotal	Subtotal
-	SECCION SEGUNDA	-	-	-	-
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes		109,83		
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	1678,88	0,00	1299,10
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	904,01	0,00	279,80
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	33952,18	0,00	33523,82
				Subtotal	Subtotal
-	SECCION TERCERA	-	-	-	-
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m3	144,00	17,20	51,60
				Subtotal	Subtotal
-	SECCION CUARTA	-	-	-	-
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.05	Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m	und	718,00	86,00	258,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.03	Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV	m2	2583,00	0,00	0,00
4.08	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero	und	718,00	0,00	0,00
				Subtotal	Subtotal
-	SECCION QUINTA	-	-	-	-
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	6462,00	774,00	2322,00

				Subtotal	Subtotal
-	SECCION QUINTA	-	-	-	-
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	195,00	0,00	0,00
6.03	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m	m	294,00	0,00	0,00
				Subtotal	Subtotal

9.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

9.3.1. Relación de actas.

- Acta de inicio del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 15 de octubre de 2025.

Los trabajos del contrato de obra No. 210.16224.6 se iniciaron el día quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025), según consta en el acta de inicio del contrato. El contrato fija un plazo de doce (12) meses, fijado el día 14 de octubre del 2026 como fecha de entrega de los trabajos.

- Acta de recibo y paga parcial 1 del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 15 de diciembre de 2025. Correspondiente al 9.01% valor ejecutado.
- Acta de recibo y paga parcial 2 del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 24 de marzo de 2026. Correspondiente al 36.46% valor ejecutado.
- Acta de recibo y paga parcial 3 del contrato de obra pública No.210.16224.6 fecha 15 de julio de 2025. Correspondiente al 62.32% valor ejecutado.

9.3.2. Bitácora de obra

El contratista lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe diariamente cada una de las actividades realizadas, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados en obra, al igual el clima durante el día y su noche anterior. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.

9.3.3. Afiliación seguridad social

Es compromiso del contratista y una de sus actividades administrativas, mantener a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra bajo el sistema de seguridad social, como lo indica el contrato. Para esto el contratista reunió la documentación necesaria de cada uno de los empleados, para tramitar ante la respectiva EPS y mantener actualizada, la información y pagos para su afiliación. El personal que se encuentra vinculado se encuentra afiliado al sistema de seguridad social bajo la razón social INFRACORP S.A.S, DESIC S.A.S, CONAINCO S.A.S Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA.

9.3.4. Seguimiento y control

Se lleva a cabo por parte del contratista un control, análisis y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron durante este periodo de tiempo. Así mismo, se mantiene una comunicación permanente con la comunidad y con la interventoría **UNION TEMPORAL INTERPANTALLAS 2025** a través de su Residente y director de Interventoría; brindando información de interés acorde a cada ente y se gestionan sus requerimientos, mediante correos electrónicos y reuniones en las instalaciones tanto de los contratistas como de la interventoría.

9.4. Actividades tipo financiero

9.4.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de enero de 2026 no hubo variaciones financieras.

9.5. Actividades de aseguramiento de la calidad

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra.

9.6. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal empleado en obra y brindando elementos específicos según las actividades a desarrollar, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista fueron:

- Capacitación del personal
- Vinculación al sistema de seguridad social del personal que ingresa, bajo Consorcio Estabilización Floridablanca.
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.

- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.

Ver anexo informe mensual de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

10. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, la obra mantiene un buen ritmo de ejecución, evidenciando avances satisfactorios en el desarrollo de las actividades programadas. Se proyecta continuar con esta dinámica de trabajo, garantizando la continuidad de los frentes de obra y el cumplimiento de las metas establecidas. Teniendo en cuenta que el frente de Arrayanes se encuentra próximo a finalizar su construcción, se contempla redistribuir y reforzar el personal operativo en los frentes de Prados del Sur y Santa Ana, con el propósito de incrementar su capacidad de ejecución, optimizar los recursos disponibles y mantener un avance constante en el proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los plazos establecidos.

Edgar Leonardo Gómez Roncancio.
Director de obra
Consorcio Estabilización Floridablanca

11. ANEXOS.

- Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Anexo No. 2: Informe de cumplimiento plan de acción socio ambiental.
- Anexo No. 3: Informe de gestión de proyectos.
- Anexo No. 4: Aseguramiento de la calidad.
- Anexo No. 5: Bitácoras de obra.
- Anexo No. 6: Estado del tiempo.
- Anexo No. 7: Oficios y correspondencia.
- Anexo No. 8: Plan manejo de Tránsito.

Anexo No. 1: Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME SST N° 9

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

CONSORCIO
ESTABILIZACIÓN
FLORIDABLANCA

Melissa Donado Arias

ELABORADO POR:
CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PROFESIONAL SISO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO 9
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 12
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 12
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12
7. PROCESOS DE FORMACIÓN 13
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 13
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 14
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 14
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2026;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
NIT	901982775-0
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR LEONARDO RONCANCIO
CONTRATO	210.16224.6
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASÍ COMO EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 2020-00080 00, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
DIRECCIÓN	Carrera 39 N° 51 – 31, Apto 2405
TELÉFONO	3012765665
CLASE DE RIESGO	V Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal vinculado para la ejecución del proyecto, en el periodo.

Tabla No. 1. Personal Staff

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026							
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE ID.**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
María Lucia Higuera Pino	1.095.700.657	Geotecnista	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	No Cotiza
Johana Paola Ospino Rodelo	1.098.618.429	Asesora ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	No Cotiza
Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	PMP	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	No Cotiza
Juan José Martínez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Comfenalco
Ángel Ramon Medina	1.239.700	Auxiliar de perforación	10/11/2025	Axa Colpatria	Salud mia	Porvenir	Comfenalco
Jorge Leonardo Herrera Reyes	1.095.835.301	Ayudante de obra	02/02/2026	Axa Colpatria	Coosalud	Porvenir	Comfenalco
Fabian Alberto Ramírez Florez	1.098.718.865	Ayudante de obra	02/02/2026	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Carlos Andrés Ramírez Florez	1.098.767.443	Ayudante de obra	02/02/2026	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Andrés Fernando Cuellar Hernández	1.098.649.173	Ayudante de obra	02/02/2026	Axa Colpatria	Salud mía	Porvenir	Comfenalco

Juan José Martínez	1.005.338.626	Almacenista	18/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Jose Alirio Valencia	5.778.254	Oficial de obra	04/11/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Jireh Lizarazo Navas	1.099.940.291	Operador de perforación I	01/06/2026	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Hugo Alfredo Diaz Ortega	1.099.371.577	Almacenista	01/06/2026	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Jhonatan Medina Florez	1.095.831.892	Operador de perforación I	01/06/2026	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					12		
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S.							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	N/A
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					1		
DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS							
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
Jonathan García Sánchez	91.185.774	Operador de maquinaria	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Ducan Buitrago Ramirez	91.357.094	Operador de maquinaria	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Maria Alejandra Sanchez	1.075.256.800	Profesional sst 2	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					3		
CONTRATISTA: INFRACORP S.A.S.							

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SISO	15/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Sandra Bermúdez	63.553.613	Profesional ambiental	15/10/2025	Axa Colpatria	Ecopetrol	Porvenir	Comfenalco
Fabián Leonardo Zambrano Lesmes	1.098.673.915	Topógrafo	15/10/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Colpensiones	Comfenalco
Oscar Sánchez Jerez	1.098.756.647	Ingeniero residente	15/10/2025	Axa Colpatria	SURA	Protección	Comfenalco
Edinson David Navarro Florez	1.007.731.661	Ayudante de perforación 2	15/10/2025	Axa Colpatria	Salud total	Porvenir	Comfenalco
Annel Edgardo Hernández Escobar	5.338.041	Ayudante de perforación II	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Alexander Prada Jerez	13.537.319	Oficial de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colfondos	Comfenalco
Emiro Monares Cuadros	13.542.493	Ayudante de obra	15/10/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Protección	Comfenalco
Jonathan Villamzar Urbina	1.234.339.663	Ayudante de obra	01/09/2026	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA					25		

SUBCONTRATISTA – PEÑARANDA & RAMIREZ

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Duván Jesid Cárdenas Mantilla	1.100.896.238	Oficial	05/01/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
John Jairo Cardenas Mantilla	1.095.936.735	Oficial	05/01/2026	Sura	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Jhon Rene Cardenas	91.464.275	Ayudante	05/01/2026	Sura	Nueva Eps	Porvenir	Cajasan
Diego Alejandro Galvis	1.098.506.084	Ayudante	05/01/2026	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan

Huver David Rivera Villalobos	1.048.271.660	Ayudante	05/01/2026	Sura	Sanitas	Protección	Cajasan
Juan Pablo Suarez Manrique	13.861.583	Ayudante	05/01/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Geraldine Patiño Ramírez	1.098.739.437	Aux SST	26/02/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Deibys Gonzalo Echverria	PT5873350	Ayudante de obra	13/03/2026	Sura	Nueva Eps	Porvenir	Cajasan
Fernando Porto Mercado	1049318275	Oficial de construcción	16/03/2026	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Jaider José Cerpa Guerrero	1002425334	Ayudante de obra	16/03/2026	Sura	Sanitas	Protección	Cajasan
Juan Carlos Almeida	91159628	Ayudante de obra	13/03/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Mauricio Méndez Urieta	1002425629	Oficial de construcción	13/03/2026	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
TOTAL, PERSONAL CONTRATISTA						12	
TOTAL, PERSONAL EN OBRA						**33**	

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo No 1. Afiliaciones y/o planilla de pagos de seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

Para el presente periodo no se presenta novedad de ingreso.

Ver anexo No 2. Novedades de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe, se presentaron los siguientes retiros:

NOVEDADES DE RETIRO			
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026			
CONTRATISTA: PEÑARANDA & RAMIREZ			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
EDUAR ALONSO REATIGA	1.101.597.448	ALMACENISTA	28-07-2026

Tabla No 4. Documentos de maquinaria

Clase	Marca	Modelo	N° Serie	Motor	Operador	Fecha actividades
Excavadora	Doosan	2018	DHKCEBACAJ0020617	DB58TIS31003EN	Duncan Buitrago	Del 01 al 31 de julio
Excavadora	Doosan	2015	CEBAA006876	DLO6CC424373E00	Jhonatan Sánchez	Del 01 al 31 de julio
Vibro compactador	Caterpillar	2017	OR5200273	CMY06808	Duncan Buitrago	Del 01 al 31 de julio

Ver anexo No 4. Documentos maquinaria y volquetas

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora.

Durante el período que cubre este informe, las actividades se focalizaron en el inicio operativo del proyecto, específicamente en el ingreso y contratación de personal. Por este motivo, la gestión de los comités no se activó; su inicio está previsto para el mes siguiente.

Ver anexo No 5. Acta de comité copasst
Ver anexo No 5.1. Acta de comité cocola

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizarán inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 4. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega y/o reposición de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 6. Registros de Elementos de protección Personal y Dotación.

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 5. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	09/07/2026	Reglamento interno
2	16/07/2026	Políticas 2026
3	29/07/2026	Etiquetas de la seguridad

Ver anexo No 7. Registro de asistencia a capacitaciones SST.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 6. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	29/07/2026
Inspección de botiquín y camilla Lagos	29/07/2026
Inspección de botiquín y camilla Arrayanes	29/07/2026
Inspección locativa de obra lagos	29/07/2026
Inspección locativa de obra Arrayanes	29/07/2026
Inspección de extintores Lagos	29/07/2026
Inspección de extintores Arrayanes	29/07/2026

Ver anexo No 8. Inspecciones de Seguridad.

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 9. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.

- Caídas a diferente nivel (trabajo en alturas)	-Diligenciamiento y verificación del permiso de trabajo en alturas - Uso obligatorio de arnés, líneas de vida y conectores certificados - Inspección previa de equipos de protección contra caídas	Del 01 al 31 de julio 2026

Ver anexo No 10. Medidas preventivas.

Ver anexo No 9. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB

CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Codigo	SST-F-41
Fecha	29/07/2021
Versión	2
Página __ de __	

Periodo Año 2026

N°	MES	N° AT			N° TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		SI	CI	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	ILI
1	ENERO	0	0	0	46	0	0	14	0	5152	ENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FEBRERO	0	0	0	44	0	0	28	0	9856	FEBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MARZO	0	0	0	54	0	0	31	0	11392	MARZO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABRIL	1	0	1	54	2	0	30	0	10960	ABRIL	1,85	3,70	1,85	0,01
5	MAYO	0	0	0	40	0	0	31	0	9520	MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	JUNIO	0	0	0	45	0	0	30	0	10800	JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	JULIO	0	0	0	45	0	0	31	0	11160	JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1	0	1	328	2	0	195	0	73240	TOTAL	0,30	0,61	0,30	0,00

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia

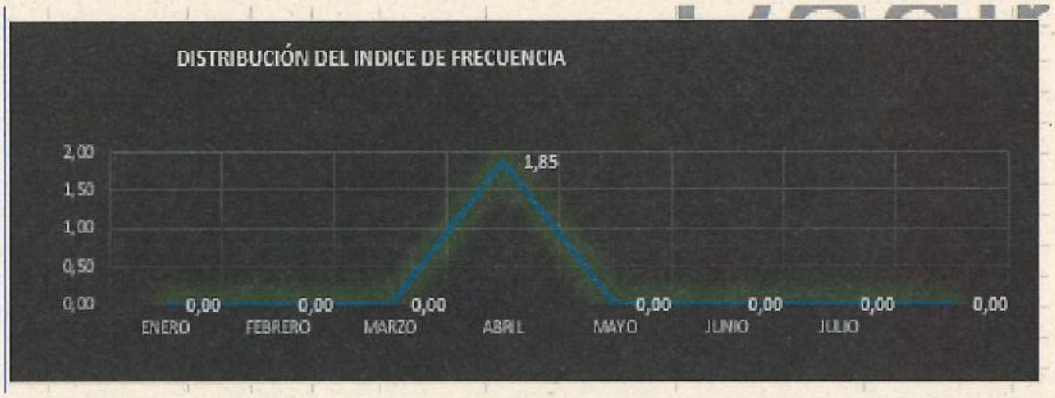


Imagen 2. Tasa de accidentalidad

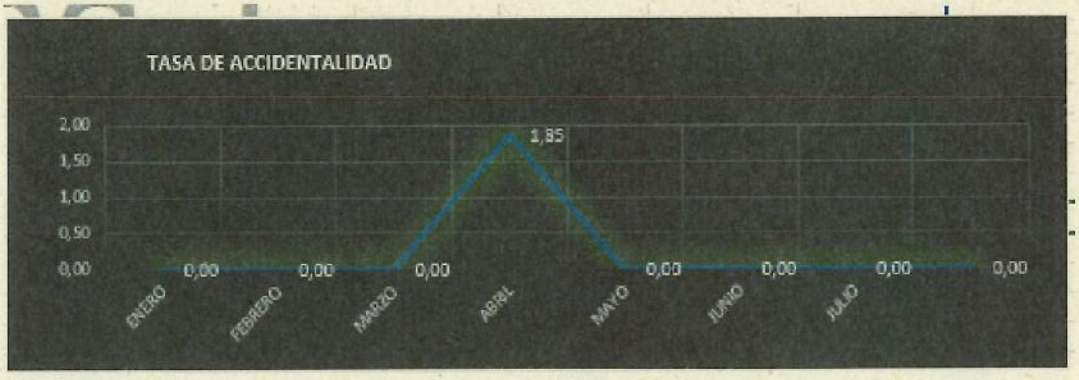


Imagen 3. Número de trabajadores mensual


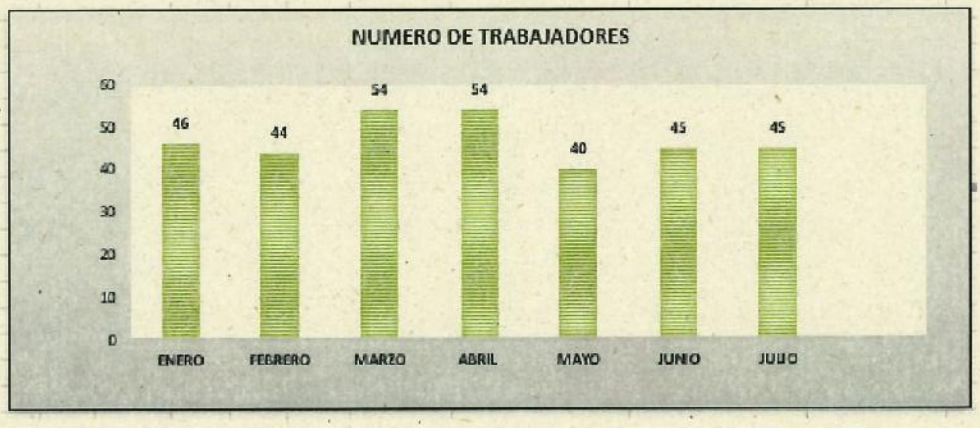


Imagen 4. Total, de accidentes de trabajo

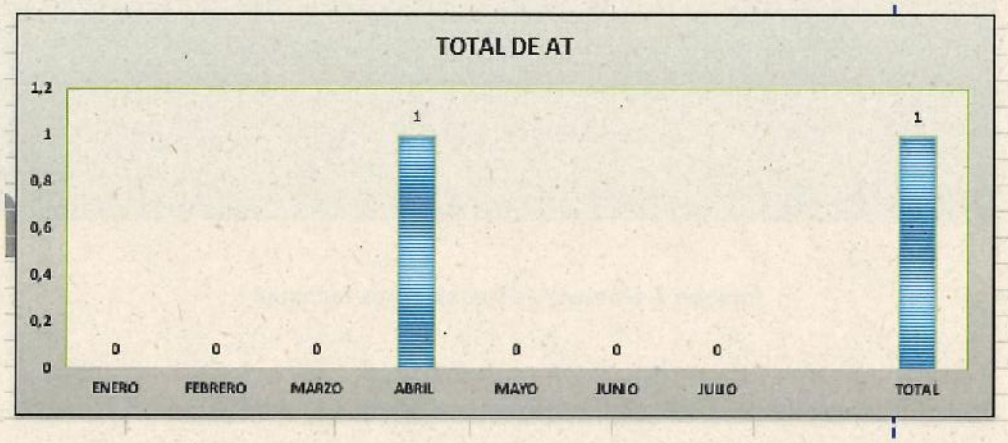

ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	561262537	9509415852	I	2026/08/20	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,006,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,197,200	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$3,197,200	$0	$94,100	$0	$94,100	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$458,200	$0					$0	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$458,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,350,800	$0					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$2,350,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$6,006,200	$0	$94,100	$0	$94,100	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72254372		GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 39 # 51 - 31 APTO 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	6914305	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	561262937	95094115852	I	2026/08/20	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,006,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72254372	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO									X									231001	30	$18,806,059	$3,197,200	EPS010	30	$18,806,059	$2,350,800		0	$0	$0	14-7	30	$18,806,059	$458,200	0	$0	$0	No	$6,006,200
Total	Afiliados(1)																						$18,806,059	$3,197,200			$18,806,059	$2,350,800			$0	$0			$18,806,059	$458,200		$0	$0		$6,006,200

2026/08/14 09:20 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$3,197,200
$3,197,200
$458,200
$458,200
$2,350,800
$2,350,800
$6,006,200

2026/08/14 09:20 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-14, 08:55:08 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064033296

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 12/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDP	TAC	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,752,605	$ 218,900	0.522	$ 1,750,905	$ 9,200	(NINGU) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,750,905	$ 1,750,905	$ 1,750,905	$ 0	$ 280,200	$ 218,900	$ 9,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508,300	$ 0	$ 508,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3818850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-13, 03:44:06 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1084012565

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	INET	RET	TDE	TAE	TDP	IGE	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IDC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095730657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																		0	0	30	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1,751,905	$ 121,900	(NINCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121,900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																		0	0	30	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1,751,905	$ 121,900	(NINCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121,900
CC 80069079	JUAN CARLOS R NOON LOZANO	59	00																		0	0	30	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1,751,905	$ 121,900	(NINCC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121,900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5,252,715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365,700	$ 0	$ 365,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 C5 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	561082525	9508279958	I	2026/08/11	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$499,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Tota. Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	Afiliados(1)																						$1,752,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER Z CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	561082525	9508279958	I	2026/08/11	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE		$499,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$499,100	$500	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

OR A PAGAR
$280,500
$280,500
$219,100
$219,100
$499,600

026/08/14 09:26 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6028033761**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		545783798

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80838078
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNDIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
D RECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIV DAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5028033761	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaammdd):		20250905	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		945783796

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
SUBTOTALES:										$ 280,200	$ 0	$ 280,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 218,900
SUBTOTALES:													$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 218,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																								SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																														PENSION							SALUD							ARP														
AP	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRL	PEN	SAL	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	CUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 80838078	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1,750,905			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A	X	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-13, 03:43:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084011741

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA		
Documento	NI901982775	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372
Total Afiliados	28	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1098336317	IVAN DARIO CASTILLA ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.823.023	$ 292.500	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 1.828.028	$ 72.200	6,960	$ 1.828.028	$ 127.200	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.828.028	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.200
CC 1095151274	ANNY LIZETH VARGAS ARENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 1.823.080	$ 308.500	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.928.080	$ 77.200	6,960	$ 1.928.080	$ 134.300	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.928.080	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.100
CC 1095336626	JUAN JOSE MARTINEZ MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 1.501.000	$ 304.000	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.200	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.300
CC 1051057947	JOSE NELSON SILVA ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 1.782.171	$ 285.200	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.782.171	$ 71.300	6,960	$ 1.782.171	$ 124.100	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.782.171	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900
CC 1063554648	CAMILO ANDRES CABANA BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.792.593	$ 286.900	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.792.593	$ 71.800	6,960	$ 1.792.593	$ 124.800	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.792.593	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.300
CC 1095831852	JHONATAN MEDINA FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 1.662.336	$ 267.700	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.860.336	$ 74.500	6,960	$ 1.860.336	$ 129.500	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.860.336	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.200
CC 1095836301	JORGE LEONARDO HERRERA REYES	01	30										X							3	29	29	29	29	[230301] PORVENIR	$ 1.744.652	$ 279.200	[ESS024] EPS-S COOSALUD	$ 1.744.652	$ 69.800	6,960	$ 1.744.652	$ 121.500	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.744.652	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.300
CC 1095836301	JORGE LEONARDO HERRERA REYES	01	30			X									X					0	1	1	1	1	[230301] PORVENIR	$ 58.365	$ 9.400	[ESS024] EPS-S COOSALUD	$ 58.365	$ 2.400	0,000	$ 58.365	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 58.365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1095839883	LEONARDO ANDRES DUARTE ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 2.128.452	$ 340.600	[EPS010] EPS SURA	$ 2.128.452	$ 85.200	6,960	$ 2.128.452	$ 148.200	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.128.452	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.200
CC 1095840052	OLGER SEPULVEDA PARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.925.595	$ 308.200	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.925.595	$ 77.100	6,960	$ 1.925.595	$ 134.100	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.925.595	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.500
CC 1095849173	ANDRES FERNANDO CUELLAR HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.938.502	$ 310.200	[EPS046] SALUD MIA EPS046	$ 1.938.502	$ 77.600	6,960	$ 1.938.502	$ 135.000	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.938.502	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.400
CC 1098718865	FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ	01	00										X							3	28	28	28	28	[230301] PORVENIR	$ 1.665.444	$ 266.500	[EPS005] EPS SANITAS	$ 1.665.444	$ 66.700	6,960	$ 1.665.444	$ 116.000	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.665.444	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.900
CC 1098718865	FABIAN ALBERTO RAMIREZ FLOREZ	01	00													X				3	2	2	2	2	[230301] PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	[EPS005] EPS SANITAS	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1096371577	HUGO ALFREDO DIAZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 2.080.952	$ 333.000	[EPS005] EPS SANITAS	$ 2.080.952	$ 83.300	6,960	$ 2.080.952	$ 144.900	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.080.952	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.500
CC 1095940251	JIREH LIZARAZO NAVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.925.595	$ 308.200	[EPS010] EPS SURA	$ 1.925.595	$ 77.100	6,960	$ 1.925.595	$ 134.100	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.925.595	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.500
CC 1101019374	JOLIVAN JERONIMO GARCIA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 1.803.015	$ 288.500	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.803.015	$ 72.200	6,960	$ 1.803.015	$ 125.500	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.803.015	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.400
CC 1101520018	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 1.844.703	$ 295.200	[EPS005] EPS SANITAS	$ 1.844.703	$ 73.800	6,960	$ 1.844.703	$ 128.400	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.844.703	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.200
CC 1101596209	SALAS GARCIA JAMES	01	00																	0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.836.450	$ 294.200	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 1.836.450	$ 73.600	6,960	$ 1.836.450	$ 126.000	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.836.450	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.450
CC 1101597448	EDUAR ALONSO HEATIGA GONZALEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	[230301] PORVENIR	$ 2.119.405	$ 309.200	[EPS017] FAMISANAR EPS	$ 2.119.405	$ 84.800	6,960	$ 2.119.405	$ 147.600	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.327.556	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/08/2026

Empresa NI901982775
CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Planilla Nro: 1084011741

Periodo Cotización: julio de 2026

Periodo Servicio: agosto de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1117497377	MAYRA ALEJANDRA BOLAÑOS SILVA	01	00											X					0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.459.069	$ 233.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.459.069	$ 58.400	0,000	$ 1.459.069	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.459.069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900
CC 1117497377	MAYRA ALEJANDRA BOLAÑOS SILVA	01	00											X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.819	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.819	$ 11.700	0,000	$ 291.819	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.819	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 1102205789	JUAN MANUEL RAMIREZ CAMPO	01	00											X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.799.542	$ 216.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.799.542	$ 0	0,000	$ 1.799.542	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.799.542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000
CC 1232396393	YHADIN RICEUS DUARTE	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESS024) EPS-S COOSALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 13516255	FREDY LEONARDO MANRIQUE ESTUPIÑAN	01	00											X					0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.810.596	$ 217.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.810.596	$ 0	0,000	$ 1.810.596	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.810.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.300
CC 13537319	ALEXANDER PRADA JEREZ	01	00																0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.700
CC 13537319	ALEXANDER PRADA JEREZ	01	00														L		0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 501.395	$ 80.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 501.395	$ 20.100	0,000	$ 501.395	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.100
CC 5778254	JOSE ALIRIO VALENCIA TARAZONA	01	00												X				0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.823.859	$ 291.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.823.859	$ 73.000	6,960	$ 1.823.859	$ 127.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.823.859	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.900
CC 86223968	LUIS ERNESTO BERMUDEZ PEREIRA	01	00												X				0	30	30	30	30	(230901) PROTECCION	$ 1.792.593	$ 286.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.792.593	$ 71.800	6,960	$ 1.792.593	$ 124.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.792.593	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.300
CC 91150950	WILSON MENDEZ PEÑA	01	00												x				0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.803.015	$ 288.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.803.015	$ 72.200	6,960	$ 1.803.015	$ 125.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.803.015	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.400
CC 91458433	HELMER CABALLERO JAIMES	01	00												x				0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.844.703	$ 295.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.844.703	$ 73.800	6,960	$ 1.844.703	$ 128.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.844.703	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.200
CC 91459128	ELIAS REATIGA RATTEA	01	00												x				0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.834.261	$ 293.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.834.261	$ 73.400	6,960	$ 1.834.261	$ 127.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.834.261	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.000
CC 91539925	CARLOS ARTURO MOLINER JIMENEZ	01	00												X				0	30	30	30	30	(230901) PORVENIR	$ 1.803.015	$ 288.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.803.015	$ 72.200	6,960	$ 1.803.015	$ 125.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.803.015	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 52.080.675	$ 52.080.675	$ 52.080.675	$ 52.254.339	$ 8.189.900	$ 1.940.400	$ 3.205.700	$ 1.870.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.206.200	$ 0	$ 15.206.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-13, 03:11:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084005967

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005152012	HEIJ ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	10	10	10	10	(250301) PORVENIR	$ 580,636	$ 92,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 580,636	$ 23,400	0,000	$ 580,636	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 580,636	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116,800
CC 1005452015	HEIJ ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	20	20	20	20	(250301) PORVENIR	$ 1,167,271	$ 186,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,167,271	$ 46,700	0,000	$ 1,167,271	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,167,271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233,500
CC 1095631315	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DE GADO	01	00																	0	30	30	30	30	(250301) PORVENIR	$ 3,685,655	$ 589,800	(EPS010) EPS SURA	$ 3,685,655	$ 147,500	6,960	$ 3,685,655	$ 256,500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3,685,655	$ 147,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,141,100
CC 1098693230	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,005,370	$ 480,900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3,005,370	$ 120,300	0,960	$ 3,005,370	$ 200,200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3,005,370	$ 120,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 921,700
CC 1098746945	AURA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(250201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS025) EPS SANITAS	$ 1,750,905	$ 70,100	0,522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429,600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.192.837	$ 10.192.837	$ 10.192.837	$ 10.192.837	$ 1.631.100	$ 408.000	$ 475.000	$ 337.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.552.000	$ 0	$ 2.552.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	560680631	9509404518	E	2026/08/12	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,872,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	ige	lm a	va c	av p	vc t	irl p	vi p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (20 Afiliados)																						$47,071,762	$7,617,800			$48,822,667	$1,953,900			$48,420,680	$1,874,700			$2,425,800		$0	$0		$13,872,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																						$11,659,611	$1,865,700			$13,410,516	$536,700			$12,867,289	$515,000			$70,300		$0	$0		$2,987,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$10,500		$0	$0		$490,500
1	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$5,250,905	$840,200			$5,250,905	$210,100			$5,250,905	$210,100			$27,500		$0	$0		$1,287,800
2	CC	1098634129	ANAYA CARRERO JUAN CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA																	23030 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF40	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$875,453	$35,100			$9,200		$0	$0		$394,600
4	CC	1095839242	TORRES PINZON MICHELLE MARIA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$394,600
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,657,801	$425,300			$2,657,801	$106,400			$2,990,026	$119,700			$13,900		$0	$0		$665,300
5	CC	1102374552	RINCON AMAYA LAURA NATHALY		X															23030 1	30	$2,657,801	$425,300	EPS010	30	$2,657,801	$106,400	CCF40	30	$2,990,026	$119,700	14-4	30	$2,657,801	0.522%	$13,900	30	$0	$0	SI	$665,300
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$9,200		$0	$0		$149,400
6	CC	91079315	ACERO ROJAS JULIO CESAR							X											0	$0	$0	MINDO1	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$149,400

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (14 Afiliados)														$35,412,151	$5,752,200			$35,412,151	$1,417,200			$35,553,391	$1,359,700			$35,412,151		$2,355,500		$0	$0		$10,884,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)														$17,233,622	$2,757,800			$17,233,622	$689,800			$17,233,622	$626,700			$17,233,622		$1,090,100		$0	$0		$5,164,400
7	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON								X			25-14	30	$2,490,325	$398,500	EPS037	30	$2,490,325	$99,700	CCF40	30	$2,490,325	$99,700	14-4	30	$2,490,325	6.950%	$173,400	30	$0	$0	SI	$771,300
8	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLMA											230301	30	$2,506,582	$401,100	MINO01	30	$2,506,582	$100,300	CCF40	30	$2,506,582	$100,300	14-4	30	$2,506,582	6.950%	$174,500	30	$0	$0	SI	$775,200
9	CC	1065890228	CANIZARES CORDERO MARIA ANGELICA											230901	30	$3,000,000	$480,000	EPS025	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.950%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
10	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA											230221	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.950%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	91285829	MEZA GOMEZ ENRIQUE											25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS042	22	$1,283,997	$51,400	CCF40	22	$1,283,997	$51,400	14-4	22	$1,283,997	6.950%	$89,400	22	$0	$0	SI	$397,700
12	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO											25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	6.950%	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
13	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO										X	25-14	17	$992,181	$158,800	EPS037	17	$992,181	$39,700	CCF40	17	$992,181	$0	14-4	17	$992,181	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$198,500
14	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO										X	25-14	10	$583,636	$93,400	EPS037	10	$583,636	$23,400	CCF40	10	$583,636	$0	14-4	10	$583,636	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$116,800
15	CC	109870 278	RESTREPO GARCIA MICHAEL GIUSEPPE											232201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.950%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
16	CC	1098673515	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO											25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS042	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	SI	$836,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)														$14,661,086	$2,431,500			$14,661,086	$586,600			$14,802,326	$592,200			$14,661,086		$1,020,500		$0	$0		$4,630,800
17	CC	1096053092	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO											25-14	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$14,100	CCF40	6	$491,421	$19,700	14-4	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$114,300
18	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA											25-14	30	$8,560,000	$1,455,200	EPS005	30	$8,560,000	$342,400	CCF40	30	$8,560,000	$342,400	14-4	30	$8,560,000	6.960%	$595,800	30	$0	$0	SI	$2,735,800
19	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES											230701	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
20	CC	1234339663	VILLAMIZAR URBINA JONATHAN											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (2 Afiliados)														$3,517,443	$562,900			$3,517,443	$140,800			$3,517,443	$140,800			$3,517,443		$244,900		$0	$0		$1,089,400
21	CC	13971400	ARGUELLES MARTINEZ JIMMY											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
22	CC	1005315959	SIMANCA PICON JHON MILLER								X			25-14	30	$1,766,538	$282,700	EPS041	30	$1,766,538	$70,700	CCF40	30	$1,766,538	$70,700	14-4	30	$1,766,538	6.960%	$123,000	30	$0	$0	SI	$547,100
Total			**Afiliados(20)**											$47,271,762	$7,917,900			$48,822,667	$1,953,900			$48,420,680	$1,874,700			$48,822,667		$2,425,800		$0	$0		$13,872,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$7,617,900	$0	$0	$7,617,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,710,500	$0	$0	$3,710,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,666,600	$0	$0	$1,666,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,760,800	$0	$0	$1,760,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,425,800	$0	$0	$2,425,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	20	$2,425,800	$0	$0	$2,425,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,874,700	$0	$0	$1,874,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	20	$1,874,700	$0	$0	$1,874,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				20	$1,953,900	$0	$0	$1,953,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$159,400	$0	$0	$159,400
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$486,600	$0	$0	$486,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$170,400	$0	$0	$170,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$310,100	$0	$0	$310,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,700	$0	$0	$70,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$602,400	$0	$0	$602,400
TOTAL				20	$13,872,300	$0	$0	$13,872,300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-13, 03:13:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1084006732

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	25	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P.	IGE	TDE	TTP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1037559383	KAROL YJUANA CELIS OLIVAS	01	00																	0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 2.945.495	$ 471,300	[EPS010] EPS SURA	$ 2.945.495	$ 117,900	6.960	$ 2.945.495	$ 205.120	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.945.495	$ 117,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912,200
CC 1037643571	ALEXANDER CAÑIZARES MANTILLA	01	00											X						0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 2.430.333	$ 389,400	[EPS041] NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.430.333	$ 97,400	6.960	$ 2.430.333	$ 169.420	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.430.333	$ 97,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 753,600
CC 1037764708	JULIAN ANDRES PALACIO CAPACHO	01	00											X						0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 2.320.179	$ 371,300	[EPS005] EPS SANITAS	$ 2.320.179	$ 92,900	6.960	$ 2.320.179	$ 161.520	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.320.179	$ 92,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718,600
CC 1075256300	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 3.050.905	$ 488,200	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 3.050.905	$ 122,100	6.960	$ 3.050.905	$ 212.420	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 3.050.905	$ 122,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944,800
CC 1095810739	DIANA PAOLA VANEGAS PORRAS	01	00	X	X															0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 4.800.000	$ 768,000	[EPS017] FAMISANAR EPS	$ 4.800.000	$ 192,000	0.522	$ 4.800.000	$ 25.120	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 5.000.000	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,185,100
CC 1037304358	SAMUEL FIERRO CAICEDO	01	00																	0	13	13	13	13	[230301] PORVENIR	$ 836.667	$ 133,700	[EPS041] NUEVA EPS S.A. CM	$ 836.667	$ 34,700	6.960	$ 836.667	$ 58.420	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 836.667	$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260,500
CC 1037304358	SAMUEL FIERRO CAICEDO	01	00														X			0	17	17	17	17	[230301] PORVENIR	$ 1.446.031	$ 231,400	[EPS041] NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.446.031	$ 57,900	0.020	$ 1.446.031	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.133.334	$ 45,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334,700
CC 1038661387	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00	X										X						0	17	17	17	17	[230301] PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240,000	[EPS010] EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60,000	0.522	$ 1.500.000	$ 7.820	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.525.833	$ 60,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368,800
CC 1038661387	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00														X			0	3	3	3	3	[230301] PORVENIR	$ 250.000	$ 40,000	[EPS010] EPS SURA	$ 250.000	$ 10,000	0.020	$ 250.000	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 250.000	$ 10,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,000
CC 1038661387	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00														X			0	10	10	10	10	[230301] PORVENIR	$ 833.334	$ 133,400	[EPS010] EPS SURA	$ 833.334	$ 33,400	0.020	$ 833.334	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 833.334	$ 33,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,900
CC 1038660238	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00																	0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280,200	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70,100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.920	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1038661518	CAMILO ANDRES RUEDA CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 4.200.000	$ 672,000	[EPS005] EPS SANITAS	$ 4.200.000	$ 168,000	0.522	$ 4.200.000	$ 22.020	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 4.200.001	$ 168,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,030,000
CC 1038701278	MICHAEL JOSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280,200	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70,100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.920	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1098701790	CARMEN JUDITH ALVARINO POLO	01	00																	0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280,200	[EPS010] EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70,100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.920	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,300
CC 1036703406	RUBEN DARIO DELGADO PALACIO	01	00											X						0	30	30	30	30	[230201] PROTECCION	$ 2.557.860	$ 409,300	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 2.557.860	$ 102,400	6.960	$ 2.557.860	$ 178.120	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.557.863	$ 102,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792,200
CC 1038761931	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400,000	[EPS046] SALUD MIA EPS046	$ 2.500.000	$ 100,000	6.960	$ 2.500.000	$ 174.020	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.003	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774,000
CC 1038756268	KINGIE DANIELA SANTOS NIEVES	01	00																	0	30	30	30	30	[25-14] COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576,000	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$ 3.600.000	$ 144,000	6.960	$ 3.600.000	$ 250.620	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 3.600.003	$ 144,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,114,600
CC 1036802398	JORGE BRITO MENDEZ	01	00											X						0	23	23	23	23	[230201] PROTECCION	$ 1.991.214	$ 318,600	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 1.991.214	$ 79,700	6.960	$ 1.991.214	$ 138.620	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 1.991.214	$ 79,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616,800
CC 1036802398	JORGE BRITO MENDEZ	01	00																	7	7	7	7	7	[230201] PROTECCION	$ 548.030	$ 87,700	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 548.030	$ 22,000	0.020	$ 548.030	$ 0	[CCF40] COMFENALCO SANTANDER	$ 548.030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/08/2026

Empresa NI900688241
DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Planilla Nro: 1084006732

Periodo Cotización: julio de 2026

Periodo Servicio: agosto de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud				Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VDT	IRP	Días AVP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min sterio	Total
CC 1116666826	KAROL MELISSA TARAZONA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(23100?) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1122564432	SERGIO LUIS ESTEBAN GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(23030?) PORVENIR	$ 2.306.454	$ 369.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.306.454	$ 92.300	0,966	$ 2.306.454	$ 160.500	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.306.454	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.200
CC 13544361	WILSON MANTILLA FUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.927.679	$ 468.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.927.679	$ 117.200	0,966	$ 2.927.679	$ 203.600	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.927.679	$ 117.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 906.700
CC 13832051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																	0	30	30	30	30	(23030?) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,966	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 3133245	FERNANDO ARAMBURO PADILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(23100?) COLFONDOS	$ 3.515.895	$ 562.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.515.895	$ 140.700	0,966	$ 3.515.895	$ 244.600	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 3.515.895	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.088.800
CC 91135774	JONATHAN GARCIA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(23030?) PORVENIR	$ 3.050.784	$ 488.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.050.784	$ 122.100	0,966	$ 3.050.784	$ 212.400	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 3.050.784	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944.800
CC 91352168	NELSON ENRIQUE SANTOS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.250.000	$ 90.000	0,966	$ 2.250.000	$ 156.600	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 91357054	DUCAN BUITRAGO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(23030?) PROTECCION	$ 2.669.436	$ 427.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.669.436	$ 106.800	0,966	$ 2.669.436	$ 185.800	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.669.436	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.600
CC 91512241	OSCAR MAURICIO ROJAS PIDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(23030?) PORVENIR	$ 3.954.322	$ 632.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.954.322	$ 158.200	0,966	$ 3.954.322	$ 275.200	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 3.954.322	$ 158.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.224.400
CC 91530713	NELSON JAVIER GARCIA SALMS	01	00										X							0	30	30	30	30	(23030?) PORVENIR	$ 2.752.191	$ 440.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.752.191	$ 110.100	0,966	$ 2.752.191	$ 191.600	(CCF40) COMFENALDO SANTANDER	$ 2.752.191	$ 110.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 68.773.420	$ 68.773.420	$ 68.773.420	$ 68.581.556	$ 11.004.800	$ 2.752.200	$ 3.736.700	$ 2.726.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.220.300	$ 0	$ 20.220.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de con juar 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	LAGOS	CONSORCIO	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94303782	14/08/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$10,412,665	$3,225,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171,500	0		0		0	0	0	0	171,500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	35,100	0		0		0	0	0	0	35,100	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	70,100	0		0		0	0	0	0	70,100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1,666,300	0	0	0	0	0	0		1,666,300	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	725,000				725,000	0	0	725,000			7,250	725,000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200105-1	416,900	0	0	416,900	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	416,900	416,900
Pensión	1	1,666,300	1,666,300
Riesgos Laborales	1	725,000	725,000
CCF	1	416,900	416,900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3,225,100	3,225,100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366099	martinp564@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	LAGOS	CONSORCIO	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94303782	14/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-07	E	$10,412,665	$3,225,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjería	Salario Integral	Extranjero Cédula extranjería	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1048271680	RIVERA VILLALOBOS HUVER DAVID	1	0			S	X															230301	875,453	15	140,100	0	0	0	0	EPS041	875,453	15	35,100	14-11	875,453	15	5	61,000	CCF39	875,453	15	35,100	0	0	0	0	0
2	CC 1095936735	CARDENAS MANTILLA JOHN JAIRO	1	0			S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS002	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF39	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
3	CC 1098600064	GALVIS DURAN DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS042	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF39	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
4	CC 1100956238	CARDENAS MANTILLA DUVAN JESID	1	0			S																230301	2,533,592	30	405,400	0	0	0	0	EPS037	2,533,592	30	101,400	14-11	2,533,592	30	5	175,400	CCF39	2,533,592	30	101,400	0	0	0	0	0
5	CC 13861583	SUAREZ MANRIQUE JUAN PABLO	1	0			S	X															230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	ESSC24	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF39	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 91464275	CARDENAS JOHN RENE	1	0			S																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF39	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS DE INGRESO

En este periodo no se reportan ingreso de personal nuevo.

ANEXO N° 3. DOCUMENTOS DE RETIRO

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL	Código	SST-F-37
		Fecha	22/08/2022
		Versión	2

Bucaramanga, 28 de julio del 2026

Eduar Alonso Reatiga Gonzalez

Cédula de Ciudadanía No. **1.101.597.448**

Almacenista

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA**dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Unisalud Salud Ocupacional ltda.

Dirección: CALLE 51A # 31 - 66 Bucaramanga - Santander

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente el 28 de julio del 2026 .

Melissa Donado Arias

Clara Melissa Donado

Coordinador SST

Contacto:

Edwar Reatiga Gonzalez

1101597448



ANEXO N° 4
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

No se reporta personal rotativo en este periodo.

ANEXO 05.
ACTA DE COPASST

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA No.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA					Mensual	x
31	07	2026	Campamento	08:00 am	10:00 am	10	Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDADYSALUDENEL TRABAJO	x	COMITÉCONVIVENCIA LABORAL		Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificacióndelquórum 2. Revisiónde Acta anterior 3. Incidentes y accidentes de trabajo / Quejas de acoso Laboral / Eventos que involucran el comité 4. Otros 5. Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Edgar Leonardo Gómez Roncancio	
Leonardo Andrés Duarte Rojas	
Invitados	**Firmas**
María Alejandra Sánchez	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se da inicio a la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el grado de cumplimiento de los compromisos pactados: – Se realiza charlas de acuerdo a los temas planteados al plan de capacitaciones – Se realiza inspección de elementos de emergencia (extintores, camilla y botiquín) – Se realiza seguimiento a la inspección de EPP de los trabajadores 3. Seguimiento al plan de formación Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacitó a los miembros del COPASST y a todo el personal en:

- Orden y aseo en el lugar de trabajo
- Técnicas de evacuación y rescate
- Inspecciones de seguridad

5. Inspecciones de lugares de trabajo

Se evidencia la participación del comité en las inspecciones de seguridad: inspección de oficina, inspección locativa de planta, inspección preoperacional de herramienta, inspección de botiquines se evidencia faltantes de elementos, camillas bien, inspección de extintores.

6. Incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales/Análisis de causas

Durante el mes de junio NO se presentaron accidentes de trabajo.

7. Ausentismo

En el mes de julio no se presentó caso de ausentismo ni días de incapacidad.

8. Visitas, auditorías gubernamentales, ARL, clientes, proveedores No se presentaron.

9. Sugerencias, recomendaciones, quejas o reclamos de los trabajadores

Durante el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de los trabajadores en materia de SST, ni se encuentra en proceso ningún proceso entre la empresa y los colaboradores.

10. Propuestas: Simulacro

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento e implementación del plan de capacitaciones para el año 2026	COPASST	julio 2026
Revisión e inspección de elementos de emergencia (botiquín, camilla y extintor)	COPASST	julio 2026

Fecha próxima reunión: Agosto 2026

Firma presidente

Firma secretario

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉS	Código	SST-F-28
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA		Fecha	12/07/2021
		Versión	3
		Página **1** de **2**	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	ACTA NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA	Campamento	8:00 am	10:00 am	**08**	Mensual	x
26	06	2026					Trimestral	
							Extraordinaria	

Señalar con X el Comité a realizar:

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	X	Otro: _____	

En las instalaciones de la empresa, se reunieron los integrantes del Comité para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum 2. Revisión de Acta anterior 3. Quejas de Acoso laboral/ Eventos que involucran el comité 4. Casos no Resueltos 5. Otros Compromisos

Asistentes Comité	Firmas
Edgar Leonardo Gómez	
Andrés Leonardo Duarte	

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del quórum Se procede a tomar asistencia para verificar Quorum y se inicia la reunión al contar con el personal suficiente para la toma de decisiones. 2. Revisión de acta anterior

Se realiza la revisión del acta anterior para dar continuidad a los compromisos y actividades definidas anteriormente.

3. Quejas de Acoso Laboral:

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026 no se evidenciaron reportes de acoso laboral ni quejas de convivencia.

Estadísticas de las quejas del periodo:

- Número de quejas presentadas en el periodo: 0
- Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0
- Número de quejas abiertas al final del periodo: 0
- Número de quejas cerradas en el periodo:0

4. Casos No resueltos:

En el periodo no se presentaron casos no resueltos que deban remitirse a entidades externas.

5. Otros

Siguiendo el cronograma de capacitación, se capacito a los miembros del COCOLA y a todo el personal en:

- Cambio en la Confidencialidad según la nueva normatividad Resolución 3461 de 2025

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Dar cumplimiento y acompañamiento a las actividades programadas	COCOLA	junio 2026

Fecha próxima reunión: Julio 2026

Edgar Leonardo Gómez
Presidente

Andrés Leonardo Duarte
secretario

ANEXO N° 05. MAQUINARIA Y VOLQUETAS



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX140LC

SERIE:
DHKCEBAACJ0007295

MOTOR:
DL06C845591E00

MODELO:
2018

MQ-038
EXCAVADORA
DX140LC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 52080

No DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC089018	DOOSAN	DX140LC	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBAACJ0007295

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DL06C845591E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14000 Kg	2775 m.m	2590 mm	7680 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
21-11-2018	21-11-2018	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352018000474262	26/10/2018



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003382

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1 Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4 Número de formulario
352018000474262-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV: 1 | 14. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: CL 99 69 C 41 | 16. Teléfono: 4239300 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOPSITO S.A. | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0095

29. Número documento de identificación: 66747318 | 30. Apellidos y nombres: ESCOBAR ANDRADE CLAUDIA PATRICIA

31. Clase (reportado por)	32. Tipo declaración	33. Cod	34. No. Formulario Anular	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907008679	2018 - 10 - 26	No. HDGLKRCO0251380	2018 - 08 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cod País Exportador: 160

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-RO, DONG-GU, INCHEON | 50. E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Dpto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve
HXB2018060541	2018 - 06 - 27	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3,088.47

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs	dcms	72. Peso neto kgs	dcms	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms
02	01	190	28,000.00		26,000.00		YY	6	1	U	2.00

78. Valor Fob USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
163,494.56	10,814.78	71.22	60.00	10,936.00	0.00	174,430.56	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Tipo Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	538,723,552	0	0	0
I.V.A.	19.00	538,723,552	102,357,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recaute	0	0	0	0	
		Total	102,357,000		0

91. Descripción de la mercancía: Especifique la descripción de las mercancías a importar con la establecida en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, modelos y referencias si el producto es de fácil reparo o partes del empaque de este formulario

DO 4011000909002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 10284. MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO18039/DO18040 // NACIONALIZACION: DO18039/DO18040 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION //. PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX140LC, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCBAAVJ0307295, SERIAL MOTOR: DL06C845592E00 , COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DESCRIPCION SEGÚN FACTURA: MODEL DX140LC (EX10) EXCAVATOR ELECTRONIC TIER-2 ENGINE (DOOSAN) 4,6M, BOOM, A-KIT, 2.5M, ARM 0.6M, CLASS BKT // INFORMACION INSPECCION PREVIA: DOOSAN INFRACORE CO., LTD // INFORMACION CUCHARA: DOOSAN No. 230104-02466 // XODEL(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352018000474262
133. Fecha: 2018 10 26

134. Levante No. 352018000368552 | 135. Fecha: 2018 - 10 - 26 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre / 137. C.C. No: LUIS A. MORA C.C. 80.160.040

Firma declarante

alpopular Logística Integral AGENCIA DE ADUANA NIVEL 1 RESOLUCIÓN 0095

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996 Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92351810709251
Fecha presentación 2018-10-26 11:24:56
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2018-10-26 11:20:35

20181624138270

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352018000474262-6**
Subpartida : **8429520000**

105 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, señales y otros)

O: H2H14M1042 // SERIAL: DH10E146 // CAPACIDAD 0.60 M3 / 0.79 Y D3 WIDTH:1042.00 MM / 41.02 INCH // PESO:534.00 KG / 1177.27 IB / / INFORMACION BRAZO#1. DOOSAN // 230211-00085M // 4.6M // INFORMACION BRAZO #2. DOOSAN // 230204-0033IE // 2.5 M // PAIS ORIGEN: COREA DEL SUP, REPUBLICA DE -190. CANT (1) U // PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX140LC, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCEBAACJ0007296, SERIAL MOTOR: DL06G5455915O0. COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DESCRIECION SEGÚN FACTURA : MODEL DX140LC (EX10) EXCAVATOR ELECTRONIC TIER-Z ENGINE (DOOSAN) 4.6M, BOOK, A-KIT, 2.5M, ARM 0.6M, CLASS BKT // INFORMACION IN SERCCION BREVIA: DOOSAN INFRACORE CO., LTD // INFORMACION CUCHARA: DOOSAN No.230104-02466// MODELO: H2H14M1042// SERIAL: DH10E146 // CAPACIDAD:0.60 M3 / 0.79 Y D3 // WIDTH: 1042.00 MM // 41.02 INCH // PESO: 534.00 KG / 1177.27 IB // INFORMACION BRAZO#1: DOOSAN 230211-00085M: 4.6 M // INFORMACION BRAZO #2: 230204-0033IE / 2.5 M // INCLUYE DOS CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO// PAIS ORIGEN: COREA DEL SUP, REPUBLICA DE - 190. CANT (1) U //XXXX



MQ-039
VIBROCOMPACTADOR CB2.7

MARCA:
CATERPILLAR

TIPO:
VIBROCOMPACTADOR CB2.7

SERIE:
0R5200273

MOTOR:
CMY06808

MODELO:
2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 54054

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC092428	CATERPILLAR	CB2.7	2017

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	CAT0CB27TR5200273

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CMY06808	CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2362 Kg	2700 mm	1312 mm	2575 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
28-01-2019	28-01-2019	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482019000044944	17/01/2019



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003412

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482019000044944-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055544	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
802000764	8	AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL 1	26	0210

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
49606130	CORREA ALBA PEGGY PATRICIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918404609	2019 - 01 - 15	No. MSCUVW062714	2017 - 12 - 15

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
CATERPILLAR AMERICAS C.V	GENEVA	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
BOITE POSTALE 6000 CH-1211	rojas_steve@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
ZQXS 101023	2017 - 11 - 27	918	1	580	25	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3,136.49

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	2,362.50	2,362.50	PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
30,710.22	1,477.68

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
25.85	77.50

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,581.03	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
32,291.25	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 101,281,183	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 101,281,183	99 19,243,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 19,243,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

001 MSCUVW062714 007 ZFEQ 001/001. NOS ACOGEMOS AL DTO.925 DE 9 MAYO/2013. MERCANCIA NUEVA. PRODUCTO: COMPACTADOR DE SUELOS VIBRATORIOS. MARCA:CATERPILLAR. MODELO:CB2.7. USO O DESTINO: CONSTRUCCION. REFERENCIA:484-9414. SERIAL PRINCIPAL:CAT0CB27TR5200273. SERIAL MOTOR: CMY06808. MODELO MOTOR: C1.5. MANIFIESTO DE CARGA NUMERO: 116575008484489 FECHA: 2017-12-18. FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA: 918353157 FECHA: 26-12-2017. ORDEN NUMERO: PA000413. NACIONALIZACION PARCIAL EL NUMERO: MSCUVW062714. CANTIDAD (00001) Or:IT. XXXXXXXXXXXXXX



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX140LC

SERIE:
CEBAA-006876

MOTOR:
DL06C424373E00

MODELO:
2015

MQ-002
EXCAVADORA DX140LC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 9983

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC031935	DOOSAN	DX140LC	2015

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	CEBAA 008876

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DL08C424373E00	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14000 Kg	2775 mm	2590 mm	7690 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-02-2016	10-02-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352015000183045	08/06/2015



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000002438

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2015**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352015000183045-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047657 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AV EL DORADO 78 20 | 14. Teléfono: 4238300 | 12. Cód. Admón.: 35 | 10. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 835000088 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS NHORA GARCIA DIAZGRANADOS COMPAÑIA LTDA N | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cod. usuario: 479

29. Número documento de identificación: 55732549 | 30. Apellidos y nombres: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

31. Clase importación	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907000027	2015 - 06 - 06	No. KR1532101	2015 - 04 - 29

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cod País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJOONG-RO,DONG-GU, INCHEON,KOREA | 50. E-mail: yuri1.lee@doosan.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Cvs.
HXB2015040270	2015 - 04 - 29	190	1	472	11	NAVES S.A.	2,549.87

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C236	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Guapandias	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comercial
02	01	190	28,000.00	28,000.00	PC	2	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
154,674.00	13,492.70

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
33.30	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
13,526.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o tramite	86. Número
168,200.00	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	428,904,954	0	0	0
I.V.A.	16.00	428,904,954	68,625,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recaito	0	0	0	0	
		Total	68,625,000		0

91. Descripción de las mercancías (No utilice la descripción de las mercancías a importar con Posición(es) en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y otras características comerciales. Continúe al respaldo si este formulario)

DO. 5486-B-15. MN. MORNING POST, PEDIDO. DO15007-DO15008. ARANCEL 0% DECONFORMIDAD CON EL DECRETO 1755 DE AGOSTO 15 DE 2013 . PRODUCTO: EXCAVADORA MARCA: DOOSAN, SIN REFERENCIA, MODELO: DX140LC, CON MOTOR MARCA DOOSAN, DIESEL, MODELO DL06C, 900 DE 6 .6M, BRAZO DE 2.5M, CUCHARON DE 0.6 M3, ZAPATAS DE 600MM, AÑO DE FABRICACION, 2.015, USO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CHAR TERRAS Y MINERIA DESTINO: IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON AUTORIZACION, CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA S U NORMAL FUNCIONAMIENTO.SERIAL, CEBAA-006876, MOTOR. DL06C424373E00, CHASIS, DHKCEBAAKE0006876, COLOR. NARANJA. SERIAL, CEBA A-006944, MOTOR. DL06C525421E00, CHASIS. DHKCEBAAKF0006944, COLOR. NARANJA. INFORMACION SEGÚN RECONOCIMI (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anticipados: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352015000183045. 133. Fecha: 2015 06 06

134. Levante No. 362015000152080	135. Fecha: 2015 - 06 - 06	Firma funcionario responsable	136. Nombre: Limbania Miranda Minota. 137. C.C. No.: C.C. 66.732.549

Firma declarante

Nit. 835.000.088-7 Res. 0006378 de Jun. 17-2009 - Código 479 Agencia de Aduanas Nhora Garcia Diazgranados Cia. Ltda. Nivel 2

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01911010508788
Fecha presentación 2015-06-06 14:38:00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2015-06-06 15:40:28

20150819778469

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352015000183045-2
Subpartida : 8429520000

Item Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

1.DATOS EN ETIQUETA DEL MOTOR DE LAS EXCAVADORAS,MARCA : DOOSAN,MODEL : DL06C,SERIALES NO : 424373 / 525421,OPTION : [illegible]
2.DATOS EN PLAQUETA DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA,MARCA : DOOSAN, DOOSAN INFRACORE,DUTY DIESEL MODEL : DL06C,ENGINE DISPLACEMENT : 5
,89 / 5,890L CM3 - COMPRESSION RATIO : 17.4:1POWER RATING : 74 KW / (100 PS) / 1850 RPM,INJECTION TIME : BTDC 10 - TDC OF FUEL
,VALVE CLEARANCE : INTAKE / EXHAUST = 0.3 / 0.4 MM (COLD),ENGINE RPM - LOW IDLE SPEED / HIGH IDLE SPEED : 800 / 1950 - / -
RPM,DIESEL ENGINE : 950209-03575,EC TYPE APPROVAL NO : e4*97/68EA*2002/88*0143*01,DATOS EN PLAQUETA DE LA CUCHARA DE LA EXCAVA
RA,MARCA : DOOSAN,MODEL : R2H14W1000,DOOSAN NO : 230104-01862A ,SERIALES : DH15C167 / DH15C270 ,CAPACITY M3/YD3 : 0.60 / 0.78,W
IDTH MM / INCH : 1000.00 / 39.37,WEIGHT KG / LB : 510.32 / 1125.05,DOOSAN INFRACORE CO LTD / 7-11, HWASU-DONG, DONG-GU, INCHEO
, KOREA / MADE IN KOREA,PART NO : 950209-04791,DATOS PRINCIPALES EN LAS EXCAVADORASNUMERO EN EL MECANISMO DEL BRAZO : DHKCEBAARF
006876, DHKCEBAARF0006944,NUMERO EN LA CUCHARA : DH15C167 06, DH15C270 06XXXX

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-12-2024	03-12-2024	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	882024000025643	01/04/2024



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM03000006911

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 141608

NO. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC710501	DEVELON	DX140LCA	2024
TIPO DE MAQUINARIA	**CLASE**	**NO. SERIE**	
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DXCCEBCUKR002042	
COLOR(ES)	**NO. MOTOR**	**RODAJE**	
NARANJA	DB58TIS350275E00	ORUGAS	

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
14570 Kg	3095 mm	2690 mm	7690 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONSORCIO CAUCE

IDENTIFICACIÓN
NIT 901 555 581

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFD114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRAJE: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD (KPB): 6050
NÚMERO DE MOTOR: 69906243
REG: N
VIN: LVBDHPES9HN005000
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES9HN005000
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES9HN005000
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINOBRAS DELCOLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900949507

REDUCCIÓN MOVILIDAD:
CILINDRAJE: ******
POTENCIA HP: 141
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352016000146112
DE: FECHA IMPORT.: 10/05/2016
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT02003920796

ANEXO N° 7
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-
		Fecha	9/10/20
		Versión	1
		Página	1 de

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andrés Duarte R	CÉDULA	1095839883	CARGO	Almacenista
EQUIPO	1	CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aeropuertos

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	27	11	25	Andrés Duarte R	Andrés
Gafas Negras	1	29	11	25	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes vaqueta	1	12	12	25	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	12	12	25	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes Nitrilo	1	28	01	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	25	01	26	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes Nitrilo	1	09	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	09	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	15	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	23	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes vaqueta	1	29	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	29	04	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	01	05	26	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes Nitrilo	1	19	05	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	01	06	26	Andrés Duarte R	Andrés
Tapa Bocas	1	04	06	26	Andrés Duarte R	Andrés
Guantes vaqueta	1	16	06	26	Andrés Duarte R	Andrés
Gafas Negras	1	22	06	26	Andrés Duarte R	Andrés

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Fabian Ramirez	CÉDULA		CARGO	Ayudante de obra
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Arrayanes 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Casco Amarillo	1	03	02	26	FBR	Anuar
Guantes vaqueta	1	03	02	26	FBR	Anuar
Gafas Claras	1	03	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	09	02	26	FBR	Anuar
Guantes Vaqueta	1	10	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	18	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	19	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	20	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	23	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	24	02	26	FBR	Anuar
Tapa Bocas	1	24	03	26	[illegible]	Anuar
Tapa Bocas	1	25	03	26	[illegible]	Anuar
Tapa Bocas	1	26	03	26	[illegible]	Anuar
Gafas claras	1	26	03	26	[illegible]	Anuar
Guantes Vaqueta	1	22	06	26	FBR	Anuar
Bota Plastica P. Acero	1	23	06	26	FBR	[illegible]

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jose Silva	CÉDULA	1051357047	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Anagores

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes vaqueta	1	09	04	26	Jose silva	Ayudante
Bota material Rato Acero	1	13	04	26	Jose Silva	Ayudante
Gafas Negro	1	14	04	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	24	04	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	04	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	06	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	07	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	08	05	26	Jose Silva	Ayudante
Guantes Nitrilo	1	22	05	26	Jose Silva	Ayudante
Gafas Claras	1	25	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	25	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	26	05	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	22	06	26	Jose Silva	Ayudante
Tapa Boca	1	23	06	26	Jose Silva	Ayudante
Bota Plastica P. Acero	1	23	06	26	Jose Silva	Ayudante
Guantes Vaqueta	1	26	06	26	Jose Silva	Ayudante

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonatan villamizar	CÉDULA	1234 339663	CARGO	A. Perforación
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aragonas 2

II. INSTRUCCIONES

. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.

. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará n proceso disciplinario.

. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

cepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas Negras	1	23	02	26	Jonatan	
Tapa Bocas	11	23	02	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	09	03	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	10	03	26	Jonatan	
Gafas vaqueta	1	31	03	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	06	04	26	Jonatan	
Gafas vaqueta	1	03	04	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	18	04	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	29	04	26	Jonatan	
Gafas vaqueta	1	29	05	26	Jonatan	
Gafas Negras	1	02	06	26	Jonatan	
Tapa Bocas	1	03	06	26	Jonatan	
Gafas vaqueta	1	05	06	26	Jonatan	
Bota Plastica P. Acero	1	24	06	26	Jonathan	
Gafas vaqueta	1	26	06	26	Jonathan	

Powered by CamScanner

INFRACORP Ingeniería y Construcción	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jireth Lizarazo	CÉDULA	1099940291	CARGO	Operador
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Arroyones

II. INSTRUCCIONES

Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en INFRACORP INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN.

El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.

NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará n proceso disciplinario.

En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

cepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	29	11	25		
Gafas Acetas	1	29	11	25		
Guantes vaqueta	1	09	12	23		
Tapa oidos insercion	1	18	12	25		
Tapa oidos copa	1	18	12	25		
Guantes Nitrilo	1	19	01	26		
Tapa Bocas	1	19	01	26		
Tapa Bocas	1	20	01	26		
Guantes Nitrilo	1	17	02	26		
Tapa Bocas	1	17	02	26		
Tapa Bocas	1	23	02	26		
Guantes Nitrilo	1	24	02	26		
Guantes Nitrilo	1	17	03	26		
Tapa Bocas	1	25	03	26		
Tapa Bocas	1	09	04	26		
Guantes Vaqueta	1	23	04	26		
Tapa Bocas	1	23	04	26		
Tapa Bocas	1	27	04	26		
Tapa Bocas	1	02	05	26		
Guantes nitrilo	1	02	05	26		
Tapa Bocas	1	08	05	26		
Tapa Bocas	1	23	06	26		
Guantes Nitrilo	1	23	06	26		
Bota Plastica P.Acero	1	23	06	26		
Gafas Acetas	1	23	06	26		

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jolman Garcia	CÉDULA		CARGO	A. Perforación
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Aireyanas 2

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en DISPOSICION FINAL
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Nitrilo	1	16	01	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	17	01	26	Jolman G V	
Gafas claras	1	20	02	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	20	02	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	23	02	26	Jolman G V	
Botas Plasticas (talla 30)	1	26	03	26	Jolman G V	
Guante Nitrilo	1	24	04	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	24	04	26	Jolman G V	
Guante Nitrilo	1	03	06	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	03	06	26	Jolman G V	
Tapa Boca	1	12	06	26	Jolman G V	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jose Alirio	ID	5778254	CARGO	oficial
PROYECTO	Est. Floridablanco Arroyones 5				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	ANO		
Guantes vaqueta	1	26	11	25	Jose Valenco	
Gafas Negras	1	26	11	25	Jose Valenco	
Guantes Nitrilo	1	12	12	25	Jose Valencia	
Tapa Bocas	1	16	01	26	Jose Valencia	
Tapa Bocas	1	17	01	26	Jose Valencia	
Tapa Bocas	1	19	01	26	Jose Valencia	
Tapa Bocas	1	20	01	26	Jose Valencia	
Guantes vaqueta	1	16	06	26	Jose Valenco	
Guantes Nitrilo	1	16	06	26	Jose Valenco	
Tapa Bocas	1	23	06	26	Jose Valenco	
Bob Plastica P. Acero	1	23	06	26	Jose Valenco	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SE
		Fecha	25/1
		Versión	
		Página	1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Wilson mendez	ID		CARGO	Ayudante
PROYECTO	Aeropuerto 2				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapa Bocas	1	01	06	26	Wilson	Ayudante
Tapa Bocas	1	02	06	26	Wilson	Ayudante
Tapa Bocas	1	03	06	26	Wilson	Ayudante
Guantes Vaqueta	1	03	06	26	Wilson	Ayudante
Gafas Negras	1	12	06	26	Wilson	Ayudante
Tapa Bocas	1	12	06	26	Wilson	Ayudante

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Elías Realiza	ID		CARGO	A Perforación II
PROYECTO	Antenares 2				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
G. Vaqueta	1	01	06	26	Elías	
Tapa Boca	1	01	06	26	Elías	
Tapa Boca	1	03	06	26	Elías	
Tapa Boca	1	12	06	26	Elías	
G. Vaqueta	1	22	06	26	Elías	
Gafas Negras	1	22	06	26	Elías	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Ivan Castilla	ID		CARGO	Ayudante de obra
PROYECTO	Anolanes L				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
G. vaqueta	1	02	06	26	IVAN CASTILLA	Ayudante
Tapa Bocas	1	02	06	26	IVAN CASTILLA	Ayudante
Tapa Bocas	1	03	06	26	IVAN CASTILLA	Ayudante
Tapa oido Inserción	1	12	06	26	IVAN CASTILLA	Ayudante
Gafas Negras	1	22	06	26	IVAN CASTILLA	Ayudante

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Andres Cuellar	ID	1098641773	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Conservo Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante baqueta	1	19	04	26	Andres Cuellar	
Tapabocas	1	17	04	26	Andres Cuellar	
Tapabocas	1	22	04	26	Andres Cuellar	
Gafas de Poliestar	1	24	04	26	Andres Cuellar.	
Guante Vaqueta	1	23	05	26	Andres Cuellar.	
Bota Amarilla	1	29	05	26	Andres Cuellar	
Guante Vaqueta	1	24	06	26	Andres Cuellar.	
Guante Vaqueta	1	11	07	26	Andres Cuellar	
Gafas Negras	1	22	07	26	Andres Cuellar	
Guante vaqueta	1	26	08	26	Andres Cuellar	
Guante vaqueta	1	07	09	26	Andres Cuellar	

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Molino	ID	91530925	CARGO	
PROYECTO	Consorcio Estabilizador Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DÍA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Tapabocas	2	02	06	26	Carlos	
Gafas negras	1	02	06	26	Carlos	
Guantes Vaqueta	1	02	06	26	Carlos	
Gafas Amarillas	1	24	06	26	Carlos Arturo	
Gafas negra	1	29	06	26	Carlos Arturo	
Gafas negras	1	10	08	26	Carlos Arturo	

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Edwin Rodriguez	ID	1102597448	CARGO	Almacenista
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas negras	1	14	03	26	Edwin Rodriguez	
Guantes Poliuretano	1	04	04	26	Edwin Rodriguez	
Guantes Poliuretano	1	06	06	26	Edwin Rodriguez	
Gafas negras	1	22	06	26	Edwin Rodriguez	
Botas Amarillas	1	23	06	26	Edwin Rodriguez	

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Fabian Ramirez	ID	1.098716865	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante de Vaqueta	1	13	04	26		
Guante de Poliuretano	1	14	04	26		
Guante vaqueta	1	24	05	26		
Bota Pantalla	1	24	06	26		
Guante vaqueta	1	09	09	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Hugo Diaz	ID	1099371577	CARGO	Almacenista
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas negras	1	18	06	26		
Guante Poliuretano	1	24	06	26		
Botas Amarillas	1	24	06	26		
Guante vaqueta	1	19	08	26		
Gafas seguridad	1	19	08	26		
Guante Poliuretano	1	01	09	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Ivan Castilla	ID	1003239317	CARGO	Ay. Obra
PROYECTO					

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINORRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DIA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Guante vaqueta	1	3	8	26	Ivan Castilla	
Gafas de seguridad	1	23	8	26	Ivan Castilla	
Guante vaqueta	1	27	8	26	Ivan Castilla	

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jire Lizarazo	ID	1090940791	CARGO	operador
PROYECTO					

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas Negras	1	18	08	26		
Guante nitrilo.	1	25	08	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jhonatan Medina	ID	1095831892	CARGO	
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas Negras	1	01	06	26	Jhonatan M.	
Guantes Policlotano	1	01	06	26	Jhonatan M.	
Tapavocas	2	01	06	26	Jhonatan M.	
Tapavocas	2	04	06	26	Jhonatan M.	
Bota Amarillas	1	24	06	26	Jhonatan M.	
Gafas negras	1	24	06	26	Jhonatan M.	
Guantes nitrilo	1.	21	07	26	Jhonatan M..	
Gafas oscuras	1	18	08	26	Jhonatan M.	
Guante nitrilo	1	26	08	26	Jhonatan M.	

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jolman Garcia	ID	1.101.019.874	CARGO	Ay. Perforacion
PROYECTO					

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas oscuras	1	03	08	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jonathan Villamizar	ID	1234334663	CARGO	Ay. Obra
PROYECTO	Santana				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas de seguridad	1	11	8	26	Jonathan	
Gafas de seguridad	1	26	8	26	Jonathan	
Guante de nitrilo	1	27	8	26	Jonathan.	
Guante vaqueta	1	07	09	26	Jonathan.	

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-17
Fecha	9/10/2020
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jorge Herrera	CÉDULA	1.095.835.307	CARGO	Ayudante de Obra.
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Santa Ana

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.

q

3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas de seguridad	1	23	08	26	Jorge Herrera	
Guante vaqueta	1	28	08	26	Jorge Herrera	
Guante vaqueta	1	7	09	26	Jorge Herrera	

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR










NOMBRE	Luis Ernesto Banda	ID	88203788	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante de baqueta	1	03	04	26		
Guante de poliuretano	1	15	05	26		
Gafas negras	1	12	05	26		
Guantes de Poliester	1	27	05	26		
Gafas Negras	1	27	05	26		
Gafas Amarillas	1	24	06	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Mayra Alejandra bdeño	ID	1117497371	CARGO	Oficios varios
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco Amarillo	1	14	04	26		
Guantes de poliestileno	1	14	04	26		
Gafas negras	1	14	04	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR





NOMBRE	Olger Sepulveda	ID	1.098 640.001	CARGO	Op Inyección
PROYECTO					

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Gafas oscuras	1	12	08	26		
Guantes nitrilo	1	18	08	26		
Gafas claras	1	28	08	26		

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST F-17
		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	wilson Mendie	ID	91160320	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Consorcio Estabilizacion Floridablanca				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN


ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guante de nitrilo	1	10	06	26	wilson	
Guante de nitrilo	1	15	06	26	wilson	
Gafas negras	1	1	06	26	wilson	
Gafas oscuras	1	19	08	26	wilson	
Guante vaqueta	1	26	08	26	wilson	

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S.

AÑO . 2025

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

No.	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP									N/R	FIRMA RECIBIDO
				BOTAS	CASCO	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	PANTALON	CAMISA	PROTECTOR AUDITIVO			
				LAGOS										
	05/05/2025	John Fern Cardenas	Ayudante			x								
	05/05/2025	Jhon Carlos	Ayudante			x								
	05/05/2025	Duvan Cardenas	Oficial			x								
	05/05/2025	Hiwer Rivera	Ayudante			x								Hiwer Rivera
	05/05/2025	Diego Gallis	Ayudante			x								DIEGO
	05/05/2025	Julio Tejos	Ayudante			x								Julio Tejos

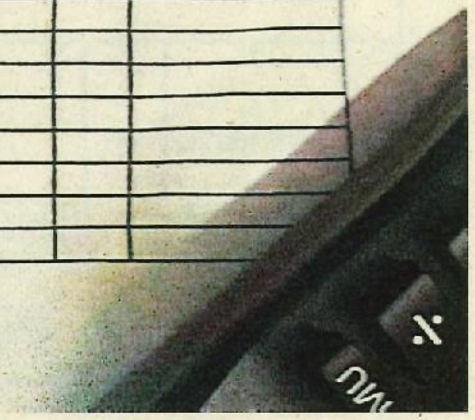

Powered by CamScanner

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S.

ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

AÑO . 2025

No.	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP									N/R	FIRMA RECIBIDO
				BOTAS	CASCO	GUANTES	TAPABOCAS	GAFAS	PANTALON	CAMISA	PROTECTOR AUDITIVO			
			la 90 ≤											
24	07-26	John Jairo Cardenas	Ayudante			1		1	1	1				
24	07-26	Juan Pablo Suarez	Ayudante			1		1	1	1				
24	07-24	Diego cardenas	Ayudante			1		1	1	1				
24	07-24	Rene cardenas	Ayudante			1		1	1	1				
24	07-24	Julian cardenas	Contratista			1		1	1	1				
24	07-24	Josue Celis	oficial								1			
24	07-24	Freddy cañas	Ayudantes								1			
24	07-24													

Powered by CamScanner

ANEXO N° 8
CAPACITACIONES

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☒

OBRA: Contrato Estabilizacion Floridablanca.

TEMA DE CAPACITACIÓN Reglamento Interno.

LUGAR: Contrato Est. Floridablanca. FECHA 09 Julio 2026

CAPACITADOR Melissa Dorado. DURACIÓN 40 Min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Josc. Nesilva Romero	1051357042	ayudante	
2	Alexander Prada	13537319	Oficial	
3	Alberto Manjarres	1015206118	Jefe Perforo II	
4	Pedro Pablo Ramirez	1095855883	Auxiliar Contable	
5	Andres Fab Cuellar H.	1098419178	ayud.	
6	Duvan Bautista	91359014	operador	
7	Mauricio A. Becerra	1063562211	OPERADOR.	
8	Fabian Ramirez.	1098318865.	Ayudante.	
9	Wilson Mendez Ben	91160722	Ayudante	
10	Anny Lucia Vargas	1003451774	OF varios.	
11	Juan Pablo Suarez.	1136161588	oficial	
12	Delis Echenique	50733150	oficial	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA: CON. Estab. Floriedana.

TEMA DE CAPACITACIÓN Políticas 2026.

LUGAR: Contrato estabilización Floriedy. FECHA 16 de Octubre 2026.

CAPACITADOR Melissa Posada DURACIÓN 40 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andry Dick R	1093839888	Almacenista	Andry
2	Fabian Damian	1098718865	Ayudante	
3	Jhon Tarazo	1099911201	Operario	
4	Wilson mendis Pen	91160129	Ayudante	Wilson
5	Camilo Javier Davila	1067026176	Ayudante	
6	Cesar Alberto Contreras	91521079	Topografo	
7	Julio Mayes	1098348614	Ayudante	
8	Deibys Echeverria	5873350	Of.	
9	Duvan Cardenas	1003896126	Oficial	
10	John Jairo Cardenas	91464275	OF.	
11	Hover David Rivero V	1048211660	Ayudante	Hover R
12	Andres felo castillo M	1082699123	Ayudante	Andres Castillo
13	Jair Pablo Suarez	1896588	oficial	
14	Anny Lizeth Vargas	1005151774	OF varios.	Anny Vargas
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
Melissa Posada

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☑

OBRA: Consorcio Estabilización Floridablanca.

TEMA DE CAPACITACIÓN Etapas de seguridad

LUGAR Floridablanca. FECHA 19 Octubre 2016.

CAPACITADOR Melissa Ordoñez. DURACIÓN

NO.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Morales	1049 940 791	Operador	
2	Emilio Monsalve	13.542.493	Ayudante	EMIRO
3	Andrés David Reyes	1095 839 883	Almacenista	
4	Olger Eduardo Pena	1098410.002	operador	
5	Ivan Dario Cortes	1003239314	Ayudante	Ivan Cortes
6	Vladimir Celis Duarte	1.732.398.357	Ayudante	Vladimir
7	Elias Realpe	91459128	ayudante	
8	Wilson morales	91160320	ayudante	Wilson
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

ANEXO N° 11
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

CAPACITACIONES SST

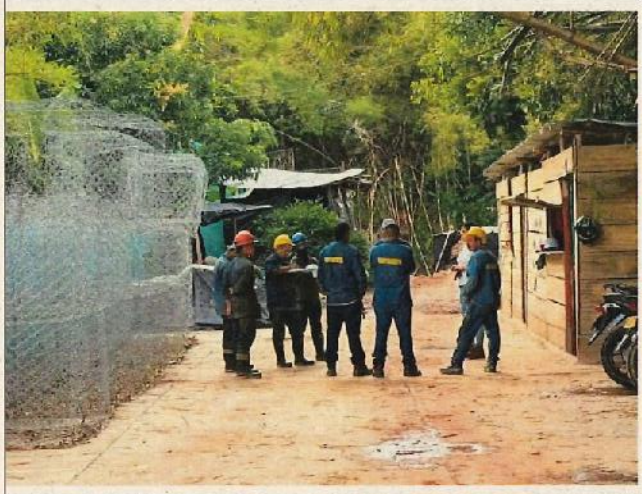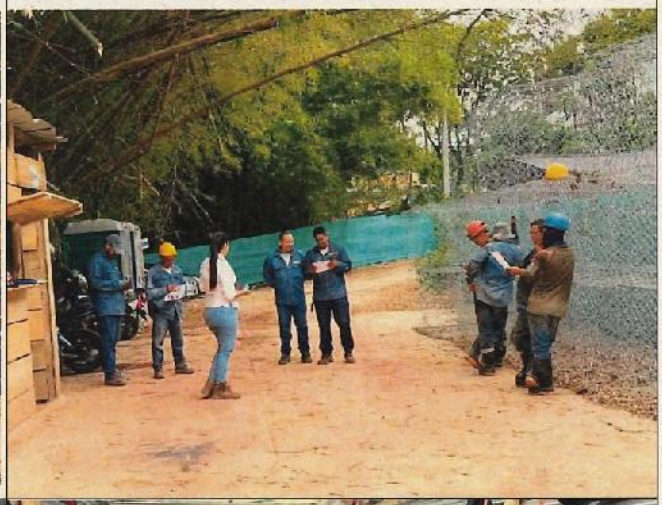

ORDEN Y ASEO





CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB



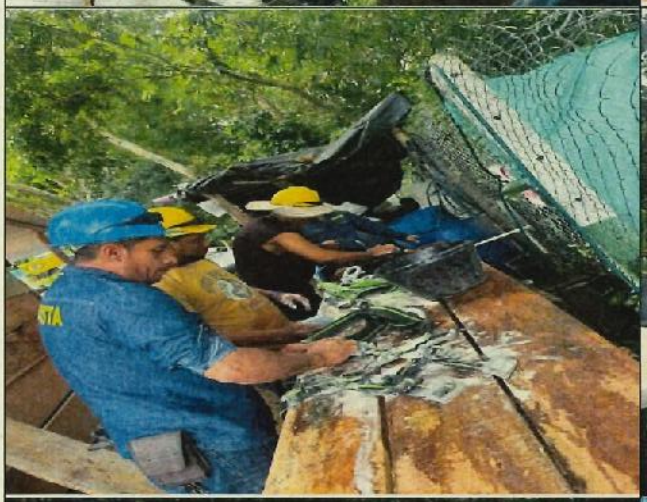







CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA


INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB

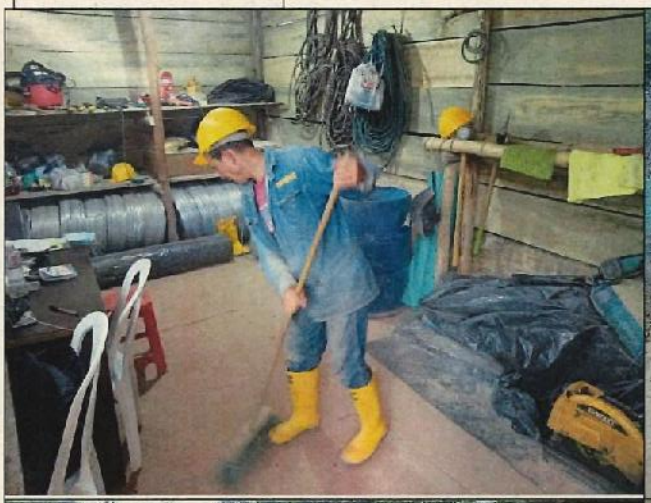


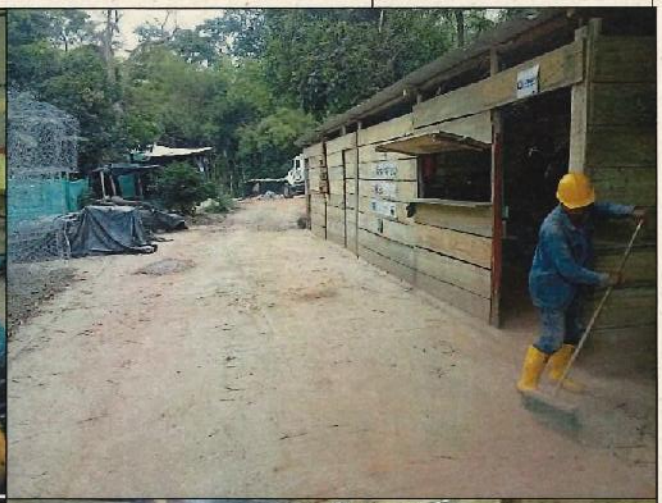

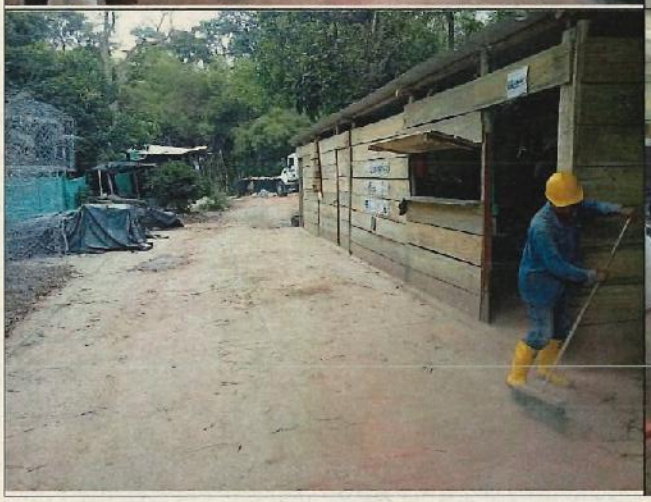

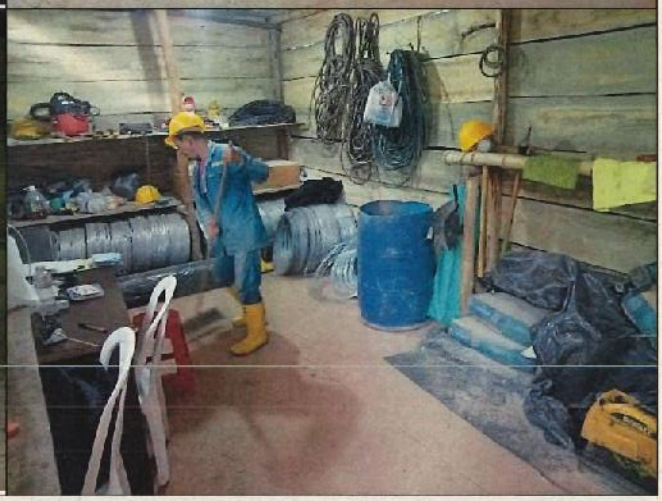



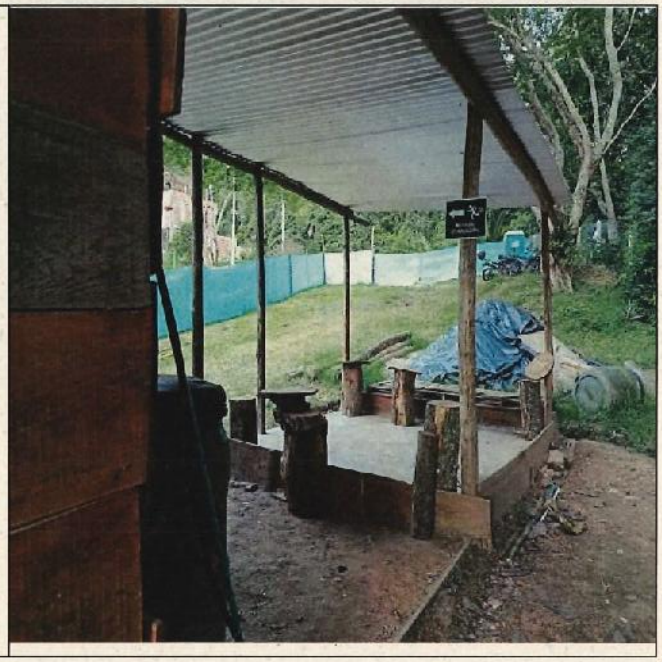

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN FLORIDABLANCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB

ELEMENTOS DE EMERGENCIA






ENTREGA DE EPP







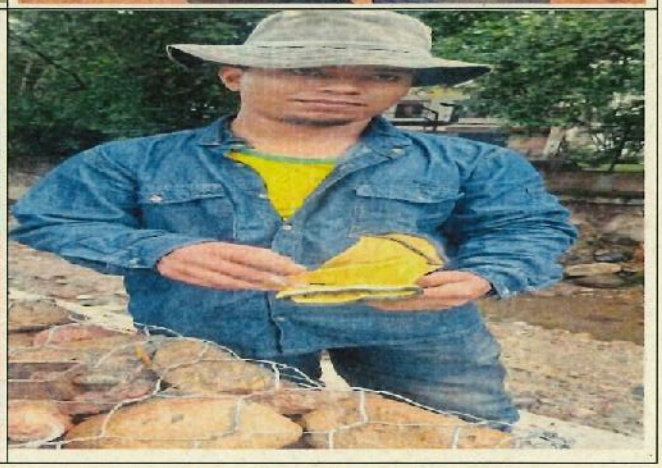

CONSORCIO ESTABILIZACION FLORIDABLANCA

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CDMB



