PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA
No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato establecido electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.** **NIT.** 844.004.197-2
CONTRATISTA:	**INGENIERIA CIVILCAS S.A.S** **NIT. No.** 900.958.996-7
OBJETO:	**LOTE 10.** ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
VALOR:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL** **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($481.358.266,00)** Moneda Legal Colombiana
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA SIGUIENTE FORMA: A) HASTA UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE PAGO DE ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INTERVENTORÍA Y CONSTANCIA DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR). B) UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, COMO PAGO FINAL, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, ENTREGA FINAL DE LA OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR). PARAGRAFO PRIMERO: LAS FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PAGO DEBEN SER EXPEDIDAS DIRECTAMENTE POR LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y NO POR CADA UNO O ALGUNO DE SUS INTEGRANTES. PARAGRAFO SEGUNDO: PARA EL TRÁMITE DE PAGOS PARCIALES Y FINALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA PAPS O CAPS (SEGÚN APLIQUE), CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I)TODA SOLICITUD DE PAGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE ACTAS PARCIALES O FINALES QUE DISCRIMINEN DE FORMA CLARA Y DETALLADA LOS CAPÍTULOS E ÍTEMS CORRESPONDIENTES EXCLUSIVAMENTE A LAS

	CANTIDADES CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADAS EN CADA PUESTO DE SALUD. EN DICHAS ACTAS SE DEBERÁ REFLEJAR, CAPÍTULO POR CAPÍTULO, EL AVANCE LOGRADO RESPECTO AL TOTAL CONTRATADO, ESPECIFICANDO VALORES, CANTIDADES EJECUTADAS Y SALDOS PENDIENTES, SIN ALTERAR NI MODIFICAR LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA OFERTA ECONÓMICA NI EN EL PRESUPUESTO APROBADO DEL RESPECTIVO PROYECTO; II) QUEDA PROHIBIDO CONSOLIDAR, MEZCLAR O TRANSFERIR CANTIDADES EJECUTADAS ENTRE LOS DIFERENTES PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. CADA ACTA Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES (TABLAS, SÁBANAS DE CANTIDADES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, DIARIOS DE OBRA, CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y DEMÁS EVIDENCIA TÉCNICA Y/O LEGAL DE EJECUCIÓN) DEBERÁN SER ELABORADOS Y PRESENTADOS DE FORMA SEPARADA E IDENTIFICABLE POR CADA PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. NO SE ACEPTARÁN SOPORTES GENÉRICOS, GLOBALES O QUE CONTENGAN INFORMACIÓN CRUZADA ENTRE DIFERENTES PROYECTOS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA; III). CADA DOCUMENTO SOPORTE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD RESPECTIVO, Y CONTENER LOS DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO APROBADO, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA EXACTA CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE. LAS CANTIDADES RECLAMADAS PARA PAGO DEBEN CORRESPONDER EXACTAMENTE A LO EJECUTADO, Y ESTAR SOPORTADAS EN LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS Y CUALQUIER OTRA EVIDENCIA REQUERIDA, TODO ELLO DISCRIMINADO POR CAPÍTULO E ÍTEM PARA EL RESPECTIVO PUESTO DE SALUD; IV). LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO SERÁ LA ENCARGADA DE VERIFICAR, REVISAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS PARA CADA PAGO. SÓLO SERÁN OBJETO DE RECONOCIMIENTO AQUELLOS AVANCES Y CANTIDADES EJECUTADAS QUE HAYAN SIDO APROBADOS Y CERTIFICADOS INDIVIDUALMENTE PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CORRESPONDIENTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER REQUERIMIENTO, OBSERVACIÓN O SUBSANACIÓN QUE LA INTERVENTORÍA ESTIME NECESARIA PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ E INTEGRIDAD DE LOS SOPORTES DE PAGO; V). EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS, LA FALTA DE DISCRIMINACIÓN, LA MEZCLA DE CANTIDADES O LA AUSENCIA DE CLARIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AVANCES

PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA
No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

	POR PUESTO DE SALUD ORIGINARÁ LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL ACTA PARCIAL O FINAL. PARÁGRAFO TERCERO: EN LO RELACIONADO CON LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS, INSUMOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL COMPONENTE ELÉCTRICO, ASÍ COMO A CUALQUIER OTRO SUMINISTRO O INSTALACIÓN TÉCNICA QUE REQUIERA PARA SU LEGALIZACIÓN LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN RETIE, SE ESTIPULA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO QUE NO HABRÁ LUGAR A PAGO ALGUNO SOBRE DICHOS CONCEPTOS MIENTRAS NO SE ACREDITE ANTE LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA VÁLIDAMENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE SOLO UNA VEZ ESTE EN PODER DE LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RETIE Y ESTA SEA EVALUADA FAVORABLEMENTE, SE AUTORIZARÁ Y PROCEDERÁ EL PAGO ÍNTEGRO DE LOS VALORES RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO O TÉCNICO, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA PARA SU PAGO, GARANTIZANDO ASÍ LA ENTREGA DE INSTALACIONES PLENAMENTE SEGURAS, FUNCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL MARCO REGULATORIO COLOMBIANO APLICABLE A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
PLAZO EJECUCIÓN:	**CUATRO (04) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA DE FIRMA	ENERO VEINTICUATRO (24) DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO	FEBRERO VENTICUATRO (24) DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	JUNIO VENTICUATRO (24) DE 2026.
PRORROGA No 01	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL
PRORROGA No 02	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA PRIMERA PRÓRROGA
PRORROGA No.03	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE ACTA.
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	OCTUBRE VEINTICINCO (25) DE 2026

PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA
No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

Entre los suscritos a saber por una parte **LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS**, mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 52.897.176 expedida en Bogotá, en la condición Gerente de **RED SALUD CASANARE E.S.E** Identificada con el Número de Identificación Tributaria -**NIT No. 844.004.197-2**, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernación de Casanare y Acta de posesión No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto según lo establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolución N.º 0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominará **RED SALUD CASANARE E.S.E** y por la otra **INGENIERIA CIVILCAS S.A.S,** Identificada bajo el Número de Identificación Tributaria No **900.958.996-7.** Representada Legalmente por **ALEXANDER MENA ORDUZ,** mayor de edad, identificado (a) con la Cedula de Ciudadanía No. **74.861.287** expedida en Yopal, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar PRORROGA No.3 al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-007-2025 y numero interno 041-2026, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1) Que, EL CONTRATISTA. **ALEXANDER MENA ORDUZ.**, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No **74.861.287** expedida en Yopal, a través de oficio con fecha del 23 de septiembre de 2026, dirigido a AL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, donde solicita la viabilidad y aceptación PRORROGA No.03 al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 041-2026 en los siguientes términos:

"(…)

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

La presente solicitud de prórroga por el término de treinta (30) días calendario, se fundamentan en la ocurrencia de una contingencia logística, operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con las condiciones climáticas de la zona de ejecución, y dificultades logísticas se la vía de acceso al PAPS Guruvito, según las condiciones contractuales. Estos impases han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicial mente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.

Las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades, y la falta de acceso y dificultades para trasladar materiales. no obstante, existe continuidad de actividades contractuales en otro PAPS, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

"(…)

"(…)

1.1 Análisis de precipitaciones de zona afectada.

De acuerdo con las condiciones climatológicas presentadas durante el pasado mes de junio y el presente mes de julio, algunas de las labores en los diferentes PAPS tuvieron que ser reprogramadas, debido a que, para algunos puntos, las precipitaciones presentaron fueron un riesgo importante al momento de la ejecución y de la distribución logística de insumos y materiales necesarios para la continuidad de la ejecución de las actividades previstas.

PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA
No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

"(…)

2) Que, MILAR C&S S.A.S., Identificada con Número de Identificación Tributaria No NIT. 900.827.656-6, Representada Legalmente por MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.118.537.518 expedida en Yopal, a través de oficio con fecha del 24 de septiembre de 2026, dirigido al CONTRATISTA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No.3 AL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026., en los siguientes términos:

"(…)
En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista INGENIERÍA CIVILCAS S.A.S., mediante oficio de fecha 23 de septiembre de 2026, relacionada con el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026, cuyo objeto corresponde a "LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE", esta interventoría se permite informar que la misma CUMPLE DOCUMENTALMENTE con los soportes técnicos y administrativos requeridos para su trámite y evaluación por parte de la entidad.

Lo anterior, conforme a la revisión efectuada sobre los documentos allegados, entre ellos el informe quincenal de avance de obra, soportes de proveedores y reprogramación de obra presentada por el contratista.

En consecuencia, esta interventoría APRUEBA DOCUMENTALMENTE la solicitud de Prórroga No. 03 por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veinticuatro (25) de septiembre de 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veinticinco (25) de octubre de 2026.
(…)".

3) Que, MILAR C&S S.A.S., Identificada con Número de Identificación Tributaria No NIT. 900.827.656-6, Representada Legalmente por MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.118.537.518 expedida en Yopal, a través de oficio con fecha del 24 de septiembre de 2026, dirigido a la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, donde solicita la viabilidad y aceptación de PRORROGA No 03 CONTRATO DE OBRA NO. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026., en los siguientes términos:

"(…)

La presente solicitud se realiza en consideración las obligaciones de seguimiento, control, verificación y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental de la interventoría deben mantenerse durante todo el periodo de ejecución del contrato de obra y hasta su terminación, por ende, se hace necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría en iguales condiciones y por el mismo terminó solicitado para el contrato principal.

Así mismo la prese ante solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de seguimiento integral al proyecto, el control permanente de las actividades pendientes, la verificación de calidad y el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales derivadas de la ejecución de la obra intervenida"
(…)".

4) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante oficio de fecha veinticuatro (25) de septiembre de 2026, dirigido a EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 03. al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 041-2026., en los siguientes términos:

"(…)
Comedidamente, me permito informar que una vez revisada su solicitud de aprobación de prórroga Nº03 por término de treinta (30) días el cual fue radicado a RED SALUD CASANARE E.S.E, el día 24 de julio del 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentado por la interventoría como soporte técnico avalando y aprobando la solicitud de prórroga Nº3 al plazo establecido por término de treinta (30) días adicionales al contrato de obra N.º RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026.

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina Asesora de planeación, Mercadeo y Sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de supervisión y se requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, N.º RSC-CP-008-2025 Y NÚMERO INTERNO 050-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de obra SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026
(…)".

5) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante memorando de fecha veinticuatro (25) de septiembre de 2026, ante el JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, con visto bueno de la Gerencia de RED SALUD CASANARE E.S.E., donde solicita realizar PRORROGA No 03. al CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007- 2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026 bajo el siguiente sustento:
"(…)

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La presente solicitud de Prórroga No. 03 por un término de treinta (30) días calendario se fundamenta en ocurrencia de una contingencia logística, operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con la intermitencia del tránsito normal de la vía terciaria cuyo acceso se ha afectado por el movimiento de masas de tierras producto de las condiciones climáticas de la zona de ejecución, afectación que han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicialmente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.

PRORROGA No.03 AL CONTRATO DE OBRA
No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

Las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades, debido a dificultades logísticas en la llegada a tiempo de material requerido durante el proceso de ejecución, no obstante, existe continuidad de actividades contractuales, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

En este sentido, y considerando que actualmente subsisten las causas que originan las afectaciones descritas, resulta técnica y contractualmente procedente la prórroga del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 041-2026, como mecanismo orientado a preservar el equilibrio contractual, evitar riesgos para el personal vinculado al proyecto, proteger la calidad de las obras ejecutadas y prevenir la generación de sobrecostos o afectaciones derivadas de la ejecución en condiciones inadecuadas.
(…)".

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y numero interno 041-2026., el cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de CUATRO (04) Y TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN. Que para efectos del presente memorando de solicitud se PRORROGA en un término de treinta (30) días calendario más el plazo pactado en el contrato No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y numero interno 041-2026, contado a partir del vencimiento del plazo de la prórroga No2. Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga se mantendrán incólumes. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

6) Que las actuaciones se amparan en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que en materia contractual se regirá por el Derecho Privado, bajo este concepto RED SALUD CASANARE E.S.E., expidió el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.",

7) Que de conformidad con el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED

SALUD CASANARE E.S.E.", artículo 65 establece que las partes de común acuerdo podrán suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las razones que originaron tal modificación. y lo reglamentado en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". Artículo 51. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSÍ "La modificación contractual o los cambios estipulados inicialmente en el clausulado dl contrato o bien sea porque RED SALUD CASANARE E.S.E., lo considere pertinente o a solicitud del contratista (...)"

8) Que, en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". en su Artículo 52.2 AMPLIACION DEL PLAZO O PRORROGA, hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato, y finalmente el Artículo 52.2.1. Numeral 1 dispone: "La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada de prórroga. No obstante, lo anterior Red Salud Casanare E.S.E., podrá tener la iniciativa de prorrogar el contrato la cual debe ser plasmada en el formato de solicitud de modificación de contrato justificando la necesidad"

9) Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la PRORROGA No 03 al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-007-2025 y numero interno 041-2026. En consecuencia, se procede a realizar el mencionado PRORROGA No 03 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA — PRORROGA No. 03: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial del contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1. Firma de las partes. 2. Ampliación, presentación y aprobación de las garantías exigidas en el contrato.

CLÁUSULA CUARTA — GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la póliza de cumplimiento constituida para amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagró la garantía única

CLÁUSULA QUINTA. — SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la

Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/terminos-y-condiciones

CLÁUSULA SEXTA— ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Con la aceptación de las partes en el portal transaccional del SECOP II, dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/ las partes declaran conocer y aceptar todas las condiciones del contrato electrónico y las cláusulas adicionales pactadas en este anexo al contrato electrónico.

FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II.

ingeniería CIVILCAS
NIT. 900958996-7

Salud

COMUNICACIONES RECIBIDAS

Radicado:	**R-2026-15486**
Fecha:	23/sep/2026 11:07 AM
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie:	Contratos de Obra
Anexos:	S
No. Folios:	33

"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art. 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art. 54 Proc. Adm.)

Yopal - Casanare, 23 de Septiembre de 2026

Señores
RED SALUD CASANARE E.S.E
Att: Ana Dioneira Bustos Caballero
Jefe Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
En Calidad Supervisor

Referencia: *Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Numero Interno 041-2026 – LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE.*

Asunto: Solicitud de Prórroga No 3 Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Numero Interno 041-2026.

Cordial saludo,

El suscrito ALEXANDER MENA ORDUZ con cedula de ciudadanía No 74.861.287 de Yopal, representante legal de la empresa INGENIERIA CIVILCAS S.A.S., y contratista de la obra de la referencia, se permite solicitar la prórroga No. 03 al Contrato de Obra referido por el término de treinta (30) días calendario, con fundamento en las circunstancias técnicas, climáticas y operativas que actualmente afectan el normal desarrollo del proyecto.

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD.

La presente solicitud de prórroga por el término de treinta (30) días calendario, se fundamentan en la ocurrencia de una contingencia logística, operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con las condiciones climáticas de la zona de ejecución, y dificultades logísticas se la vía de acceso al PAPS Guruvito, según las condiciones contractuales. Estos impases han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicialmente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.

Las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades y la falta de acceso y dificultades para trasladar materiales, no obstante, existe continuidad de actividades contractuales en otros PAPS, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

1.1. Análisis de precipitaciones de zona afectada.

De acuerdo con las condiciones climatológicas presentadas durante los meses de Agosto y el presente mes de Septiembre, algunas de las labores en los diferentes PAPS tuvieron que ser reprogramadas, debido a que, para algunos puntos, las precipitaciones presentaron fueron un

riesgo importante al momento de la ejecución y de la distribución logística de insumos y materiales necesarios para la continuidad de la ejecución de las actividades previstas.

1.1.1.1. Metodología.

Con el propósito de evaluar la incidencia de las condiciones meteorológicas sobre la ejecución de las actividades programadas, se realizó un proceso de recopilación, depuración y análisis de información de precipitación proveniente de la Red Hidrometeorológica Nacional del IDEAM. Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología empleada fue la siguiente:

1. Recolección de datos oficiales de precipitación diaria correspondientes al período de ejecución de Agosto y Septiembre.
2. Selección de estaciones de referencia ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y representativas de las condiciones climáticas del municipio de Chámeza.
3. Procesamiento y validación de la información mediante herramientas de análisis de datos.
4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA – Exploratory Data Analysis) para identificar patrones temporales, acumulados mensuales, eventos extremos y tendencias de precipitación.
5. Comparación de los registros diarios y acumulados mensuales con las actividades programadas en campo, evaluando su incidencia sobre el acceso a los puntos de trabajo, las condiciones de seguridad operacional y la productividad de las labores ejecutadas.

1.1.1.2. Fuentes de información utilizadas.

Para el análisis se emplearon los registros de precipitación diaria suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, correspondientes a las siguientes estaciones:

Tabla 1. Nombre, código y localización de los puestos de control del Ideam

ESTACIÓN	CODIGO IDEAM	UBICACIÓN
CHAMEZA	35190030	5°22'46.9"N 72°87'06.2"W

Estas estaciones fueron seleccionadas debido a su representatividad sobre las condiciones meteorológicas predominantes en el municipio de Chámeza y las áreas donde se desarrollaron las actividades objeto del contrato.

1.1.1.3. Ubicación de estaciones.

Con el fin de tener un registro solido de las afectaciones y la consolidación de la información, se ilustran los puntos marcados en azul, correspondientes a los puntos de control del Ideam donde se tomaron las muestras para el análisis de la información.

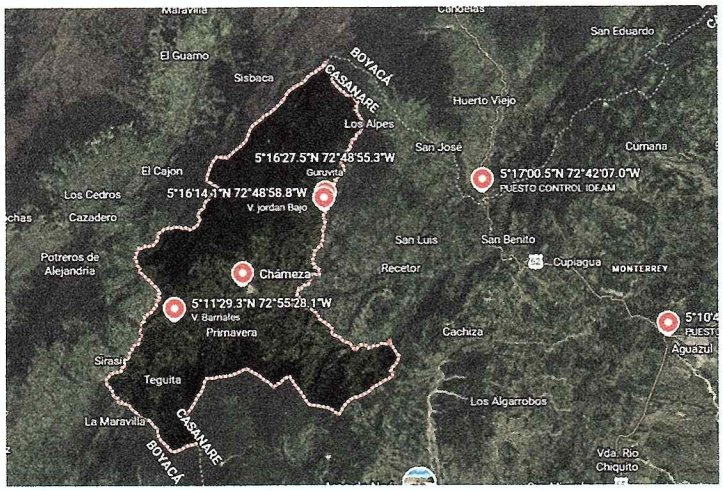


Ilustración 1. Localización de puntos de control del IDEAM y localización general de los PAPS de Chámeza, Casanare.

La ilustración anterior, permite evidenciar la localización de los puntos control donde se tomaron los datos y que estos presentan correlación de incidencia al estar presentes en el territorio del municipio.

1.1.1.4. Resultados generales del análisis EDA

El análisis exploratorio evidenció un comportamiento pluviométrico característico de la temporada de lluvias de la Orinoquía colombiana, presentándose eventos frecuentes de precipitación y varios episodios de lluvia intensa durante el periodo analizado.

A continuación, se detalla el resumen por estación del comportamiento de precipitaciones de la zona de estudio.

RESUMEN MENSUAL — CHAMEZA, CASANARE 2026					
Estación	**Código IDEAM**	**Mes**	**Total (mm)**	**Promedio Diario (mm)**	**Máximo Diario (mm)**
CHAMEZA	35190030	Agosto	156,0	5,2	13,9

Tabla 2, Resumen ejecutivo de precipitación en la estación de Chameza. Fuente: Base de Datos Precipitaciones IDEAM

Información disponible a corte 21 de Septiembre de 2026.

Dentro de la información suministrada se puede observar para el mes de Agosto un incremento en las lluvias y precipitaciones, así mismo se tienen los picos máximos diarios en el mes de Junio, de acuerdo a la normal climatológica y las estimaciones que se tienen para el año 2026, se observa que en el mes de agosto, para la zona de Chameza hay también fuertes precipitaciones especialmente en las veredas del perímetro urbano. Es importante conocer que actualmente las precipitaciones a corte 21 de Septiembre tienen una grave afectación en algunos puntos ubicados en llanuras inundables, tales como Chameza, Guruvita, Vereda Jordan Bajo y Vereda Barriales.

Se identificaron además eventos diarios de alta intensidad:

- 24.8 mm en Agosto (Estación Chameza).

Estos valores evidencian la ocurrencia de precipitaciones significativas capaces de generar saturación de suelos, anegamientos temporales, deterioro de vías terciarias y limitaciones para el desarrollo seguro de actividades operativas en campo.

1.1.1.5. Relación de las condiciones climáticas con las actividades ejecutadas

De acuerdo con los datos suministrados por el IDEAM, se observa que el inicio de la temporada de lluvias en el municipio de Chameza da sus inicios en los primeros días del mes de junio con picos el 05 y 15 de junio , sin embargo, en julio es donde las precipitaciones empiezan a tener valores significantes de tal forma que llevan a obstaculizar con el avance en las actividades y la problemática de riesgos asociados con precipitaciones altas.

Debido a que el plazo de ejecución fue relativamente corto y las actividades se desarrollaron en múltiples puntos de intervención distribuidos en el municipio, la ocurrencia continua de precipitaciones tuvo una incidencia directa sobre:

Accesibilidad y movilidad, las lluvias ocasionaron:

- Deterioro de vías terciarias y caminos veredales.
- Formación de encharcamientos y sectores inundables.
- Incremento de tiempos de desplazamiento.
- Restricciones para el ingreso de personal, equipos y materiales a los puntos de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Las condiciones de lluvia incrementaron significativamente los riesgos operacionales asociados a:

- Caídas al mismo nivel por superficies resbaladizas.
- Deslizamientos y pérdida de estabilidad del terreno.
- Riesgo de accidentes durante desplazamientos terrestres.
- Exposición prolongada del personal a condiciones climáticas adversas.
- Manipulación de herramientas y equipos en ambientes húmedos.
- Disminución de la visibilidad durante actividades de campo.
- Incremento de la probabilidad de incidentes por fatiga derivada de recorridos más extensos y complejos.

Por lo anterior, fue necesario implementar pausas operativas, reprogramaciones y controles preventivos orientados a preservar la integridad física del personal y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.1.1.6. Análisis de precipitaciones por mes.

AGOSTO

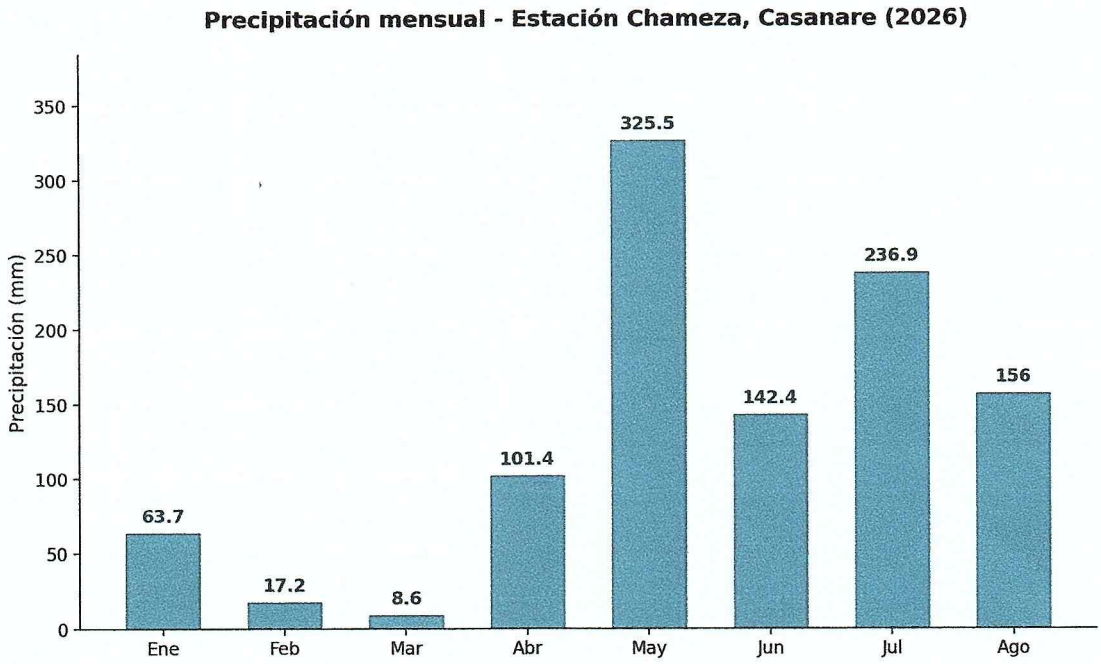


Ilustración 2.: Análisis de precipitación diarias por estación IDEAM. Año 2026. Agosto. Elaboración propia.

Se observa que durante el inicio de la temporada de lluvias entre Mayo y Junio se presenta la mayor concentración de lluvias en el año, posteriormente Julio, agosto y parte de Septiembre, las lluvias aunque tienden a disminuir su presencia en la zona es muy considerable teniendo días en los que los accesos se vuelven prácticamente imposibles para personal y materiales.

1.1.1.7. Análisis de precipitaciones por PAPS

De acuerdo con los registros históricos y los datos meteorológicos analizados mediante información oficial del IDEAM, complementados con el análisis exploratorio de datos (EDA) y la validación de las condiciones climáticas observadas en la zona de influencia del proyecto, se evidencia que durante los meses de Junio hasta Agosto se presenta un incremento significativo de las precipitaciones en el municipio de Chámeza y sus áreas rurales de intervención.

Estas condiciones climáticas generan afectaciones directas sobre la ejecución de las actividades programadas, principalmente por el deterioro de las vías terciarias de acceso, la presencia de encharcamientos, saturación de los suelos, aumento de los niveles de cuerpos de agua y el aumento de escorrentías de sectores ubicados en zonas montañosas y de laderas con masas removibles.

Adicionalmente, las precipitaciones constantes incrementan los riesgos asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los que se destacan la disminución de la estabilidad de los terrenos,

riesgos de deslizamientos localizados, dificultades de movilidad vehicular y peatonal, riesgo de atrapamiento de vehículos, exposición a tormentas eléctricas, reducción de la visibilidad durante los desplazamientos y mayores probabilidades de incidentes derivados de superficies resbaladizas o condiciones inseguras para el personal operativo.

Por lo anterior, resulta necesario analizar de manera individual el comportamiento de las precipitaciones y las condiciones de accesibilidad de cada uno de los PAPS identificados, con el fin de evidenciar la incidencia de los factores climáticos sobre la programación y ejecución de las actividades del proyecto.

1.1.1.8. PAPS GURUVITA

De acuerdo con los registros históricos, los datos meteorológicos se realizó una correlación donde se estima la cantidad de posibles días de lluvia además de las precipitaciones en los puntos exactos de atención, en este caso Guruvita, a continuación, se presentan los gráficos y sus posibles afectaciones

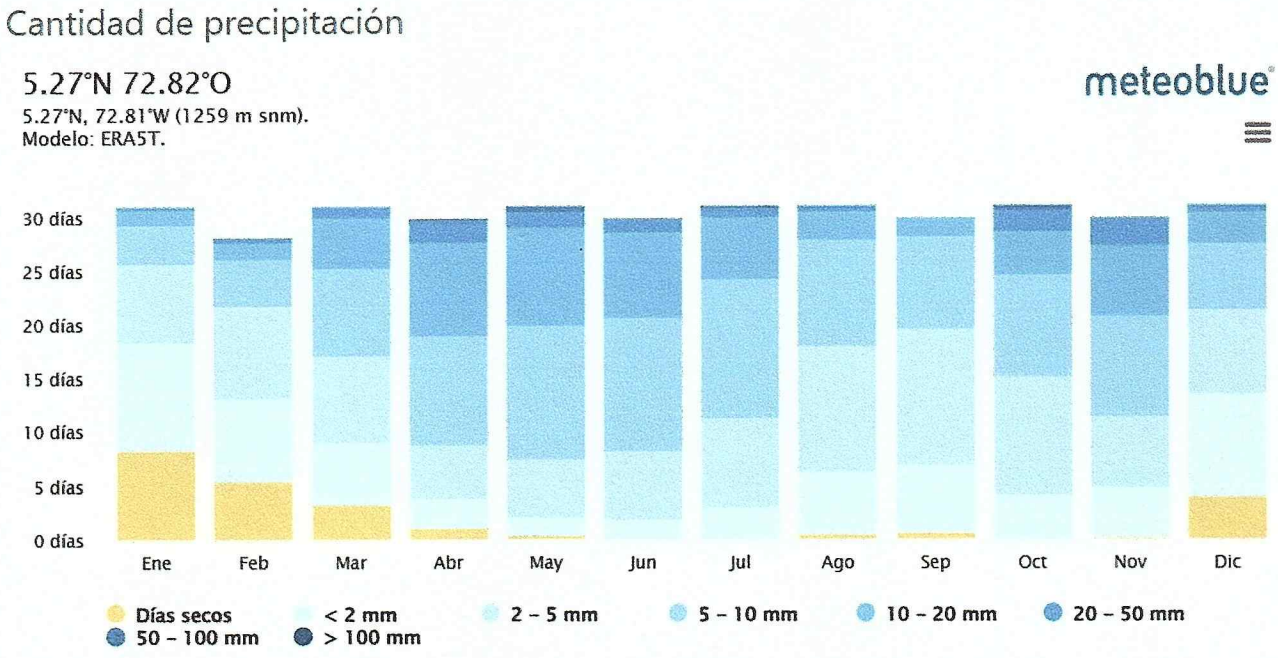



Ilustración 4: Temperaturas medias y precipitaciones en la ubicación de Guruvito.

Se evidencio que para los meses de mayo, junio y julio se tienen los mayores picos de precipitaciones en cuanto a mayor cantidad de mm, un indicador importante ya que, de acuerdo a las estimaciones, es considerada una lluvia fuerte después de los 15mm. Para el mes de junio se tienen 14 días de precipitaciones mayores a 10mm y solo medio de días secos en todo el mes. Para el mes de julio se tienen 14 días de precipitaciones mayores a 10mm y 0 días secos en todo el mes. Esto tiene directamente una afectación ya que el PAPS está ubicado en zona de alta remoción de masas lo cual afecta directamente en la realización de los trabajos civiles, adicionalmente la vía terciaria sufre también por las inundaciones y deslizamientos afectando

directamente el acceso de materiales y personal a la obra. Confirmando que para el PAP de Guruvita se mantendrá en constante lluvia haciendo que la saturación de agua en el suelo se mantenga constante y se tengan dificultades adversas a las labores a realizar.

1.1.1.9. PAPS VEREDA JORDAN BAJO


De acuerdo con los registros históricos, los datos meteorológicos se realizó una correlación donde se estima la cantidad de posibles días de lluvia además de las precipitaciones en los puntos exactos de atención, en este caso Vereda Jordan Bajo, a continuación, se presentan los gráficos y sus posibles afectaciones

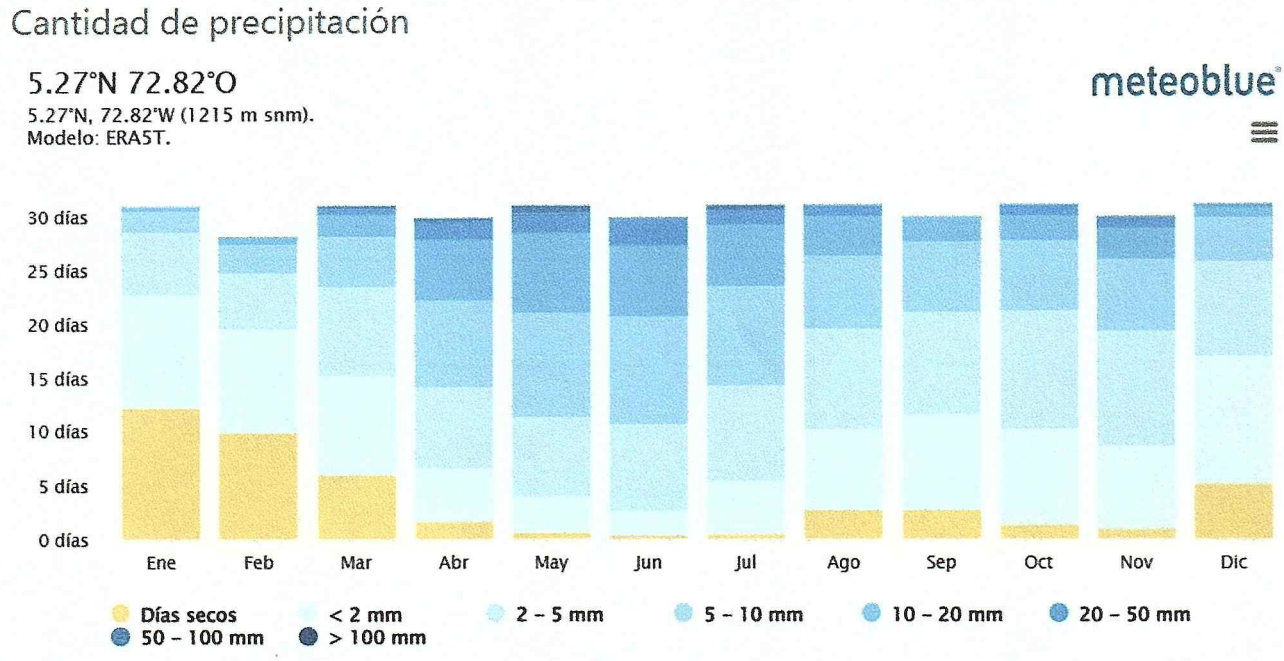

Se evidencia que para los meses de Mayo, Junio y Julio se tienen los mayores picos de precipitaciones en cuanto a mayor cantidad de mm, un indicador importante ya que, de acuerdo a las estimaciones, es considerada una lluvia fuerte después de los 15mm. Para el mes de junio se tienen 17 días de precipitaciones mayores a 10mm y solo medio de días secos en todo el mes. Para el mes de julio se tienen 14 dias de precipitaciones mayores a 10mm y medio día secos en todo el mes. Esto tiene directamente una afectación ya que el PAPS está ubicado en zona de alta remoción de masas lo cual afecta directamente en la realización de los trabajos civiles, adicionalmente la vía terciaria sufre también por las inundaciones y deslizamientos afectando directamente el acceso de materiales y personal a la obra. Confirmando que para el PAP de Jordan Bajo se mantendrá en constante lluvia haciendo que la saturación de agua en el suelo se mantenga constante y se tengan dificultades adversas a las labores a realizar.

1.1.1.10. PAPS VEREDA BARRIALES

De acuerdo a los registros históricos, los datos meteorológicos se realizó una correlación donde se estima la cantidad de posibles días de lluvia además de las precipitaciones en los puntos exactos de atención, en este caso Vereda Barriales, a continuación, se presentan los gráficos y sus posibles afectaciones

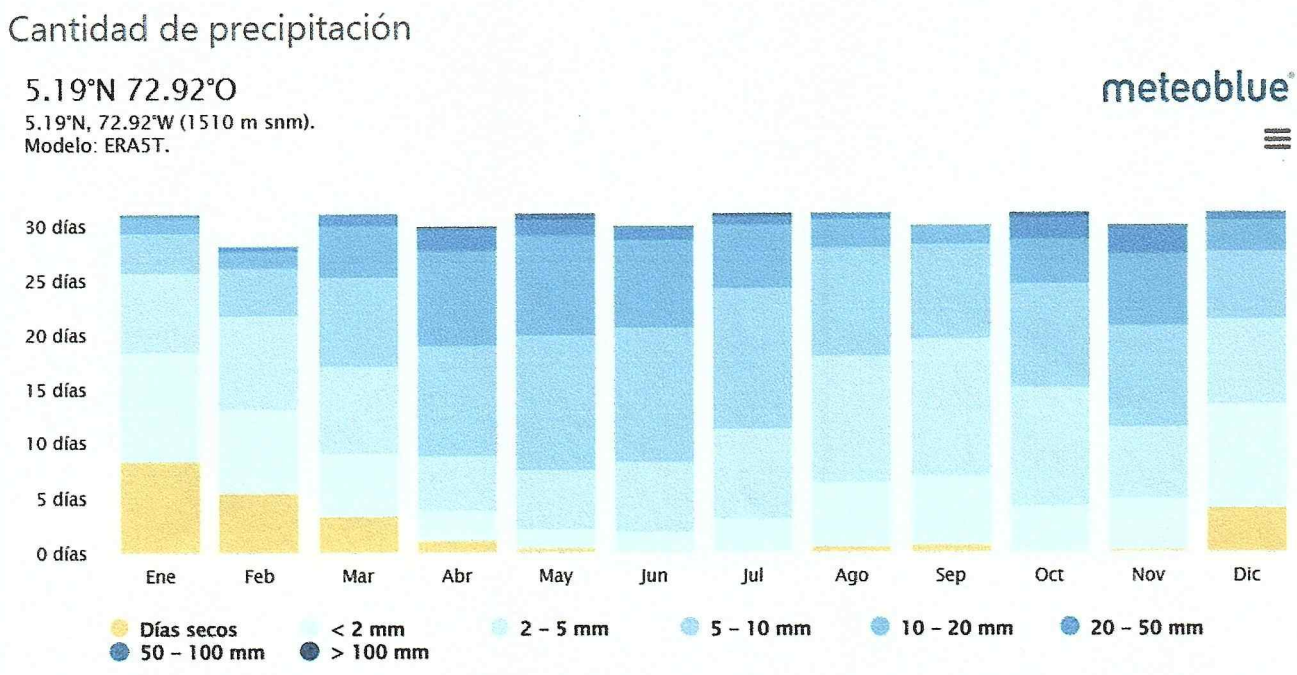

Se evidencia que para los meses de Mayo, Junio y julio se tienen los mayores picos de precipitaciones en cuanto a mayor cantidad de mm, un indicador importante ya que, de acuerdo a las estimaciones, es considerada una lluvia fuerte después de los 15mm. Para el mes de junio se tienen 17 días de precipitaciones mayores a 10mm y solo medio de días secos en todo el mes. Para el mes de julio se tienen 14 días de precipitaciones mayores a 10mm y medio día secos en todo el mes. Esto tiene directamente una afectación ya que el PAPS está ubicado en zona de alta remoción de masas lo cual afecta directamente en la realización de los trabajos civiles, adicionalmente la vía terciaria sufre también por las inundaciones y deslizamientos afectando directamente el acceso de materiales y personal a la obra. Confirmando que para el PAPS de Barriales se mantendrá en constante lluvia haciendo que la saturación de agua en el suelo se mantenga constante y se tengan dificultades adversas a las labores a realizar.

1.1.1.11. Conclusiones del análisis.

Durante el periodo de ejecución contractual se ha presentado el ingreso y consolidación de la temporada invernal, situación que ha ocasionado afectaciones materiales y operativas sobre la movilidad, logística de abastecimiento y ejecución de actividades constructivas.

Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:

- Deterioro acelerado de vías terciarias y caminos veredales por saturación hídrica y tránsito restringido.
- Movimientos de masas en corredores de acceso y puntos críticos de movilidad.
- Desbordamiento de fuentes hídricas y pasos provisionales que limitan el ingreso de personal, equipos y materiales.
- Procesos de socavación, pérdida de banca y afectación de zonas de ladera que incrementan el riesgo de desplazamiento vehicular.
- Restricciones operativas derivadas del enterramiento recurrente de vehículos de carga y transporte de materiales, ocasionando retrasos en tiempos de entrega e ingreso a frente de obra.
- Disminución de rendimientos constructivos por condiciones climáticas adversas, lluvias intensas y restricciones para desarrollar determinadas actividades.

1.2. CONCLUSIÓN TÉCNICA.

De acuerdo con los registros oficiales del IDEAM y el análisis exploratorio realizado, se concluye que durante el período comprendido entre los meses de Mayo a Agosto se presentaron condiciones pluviométricas significativas y recurrentes en el municipio de Chámeza, particularmente durante los meses de mayo, junio y julio.

La magnitud y frecuencia de las precipitaciones generaron afectaciones directas sobre la accesibilidad a los puntos de intervención, incrementaron los riesgos asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo y limitaron la ejecución continua de las actividades programadas. En consecuencia, las condiciones climáticas constituyeron un factor externo debidamente soportado que incidió en el rendimiento operativo y en los tiempos requeridos para el desarrollo de las labores contratadas, justificando técnicamente las reprogramaciones y la necesidad de ampliación del plazo de ejecución para garantizar la correcta culminación de las actividades bajo condiciones seguras para el personal involucrado. La condición tuvo especial incidencia sobre la cadena logística y constructiva asociada a la ejecución del proyecto. La persistencia de lluvias durante el mes de agosto redujo las ventanas efectivas de trabajo, incrementó los tiempos de desplazamiento hacia los PAPS y afectó la posibilidad de ejecutar de manera continua las actividades.

Por lo anterior, los registros de precipitación de mayo hasta agosto de 2026 permiten soportar objetivamente que las condiciones climáticas incidieron de manera directa en la reducción de rendimientos, la afectación de accesos rurales, la logística de abastecimiento y la continuidad de las actividades críticas del contrato. Esta situación justifica técnicamente la necesidad de ajustar

el plazo contractual, no como consecuencia de falta de gestión del contratista, sino como medida razonable y proporcional para permitir la culminación integral de las actividades pendientes bajo condiciones adecuadas de seguridad, calidad y funcionalidad.

En consecuencia, las condiciones climáticas constituyeron un factor externo debidamente soportado que incidió en el rendimiento operativo y en los tiempos requeridos para el desarrollo de las labores contratadas, justificando técnicamente las reprogramaciones y la necesidad de ampliación del plazo de ejecución para garantizar la correcta culminación de las actividades bajo condiciones seguras para el personal involucrado.

Debe precisarse que esta situación no ha generado un detenimiento absoluto de la ejecución contractual; no obstante, sí ha provocado una reducción sustancial en el rendimiento programado de obra y una afectación directa sobre el cumplimiento de hitos, secuencias constructivas y tiempos inicialmente proyectados, impactando la ruta crítica del cronograma, disminución objetiva del rendimiento y afectación de la continuidad de la obra.

2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

Desde el punto de vista financiero, la cubierta representa uno de los componentes de mayor incidencia dentro de la ejecución física y presupuestal del contrato. Su retraso limita el avance de actividades medibles, afecta la curva de ejecución programada y condiciona la posibilidad de consolidar frentes de obra con avance integral esto respecto al PAPS de GURUVITO, en los casos de los PAPS BARRIALES y JORDAN BAJO, si bien se continuaron con los trabajos, a pesar del temporal invernal esto repercute directamente en una baja de rendimiento sustancial sobre la que estábamos teniendo donde estábamos durante varias quincenas por encima del porcentaje programado.

La prórroga solicitada no busca modificar el valor del contrato ni generar reconocimiento económico adicional, sino permitir el plazo estrictamente necesario para recibir, transportar, instalar y cerrar técnicamente las actividades asociadas a la cubierta y sus actividades dependientes en el PAPS GURUVITO, preservando la adecuada inversión de los recursos públicos y evitando reprocesos o ejecuciones apresuradas que comprometan la calidad final de las obras.

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

La prórroga de treinta (30) días, no busca modificar el objeto, valor, alcance ni especificaciones del contrato; solo ajusta el plazo para superar una contingencia real y documentada sobre el impacto de condiciones climáticas al cronograma establecidos, debido movimiento de masa sobre vías terciarias de acceso y la disminución del rendimiento de las actividades requeridas para la continuidad de la ejecución como instalaciones, acabados, cielo raso, instalaciones eléctricas, pruebas y cierre de obra.

Desde el punto de vista jurídico y contractual, la solicitud encuentra sustento en el propio clausulado del contrato y en el régimen interno de contratación de Red Salud Casanare E.S.E. El otrosí modificatorio aclaratorio del contrato reconoce que las partes, de común acuerdo, pueden suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las

razones que originan la modificación. Así mismo, el clausulado contempla la modificación contractual u otrosí cuando Red Salud Casanare E.S.E. lo considere pertinente o a solicitud del contratista.

Desde la perspectiva jurídica y contractual, el Estatuto de Contratación de Red Salud permite gestionar la contratación bajo su régimen especial, pero dentro de principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y eficacia.

3.1. Marco normativo:

La Ley 80 de 1993 permite soportar la decisión desde los fines de la contratación estatal: el contrato debe ejecutarse para asegurar el cumplimiento de los fines estatales, la prestación eficiente del servicio público y la protección del interés general. También permite acudir a la autonomía de la voluntad y a las normas civiles y comerciales para estructurar el contenido contractual, incluidas modificaciones de plazo cuando sean necesarias y estén justificadas.

La Ley 1150 de 2007 refuerza que la contratación con recursos públicos debe orientarse por eficiencia y transparencia. Esto sirve para justificar que no conviene forzar una ejecución defectuosa o acelerada si la actividad crítica depende de un material especializado no disponible oportunamente.

La Ley 1474 de 2011, artículo 83, obliga a vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato mediante supervisión o interventoría. Por eso, la prórroga debe tener concepto técnico de interventoría/supervisión, no solo solicitud del contratista.

Por otra parte, el Consejo de Estado ha señalado que la prórroga puede ser aconsejable para la administración desde el punto de vista técnico y financiero, pero no opera automáticamente: la entidad debe evaluar su conveniencia para el interés público. También se ha sostenido que las modificaciones contractuales deben respetar límites temporales, formales, materiales y axiológicos: deben hacerse durante la vigencia del contrato, constar por escrito, estar motivadas, no alterar condiciones sustanciales y preservar planeación, transparencia, igualdad y selección objetiva.

Frente a hechos externos, el Consejo de Estado ha explicado que el equilibrio y la ejecución contractual pueden verse afectados por circunstancias de hecho imprevistas, ajenas y no imputables a las partes, manejables bajo la teoría de la imprevisión; además, la relatoría reciente resume que la imprevisión puede incluir hechos de la naturaleza, hechos causados por terceros o cambios normativos, siempre que no sean causados por la entidad contratante. En este

sentido, el retraso por proveedores, la alta demanda y problemas de puerto justifican un hecho de terceros y contingencia externa de suministro y no como incumplimiento del contratista por su diligencia frente al evento presentado.

La prórroga solicitada constituye una medida razonable, proporcional y necesaria para garantizar la culminación integral del objeto contratado. La situación presentada corresponde a una contingencia sobreviniente de abastecimiento, acreditada mediante soportes de proveedores, que afecta temporalmente el cumplimiento del cronograma, pero no altera el objeto, el valor, las cantidades, las especificaciones técnicas, la fuente de financiación ni el alcance aprobado del proyecto.

Debe precisarse que la presente solicitud no modifica el objeto contractual, no incrementa el valor del contrato, no altera cantidades, no cambia especificaciones técnicas, no modifica la fuente de financiación, no sustituye actividades, no afecta la viabilidad técnica del proyecto y no genera reconocimiento económico adicional a favor del contratista. La modificación se limita exclusivamente al plazo de ejecución, con el fin de garantizar la correcta terminación de los diez PAPS objeto del contrato.

En consecuencia, la modificación requerida se limita exclusivamente al plazo de ejecución contractual. La ampliación del plazo por treinta (30) días se encuentra justificada en la medida en que guarda relación directa con las condiciones climáticas reportadas en la zona por el IDEAM, las afectaciones por invierno han causado cierres o problemas de ingreso de carga mediana, y permite reprogramar de manera ordenada las actividades críticas asociadas al suministro, transporte, acopio, instalación de cubierta, instalación de cielo raso, instalaciones eléctricas, acabados y cierre técnico de los frentes de obra. Esta medida evita forzar una ejecución acelerada o incompleta, reduce riesgos de reprocesos, protege la calidad de la infraestructura intervenida y garantiza que las obras sean entregadas en condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y estabilidad.

Debe precisarse que el contratista ha mantenido la ejecución de las demás actividades posibles conforme a las condiciones reales de obra, sin que la presente solicitud implique suspensión total del contrato ni abandono de los frentes de intervención. La afectación se concentra en una condición externa y verificable cuya circunstancia impacta necesariamente la programación general del contrato.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, existe plena viabilidad legal para suscribir la Prórroga No. 3 al Contrato de Obra Pública SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 041-2026, por tratarse de una medida proporcional, necesaria y debidamente justificada frente a circunstancias externas no imputables al contratista que afectan temporalmente la ejecución del contrato.

4. SOLICITUD

Las condiciones que se presentaron producto de la persistencia de la temporada de lluvias y los procesos de pérdida de banca, deslizamientos de talud y deterioro de la infraestructura vial, y que generaron una imposibilidad material y temporal para garantizar el normal desarrollo de las actividades pendientes de ejecución del contrato. Y que de igual manera limitaron significativamente el transporte de materiales, el ingreso de equipos, la movilidad del personal técnico y operativo y la continuidad de los procesos constructivos, configurándose en hechos externos, extraordinarios, imprevisibles y ajenos al control del contratista que impedían la ejecución eficiente y segura de las actividades programadas ya fueron SUPERADAS.

En este sentido, y considerando que gracias al esfuerzo y articulación de la Alcaldía de Chameza, se realizaron las actividades de adecuación y mitigación del acceso vial, remoción del alud que tenía sin acceso esta vía terciaria tan importante para la ejecución del proyecto.

En consecuencia, y con fundamento en los principios de planeación, economía, responsabilidad y cumplimiento del contrato, se considera técnica, jurídica y contractualmente viable solicitar a esta Supervisión la PRORROGA al Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 041-2026 por el término de treinta (30) días, para garantizar la correcta ejecución y finalización del proyecto.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Supervisión emitir concepto favorable y tramitar ante la Entidad Contratante la solicitud de prórroga No. 03 del contrato referido por el término de treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta correspondiente.

Cordialmente,

ALEXANDER MENA ORDUZ
Representante Legal / Contratista de Obra
INGENIERÍA CIVILCAS S.A.S.
NIT. 900.958.996-7

Anexos:

1. Último informe quincenal de avance de obra.
2. Reprogramación ajustada.

INFORME QUINCENAL DE OBRA
PAPS VEREDA BARRIALES

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	9	FECHA INICIO INF. Quincenal	26 de junio del 2026
MES No.	5	FECHA FIN INF. Quincenal	10 de julio del 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 182.035.876,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2026

PRORROGAS		
No.	TIEMPO	FECHA
1	30 dias	24/07/2026
2	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	FECHA
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A


CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,95%	65,98%	-0,03%
Durante el periodo	13,85%	14,02%	0,17%
Acumulado Actual	79,80%	80,00%	0,20%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
150	126	24	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

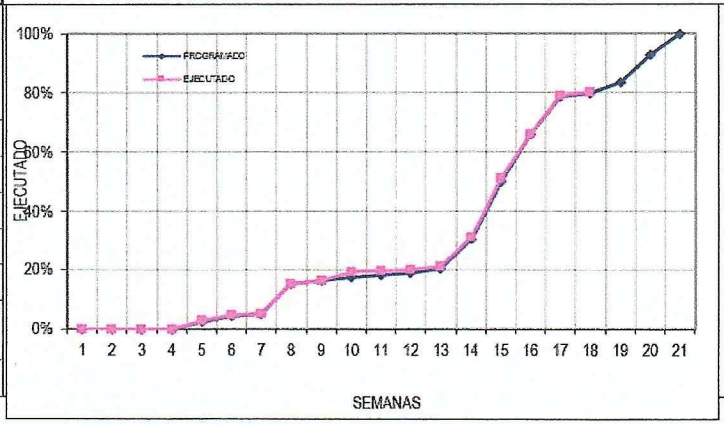


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0,00%
2	0,00	0,00	0,00%
3	0,00	0,00	0,00%
4	0,00	0,00	0,00%
5	4.641.914,83	5.188.022,46	2,85%
6	8.282.632,35	8.828.739,98	4,85%
7	9.192.811,73	9.192.811,73	5,05%
8	27.287.177,78	27.669.453,12	15,20%
9	29.307.776,00	29.671.847,76	16,30%
10	31.310.170,64	35.314.959,91	19,40%
11	32.948.493,52	35.679.031,66	19,60%
12	34.550.409,23	36.388.971,57	19,99%
13	36.953.282,79	38.227.533,92	21,00%
14	55.338.906,24	56.431.121,50	31,00%
15	91.199.973,78	92.838.296,66	51,00%
16	120.052.660,09	120.107.270,85	65,98%
17	143.080.198,38	143.808.341,88	79,00%
18	145.264.628,89	145.628.700,64	80,00%
19	152.181.992,17		
20	168.565.220,99		
21	182.035.875,80		
TOTAL	182.035.875,80		

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

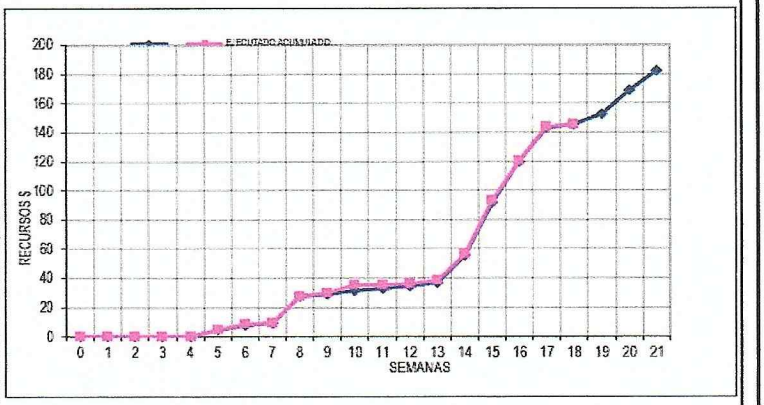

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante el período reportado se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación y adecuación de los sistemas sanitarios, hidráulicos y eléctricos requeridos para el adecuado funcionamiento de la infraestructura. En el componente sanitario se contempló la instalación del sistema séptico ovoide con capacidad de 2.000 litros, incluyendo tanque séptico, tanque anaeróbico y trampa de grasas, así como la instalación de sanitario de bajo consumo y lavaplatos en acero inoxidable con su respectiva grifería, acoples y sistema de desagüe.

De igual manera, se adelantaron actividades relacionadas con la instalación de la acometida eléctrica en baja tensión, medidor de energía, sistema de puesta a tierra, tablero trifásico y sus respectivos dispositivos de protección, incluyendo interruptor termomagnético totalizador y cortacircuitos para la distribución de los diferentes circuitos eléctricos.

Asimismo, se realizaron las instalaciones eléctricas internas correspondientes a salidas para iluminación, interruptores sencillos y dobles, y tomacorrientes con polo a tierra tipo GFCI, incluyendo tuberías, conductores, cajas, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Finalmente, se contempló la instalación de luminarias tipo panel LED de 60 x 60 cm y módulos LED redondos de 18 W, junto con sus respectivos sistemas de conexión y fijación, además de la acometida eléctrica en conductor de cobre para la alimentación del tablero general de distribución.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante el período reportado no se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación de las puertas en aluminio con vidrio incoloro de 4 mm, puertas en lámina cold rolled calibre 18 con su respectivo marco y acabado, ni la instalación de los lavamanos de colgar con grifería y accesorios. Se tiene previsto que estas actividades sean desarrolladas durante la siguiente quincena, de acuerdo con la programación establecida y la disponibilidad de los elementos requeridos para su instalación.

OBSERVACIONES

En constancia se firma

Elaboró	Revisó
ING JAVIER ALEXANDER ARIAS PÉREZ RESIDENTE DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S


REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 9



Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)



Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.

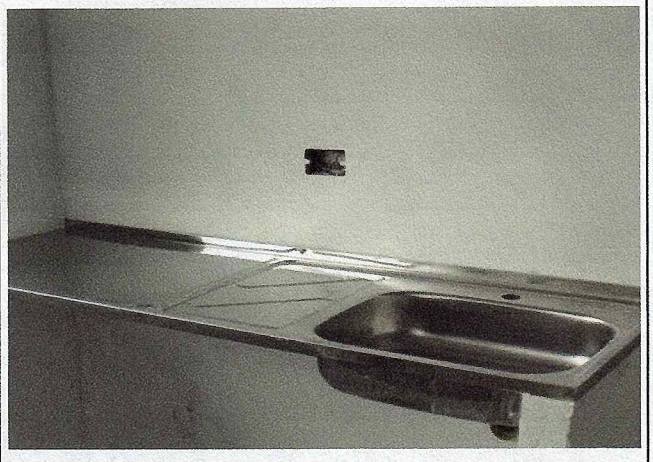

Lavaplatos de sobreponer liso en acero inoxidable 150 x 52 cm con griferia monocontrol tipo Aluvia de corona incluye acoples y kit desague. Suministro e Instal.








Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion



medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra



Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N

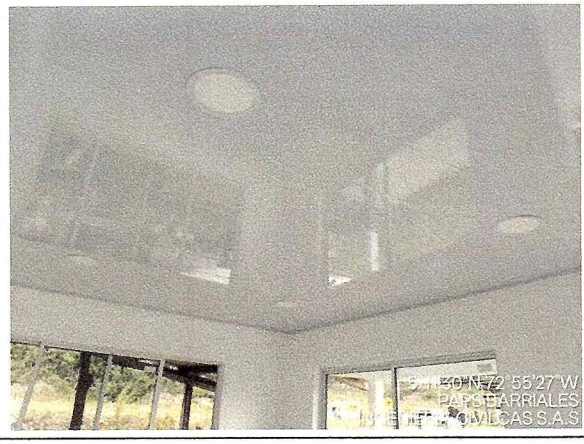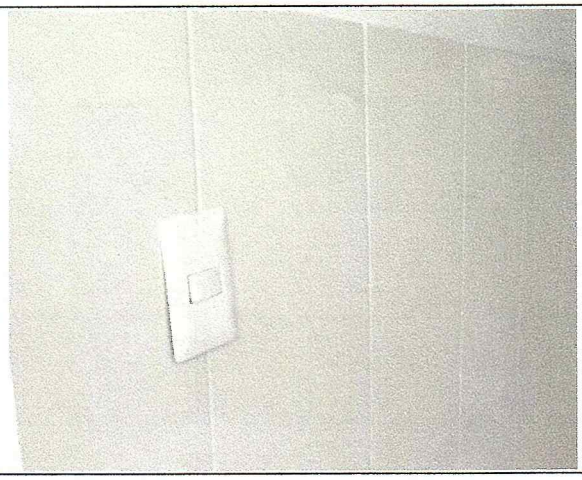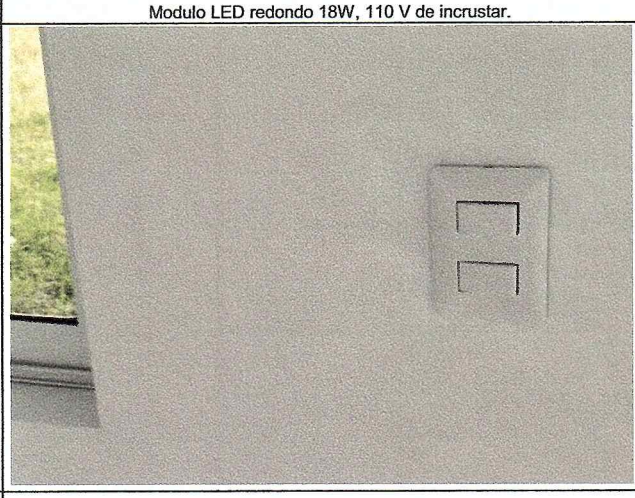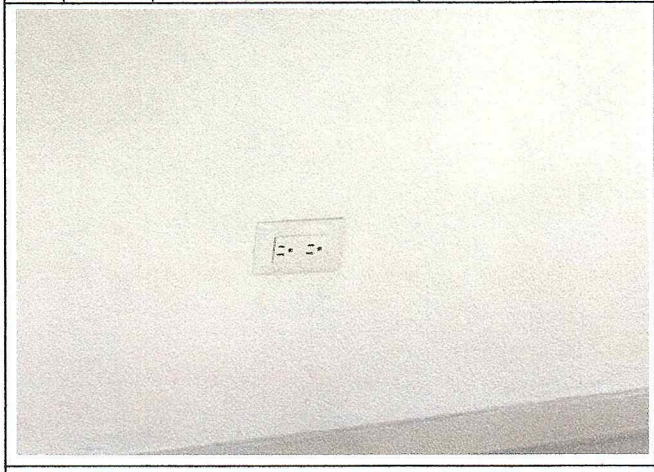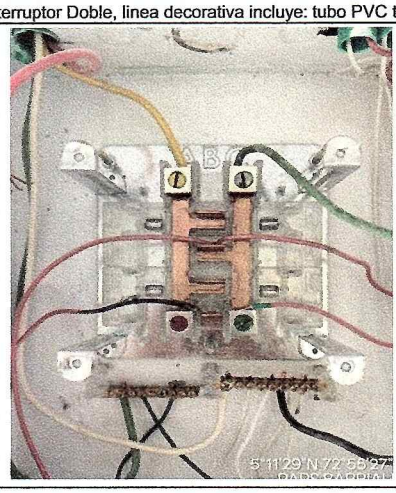	
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG,	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar.
	
Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4",	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", ca
	
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluy	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)

INFORME QUINCENAL DE OBRA
PAPS VEREDA BARRIALES

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	10	FECHA INICIO INF. Quincenal	11 de julio del 2026
MES No.	5	FECHA FIN INF. Quincenal	25 de julio del 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 182.035.876,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de agosto de 2026

PRORROGAS		
No.	TIEMPO	FECHA
1	30 dias	24/07/2026
2	30 dias	24/08/2026


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	FECHA
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83,20%	84,00%	0,80%
Durante el periodo	5,59%	4,90%	-0,69%
Acumulado Actual	88,79%	88,90%	0,11%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
180	141	39	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

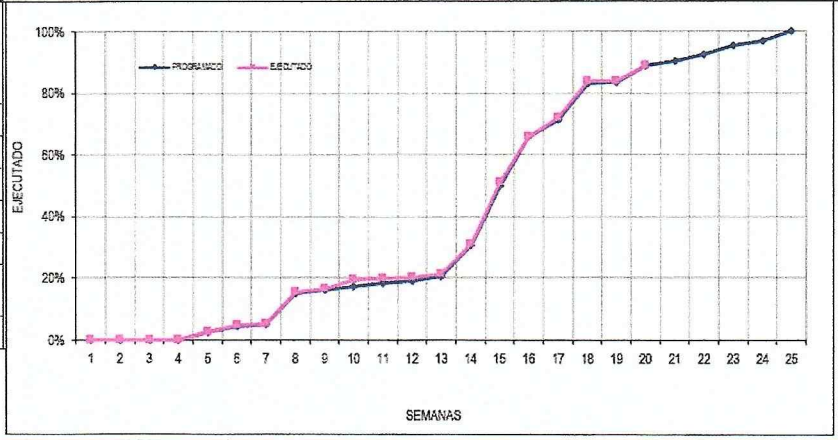


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0,00%
2	0,00	0,00	0,00%
3	0,00	0,00	0,00%
4	0,00	0,00	0,00%
5	4.641.914,83	5.188.022,46	2,85%
6	8.282.632,35	8.828.739,98	4,85%
7	9.192.811,73	9.192.811,73	5,05%
8	27.287.177,78	27.669.453,12	15,20%
9	29.307.776,00	29.671.847,76	16,30%
10	31.310.170,64	35.314.959,91	19,40%
11	32.948.493,52	35.679.031,65	19,60%
12	34.550.409,23	36.388.971,57	19,99%
13	36.953.282,79	38.227.533,92	21,00%
14	55.338.506,24	56.431.121,50	31,00%
15	91.199.973,78	92.838.296,66	51,00%
16	120.052.660,09	120.107.270,65	65,96%
17	129.609.543,57	131.065.830,58	72,00%
18	151.453.848,67	152.910.135,67	84,00%
19	152.181.992,17	152.910.135,67	84,00%
20	161.829.654,12	161.829.693,59	88,90%
21	164.560.431,72		
22	182.035.875,80		
23	174.026.297,25		
24	176.210.727,77		
25	182.035.875,80		
VR TOTAL	182.035.875,80		

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

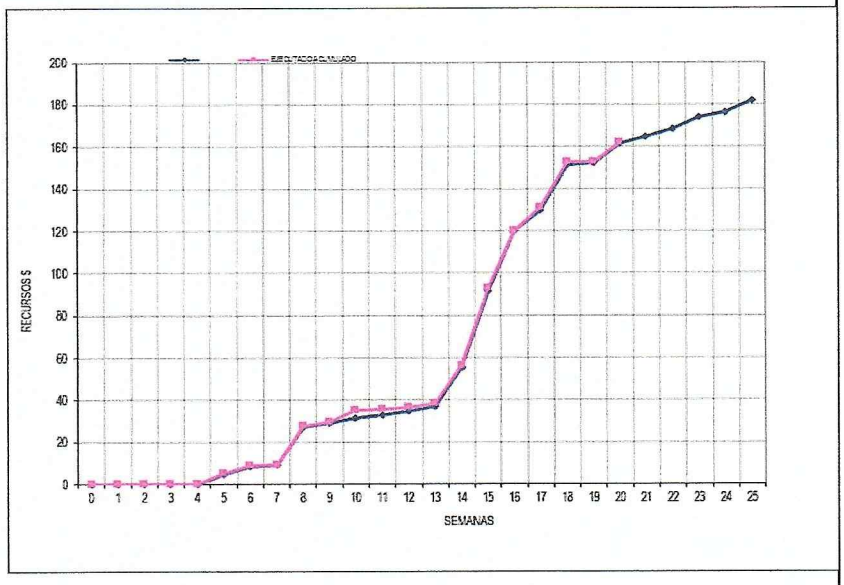

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante la actual quincena se tiene prevista la ejecución de las actividades correspondientes al suministro e instalación de puertas en aluminio con vidrio incoloro de 4 mm y puertas en lámina cold rolled calibre 18, incluyendo sus respectivos marcos y acabados. Asimismo, se contempla la instalación de lavamanos blancos de colgar, con grifería monocontrol, sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante la actual quincena se tiene prevista la ejecución de las actividades correspondientes al suministro e instalación de puertas en aluminio con vidrio incoloro de 4 mm, puertas en lámina cold rolled calibre 18, incluyendo sus respectivos marcos y acabados, así como la instalación de lavamanos de colgar con grifería y demás accesorios. Se espera culminar la totalidad de estas actividades durante la siguiente quincena, dando continuidad al proceso de terminación y adecuación de la infraestructura.


OBSERVACIONES

Durante la actual quincena se dará continuidad a las actividades relacionadas con la instalación de puertas y aparatos sanitarios, esperando culminar estos trabajos en la siguiente quincena y avanzar en la terminación de los diferentes espacios intervenidos.


En constancia se firma

Elaboró	Revisó
ING JAVIER ALEXANDER ARIAS PÉREZ RESIDENTE DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S


REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 10

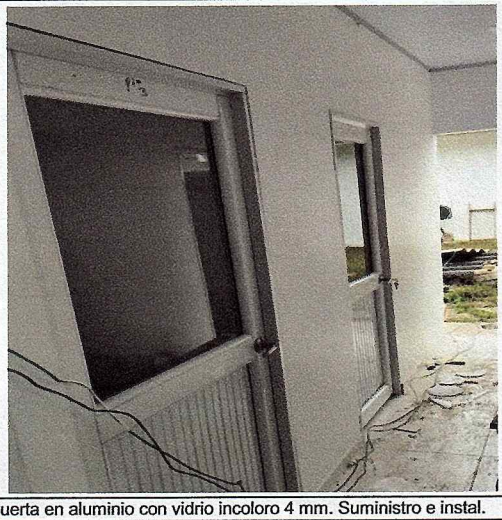

Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.

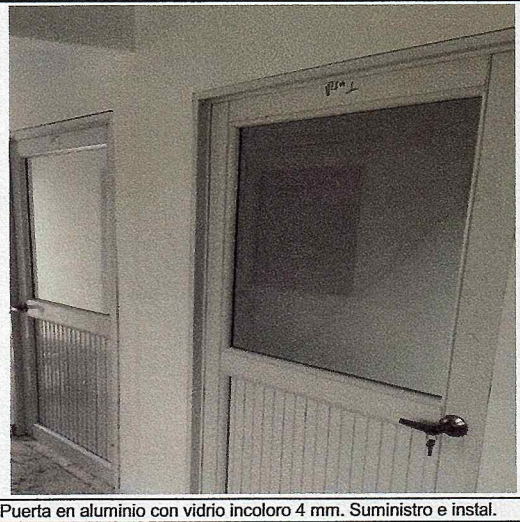

Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.

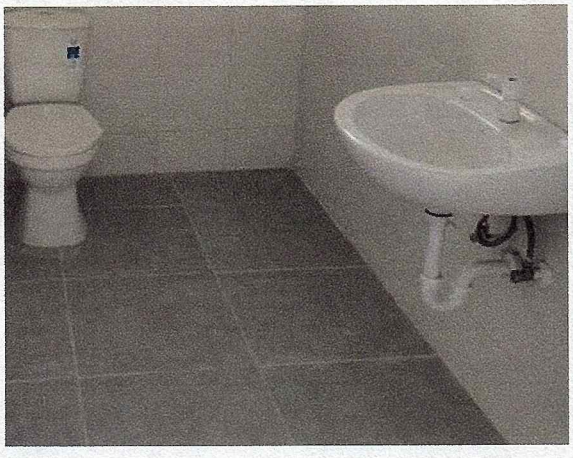

Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media crom



Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico.



Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.



Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.

INFORME SEMANAL DE OBRA
PAPS VEREDA JORDAN BAJO

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	10
MES No.	5

FECHA INICIO INF. Quincenal	11 de juLio del 2026
FECHA FINALIZACIÓN INF. QUINCENAL	25 de julio del 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 156.248.828,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses+30 DIAS DE PRORROGA
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2026

PRORROGAS		
No.	TIEMPO	FECHA
1	30 DIAS	24/07/2025
2	30 dias	24/08/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	FECHA
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	68,90%	69,00%	0,10%
Durante el periodo	20,16%	20,90%	0,74%
Acumulado Actual	89,06%	89,90%	0,84%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
180	140	40	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

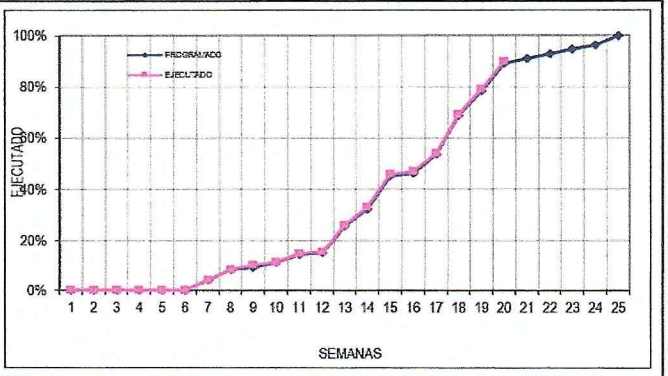


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0%
2	0,00	0,00	0%
3	0,00	0,00	0%
4	0,00	0,00	0%
5	0,00	0,00	0%
6	0,00	0,00	0%
7	6.328.077,53	6.296.827,77	4,03%
8	12.609.280,42	12.624.905,30	8,08%
9	14.218.643,35	15.781.131,63	10,10%
10	17.531.118,50	17.702.992,21	11,33%
11	21.968.585,22	22.656.080,06	14,50%
12	23.499.823,73	23.820.558,73	15,25%
13	39.999.699,97	40.624.695,28	26,00%
14	50.624.620,27	51.562.113,24	33,00%
15	70.311.972,60	71.874.460,88	46,00%
16	72.546.330,84	73.468.198,93	47,02%
17	84.061.869,46	84.374.367,12	54,00%
18	107.655.442,49	107.811.691,32	69,00%
19	122.655.329,98	123.436.574,12	79,00%
20	139.155.206,22	140.467.696,37	89,90%
21	142.217.683,25		
22	144.842.663,56		
23	147.811.391,29		
24	149.998.874,88		
25	156.248.828,00		

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

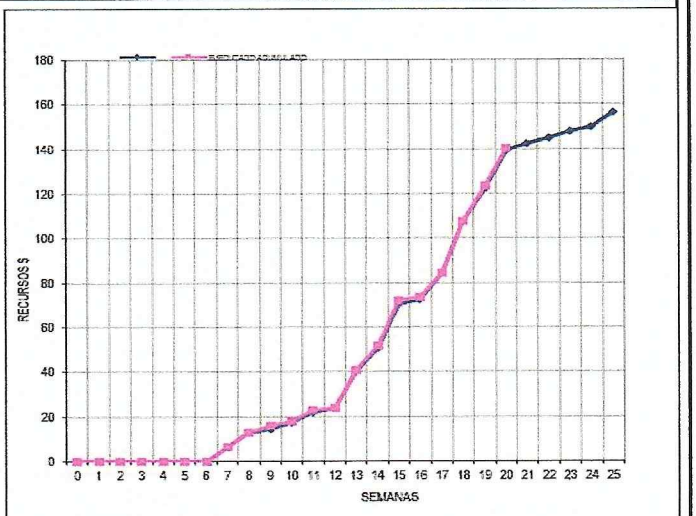

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante la presente quincena se desarrollarán actividades correspondientes a la ejecución de obras de construcción, adecuación y acabados de la infraestructura. Se dará continuidad a los trabajos de mampostería y elementos estructurales, incluyendo la construcción de muros, zapatas, losas y demás elementos en concreto requeridos.

Asimismo, se ejecutarán actividades de acabados, tales como instalación de enchapes de piso y pared, mediacañas, guardaescobas, pañetes, alistados impermeabilizados, estucos y aplicación de pintura interior y exterior. De igual manera, se avanzará en la instalación de cielo raso, mesones, puertas, ventanas, rejas y demás elementos complementarios para la terminación de los espacios.

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, se contempla la instalación del tanque elevado, acometidas hidráulicas, sanitario, lavaplatos, lavamanos y demás accesorios. Paralelamente, se desarrollarán actividades correspondientes a las instalaciones eléctricas, incluyendo acometida en baja tensión, interruptores de protección, salidas para iluminación, instalación de luminarias y demás elementos necesarios para la adecuada distribución y funcionamiento del sistema eléctrico.

Con el desarrollo de estas actividades se espera continuar con el avance general de la obra y la adecuación progresiva de los diferentes espacios intervenidos.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante la presente quincena se desarrollarán actividades correspondientes a obras de construcción, adecuación, instalaciones y acabados de la infraestructura, incluyendo trabajos de mampostería, elementos en concreto, enchapes, pañetes, estucos, pinturas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como la instalación de puertas, ventanas, cielo raso, aparatos sanitarios y demás elementos complementarios.

Se espera que estas actividades sean culminadas durante la siguiente quincena, permitiendo avanzar en la terminación y adecuación integral de los espacios intervenidos.


OBSERVACIONES

Durante la presente quincena se desarrollarán actividades correspondientes a obras de construcción, adecuación, instalaciones y acabados de la infraestructura, incluyendo trabajos de mampostería, elementos en concreto, enchapes, pañetes, estucos, pinturas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como la instalación de puertas, ventanas, cielo raso, aparatos sanitarios y demás elementos complementarios.


Se espera que estas actividades sean culminadas durante la siguiente quincena, permitiendo avanzar en la terminación y adecuación integral de los espacios intervenidos.

En constancia se firma	
Elaboró	**Revisó**
ING ALEXANDER MENA ORDUZ RESIDENTE DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 10

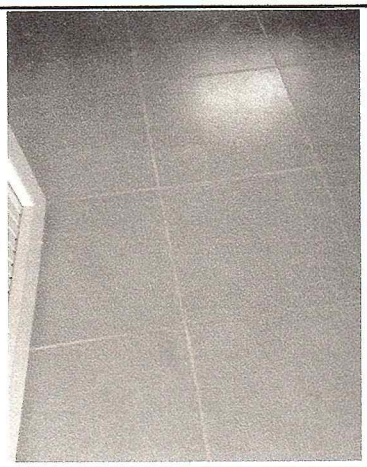


Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.

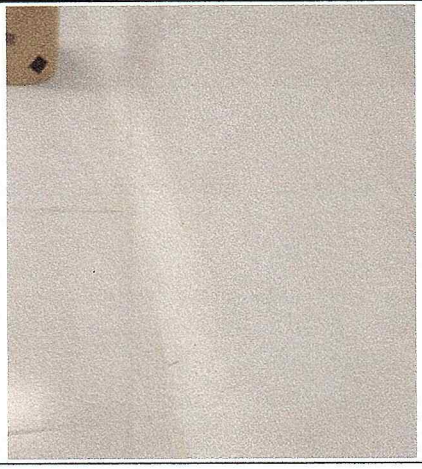


Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m




Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.

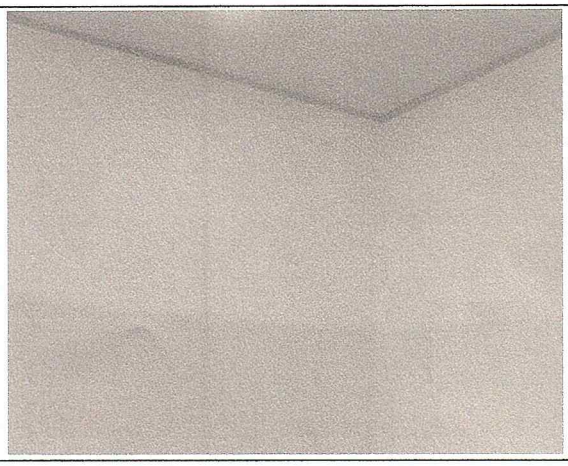


Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos

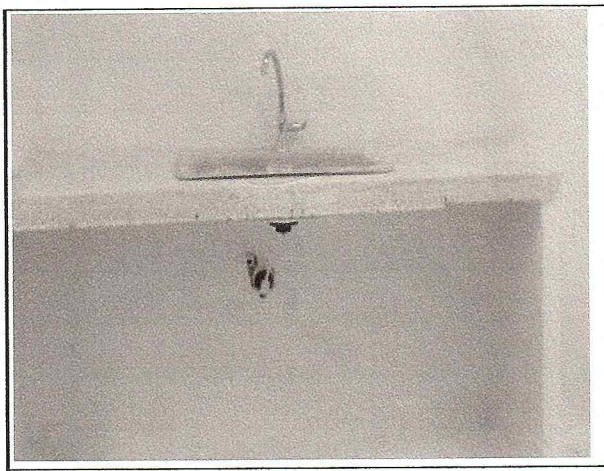


Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito puli

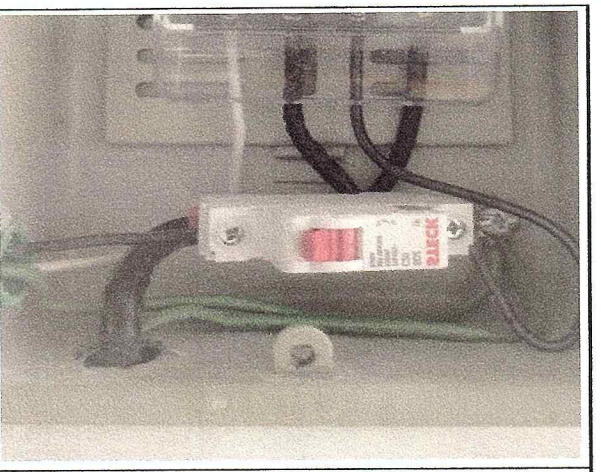


Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e inst

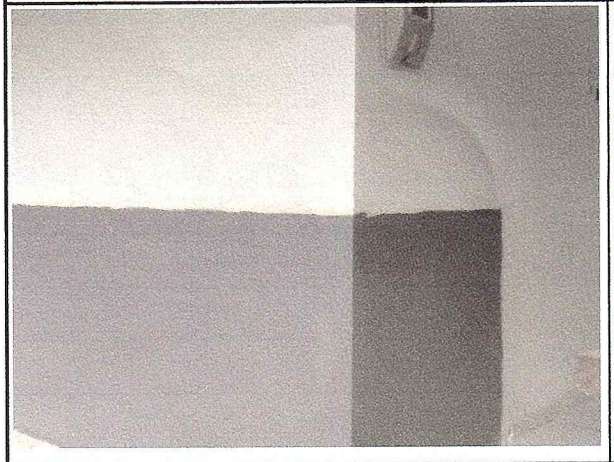

Estuco plástico muros. Suministro e Instal

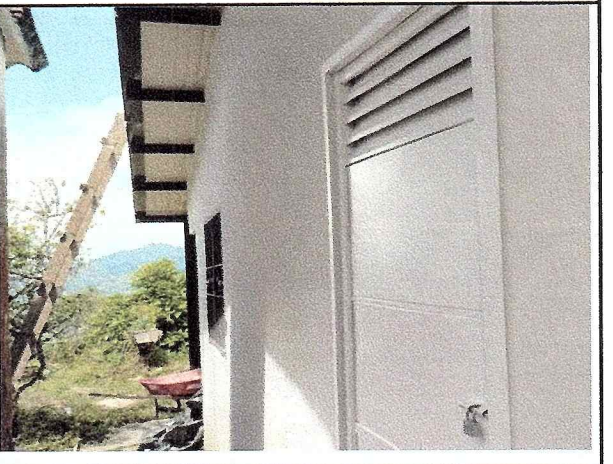

Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con

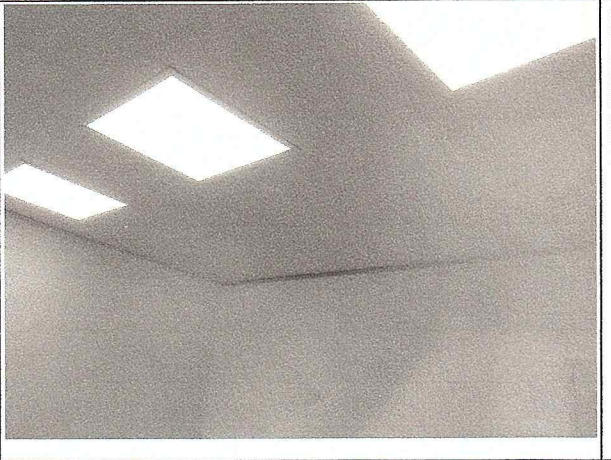

Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, c



Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalaci

INFORME SEMANAL DE OBRA
PAPS VEREDA JORDAN BAJO

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	9
MES No.	5

FECHA INICIO INF. Quincenal	26 de junio del 2026
FECHA FINALIZACIÓN INF. QUINCENAL	10 de julio del 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 156.248.828,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses+30 DIAS DE PRORROGA
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2026

PRORROGAS		
No.	TIEMPO	FECHA
1	30 DIAS	24/07/2025
2	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	FECHA
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	46,43%	47,02%	0,59%
Durante el periodo	32,07%	31,98%	0,09%
Acumulado Actual	78,50%	79,00%	0,50%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
150	126	24	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

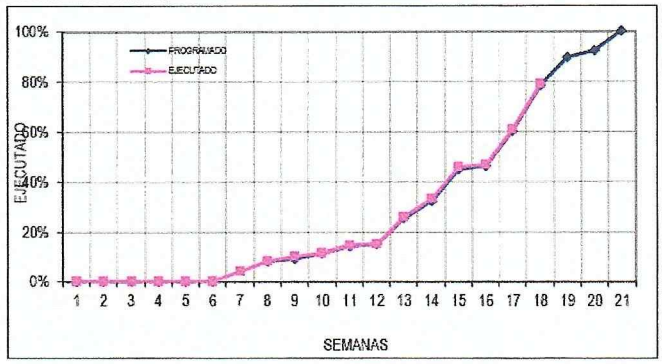


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0%
2	0,00	0,00	0%
3	0,00	0,00	0%
4	0,00	0,00	0%
5	0,00	0,00	0%
6	0,00	0,00	0%
7	0,00	6.296.827,77	4,03%
8	12.609.280,42	12.624.905,30	8,08%
9	14.218.643,35	15.781.131,63	10,10%
10	17.531.118,50	17.702.992,21	11,33%
11	21.968.585,22	22.656.080,06	14,50%
12	23.499.823,73	23.820.558,73	15,25%
13	39.999.699,97	40.624.695,28	26,00%
14	50.624.620,27	51.562.113,24	33,00%
15	70.311.972,60	71.874.460,88	46,00%
16	72.546.330,84	73.468.198,93	47,02%
17	94.530.540,94	95.311.785,08	61,00%
18	122.655.329,98	123.436.574,12	79,00%
19	139.998.949,89		
20	144.530.165,90		
21	156.248.828,00		
VR TOTAL	156.248.828,00		

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

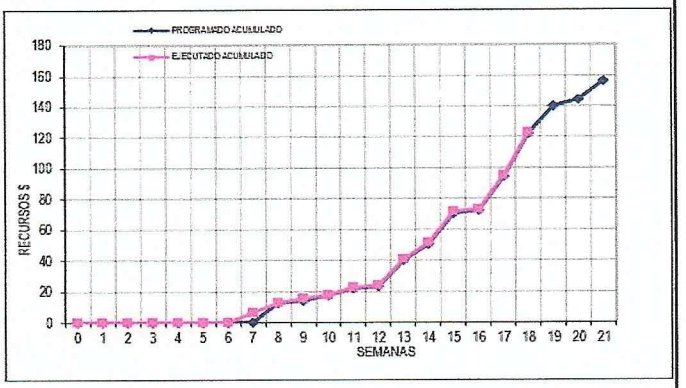

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante el período reportado se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción, adecuación y terminación de los diferentes espacios de la infraestructura. Dentro de las actividades desarrolladas se incluyeron trabajos de mampostería y elementos estructurales, tales como la construcción de muros en bloque de arcilla, placa base, poyos, columnetas, columnas y losa maciza elevada en concreto de 3.000 psi, junto con la instalación del acero de refuerzo requerido.

Asimismo, se adelantaron actividades relacionadas con la instalación de la cubierta tipo sándwich, caballetes y canales metálicas, complementando los trabajos de protección y conformación de la estructura. En los espacios interiores se ejecutaron actividades de enchape de muros en cerámica, instalación de cielo raso en lámina PVC, rinconeras, aplicación de estuco plástico, estuco y vinilo interior, así como pintura acrílica de alta asepsia, contribuyendo a la adecuación y terminación de las áreas intervenidas.

De igual manera, se realizaron actividades correspondientes a la instalación de elementos sanitarios e hidráulicos, incluyendo sanitario de bajo consumo, lavamanos, registros y llaves terminales, con sus respectivos accesorios y conexiones.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se desarrollaron trabajos relacionados con la acometida en baja tensión, instalación del medidor de energía, sistema de puesta a tierra, tablero trifásico y dispositivos de protección. Asimismo, se ejecutaron las salidas para iluminación, interruptores sencillos y dobles, tomacorrientes convencionales y GFCI, junto con la acometida en cable de cobre para la alimentación del tablero de distribución.

Finalmente, se adelantó la instalación de ventanas y puertas en aluminio con sus respectivos vidrios, como parte de las actividades de cerramiento y terminación de la infraestructura. En conjunto, estas actividades permitieron dar continuidad al proceso constructivo y avanzar en la adecuación integral de los diferentes espacios intervenidos.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante la siguiente quincena se tiene prevista la ejecución y continuidad de actividades de obra correspondientes a acabados, mampostería, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como trabajos de estructura y cerramiento. Entre estas actividades se encuentran la instalación de enchapes de piso y pared, aplicación de pañetes, estucos y pinturas, construcción de elementos en concreto y mampostería, instalación de cielo raso, puertas, ventanas, rejas y demás elementos complementarios.

Asimismo, se desarrollarán actividades relacionadas con la instalación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos, tanque elevado, acometidas y redes hidráulicas, además de la ejecución de las instalaciones eléctricas, incluyendo acometidas, salidas para iluminación, interruptores y montaje de luminarias. Con el desarrollo de estas actividades se espera continuar avanzando en la adecuación y terminación de los espacios intervenidos.

OBSERVACIONES
Durante la siguiente quincena se dará continuidad a las actividades programadas, priorizando los trabajos de acabados, instalaciones y elementos complementarios, con el fin de avanzar en la terminación y adecuación general de la infraestructura.

En constancia se firma

Elaboró	Revisó
ING ALEXANDER MENA ORDUZ RESIDENTE DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 9



Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm




Lavaplatos de sobreponer liso en acero inoxidable 150 x 52 cm con griferia monocontrol tipo Aluvia de corona incluye acoples y kit desague. Suministro e Instal.



Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones



Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm

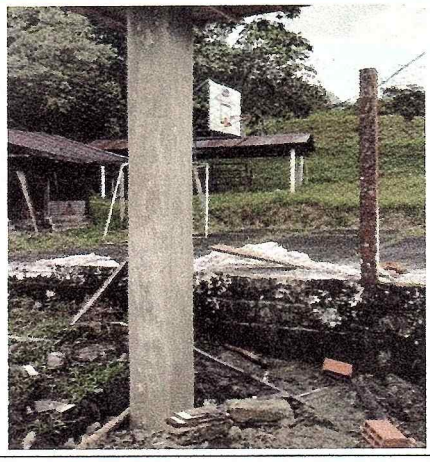	
Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m
	
Columna en concreto de resistencia 3000 psi	ministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor,

INFORME QUINCENAL DE OBRA
PAPS VEREDA GURUVITO

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	**10**	**FECHA INICIO INF. QUINCENAL**	11 de julio del 2026
MES No.	5	**FECHA FINALIZACIÓN INF. QUINCENAL**	25 de julio de 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 143.073.562,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2026

PRORROGAS		
No.	**TIEMPO**	**FECHA**
1	30 DIAS	24/07/2026
2	30 DIAS	24/08/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	**TIEMPO**	**FECHA**
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	11,10%	11,10%	8,03%
Durante el periodo	1,50%	1,50%	0,00%
Acumulado Actual	12,60%	12,60%	8,03%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
180	140	40	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

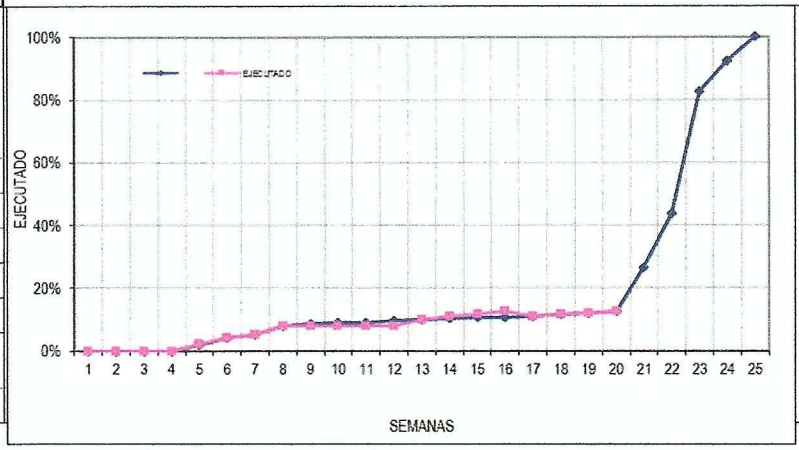


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0%
2	0,00	0,00	0%
3	0,00	0,00	0%
4	0,00	0,00	0%
5	3.004.544,80	3.147.618,36	2,20%
6	6.166.470,52	6.295.236,73	4,40%
7	7.582.898,79	7.725.972,35	5,40%
8	11.402.962,89	11.488.807,03	8,03%
9	12.304.326,33	11.488.807,03	8,03%
10	12.733.547,02	11.488.807,03	8,03%
11	13.019.694,14	11.488.807,03	8,03%
12	13.735.061,95	11.488.807,03	8,03%
13	14.164.282,64	14.307.356,20	10,00%
14	15.022.724,01	15.738.091,82	11,00%
15	15.165.797,57	16.596.533,19	11,60%
16	15.451.944,70	18.041.576,17	12,61%
17	15.881.165,38	15.881.165,38	11,10%
18	16.596.533,19	16.596.533,19	11,60%
19	17.168.827,44	17.168.827,44	12,00%
20	18.027.268,81	18.027.268,81	12,60%
21	37.914.493,93		
22	62.380.073,03		
23	118.178.762,21		
24	132.199.971,29		
25	143.073.562,00		
VR TOTAL			

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

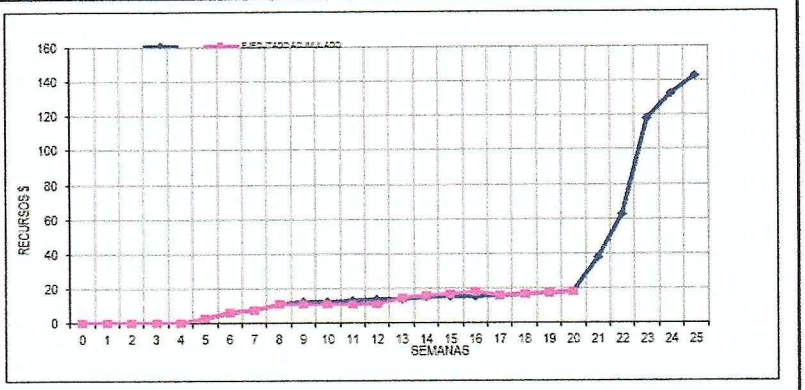

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante la quincena correspondiente al presente informe no se ejecutaron actividades de obra, por lo cual no se presentaron avances físicos en el proyecto. En consecuencia, se mantienen las condiciones y el porcentaje de ejecución reportados al cierre de la quincena anterior.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante la quincena objeto del presente informe no fue posible adelantar actividades de obra, por lo que no se generaron avances físicos en el proyecto. Por tal motivo, se conserva el estado de ejecución registrado al finalizar la quincena anterior.

Para el próximo período se prevé contar con condiciones más favorables en las vías de acceso, permitiendo retomar las actividades previstas y continuar con el avance de las obras programadas.


OBSERVACIONES

Con la prórroga otorgada fue posible ajustar los porcentajes de avance, logrando una mayor concordancia entre las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas. De igual manera, durante el período se presentó el acta de mayores y menores cantidades, como parte de los ajustes necesarios para dar continuidad y favorecer el adecuado desarrollo del proyecto.

En constancia se firma

Elaboró	Revisó
Enyer Farid MR	
ING ENYER FARID MIRANDA ROJAS	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA
INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 10

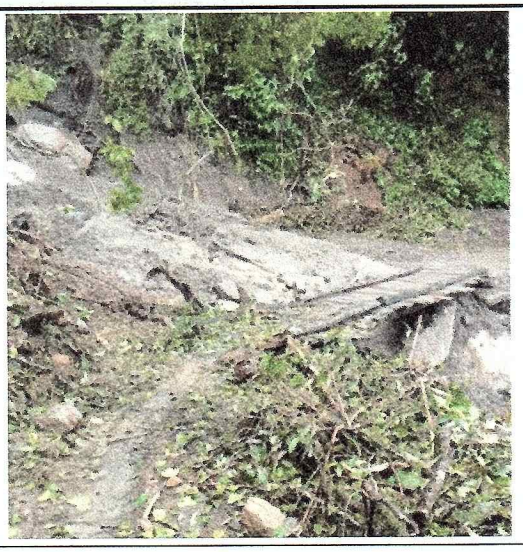	
AFECTACIONES EN VIA DE ACCESO AL PAPS	AFECTACIONES EN VIA DE ACCESO AL PAPS

INFORME QUINCENAL DE OBRA
PAPS VEREDA GURUVITO

CONTRATO	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

INFORME QUINCENAL DE OBRA

QUINCENA No.	9	FECHA INICIO INF. QUINCENAL	26 de junio del 2026
MES No.	5	FECHA FINALIZACIÓN INF. QUINCENAL	10 de julio de 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	MILAR C&S S.A.S
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONATAN VELASCO ALBARRACÍN

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE
CONTRATO No	No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 481.358.266,00
VALOR DEL P.A.P.S.	$ 143.073.562,00
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2026

PRORROGAS		
No.	TIEMPO	FECHA
1	30 DIAS	24/07/2026
2	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	FECHA
SUSPENSION No. 1	N/A	N/A
AMPLIACION No.1 SUSPENSION 1	N/A	N/A

CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	36,80%	12,61%	8,03%
Durante el periodo	2,10%	0,00%	-2,10%
Acumulado Actual	38,90%	12,61%	8,03%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	
150	126	24	

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA

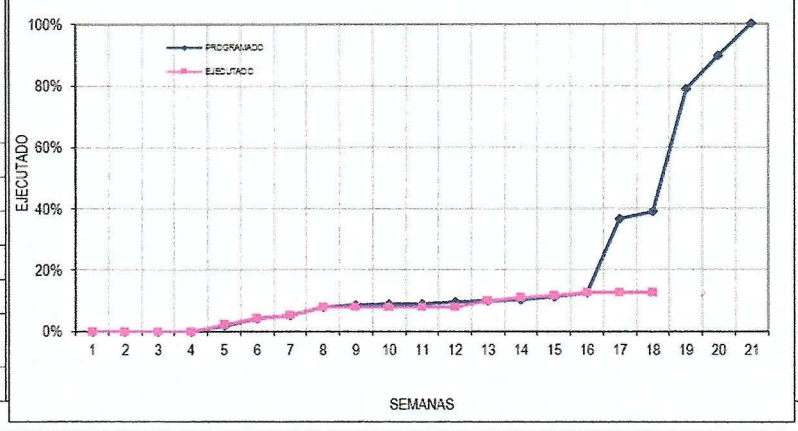


CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

SEMANA	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
1	0,00	0,00	0%
2	0,00	0,00	0%
3	0,00	0,00	0%
4	0,00	0,00	0%
5	3.004.544,80	3.147.618,36	2,20%
6	6.166.470,52	6.295.236,73	4,40%
7	7.582.898,79	7.725.972,35	5,40%
8	11.402.962,89	11.488.807,03	8,03%
9	12.304.326,33	11.488.807,03	8,03%
10	12.733.547,02	11.488.807,03	8,03%
11	13.019.694,14	11.488.807,03	8,03%
12	13.735.061,95	11.488.807,03	8,03%
13	14.164.282,64	14.307.356,20	10,00%
14	15.022.724,01	15.738.091,82	11,00%
15	16.453.459,63	16.596.533,19	11,60%
16	18.041.576,17	18.041.576,17	12,61%
17	52.651.070,82	52.937.217,94	37,00%
18	55.655.615,62	55.798.689,18	39,00%
19	112.885.040,42		
20	128.136.682,13		
21	143.073.562,00		
VR TOTAL			

GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

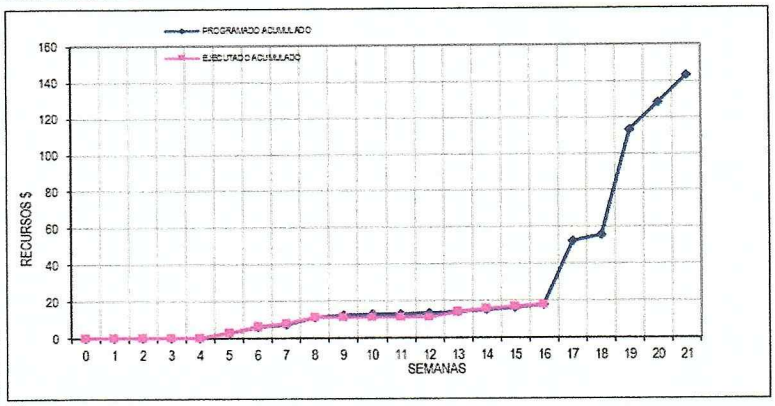

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

Durante la quincena correspondiente al presente informe no se ejecutaron actividades de obra, por lo cual no se presentaron avances físicos en el proyecto. En consecuencia, se mantienen las condiciones y el porcentaje de ejecución reportados al cierre de la quincena anterior.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE QUINCENA

Durante la quincena objeto del presente informe no fue posible adelantar actividades de obra, por lo que no se generaron avances físicos en el proyecto. Por tal motivo, se conserva el estado de ejecución registrado al finalizar la quincena anterior.

Para el próximo período se prevé contar con condiciones más favorables en las vías de acceso, permitiendo retomar las actividades previstas y continuar con el avance de las obras programadas.

OBSERVACIONES

Con la prórroga otorgada fue posible ajustar los porcentajes de avance, logrando una mayor concordancia entre las actividades programadas y las efectivamente ejecutadas. De igual manera, durante el período se presentó el acta de mayores y menores cantidades, como parte de los ajustes necesarios para dar continuidad y favorecer el adecuado desarrollo del proyecto.

En constancia se firma

Elaboró	Revisó
Enyer farid MR	
ING ENYER FARID MIRANDA ROJAS RESIDENTE DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S	**JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ** DIRECTOR DE OBRA INGENIERIA CIVILCAS S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUINCENA 9




AFECTACIONES EN VIA DE ACCESO AL PAPS



AFECTACIONES EN VIA DE ACCESO AL PAPS

CRONOGRAMA: BARRIALES N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
0		**CRONOGRAMA BARRIALES**	**205 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 24/10/26**
1	**00**	**ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO**	**68 días**	**mar 24/02/26**	**jue 14/05/26**
2	00.01	Visitas a campo	15 días	mar 24/02/26	jue 12/03/26
3	00.02	socializaciones	10 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26
4	00.03	compras	20 días	mar 24/03/26	vie 17/04/26
5	00.04	Contratación de personal de obra	15 días	vie 17/04/26	mié 6/05/26
6	00.05	Afiliaciones a seguridad social	8 días	mié 6/05/26	jue 14/05/26
7	**01**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**109,63 días**	**mar 24/03/26**	**mié 5/08/26**
8	01.01	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	15 días	vie 15/05/26	mar 2/06/26
9	01.02	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	15 días	vie 15/05/26	mar 2/06/26
10	01.03	Desmonte aparatos sanitarios	12 días	mar 2/06/26	jue 18/06/26
11	01.04	Desmonte de ventanas, con transporte	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
12	01.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
13	01.06	Demolicion enchape muros con retiro	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
14	01.07	Demolicion muro en ladrillo brecha de 0.12*0.25 m para insercion de columna	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26
15	01.08	Desmonte correas	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
16	01.09	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	8 días	jue 18/06/26	sáb 27/06/26
17	01.10	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	15 días	vie 12/06/26	jue 2/07/26
18	01.11	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	15 días	sáb 27/06/26	jue 16/07/26
19	01.12	Desmonte tableros electricos	8 días	jue 2/07/26	sáb 11/07/26
20	01.13	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	8 días	jue 16/07/26	lun 27/07/26
21	01.14	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	8 días	lun 27/07/26	mié 5/08/26
22	**02**	**PISOS Y ENCHAPES**	**108,5 días**	**jue 5/03/26**	**mar 14/07/26**
23	02.01	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	8 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26
24	02.02	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	1 día	jue 5/03/26	vie 6/03/26
25	02.03	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	16 días	mar 9/06/26	mar 30/06/26
26	02.04	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	12 días	mié 1/07/26	mar 14/07/26
27	02.05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	15 días	sáb 2/05/26	jue 21/05/26
28	02.06	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	1 día	jue 5/03/26	vie 6/03/26
29	02.07	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	8 días	sáb 30/05/26	mar 9/06/26
30	02.08	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 ps	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26
31	**03**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**127,75 días**	**jue 21/05/26**	**lun 19/10/26**
32	03.01	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	8 días	jue 16/07/26	lun 27/07/26
33	03.02	Punto agua fria PVC 1/2"	8 días	lun 27/07/26	mié 5/08/26
34	03.03	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e Instal.	2 días	mar 7/07/26	jue 9/07/26
35	03.04	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	3 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26

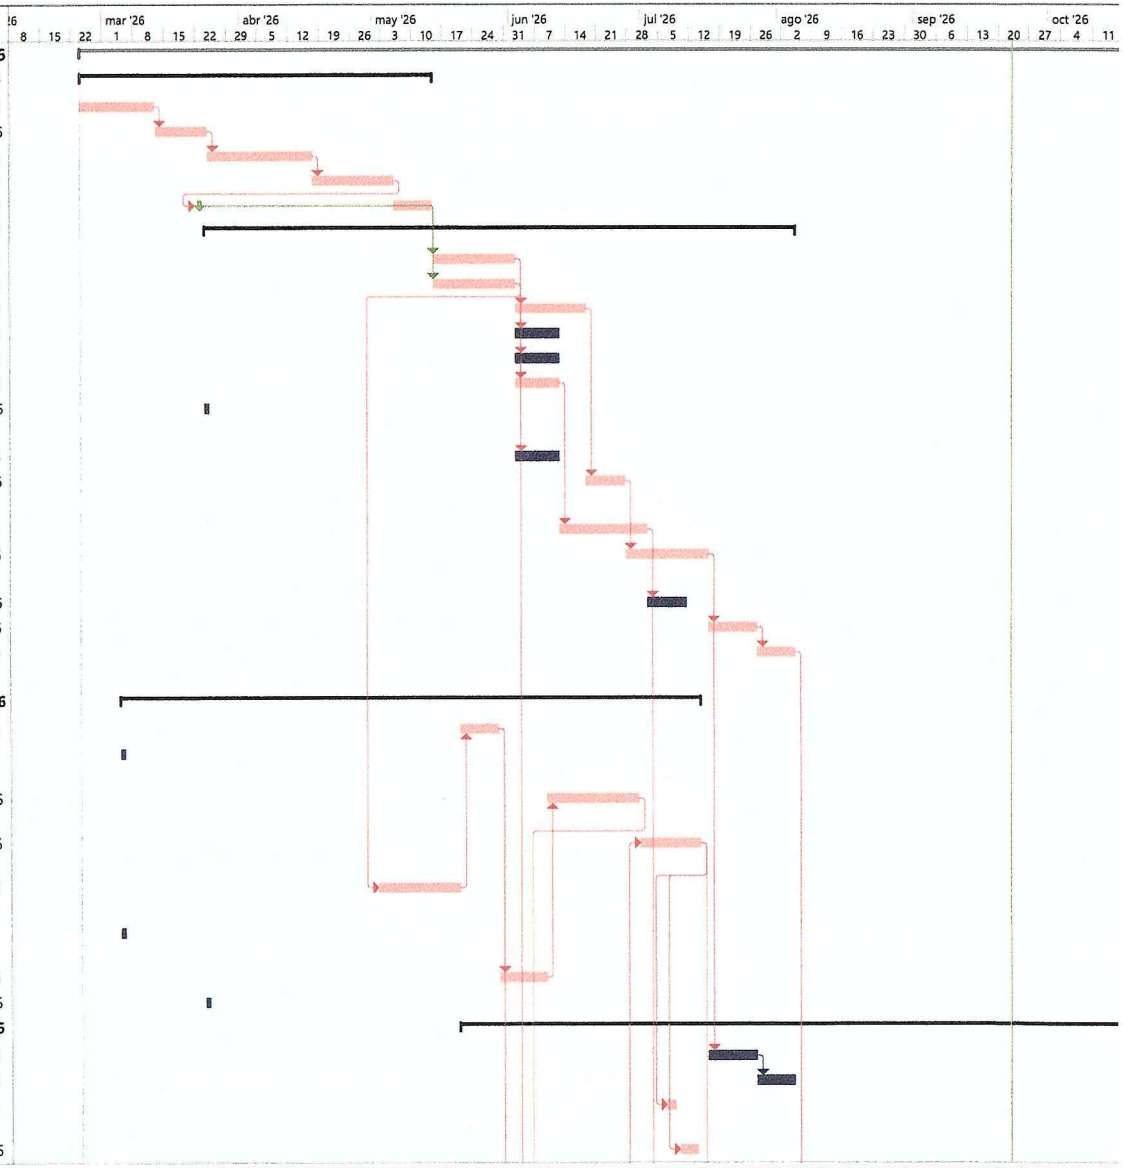


CRONOGRAMA BARRIALES
ELABORA: INGENIERIA CIVILCAS

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA: BARRIALES N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
36	03.05	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	12 días	mar 6/10/26	lun 19/10/26
37	03.06	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	1 día	jue 21/05/26	vie 22/05/26
38	**04**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**34 días**	**jue 2/07/26**	**mar 11/08/26**
39	04.01	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	7 días	jue 2/07/26	vie 10/07/26
40	04.02	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	7 días	vie 10/07/26	sáb 18/07/26
41	04.03	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon	7 días	sáb 18/07/26	mar 28/07/26
42	04.04	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	7 días	sáb 18/07/26	mar 28/07/26
43	04.05	Excavacion manual en conglomerado	6 días	mar 28/07/26	mar 4/08/26
44	04.06	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	7 días	mar 4/08/26	mar 11/08/26
45	**05**	**APARATOS SANITARIOS**	**5,88 días**	**lun 13/07/26**	**sáb 18/07/26**
46	05.01	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	1 día	mié 15/07/26	mié 15/07/26
47	05.02	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e Instal.	5 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26
48	05.03	Lavaplatos de sobreponer liso en acero inoxidable 150 x 52 cm con griferia monocontrol tipo Aluvia de corona incluye acoples y kit desague. Suministroeinstal.	5 días	mar 14/07/26	sáb 18/07/26
49	**06**	**MUROS Y ACABADOS**	**72 días**	**lun 27/04/26**	**vie 24/07/26**
50	06.01	Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar calidad	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26
51	06.02	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	16 días	sáb 13/06/26	sáb 4/07/26
52	06.03	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
53	06.04	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	6 días	jue 11/06/26	vie 19/06/26
54	06.05	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	15 días	mar 7/07/26	vie 24/07/26
55	06.06	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26
56	06.07	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	8 días	mar 2/06/26	vie 12/06/26
57	06.08	Estuco plástico muros. Suministro e instal	7 días	mar 2/06/26	jue 11/06/26
58	**07**	**CUBIERTA**	**83,5 días**	**sáb 6/06/26**	**mar 15/09/26**
59	07.01	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
60	07.02	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
61	07.03	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	7 días	vie 21/08/26	sáb 29/08/26
62	07.04	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	5 días	sáb 29/08/26	vie 4/09/26
63	07.05	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
64	07.06	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal.	8 días	sáb 29/08/26	mar 8/09/26
65	07.07	Bajante A.LL. PVC 4"	4 días	mar 8/09/26	sáb 12/09/26
66	07.08	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	6 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26

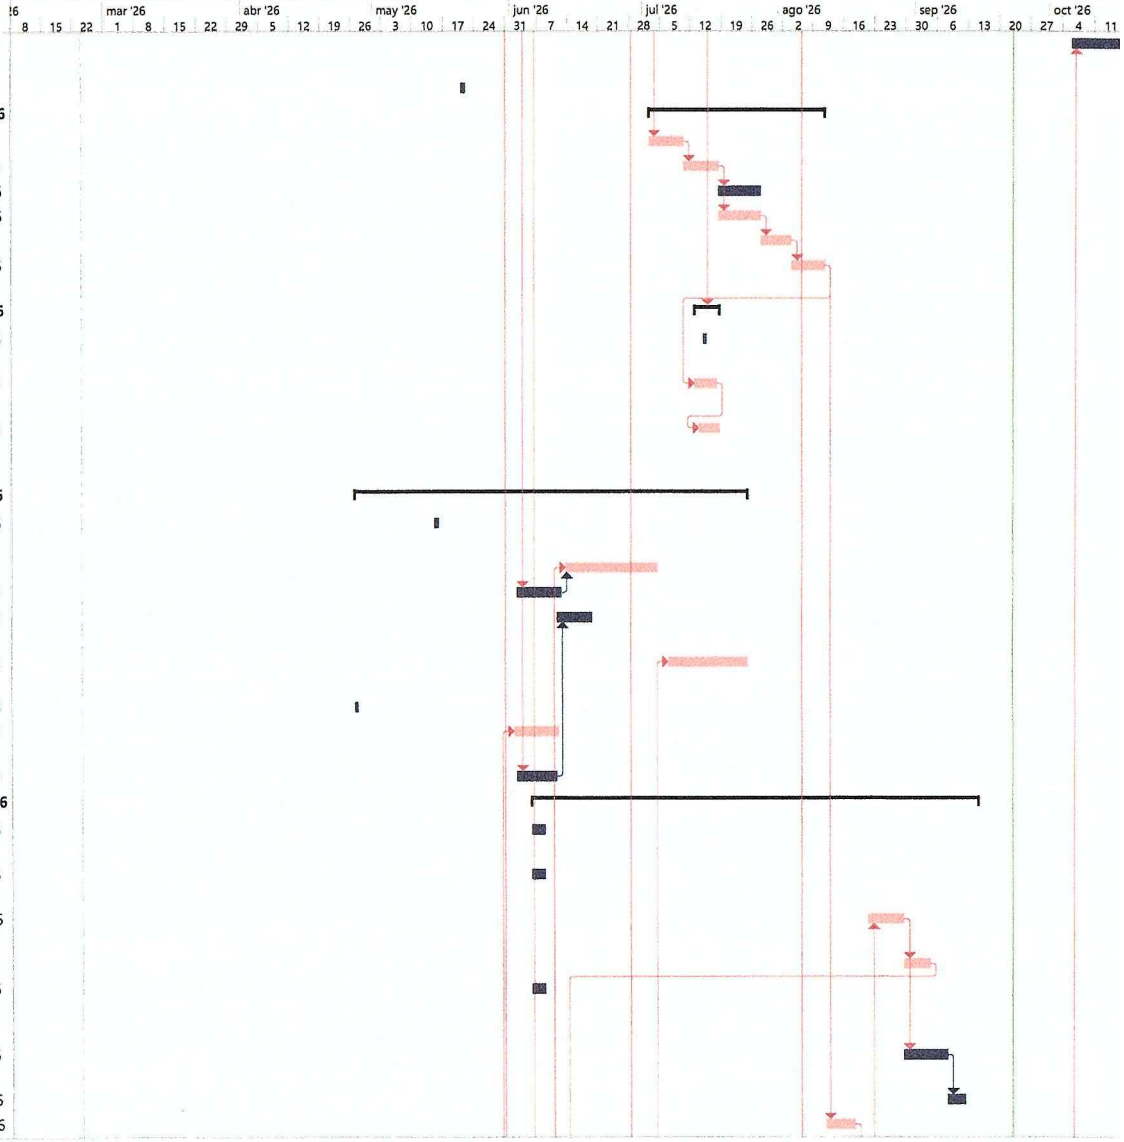


CRONOGRAMA BARRIALES
ELABORA: INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · División · Hito · Resumen
Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo
Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual
solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo
Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA: BARRIALES N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
67	07.09	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	16 días	jue 27/08/26	mar 15/09/26
68	07.10	Columneta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
69	07.11	Platina 0.25*025 m en lamina HR 1/4" con anclajes de 3/8". Suministro e instalacion	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
70	07.12	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
71	07.13	Acero de Refuerzo Grado 60	8 días	mar 18/08/26	jue 27/08/26
72	07.14	Excavacion manual en conglomerado	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26
73	**08**	**ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO**	**34 días**	**jue 27/08/26**	**lun 5/10/26**
74	08.01	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	3 días	jue 27/08/26	lun 31/08/26
75	08.02	Acero de Refuerzo Grado 60	4 días	jue 27/08/26	mar 1/09/26
76	08.03	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	8 días	mar 1/09/26	jue 10/09/26
77	08.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	10 días	jue 10/09/26	mar 22/09/26
78	08.05	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m.	8 días	mar 22/09/26	jue 1/10/26
79	08.06	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	4 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26
80	**09**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**162,5 días**	**mar 24/02/26**	**lun 7/09/26**
81	09.01	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	15 días	sáb 11/07/26	mié 29/07/26
82	09.02	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	8 días	mié 29/07/26	vie 7/08/26
83	09.03	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	4 días	vie 7/08/26	mié 12/08/26
84	09.04	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	3 días	mié 12/08/26	sáb 15/08/26
85	09.05	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	3 días	mié 12/08/26	sáb 15/08/26
86	09.06	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	4 días	sáb 15/08/26	jue 20/08/26
87	09.07	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijació	6 días	jue 20/08/26	jue 27/08/26
88	09.08	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26
89	09.09	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	5 días	jue 20/08/26	mié 26/08/26
90	09.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26
91	09.11	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	5 días	mié 26/08/26	mar 1/09/26

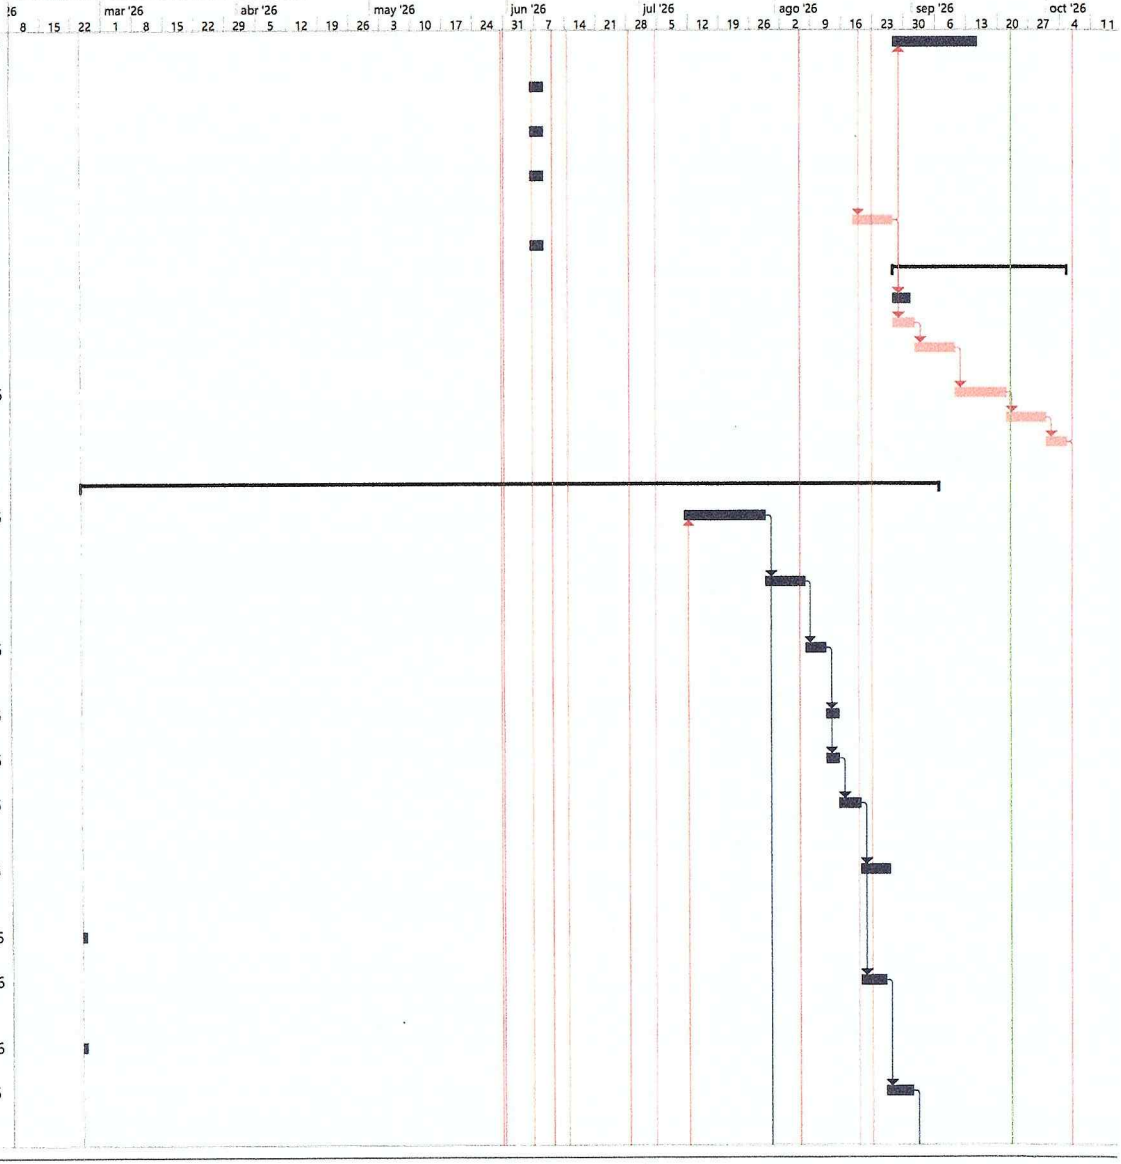


CRONOGRAMA BARRIALES
ELABORA: INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

CRONOGRAMA: BARRIALES N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
92	09.12	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	5 días	mar 1/09/26	lun 7/09/26
93	09.13	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	5 días	mar 1/09/26	lun 7/09/26
94	09.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	5 días	mar 1/09/26	lun 7/09/26
95	09.15	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	4 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26
96	**10**	**CARPINTERIA METALICA**	**18 días**	**sáb 4/07/26**	**sáb 25/07/26**
97	10.01	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	12 días	sáb 11/07/26	sáb 25/07/26
98	10.02	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	7 días	sáb 4/07/26	dom 12/07/26
99	**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**124,88 días**	**sáb 30/05/26**	**sáb 24/10/26**
100	NP.1	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0,12m (33 x 12 x 23).	12 días	mié 5/08/26	mar 18/08/26
101	NP.2	Pañete interior allanado 1:4 espesor 2 cm	12 días	mar 18/08/26	mar 1/09/26
102	NP.3	Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e Instal	7 días	vie 16/10/26	sáb 24/10/26
103	NP.4	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3 x 2. Suministro e Instal.	5 días	mar 9/06/26	dom 14/06/26
104	NP.5	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2. Suministro e Instal.	5 días	mar 6/10/26	sáb 10/10/26
105	NP.6	Acometida red hidraulica pvc 1/2 x 10 m	5 días	lun 12/10/26	vie 16/10/26
106	NP.7	Llave terminal manguera 1/2	5 días	mar 6/10/26	sáb 10/10/26
107	NP.8	Puerta en lamina Cold Rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	6 días	lun 13/07/26	sáb 18/07/26
108	NP.9	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa).	20 días	mié 17/06/26	vie 10/07/26
109	NP.10	Guardaescoba en ceramica 60 * 10 cm. Suministro e instalación	8 días	lun 13/07/26	jue 23/07/26
110	NP.11	Piso ceremica 0.60x0.60mt, trafico comercial.	30 días	sáb 30/05/26	mar 7/07/26
111	NP.12	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada.	16 días	mar 18/08/26	sáb 5/09/26
112	NP.13	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	5 días	mar 7/07/26	lun 13/07/26
113	NP.14	Correa metalica en perfil estructural Rectangular 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	3 días	mar 18/08/26	vie 21/08/26

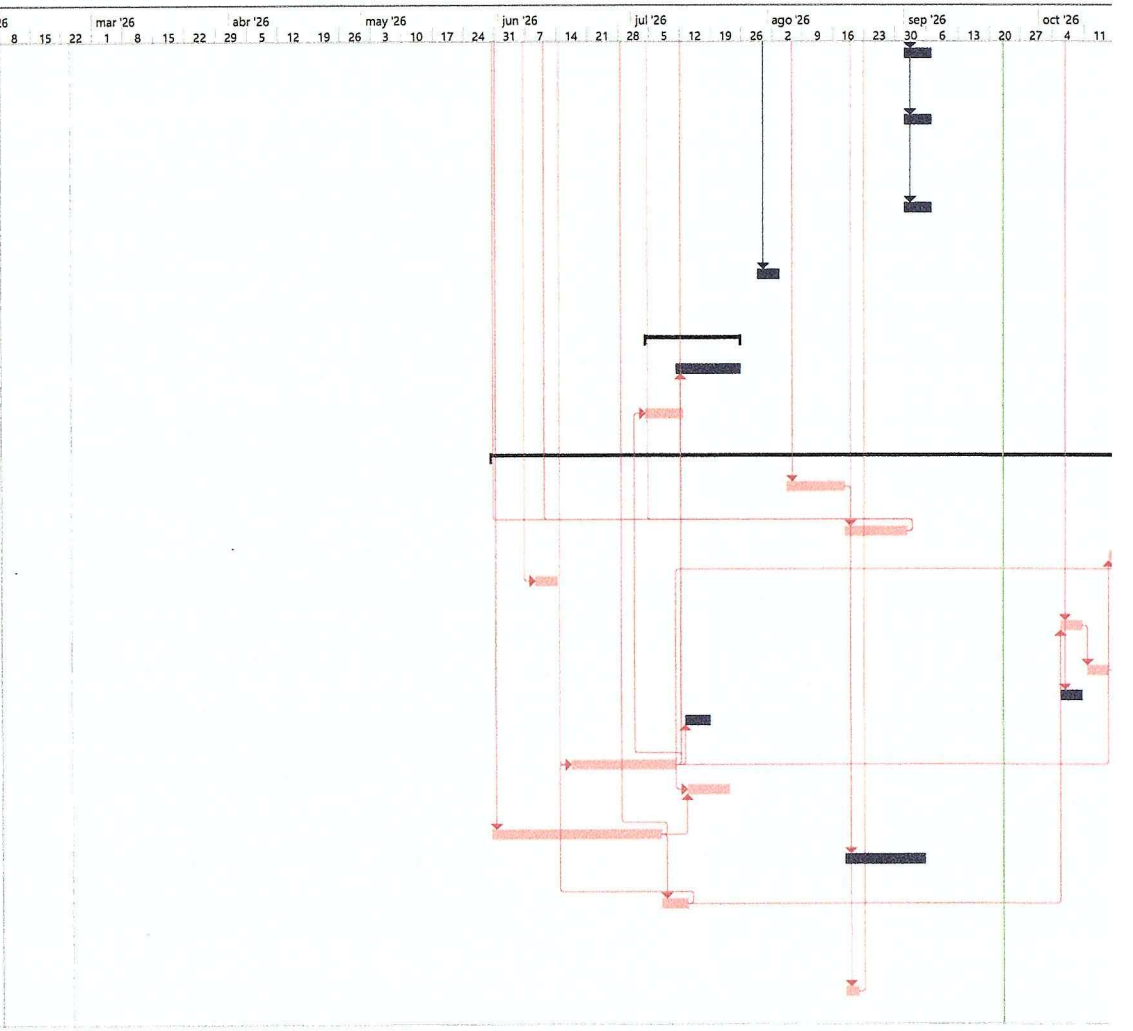


CRONOGRAMA BARRIALES
ELABORA: INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

CRONOGRAMA: GURUVITA N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
0		**CRONOGRAMA GURUVITO**	**203,25 días**	**mar 24/02/26**	**sáb 24/10/26**
1	00	**ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO**	**26 días**	**mar 24/02/26**	**jue 26/03/26**
2	00.01	Visitas a campo	5 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26
3	00.02	socializaciones	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26
4	00.03	compras	8 días	mar 3/03/26	mié 11/03/26
5	00.04	Contratación de personal de obra	4 días	jue 12/03/26	lun 16/03/26
6	00.05	Afiliaciones a seguridad social	8 días	lun 16/03/26	jue 26/03/26
7	01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**38 días**	**jue 26/03/26**	**mar 12/05/26**
8	01.01	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	3 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26
9	01.02	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	10 días	jue 26/03/26	jue 9/04/26
10	01.03	Desmonte aparatos sanitarios	6 días	jue 9/04/26	jue 16/04/26
11	01.04	Desmonte de ventanas, con transporte	2 días	jue 16/04/26	sáb 18/04/26
12	01.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	2 días	sáb 18/04/26	mar 21/04/26
13	01.06	Demolicion enchape muros con retiro	4 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26
14	01.07	Desmonte correas	3 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26
15	01.08	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26
16	01.09	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26
17	01.10	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26
18	01.11	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
19	02	**PISOS Y ENCHAPES**	**36 días**	**mar 8/09/26**	**lun 19/10/26**
20	02.01	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	8 días	jue 17/09/26	sáb 26/09/26
21	02.02	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	1 día	sáb 26/09/26	lun 28/09/26
22	02.03	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e instal.	4 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26
23	02.04	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	4 días	mar 6/10/26	sáb 10/10/26
24	02.05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	4 días	mar 8/09/26	sáb 12/09/26
25	02.06	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	4 días	sáb 10/10/26	jue 15/10/26
26	02.07	Mediacaña mortero Imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	4 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26
27	03	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**16 días**	**lun 24/08/26**	**jue 10/09/26**
28	03.01	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	6 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26
29	03.02	Punto agua fria PVC 1/2"	6 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26
30	03.03	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	1 día	mar 8/09/26	mié 9/09/26
31	03.04	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	1 día	mié 9/09/26	jue 10/09/26
32	03.05	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	2 días	sáb 5/09/26	mar 8/09/26
33	04	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**52 días**	**lun 24/08/26**	**mié 21/10/26**
34	04.01	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	6 días	mar 1/09/26	mar 8/09/26
35	04.02	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	6 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26
36	04.03	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon	6 días	mar 15/09/26	mar 22/09/26
37	04.04	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	6 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26

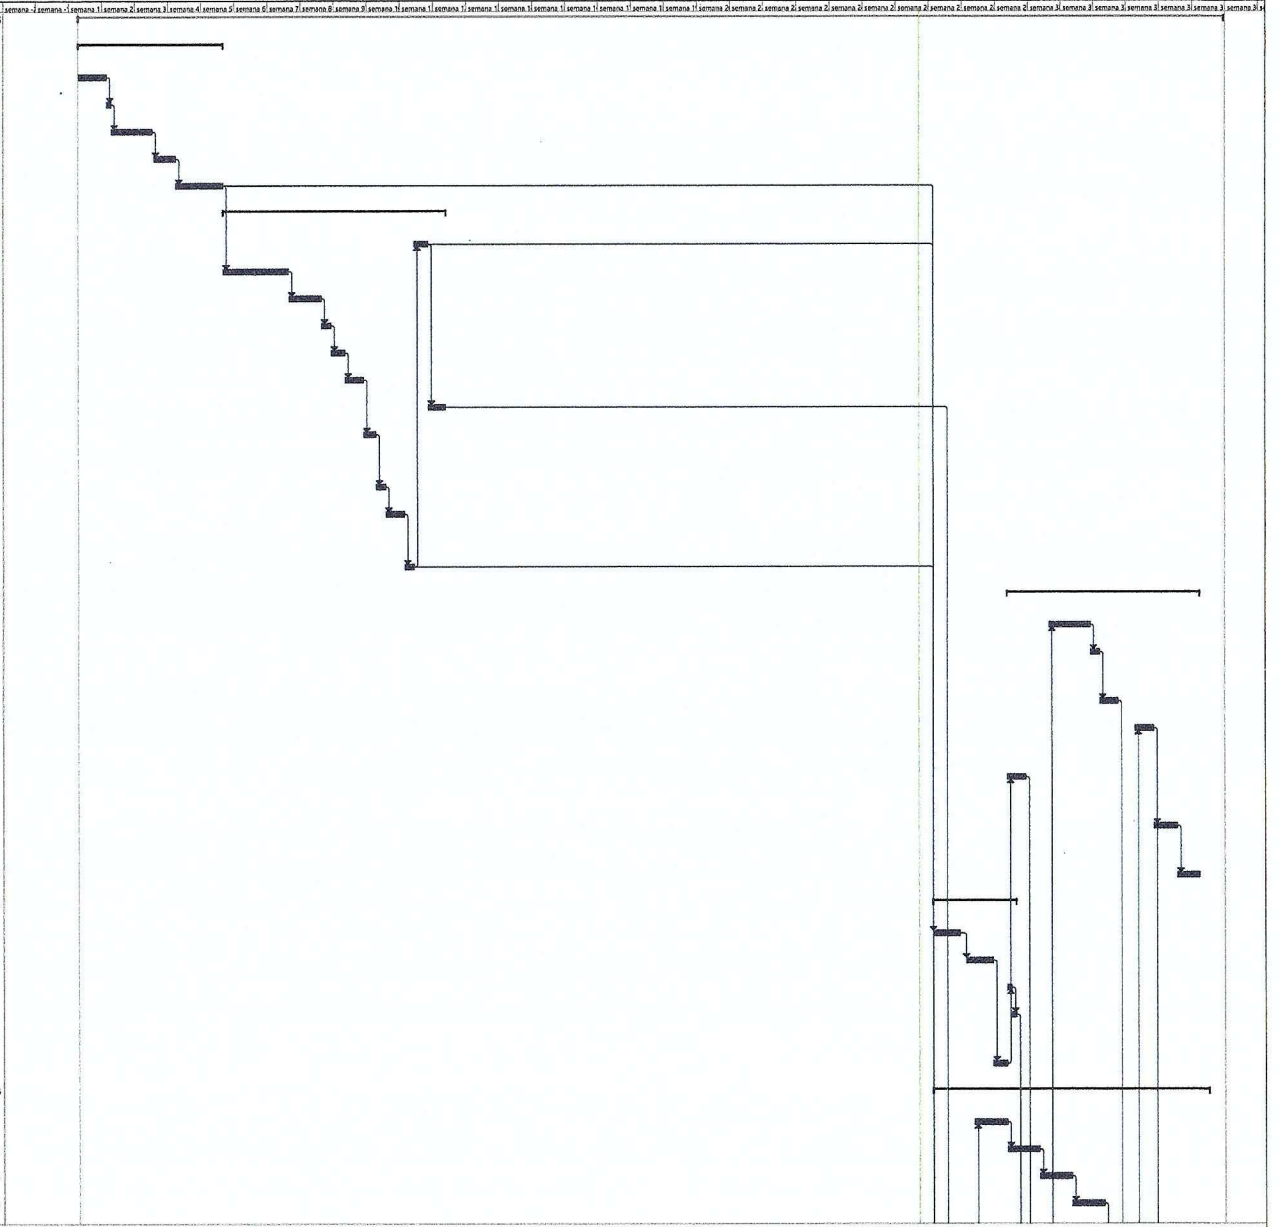


CRONOGRAMA GURUVITA
INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: GURUVITA N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
38	04.05	Excavacion manual en conglomerado	8 días	lun 24/08/26	mar 1/09/26
39	04.06	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	20 días	mar 29/09/26	mié 21/10/26
40	05	**APARATOS SANITARIOS**	**41 días**	**lun 24/08/26**	**vie 9/10/26**
41	05.01	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26
42	05.02	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal	4 días	lun 5/10/26	vie 9/10/26
43	05.03	Lavaplatos de sobreponer liso en acero inoxidable 150 x 52 cm con grifería monocontrol tipo Aluvia de corona incluye acoples y kit desague. Suministroeinstal.	4 días	lun 5/10/26	vie 9/10/26
44	06	**MUROS Y ACABADOS**	**32 días**	**lun 24/08/26**	**mar 29/09/26**
45	06.01	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	8 días	mar 1/09/26	jue 10/09/26
46	06.02	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	8 días	lun 24/08/26	mar 1/09/26
47	06.03	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	8 días	jue 10/09/26	sáb 19/09/26
48	06.04	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	8 días	sáb 19/09/26	mar 29/09/26
49	06.05	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	8 días	mar 1/09/26	jue 10/09/26
50	06.06	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	8 días	jue 10/09/26	sáb 19/09/26
51	06.07	Estuco plástico muros. Suministro e instal	8 días	mar 1/09/26	jue 10/09/26
52	07	**CUBIERTA**	**24 días**	**lun 24/08/26**	**sáb 19/09/26**
53	07.01	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	3 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26
54	07.02	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	2 días	lun 31/08/26	mar 1/09/26
55	07.03	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	1 día	lun 24/08/26	lun 24/08/26
56	07.04	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	4 días	mar 1/09/26	sáb 5/09/26
57	07.05	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	1 día	lun 24/08/26	lun 24/08/26
58	07.06	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal.	3 días	sáb 5/09/26	mié 9/09/26
59	07.07	Bajante A.LL. PVC 4"	3 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26
60	07.08	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	3 días	sáb 12/09/26	mié 16/09/26
61	07.09	Acero de Refuerzo Grado 60	3 días	jue 27/08/26	sáb 29/08/26
62	08	**ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO**	**17 días**	**lun 24/08/26**	**vie 11/09/26**
63	08.01	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26
64	08.02	Acero de Refuerzo Grado 60	3 días	sáb 29/08/26	mar 1/09/26
65	08.03	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000	2 días	jue 27/08/26	vie 28/08/26
66	08.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	2 días	mar 1/09/26	jue 3/09/26
67	08.05	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m.	3 días	jue 3/09/26	lun 7/09/26
68	08.06	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	4 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26
69	09	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**25 días**	**sáb 26/09/26**	**sáb 24/10/26**
70	09.01	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	3 días	sáb 26/09/26	mié 30/09/26

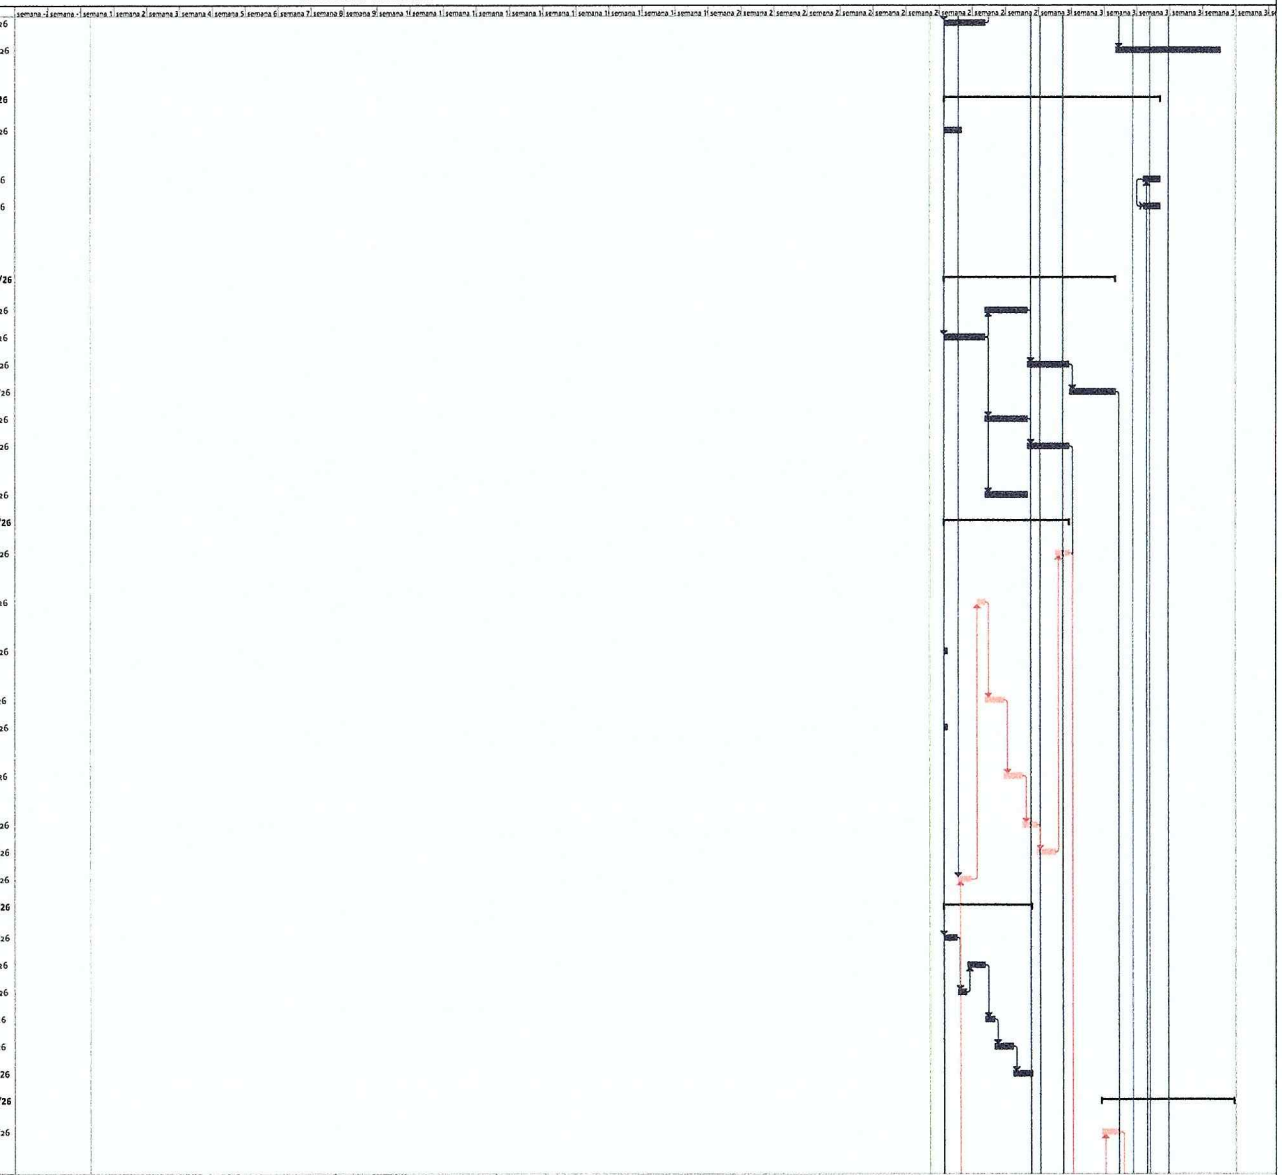


CRONOGRAMA GURUVITA INGENIERIA CIVILCAS

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

CRONOGRAMA: GURUVITA N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
71	09.02	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	3 días	mié 30/09/26	sáb 3/10/26
72	09.03	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	4 días	sáb 3/10/26	jue 8/10/26
73	09.04	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	1 día	jue 8/10/26	vie 9/10/26
74	09.05	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	1 día	vie 9/10/26	sáb 10/10/26
75	09.06	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	1 día	sáb 10/10/26	lun 12/10/26
76	09.07	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijació	1 día	lun 12/10/26	mar 13/10/26
77	09.08	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	2 días	mar 13/10/26	jue 15/10/26
78	09.09	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	2 días	jue 15/10/26	sáb 17/10/26
79	09.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	1 día	sáb 17/10/26	lun 19/10/26
80	09.11	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	2 días	lun 19/10/26	mar 20/10/26
81	09.12	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	mié 21/10/26	mié 21/10/26
82	09.13	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	1 día	jue 22/10/26	jue 22/10/26
83	09.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	1 día	vie 23/10/26	vie 23/10/26
84	09.15	Acometida en cable de cobre aislado ([3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]) - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	1 día	sáb 24/10/26	sáb 24/10/26
85	10	**CARPINTERIA METALICA**	6 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26
86	10.01	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26
87	10.02	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	3 días	jue 27/08/26	sáb 29/08/26
88	11	**NO PREVISTOS**	44 días	lun 24/08/26	mar 13/10/26
89	11.03	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0,12m (33 x 12 x 23).	6 días	sáb 19/09/26	sáb 26/09/26
90	11.04	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	6 días	mar 29/09/26	mar 6/10/26
91	11.05	Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e instal	3 días	mar 29/09/26	vie 2/10/26
92	11.06	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3 x 2. Suministro e instal.	2 días	sáb 10/10/26	mar 13/10/26
93	11.07	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2. Suministro e instal.	1 día	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
94	11.08	Acometida red hidraulica pvc 1/2 x 10 m	1 día	jue 10/09/26	vie 11/09/26
95	11.09	Demolicion muro en bloque de arcilla. con retiro	4 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26
96	11.10	Llave terminal manguera 1/2	3 días	lun 24/08/26	mié 26/08/26
97	11.11	Puerta en lamina Cold Rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26
98	11.12	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa).	2 días	sáb 26/09/26	mar 29/09/26

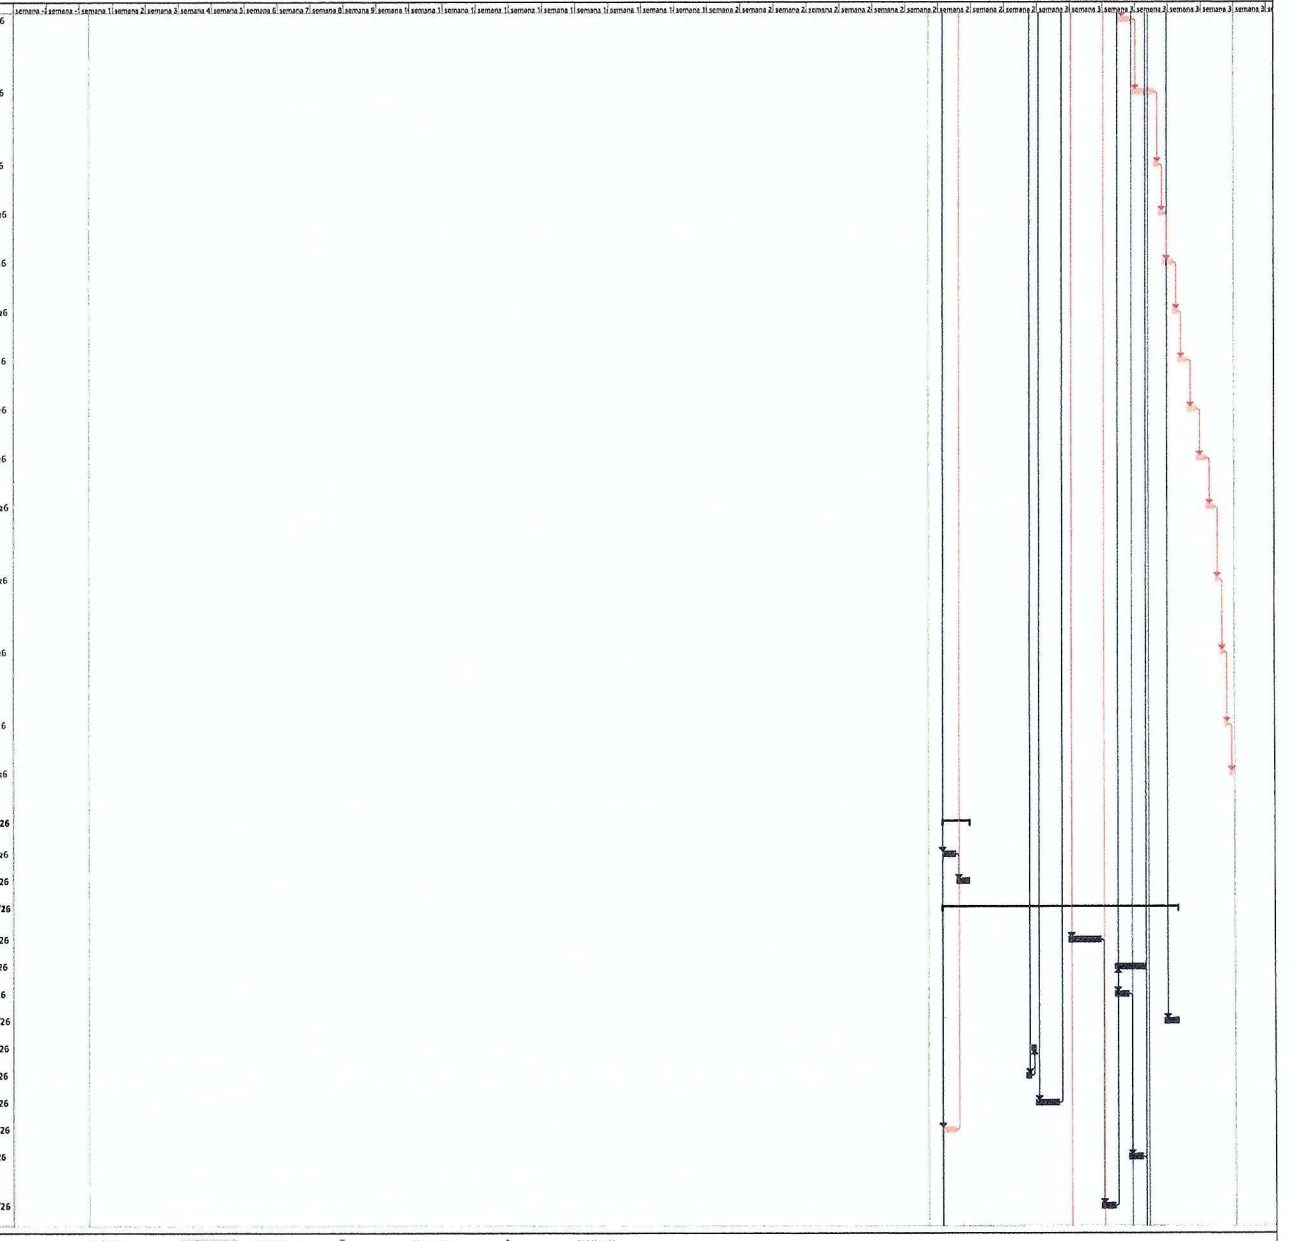


CRONOGRAMA GURUVITA INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


CRONOGRAMA: GURUVITA N° RSC-CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin
99	11.13	Guardaescoba en ceramica 60 * 10 cm. Suministro e Instalación	2 días	jue 24/09/26	sáb 26/09/26
100	11.14	Piso ceramica 0.60x0.60mt, trafico comercial.	1 día	lun 5/10/26	mar 6/10/26
101	11.02	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con grifería monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	2 días	vie 2/10/26	lun 5/10/26
102	11.16	Teja tipo master 1000 cal 28 pintada	2 días	lun 24/08/26	mar 25/08/26
103	11.17	Esmalte sobre ventana en lamina (incluye anticorrosivo)	2 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26
104	11.18	Juego de barras de seguridad en L 24 x 35 para baño PMR. Suministro e Instal.	2 días	sáb 19/09/26	mar 22/09/26
105	11.19	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	2 días	mar 22/09/26	jue 24/09/26

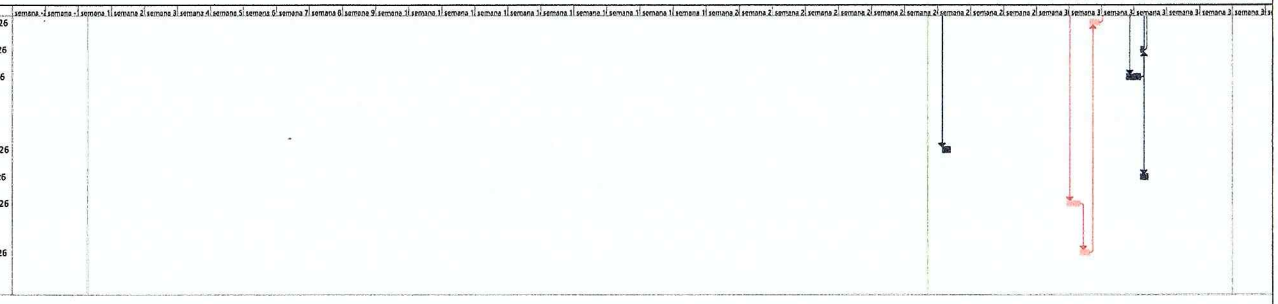

CRONOGRAMA: JORDAN BAJO N° RSC - CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0		**CRONOGRAMA JORDAN BAJO**	**149 días**	**mar 24/02/26**	**lun 24/10/26**	**$ 116.345.251,82**
1	00	**ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO**	**27 días**	**mar 24/02/26**	**vie 27/03/26**	**$ 0,00**
2	00.01	Visitas a campo	5 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26	$ 0,00
3	00.02	socializaciones	5 días	lun 2/03/26	sáb 7/03/26	$ 0,00
4	00.03	Programación de compras de materiales	3 días	sáb 7/03/26	mar 10/03/26	$ 0,00
5	00.04	Elaboración del plan de trabajo y cronograma detallado	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	$ 0,00
6	00.05	Contratación de personal de obra	3 días	sáb 14/03/26	mar 17/03/26	$ 0,00
7	00.06	Afiliaciones a seguridad social	3 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	$ 0,00
8	00.07	Dotación de elementos de protección personal (EPP)	3 días	vie 20/03/26	mié 25/03/26	$ 0,00
9	00.08	Desalojo por parte de la comunidad	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	$ 0,00
10	01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**88 días**	**vie 27/03/26**	**mié 15/07/26**	**$ 4.828.681,60**
11	01.01	Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	10 días	mié 24/06/26	mar 7/07/26	$ 834.302,88
12	01.02	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	12 días	vie 27/03/26	lun 13/04/26	$ 1.262.396,45
13	01.03	Desmonte aparatos sanitarios	4 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	$ 29.478,00
14	01.04	Desmonte de ventanas, con transporte	8 días	vie 17/04/26	lun 27/04/26	$ 62.190,00
15	01.05	Desmonte marcos y puertas con transporte	8 días	lun 27/04/26	jue 7/05/26	$ 139.775,80
16	01.06	Demolicion enchape muros con retiro	10 días	jue 7/05/26	mar 19/05/26	$ 138.075,19
17	01.07	Desmonte correas	7 días	mar 7/07/26	mié 15/07/26	$ 359.880,00
18	01.08	Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	8 días	mié 20/05/26	jue 28/05/26	$ 1.661.398,82
19	01.09	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	8 días	jue 28/05/26	sáb 6/06/26	$ 92.515,50
20	01.10	Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	8 días	sáb 6/06/26	jue 18/06/26	$ 87.920,00
21	01.11	Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	$ 160.748,96
22	02	**PISOS Y ENCHAPES**	**53,5 días**	**lun 13/04/26**	**jue 18/06/26**	**$ 13.366.851,54**
23	02.01	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	3 días	mié 15/04/26	sáb 18/04/26	$ 1.673.011,56
24	02.02	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	3 días	sáb 13/06/26	jue 18/06/26	$ 0,00
25	02.03	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	3 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26	$ 1.538.017,98
26	02.04	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	3 días	mar 9/06/26	vie 12/06/26	$ 6.074.003,88
27	02.05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	2 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	$ 3.606.276,24
28	02.06	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	2 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26	$ 0,00
29	02.07	Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m	2 días	mar 16/06/26	jue 18/06/26	$ 475.541,88
30	03	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**6 días**	**jue 18/06/26**	**jue 25/06/26**	**$ 2.373.927,30**
31	03.01	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26	$ 199.662,30
32	03.02	Punto agua fria PVC 1/2"	2 días	sáb 20/06/26	mar 23/06/26	$ 582.904,00
33	03.03	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	1 día	mar 23/06/26	mié 24/06/26	$ 239.466,00
34	03.04	Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	1 día	mié 24/06/26	jue 25/06/26	$ 1.351.895,00
35	03.05	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	1 día	mar 23/06/26	mié 24/06/26	$ 0,00

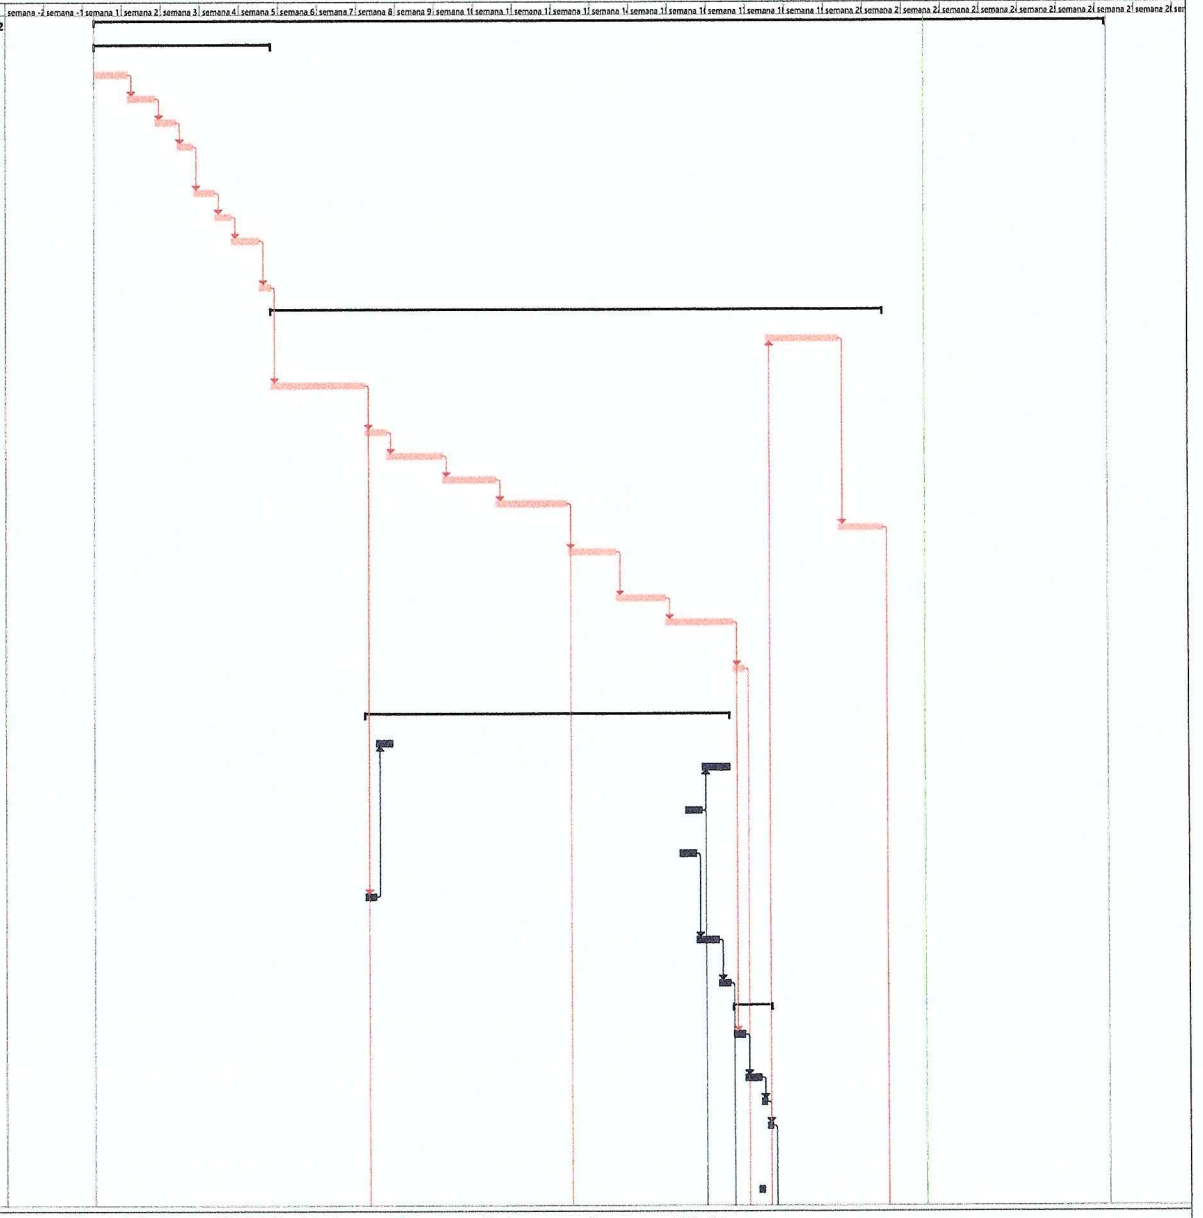


CRONOGRAMA JORDAN BAJO C
INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · solo duración · Informe de resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

CRONOGRAMA: JORDAN BAJO N° RSC - CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin	Costo
36	04	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**30 días**	**lun 13/04/26**	**mar 19/05/26**	**$ 7.450.472,85**
37	04.01	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	4 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	$ 375.914,88
38	04.02	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	4 días	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	$ 482.572,48
39	04.03	Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon	6 días	sáb 2/05/26	sáb 9/05/26	$ 569.016,00
40	04.04	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	3 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	$ 380.649,00
41	04.05	Excavacion manual en conglomerado	8 días	lun 13/04/26	mié 22/04/26	$ 293.720,49
42	04.06	Sistema septico Ovoide 2000 Lt (Incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico y Trampa de grasas)	5 días	mié 13/05/26	mar 19/05/26	$ 5.348.600,00
43	05	**APARATOS SANITARIOS**	**11,13 días**	**mié 10/06/26**	**mié 24/06/26**	**$ 2.595.897,00**
44	05.01	Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con griferia de mesa tipo push	1 día	mar 23/06/26	mié 24/06/26	$ 0,00
45	05.02	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	1 día	vie 19/06/26	sáb 20/06/26	$ 1.981.452,00
46	05.03	Lavaplatos de sobreponer liso en acero inoxidable 150 x 52 cm con griferia monocontrol tipo Aluvia de corona incluye acoples y kit desague. Suministroeinstal.	2 días	mié 10/06/26	vie 12/06/26	$ 614.445,00
47	06	**MUROS Y ACABADOS**	**13 días**	**mié 20/05/26**	**mié 3/06/26**	**$ 4.850.349,48**
48	06.01	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	7 días	mié 20/05/26	mié 27/05/26	$ 956.206,92
49	06.02	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	3 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	$ 608.792,16
50	06.03	Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	3 días	mié 27/05/26	sáb 30/05/26	$ 794.997,76
51	06.04	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	3 días	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	$ 2.039.320,64
52	06.05	Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	2 días	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	$ 91.816,50
53	06.06	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	6 días	lun 25/05/26	lun 1/06/26	$ 359.215,50
54	07	**CUBIERTA**	**62,5 días**	**mié 10/06/26**	**lun 24/08/26**	**$ 36.145.722,79**
55	07.01	Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	1 día	vie 7/08/26	sáb 8/08/26	$ 0,00
56	07.02	Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4". Suministro e instalacion	3 días	sáb 8/08/26	mar 11/08/26	$ 0,00
57	07.03	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación.	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	$ 28.756.153,75
58	07.04	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m	3 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/26	$ 387.978,30
59	07.05	Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste	1 día	mié 10/06/26	jue 11/06/26	$ 0,00
60	07.06	Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal.	3 días	mar 18/08/26	vie 21/08/26	$ 1.293.517,20
61	07.07	Bajante A.LL. PVC 4"	2 días	vie 21/08/26	lun 24/08/26	$ 163.338,00
62	07.08	Viga cinta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	3 días	jue 30/07/26	lun 3/08/26	$ 2.667.444,90
63	07.09	Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado.	4 días	sáb 25/07/26	jue 30/07/26	$ 1.124.442,00
64	07.10	Platina 0.25*0.25 m en lamina HR 1/4" con 6 perforaciones de 5/8" con mortero de nivelación.	3 días	mié 22/07/26	sáb 25/07/26	$ 0,00
65	07.11	Acero de Refuerzo Grado 60	5 días	mié 15/07/26	mié 22/07/26	$ 1.752.848,64

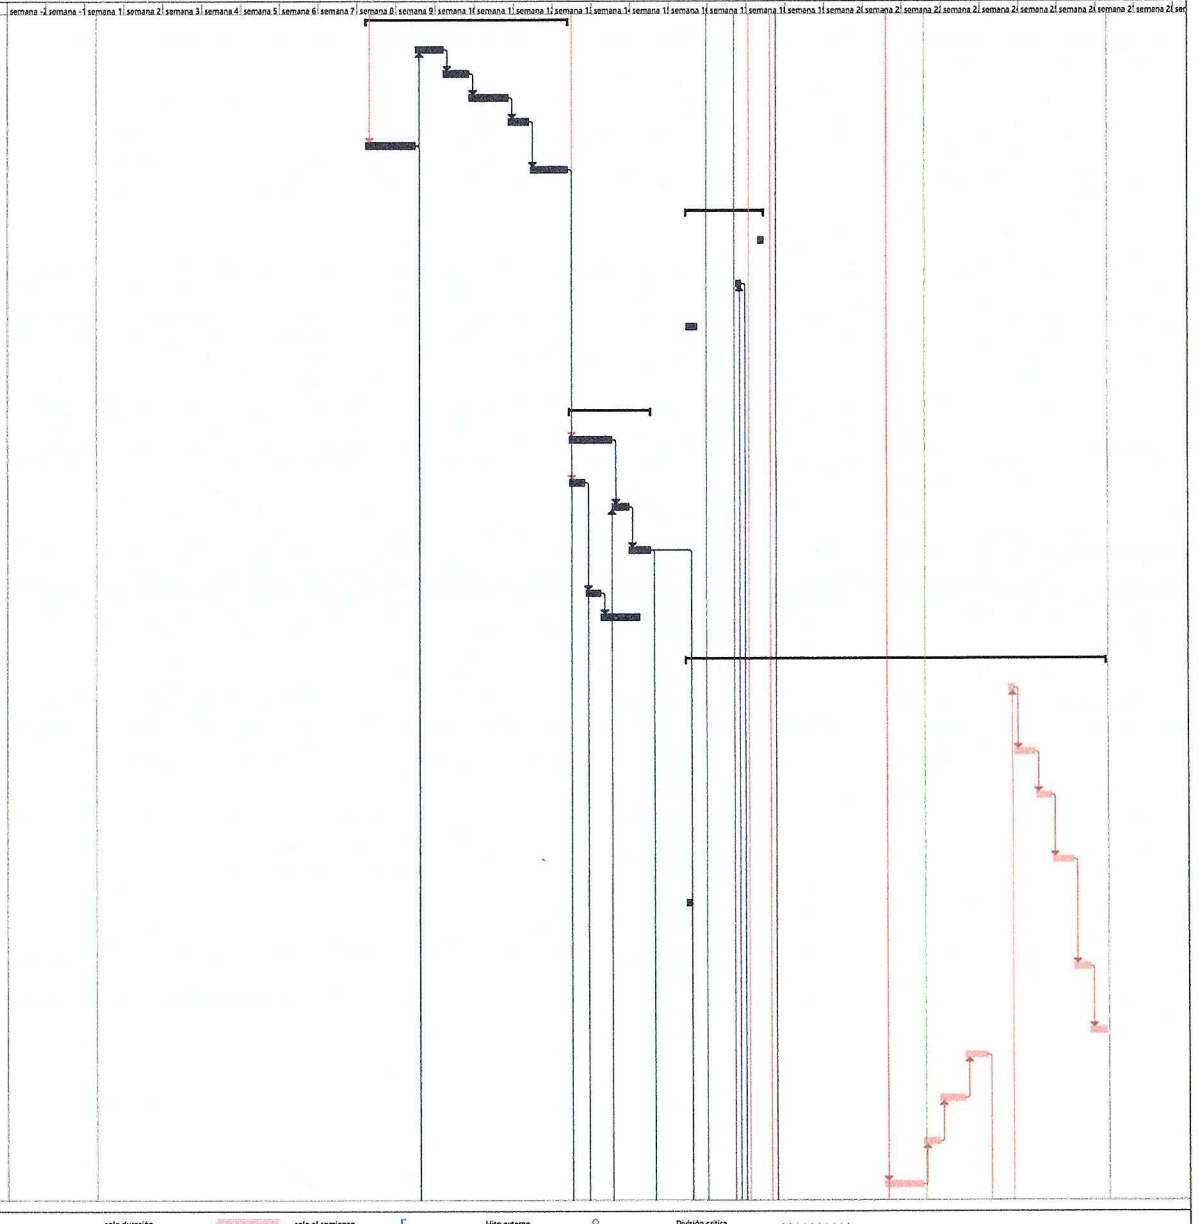


CRONOGRAMA JORDAN BAJO C
INGENIERIA CIVILCAS

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

CRONOGRAMA: JORDAN BAJO N° RSC - CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin	Costo
66	08	**ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO**	**10 días**	**mié 22/04/26**	**mar 5/05/26**	**$ 2.163.503,07**
67	08.01	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	1 día	mié 22/04/26	jue 23/04/26	$ 67.427,10
68	08.02	Acero de Refuerzo Grado 60	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	$ 464.406,48
69	08.03	Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	$ 863.974,81
70	08.04	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	3 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26	$ 290.286,00
71	08.05	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m.	1 día	jue 30/04/26	sáb 2/05/26	$ 411.764,64
72	08.06	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	2 días	sáb 2/05/26	mar 5/05/26	$ 65.644,04
73	09	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**19 días**	**mié 20/05/26**	**jue 11/06/26**	**$ 11.858.483,04**
74	09.01	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	1 día	mié 20/05/26	mié 20/05/26	$ 429.340,00
75	09.02	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	$ 2.213.427,00
76	09.03	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	2 días	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	$ 343.574,00
77	09.04	Interruptor Termomagnático Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	2 días	lun 25/05/26	mié 27/05/26	$ 343.574,00
78	09.05	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	$ 230.951,00
79	09.06	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	1 día	vie 29/05/26	sáb 30/05/26	$ 3.297.648,00
80	09.07	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijació	1 día	sáb 30/05/26	lun 1/06/26	$ 474.021,00
81	09.08	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	1 día	lun 1/06/26	mar 2/06/26	$ 644.418,00
82	09.09	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	1 día	mar 2/06/26	mié 3/06/26	$ 233.502,00
83	09.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	1 día	mié 3/06/26	jue 4/06/26	$ 180.415,00
84	09.11	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	jue 4/06/26	vie 5/06/26	$ 1.057.770,00
85	09.12	Salida para interruptor Doble, linea decorativa Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	1 día	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	$ 165.282,00
86	09.13	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	1 día	sáb 6/06/26	mar 9/06/26	$ 1.751.050,00
87	09.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	1 día	mar 9/06/26	mié 10/06/26	$ 311.487,00
88	09.15	Acometida en cable de cobre aislado ([3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]) - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	1 día	mié 10/06/26	jue 11/06/26	$ 182.024,04

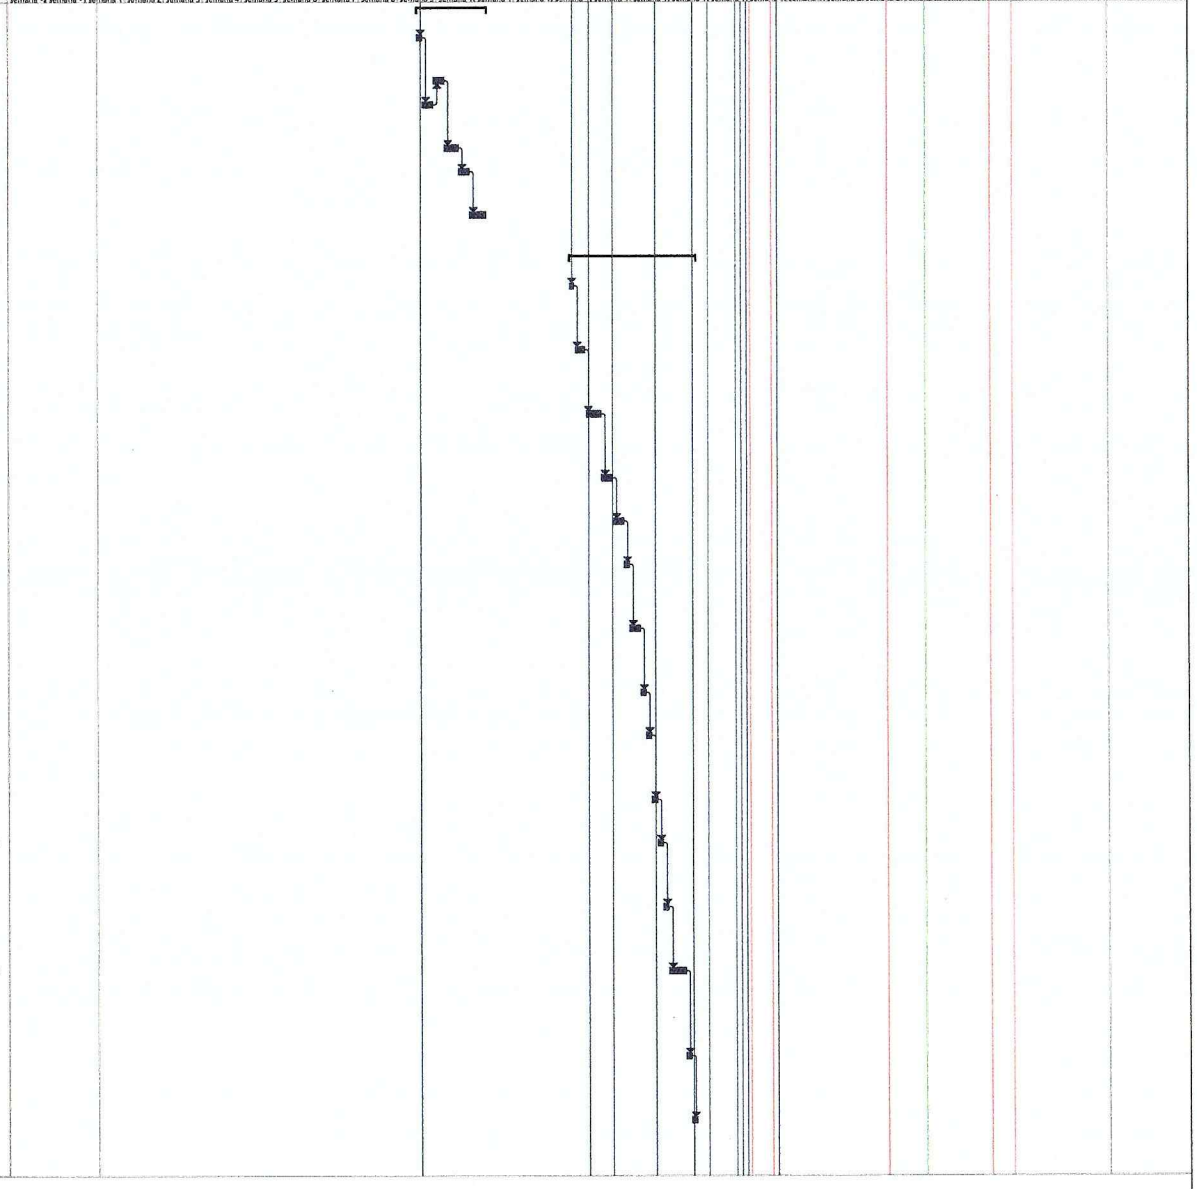


CRONOGRAMA JORDAN BAJO C
INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

CRONOGRAMA: JORDAN BAJO N° RSC - CP 007-2025
CHAMEZA CASANARE
INGENIERIA CIVILCAS

Id	EDT	ACTIVIDADES	Duración	Comienzo	Fin	Costo
89	10	**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**	**2 días**	**jue 11/06/26**	**sáb 13/06/26**	**$ 3.857.176,80**
90	10.01	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	2 días	jue 11/06/26	sáb 13/06/26	$ 936.000,00
91	10.02	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	2 días	jue 11/06/26	sáb 13/06/26	$ 2.921.176,80
92	11	**NO PREVISTOS**	**87 días**	**mié 22/04/26**	**vie 7/08/26**	**$ 26.854.186,35**
93	11.05	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0,12m (33	4 días	mié 15/07/26	mar 21/07/26	$ 1.868.282,64
94	11.06	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	4 días	vie 31/07/26	mié 5/08/26	$ 1.924.580,25
95	11.07	Rinconera en PVC media caña 0.09 m. Suministro e instal	1 día	mié 10/06/26	jue 11/06/26	$ 286.209,00
96	11.08	Juego de barras de seguridad en L 24 x 35 para baño PMR. Suministro e instal.	1 día	jue 11/06/26	vie 12/06/26	$ 1.543.088,00
97	11.09	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e instalada.	1 día	sáb 13/06/26	mar 16/06/26	$ 1.054.177,41
98	11.10	Rejilla en aluminio con sosco tradicional 3 x 2. Suministro e instal.	1 día	jue 18/06/26	vie 19/06/26	$ 110.250,00
99	11.11	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2". Suministro e instal.	1 día	sáb 27/06/26	mar 30/06/26	$ 175.727,00
100	11.12	Acometida red hidraulica pvc 1/2" x 10 m	2 días	jue 25/06/26	sáb 27/06/26	$ 349.534,00
101	11.13	Mortero impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	3 días	mar 28/07/26	vie 31/07/26	$ 33.289,28
102	11.14	Demolicion muro en bloque de arcilla. con retiro	3 días	sáb 20/06/26	mié 24/06/26	$ 10.182,40
103	11.15	Llave terminal manguera 1/2"	1 día	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	$ 115.281,00
104	11.16	Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)"	5 días	mié 3/06/26	mié 10/06/26	$ 5.399.995,20
105	11.17	Piso cerámica 0.60x0.60mts, tráfico comercial.	4 días	sáb 13/06/26	vie 19/06/26	$ 1.760.879,54
106	11.18	Guardaescoba en ceramica 60 x 10 cm. Suministro e instalacion	4 días	vie 19/06/26	mié 24/06/26	$ 170.478,32
107	11.19	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epoxico, incluye marco. Suministro e instal.	6 días	mar 21/07/26	mar 28/07/26	$ 5.191.004,40
108	11.20	Lavamanos blanco de colgar acuacer o similar con griferia monocontrol media cromada, incluye sifón flexible, desague, valvula reguladora y acople metalico. Instalacion	1 día	sáb 20/06/26	lun 22/06/26	$ 1.177.347,00
109	11.21	Correa metalica en perfil estructural rectangular 76 x 38 x 1.5 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	4 días	lun 3/08/26	vie 7/08/26	$ 3.603.059,55
110	11.22	Columneta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	4 días	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	$ 1.006.185,60
111	11.23	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3.000psi	4 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	$ 214.924,08
112	11.01	Estuco plástico muros. Suministro e instal	3 días	sáb 23/05/26	mar 26/05/26	$ 859.713,68

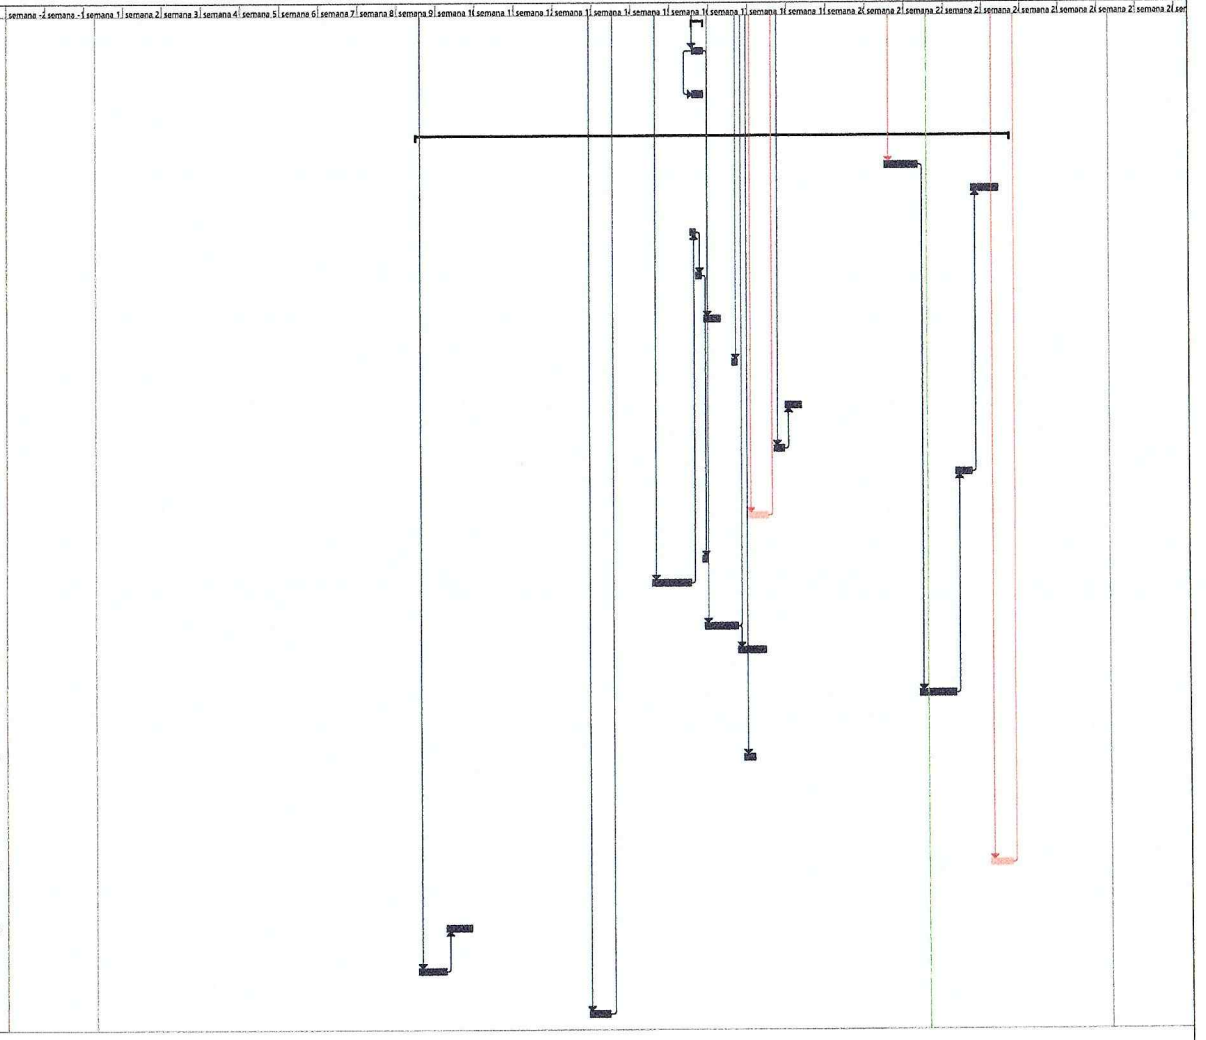

CRONOGRAMA JORDAN BAJO C
INGENIERIA CIVILCAS

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · solo duración · Informe de resumen manual · solo fin · Tareas externas · solo el comienzo · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MILAR C&S SAS
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
NIT 900.827.656 6

Yopal, 24 de Septiembre de 2026

Señores
INGENIERÍA CIVILCAS S.A.S.
NIT 900.958.996-7
Representante Legal:
ALEXANDER MENA ORDUZ
C.C. 74.861.287 de Yopal

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRORROGA No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista INGENIERÍA CIVILCAS S.A.S., mediante oficio de fecha 23 de Septiembre de 2026, relacionada con el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026, cuyo objeto corresponde a "LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE", esta interventoría se permite informar que la misma CUMPLE DOCUMENTALMENTE con los soportes técnicos y administrativos requeridos para su trámite y evaluación por parte de la entidad.

Lo anterior, conforme a la revisión efectuada sobre los documentos allegados, entre ellos el informe quincenal de avance de obra, reprogramación de obra presentada por el contratista.

En consecuencia, esta interventoría APRUEBA DOCUMENTALMENTE la solicitud de Prórroga No. 03 por el término de treinta (30) días calendario, precisando que la fecha de terminación inicialmente establecida corresponde al día veinticuatro (24) de Septiembre de 2026 y que, con la presente ampliación, la nueva fecha de terminación contractual corresponderá al día veinticuatro (24) de Septiembre de 2026.

Cordialmente,

MILTON JAVIER IBARRA ANGARITA
Representante Legal
MILAR C&S S.A.S.
Nit: 900.827.656-6
Yopal-Casanare

Yopal, 25 de septiembre del 2026

Señores:
INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
NIT. No. 900.958.996-7
TELF: +57 310 556 5622 / 310 626 1987
CORREO. civilcas.sas@gmail.com / ingenieriacivilcas.sas@gmail.com
Dirección: Calle 33 No. 19 - 10 Barrio 20 de Julio – Yopal (Casanare)

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026. LOTE 10. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS JORDAN BAJO, BARRIALES Y GURUVITO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE

Asunto: Respuesta a la solicitud de prórroga N°3 para el contrato de referencia.

Cordial saludo.

Comedidamente, me permito informar que una vez revisada su solicitud de aprobación de prórroga Nº03 por término de treinta (30) días el cual fue radicado a RED SALUD CASANARE E.S.E, el día 25 de septiembre del 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentado por la interventoría como soporte técnico avalando y aprobando la solicitud de prórroga Nº3 al plazo establecido por término de treinta (30) días adicionales al contrato de obra N.º RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026.

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina Asesora de planeación, Mercadeo y Sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de supervisión y se requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, N.º RSC-CP-008-2025 Y NÚMERO INTERNO 050-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de obra SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NÚMERO INTERNO 041-2026

Atentamente.

ANA DIONERIA BUSTOS CABALLERO
SUPERVISOR DELEGADO.

Proyecto: Jhonatan Velasco Albarracin
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S

Yopal, 25 de septiembre de 2026

PARA: OFICINA ASESORA JURIDICA
Dra. Maryuri Lizeth Ávila Sanabria
Jefe Oficina Jurídica
Correo: juridica@redsaludcasanare.gov.co
Ciudad.

DE: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Supervisor
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Correo: planeacion@redsaludcasanare.gov.co
Ciudad.

Asunto: Solicitud de elaboración de Prorroga en tiempo No 03. para el CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 041-2026

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría asunto de la referencia, me permito aceptar y dar viabilidad para suscribir la **Prorroga No. 03**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de ajustar la CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La presente solicitud de Prórroga No. 03 por un término de treinta (30) días calendario se fundamenta en ocurrencia de una contingencia logística, operativa y de sobreviniente, externa y no imputable al contratista, relacionada con la intermitencia del tránsito normal de la vía terciaria cuyo acceso se ha afectado por el movimiento de masas de tierras producto de las condiciones climáticas de la zona de ejecución, afectación que han impactado el desarrollo normal de la programación de obra inicialmente prevista para todos los Puestos de Atención Primaria en Salud.

Las condiciones climáticas han influido en la reducción del rendimiento de las actividades, debido a dificultades logísticas en la llegada a tiempo de material requerido durante el proceso de ejecución, no obstante, existe continuidad de actividades contractuales, sin desligar la responsabilidad del contratista ni causar impases fuera de los presentes.

En este sentido, y considerando que actualmente subsisten las causas que originan las afectaciones descritas, resulta técnica y contractualmente procedente la prórroga del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 041-2026, como mecanismo orientado a preservar el equilibrio contractual, evitar riesgos para el personal vinculado al proyecto, proteger la calidad de las obras ejecutadas y prevenir la generación de sobrecostos o afectaciones derivadas de la ejecución en condiciones inadecuadas.

2. SOPORTES ADJUNTOS

Para sustentar esta solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Copia de la solicitud del contratista.
2. Copia de solicitud de prórroga de la interventoría

Atentamente,

ANA DIONERIA BUSCOS CABALLERO
Supervisor Delegado

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente

Proyecto: Jhonatan Velasco Albarracin
Profesional contratado de apoyo a la supervisión-Manning S.A.S
