INFORME FINANCIERO No. 2

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0083 DE 2026

KAREN LOPEZ
SUPERVISOR
OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
2026

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

1. GENERALIDADES

CONTRATO No.	CPS-0083-2026
OBJETO	Implementación de la estrategia de gestión ambiental urbana para optimizar los procesos de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en el municipio de Barrancas, La Guajira.
CONTRATISTA	CONSORCIO RESIDUOS SÓLIDOS BARRANCAS
NIT	902062123-5
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA
SUPERVISIÓN	Karen López - Oficina de Educación Ambiental
PLAZO	Cinco (5) meses
PERÍODO INFORMADO	01 de julio de 2026 al 31 de junio de 2026
VALOR BASE DE LA OFERTA ECONÓMICA	$ 914.300.006

El presente informe financiero se elabora con base en el presupuesto oficial y la oferta económica del proyecto, con el fin de presentar el valor programado, el valor ejecutado durante el primer periodo y el saldo pendiente por ejecutar, conforme a las actividades contractuales y los soportes técnicos reportados

2. PRESUPUESTO OFICIAL

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA					
1.0 Promover la cultura ambiental en la comunidad del Municipio de Barrancas					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Numero	2	$ 3.561.759	$ 7.123.518
1.2	Realizar divulgación del proyecto	Numero	1	$ 32.496.307	$ 32.496.307
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Numero	2	$ 3.378.084	$ 6.756.169
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Numero	4	$ 3.726.594	$ 14.906.375
1.5	Realizar Sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, Campaña "Barrancas Verde"	Numero	1	$ 68.580.712	$ 68.580.712
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Numero	4	$ 4.078.433	$ 16.313.733
1.7	Realizar Talleres Educativos Comunitarios para el Fomento de la adecuada separación de residuos y el Compostaje Doméstico	Numero	4	$ 4.078.433	$ 16.313.733
				Subtotal 1	**$ 162.490.547**

2.0 Desarrollar acciones de mejoramiento la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barrancas					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barranca	Número	1	$ 36.105.192	$ 36.105.192
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Número	1	$ 45.350.522	$ 45.350.522
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la Ruta de Recolección	Número	1	$ 64.207.411	$ 64.207.411
2.4	Instalar puntos Ecológicos con Figura Metálica	Número	17	$ 18.745.200	$ 318.668.401
2.5	Realizar asistencia técnica administrativa y operativa de la asociación de recicladores del municipio de Barranca	Número	1	$ 141.497.261	$ 141.497.261
				Subtotal 2	**$ 605.828.786**
				Subtotal	**$ 768.319.333**
				IVA 19%	**$ 145.980.673**
				TOTAL	**$ 914.300.006**

Fuente: Oferta económica / Presupuesto oficial del proyecto, 2026.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRIMER PERÍODO

La ejecución financiera se determinó con base en las cantidades ejecutadas durante el presente periodo y los valores establecidos en la oferta económica, incluido el IVA del 19 %.
En los meses anteriores se ejecutaron $98.135.032, equivalentes al 10,73 % del valor total del proyecto. Durante el presente periodo se ejecutaron $256.763.778, correspondientes al 28,08 %.
En consecuencia, la ejecución financiera acumulada asciende a $354.898.810, equivalente al 38,82 % del valor total del proyecto.

Valor total base de actividades	$914.300.006,00
Valor ejecutado en meses anteriores	$98.135.032,20
Valor ejecutado en el presente período	$256.763.778
Valor ejecutado acumulado	$354.898.810
Saldo por ejecutar	$559.401.195
Avance financiero acumulado	38,82%

Nota de control: La ejecución financiera acumulada del 38,82 % deberá armonizarse con el avance técnico y validarse mediante informes, productos, facturas, actas, registros fotográficos, listados de asistencia y aprobación de la supervisión.

4. CUADRO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO POR ACTIVIDAD

Actividad	Valor contratado	Cant. meta	% actividad	Ejec. mes ant.	Ejec. presente mes	Ejec. acumulado	% ejecutado	Saldo por ejecutar
Realizar jornadas de socialización del proyecto	$8.476.986	2	0,93%	$4.238.493	-	$4.238.493	0,46%	$4.238.493
Realizar divulgación del proyecto	$38.670.605	1	4,23%	$7.734.121	$7.734.121	$15.468.242	1,69%	$23.202.363
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	$8.039.841	2	0,88%	$4.019.921	-	$4.019.921	0,44%	$4.019.920
Realizar jornadas de sensibilización sobre los componentes de la gestión ambiental urbana	$17.738.586	4	1,94%	-	$8.869.293	$8.869.293	0,97%	$8.869.293
Realizar sensibilización puerta a puerta - Campaña “Barrancas Verde”	$81.611.047	1	8,93%	-	$81.611.047	$81.611.047	8,93%	-
Realizar talleres de educación ambiental en instituciones educativas	$19.413.342	4	2,12%	-	-	-	0,00%	$19.413.342

Actividad	Valor contratado	Cant. meta	% actividad	Ejec. mes ant.	Ejec. presente mes	Ejec. acumulado	% ejecutado	Saldo por ejecutar
Realizar talleres comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico	$19.413.342	4	2,12%	-	-	-	0,00%	$19.413.342
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	$42.965.178	1	4,70%	$21.482.589	$21.482.589	$42.965.178	4,70%	-
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	$53.967.121	1	5,90%	$26.983.560	$26.983.561	$53.967.121	5,90%	-
Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	$76.406.819	1	8,36%	-	$76.406.819	$76.406.819	8,36%	-
Instalar puntos ecológicos con figura metálica	$379.215.397	17	41,48%	-	-	-	0,00%	$379.215.397
Realizar asistencia técnica administrativa y operativa a los recicladores	$168.381.741	1	18,42%	$33.676.348	$33.676.348	$67.352.696	7,37%	$101.029.045
TOTAL	**$914.300.005**		**100,00%**	**$98.135.032**	**$256.763.778**	**$354.898.810**	**38,82%**	**$559.401.195**

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO 50%				
OBJETIVO 1. Promover la cultura ambiental en la comunidad del Municipio de Barrancas				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR NETO A GIRAR**
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	Número	2	$ 3.561.758,82
1.2	Realizar divulgación del proyecto	Número	1	$ 12.998.522,69
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Número	2	$ 3.378.084,87
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Número	4	$ 7.453.187,39
1.5	Realizar sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, campaña “Barrancas Verde”	Número	1	$ 68.580.711,76
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Número	4	$ 0,00
1.7	Realizar talleres educativos comunitarios para el fomento de la adecuada separación de residuos y el compostaje doméstico	Número	4	$ 0,00
SUB TOTAL 1				**$ 95.972.265,53**
OBJETIVO 2. Desarrollar acciones de mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barrancas				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR NETO A GIRAR**
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	Número	1	$ 36.105.191,60
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Número	1	$ 45.350.522,69
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	Número	1	$ 64.207.410,92
2.4	Instalar puntos ecológicos con figura metálica	Número	17	$ 93.726.000,00
2.5	Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	Número	1	$ 48.798.275,63
SUB TOTAL 2				**$ 288.187.400,84**
TOTAL ANTICIPO ANTES DE IMPUESTO				**$ 384.159.666,39**
IMPUESTOS (IVA 19%)				**$ 72.990.336,61**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO				**$ 457.150.003,00**

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS
NIT. 902062123-5

INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO No. 2


Contrato CPS-0083-2026 | Gestión integral de residuos sólidos | Barrancas, La Guajira

VALOR DEL PROYECTO	EJECUCIÓN ANTERIOR	EJECUCIÓN DEL PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA
$914.300.005	$98.135.032	$256.763.778	$354.898.810

AVANCE FINANCIERO	SALDO POR EJECUTAR	ANTICIPO LEGALIZADO
38,82%	$559.401.195	77,63%

COMPOSICIÓN FINANCIERA


Concepto	Valor
Ejecutado acumula	$354.898.810
Saldo por ejecutar	$559.401.195

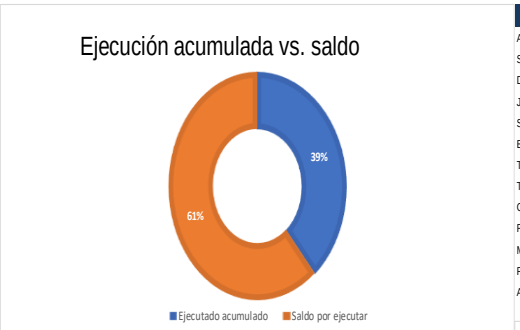


EJECUCIÓN ACUMULADA POR ACTIVIDAD

Actividad	Contratado	Ejecutado
Socialización del proy	$8.476.986	$4.238.493
Divulgación	$38.670.605	$15.468.242
Jornadas lúdicas	$8.039.841	$4.019.921
Sensibilización	$17.738.586	$8.869.293
Barrancas Verde	$81.611.047	$81.611.047
Talleres instituciones	$19.413.342	-
Talleres comunitarios	$19.413.342	-
Caracterización	$42.965.178	$42.965.178
Rutas recolección	$53.967.121	$53.967.121
Muestreo diagnóstico	$76.406.819	$76.406.819
Puntos ecológicos	$379.215.397	-
Asistencia técnica	$168.381.741	$67.352.696

Periodo	ución del peri	ución acumul	% acumulado
Inicio	-	-	0,00%
Mes 1	$98.135.032	$98.135.032	10,73%
Mes 2	$256.763.778	$354.898.810	38,82%

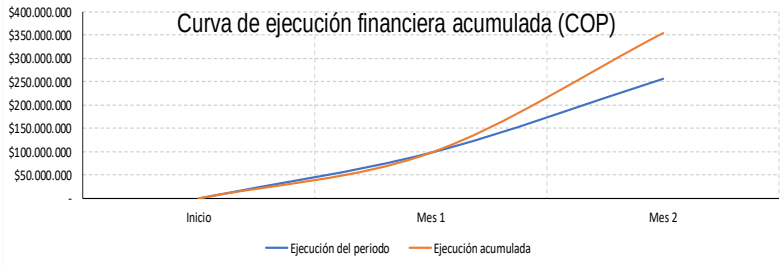

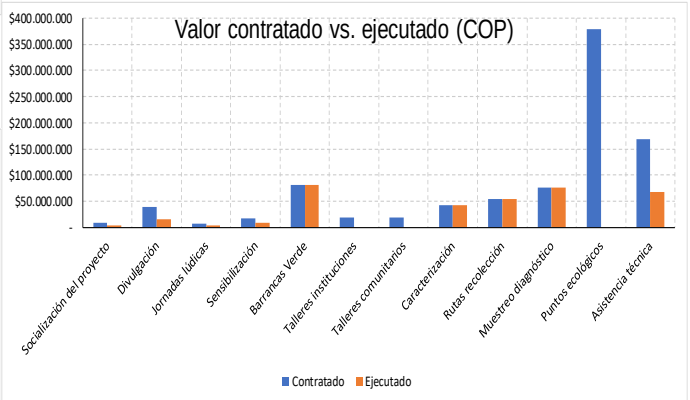

LÍNEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
Programación contractual	Plazo contractual: cinco (5) meses				
Ejecución financiera	Ejecución acumulada al Mes 2: 38,82 %		Pendiente por ejecutar: 61,18 %		

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS BARRANCAS
NIT. 902062123-5

SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BARRANCAS, LA GUAJIRA

La información corresponde a la legalización del anticipo con base en el avance financiero de cada actividad; no representa un nuevo giro de recursos.

Ítem	Actividad	Plan anticipo antes de IVA	IVA plan	Plan anticipo total	Legalizado mes anterior antes de IVA	Legalizado presente mes antes de IVA	Legalizado acumulado antes de IVA	IVA legalización acumulada	Legalizado acumulado con IVA	% avance contractual de la actividad	Saldo contractual por legalizar
1.1	Realizar jornadas de socialización del proyecto	$3.561.758,82	$676.734,18	$4.238.493,00	$3.561.758,82	$ -	$3.561.758,82	$676.734,18	$4.238.493,00	50,00%	$4.238.493,00
1.2	Realizar divulgación del proyecto	$12.998.522,69	$2.469.719,31	$15.468.242,00	$6.499.261,34	$6.499.261,34	$12.998.522,68	$2.469.719,31	$15.468.241,99	40,00%	$23.202.363,00
1.3	Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	$3.378.084,87	$641.836,13	$4.019.921,00	$3.378.084,28	$ -	$3.378.084,28	$641.836,01	$4.019.920,29	50,00%	$4.019.921,00
1.4	Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la gestión ambiental urbana	$7.453.187,39	$1.416.105,60	$8.869.292,99	$ -	$7.453.187,39	$7.453.187,39	$1.416.105,60	$8.869.292,99	50,00%	$8.869.293,00
1.5	Realizar sensibilización puerta a puerta - Campaña "Barrancas Verde"	$68.580.711,76	$13.030.335,23	$81.611.046,99	$ -	$68.580.711,76	$68.580.711,76	$13.030.335,23	$81.611.046,99	100,00%	$ -
1.6	Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$19.413.342,00
1.7	Realizar talleres comunitarios sobre separación de residuos y compostaje doméstico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$19.413.342,00
2.1	Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	$36.105.191,60	$6.859.986,40	$42.965.178,00	$18.052.595,80	$18.052.595,80	$36.105.191,60	$6.859.986,40	$42.965.178,00	100,00%	$ -
2.2	Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	$45.350.522,69	$8.616.599,31	$53.967.122,00	$22.675.260,92	$22.675.260,92	$45.350.521,84	$8.616.599,15	$53.967.120,99	100,00%	$ -
2.3	Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	$64.207.410,92	$12.199.408,07	$76.406.818,99	$ -	$64.207.410,92	$64.207.410,92	$12.199.408,07	$76.406.818,99	100,00%	$ -
2.4	Instalar puntos ecológicos con figura metálica	$93.726.000,00	$17.807.940,00	$111.533.940,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$379.215.397,00
2.5	Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	$48.798.275,63	$9.271.672,37	$58.069.948,00	$28.299.452,27	$28.299.452,27	$56.598.904,54	$10.753.791,86	$67.352.696,40	40,00%	$101.029.045,00
TOTAL		**$384.159.666,39**	**$72.990.336,61**	**$457.150.003,00**	**$82.466.413,60**	**$215.767.880,40**	**$298.234.294,00**	**$56.664.515,86**	**$354.898.809,86**	**38,82%**	**$559.401.195,00**

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

EJECUCIÓN DETALLADA POR ACTIVIDAD - SEGUNDO PERIODO

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN BARRANCAS, LA GUAJIRA

Distribución por talento humano e insumos. Costos antes de IVA; conciliación final con IVA en las filas de cierre.

ACTIVIDADES	TALENTO HUMANO E INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN MES 2	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	MES 1	MES 2	TOTAL EJECUTADO	% AVANCE
Realizar jornadas de socialización del proyecto	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	0,00%	$399.600,11	$399.600,11	$199.800,05	$ -	$199.800,05	50,00 %
	Trabajadora social	UNIDAD	1	0,00%	$266.400,07	$266.400,07	$133.200,03	$ -	$133.200,03	50,00 %
	Ingeniero ambiental	UNIDAD	1	0,00%	$333.000,09	$333.000,09	$166.500,04	$ -	$166.500,04	50,00 %
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	0,00%	$940.500,26	$940.500,26	$470.250,11	$ -	$470.250,11	50,00 %
	Alquiler de sitio	UNIDAD	1	0,00%	$3.220.766,24	$3.220.766,24	$1.610.383,04	$ -	$1.610.383,04	50,00 %
	Folletos	UNIDAD	1	0,00%	$630.945,18	$630.945,18	$315.472,57	$ -	$315.472,57	50,00 %
	Transporte	UNIDAD	1	0,00%	$626.373,18	$626.373,18	$313.186,57	$ -	$313.186,57	50,00 %
	Administración	UNIDAD	1	0,00%	$705.932,86	$705.932,86	$352.966,41	$ -	$352.966,41	50,00 %
Subtotal actividad 1.1				**0,00%**		**$7.123.518,00**	**$3.561.758,82**	**$ -**	**$3.561.758,82**	**50,00 %**
Realizar divulgación del proyecto	Notas de prensa escrita	UNIDAD	1	20,00%	$16.857.610,00	$16.857.610,00	$3.371.522,00	$3.371.522,00	$6.743.044,00	40,00 %
	Notas de prensa en medios virtuales	UNIDAD	1	20,00%	$6.814.331,00	$6.814.331,00	$1.362.866,20	$1.362.866,20	$2.725.732,40	40,00 %

	Cuñas radiales	UNIDAD	1	20,00%	$1.515.412,00	$1.515.412,00	$303.082,40	$303.082,40	$606.164,80	40,00 %
	Video documental	UNIDAD	1	20,00%	$4.088.599,00	$4.088.599,00	$817.719,80	$817.719,80	$1.635.439,60	40,00 %
	Administración	UNIDAD	1	20,00%	$3.220.354,72	$3.220.354,72	$644.070,94	$644.070,94	$1.288.141,89	40,00 %
Subtotal actividad 1.2				**20,00%**		**$32.496.306,72**	**$6.499.261,34**	**$6.499.261,34**	**$12.998.522,68**	**40,00 %**
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	0,00%	$399.600,00	$399.600,00	$199.800,00	$ -	$199.800,00	50,00 %
	Profesional social	UNIDAD	1	0,00%	$266.400,00	$266.400,00	$133.200,00	$ -	$133.200,00	50,00 %
	Ingeniero ambiental dinamizador	UNIDAD	1	0,00%	$633.000,00	$633.000,00	$316.500,00	$ -	$316.500,00	50,00 %
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	0,00%	$940.500,00	$940.500,00	$470.250,00	$ -	$470.250,00	50,00 %
	Alquiler de sitio	UNIDAD	1	0,00%	$3.220.765,34	$3.220.765,34	$1.610.382,67	$ -	$1.610.382,67	50,00 %
	Transporte	UNIDAD	1	0,00%	$626.373,00	$626.373,00	$313.186,50	$ -	$313.186,50	50,00 %
	Administración	UNIDAD	1	0,00%	$669.530,22	$669.530,22	$334.765,11	$ -	$334.765,11	50,00 %
Subtotal actividad 1.3				**0,00%**		**$6.756.168,56**	**$3.378.084,28**	**$ -**	**$3.378.084,28**	**50,00 %**
Realizar jornada de sensibilización referente a los componentes de la Gestión ambiental urbana a la comunidad, comerciantes, recicladores, entes locales y empresas con presencia en el territorio	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	50,00%	$799.200,11	$799.200,11	$ -	$399.600,05	$399.600,05	50,00 %
	Profesional social	UNIDAD	1	50,00%	$532.800,07	$532.800,07	$ -	$266.400,03	$266.400,03	50,00 %
	Ingeniero ambiental dinamizador	UNIDAD	1	50,00%	$1.260.000,17	$1.260.000,17	$ -	$630.000,08	$630.000,08	50,00 %
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	50,00%	$1.881.000,25	$1.881.000,25	$ -	$940.500,11	$940.500,11	50,00 %
	Alquiler de sitio	UNIDAD	1	50,00%	$6.441.531,54	$6.441.531,54	$ -	$3.220.765,72	$3.220.765,72	50,00 %
	Folleto full color	UNIDAD	1	50,00%	$1.261.890,17	$1.261.890,17	$ -	$630.945,08	$630.945,08	50,00 %
	Transporte	UNIDAD	1	50,00%	$1.252.746,17	$1.252.746,17	$ -	$626.373,07	$626.373,07	50,00 %
	Administración	UNIDAD	1	50,00%	$1.477.206,52	$1.477.206,52	$ -	$738.603,25	$738.603,25	50,00 %

Subtotal actividad 1.4				**50,00%**		**$14.906.375,00**	**$ -**	**$7.453.187,39**	**$7.453.187,39**	**50,00%**
Realizar sensibilización puerta a puerta a la comunidad en escuela y comerciantes, campaña “Barrancas Verde”	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	100,00%	$1.998.000,00	$1.998.000,00	$ -	$1.998.000,00	$1.998.000,00	100,00%
	Profesional social	UNIDAD	1	100,00%	$1.332.000,00	$1.332.000,00	$ -	$1.332.000,00	$1.332.000,00	100,00%
	Ingeniero ambiental	UNIDAD	1	100,00%	$1.665.000,00	$1.665.000,00	$ -	$1.665.000,00	$1.665.000,00	100,00%
	Profesional ambiental de apoyo	UNIDAD	1	100,00%	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$ -	$5.000.000,00	$5.000.000,00	100,00%
	Profesional social de apoyo	UNIDAD	1	100,00%	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$ -	$5.000.000,00	$5.000.000,00	100,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	100,00%	$470.250,00	$470.250,00	$ -	$470.250,00	$470.250,00	100,00%
	Kit de bolsa de tres colores	UNIDAD	1	100,00%	$27.450.000,00	$27.450.000,00	$ -	$27.450.000,00	$27.450.000,00	100,00%
	Folleto full color	UNIDAD	1	100,00%	$9.464.175,00	$9.464.175,00	$ -	$9.464.175,00	$9.464.175,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	1	100,00%	$9.405.000,00	$9.405.000,00	$ -	$9.405.000,00	$9.405.000,00	100,00%
	Administración	UNIDAD	1	100,00%	$6.796.286,75	$6.796.286,75	$ -	$6.796.286,75	$6.796.286,75	100,00%
Subtotal actividad 1.5				**100,00%**		**$68.580.711,75**	**$ -**	**$68.580.711,76**	**$68.580.711,76**	**100,00%**
Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	0,00%	$2.163.278,66	$2.163.278,66	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional social	UNIDAD	1	0,00%	$1.442.185,77	$1.442.185,77	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Ingeniero ambiental dinamizador	UNIDAD	1	0,00%	$1.802.732,21	$1.802.732,21	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Dinamizador	UNIDAD	1	0,00%	$1.624.083,08	$1.624.083,08	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	0,00%	$1.272.875,11	$1.272.875,11	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Alquiler de sitio	UNIDAD	1	0,00%	$4.358.992,07	$4.358.992,07	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Folleto full color	UNIDAD	1	0,00%	$1.707.845,16	$1.707.845,16	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Transporte	UNIDAD	1	0,00%	$847.734,82	$847.734,82	$ -	$ -	$ -	0,00%

	Administración	UNIDAD	1	0,00%	$1.094.006,04	$1.094.006,04	$ -	$ -	$ -	0,00%
Subtotal actividad 1.6				**0,00%**		**$16.313.732,92**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00 %**
Realizar talleres educativos comunitarios para el fomento de la adecuada separación de residuos y el compostaje doméstico	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	0,00%	$2.163.278,66	$2.163.278,66	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional social	UNIDAD	1	0,00%	$1.442.185,77	$1.442.185,77	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Ingeniero ambiental dinamizador	UNIDAD	1	0,00%	$1.802.732,21	$1.802.732,21	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Dinamizador	UNIDAD	1	0,00%	$1.624.083,08	$1.624.083,08	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	0,00%	$1.272.875,11	$1.272.875,11	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Alquiler de sitio	UNIDAD	1	0,00%	$4.358.992,07	$4.358.992,07	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Folleto full color	UNIDAD	1	0,00%	$1.707.845,16	$1.707.845,16	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Transporte	UNIDAD	1	0,00%	$847.734,82	$847.734,82	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Administración	UNIDAD	1	0,00%	$1.094.006,04	$1.094.006,04	$ -	$ -	$ -	0,00%
Subtotal actividad 1.7				**0,00%**		**$16.313.732,92**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00 %**
Caracterizar a los recicladores existentes en el municipio de Barrancas	Mano de obra total	UNIDAD	1	50,00%	$24.000.000,00	$24.000.000,00	$11.999.999,87	$11.999.999,87	$23.999.999,73	100,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	50,00%	$627.000,00	$627.000,00	$313.500,00	$313.500,00	$626.999,99	100,00%
	Transporte	UNIDAD	1	50,00%	$7.900.200,00	$7.900.200,00	$3.950.099,96	$3.950.099,96	$7.900.199,91	100,00%
	Administración	UNIDAD	1	50,00%	$3.577.992,00	$3.577.992,00	$1.788.995,98	$1.788.995,98	$3.577.991,96	100,00%
Subtotal actividad 2.1				**50,00%**		**$36.105.192,00**	**$18.052.595,80**	**$18.052.595,80**	**$36.105.191,60**	**100,00%**
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en áreas principales del municipio de Barrancas	Mano de obra total	UNIDAD	1	50,00%	$4.644.000,00	$4.644.000,00	$2.321.999,99	$2.321.999,99	$4.643.999,98	100,00%
	Diseño e impresión de cartografía digital y física	UNIDAD	1	50,00%	$6.528.501,00	$6.528.501,00	$3.264.250,49	$3.264.250,49	$6.528.500,98	100,00%
	Documento técnico	UNIDAD	1	50,00%	$10.360.000,00	$10.360.000,00	$5.179.999,98	$5.179.999,98	$10.359.999,96	100,00%

	impreso a full color									
	Auditorio con logística	UNIDAD	1	50,00%	$17.235.552,00	$17.235.552,00	$8.617.775,97	$8.617.775,97	$17.235.551,94	100,00%
	Transporte	UNIDAD	1	50,00%	$2.088.273,00	$2.088.273,00	$1.044.136,50	$1.044.136,50	$2.088.272,99	100,00%
	Administración	UNIDAD	1	50,00%	$4.494.196,00	$4.494.196,00	$2.247.097,99	$2.247.097,99	$4.494.195,98	100,00%
Subtotal actividad 2.2				**50,00%**		**$45.350.522,00**	**$22.675.260,92**	**$22.675.260,92**	**$45.350.521,84**	**100,00%**
Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección	Mano de obra total	UNIDAD	1	100,00%	$30.624.000,00	$30.624.000,00	$ -	$30.623.999,96	$30.623.999,96	100,00%
	Apoyo logístico diagnóstico	UNIDAD	1	100,00%	$205.000,00	$205.000,00	$ -	$205.000,00	$205.000,00	100,00%
	Bolsas multiusos	UNIDAD	1	100,00%	$310.000,00	$310.000,00	$ -	$310.000,00	$310.000,00	100,00%
	Folletos a full color con información	UNIDAD	1	100,00%	$22.088.000,00	$22.088.000,00	$ -	$22.087.999,97	$22.087.999,97	100,00%
	Diseño e impresión de plantilla	UNIDAD	1	100,00%	$330.000,00	$330.000,00	$ -	$330.000,00	$330.000,00	100,00%
	Papelería documento diagnóstico	UNIDAD	1	100,00%	$1.039.090,00	$1.039.090,00	$ -	$1.039.090,00	$1.039.090,00	100,00%
	Transporte	UNIDAD	1	100,00%	$3.248.424,00	$3.248.424,00	$ -	$3.248.424,00	$3.248.424,00	100,00%
	Administración / impuestos	UNIDAD	1	100,00%	$6.362.897,00	$6.362.897,00	$ -	$6.362.896,99	$6.362.896,99	100,00%
Subtotal actividad 2.3				**100,00%**		**$64.207.411,00**	**$ -**	**$64.207.410,92**	**$64.207.410,92**	**100,00%**
Instalar puntos ecológicos con figura metálica	Coordinador del proyecto	UNIDAD	1	0,00%	$10.189.800,09	$10.189.800,09	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional social	UNIDAD	1	0,00%	$6.793.200,06	$6.793.200,06	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Ingeniero ambiental	UNIDAD	1	0,00%	$8.491.500,07	$8.491.500,07	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Albañil	UNIDAD	1	0,00%	$3.901.500,03	$3.901.500,03	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Ayudante	UNIDAD	1	0,00%	$2.550.000,02	$2.550.000,02	$ -	$ -	$ -	0,00%

	Soldador	UNIDAD	1	0,00%	$5.100.000,04	$5.100.000,04	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	0,00%	$10.659.000,09	$10.659.000,09	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Caneca en acero inoxidable	UNIDAD	1	0,00%	$100.099.196,85	$100.099.196,85	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Arena	UNIDAD	1	0,00%	$89.770,20	$89.770,20	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Gravilla	UNIDAD	1	0,00%	$301.563,00	$301.563,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Varilla 3/8	UNIDAD	1	0,00%	$1.487.976,01	$1.487.976,01	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Listones de madera	UNIDAD	1	0,00%	$3.063.400,03	$3.063.400,03	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Kilo de alambre	UNIDAD	1	0,00%	$286.110,00	$286.110,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Caja de clavo	UNIDAD	1	0,00%	$101.575,00	$101.575,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Caneca de agua 200 lt	UNIDAD	1	0,00%	$12.770.910,11	$12.770.910,11	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Bolsa de cemento	UNIDAD	1	0,00%	$604.987,51	$604.987,51	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Estructura alambrada animales	UNIDAD	1	0,00%	$100.375.650,85	$100.375.650,85	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Transporte	UNIDAD	1	0,00%	$15.972.511,64	$15.972.511,64	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Transporte de material	UNIDAD	1	0,00%	$4.250.000,04	$4.250.000,04	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Administración	UNIDAD	1	0,00%	$31.579.749,37	$31.579.749,37	$ -	$ -	$ -	0,00%
Subtotal actividad 2.4				**0,00%**		**$318.668.401,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**
Realizar asistencia técnica y operativa en el manejo de residuos sólidos a los recicladores	Mano de obra total	UNIDAD	1	20,00%	$73.276.250,00	$73.276.250,00	$14.655.250,04	$14.655.250,04	$29.310.500,07	40,00%
	Apoyo logístico	UNIDAD	1	20,00%	$3.762.000,00	$3.762.000,00	$752.400,00	$752.400,00	$1.504.800,00	40,00%
	Gafas de seguridad	UNIDAD	1	20,00%	$331.540,00	$331.540,00	$66.308,00	$66.308,00	$132.616,00	40,00%
	Botas de caucho	UNIDAD	1	20,00%	$2.370.060,00	$2.370.060,00	$474.012,00	$474.012,00	$948.024,00	40,00%
	Tapaboca antifluido	UNIDAD	1	20,00%	$146.100,00	$146.100,00	$29.220,00	$29.220,00	$58.440,00	40,00%

	Overoles de dos piezas	UNIDAD	1	20,00%	$8.805.000,00	$8.805.000,00	$1.761.000,00	$1.761.000,00	$3.522.000,01	40,00%
	Gorras con tapa cuello	UNIDAD	1	20,00%	$2.104.560,00	$2.104.560,00	$420.912,00	$420.912,00	$841.824,00	40,00%
	Transporte	UNIDAD	1	20,00%	$36.679.500,00	$36.679.500,00	$7.335.900,02	$7.335.900,02	$14.671.800,04	40,00%
	Administración	UNIDAD	1	20,00%	$14.022.251,00	$14.022.251,00	$2.804.450,21	$2.804.450,21	$5.608.900,41	40,00%
Subtotal actividad 2.5				**20,00%**		**$141.497.261,00**	**$28.299.452,27**	**$28.299.452,27**	**$56.598.904,54**	**40,00%**
TOTAL GENERAL ANTES DE IVA						**$768.319.333,00**	**$82.466.413,60**	**$215.767.880,40**	**$298.234.294,00**	**38,82%**

IVA 19 %						**$145.980.673,00**	**$15.668.618,58**	**$40.995.897,28**	**$56.664.515,86**	
TOTAL GENERAL CON IVA						**$914.300.006,00**	**$98.135.032,18**	**$256.763.777,68**	**$354.898.809,86**	**38,82%**

310 6311520
csresidusosolidobarrancas@gmail.com
Barrancas, La Guajira- Colombia
CALLE 13 No.19- 70

5. CONCLUSIÓN FINANCIERA

Durante el periodo evaluado se legalizaron recursos del anticipo por **$256.763.778**, que, sumados a los **$98.135.032** legalizados anteriormente, representan un valor acumulado de **$354.898.810**, equivalente al **38,82 %** del valor total del contrato.

La legalización se sustenta en el avance de las actividades ejecutadas y no corresponde a un nuevo desembolso de recursos. Las actividades relacionadas con la campaña “Barrancas Verde”, caracterización de recicladores, elaboración de rutas de recolección y diagnóstico de la ruta alcanzaron el 100 % de su ejecución financiera. La asistencia técnica y operativa a los recicladores presenta un avance acumulado del **40 %**.

El saldo pendiente por legalizar y ejecutar asciende a **$559.401.195**, equivalente al **61,18 %** del contrato. Se recomienda continuar verificando la correspondencia entre el avance técnico, la legalización financiera y los soportes de cada actividad, especialmente en los talleres de educación ambiental y la instalación de puntos ecológicos, que aún no registran ejecución.

FIRMA

Nombre: **GUSTAVO SALAS**
Representante Legal
Consorcio Residuos Sólidos Barrancas
Celular 3106311520
