ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

CB INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 1 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 24 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE	CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
GERENCIA	CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016


III. RESUMEN

Se discutieron los avances del convenio, que actualmente se encuentra en un 36.98% para la primera orden de bienes, a pesar de algunos retrasos en el transporte del mobiliario, para los cuales se han implementado medidas de mitigación. Beatriz Elena Yara Arias destacó la importancia de coordinar las fechas de entrega para optimizar los desplazamientos a las instituciones, y se acordó que se coordinara con la interventoría el envió de la programación actualizada. Además, se confirmó la asistencia de Germán Gómez Vega a la jornada informativa del 7 de marzo, y Carolina Parra Báez subrayó la necesidad de coordinar esta actividad para cumplir la cláusula siete del convenio. Beatriz se ofreció a gestionar la sala de juntas de la alcaldesa para la reunión, mientras que Marcelino Ruiz Montaño se encargará de verificar la disponibilidad de la alcaldesa para asistir.

IV. TEMAS TRATADOS

Se presentan los tiempos de ejecución de cada uno de los contratos que intervienen en el proyecto, se destaca que la fecha de inicio de la ejecución del proyecto es el 13 de enero de 2025 y la ejecución de la dotación tiene fecha fin del 12 de junio de 2025.

LINEA BASE
(Proyección - Tiempo)

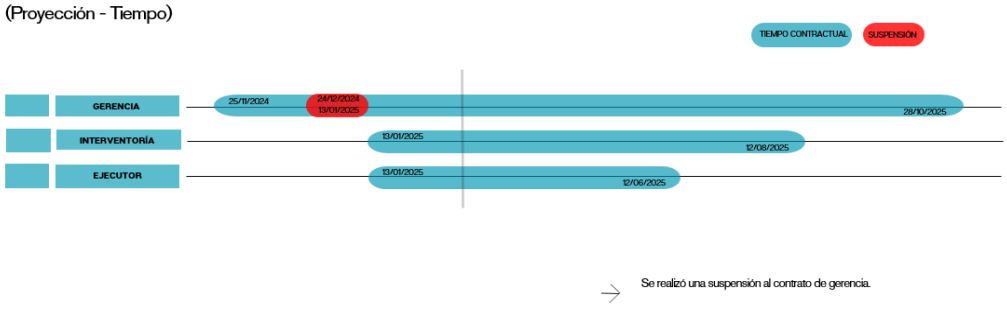


ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

CB INGENIEROS S.A.S.


Comité No.	1	CONVENIO 007 de 2023	**FECHA:**	24	2	2025
				(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)		

Adicionalmente se presenta como se distribuyeron las entregas en 4 ordenes de bienes, con lo cual se estableció un cronograma de entregas, el cual tuvo fecha de inicio del 15 de febrero de 2025 y cuenta con fecha fin del 08 de junio de 2025.

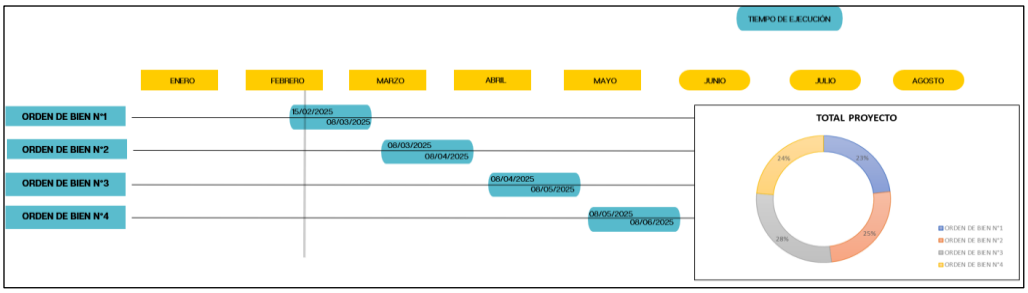

Se presenta el avance actual de la orden de bien N°1 que corrresponde al 36.98%. Se mencionaron algunos retrasos en el transporte del mobiliario, pero estos han sido mitigados, lo cual no ha generado atrasos y se cuenta con un avance superior al programado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	99	25	74	25,25%	74,75%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1742	406	1336	23,31%	76,69%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1968	879	1089	44,66%	55,34%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	809	383	426	47,34%	52,66%
5	TABLERO PARA AULAS	167	71	96	42,51%	57,49%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	167	71	96	42,51%	57,49%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	46	19	27	41,30%	58,70%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	19	5	14	26,32%	73,68%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	487	176	311	36,14%	63,86%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	32	12	20	37,50%	62,50%
		5536	**2047**	**3489**	**36,98%**	63,02%

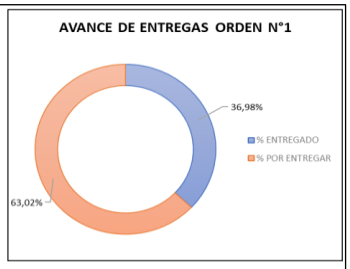


% PROGRAMADO	14%
% EJECUTADO	36,98%
DIFERENCIA	22,98%

→ Las entregas realizadas corresponden a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO

Se presenta el avance total del proyecto el cual corrresponde al 8.55%. Se mencionaron algunos retrasos en el transporte del mobiliario, pero estos han sido mitigados, lo cual no ha generado atrasos y se cuenta con un avance superior al programado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	25	375	6,25%	93,75%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	406	8031	4,81%	95,19%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	879	7346	10,69%	89,31%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	383	2675	12,52%	87,48%
5	TABLERO PARA AULAS	634	71	563	11,20%	88,80%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	71	563	11,20%	88,80%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	19	190	9,09%	90,91%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	5	80	5,88%	94,12%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	176	1942	8,31%	91,69%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	12	133	8,28%	91,72%
		23945	**2047**	**21898**	**8,55%**	**91,45%**

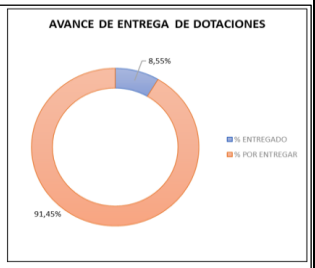

% PROGRAMADO	2,65%
% EJECUTADO	8,55%
DIFERENCIA	5,89%

→ Las entregas realizadas corresponden a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO, los avances presentados son a corte del 19 de febrero de 2025.

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 1 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 24 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	Desde el territorio se coordinara una jornada informativa, en la cual se socializará el cronograma de entregas.
2	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
3	Desde la gerencia se coordinara con la interventoría el envió de la programación actualizada.
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 7 (DIA) | 4 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) **24** (Día en números) días del mes de **FEBRERO** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

CB INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 2 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 7 | 4 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

GERENCIA CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Beatriz elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


Se discutieron los avances del convenio de dotación de mobiliario escolar en Buenaventura. Se informó que la orden de bienes número 2 ha sido completada, mientras que la orden número 3 presenta un avance del 45%.

A pesar de los inconvenientes relacionados con el orden público, los despachos se han reanudado sin alertas recientes, y se espera que la dotación esté completamente finalizada antes del 8 de junio, siempre que no se presenten nuevos contratiempos.

Se presentaron registros fotográficos de las entregas realizadas. Además, se revisó el estado de la ejecución presupuestal, con un total ejecutado aproximado de 3.700 millones de pesos. La orden de bienes número 2 se encuentra en proceso de pago, mientras que la orden número 3 aún no ha sido validada.

IV. TEMAS TRATADOS

Se presentan los tiempos de ejecución de cada uno de los contratos que intervienen en el proyecto, se destaca que la fecha de inicio de la ejecución del proyecto es el 13 de enero de 2025 y la ejecución de la dotación tiene fecha fin del 12 de junio de 2025.

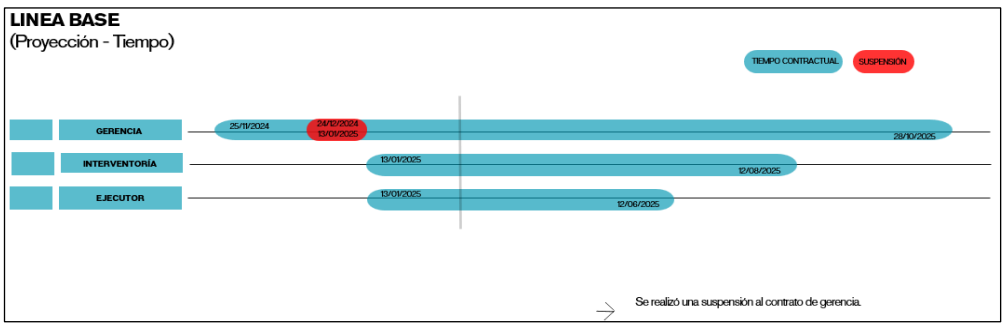


ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

CB INGENIEROS S.A.S.


Comité No. 2 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 7 | 4 | 2025 (Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

Adicionalmente se presenta como se distribuyeron las entregas en 4 ordenes de bienes, con lo cual se estableció un cronograma de entregas, el cual tuvo fecha de inicio del 15 de febrero de 2025 y cuenta con fecha fin del 08 de junio de 2025.

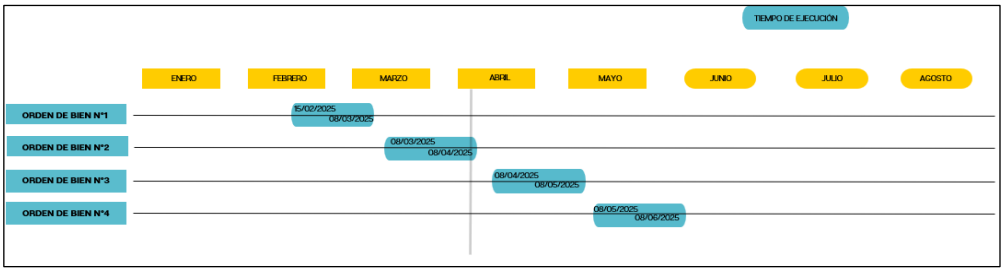

Se presenta el avance actual de la orden de bien N°3 que corrresponde al 45.00%. Se mencionaron algunos retrasos en el transporte del mobiliario, pero estos han sido mitigados, lo cual no ha generado atrasos y se cuenta con un avance superior al programado.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	93	$ 252.197,00	$ 23.454.321,00	42	-51
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2448	$ 145.321,00	$ 355.745.808,00	1100	-1348
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2223	$ 151.798,00	$ 337.446.954,00	1000	-1223
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1004	$ 151.798,00	$ 152.405.192,00	450	-554
5	TABLERO PARA AULAS	161	$ 222.062,00	$ 35.751.982,00	72	-89
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	161	$ 248.289,00	$ 39.974.529,00	72	-89
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	57	$ 1.776.879,00	$ 101.282.103,00	25	-32
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	19	$ 717.304,00	$ 13.628.776,00	8	-11
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	600	$ 587.779,00	$ 352.667.400,00	270	-330
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	36	$ 726.299,00	$ 26.146.764,00	16	-20

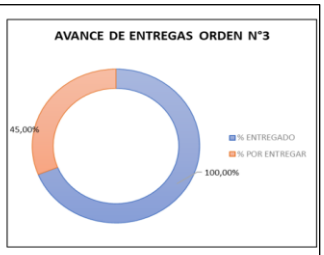

Viernes 04/04/2025 despacho para IE. NESTOR URBANO TENORIO - SEDE PRINCIPAL (Total)
Sábado 05/04/2025 despacho para IE. LICEO DEL PACIFICO - SEDE PRINCIPAL

Se presenta el avance total del proyecto el cual corrresponde al 60.84%. Se mencionaron algunos retrasos en el transporte del mobiliario, pero estos han sido mitigados, lo cual no ha generado atrasos y se cuenta con un avance superior al programado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	249	151	62,25%	37,75%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	4852	3585	57,51%	42,49%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	5181	3044	62,99%	37,01%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	1953	1105	63,87%	36,13%
5	TABLERO PARA AULAS	634	394	240	62,15%	37,85%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	394	240	62,15%	37,85%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	121	88	57,89%	42,11%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	50	35	58,82%	41,18%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	1290	828	60,91%	39,09%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	84	61	57,93%	42,07%

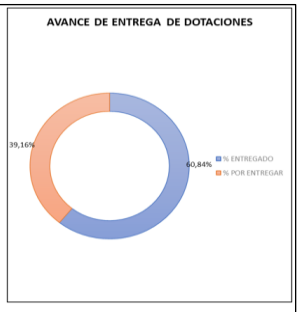

% PROGRAMADO	45,13%
% EJECUTADO	60,84%
DIFERENCIA	15,71%

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 2 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 7 | 4 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La gerencia coordinara con la interventoría y ejecutor la entrega de infomación relevante de las entregas para mantener a todas las partes actualizadas en el estado de avance de los despachos y entregas de las dotaciones
2	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
3	Desde la gerencia se coordinara con la interventoría el envió de la programación actualizada semana a semana.
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 28 (DIA) | 4 (MES) | 2025 (ANO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SIETE (Día en letras) **7** (Día en números) días del mes de **ABRIL** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No.	3	CONVENIO 007 de 2023	**FECHA:**	28	4	2025
				(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)		

CONTRIBUYENTE	CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
GERENCIA	CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD□	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN

La reunión del Comité Técnico Número Tres en Buenaventura contó con la asistencia de Marcelino Ruiz Montaño, Beatriz Elena Yara Arias, Germán Gómez y Christian Camilo Hernández. Se socializó el avance del proyecto de dotación, que alcanza un 83,4 %, superando lo programado.


Se programarán visitas a las instituciones educativas entre el 19 y el 23 de mayo. Por tal motivo, se convocará una reunión a la 1:30 p. m. del día de hoy para definir la ruta de dichas visitas y coordinar con la interventoría, el municipio y un representante del contribuyente.

IV. TEMAS TRATADOS


El Comité Técnico Número Tres del convenio inició con la confirmación de la asistencia de los participantes. Asistieron Marcelino Ruiz Montaño (líder de Planeación Educativa del municipio), Beatriz Elena Yara Arias (supervisora del convenio por parte de CENIT), Germán Gómez (Ministerio de Educación) y Christian Camilo Hernández (Gerencia).

Se presentaron los tiempos de ejecución de cada uno de los contratos que intervienen en el proyecto. Se destacó que la fecha de inicio de la ejecución es el 13 de enero de 2025 y la fecha de finalización de la dotación es el 12 de junio de 2025, sin que hasta la fecha se hayan presentado variaciones.

LINEA BASE
(Proyección - Tiempo)

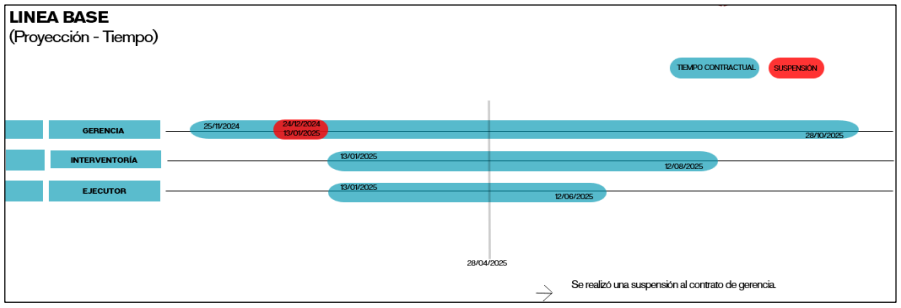


Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, con base en la cual se definió un cronograma de ejecución, cuya fecha de inicio fue el 15 de febrero de 2025 y cuya fecha de finalización está prevista para el 8 de junio de 2025.

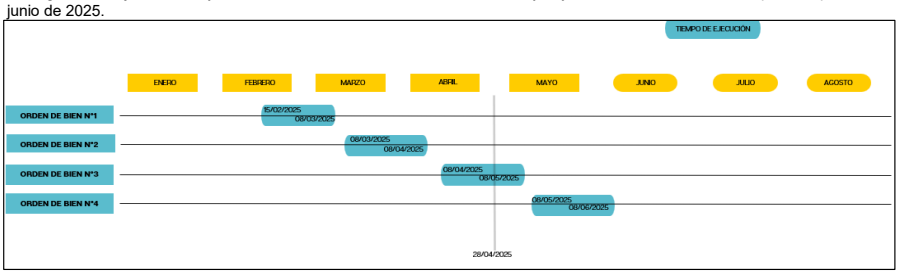

Se presentan los avances del proyecto de dotación, el cual se encuentra dividido en cuatro órdenes de bienes. Las órdenes uno y dos se encuentran completadas; la orden tres presenta un avance del 99,66 %, y la orden cuatro registra un avance del 29,77 %.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	93	$ 252.197,00	$ 23.454.321,00	93	0
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2448	$ 145.321,00	$ 355.745.808,00	2448	0
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2223	$ 151.798,00	$ 337.446.954,00	2223	0
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1004	$ 151.798,00	$ 152.405.192,00	1004	0
5	TABLERO PARA AULAS	161	$ 222.062,00	$ 35.751.982,00	161	0
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	161	$ 248.289,00	$ 39.974.529,00	161	0
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	57	$ 1.776.879,00	$ 101.282.103,00	57	0
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	19	$ 717.304,00	$ 13.628.776,00	19	0
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	600	$ 587.779,00	$ 352.667.400,00	578	-22
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	36	$ 726.299,00	$ 26.146.764,00	35	-1

% PROGRAMADO	84%
% EJECUTADO	99,66%
DIFERENCIA	16,06%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	100	$ 252.197,00	$ 25.219.700,00	0	-100
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2237	$ 145.321,00	$ 325.083.077,00	1498	-739
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1821	$ 151.798,00	$ 276.424.158,00	116	-1705
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	551	$ 151.798,00	$ 83.640.698,00	0	-551
5	TABLERO PARA AULAS	151	$ 222.062,00	$ 33.531.362,00	0	-151
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	151	$ 248.289,00	$ 37.491.639,00	21	-130
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	56	$ 1.776.879,00	$ 99.505.224,00	0	-56
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	24	$ 717.304,00	$ 17.215.296,00	0	-24
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	498	$ 587.779,00	$ 292.713.942,00	0	-498
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	41	$ 726.299,00	$ 29.778.259,00	41	0


% PROGRAMADO	0%
% EJECUTADO	29,77%
DIFERENCIA	29,77%



Se presenta el avance total del proyecto el cual corrresponde al 83.39%, superando el programado en un 19%.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	300	100
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	7698	739
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	6520	1705
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	2507	551
5	TABLERO PARA AULAS	634	483	151
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	504	130
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	153	56
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	61	24
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	1598	520
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	144	1

% PROGRAMADO	63,72%
% EJECUTADO	83,39%
DIFERENCIA	19,67%

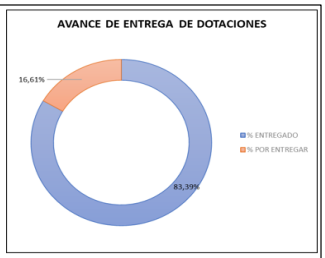

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 3 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 28 | 4 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La Gerencia programó una reunión para la 1:30 p. m. del día de hoy, con el fin de definir la ruta de las visitas y coordinar, junto con la interventoría, el municipio y un representante del contribuyente, las sedes a visitar.
2	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 26 (DIA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) **28** (Día en números) días del mes de **ABRIL** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 4 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 26 / 5 / 2025 (Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

GERENCIA CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO


Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


La reunión del Comité Técnico Número Cuatro contó con la asistencia de Marcelino Ruiz Montaño, Beatriz Elena Yara Arias, Germán Gómez y Christian Camilo Hernández. Durante el encuentro, se socializó el avance del proyecto de dotación, el cual alcanzó el 100,00 %, superando lo programado. Asimismo, se socializaron los recorridos realizados a varias instituciones educativas durante la semana anterior.

IV. TEMAS TRATADOS

Se socializó el avance del Convenio 007 de 2023, el cual se encuentra dentro de los tiempos previstos, sin que se hayan generado prórrogas. La ejecución de la orden de bien número cuatro finalizó los despachos la semana pasada, y se está a la espera de la confirmación por parte de la interventoría sobre la entrega total de las dotaciones, la cual se espera para el próximo Comité Técnico. Se reportó un avance del 100 % en la ejecución, frente a un 88,50 % programado, lo que representa un adelanto del 11,5 % en el proyecto.

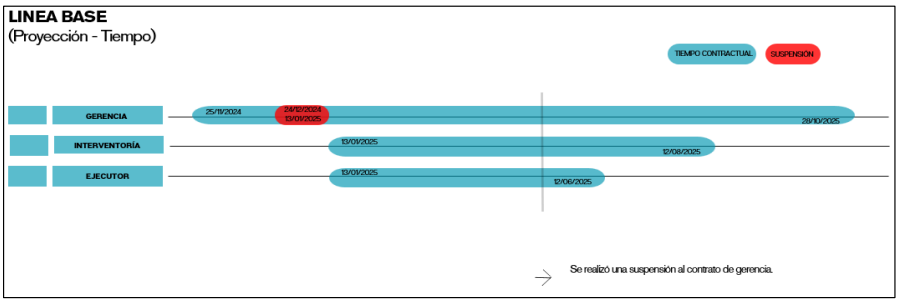


Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, a partir de la cual se estableció un cronograma de entregas con fecha de inicio el 15 de febrero de 2025 y fecha de finalización el 8 de junio de 2025.

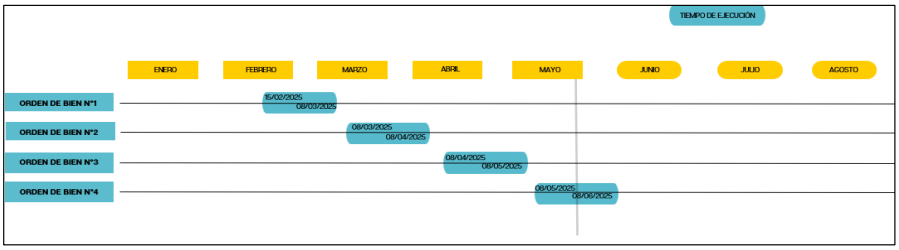

Se reportó un avance del 100 % en la ejecución, frente a un 88,50 % programado, lo que representa un adelanto del 11,5 % en el proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	400	0	100,00%	0,00%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	8437	0	100,00%	0,00%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	8225	0	100,00%	0,00%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	3058	0	100,00%	0,00%
5	TABLERO PARA AULAS	634	634	0	100,00%	0,00%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	634	0	100,00%	0,00%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	209	0	100,00%	0,00%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	85	0	100,00%	0,00%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	2118	0	100,00%	0,00%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	145	0	100,00%	0,00%
		23945	23945	0	100,00%	0,00%



% PROGRAMADO	88,50%
% EJECUTADO	100,00%
DIFERENCIA	11,50%

URBANAS
I.E. Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano
I.E., San Vicente
I.E., Liceo del Pacífico
I.E., Termarit
RURALES
I.E. Francisco Javier Cisneros
I.E. Nachasin
I.E. José María Córdoba

En la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros, se verificó que las cantidades entregadas correspondían a lo contratado. Sin embargo, se identificó una novedad relacionada con la afectación de la marcación en los tableros, atribuida al uso de alcohol para borrarlos. Esta situación ya está siendo gestionada con la interventoría y el ejecutor.

En la Institución Educativa Nachasín, la dotación entregada también coincidía con lo previsto, se encontraba en buen estado y estaba en uso. No obstante, el rector informó que aún había dotación almacenada pendiente de distribución.

Condiciones similares se evidenciaron en la Institución Educativa Agropecuario José María Córdoba, donde también se presentó el inconveniente de la marcación borrada en los tableros.

En las Instituciones Educativas San Vicente, Liceo del Pacífico, Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano y Termarit, se constató que las cantidades de dotación entregadas correspondían a lo contratado, se encontraban en uso y en óptimas condiciones. No obstante, se observó nuevamente la novedad recurrente de la marcación borrada en los tableros.

Beatriz Elena Yara Arias señaló que en el Liceo del Pacífico se identificaron aulas con mobiliario nuevo, pero con tableros antiguos. Lorena Castañeda confirmó que ya se había solicitado la corrección de esta situación. Asimismo, se observó que los casilleros de estudiantes no estaban presentes en todas las aulas visitadas, por lo que se generó la respectiva observación para su subsanación, solicitándose además un registro fotográfico del mobiliario completo.

Beatriz Elena Yara Arias también manifestó que los casilleros apilados representaban un riesgo para la seguridad, razón por la cual se solicitó que no fueran colocados uno encima del otro.

VISITA IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de Casilleros



Vista de puestos de trabajo - instalados en aula

VISITA IE NACHASIN


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de puestos trabajo preescolar


Inspección marcación P.T. preescolar


Inspección P.T. primaria en uso

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 4 CONVENIO 007 de 2023 **FECHA:** 26 | 5 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

VISITA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA



Vista de puestos de trabajo secundaria instalados en aula



Vista de puestos de trabajo primaria — Tableros instalados en aula

REGISTRO FOTGRÁFICO IE SAN VICENTE



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE LICEO DEL PACIFICO



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado

IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO



Reunión con Rectora de la Institución educativa



Vista de aulas primaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE TERMARIT



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros instalados



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
2	
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 26 (DIA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) **28** (Día en números) días del mes de **ABRIL** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 5 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 26 / 6 / 2025 (Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE	CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
GERENCIA	CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


El Comité revisó los avances del Convenio 007 de 2023, incluyendo la finalización de la ejecución del proyecto y la entrega de 23.945 conjuntos de dotaciones en Buenaventura, verificados por la interventoría, el Ministerio y la Gerencia.

Durante la sesión, se discutió la continuidad mensual de los comités hasta el cierre del convenio y de los contratos asociados. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la revisión de pagos e informes, incluyendo la recopilación y consolidación de los mismos.


El próximo Comité se programó para el 4 de agosto, con el fin de tratar asuntos relacionados con el cierre de contratos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

IV. TEMAS TRATADOS

Se socializó el avance del Convenio 007 de 2023, el cual se encuentra dentro de los tiempos previstos, sin haberse generado prórrogas. La ejecución del proyecto se completó al 100 % dentro del plazo establecido, incluyendo la entrega de 23.945 conjuntos de dotaciones, verificados en campo por la interventoría, el Ministerio y la Gerencia. Las dotaciones fueron distribuidas en 64 sedes educativas del distrito de Buenaventura.

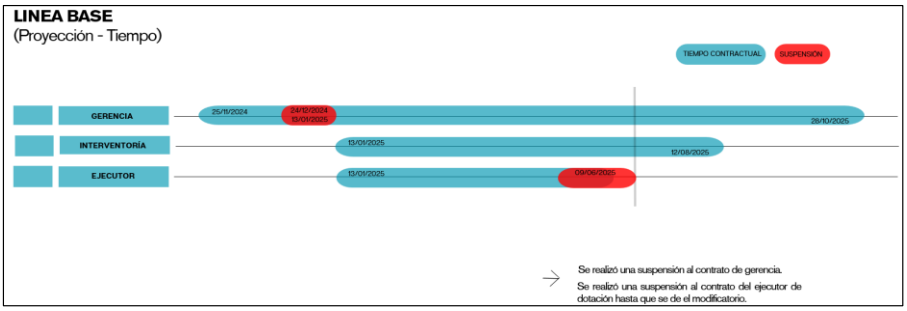


Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, a partir de la cual se estableció un cronograma con fecha de inicio el 15 de febrero de 2025 y fecha de finalización el 8 de junio de 2025.

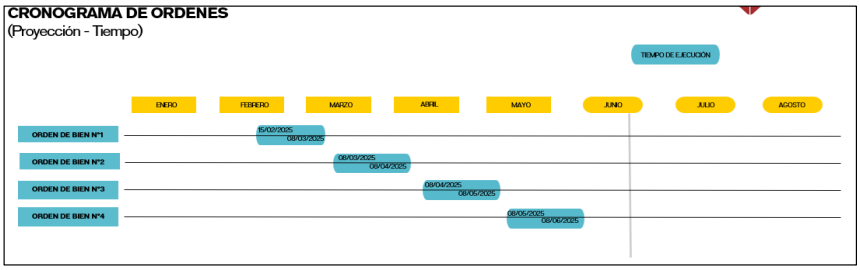

Se reportó un avance del 100 %, con un total de 23.945 conjuntos entregados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	400	0	100,00%	0,00%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	8437	0	100,00%	0,00%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	8225	0	100,00%	0,00%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	3058	0	100,00%	0,00%
5	TABLERO PARA AULAS	634	634	0	100,00%	0,00%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	634	0	100,00%	0,00%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	209	0	100,00%	0,00%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	85	0	100,00%	0,00%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	2118	0	100,00%	0,00%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	145	0	100,00%	0,00%
		23945	23945	0	100,00%	0,00%



% PROGRAMADO	100,00%
% EJECUTADO	100,00%
DIFERENCIA	0,00%

Se destacó que no se han recibido observaciones por parte de las instituciones respecto a la calidad de los insumos entregados. Sin embargo, se mantiene el seguimiento con la interventoría del Ministerio para identificar posibles observaciones o solicitudes adicionales. Cualquier comentario futuro será comunicado a todas las partes involucradas.

La ENC (ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE) aclaró que los comités deben continuar reuniéndose mensualmente hasta que el convenio y los contratos estén vigentes, con el fin de cumplir con las obligaciones y documentar adecuadamente el proceso de liquidación.

Desde la Gerencia se solicitó colaboración para la firma de las actas de comités previos y se comprometió a compartir el acta del presente comité.

El MEN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL) indicó que no existen inconvenientes con la aprobación de los informes de la interventoría, y que se están ajustando las aprobaciones de pagos. Se iniciará la revisión de los costos variables, las actas de entrega del mobiliario, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La ENC (ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE) enfatizó la importancia de recopilar los informes del proyecto para el proceso de cierre.

VISITA IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de Casilleros




Vista de puestos de trabajo - instalados en aula

VISITA IE NACHASIN


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de puestos trabajo preescolar


Inspección marcación P.T. preescolar


Inspección P.T. primaria en uso

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

INGENIEROS S.A.S.

Comité No. 5 CONVENIO 007 de 2023 **FECHA:** 26 | 6 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

VISITA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA



Vista de puestos de trabajo secundaria instalados en aula



Vista de puestos de trabajo primaria — Tableros instalados en aula

REGISTRO FOTGRÁFICO IE SAN VICENTE



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE LICEO DEL PACIFICO



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado

IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO



Reunión con Rectora de la Institución educativa



Vista de aulas primaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE TERMARIT





Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros instalados





Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
2	
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 4 (DIA) | 8 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (Día en letras) **26** (Día en números) días del mes de **junio** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto
