ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES EN SALUD	MMDS01.03.15.P001.F021	
		VERSIÓN	001

FECHA: 06/ago//2026 **HORA: INICIAL** 03:00 pm **HORA: FINAL** 05: 00 pm

LUGAR: Remoto

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Marca con X)

Sensibilización [ ] Capacitación [ ] Acompañamiento [X] Seguimiento [ ] Jornada [ ]

Articulación [ ] Otro, Cuál: _____

TIPO (Marca con X)

Individual: [ ] Colectiva: [X]

MODALIDAD (Marca con X)

Virtual: [X] Presencial: [ ]

DATOS DEL ENTORNO (Marca con X)

Educativo: [ ] Comunitario: [ ] Laboral: [X] Institucional: [ ] Hogar: [ ]

Datos de quien recibe la intervención: Álvaro Enrique Vargas
Nombre o Institución: E. S. E Red de Salud del Norte
Contacto: 3135344134
Correo: gestiondelriesgopicnorte@gmail.com

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1. **OBJETIVO**: Realizar seguimiento semanal a la ejecución del proyecto de Gestión del Riesgo del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Norte, con énfasis en el componente de cáncer, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, la correspondencia entre las jornadas planeadas y ejecutadas.

2. **ORDEN DEL DÍA:**

2.1. Presentación del equipo.
2.2. Desarrollo de la reunión.
2.3. Resultados alcanzados.
2.4. Conclusiones o recomendaciones.

3. **DESARROLLO DE LA INTERVENCION:**

Siendo las 3:00 se inicia la reunión se seguimiento semanal a la ejecución del proyecto de Gestión del Riesgo del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Norte

3.1 Revisión del anexo técnico y cronograma

Se realizó una revisión conjunta del anexo técnico del proyecto con el propósito de contextualizar el avance de las actividades, las fechas de ejecución y la distribución de las jornadas establecidas.

Durante la revisión se identificó que, aunque el anexo técnico contemplaba actividades desde febrero, la ejecución efectiva inició el 24 de abril de 2026. Por esta razón, fue necesario realizar una redistribución de las jornadas de acuerdo con la ejecución real y con los compromisos establecidos para las diferentes cuotas del proyecto.

Se enfatizó que el cronograma debe reflejar de manera precisa las actividades de planeación, coordinación y ejecución, distribuidas cronológicamente, con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar los procesos de seguimiento y auditoría.

3.2 Seguimiento a las jornadas de prevención de cáncer

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El proyecto contempla 27 jornadas de salud orientadas a la prevención de diferentes tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama, cuello uterino, cáncer infantil, colon y recto, pulmón, piel, gástrico y próstata.
Se informó que las fechas correspondientes a eventos conmemorativos constituyen actividades que no pueden ser modificadas, mientras que las demás jornadas requieren concertación y gestión de espacios con las instituciones y actores involucrados.
Durante los meses de abril a junio se realizó una redistribución de actividades para dar cumplimiento a la cuota dos. En abril se desarrollaron jornadas de prevención de cáncer infantil, articuladas con servicios de vacunación y salud mental. Posteriormente, en mayo se realizaron jornadas relacionadas con cáncer de próstata, colon y recto y cuello uterino.

3.3 Tamizajes y estrategias de remisión

Las jornadas contemplan la realización de tamizajes específicos de acuerdo con el tipo de cáncer priorizado, además de actividades de educación, sensibilización y consejería para identificación de factores de riesgo y orientación hacia los servicios de salud.
Cuando durante las jornadas no se logra alcanzar la meta establecida para determinados tamizajes, se definió como estrategia la remisión de los usuarios a sus respectivas IPS o la articulación con la ESE correspondiente para facilitar el procesamiento de las muestras.
El proyecto contempla como meta global 450 tamizajes y 90 consejerías, distribuidos entre las diferentes patologías priorizadas.

3.4 Estrategias educativas

Se evidenció que el proyecto tiene un enfoque principalmente educativo y de sensibilización, debido a que no cuenta con insumos físicos destinados para entrega a los participantes.
Para el desarrollo de las actividades se utilizan herramientas como rotafolios, modelos anatómicos de mama y cuello uterino, carpa inflable, videos educativos disponibles mediante códigos QR y encuestas de satisfacción.

Estas estrategias permiten fortalecer la educación para la prevención y promover el reconocimiento temprano de factores de riesgo asociados a los diferentes tipos de cáncer.

3.5 Revisión de las jornadas ejecutadas en junio y julio

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Durante el seguimiento se identificó una diferencia entre el número de jornadas registrado en el plan de trabajo y las efectivamente ejecutadas.

Para junio se registraban inicialmente seis jornadas; sin embargo, después de verificar el cronograma se estableció que fueron cinco jornadas efectivamente ejecutadas, por lo cual se acordó realizar el ajuste correspondiente.

De igual manera, para julio se confirmó la ejecución de cinco jornadas, relacionadas con cáncer de cérvix, colon y mama. Se acordó actualizar el cronograma y detallar cada actividad con su respectivo tipo de cáncer, fecha y ubicación, tomando la información directamente del cronograma para garantizar la precisión de los registros.

3.6 Gestión documental y evidencias

Se realizó seguimiento a la organización de las evidencias digitales necesarias para soportar la ejecución de las actividades.

Se estableció la necesidad de cargar en las carpetas correspondientes del Drive las actas, registros fotográficos, resultados de tamizajes e informes de las jornadas realizadas.

La información correspondiente a la segunda cuota se encontraba en proceso de consolidación y cargue. Se destacó que los archivos estaban organizados por tamizajes y jornadas, lo cual facilitará posteriormente la revisión y firma de los informes.

3.7 Revisión del tablero de control

Se realizó revisión del tablero de control correspondiente al fortalecimiento de la gestión del riesgo individual y colectivo.

Durante esta actividad se identificaron vacíos en la información relacionada con los cánceres priorizados, principalmente respecto a las metas programadas y ejecutadas para cada grupo poblacional.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se estableció la necesidad de complementar la información utilizando los listados de asistencia y garantizar la identificación de variables poblacionales requeridas para el informe mensual, incluyendo población afro, indígena, migrante, comunidad LGTBIQ+ y personas en situación de desplazamiento. En caso de no disponer del dato, se indicó como realizarlo de acuerdo con lo establecido durante la reunión.

3.8 Planeación de las actividades futuras

Se realizó la programación de las jornadas de prevención de cáncer para los meses siguientes.

Para agosto se establecieron cinco jornadas, incluyendo actividades relacionadas con prevención de cáncer gástrico, piel y pulmón. Para septiembre se proyectaron actividades relacionadas con cáncer de pulmón y para octubre jornadas enfocadas en cáncer de mama.

Se aclaró que las fechas registradas hasta octubre tienen carácter tentativo y podrán modificarse de acuerdo con la concertación de espacios y la gestión realizada, mientras que las fechas confirmadas corresponden a las actividades ya concertadas

4. RESULTADOS ALCANZADOS:

Como resultado del seguimiento técnico realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se realizó la revisión del anexo técnico y del cronograma de ejecución del proyecto.
- Se verificó la ejecución real de las actividades frente a las jornadas inicialmente programadas.
- Se identificó y acordó corregir la diferencia existente en el número de jornadas registradas para junio, ajustándolo de seis a cinco jornadas ejecutadas.
- Se confirmó la ejecución de cinco jornadas durante julio y se estableció la necesidad de documentarlas detalladamente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se confirmó el cumplimiento de la programación correspondiente a la cuota dos y el avance de las actividades de la cuota tres.
- Se establecieron metas globales de 450 tamizajes y 90 consejerías para el proyecto.
- Se definieron estrategias de remisión a IPS y articulación con las ESE cuando no se alcance la meta de tamizajes durante las jornadas.

 Se definieron estrategias de remisión a IPS y articulación con las ESE cuando no se alcance la meta de tamizajes durante las jornadas.

 Se avanzó en la organización de las evidencias correspondientes a las jornadas y tamizajes.
 Se estableció el cargue de actas, registros fotográficos, tamizajes e informes en las carpetas correspondientes del Drive.
 Se identificaron vacíos de información en el tablero de control, estableciendo la necesidad de completar las metas programadas y ejecutadas y las variables poblacionales.
 Se definió la programación de cinco jornadas para agosto y la planeación preliminar de las actividades de septiembre y octubre.
 Se acordó mantener el seguimiento semanal los días viernes a las 3:00 p. m., salvo que se presenten modificaciones por compromisos institucionales.

5. CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES

El seguimiento semanal permitió verificar el avance técnico y operativo del proyecto de Gestión del Riesgo del PIC Norte, particularmente en el componente de prevención y gestión del riesgo frente al cáncer.

Se evidenció la necesidad de mantener una actualización permanente del cronograma, de manera que exista correspondencia entre las actividades planeadas y las efectivamente ejecutadas. Los ajustes realizados para junio y julio permiten mejorar la consistencia de la información y fortalecer la trazabilidad del proceso.


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La gestión documental constituye un aspecto prioritario para el seguimiento del proyecto, por lo cual se estableció como compromiso completar el cargue de las evidencias correspondientes a las jornadas ejecutadas, incluyendo actas, registros fotográficos, resultados de tamizajes e informes.


De igual manera, se identificó la necesidad de fortalecer el tablero de control mediante la consolidación de información relacionada con metas, población atendida y variables poblacionales, garantizando que los reportes mensuales cuenten con información completa y verificable.

Finalmente, se estableció la continuidad del seguimiento semanal y la programación de las jornadas futuras, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto y mantener actualizados los soportes técnicos y documentales requeridos para los procesos de supervisión, seguimiento y control.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

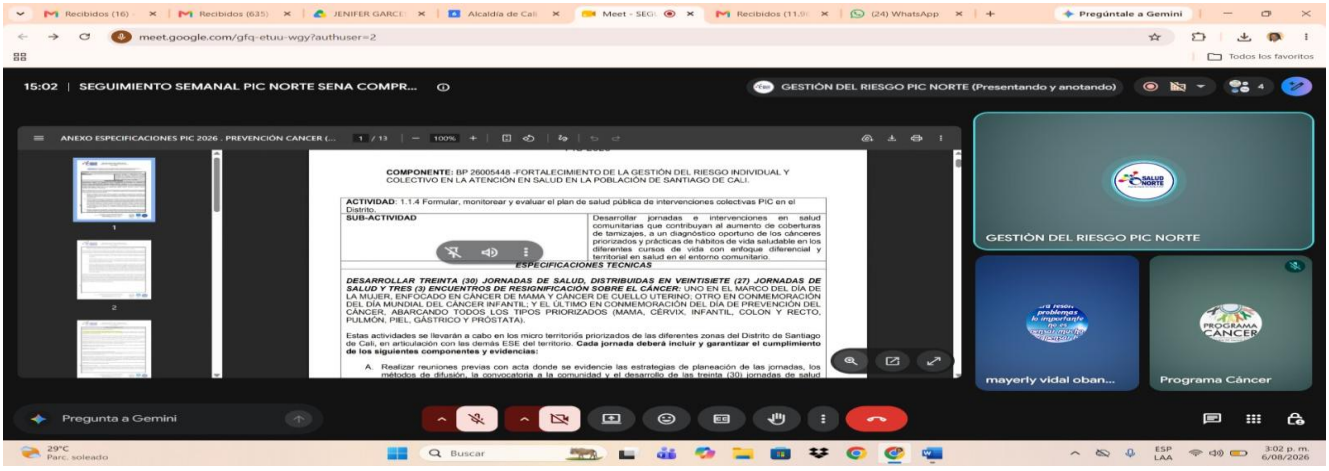


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

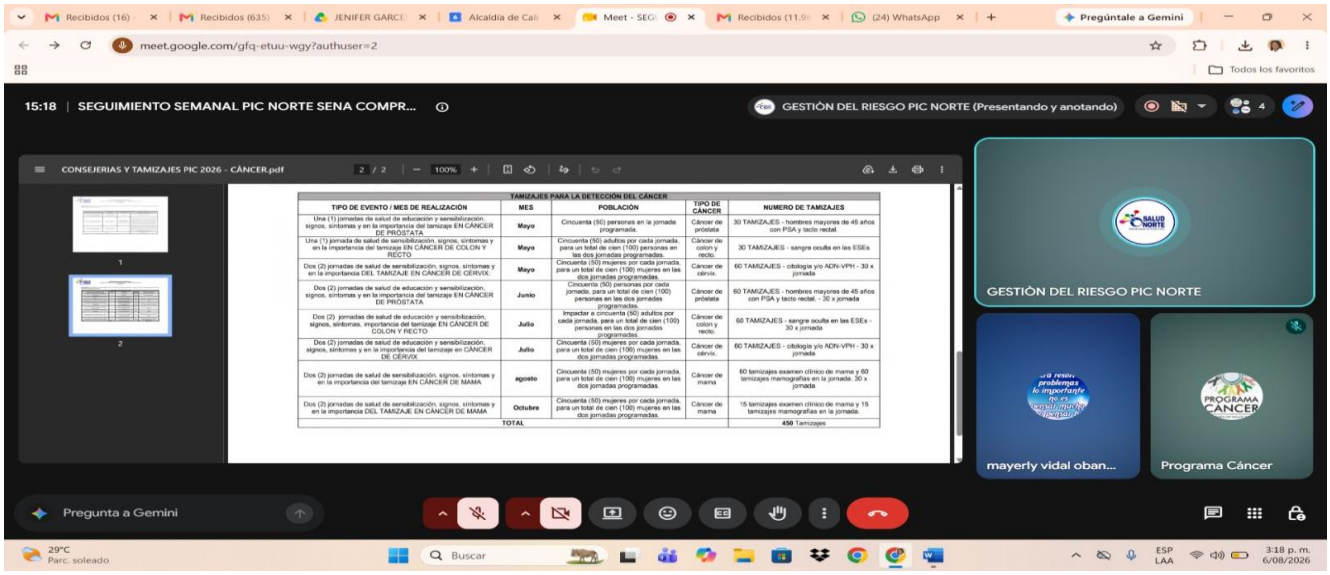

FECHA	HORA	Comuna	DIRECCIÓN	TIPO DE ACTIVIDAD	TIPO DE REFRIGERIO	SERVICIOS	TAMIZAJES
Viernes, 24 de julio 2026	9:00Am a 2:00Pm	4	COAMIR. Cl. 42 Nte. #1N-37, barrio Popular - Pastoral para Migrantes de la Arquidiócesis de Cali seria organizador principal jornada integral salud	Segunda jornada para la prevención del cáncer de colon y recto.	50 Fruta e hidratación	Vacunación - salud mental - servicios amigables - pruebas rapidas de VIH - educación y sensibilización en signos y sintomas para la prevención del cancer de colon y recto.	es impactar a cincuenta (50) adultos por cada jornada, para un total de cien (100) personas en las dos jornadas programadas. A cada participante se le deberá realizar el registro de asistencia y el registro fotográfico con marca de agua. Asimismo, se indagará sobre la presencia de signos y síntomas de alarma y, según el grupo etario, se verificará la realización de los tamizajes correspondientes. En caso de identificar que el tamizaje no ha sido realizado o se detecten hallazgos positivos, se procederá a activar la ruta oncológica ante la EPS y a efectuar los seguimientos respectivos **DEBERÁ GARANTIZAR 30 TAMIZAJES POR CADA JORNADA PARA UN TOTAL DE 30 TAMIZAJES.**
Viernes, 24 de julio 2026	8:00Am a 12:00M	5	Polideportivo torres de comfandi, carrera 1c con calle 57, santiago de Cali.	tercera jornada para la prevención del cáncer de colon y recto.	51 Fruta e hidratación	Vacunación - salud mental - servicios amigables - pruebas rapidas de VIH - educación y sensibilización en signos y sintomas para la prevención del cancer de colon y recto.	es impactar a cincuenta (50) adultos por cada jornada, para un total de cien (100) personas en las dos jornadas programadas. A cada participante se le deberá realizar el registro de asistencia y el registro fotográfico con marca de agua. Asimismo, se indagará sobre la presencia de signos y síntomas de alarma y, según el grupo etario, se verificará la realización de los tamizajes correspondientes. En caso de identificar que el tamizaje no ha sido realizado o se detecten hallazgos positivos, se procederá a activar la ruta oncológica ante la EPS y a efectuar los seguimientos respectivos **DEBERÁ GARANTIZAR 30 TAMIZAJES POR CADA JORNADA PARA UN TOTAL DE 30 TAMIZAJES.**
Sabado, 25 de julio 2026	8:00Am a 2:00Pm	6	Feria de servicios Jarillon de floralia - calle 84 #1i - 18	Cuarta jornada para la prevención del cáncer de cervix	52 Fruta e hidratación	Vacunación - salud mental - servicios amigables - pruebas rapidas de VIH - educación y sensibilización en signos y sintomas para la prevención del cancer de cervix - Citologia ADN/VPH	30 TAMIZAJES - citologia y/o ADN-VPH - 30 x jornada
Viernes, 31 de julio 2026	8:00Am a 12:30M	15	Calle 51 # 41 - 14 Barrio El Vallado	Primera jornada para la prevención del cáncer de mama.	53 Fruta e hidratación	Educación y sensibilización en signos y síntomas para la prevención del cáncer de mama - vacunación - talleres de auto cuidado y salud mental para la construcción de paz - examen clínico de mama y tamizaje mamografia	30 examen clinico de mama y 30 tamizajes mamografias

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

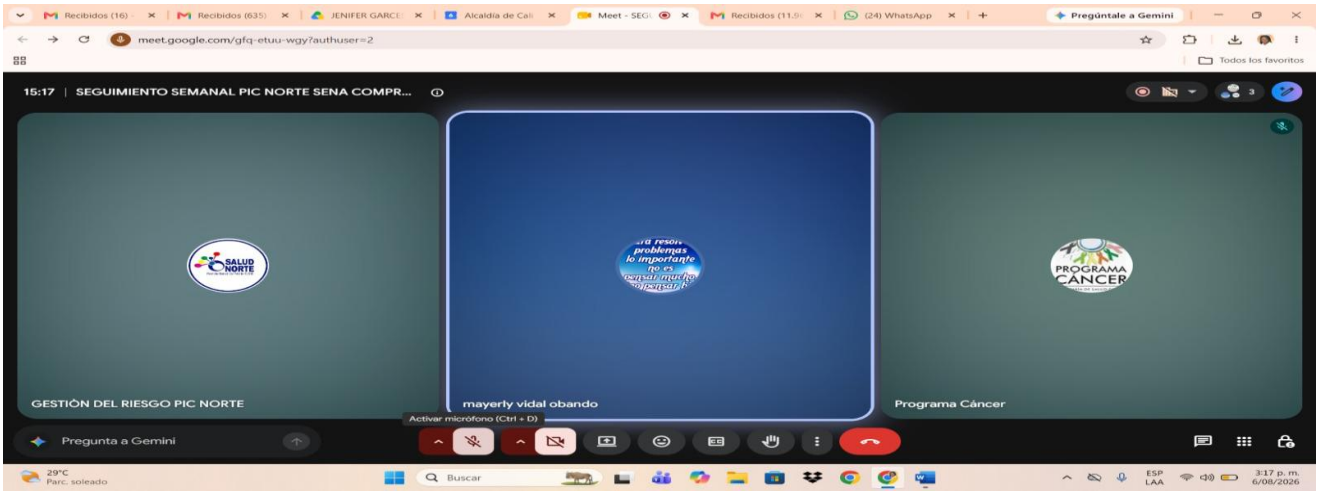

Marley Solis

Firma_____
Nombre: LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA
Cargo: Enfermera Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
