Fecha: 7 DE OCTUBRE DE 2025

Señor:
Jefry Zea
Director técnico EMDUCE

ASUNTO:
Informe de Control de Tareas Asignadas a los Técnicos

Introducción

El presente informe tiene como objetivo hacer un análisis detallado de las tareas asignadas a los técnicos durante la puesta en marcha del centro de control, evaluando el cumplimiento de los plazos establecidos y los retrasos observados. Se busca identificar áreas de mejora para optimizar la gestión de tareas y reducir los tiempos de retraso.

Metodología

La información sobre las tareas asignadas se ha recopilado a través del correo control@emduce.gov.co tanto de ingreso como las respuestas que se han dado a los solicitantes con copia al mismo por los técnicos. El control de las tareas se ha basado en las fechas de asignación y cumplimiento, así como en los tiempos reportados de retraso.

Análisis de Tareas por técnico

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
139	ANDRE A	3/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
434	BRANDON LOPERA	8/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
439	BRANDON LOPERA	6/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
442	BRANDON LOPERA	30/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
803	BRANDON LOPERA	30/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
809	BRANDON LOPERA	2/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
811	BRANDON LOPERA	3/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
818	BRANDON LOPERA	4/06/2025	REALIZADA CON RETRASO

819	BRANDON LOPERA	4/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
841	BRANDON LOPERA	9/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
845	BRANDON LOPERA	10/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
848	BRANDON LOPERA	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
882	BRANDON LOPERA	23/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
901	BRANDON LOPERA	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
908	BRANDON LOPERA	28/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
911	BRANDON LOPERA	28/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
913	BRANDON LOPERA	28/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
916	BRANDON LOPERA	28/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
930	BRANDON LOPERA	31/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
931	BRANDON LOPERA	31/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
932	BRANDON LOPERA	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
935	BRANDON LOPERA	31/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
942	BRANDON LOPERA	5/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
945	BRANDON LOPERA	18/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
960	BRANDON LOPERA	26/08/22025	REALIZADA A TIEMPO
976	BRANDON LOPERA	19/08/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – Brandon Lopera

1. Tareas realizadas a tiempo (9 tareas – 36%)
2. Tareas realizadas con retraso (13 tareas – 52%)
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (2 tareas – 8%)
4. Tareas aún dentro del plazo (1 tarea – 4%)

Conclusión y Recomendaciones

• El **60%** de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar).

200	CAMILO NEGRETE	14/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
235	CAMILO NEGRETE	24/02/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – Camilo Negrete

1. Tareas realizadas a tiempo: 1 tarea – 50%
2. Tareas realizadas con retraso: 1 tarea – 50%
3. Tareas sin realizar y ya vencidas: 0 tareas – 0%
4. Tareas aún dentro del plazo: 0 tareas – 0%

Conclusión y Recomendaciones

- El 50% de las tareas fue entregado con retraso, lo que indica necesidad de mejorar la gestión del tiempo.
- Aunque no hay tareas sin realizar, se sugiere monitorear el cumplimiento futuro para evitar tendencia negativa.

386	CONTABILIDAD	7/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
956	CONTABILIDAD	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – Contabilidad

1. **Tareas realizadas a tiempo**: 2 tareas – **100%**
2. **Tareas realizadas con retraso**: 0 tareas – **0%**
3. **Tareas sin realizar y ya vencidas**: 0 tareas – **0%**
4. **Tareas aún dentro del plazo**: 0 tareas – **0%**

Conclusión y Recomendaciones

- Cumplimiento **excelente**, con el **100%** de las tareas entregadas a tiempo.
- Se recomienda **mantener las buenas prácticas actuales** y utilizarlas como ejemplo para otros colaboradores o áreas.

151	INFO		REALIZADA A TIEMPO
210	INFO	18/02/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – INFO

1. Tareas realizadas a tiempo: 2 tareas – 100%
2. Tareas realizadas con retraso: 0 tareas – 0%

3. Tareas sin realizar y ya vencidas: 0 tareas – 0%
4. Tareas aún dentro del plazo: 0 tareas – 0%

Conclusión y Recomendaciones

- Cumplimiento óptimo, con el 100% de las tareas entregadas a tiempo.

378	JEFRY	4/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
429	JEFRY	2/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
871	JEFRY	24/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
925	JEFRY -JURIDICA	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – Jefry

1. Tareas realizadas a tiempo: 4 tareas – 100%
2. Tareas realizadas con retraso: 0 tareas – 0%
3. Tareas sin realizar y ya vencidas: 0 tareas – 0%
4. Tareas aún dentro del plazo: 0 tareas – 0%

Conclusión y Recomendaciones

- Excelente nivel de cumplimiento, con el 100% de las tareas finalizadas a tiempo.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
877	JHONATHAN	23/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
878	JHONATHAN	23/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
883	JHONATHAN	23/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
890	JHONATHAN - BRANDON	23/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
897	JHONATHAN	24/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
912	JHONATHAN	29/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
917	JHONATHAN	28/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
919	JHONATHAN	4/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
920	JHONATHAN	29/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
921	JHONATHAN - BRANDON	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
926	JHONATHAN	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
933	JHONATHAN	6/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
944	JHONATHAN	4/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
957	JHONATHAN	11/08/2025	REALIZADA CON RETRASO

964	JHONATHAN	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
965	JHONATHAN	19/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
966	JHONATHAN	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
988	JHONATHAN	29/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

Análisis Detallado – Jhonathan

1. Tareas realizadas a tiempo (12 tareas – 67%)
   - Tareas: 877, 897, 917, 919, 920, 921, 926, 933, 944, 964, 965, 966
2. Tareas realizadas con retraso (4 tareas – 22%)
   - Tareas: 878, 890, 912, 957
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (2 tareas – 11%)
   - Tareas: 883, 988
4. Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)
   - No se identifican tareas pendientes dentro de su plazo actual.

Conclusión y Recomendaciones

- El 33% de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar), lo que refleja un área crítica a mejorar.
- A pesar de que el 67% de las tareas fueron completadas puntualmente, se recomienda:
  - Fortalecer el seguimiento de plazos para evitar acumulación de tareas vencidas.
  - Implementar alertas o recordatorios para tareas próximas a vencer.
  - Evaluar posibles causas de los retrasos y proponer acciones correctivas.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
134	JORGE ANAYA	1/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
165	JORGE ANAYA	6/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
195	JORGE ANAYA	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
206	JORGE ANAYA	18/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
241	JORGE ANAYA	28/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
269	JORGE ANAYA	5/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
285	JORGE ANAYA	6/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
336	JORGE ANAYA	19/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
340	JORGE ANAYA	20/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
347	JORGE ANAYA	24/03/2025	REALIZADA CON

			RETRASO
374	JORGE ANAYA	7/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
851	JORGE ANAYA	13/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
874	JORGE ANAYA	2/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
902	JORGE ANAYA	25/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
903	JORGE ANAYA	25/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
934	JORGE ANAYA	31/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
954	JORGE ANAYA	8/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

Análisis Detallado – Jorge Anaya

1. **Tareas realizadas a tiempo** (4 tareas – 24%)
    - Tareas: 165, 241, 374, 874, 902
2. **Tareas realizadas con retraso** (9 tareas – 53%)
    - Tareas: 134, 195, 206, 269, 285, 336, 340, 347, 851, 934
3. **Tareas sin realizar y ya vencidas** (2 tareas – 12%)
    - Tareas: 903, 954
4. **Tareas aún dentro del plazo** (0 tareas – 0%)
    - Todas las tareas vencieron ya, ninguna está pendiente dentro del plazo.

Conclusión y Recomendaciones

- El **65% de las tareas** presentan problemas de cumplimiento (**retraso o sin realizar**), lo que representa una situación preocupante que requiere intervención inmediata.
- Solo un **24% de las tareas fueron completadas puntualmente**, lo cual es significativamente bajo.
- **Recomendaciones**:
    - Implementar un sistema de alertas o gestión de plazos más riguroso.

101	LAURA MARTINEZ	24/01/2025	REALIZADA CON RETRASO

102	LAURA MARTINEZ	27/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
103	LAURA MARTINEZ	30/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
104	LAURA MARTINEZ	25/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
108	LAURA MARTINEZ	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
111	LAURA MARTINEZ	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
117	LAURA MARTINEZ		REALIZADA A TIEMPO
126	LAURA MARTINEZ	29/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
129	LAURA MARTINEZ	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
130	LAURA MARTINEZ	30/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
132	LAURA MARTINEZ	6/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
146	LAURA MARTINEZ	2/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
155	LAURA MARTINEZ	3/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
169	LAURA MARTINEZ	7/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
170	LAURA MARTINEZ	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
185	LAURA MARTINEZ	11/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
190	LAURA MARTINEZ	12/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
196	LAURA MARTINEZ	17/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
197	LAURA MARTINEZ	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
199	LAURA MARTINEZ - SERGIO - RODRIGO	17/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
201	LAURA MARTINEZ	13/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
204	LAURA MARTINEZ	17/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
208	LAURA MARTINEZ	17/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
211	LAURA MARTINEZ	19/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
212	LAURA MARTINEZ - SERGIO - RODRIGO	14/02/20257	REALIZADA A TIEMPO
247	LAURA MARTINEZ	26/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
250	LAURA MARTINEZ	26/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
253	LAURA MARTINEZ	26/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
254	LAURA MARTINEZ	27/02/2025	REALIZADA A TIEMPO

273	LAURA MARTINEZ	5/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
278	LAURA MARTINEZ	5/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
279	LAURA MARTINEZ	6/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
281	LAURA MARTINEZ	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
290	LAURA MARTINEZ	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
291	LAURA MARTINEZ	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
311	LAURA MARTINEZ	13/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
314	LAURA MARTINEZ	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
319	LAURA MARTINEZ	17/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
324	LAURA MARTINEZ	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
330	LAURA MARTINEZ	17/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
338	LAURA MARTINEZ	19/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
348	LAURA MARTINEZ	24/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
352	LAURA MARTINEZ	26/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
355	LAURA MARTINEZ	31/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
358	LAURA MARTINEZ	31/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
372	LAURA MARTINEZ	2/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
382	LAURA MARTINEZ	7/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
397	LAURA MARTINEZ	9/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
402	LAURA MARTINEZ	11/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
403	LAURA MARTINEZ	11/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
404	LAURA MARTINEZ	11/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
406	LAURA MARTINEZ	11/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
407	LAURA MARTINEZ	11/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
413	LAURA MARTINEZ	15/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
421	LAURA MARTINEZ	29/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
430	LAURA MARTINEZ	2/05/2025	REALIZADA A TIEMPO

433	LAURA MARTINEZ	6/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
440	LAURA MARTINEZ	9/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
443	LAURA MARTINEZ	23/05/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
802	LAURA MARTINEZ	30/05/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
804	LAURA MARTINEZ	30/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
808	LAURA MARTINEZ	2/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
810	LAURA MARTINEZ	2/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
812	LAURA MARTINEZ - TATIANA	3/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
816	LAURA MARTINEZ	3/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
817	LAURA MARTINEZ	4/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
820	LAURA MARTINEZ	4/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
824	LAURA MARTINEZ	6/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
826	LAURA MARTINEZ	3/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
828	LAURA MARTINEZ	6/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
831	LAURA MARTINEZ	6/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
835	LAURA MARTINEZ	9/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
836	LAURA MARTINEZ	09/-06/2025	REALIZADA A TIEMPO
837	LAURA MARTINEZ	9/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
840	LAURA MARTINEZ	9/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
842	LAURA MARTINEZ	10/11/2025	REALIZADA CON RETRASO
843	LAURA MARTINEZ	10/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
844	LAURA MARTINEZ	10/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
846	LAURA MARTINEZ	10/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
849	LAURA MARTINEZ	13/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
852	LAURA MARTINEZ	13/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
858	LAURA MARTINEZ	19/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
861	LAURA MARTINEZ	25/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
868	LAURA MARTINEZ	24/06/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado Laura Martínez

1. Tareas realizadas a tiempo (26 tareas – 42%)

2. Tareas realizadas con retraso (33 tareas – 53%)
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (2 tareas – 3%)
4. Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)

Conclusión y Recomendaciones

- El 56% de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar).
- Se recomienda implementar acciones de mejora en la gestión del tiempo y priorización para reducir los retrasos.

114	MANUEL LLANOS	10/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
120	MANUEL LLANOS	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
122	MANUEL LLANOS	4/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
123	MANUEL LLANOS	30/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
125	MANUEL LLANOS	3/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
131	MANUEL LLANOS	5/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
136	MANUEL LLANOS	4/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
138	MANUEL LLANOS	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
141	MANUEL LLANOS	3/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
148	MANUEL LLANOS	6/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
154	MANUEL LLANOS, CONTABILIDAD	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
162	MANUEL LLANOS	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
177	MANUEL LLANOS	20/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
189	MANUEL LLANOS	28/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
198	MANUEL LLANOS	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
204	MANUEL LLANOS , JURIDICA	24/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
205	MANUEL LLANOS	17/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
215	MANUEL LLANOS	19/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
220	MANUEL LLANOS	20/02/2025	REALIZADA CON RETRASO

229	MANUEL LLANOS	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
238	MANUEL LLANOS	25/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
255	MANUEL LLANOS	5/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
258	MANUEL LLANOS	28/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
259	MANUEL LLANOS	28/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
260	MANUEL LLANOS	28/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
264	MANUEL LLANOS	3/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
265	MANUEL LLANOS	3/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
268	MANUEL LLANOS	17/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
277	MANUEL LLANOS	18/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
283	MANUEL LLANOS	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
284	MANUEL LLANOS	6/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
294	MANUEL LLANOS	10/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
298	MANUEL LLANOS	21/03/2025	REALIZADA A TIEMPO

305	MANUEL LLANOS	12/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
306	MANUEL LLANOS	12/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
307	MANUEL LLANOS	12/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
315	MANUEL LLANOS	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
322	MANUEL LLANOS	14/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
325	MANUEL LLANOS	18/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
328	MANUEL LLANOS	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
334	MANUEL LLANOS	18/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
341	MANUEL LLANOS	20/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
351	MANUEL LLANOS	26/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
354	MANUEL LLANOS	27/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
356	MANUEL LLANOS	31/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
357	MANUEL LLANOS	31/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
375	MANUEL LLANOS	4/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
379	MANUEL LLANOS	4/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
383	MANUEL LLANOS	8/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
392	MANUEL LLANOS	7/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
394	MANUEL LLANOS	9/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
395	MANUEL LLANOS	9/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
398	MANUEL LLANOS	11/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
401	MANUEL LLANOS	11/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

Análisis Detallado Manuel Llanos

1. Tareas realizadas a tiempo (14 tareas – 29%)
2. Tareas realizadas con retraso (22 tareas – 45%)
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (13 tareas – 26%)
4. Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)

Conclusión y Recomendaciones

- El 71% de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar).
- Se recomienda reforzar la planificación y seguimiento para evitar que más tareas queden sin realizar o con retraso.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
118	MONICA MARTINEZ	3/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
166	MONICA MARTINEZ	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
178	MONICA MARTINEZ	14/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
256	MONICA MARTINEZ	27/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
257	MONICA MARTINEZ	28/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
270	MONICA MARTINEZ	5/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
293	MONICA MARTINEZ	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
323	MONICA MARTINEZ	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
405	MONICA MARTINEZ	11/04/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
426	MONICA MARTINEZ	30/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
899	MONICA MARTINEZ	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
910	MONICA MARTINEZ	25/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
929	MONICA MARTINEZ	31/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
962	MONICA MARTINEZ	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
978	MONICA MARTINEZ	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

Análisis Detallado – Mónica Martínez

1. **Tareas realizadas a tiempo** (4 tareas – 27%)
   - Tareas: 256, 270, 910, 929, 962
2. **Tareas realizadas con retraso** (7 tareas – 47%)
   - Tareas: 118, 166, 178, 293, 323, 426, 899
3. **Tareas sin realizar y ya vencidas** (3 tareas – 20%)
   - Tareas: 257, 405, 978
4. **Tareas aún dentro del plazo** (0 tareas – 0%)
   - Todas las tareas ya tienen fecha de vencimiento pasada.

Conclusión y Recomendaciones

- El **67% de las tareas** presentan problemas de cumplimiento (**retraso o sin realizar**), lo que refleja un área crítica que requiere mejora inmediata.

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
107	PABLO DUQUE	30/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
10G	PABLO DUQUE	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
110	PABLO DUQUE	31/01/2025	OK
112	PABLO DUQUE	31/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
113	PABLO DUQUE		REALIZADA A TIEMPO
115	PABLO DUQUE		REALIZADA A TIEMPO
121	PABLO DUQUE	6/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
124	PABLO DUQUE	31/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
127	PABLO DUQUE	5/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
128	PABLO DUQUE	3/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
133	PABLO DUQUE	30/01/2025	REALIZADA A TIEMPO
140	PABLO DUQUE	2/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
142	PABLO DUQUE	5/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
143	PABLO DUQUE		REALIZADA A TIEMPO
144	PABLO DUQUE	5/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
145	PABLO DUQUE	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
147	PABLO DUQUE	6/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
150	PABLO DUQUE	4/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
152	PABLO DUQUE	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
153	PABLO DUQUE	6/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
156	PABLO DUQUE	4/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
15G	PABLO DUQUE	11/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
160	PABLO DUQUE	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
161	PABLO DUQUE	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
171	PABLO DUQUE	6/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
172	PABLO DUQUE	11/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
174	PABLO DUQUE	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
175	PABLO DUQUE	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
176	PABLO DUQUE	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
180	PABLO DUQUE	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
181	PABLO DUQUE	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
182	PABLO DUQUE	11/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
183	PABLO DUQUE	11/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
186	PABLO DUQUE	12/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
187	PABLO DUQUE	12/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
188	PABLO DUQUE	12/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
1G3	PABLO DUQUE	17/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
1G4	PABLO DUQUE	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
203	PABLO DUQUE	17/02/2025	REALIZADA CON RETRASO

207	PABLO DUQUE	17/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
20G	PABLO DUQUE	18/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
214	PABLO DUQUE	16/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
216	PABLO DUQUE	20/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
217	PABLO DUQUE	20/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
221	PABLO DUQUE	20/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
222	PABLO DUQUE	20/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
224	PABLO DUQUE	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
228	PABLO DUQUE	21/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
230	PABLO DUQUE	21/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
232	PABLO DUQUE	21/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
237	PABLO DUQUE	24/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
23G	PABLO DUQUE	25/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
240	PABLO DUQUE	25/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
242	PABLO DUQUE	25/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
243	PABLO DUQUE	25/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
244	PABLO DUQUE	26/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
245	PABLO DUQUE	26/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
246	PABLO DUQUE	26/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
248	PABLO DUQUE	25/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
251	PABLO DUQUE	26/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
261	PABLO DUQUE	28/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
262	PABLO DUQUE	28/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
SIN	PABLO DUQUE	3/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
267	PABLO DUQUE	26/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
271	PABLO DUQUE	5/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
280	PABLO DUQUE	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
288	PABLO DUQUE	7/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
28G	PABLO DUQUE	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
2G2	PABLO DUQUE	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
2G5	PABLO DUQUE	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
2GG	PABLO DUQUE	10/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
RE	PABLO DUQUE	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
303	PABLO DUQUE	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
304	PABLO DUQUE	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
308	PABLO DUQUE	12/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
30G	PABLO DUQUE	11/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
310	PABLO DUQUE	13/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
312	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
313	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
317	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
318	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO

320	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
321	PABLO DUQUE	14/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
326	PABLO DUQUE	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
327	PABLO DUQUE	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
331	PABLO DUQUE	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
332	PABLO DUQUE	17/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
333	PABLO DUQUE	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
342	PABLO DUQUE	20/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
344	PABLO DUQUE	21/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
345	PABLO DUQUE	21/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
34G	PABLO DUQUE	26/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
350	PABLO DUQUE	26/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
353	PABLO DUQUE	26/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
35G	PABLO DUQUE	28/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
361	PABLO DUQUE	31/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
362	PABLO DUQUE	31/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
364	PABLO DUQUE	31/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
365	PABLO DUQUE	31/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
367	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
368	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
36G	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
370	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
371	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
373	PABLO DUQUE	1/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
376	PABLO DUQUE	4/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
377	PABLO DUQUE	4/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
380	PABLO DUQUE	4/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
381	PABLO DUQUE	4/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
384	PABLO DUQUE	7/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
385	PABLO DUQUE	7/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
387	PABLO DUQUE	7/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
388	PABLO DUQUE	8/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
38G	PABLO DUQUE	7/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
3G0	PABLO DUQUE	7/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
400	PABLO DUQUE	11/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
RE	PABLO DUQUE	14/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
40G	PABLO DUQUE	14/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
410	PABLO DUQUE	14/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
411	PABLO DUQUE	14/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
412	PABLO DUQUE	15/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
414	PABLO DUQUE	15/04/2025	REALIZADA CON RETRASO

415	PABLO DUQUE	15/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
416	PABLO DUQUE	28/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
417	PABLO DUQUE	26/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
418	PABLO DUQUE	30/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
41G	PABLO DUQUE	26/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
420	PABLO DUQUE	26/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
422	PABLO DUQUE	26/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
425	PABLO DUQUE	28/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
427	PABLO DUQUE	30/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
431	PABLO DUQUE	30/04/2025	REALIZADA A TIEMPO
432	PABLO DUQUE	2/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
435	PABLO DUQUE	5/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
441	PABLO DUQUE	21/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
805	PABLO DUQUE	30/05/2025	REALIZADA CON RETRASO
806	PABLO DUQUE	30/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
807	PABLO DUQUE	30/05/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
813	PABLO DUQUE	3/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
814	PABLO DUQUE	3/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
821	PABLO DUQUE	2/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
822	PABLO DUQUE	4/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
825	PABLO DUQUE	3/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
82G	PABLO DUQUE	6/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
830	PABLO DUQUE	6/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
832	PABLO DUQUE	6/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
833	PABLO DUQUE	6/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
838	PABLO DUQUE	6/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
83G	PABLO DUQUE	6/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
854	PABLO DUQUE	16/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
855	PABLO DUQUE	16/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
856	PABLO DUQUE	16/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
85G	PABLO DUQUE	16/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
860	PABLO DUQUE	16/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
862	PABLO DUQUE	24/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
863	PABLO DUQUE	24/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
864	PABLO DUQUE	24/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
866	PABLO DUQUE	24/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
867	PABLO DUQUE	24/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
86G	PABLO DUQUE	24/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
870	PABLO DUQUE	25/06/2025	REALIZADA CON RETRASO

Análisis Detallado – Pablo Duque

1. Tareas realizadas a tiempo:
   40 tareas (29%)

2. Tareas realizadas con retraso:
   72 tareas (51%)

3. Tareas sin realizar y ya vencidas:
   17 tareas (12%)

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
884	PAULINA	23/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
887	PAULINA	23/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
888	PAULINA - MONICA	24/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
892	PAULINA	23/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
893	PAULINA	23/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
894	PAULINA	24/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
909	PAULINA	11/08//2025	SIN REALIZAR VENCIDA
914	PAULINA	28/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
915	PAULINA	28/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
918	PAULINA	28/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
923	PAULINA	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
924	PAULINA	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
928	PAULINA	31/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
937	PAULINA	29/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
938	PAULINA	31/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
939	PAULINA	1/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
940	PAULINA	31/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
952	PAULINA	8/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
967	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
968	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
969	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
970	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
971	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
972	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
973	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
974	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO

975	PAULINA	22/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
981	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
982	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
983	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
984	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
985	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
986	PAULINA	19/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
987	PAULINA	5/09/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

Análisis Detallado – Paulina

1. Tareas realizadas a tiempo (17 tareas – 46%)
2. Tareas realizadas con retraso (4 tareas – 11%)
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (16 tareas – 43%)
4. Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)

Conclusión y Recomendaciones
• El **54%** de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar).

886	SEBASTIAN - JURIDICA	25/07/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado Sebastián - Jurídica

1. Tareas realizadas a tiempo (1 tarea – 100%)
2. Tareas realizadas con retraso (0 tareas – 0%)
3. Tareas sin realizar y ya vencidas (0 tareas – 0%)
4. Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)

Conclusión y Recomendaciones
El 0% de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar). Se recomienda mantener la gestión actual para seguir cumpliendo con los tiempos establecidos**.**

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
105	SERGIO ARANGO	24/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
106	SERGIO ARANGO	28/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
115	SERGIO ARANGO		REALIZADA A TIEMPO

119	SERGIO ARANGO	30/01/2025	REALIZADA CON RETRASO
135	SERGIO ARANGO	5/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
136	SERGIO ARANGO	4/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
149	SERGIO ARANGO	10/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
158	SERGIO ARANGO	6/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
163	SERGIO ARANGO	7/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
168	SERGIO ARANGO	6/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
173	SERGIO ARANGO	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
191	SERGIO ARANGO	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
192	SERGIO ARANGO	13/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
202	SERGIO ARANGO CAROLINA ARBOLEDA	18/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
213	SERGIO ARANGO	18/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
218	SERGIO ARANGO	20/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
219	SERGIO ARANGO	20/02/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
225	SERGIO ARANGO	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
227	SERGIO ARANGO	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
231	SERGIO ARANGO	21/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
233	SERGIO ARANGO	21/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
234	SERGIO ARANGO	24/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
236	SERGIO ARANGO	24/02/2025	REALIZADA A TIEMPO
249	SERGIO ARANGO	26/02/2025	REALIZADA CON RETRASO
252	SERGIO ARANGO	26/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
272	SERGIO ARANGO	5/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
274	SERGIO ARANGO	5/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
275	SERGIO ARANGO	6/03/2025	REALIZADA CON RETRASO

276	SERGIO ARANGO	6/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
282	SERGIO ARANGO	7/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
296	SERGIO ARANGO	10/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
297	SERGIO ARANGO	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
300	SERGIO ARANGO	10/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
302	SERGIO ARANGO	10/03/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
329	SERGIO ARANGO	18/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
335	SERGIO ARANGO	19/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
337	SERGIO ARANGO	19/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
343	SERGIO ARANGO	20/03/2025	REALIZADA CON RETRASO
360	SERGIO ARANGO	31/03/2025	REALIZADA A TIEMPO
391	SERGIO ARANGO	7/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
399	SERGIO ARANGO	11/04/2025	REALIZADA CON RETRASO
428	SERGIO ARANGO	2/05/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
437	SERGIO ARANGO	6/05/2025	REALIZADA A TIEMPO
815	SERGIO ARANGO	2/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
823	SERGIO ARANGO	4/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
850	SERGIO ARANGO	13/06/2025	REALIZADA CON RETRASO
853	SERGIO ARANGO	14/06/2025	REALIZADA A TIEMPO
865	SERGIO ARANGO	24/06/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
879	SERGIO ARANGO	25/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
881	SERGIO ARANGO	23/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
885	SERGIO ARANGO	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
889	SERGIO ARANGO	23/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
891	SERGIO ARANGO	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
895	SERGIO ARANGO	24/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
896	SERGIO ARANGO	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
898	SERGIO ARANGO	24/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA

900	SERGIO ARANGO	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
900	SERGIO ARANGO	23/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
905	SERGIO ARANGO	24/07/2025	REALIZADA CON RETRASO
906	SERGIO ARANGO	28/07/2025	REALIZADA A TIEMPO

907	SERGIO ARANGO	28/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
922	SERGIO ARANGO	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
927	SERGIO ARANGO	30/07/2025	REALIZADA A TIEMPO
936	SERGIO ARANGO	31/07/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
941	SERGIO ARANGO	8/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
943	SERGIO ARANGO	4/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
946	SERGIO ARANGO	6/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
948	SERGIO ARANGO	4/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
950	SERGIO ARANGO	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
951	SERGIO ARANGO	8/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
953	SERGIO ARANGO	8/08/2025	SIN REALIZAR VENCIDA
955	SERGIO ARANGO	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
958	SERGIO ARANGO	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
959	SERGIO ARANGO	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
961	SERGIO ARANGO	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
977	SERGIO ARANGO	14/08/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado – Sergio Arango

1. **Tareas realizadas a tiempo (20 tareas – 27%)**
2. **Tareas realizadas con retraso (40 tareas – 53%)**
3. **Tareas sin realizar y ya vencidas (15 tareas – 20%)**
4. **Tareas aún dentro del plazo (0 tareas – 0%)**

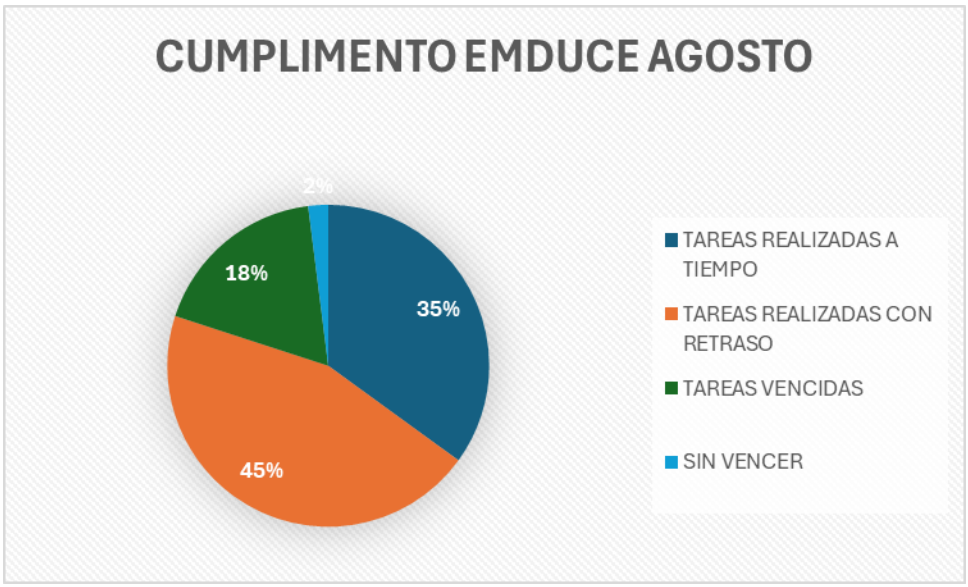
Conclusión y Recomendaciones
• El **73%** de las tareas presentan problemas de cumplimiento (retraso o sin realizar).

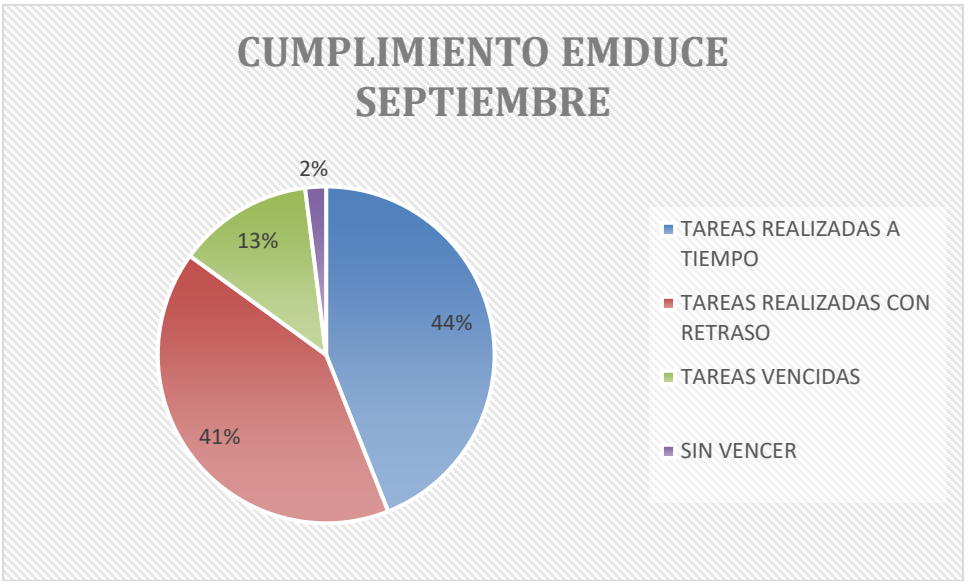
TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLIMIENTO
947	TATIANA	4/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
963	TATIANA	11/08/2025	REALIZADA A TIEMPO
980	TATIANA	19/08/2025	REALIZADA A TIEMPO

Análisis Detallado Tesorería y Tatiana

1. Tareas realizadas a tiempo (3 tareas – 75%)
2. Tareas sin vencer (1 tarea – 25%)
3. Tareas realizadas con retraso (0 tareas – 0%)
4. Tareas sin realizar y ya vencidas (0 tareas – 0%)

Conclusión y Recomendaciones
El 75% de las tareas han sido realizadas a tiempo, y el 25% está aún dentro del plazo. No se presentan retrasos ni tareas vencidas.





Resumen de Cumplimiento General – Área Técnica

Distribución por estado:

- **Tareas realizadas a tiempo: tareas (44%)**
- **Tareas realizadas con retraso: tareas (41%)**
- **Tareas sin realizar y ya vencidas: tareas (13%)**
- **Tareas aún dentro del plazo (sin vencer): tareas (2%)**

COMPARATIVO:

El comparativo evidencia una tendencia positiva en la gestión de tareas, destacándose:

Incremento del 9% en tareas cumplidas a tiempo, lo que refleja una mejora sustancial en la eficiencia y cumplimiento de metas.

Reducción del 4% en retrasos, señal de un avance en la planeación y priorización.

Disminución del 5% en tareas vencidas, lo cual demuestra un fortalecimiento en el seguimiento y control interno.

CONCLUSION:

Entre ambos periodos analizados, se evidencia un avance general en la gestión de cumplimiento, con mejoras tanto en la oportunidad de ejecución como en la disminución de tareas atrasadas o no ejecutadas.
Estos resultados reflejan el impacto positivo de las estrategias de control implementadas, así como el compromiso creciente del equipo técnico en el cumplimiento de los objetivos.

LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA
centro de control

La Ceja, 31 de octubre de 2025

Doctora
ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
Gerente General EMDUCE
Municipio de La Ceja

Asunto: Informe de actividades contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2025.085
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA (EMDUCE) E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
CONTRATISTA	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA
CC	1.036.965.542
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA.
VALOR	12 MILLONES DE PESOS. ($12.000.000) INCLUIDO IVA Y DEMAS GASTOS APLICABLES
PLAZO	4 MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Las siguientes son las actividades ejecutadas en el periodo de la referencia del 01 al 31 de octubre de 2025

Descripción actividades ejecutadas		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES- EVIDENCIA**
1.Brindar apoyo a la dirección técnica en el recibo de información, requerimientos y reparto de tareas, así como en el seguimiento de la	Realice el apoyo a la dirección técnica recibiendo la información por medio del correo electrónico control@emduce.gov.co y realizando el respectivo reparto a los técnicos	PANTALLAZO

realización efectiva de las mismas.	encargados o áreas encargadas de las solicitudes	
2.Apoyar la asignación y reparto de tareas al personal técnico sobre el intercambio de información, solicitudes y consultas de los proyectos que se encuentren vigentes con la organización.	Realizo la asignación de reparto a los técnicos, de las solicitudes recibidas por el correo de control@emduce.gov.co de información y consultas de los proyectos	PANTALLAZO
3.Realizar los respectivos reportes de acuerdo con la información recibida mediante correo electrónico asignado.	Se realiza el reporte diario de asignación de tareas y cumplimiento de las mismas mediante el archivo drive compartido	PANTALLAZO
4.Generar reportes semanales, alertas y datos estadísticos necesarios que permitan mejorar la realización de tareas a tiempo en la dirección técnica y en su interacción con las demás áreas de la empresa.	Se realizo un informe escrito con alertas sobre las tareas vencidas, realizadas a tiempo, realizadas a destiempo y con las próximas a vencer, con cifras de cumplimiento por técnico y del área técnica en general con sus datos estadísticos	INFORME
5.Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica y administrativa indispensable para la correcta y eficiente prestación del servicio contratado.	Aplique toda la capacidad intelectual, técnica y administrativa para la presentación del servicio y requerimientos para el cumplimiento de las actividades	N.A
6.Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para ejecutar el mismo.	Garantice mi disponibilidad de tiempo para darle tramite a las solicitudes y reparto de tareas y poder darles agilidad a los procesos	N.A
7.Apoyar la consolidación de bases de datos y los registros que en el desarrollo de la gestión administrativa se requieran desde las diferentes áreas de trabajo de la dependencia	Apoye la realización de base de datos de con las solicitudes que llegan por medio del correo de control@emduce.gov.co para una correcta gestión de las diferentes áreas	PANTALLAZO

8.Apoyar la consolidación de información que se requiera, tendiente a satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de los usuarios externos.	Apoye la consolidación de información por medio del correo para satisfacer las necesidades de los usuarios externos	
9.Apoyar con la recepción de documentos y/o correspondencia requerida.	Apoye con la recepción de los documentos entregados por el correo de control@emduce.gov.co	Pantallazo
10.Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Para este periodo no se realizaron demás funciones porque no fue requerido por el supervisor	N. A

OBSERVACIONES (Recomendaciones- Dificultades)
Contratista:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN		
• Pago Seguridad social • 1 documentos anexos	• evidencias fotográficas • factura equivalente 4	• Comprobante pago seguridad social

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: 3 MILLONES DE PESOS M.L ($ 3.000.000).

Para constancia se firma en el Municipio de la Ceja a los 31vdías del mes de octubrebre del año 2025.

Atentamente,

Laura Parra

Laura Marcela Parra Espinosa
C.C 1.036.965.542
CONTRATISTA.

Isabel Cristina Roldán Ospina
Gerente General-EMDUCE

Jefry Emir Zea Buriticá
Director Técnico EMDUCE

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**Registro presupuestal Nro:326**	Valor: $**12.000.000**
Número de Contrato: 2025.085		**Día: Mes: Año:** 01/07/2025		**Fecha del informe**: 31/10/2025	**Mes: Año:** **OCTUBRE DE 2025**
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA					
Periodo de Cobro: 01 al 31 de octubre de 2025					
Nombre Contratista: Laura Marcela Parra Espinosa			**Cédula o NIT:** 1.036.965.542		

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**Nº. 326**	**Fecha: Día: Mes: Año:** 16/06/2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__NO_X_	**Fecha: Día: Mes: Año:** N/A
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 01 Mes: jul Año: 2025	
Duración total del contrato:	**4 meses**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** o c t **Año:** 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha:
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor ($):
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total del contrato: XXXXXXX de pesos		Valor suscrito en números ($): $XXXXXXXX

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ___X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 16100019195	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	**$12.000.000**
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	0.oo$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	0.oo$
4. Valor Acta. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$3.000.000
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$12.000.000
6. Relación de los costos y gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato.	0.oo$

3.1 RENDIMIENTOS
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X___

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X	NO __
	No. Planilla: **81272973** septiembre 2025	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de _*Nombre de la entidad)*_____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI ___ NO ___ X	

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. *Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*	SI ___	NO __
	X N/A	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

	de actividades que tiene que ver con el objeto)	realizadas relacionadas con las actividades)
1	1.Brindar apoyo a la dirección técnica en el recibo de información, requerimientos y reparto de tareas, así como en el seguimiento de la realización efectiva de las mismas.	La contratista realiza apoyo en la distribución de reparto de tareas de las solicitudes que llegan por el correo
2	2.Apoyar la asignación y reparto de tareas al personal técnico sobre el intercambio de información, solicitudes y consultas de los proyectos que se encuentren vigentes con la organización.	Apoyo la asignación de reparto por número de tareas según el orden de llegada por el correo
3	3.Realizar los respectivos reportes de acuerdo con la información recibida mediante correo electrónico asignado.	Realiza reportes diarios de asignación de tareas por medio del archi de drive
4	4.Generar reportes semanales, alertas y datos estadísticos necesarios que permitan mejorar la realización de tareas a tiempo en la dirección técnica y en su interacción con las demás áreas de la empresa.	Entrego informe reportando. Las solicitudes por técnico y el avance en respuestas
5	5.Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica y administrativa indispensable para la correcta y eficiente prestación del servicio contratado.	La contratista aplico toda su capacidad intelectual y técnica para realizar con eficiencia el servicio
6	6.Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para ejecutar el mismo.	la contratista estuvo disponible para la ejecución del contrato
7	7.Apoyar la consolidación de bases de datos y los registros que en el desarrollo de la gestión administrativa se requieran desde las diferentes áreas de trabajo de la dependencia	La contratista consolida en base de datos el reparto de tareas asignada a cada técnico
8	8.Apoyar la consolidación de información que se requiera, tendiente a satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de los usuarios externos.	La contratista consolido la información que llega por el correo para satisfacer las necesidades de los usuarios externos
9	9.Apoyar con la recepción de documentos y/o correspondencia requerida.	La contratista poya la recepción de documentos que llegaron al correo de control
10	10.Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	-

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO
1. La contratista cumple con sus actividades contractuales de una buena manera.

5.3. RECOMENDACIONES	
Se termina el Contrato:	SI X NO
Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	

6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por: Laura Marcela Parra Espinosa
2	Documento equivalente del mes de octubre
3	Planilla seguridad social correspondiente al mes de septiembre
4	Declaración Juramentada del mes de octubre
5	Informe presentado a la dirección técnica
6	Evidencias fotográficas

ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA
Gerente – EMDUCE

Jefry Emir Zea Buriticá
Director Técnico EMDUCE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit. 901105143-5
Dirección: Calle 15 AA N 13 E 21
Municipio La Ceja del Tambo- Antioquia
Telefono: (604) 4734927
Email: info@emduce.gov.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE	
N°	4

Nombre del Contratista:	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA
Número de Cédula	1.036.965.542
Dirección:	CALLE 44 # 47-05
Ciudad/Municipio:	GUARNE
Número de Teléfono:	313 6642394
Email:	lmpe.210817@gmail.com
Fecha:	30 de octubre 2025

Contrato Numero:	O85	
Información Bancaria	Banco	BANCOLOMBIA
	Tipo de Cuenta	AHORROS
	Número	16100019195
Valor Total del Contrato:	$	12.000.000

Número y Objeto Contractual	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2025.085-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00

Total	$	3.000.000,00
Rete Fuente Honorarios 10%		
Estampilla Procultura 1%	$	30.000,00
Estampilla Probienestar Adulto Mayor 3%	$	90.000,00
Valor Neto a Pagar	$	2.880.000,00

Este Documento solo aplica para personas que no estan obligadas a facturar

Solicito aplicación de depuración de retención en la fuente como empleado según el artículo 383 de ET, Para lo cual certifico que para realizar esta actividad no he contratado o vinculado más de 2 trabajadores asociados a esta actividad.

Seleccione una opción.	SI	NO	**X**

Laura Parra

Firma contratista	C.C	1036965542	Teléfono	**313 6642394**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Nit 901.105.143-5
CALLE 15 AA 13E 21
Urbanización Miraflores
Tel: (604) 4734927
La Ceja - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1429

Proveedor	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA		
Nit	1.036.965.542-3	**Teléfono**	(313) 6642394 - Ext. 000
Dirección	CALLE 44 #47-05	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios por servicios profesionales	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 3,000,000.00

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764077655957 aprobado en 20240821 prefijo DSE desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: dbeb9412cf0dd08830d2e6523b79990c8edb4f9237a8bae6f8bc128acc8d23ccbcd2fde12e9dd250e4bb56d045a9ab78

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DECLARACION JURAMENTADA

Municipio de La Ceja,31 de octubre de 2025

Señores
EMDUCE

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la Retención en la Fuente por renta.

De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 del 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al Sistema de Seguridad Social por el contrato No**. 2025-085** del 01 de julio de 2025.

Para tal efecto de manera libre y espontánea certifico bajo gravedad de juramento que

a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social corresponden, a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto de retención.


b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del **01 de octubre al 31 de octubre de 2025**

Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social según planilla No o. Planilla: 81272973 correspondiente al mes de septiembre de 2025, corresponde a este contrato en la proporción que abajo relaciono.

c) El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL por este contrato es:

CONCEPTO	VALOR
Salud	$ 178.000
Pensión	$ 227.800
ARL	$ 14.900
Total	**$ 420.700**

Además, certifico bajo gravedad de juramento que SI_____ NO___X___ he contratado o vinculado para el desarrollo de mi actividad dos o más trabajadores o contratistas durante por lo menos 90 días continuos o discontinuos, según artículo 340 del E.T. Lo anterior en la aplicación del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario.



FIRMA: _____
Laura Marcela Parra Espinosa
C.C # 1036965542

Información de la Planilla Pagada

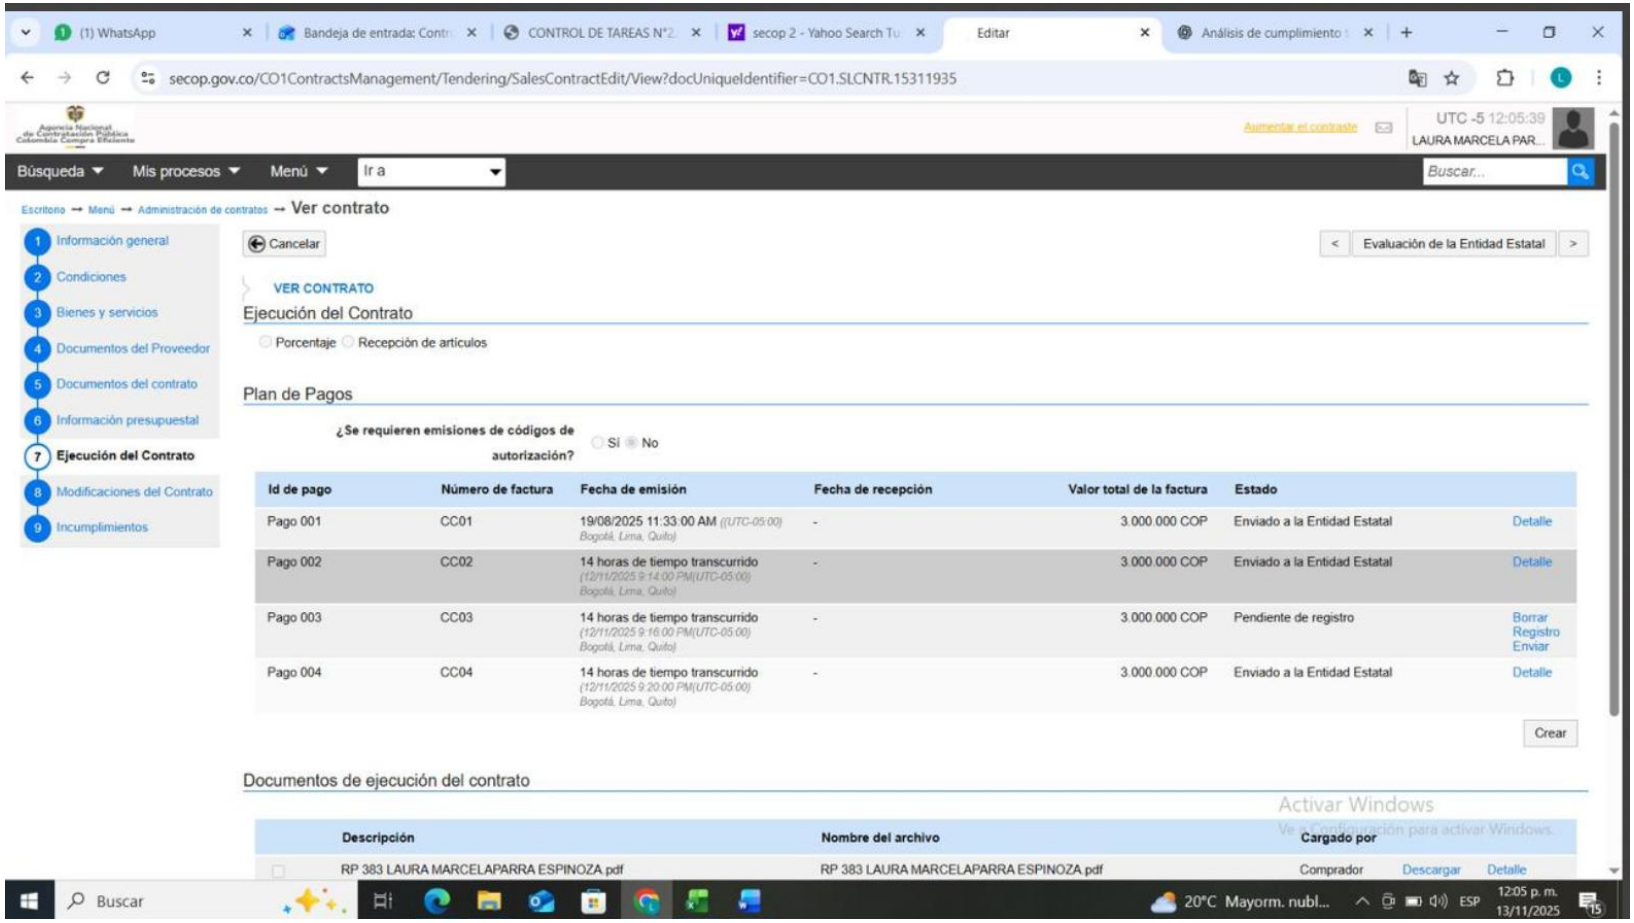
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-25, 09:03:20 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036965542
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81272973
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1877131817
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 425.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

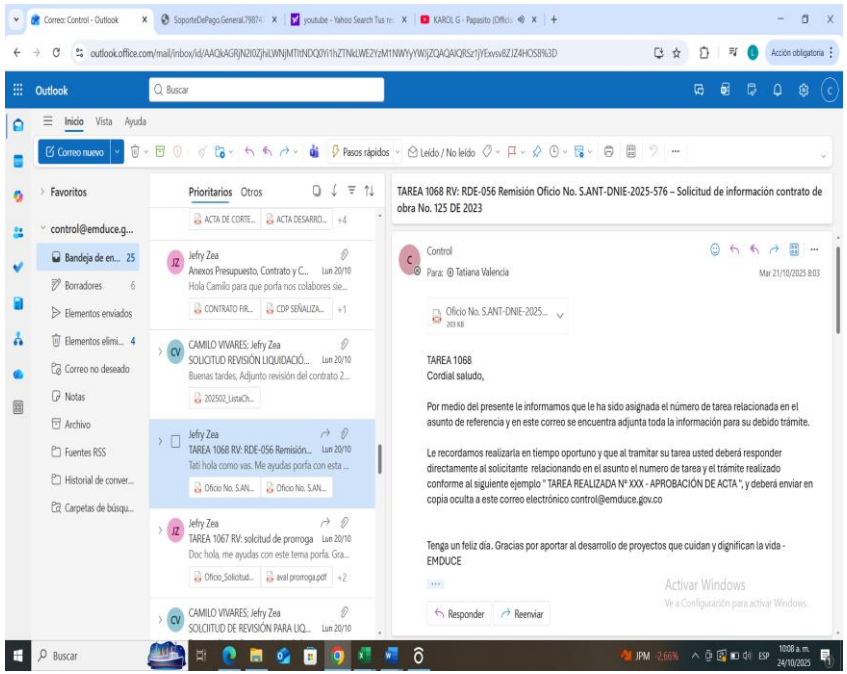
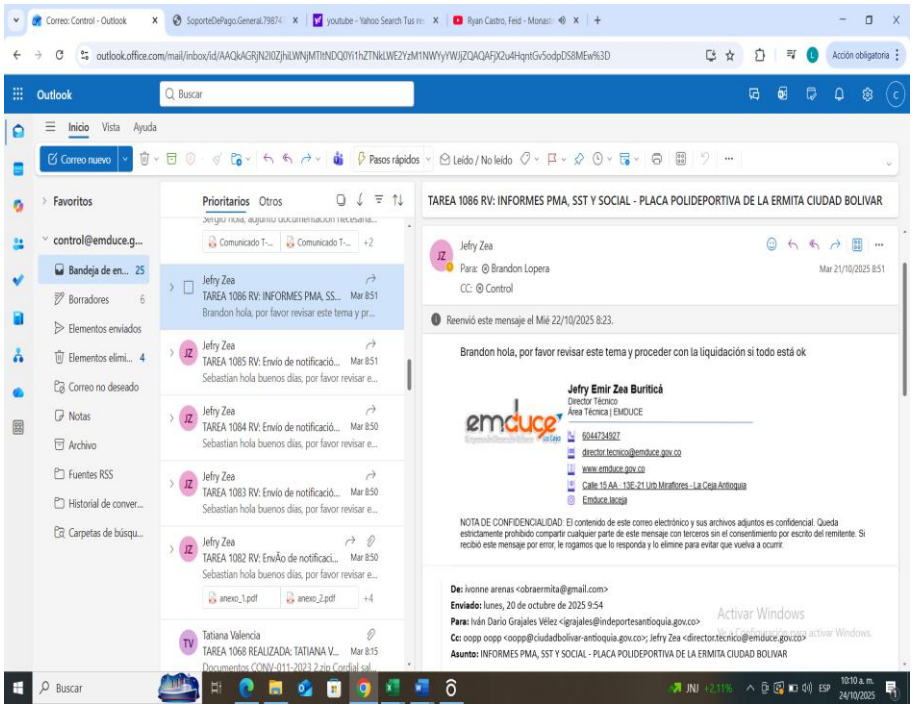
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 2.600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 178.000	$ 2.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 14.900	$ 200
		SubTotales:		$ 420.700	$ 4.800
		Total a Pagar:			$ 425.500

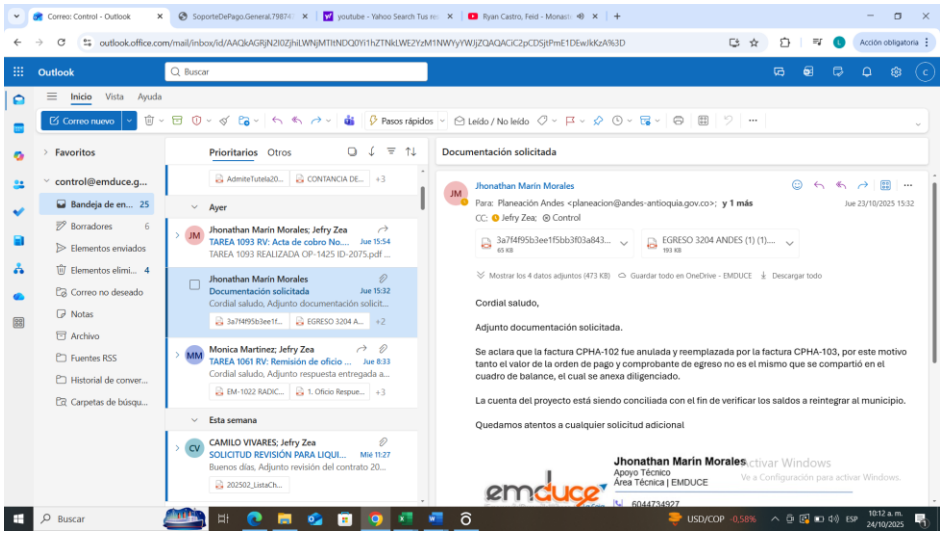
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


(1) WhatsApp
Bandeja de entrada: Contr
CONTROL DE TAREAS N°2
secop 2 - Yahoo Search Tu
Editar
Análisis de cumplimiento t
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.15311935
Aumentar el contraste
UTC -5 12:05:39
LAURA MARCELA PAR...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Sí
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001 CC01 19/08/2025 11:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) - 3.000.000 COP Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Pago 002 CC02 14 horas de tiempo transcurrido (12/11/2025 9:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) - 3.000.000 COP Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Pago 003 CC03 14 horas de tiempo transcurrido (12/11/2025 9:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) - 3.000.000 COP Pendiente de registro Borrar Registro Enviar
Pago 004 CC04 14 horas de tiempo transcurrido (12/11/2025 9:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) - 3.000.000 COP Enviado a la Entidad Estatal Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
RP 383 LAURA MARCELAPARRA ESPINOZA.pdf
RP 383 LAURA MARCELAPARRA ESPINOZA.pdf
Comprador Descargar Detalle
Activar Windows
Buscar
20°C Mayorm. nubl...
ESP
12:05 p. m.
13/11/2025

Fecha:	21 DE OCTUBRE	**Fecha:**	21 DE SEPTIEMBRE
Número de Actividad Contractual:	1	**Número de Actividad Contractual:**	2
Lugar:	CORREO	**Lugar:**	CORREO DE CONTROL
Actividad	Apoyo a la dirección técnica en el reparto de tareas	**Actividad**	REPARTO DE TAREAS
			

Fecha:	OCTUBRE	**Fecha:**	OCTUBRE
Número de Actividad Contractual:	3-7-8	**Número de Actividad Contractual:**	9
Lugar:	Archivo drive	**Lugar:**	Correo de control
Actividad	Reporte diario de tareas, consolidación de base de datos y de información	**Actividad**	Recepción de documentos
			

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-25, 09:09:25 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 81272973

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-10-25 09:08:33.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA				
Documento	CC 1036965542	**Dirección**	VÍA 0 #0 - 0 VEREDA LA HONDITA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136642394		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036965542		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PARRA ESPINOSA LAURA MARCELA	5318000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 1.423.500	$ 14.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMDUCE
Nombre del pago: OP1450
Fecha: 31-10-2025 **Hora:** 16:41:59
Fecha de envío del pago: 31-10-2025
NIT: 901105143
Secuencia: aq
Fecha de Generación: 31-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 02388997226

Impreso por: Naty3062

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,880,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,880,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16100019195	Ahorros	1036965542	LAURA MARCELA PARR	2,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025

Usuario Ordenó
CZAPATA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

NIT 901105143-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1450

Fecha/Estado
29/10/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CDP 326

PAGADO A: PARRA ESPINOZA LAURA MARCELA ,Id: 1036965542

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Doc. Ref. : 004 LA CEJA

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 120,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,880,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
326	383	1.3.3.4.21	2	2.1.2.02.02.008.20	Honorarios por Servicios Tecnicos Operativos	$3,000,000.00

TOTAL: **$3,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,000,000	$30,000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$3,000,000	$90,000

TOTAL Deducibles: **$120,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE

NINI JOHANA GUISAO RAMIREZ
CONTADOR

"."

Usuario Pago:
JSALAZAR
1450

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT 901105143-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01579

Fecha de Pago: 31-10-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PARRA ESPINOZA LAURA MARCELA ,Id: 1036965542

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Otros: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 004 LA CEJA

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 120,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,880,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	02388997226	OP 1450	PARRA ESPINOZA LAURA MARCELA ,	$2,880,000.00
				Total:	**$2,880,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,000,000	$30,000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$3,000,000	$90,000
TOTAL Deducibles:			**$120,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA NATALIA OSORIO RINCON
TESORERIA

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE
