REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

TRD – 700

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No.196 DE 2026



OBJETO:

APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.".

ELABORADO POR:
MARTH A JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Supervisor

TAME, SEPTIEMBRE DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-882 del 23 de noviembre de 2011, precisó que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural comprende de manera intrínseca el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos étnicos, lo cual implica la facultad de definir, desde su propia visión del mundo, el modelo de desarrollo que mejor se adecúe a sus necesidades, intereses y valores culturales, como condición esencial para garantizar la pervivencia física y cultural de estas comunidades.

En relación con la población vulnerable o menos favorecida, las comunidades afrodescendientes son sujetos de especial protección constitucional, en razón a su identidad cultural diferenciada y a las condiciones históricas de vulnerabilidad social, económica y territorial que han enfrentado. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de diseñar e implementar políticas públicas con enfoque diferencial, que reconozcan dichas particularidades y contribuyan a la superación de las brechas estructurales que limitan el ejercicio efectivo de sus derechos.

En sociedades diversas y complejas como la colombiana, la atención prioritaria a la población vulnerable constituye un imperativo ético, social y jurídico. Las comunidades afrodescendientes han sido históricamente afectadas por múltiples formas de discriminación, exclusión y marginalización, cuya intersección con factores económicos, culturales y territoriales exige un abordaje integral que garantice el respeto de sus derechos, promueva su desarrollo sostenible y fortalezca la preservación de su identidad cultural.

Las condiciones socioeconómicas de estas comunidades resultan particularmente preocupantes, evidenciándose altos índices de pobreza, limitaciones en el acceso a servicios básicos como salud y educación, restricciones en la participación en los escenarios de toma de decisiones y una constante vulneración de sus derechos territoriales y culturales, lo cual contribuye a procesos de despojo, fragmentación social y debilitamiento del tejido comunitario.

En este contexto, reforzar el apoyo institucional a las comunidades afrodescendientes no solo responde a un criterio de justicia social, sino que constituye un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del territorio. La inclusión activa de estos pueblos en la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas permite adoptar enfoques más integrales, pertinentes y representativos, generando soluciones sostenibles y de largo plazo.

Asimismo, la preservación y promoción de las culturas y tradiciones afrodescendientes resulta esencial para el fortalecimiento de la diversidad cultural del país, contribuyendo al enriquecimiento del tejido social y a la construcción de un modelo de desarrollo más equitativo e inclusivo.

En este escenario, la agricultura sustentable y sostenible se configura como una oportunidad estratégica para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes, al tiempo que contribuye a la protección del medio ambiente y a la mitigación de los efectos del cambio climático. El fomento de sistemas agroforestales que integren criterios de conservación ambiental, preservación de la biodiversidad y justicia social resulta fundamental para enfrentar los desafíos globales y territoriales actuales.

La transición hacia estos modelos productivos requiere del respaldo de políticas públicas inclusivas, acceso a procesos de formación y asistencia técnica, disponibilidad de recursos productivos y el fortalecimiento de redes de comercialización que consoliden la autonomía económica de las comunidades. De esta manera, la agricultura sostenible no solo beneficia a las comunidades afrodescendientes, sino que también aporta a la seguridad alimentaria y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

La implementación de sistemas agroforestales basados en la combinación de cultivos de cacao, plátano, especies maderables y frutales genera múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales, entre los cuales se destacan:

1. Promoción de la diversidad de especies, favoreciendo la conservación de la fauna y flora local.
2. Reducción de la erosión del suelo mediante el fortalecimiento del sistema radicular de los árboles.
3. Mejora de la fertilidad y calidad del suelo a través de la incorporación de materia orgánica y la fijación de nitrógeno.
4. Regulación del ciclo hídrico, aumentando la infiltración y disminuyendo la escorrentía.
5. Generación de microclimas que protegen los cultivos frente a condiciones climáticas extremas.
6. Diversificación de las fuentes de ingreso de las unidades agrícolas familiares.
7. Contribución a la mitigación del cambio climático mediante la captura de dióxido de carbono (CO_2).
8. Generación de oportunidades laborales en zonas rurales.
9. Equilibrio entre la producción agrícola y la conservación del medio ambiente.

Estos sistemas constituyen una estrategia clave para fortalecer la sostenibilidad económica y social de las comunidades afrodescendientes y se articulan de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–, en especial los ODS 2 (Hambre Cero), 12 (Producción y Consumo Responsables), 13 (Acción por el Clima) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

Los procesos de restauración ecológica deben reconocer, valorar e integrar los saberes tradicionales de los pueblos étnicos y campesinos, así como sus formas propias de organización social, como elementos dinamizadores del cambio territorial. La articulación de comunidades de práctica y redes de aprendizaje facilita el intercambio de conocimientos, fortalece la capacidad de agencia socio ecológica y promueve la sostenibilidad de las intervenciones (Osborne et al., 2021; Tuckey et al., 2023).

En consonancia con lo anterior, la Administración Municipal de Tame, con el propósito de fortalecer a la población vulnerable, busca a través del presente proceso de contratación apoyar la transformación productiva del territorio, mediante procesos de planificación participativa, intercambio de conocimientos, innovación y valoración de la diversidad biológica y cultural existente. Todo ello orientado a identificar y promover cadenas de valor que potencien las asociaciones comunitarias, la revitalización territorial y el desarrollo de proyectos productivos bajo enfoques agroforestales..

INFORME FINAL SUPERVISOR

CONTRATO DE SUMINISTRO No.196 DE 2026

El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.196 DE 2026; suscrito entre el MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA y TAS SOLUCIONES R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ, para la ejecución del objeto: "APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.". Abarca los Ítems contemplados en los aspectos técnicos del contrato, los cuales ejecutó el contratista de acuerdo a las actividades programadas del contrato en mención.

1. ASPECTOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
CONTRATISTA	TAS SOLUCIONES S.A.S. identificado con NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 60.267.178 expedida en Pamplona.
OBJETO	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISTRO
VALOR	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así: • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. • Planillas de enfoque diferencial en físico y digital en formato Excel(Cuando aplique). • Registro Fotográfico físico y digital. • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda. • Acta de recibo final. • Informe del Supervisor. • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado. • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales. • Y los demás requisitos que solicite el supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de

	Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. **PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la Legalización. **PARÁGRAFO CUARTO:** El contratista deberá presentar la factura o *documento equivalente, según sea el caso,* constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. **ANTICIPO:** Para el presente proceso contractual el Municipio no entregará al contratista anticipo. **PARÁGRAFO CUARTO:** El Municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 DE JULIO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	2 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	2 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

2. ASPECTOS LEGALES

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA LEGALIZACIÓN
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2026
2	ACTA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
3	FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	02 DE JULIO DE 2026

I. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2026, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IL81794 Inversión local NBI y cuarta, quinta y sexta categoría	CDP 20260115001	15/01/2026	SGR.03.IL.171702-2025-817794- 0003 Apoyo y fortalecimiento para la resiembra de 19 hectáreas de la línea productiva de cacao para la comunidad afrodescendiente de municipio de Tame-Arauca	$ 214.436.744, 10
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SPGR	126	15/01/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.436.744, 10
REGISTRO PRESUPUESTAL	SPGR - 2026	RPR20260414001	14/04/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.431.084,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	SPGR	526	14/04/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.431.084,00

II. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

POLIZAS DE LEGALIZACION

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 196 DE 2026					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	No. COQ-100009080 ANEXO No.0	10/04/2026	10/11/2026	$ 21.443.108,40
	Calidad del servicio		10/04/2026	10/01/2027	$ 21.443.108,40
	Calidad y correcto funcionamiento		10/07/2026	10/07/2027	$ 21.443.108,40

a) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 196 DE 2026					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	No. COQ-100009080 ANEXO No.1 y 2	14/04/2026	14/11/2026	$ 21.443.108,40
	Calidad del servicio		14/04/2026	14/01/2027	$ 21.443.108,40
	Calidad y correcto funcionamiento		14/07/2026	14/07/2027	$ 21.443.108,40

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 214.431.084,00	
Valor Acta de Recibo Final		$ 214.431.084,00
Saldo a favor Municipio de Tame		$ 00,00
VALOR TOTAL	$ 214.431.084,00	$ 214.431.084,00

2.1 PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.196 DE 2026.

PRESUPUESTO					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00
2	REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00
3	FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19	$ 1.291.00,00	$ 24.529.000,00
4	REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550,00	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 214.431.084,00

2.2 LISTADO DE BENEFICIARIOS

A continuación se relaciona el listado de identificación productor beneficiarios del proyecto:

N°	IDENTIFICACIÓN PRODUCTOR					
	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CEDULA	PREDIO
1	SILVIO		MINA		17,546,182	EL RECUERDO
2	BEATRIZ		CASTRILLON	DE MINA	25,363,094	EL PARAÍSO
3	EVER	ALFONSO	MULATO	ARRECHEA	17,547,105	EL REFLEJO
4	RAFAEL		CARO	BUSTAMANTE	17,545,318	BUENOS AIRES
5	DALIDA	MARGARITA	CHIQUILLO	SANCHEZ	1,116,857,200	EL CACHIPAY
6	CARLOS	ALBERTO	CARABALI	SANCHEZ	96,191,461	EL PORVENIR
7	TERESITA		SANTAFE	SANCHEZ	68,246,862	EL LIMONAL
8	MARIA	MIRZA	CARDOSO	ALDANA	68,300,453	NUEVO HORIZONTE
9	JUVENAL		AMU	CAVICHE	17,546,022	EL PARQUEADERO
10	MARIA	DEL CARMEN	ARBOLEDA	MINA	1,116,864,993	LOTE TERRENO
11	JAIRO	ALFREDO	GUTIERREZ		1,115,739,370	LOTE TERRENO
12	HERNANDO		MINA	CASTILLO	17,547,938	MANDARINO
13	DUBERNEY		MULATO	ARRECHEA	96,190,517	LA PALMITA
14	IRMA		TOBAR	CARABALI	68,306,032	LA ESPERANZA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

TRD – 700

N°	IDENTIFICACIÓN PRODUCTOR					
	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CEDULA	PREDIO
15	JOSE	ARCADIO	HERRERA	OSCATICA	17,548,691	MIRA LINDO
16	MIRYAM	ZORAIDA	SANTOS	RIVERO	27,882,664	LOTE TERRENO
17	EMILIO		CAVICHE		17,545,494	EL LAGO
18	URIEL		MULATO	ARRECHEA	17,546,656	LA ISLA
19	EMILIANO		MARTINEZ	CASTRO	17,548,954	LA PRIMAVERA

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., realizo el día 24 de abril de 2026 a las 10:30 am, en el Auditorio del Edificio Alonso Pérez de Guzmán, la socialización del proyecto, contando con la asistencia del Alcalde Municipal el señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ, la firma contratista TAS SOLUCIONES S.A.S y los beneficiarios del proyecto; en esta socialización se dio a conocer el alcance del proyecto, como se van a ejecutar dichas actividades y el personal que va a laborar en el desarrollo de las actividades.

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S., contrato para el ejecución del Contrato de suministro No. 196 de 2026 el siguiente personal, que se relaciona en las siguientes tablas:

MES: ABRIL 2026												
	DATOS GENERALES								AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9504149277 - 9510995427												
1	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	17	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	992.180	14/04/2026	-	17	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	900.000	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
4	Florez Alvarado	Eyleen Danitza	1.115.726.921	Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao	291.818	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: MAYO 2026												
	DATOS GENERALES								AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9505893221 - 9510996020												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	1.750.905	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	2.520.000	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
4.	Florez Alvarado	Eyleen Danitza	1.115.726.921	Técnico en producción y cosecha del cultivo de cacao	817.059	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: JUNIO 2026												
	DATOS GENERALES								AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN

PLANILLA No. 9507408524												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	1.750.905	14/04/2026	-	30	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	360.000	2/06/2026	25/06/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: JULIO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 9509051399												
1.	Aya Rodriguez	Julieth Paola	60.267.178	Secretaria	1.800.000	14/04/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
2.	Mulato Sepúlveda	Johanna Carolina	1.032.440.156	Residente	758.726	14/04/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar
3.	Herrero Otero	Eduardo	1.110.495.867	Agronomo	360.000	1/07/2026	2/07/2026	2	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

PERSONAL SUBCONTRATADO

MES: ABRIL 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 6018249340												
1	Mulato Sepúlveda	Jessy Catherine	1.032.396.585	Obrero	1.750.905	26/04/2026	-	5	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

MES: MAYO 2026												
DATOS GENERALES									AFILIADO A			
#	APELLIDOS	NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DÍAS LABORADOS	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PLANILLA No. 6024550818												
1	Mulato Sepúlveda	Jessy Catherine	1.032.396.585	Obrero	1.750.905	26/04/2026	29/05/2026	14	Nueva eps	Porvenir	Positiva	Comfiar

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó actividades que contempla la minuta contractual en los tiempos establecidos. Se realizó y prestó los servicios de apoyo logístico para el desarrollo del apoyo y fortalecimiento para la resiembra de 19 hectáreas de la línea productiva de cacao para la comunidad afrodescendiente del municipio de Tame – Arauca., en el marco de la implementación de las actividades establecidas en el contrato de suministro No.196 de 2026, en el municipio de Tame departamento de Arauca, a través del desarrollo de las siguientes actividades:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.			100%
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el	Unidad	19	100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
2	REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.			100%
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3	100%
3	FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.			100%
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19	100%
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19	100%
4	REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.			100%
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550,00	100%
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19	100%

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

1.1. Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema de resiembra

La empresa **TAS SOLUCIONES S.A.S.** realizó el acompañamiento técnico y la entrega de material vegetal a 19 beneficiarios del proyecto. La asistencia abordó aspectos clave como el almacenamiento temporal, la prevención fitosanitaria y el acondicionamiento previo al trasplante de las plántulas de cacao.

Adicionalmente, el equipo técnico recomendó efectuar la siembra en sitio definitivo dentro de un plazo de 3 a 8 días tras la entrega, aprovechando la humedad de los suelos y las lluvias recientes para maximizar el porcentaje de prendimiento.
La jornada de entrega y asesoría en campo contó con la participación directa del ingeniero agrónomo **Eduardo Herreño Otero** y la técnica en producción y cosecha de cacao **Eyleen Danitza Flórez Alvarado.**

DATOS DE BENEFICIARIO					VISITA
No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
1	25.363.094	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	SANTA INES	EL PARAISO	28/04/2026
2	17.546.022	JUVENAL AMU CAVICHE	CRAVO COROZO	EL PARQUEADERO	29/04/2026
3	68.300.453	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	SANTA INES	NUEVO HORIZONTE	29/04/2026

DATOS DE BENEFICIARIO					VISITA
No.	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA	PREDIO	FECHA
4	17.547.105	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	EL REFLEJO	30/04/2026
5	17.546.656	URIEL MULATO ARRECHEA	CRAVO TOTUMO	LA ISLA	30/04/2026
6	1.115.739.370	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA	PIÑALITO	KINAKIND	6/05/2026
7	68.306.032	IRMA TOBAR CARABALI	EL TEMBLADOR	LA EMPERATRIZ	7/05/2026
8	96.191.461	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ	EL TEMBLADOR	EL PORVENIR	8/05/2026
9	17.548.954	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	LA HOLANDA	LA PRIMAVERA	8/05/2026
10	17.548.691	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	LA ESPERANZA	MIRALINDO	9/05/2026
11	17.546.182	SILVIO MINA	LA HOLANDA	EL RECUERDO	9/05/2026
12	17.547.938	HERNANDO MINA CASTILLO	SANTA INES	EL ENCANTO	11/05/2026
13	1.116.857.200	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	BAJO CUSAY	LAS VEGAS	14/05/2026
14	27.882.664	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	LA HERMOSA	LOTE TERRENO	14/05/2026
15	68.246.862	TERESITA SANTAFE SANCHEZ	BAJA FLORIDA	EL LIMONAL	15/05/2026
16	1.116.864.993	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	SANTA INES	LOTE TERRENO	20/05/2026
17	17.545.494	EMILIO CAVICHE	SANTA INES	EL LAGO	28/05/2026
18	17.545.318	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	NARANJITO	BUENOS AIRES	29/05/2026
19	96.190.517	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	MAPOY	MULATERA	29/05/2026

2. REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

2.1. Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)

En el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No. 196 de 2026, la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. llevó a cabo tres (03) talleres de capacitación en Manejo Fitosanitario y Poda, orientados al fortalecimiento de la línea productiva de cacao y dirigidos a los diecinueve (19) beneficiarios del proyecto.

La programación de las jornadas se desarrolló de la siguiente manera:

- Taller No. 1: Realizado el 3 de junio de 2026 en la Carrera 15 No. 13 – 61, Barrio Sucre, Municipio de Tame.
- Taller No. 2: Realizado el 25 de junio de 2026 en las instalaciones del Hotel Tame Real (Calle 15 No. 18 – 50, Barrio Centro, Municipio de Tame).
- Taller No. 3: Realizado el 1 de julio de 2026 en el Salón Comunal Meleocipo, ubicado en la Vereda Santa Inés, zona rural del Municipio de Tame.

3 FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO

3.1 Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. hizo entrega de diecinueve (19) Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC según Ficha de especificaciones técnicas, el dia 1 de julio de 2026.

3.2 CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. hizo entrega de diecinueve (19) CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas según Ficha de especificaciones técnicas, el dia 25 de junio de 2026.

Se evidencia que los elementos y actividades entregados por la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S, CUMPLE con las especificaciones técnica establecidas en la ficha técnica publicada en proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. SA-SI-TA-001-2026., Y esta soportado con la entrada de almacén de la oficina administrativa entradas de almacén No. INV-E2026050500001 del 30 de abril de 2026, Salida No. INV-S2026043000001 del 30 de abril de 2026, y entradas de almacén No. INV-E2026062500001 del 24 de junio de 2026, Salida No. INV-S2026062400001del 24 de junio de 2026,

4 REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

4.1 Suministro de Plántulas de cacao para patronaje

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. llevó a cabo la entrega de un total de 8.550 plántulas de cacao de patronaje, distribuidas equitativamente entre los diecinueve (19) beneficiarios del contrato, correspondiendo a cada uno un cupo de 450 unidades.

4.2 Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)

La empresa TAS SOLUCIONES S.A.S. llevó a cabo el transporte de un total de 8.550 plántulas de cacao de patronaje, distribuidas equitativamente entre los diecinueve (19) beneficiarios del contrato, correspondiendo a cada uno un cupo de 450 unidades.

Hace parte integral comité No.1 ,2 y 3 y actas de contrapartida establecida con el beneficiario del proyecto. Ver Anexo No.1

Que, el contratista TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4 R/L JULIEHT PAOLA AYA identificado Cedula de ciudadanía No. 60.267.178 de Pamplona N.S, cumplió con la ejecución de acuerdo con el acta de recibo final y las actividades programadas del contrato de suministro No.196 de 2026., cuyo objeto es " APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA." Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.

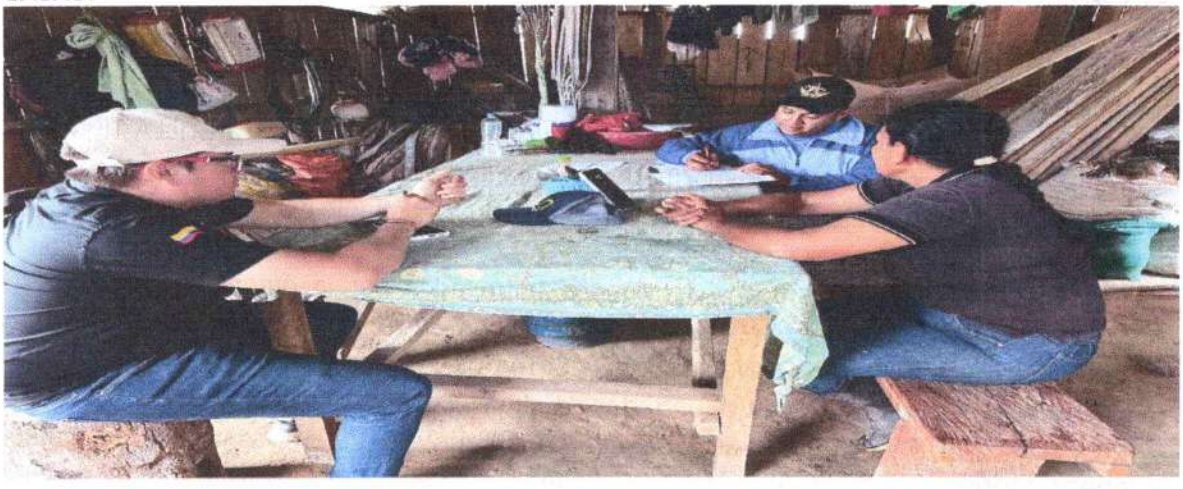


Foto No.1



Foto No.2

2353

2 REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA.

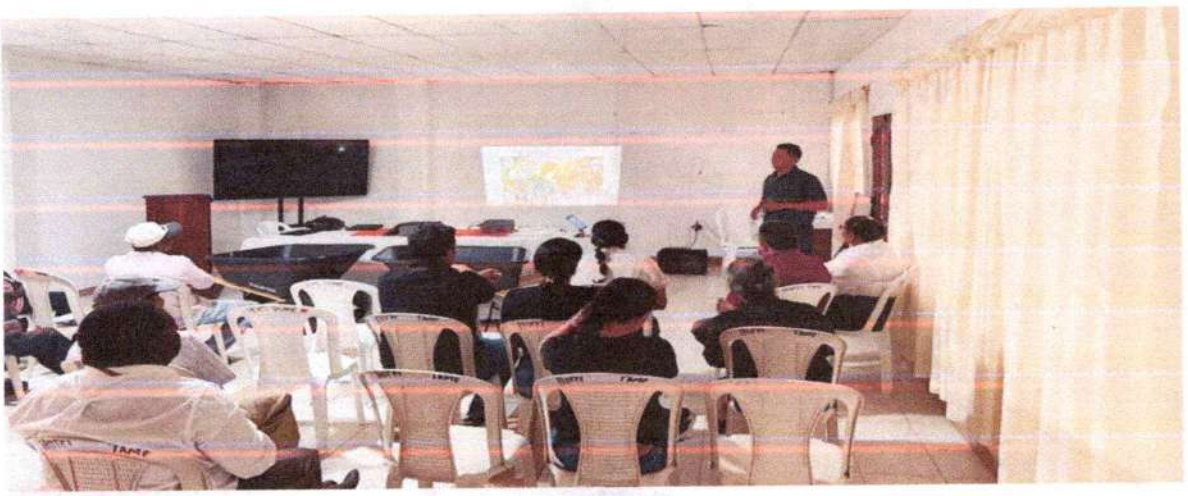


Foto No.3



Foto No.4

Foto No. 3 y 4 Muestra ítem No 2.1 Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)



Foto No.5



Foto No.6

Foto No. 5 y 6 Muestra ítem No 3.1 Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC

2354



Foto No.7



Foto No.8

Foto No. 7 y 8 Muestra ítem No 3.2 CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mangos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas

4 REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.



Foto No.9



Foto No.10

Foto No. 9 y 10 Muestra ítem No 4.1 Suministro de Plántulas de cacao para patronaje,30 cm con registro ICA.



Foto No.11



Foto No.12

Foto No. 11 y 12 Muestra ítem No 4.2 Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)

5. CONCLUSIÓN

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026.cuyo objeto es: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA., el contratista TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA RODRÍGUEZ., ha ejecutado el 100 % las actividades contempladas, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato. También se verifico el pago de la seguridad social de la empresa del periodo que se ejecutaron las actividades para lograr el fin del contrato, Por lo tanto, esta supervisión autoriza el pago de la presente acta recibo final.

Con la ejecución del contrato de suministro No. 196 DE 2026, se logrõ implementar proyectos productivos agroforestales para las comunidades afrodescendientes del municipio de Tame, departamento de Arauca, representando un esfuerzo significativo para la conservación ambiental, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible, al tiempo que contribuye a la protección de los sistemas que funcionan como sumideros de carbono y al fortalecimiento de la agricultura local.

El fortalecimiento de unidades productivas, se consolidaron como una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de 19 familias de las comunidades afrodescendientes del municipio de Tame, permitiendo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, mediante la restauración de ecosistemas e inclusión productiva de pequeños productores rurales.

Presenta:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretearía De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente
Supervisor

ANEXO 01

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE COMITÉ No. 01

Acta No. 01	**Fecha:** 24 de abril de 2026	**Páginas:** 3

CONTRATO DE SUMINISTRO:	196 DE 2026
CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
NIT.:	900.885.335-4
OBJETO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

LUGAR Y FECHA
Edificio Alonso Pérez de Guzmán, área urbana del Municipio de Tame, Arauca; 24 de abril de 2026.
1. TEMAS
Comité de control social del Contrato de suministro No. 196 de 2026.
2. AGENDA DEL DIA
1. Saludo protocolario. 2. Presentación de las actividades y cantidades a ejecutar por parte del contratista. 3. Discusión y observaciones por parte de los asistentes.
3. DESARROLLO

Se da inicio al Comité de control social del Contrato de Suministro No. 196 de 2026, con el propósito de dar a conocer la firma Contratista, la Supervisión encargada del seguimiento y control del proyecto; y el alcance contractual del Contrato.

La reunión contó con la participación de los representantes de la Entidad Contratante la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Supervisora, el Contratista la señor (a) JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS y los diecinueve beneficiarios del proyecto; con el fin de socializar las actividades y cantidades a ejecutar, también el personal el cual va a laborar y la forma en la cual se van a desarrollar las actividades.

La señora JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS realiza la exposición detallada de cada una de las actividades y cantidades contratadas, también expone cual va a ser su plan de trabajo y presenta el personal que hará parte de este equipo, posteriormente presenta el cronograma de ejecución de las actividades, destacando que esta iniciativa busca fortalecer la productividad cacaotera mediante la resiembra del cultivo, el acompañamiento técnico a las familias beneficiarias, finalmente la contratista menciona los diecinueve (19) beneficiarios del proyecto.

La señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ como Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Supervisora, expresa la importancia del cumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiarios para garantizar el éxito de la iniciativa y de igual manera manifestó su disposición para lograr las entregas dentro de los tiempos establecidos contractuales, asegurando el acompañamiento permanente durante cada fase del proyecto.

Por parte de los beneficiarios, el señor WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS como R/L ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE, manifestó su disposición y compromiso para participar activamente en cada una de las etapas del proyecto.

Finalmente la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ como Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Supervisora, hace énfasis a la firma Contratista en el compromiso al cumplimento oportuno de las actividades programadas; y a la ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE resaltó el compromiso de la población beneficiaria, en la asistencia a las actividades que serán realizadas por parte del Contratista y en el aporte de mano de obra en la contrapartida.

4. CONCLUSIONES Y ACCIONES A EJECUTAR
Compromiso a la firma Contratista de ejecutar cada una de las actividades y cantidades contractuales según el plazo establecido en el Contrato de suministro No. 196 de 2026. El compromiso a la ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE, en la asistencia a las actividades que serán realizadas por parte del Contratista y en el aporte de mano de obra en la contrapartida.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente - Supervisora	
JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ	R/L Tas Soluciones S.A. S	
WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS	R/L Asociación de Afrodescendientes del Caribe – AFROCARIBE	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
Silvio Mina	17546182	3224214947	
Walberto Bedoya	19584811	3118813040	
Carlos A Carabali	98191461	3217321729	Carlos Carabali
Victor Arboleda Medina	1486.609	3241066605	VICTOR HUGO ARBOLEDA
Uriel Mulato	17746656	3134368697	
Iver Mulato	1752#105	3123624870	
Maria Nina Cardoso	68.300.453	3138944770	Maria Nina Cardoso
Fernando Mina Carrillo	17547938	3133060792	
Teresita Santofimia	68246862	3142729060	Teresita Sa
Yoberth Manuel J	51768344	3143993179	Aux. Admvo SI
Mabel Garcia	1.115.189928	3185572875	
Karen J. Velandia B.	1110868592	3118799807	Karen Velandia
Fernando	96145714	3209449852	
Jose Portilla	77141.966	3107607687	
Luis Alberto Tenorio	17593532	3180097887	
Sebastian Cuervo	1116572803	3134028350	
Diego Vargas	1092351297	3160189975	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
Wilber Rincón	80'810.962	3105743410	
Darwin Marquez	1098641532	3108104125	
Delsa Nieto G	68288504	3212151443	Delsa Nieto
Juan Salcedo	7714067Y	3112347505	
Victor Bolaños	92528187	3107556121	
Marica Mirza Cardoza	68300453	3182555160	

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No.1



Foto No.2

Foto 1 y 2. Muestra socialización del contrato de suministro No.196 de 2026.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE COMITÉ No. 02

Acta No. 02	**Fecha:** 25 de junio de 2026	**Páginas: 3**

CONTRATO DE SUMINISTRO:	196 DE 2026
CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
NIT.:	900.885.335-4
OBJETO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

LUGAR Y FECHA

25 de junio de 2026 Salón de eventos del
Salón de eventos del Hotel Tame Real (Calle 15 No. 18-50, Tame, Arauca)

1. TEMAS

2. AGENDA DEL DIA

1. Saludo protocolario.
2. Presentación de las actividades y cantidades ejecutadas por parte del contratista.
3. Discusión y observaciones por parte de los asistentes.
4. Aprobación de cantidades ejecutadas y avance de ejecución del Contrato.

3. DESARROLLO

Se da inicio a la sesión de comité de avance de obra para el Contrato de Suministro No. 196 de 2026, contando con la asistencia de los representantes de la Entidad Contratante la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, el Contratista la señor (a) JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS y los diecinueve beneficiarios del proyecto; con el fin de evaluar el estado actual de la ejecución contractual.

La señora JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS realiza la exposición técnica detallada de los ítems, actividades y cantidades de suministro ejecutadas a la fecha de corte. Se presenta el balance del proyecto, reportando un avance físico acumulado del 51,59% respecto al 100% del alcance contractual, evidenciando el cumplimiento de las cantidades iniciales.

Interviene el señor WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS como R/L ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE, quien expresa su total satisfacción por las actividades y suministros entregados hasta el momento a la comunidad. Asimismo, destaca la siembra de las plántulas que ha realizado cada uno de los beneficiarios, cumpliendo de manera estricta y comprometida con las actividades a las cuales están comprometidos al recibir este beneficio.

Por último La señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ como Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente procede a verificar el cumplimiento de las cantidades y especificaciones del suministro, según los informes y soportes presentados, también resalta la necesidad de mantener el ritmo de ejecución para asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales.

Tras la revisión minuciosa de los soportes correspondientes, los asistentes validan la concordancia de los datos expuestos. En consecuencia, se aprueban de manera unánime las cantidades ejecutadas y el avance financiero/físico presentado del 98.83%.

4. CONCLUSIONES Y ACCIONES A EJECUTAR

Cumplimiento del cronograma a la fecha de corte 25 de junio de 2026, del Contrato de Suministro No. 196 de 2026 presenta una ejecución física acumulada del 98.83%, demostrando un ritmo de trabajo conforme a lo proyectado y superando la mitad del alcance contractual de manera satisfactoria.

Validación Técnica: Las cantidades de obra y suministros reportadas por el contratista en este periodo fueron revisadas, verificadas y avaladas por la Supervisión, confirmando que cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

Garantía de Continuidad: No se registran alertas críticas, retrasos injustificados ni eventos de fuerza mayor que pongan en riesgo la continuidad del objeto contractual, estimando que el proyecto avanzará con normalidad hacia sus fases finales en el municipio de Tame.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	
JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ	R/L TAS SOLUCIONES S.A. S	
WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS	R/L ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

LISTADO DE ASISTENCIA Y PARTICPACION CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	PREDIO	VEREDA	CELULAR	FIRMA
1	SILVIO MINA	17,546,182	EL RECUERDO	HOLANDA	3136211613	
2	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	25,363,094	EL PARAISO	SANTA INES	3213610977	
3	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	17,547,105	EL REFLEJO	CRAVO TOTUMO	3123624870	
4	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	17,545,318	BUENOS AIRES	NARANJITO	3222255893	
5	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	1,116,857,200	EL CACHIPAY	BAJO CUSAY	3103442266	
6	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALES	96,191,461	EL PORVENIR	TEMBLADOR	3217321729	
7	TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR	68,246,862	EL LIMONAL	BAJO FLORIDA	3142729060	
8	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	68,300,453	NUEVO HORIZONTE	SANTA INES	3138944770	
9	JUVENAL AMU CAVICHE	17,546,022	EL PARQUEADERO	CRAVO COROZO	3132763230	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

10	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	1,116,864,993	LOTE TERRENO	SANTA INÉS	3108535745	Virgilia Arboleda
11	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ	1,115,739,370	LOTE TERRENO	PIÑALITO	3112852083	Jairo Gutierrez
12	HERNANDO MINA CASTILLO	17,547,938	MANDARINO	SANTA INES	3133060792	Hernando Mina
13	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	96,190,517	LA PALMITA	EL MAPOY	3102037782	
14	IRMA TOBAR CARABALI	68,306,032	LA ESPERANZA	HOLANDA	3138305825	
15	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	17,548,691	MIRA LINDO	LA ESPERANZA	3209903979	Marlina Villarreal
16	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	27,882,664	LOTE TERRENO	BOTALON	3112576501	Miriam Santos
17	EMILIO CAVICHE	17,545,494	EL LAGO	SANTA INES	3118071535	
18	URIEL MULATO ARRECHEA	17,546,656	LA ISLA	CRAVO TOTUMO	3134368697	
19	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	17,548,954	LA PRIMAVERA	HOLANDA	3203212321	Emiliano Martinez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

20	Eduardo Herrera Olaa	1116495867	TAJ Soluciones.	Tame	312 3717069	
21	Waldeiley Hernández	1116861947	SDAMA	TAME	3214928810	
22						
23						
24						
25						

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Foto H.W. 2026. Comité de Seguimiento Comunidad Contrato Suministro 196-2026	**Foto H.W. 2026. Comité de Seguimiento Comunidad Contrato Suministro 196-2026**
	
Foto H.W. 2026. Comité de Seguimiento Comunidad Contrato Suministro 196-2026	**Foto H.W. 2026. Comité de Seguimiento Comunidad Contrato Suministro 196-2026**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE COMITÉ No. 03

Acta No. 03	**Fecha:** 1 de julio de 2026	**Páginas:** 3

CONTRATO DE SUMINISTRO:	196 DE 2026
CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
NIT.:	900.885.335-4
OBJETO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

LUGAR Y FECHA
Salon comunitario Meleocipo Amu Arrechea, área rural Tame, Arauca; 1 de julio de 2026.
1. TEMAS
Entrega Final del Contrato de suministro No. 196 de 2026.
2. AGENDA DEL DIA
1. Saludo protocolario. 2. Presentación de las actividades y cantidades ejecutadas por parte del contratista. 3. Discusión y observaciones por parte de los asistentes. 4. Aprobación de cantidades ejecutadas y avance de ejecución del Contrato.
3. DESARROLLO

Se da inicio al desarrollo del comité final de avance para el Contrato de Suministro No. 196 de 2026, con el propósito de revisar el estado definitivo de su ejecución. La reunión contó con la participación de los representantes de la Entidad Contratante la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, el Contratista la señor (a) JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS y los diecinueve beneficiarios del proyecto; con el fin de evaluar el estado actual de la ejecución contractual.

La señora JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES SAS realiza la exposición detallada de los ítems, actividades y cantidades de suministro entregados. Se presenta el balance del proyecto, reportando un avance físico acumulado del 100,00% respecto al 100,00% del alcance contractual, confirmando el cumplimiento total de las metras y alcance pactados inicialmente.

Por parte de los beneficiarios, el señor WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS como R/L ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE – AFROCARIBE, manifestó la satisfacción de la comunidad con los entregables recibidos. Asimismo, resaltó el compromiso de la población beneficiaria, reflejado en su constante asistencia a las actividades realizadas por parte del Contratista y en el aporte de mano de obra como contrapartida.

Por último la señora MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ como Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, verificó que las cantidades, especificaciones técnicas y plazos estipulados en el contrato se ajustaran a los informes y soportes aportados.

Tras la revisión minuciosa de los soportes correspondientes, los asistentes validan la concordancia de los datos expuestos. En consecuencia, se aprueban de manera unánime las cantidades ejecutadas y el avance financiero/físico presentado del 100,00%.

4. CONCLUSIONES Y ACCIONES A EJECUTAR

A la fecha de corte 2 de julio de 2026, del Contrato de Suministro No. 196 de 2026 presenta el avance financiero/físico de 100,00%, demostrando el alcance contractual de manera satisfactoria.

Las cantidades del suministros reportadas por el Contratista durante el plazo de ejecución fueron revisadas, verificadas y avaladas por la Supervisión, confirmando que cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en el Contrato de suministro No. 196 de 2026.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARTHA JANETH GALVIS RODRÍGUEZ	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	
JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ	R/L Tas Soluciones S.A. S	
WALBERTO BERDUGO ARRELLANOS	R/L Asociación de Afrodescendientes del Caribe – AFROCARIBE	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

LISTADO DE ASISTENCIA Y PARTICPACION CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026

ÍTEM	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	PREDIO	VEREDA	CELULAR	FIRMA
1	SILVIO MINA	17,546,182	EL RECUERDO	HOLANDA	3136211613	
2	BEATRIZ CASTRILLON DE MINA	25,363,094	EL PARAISO	SANTA INES	3213610977	
3	EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA	17,547,105	EL REFLEJO	CRAVO TOTUMO	3123624870	
4	RAFAEL CARO BUSTAMANTE	17,545,318	BUENOS AIRES	NARANJITO	3222255893	
5	DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ	1,116,857,200	EL CACHIPAY	BAJO CUSAY	3103442266	
6	CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALES	96,191,461	EL PORVENIR	TEMBLADOR	3217321729	
7	TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR	68,246,862	EL LIMONAL	BAJO FLORIDA	3142729060	
8	MARIA MIRZA CARDOSO ALDANA	68,300,453	NUEVO HORIZONTE	SANTA INES	3138944770	
9	JUVENAL AMU CAVICHE	17,546,022	EL PARQUEADERO	CRAVO COROZO	3132763230	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

10	MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA	1,116,864,993	LOTE TERRENO	SANTA INÉS	3108535745	Victo Hugo arboleda
11	JAIRO ALFREDO GUTIERREZ	1,115,739,370	LOTE TERRENO	PIÑALITO	3112852083	Jairo Gutierrez.
12	HERNANDO MINA CASTILLO	17,547,938	MANDARINO	SANTA INES	3133060792	
13	DUBERNEY MULATO ARRECHEA	96,190,517	LA PALMITA	EL MAPOY	3102037782	
14	IRMA TOBAR CARABALI	68,306,032	LA ESPERANZA	HOLANDA	3138305825	
15	JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA	17,548,691	MIRA LINDO	LA ESPERANZA	3209903979	
16	MIRYAM ZORAIDA SANTOS RIVERO	27,882,664	LOTE TERRENO	BOTALON	3112576501	Miriam Santos
17	EMILIO CAVICHE	17,545,494	EL LAGO	SANTA INES	3118071535	
18	URIEL MULATO ARRECHEA	17,546,656	LA ISLA	CRAVO TOTUMO	3134368697	
19	EMILIANO MARTINEZ CASTRO	17,548,954	LA PRIMAVERA	HOLANDA	3203212321	Emiliano Martinez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

20	Walberto Berdugo A.	1958481	P/L. Africaribe		311 2813040	
21	Eduardo Herrero	1110495867	TAS Soluciones.		312 37170 69.	
22	Valderley Hernandez	1.116.861.947	Profesional Apo Secretaria de Desarrollo agrop		3214928810	
23						
24						
25						

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
H.W. 2026. COMITÉ FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026	H.W. 2026. COMITÉ FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026
	
H.W. 2026. COMITÉ FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026	H.W. 2026. COMITÉ FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO 196-2026

REGISTRO ACTAS CONTRAPARTIDAS

3

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 23 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**EMILIANO MARTINEZ CASTRO**
Cédula de ciudadanía:	**17.548.954 DE TAME**
Predio:	**LA PRIMAVERA**
Vereda:	**HOLANDA**
Teléfono:	**3203912321**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: EMILIANO MARTINEZ CASTRO
C.C. **17.548.954 DE TAME**
Vda: HOLANDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. EMILIANO MARTINEZ CASTRO

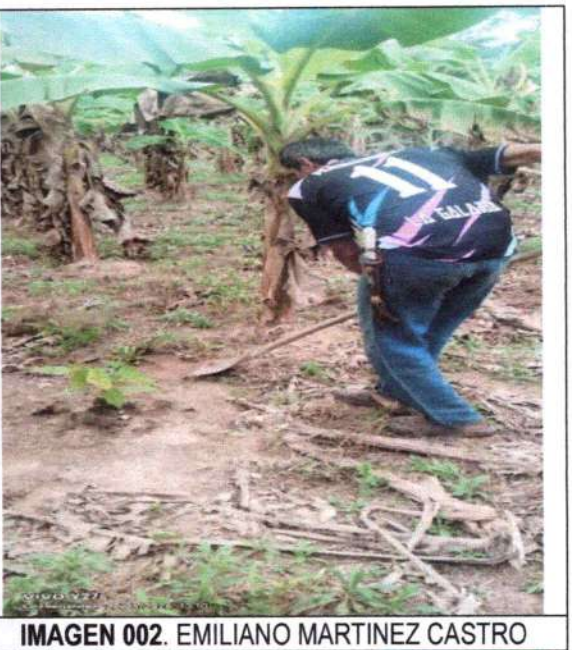


IMAGEN 002. EMILIANO MARTINEZ CASTRO



IMAGEN 004. EMILIANO MARTINEZ CASTRO

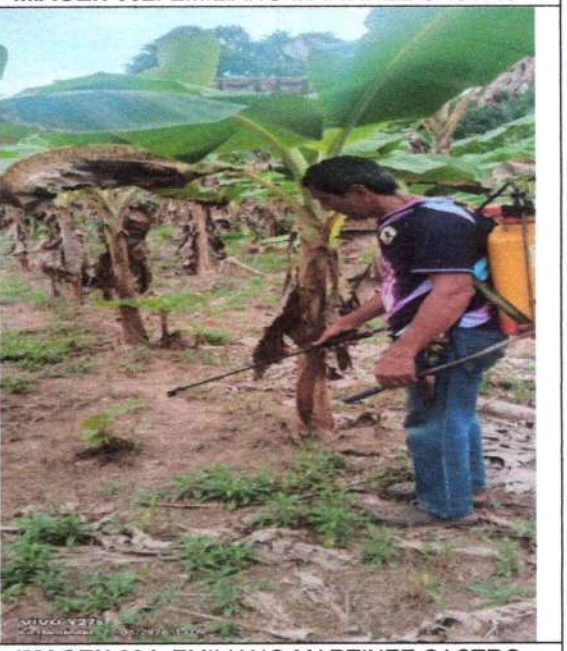


IMAGEN 004. EMILIANO MARTINEZ CASTRO

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 22 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**DALIDA MARGARITA CHIQUILLO SANCHEZ**
Cédula de ciudadanía:	**1.116.857.200 TAME**
Predio:	**LAS VEGAS**
Vereda:	**BAJO CUSAY**
Teléfono:	**310-3442266**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión




BENEFICIARIO:

NOMBRE: DALIDA MARGARITA CHIQUILLO
C.C. **1.116.857.200 TAME**
Vda: BAJO CUSAY

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO
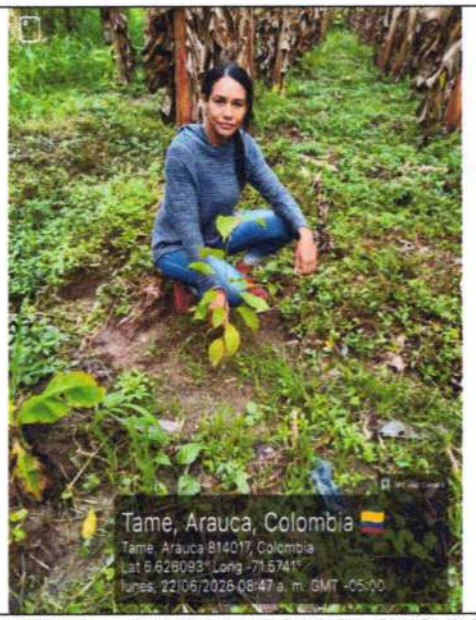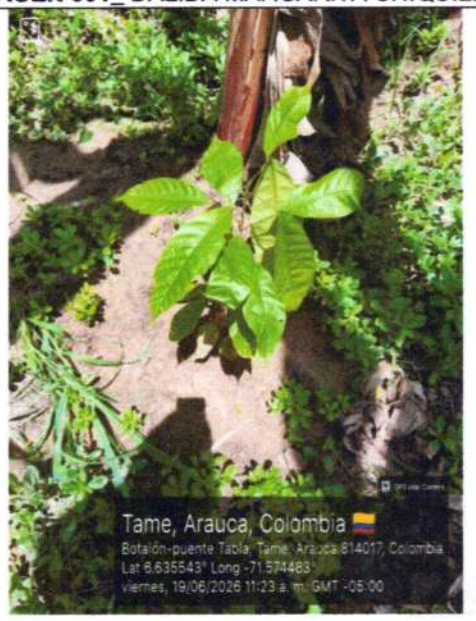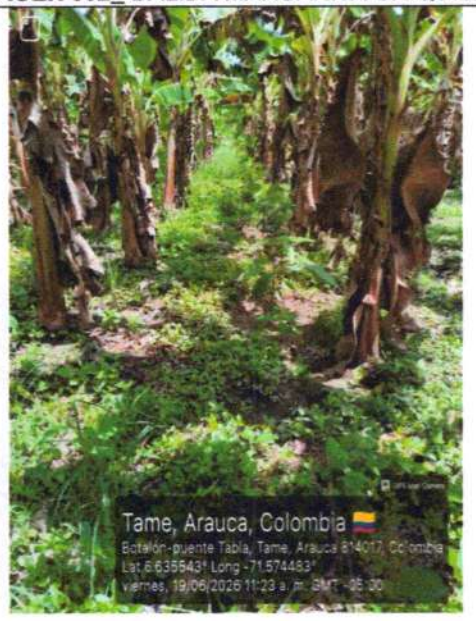
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>IMAGEN 001_ DALIDA MARGARITA CHIQUILLO</td>
<td>IMAGEN 002_ DALIDA MARGARITA CHIQUILLO</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>IMAGEN 003_ DALIDA MARGARITA CHIQUILLO</td>
<td>IMAGEN 004_ DALIDA MARGARITA CHIQUILLO</td>
</tr>
</table>

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 22 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JOSE ARCADIO HERRERA OSCATICA**
Cédula de ciudadanía:	**17.548.691 TAME**
Predio:	**LA NUEVA ESPERANZA**
Vereda:	**LA ESPERANZA**
Teléfono:	**320 9903979**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JOSE ARCADIO HERRERA O.

C.C. **17.548.691 TAME**
Vda: LA ESPERANZA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 002. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 003. JOSE ARCADIO HERRERA O.



IMAGEN 004. JOSE ARCADIO HERRERA O.

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 20 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**CARLOS ALBERTO CARABALI GONZALEZ**
Cédula de ciudadanía:	**96.191.461 TAME**
Predio:	**EL PORVENIR**
Vereda:	**EL TEMBLADOR**
Teléfono:	**321 7321729**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

carlos carabali

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CARABALI G.
C.C. **96.191.461 TAME**
Vda: EL TEMBLADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
IMAGEN 001. CARLOS A. CARABALI G.	**IMAGEN 002**. CARLOS A. CARABALI G.
	
IMAGEN 003. CARLOS A. CARABALI G.	**IMAGEN 004**. CARLOS A. CARABALI G.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 19 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**BEATRIZ CASTRILLON DE MINA**
Cédula de ciudadanía:	**25.363.094**
Predio:	**EL PARAÍSO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**321 361 09 77**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: BEATRIZ CASTRILLON DE MINA
C.C. 25.363.094
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRÁFICO



IMAGEN 001. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 002. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 003. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA



IMAGEN 004. BEATRIZ CASTRILLON DE MINA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 16 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**URIEL MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.656 TAME**
Predio:	**LA ISLA**
Vereda:	**CRAVO TOTUMO**
Teléfono:	**313 4368697**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: URIEL MULATO ARRECHEA
C.C. **17.546.656 TAME**
Vda: CRAVO TOTUMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 002. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 004. URIEL MULATO ARRECHEA



IMAGEN 003. URIEL MULATO ARRECHEA

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 22 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA MINA**
Cédula de ciudadanía:	**1.116.864.993 TAME**
Predio:	**SANTA INES**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**324 1846195**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN ARBOLEDA
C.C. 1.116.864.993 TAME
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

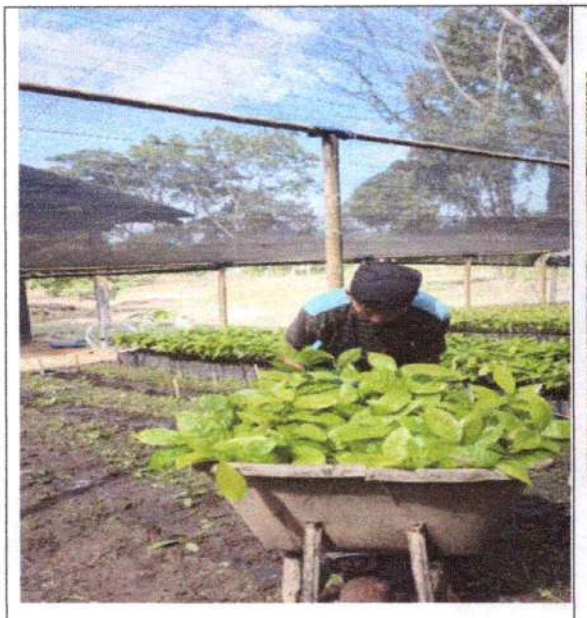


IMAGEN 001 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA



IMAGEN 002 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA



IMAGEN 003 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA



IMAGEN 004 MARÍA DEL CARMEN ARBOLEDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 16 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JAIRO ALFREDO GUTIERREZ TARAZONA**
Cédula de ciudadanía:	**1.115.739.370 SARAVENA**
Predio:	**KINAKINO**
Vereda:	**PIÑALITO**
Teléfono:	**3112852083**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JAIRO ALFREDO GUTIERREZ T.
C.C. 1.115.739.370 SARAVENA
Vda: PIÑALITO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
IMAGEN 001. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ	**IMAGEN 002**. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ
	
IMAGEN 003. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ	**IMAGEN 004**. JAIRO ALFREDO GUTIERREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 15 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**JUVENAL AMÚ CAVICHE**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.022 TAME**
Predio:	**EL PARQUEADERO**
Vereda:	**CRAVO COROZO**
Teléfono:	**313 5130631**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: JUVENAL AMU CAVICHE
C.C. 17.546.022 TAME
Vda: CRAVO COROZO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. JUVENAL AMU CAVICHE



IMAGEN 002. JUVENAL AMU CAVICHE



IMAGEN 003. JUVENAL AMU CAVICHE



IMAGEN 004. JUVENAL AMU CAVICHE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**EVER ALFONSO MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**17.547.105 TAME**
Predio:	**EL REFLEJO**
Vereda:	**CRAVO TOTUMO**
Teléfono:	**312 3624870**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: EVER ALFONSO MULATO A.
C.C. 17.547.105 TAME
Vda: CRAVO TOTUMO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRÁFICO



IMAGEN 002. EVER ALFONSO MULATO A.



IMAGEN 003. EVER ALFONSO MULATO A.

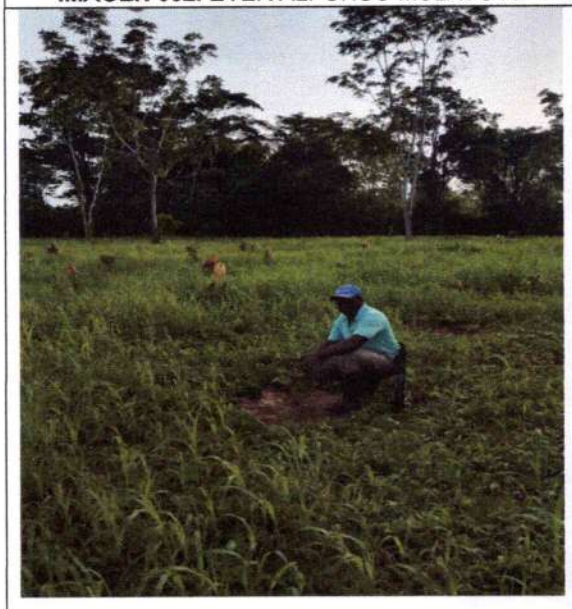


IMAGEN 003. EVER ALFONSO MULATO A.



IMAGEN 004. EVER ALFONSO MULATO A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**RAFAEL CARO BUSTAMANTE**
Cédula de ciudadanía:	**17.545.318 TAME**
Predio:	**BUENOS AIRES**
Vereda:	**NARANJITOS**
Teléfono:	**3212638180**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión


BENEFICIARIO:

NOMBRE: RAFAEL CARO BUSTAMANTE
C.C. **17.545.318 TAME**
Vda: NARANJITOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO
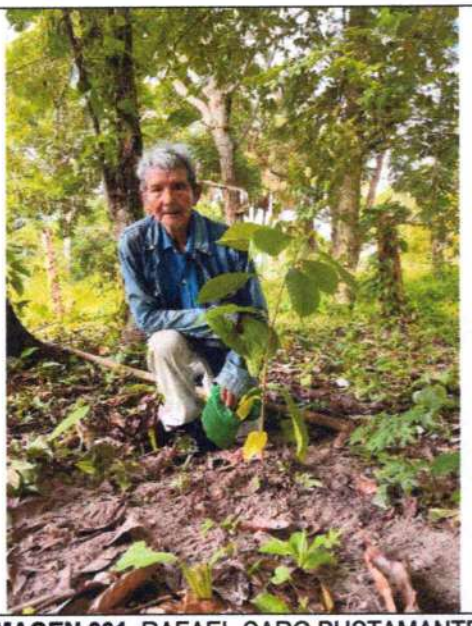
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IMAGEN 001. RAFAEL CARO BUSTAMANTE</td><td>IMAGEN 002. RAFAEL CARO BUSTAMANTE</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IMAGEN 003. RAFAEL CARO BUSTAMANTE</td><td>IMAGEN 004. RAFAEL CARO BUSTAMANTE</td></tr>
</table>

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 14 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**EMILIO CAVICHE**
Cédula de ciudadanía:	**17.545.494 TAME**
Predio:	**EL LAGO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**311 8071535**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: EMILIO CAVICHE
C.C. **17.545.494 TAME**
Vda: CRAVO COROZO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. Emilio Caviche



IMAGEN 002. Emilio Caviche



IMAGEN 003. Emilio Caviche



IMAGEN 004. Emilio Caviche

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 13 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR**
Cédula de ciudadanía:	**68.246.862 SARAVENA**
Predio:	**EL LIMONAL**
Vereda:	**BAJA FLORIDA**
Teléfono:	**314 2729060**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: TERESITA SANTAFE VILLAMIZAR
C.C. **68.246.862 SARAVENA**
Vda: Baja Florida

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TAME
CUNA DE LA LIBERTAD

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. Teresita Santafe Villamizar



IMAGEN 002. Teresita Santafe Villamizar



IMAGEN 003. Teresita Santafe Villamizar



IMAGEN 004. Teresita Santafe Villamizar

2419

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 12 días del mes de JUNIO de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**DUBERNEY MULATO ARRECHEA**
Cédula de ciudadanía:	**96.190.517 TAME**
Predio:	**LA MULATERA**
Vereda:	**MAPOY**
Teléfono:	**310 2037782**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: DUBERNEY MULATO ARRECHEA
C.C. **96.190.517 TAME**
Vda: MAPOY

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. DUBERNEY MULATO ARRECHEA

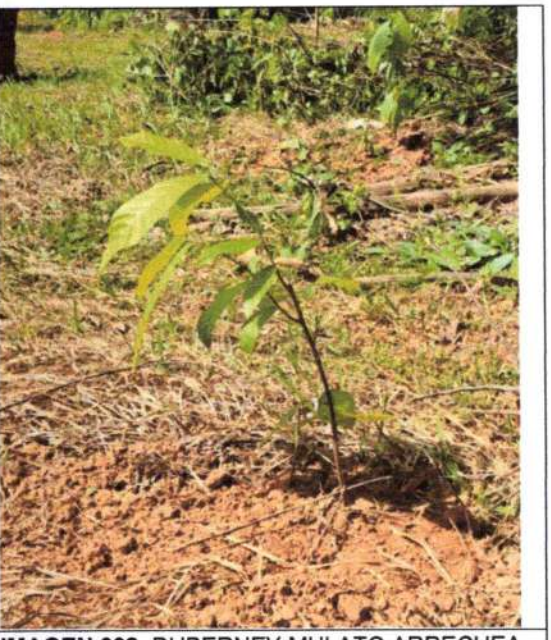


IMAGEN 002. DUBERNEY MULATO ARRECHEA



IMAGEN 003. DUBERNEY MULATO ARRECHEA



IMAGEN 004. DUBERNEY MULATO ARRECHEA

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 11 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**SILVIO MINA**
Cédula de ciudadanía:	**17.546.182 DE TAME**
Predio:	**EL ENCUENTRO**
Vereda:	**HOLANDA**
Teléfono:	**322 4214947**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: SILVIO MINA
C.C. **17.546.182 DE TAME**
Vda: LA HOLANDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
IMAGEN 001. SILVIO MINA	**IMAGEN 002**. SILVIO MINA
	
IMAGEN 003. SILVIO MINA	**IMAGEN 003**. SILVIO MINA

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 09 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**IRMA TOBAR CARABALI**
Cédula de ciudadanía:	**68.306.032 TAME**
Predio:	**LA EMPRETRIZ**
Vereda:	**HOLANDA**
Teléfono:	**321 4022432**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: IRMA TOBAR CARABALI
C.C. **68.306.032 TAME**
Vda: HOLANDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRÁFICO

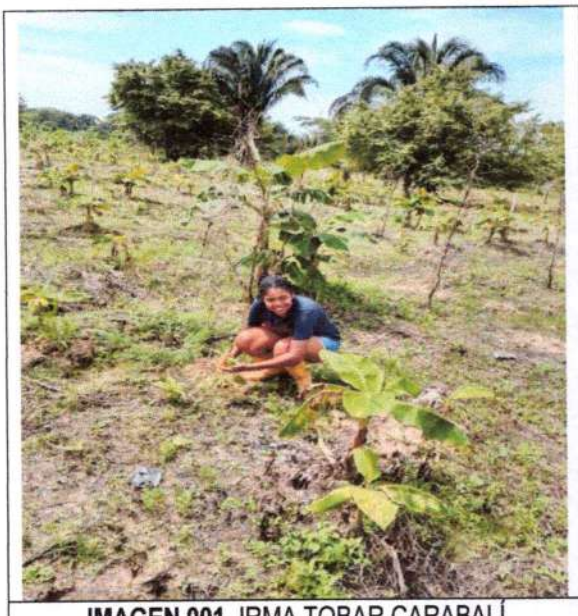


IMAGEN 001. IRMA TOBAR CARABALÍ



IMAGEN 002. IRMA TOBAR CARABALÍ



IMAGEN 003. IRMA TOBAR CARABALÍ



IMAGEN 004. IRMA TOBAR CARABALÍ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 09 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MIRYAN ZORAIDA SANTOS RIVERO**
Cédula de ciudadanía:	**27.882.664 TOLEDO**
Predio:	**LOTE TERRENO**
Vereda:	**LA HERMOSA**
Teléfono:	**311 2576501**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

Miriam Santos

NOMBRE: MIRYAN ZORAIDA SANTOS R.
C.C. 27.882.664 TOLEDO
Vda: LA HERMOSA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IMAGEN 001. Miryan Zoraida Santos Rivero</td><td>IMAGEN 002. Miryan Zoraida Santos Rivero</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IMAGEN 004. Miryan Zoraida Santos Rivero</td><td>IMAGEN 004. Miryan Zoraida Santos Rivero</td></tr>
</table>

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 08 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**HERNANDO MINA CASTRILLON**
Cédula de ciudadanía:	**17.547.938 TAME**
Predio:	**MANDARINO**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**3133060792**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	**$4.590.000**

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

NOMBRE: HERNANDO MINA CASTRILLON
C.C. 17.547.938 TAME
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 001. Hernando Mina Castrillon</td><td>Imagen 002. Hernando Mina Castrillon</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 003. Hernando Mina Castrillon</td><td>Imagen 004. Hernando Mina Castrillon</td></tr>
</table>

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
TRD - 700

ACTA DE CONTRAPARTIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

En el Municipio de Tame, Departamento de Arauca, a los 04 días del mes de junio de 2026, se reunieron por una parte el productor beneficiario del proyecto y por otra la Supervisión la Doc. **MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ** como Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con el fin de dejar constancia que el participante realizo mano de obra como contrapartida para la ejecución y sostenibilidad del proyecto productivo de cacao.

DATOS DEL PRODUCTOR BENEFICIARIO

Nombre del productor:	**MARIA MIRZA CARDOZO ALDANA**
Cédula de ciudadanía:	**68.300.453 TAME**
Predio:	**NUEVO HORIZONTE**
Vereda:	**SANTA INES**
Teléfono:	**313 8944770**

OBJETO DEL COMPROMISO

El productor beneficiario aporto la mano de obra requerida para el establecimiento y mantenimiento de una (1) hectárea de cacao, correspondiente a la contrapartida comunitaria contemplada dentro del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTRAPARTIDA

El beneficiario realizo las siguientes labores agrícolas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.0	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**			
5.1	Siembra de plántulas de cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.2	Control de arvenses	24 jornales	$67.500	$1.620.000
5.3	Control fitosanitario del cacao	8 jornales	$67.500	$540.000
5.4	Aplicación de fertilizantes	4 jornales	$67.500	$270.000
5.5	Podas de mantenimiento	12 jornales	$67.500	$810.000
5.6	Mantenimiento de drenajes	12 jornales	$67.500	$810.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	$4.590.000

TOTAL, CONTRAPARTIDA PRODUCTOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.590.000)

COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO

El productor (a) beneficiario (a) se compromete a:

- Realizar oportunamente las labores de mantenimiento del cultivo establecidas adicionales en el proyecto.
- Garantizar el adecuado manejo agronómico de la hectárea establecida.
- Participar en las actividades de asistencia técnica y acompañamiento programadas.
- Conservar y dar buen uso a los insumos y materiales entregados mediante el proyecto.
- Cumplir con las recomendaciones técnicas orientadas al fortalecimiento de la línea productiva de cacao.

NOTA: El beneficiario se compromete a sostener cultivo y mantenerlo en adecuadas condiciones.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha anteriormente indicada.

ENTREGANTE:

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisión

BENEFICIARIO:

Maria Mirza Cardoso A.
NOMBRE: MARIA MIRZA CARDOZO A.
C.C. **68.300.453 TAME**
Vda: SANTA INES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD - 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 001. MARIA MIRZA CARDOZO



IMAGEN 002. MARIA MIRZA CARDOZO



IMAGEN 003. MARIA MIRZA CARDOZO



IMAGEN 004. MARIA MIRZA CARDOZO

Carrera 15 Nª 14-20 3 Piso
(7) 888 6394
agricultura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

APOYO Y FORTALECIMIENTO A 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA DE RESIEMBRA PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

Sector:	ID 60 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fase:	FACTIBILIDAD - FASE 3
Valor Total:	$ 301.646.744,10
Valor del proyecto SGR:	$ 214.436.744,10
Valor del proyecto Contrapartida:	$ 87.210.000,00
Plazo de ejecución física y financiera:	TRES (03) MESES
Población Objetivo:	76
Unidad ejecutora:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
Fuente de Financiación:	SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORÍA
Valor no comprometido:	N/A
Contratos suscritos:	UNO (01)

CONTRATO DE SUMINISTRO N°:	196 DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	TAS SOLUCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH PAOLA AYA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 214.431.084,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	N/A
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	N/A

PROYECTO: 2025617940003

CONDICIONES APROBADAS						CONTRATADO				MES 1 - ABRIL 2026 (14 AL 30) (17 DIAS)		MES 2 - MAYO 2026 (01 AL 31) (31 DIAS)		MES 3 - JUNIO 2026 (01 AL 30)		MES 4 - JULIO 2026 (01 AL 02) (02 DIAS)		VALOR ACUMULADO (MESES ANTERIORES)	CANTIDADES MES JULIO (01 AL 31 DE JULIO DE 2026)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
1	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				$ 15.829.280,00				$ 15.829.280,00		$ 4.165.600		$ 11.663.680		$ -		$ -	$ 15.829.280		$ -		$ 15.829.280,00
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19,00	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00	Unidad	19,00	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00	5,00	$ 4.166.600	14,00	$ 11.663.680		$ -		$ -	$ 15.829.280	0,00	$ -	19,00	$ 15.829.280,00
2.0	REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA.				$ 10.536.555,00				$ 10.536.555,00		$ -		$ -		$ 7.024.370		$ -	$ 10.536.555		$ 3.512.185,00		$ 10.536.555,00
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, sillatería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3,00	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00	Unidad	3,00	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00		$ -		$ -	2,00	$ 7.024.370,00	1,00	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555	1,00	$ 3.512.185,00	3,00	$ 10.536.555,00
3.0	FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO				$ 124.818.940,10				$ 124.813.280,00		$ -		$ -		$ 124.813.280		$ -	$ 124.813.280		$ -		$ 124.813.280,00
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19,00	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00	Unidad	19,00	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00		$ -		$ -	19,00	$ 100.284.280		$ -	$ 100.284.280	0,00	$ -	19,00	$ 100.284.280,00
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 880, bandeja plástica, mgoa/madera, llanta ligera, 2 llantas neumáticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19,00	$ 1.291.297,90	$ 24.534.660,10	Unidad	19,00	$ 1.291.000,00	$ 24.529.000,00		$ -		$ -	19,00	$ 24.529.000		$ -	$ 24.529.000	0,00	$ -	19,00	$ 24.529.000,00
4.0	REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.				$ 63.251.969,00				$ 63.251.969,00		$ 16.645.255		$ 46.606.714		$ -			$ 63.251.969		$ -		$ 63.251.969,00
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje de cacao para patronaje, de 30cm con registro ICA	Unidad	8550,00	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00	Unidad	8550,00	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00	2250,00	$ 12.715.875	6300,00	$ 35.604.450		$ -		$ -	$ 48.320.325		$ -	8550,00	$ 48.320.325,00
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19,00	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00	Unidad	19,00	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00	5,00	$ 3.929.380	14,00	$ 11.002.264		$ -		$ -	$ 14.931.644		$ -	19,00	$ 14.931.644,00

2433

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

APOYO Y FORTALECIMIENTO A 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA DE RESIEMBRA PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

Sector:	ID 60 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Fase:	FACTIBILIDAD - FASE 3
Valor Total:	$ 301.646.744,10
Valor del proyecto SGR:	$ 214.436.744,10
Valor del proyecto Contrapartida:	$ 87.210.000,00
Plazo de ejecución física y financiera:	TRES (03) MESES
Población Objetivo:	76
Unidad ejecutora:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
Fuente de Financiación:	SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORIA
Valor no comprometido:	N/A
Contratos suscritos:	UNO (01)

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº:	196 DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA:	TAS SOLUCIONES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH PAOLA AYA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 214.431.084,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	N/A
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	N/A

PROYECTO: 2025617940003

CONDICIONES APROBADAS						CONTRATADO				MES 1 - ABRIL 2026 (14 AL 30) (17 DIAS)		MES 2 - MAYO 2026 (01 AL 31) (31 DIAS)		MES 3 - JUNIO 2026 (01 AL 30)		MES 4 - JULIO 2026 (01 AL 02) (02 DIAS)		VALOR ACUMULADO (MESES ANTERIORES)	CANTIDADES MES JULIO (01 AL 31 DE JULIO DE 2026)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
5.0	REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO	HAS	19		$ 87.210.000,00	HAS	19		$ 87.210.000,00				$ -		$ 87.210.000			$ 87.210.000		$ -		$ 87.210.000,00
5.1	Siembra de Plántulas de cacao (8 Jornales X Ha)	Jornal	152,00	$ 67.500,00	$ 19.260.000,00	Jornal	152,00	$ 67.500,00	$ 10.260.000,00		$ -		$ -	152,00	$ 10.260.000		$ -	$ 10.260.000		$ -		$ -
5.2	Control de arvenses (24 Jornales X Ha)	Jornal	456,00	$ 67.500,00	$ 30.780.000,00	Jornal	456,00	$ 67.500,00	$ 30.780.000,00		$ -		$ -	456,00	$ 30.780.000		$ -	$ 30.780.000		$ -		$ -
5.3	Control Fitosanitario del Cacao (8 Jornales X Ha)	Jornal	152,00	$ 67.500,00	$ 10.260.000,00	Jornal	152,00	$ 67.500,00	$ 10.260.000,00		$ -		$ -	152,00	$ 10.260.000		$ -	$ 10.260.000		$ -		$ -
5.4	Aplicaciones de Fertilizantes (4 Jornales X Ha)	Jornal	76,00	$ 67.500,00	$ 5.130.000,00	Jornal	76,00	$ 67.500,00	$ 5.130.000,00		$ -		$ -	76,00	$ 5.130.000		$ -	$ 5.130.000		$ -		$ -
5.5	Podas de Mantenimiento (12 Jornales X Ha)	Jornal	228,00	$ 67.500,00	$ 15.390.000,00	Jornal	228,00	$ 67.500,00	$ 15.390.000,00		$ -		$ -	228,00	$ 15.390.000		$ -	$ 15.390.000		$ -		$ -
5.6	Mantenimiento Drenajes (12 Jornales X Ha)	Jornal	228,00	$ 67.500,00	$ 15.390.000,00	Jornal	228,00	$ 67.500,00	$ 15.390.000,00		$ -		$ -	228,00	$ 15.390.000		$ -	$ 15.390.000		$ -		$ -
				SUBTOTAL APORTE SGR	$ 214.436.744,10			SUBTOTAL APORTE SGR	$ 214.431.084,00		$ 20.810.855		$ 58.270.394		$ 131.837.650		$ 3.512.185	$ 214.431.084		$ 3.512.185,00		$ 214.431.084,00
				SUBTOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$ 87.210.000,00			SUBTOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$ 87.210.000						$ 87.210.000			$ 87.210.000		$ -		$ 87.210.000,00
				TOTAL SUMINISTRO	$ 301.646.744,1			TOTAL SUMINISTRO	$ 301.641.084,00		$ 20.810.855		$ 58.270.394		$ 219.047.650		$ 3.512.185	$ 301.641.084		$ 3.512.185,00		$ 301.641.084,00
										TOTAL EJEUCTADO MES 01		TOTAL EJEUCTADO MES 02		TOTAL EJEUCTADO MES 03		TOTAL EJEUCTADO MES 04			TOTAL ACTIVIDAD FISICA EJECUTADA		TOTAL, ACTIVIDAD FISICA ACUMULADO	
				VALOR TOTAL	$ 301.646.744,10				$ 301.641.084,00		$ 20.810.855	$ -	$ 58.270.394	$ -	$ 219.047.650	$ -	$ 3.512.185	$ 301.641.084	TOTAL, EJECUTADO MES DE JULIO DE 2026	$ 3.512.185	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO	$ 301.641.084
																					% AVANCE FISICO	100,00%

TAS SOLUCIONES S.A.S
JULIETH PAOLA AYA
CONTRATISTA DE SUMINISTRO

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO
SUPERVISOR DESIGNADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

MIGUEL ANGEL CASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME

2434

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: "APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA"

- **Código BPIN:** 2025817940003
- **Valor Total aprobado del Proyecto:** 301.646.744,10
- **Valor Total ejecutado del Proyecto: $ 301.641.084**
- **% de avance de ejecución:** 100%
- **Fecha de Inicio:** 14 DE ABRIL DE 2026
- **Fecha de Terminación:** 02 DE JULIO DE 2026
- **Supervisor:** Martha Janeth Galvis - Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
- **Interventor (si aplica):** N/A

2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y PRODUCTOS

El suscrito Supervisor y/o Interventor certifica que, de acuerdo con la revisión técnica, financiera y administrativa realizada:

2.1 Metas de Producto

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Fecha de reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Implementar proyectos productivos sostenibles	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	Número de pequeños productores rurales	19	02/07/2026	19	100%

Seleccione:

☒ El proyecto cumplió el 100% de las metas aprobadas.

☐ El proyecto no cumplió totalmente las metas (justificación obligatoria):

Justificación (si aplica): No aplica

TRD- 700

3. INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Fecha de reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
Implementar proyectos productivos sostenibles	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	Número de pequeños productores rurales	19.00	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	2025	2025	19	02/07/2026	19	100%

Seleccione:

☒ Los indicadores alcanzaron las metas establecidas.

☐ No se alcanzaron plenamente los indicadores (justificación):

Justificación (si aplica):

4. POBLACIÓN BENEFICIADA

- **Beneficiarios proyectados:** 76 beneficiarios
- **Beneficiarios reales:** 76 beneficiaros
- **Fuente de verificación:** Informes de ejecución, Acta de recibo final.

Seleccione:

☒ La población objetivo está siendo beneficiada conforme a lo aprobado en el proyecto.

☐ Existen variaciones (justificar técnica y normativamente):

Justificación (si aplica): No aplica

5. SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN

1. ¿Los productos generados son agotables?
   ☒Sí ☐No

TRD- 700

2. ¿El proyecto se encuentra operando y en funcionamiento?
   ☒ Sí ☐ No

3. Entidad responsable de la operación y sostenibilidad:
   ☐ Gobernación
   ☒ Municipio
   ☐ E.S.E.
   ☐ Empresa de Servicios Públicos
   ☐ Institución Educativa
   ☒ Otra:

4. Nombre de la entidad responsable:
   - AFROCARIBE R/L WALBERTO BERDUGO ARELLANOS
   - ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

5. Documento que garantiza la operación:
   ☒ Acta de Entrega
   ☐ Acto Administrativo
   ☐ Convenio
   ☐ Otro:

Justifique el concepto sobre sostenibilidad: Se suscribieron acta de compromiso con los beneficiarios del proyecto quienes realizarán actividades de control de arvenses, control fitosanitario del cacao, aplicaciones de fertiiizantes, podas de mantenimiento, mantenimiento drenajes, por parte del municipio se brindará seguimiento por parte de la Secretaría de Agricultura

6. CONCEPTO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Certifico que:

☒ Las obras fueron recibidas a satisfacción.
☐ Las pruebas técnicas y ensayos cumplen normatividad sectorial vigente. No aplica
☒ Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas contractuales.
☒ El proyecto es funcional.
☒ El proyecto es sostenible.
☒ El proyecto se encuentra operando.

Concepto Final (Máximo 2000 caracteres)

En ejercicio de las funciones de supervisión/interventoría, y con base en las verificaciones técnicas, administrativas y financieras realizadas durante la ejecución contractual, se certifica que el proyecto

identificado con BPIN No. 2025817940003 cumplió con las metas, productos e indicadores aprobados en el Sistema General de Regalías, garantizando la calidad técnica de los bienes entregados, así como las condiciones de funcionalidad y sostenibilidad previstas en la formulación del proyecto. En consecuencia, se emite concepto favorable para su cierre en GESPROY-SGR.

Anexar:

- Soportes del acta de entrega
- Socialización de entrega
- Registro fotográfico – Proyecto terminado

Firma Supervisor: _____

Nombre: Ronald Jonnat Galvis Rodriguez

Cargo: Secretaria De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Fecha: 2 de Julio de 2026.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

REGISTRO FOTOGRAFICO



H. w 2026. Comité final 3



H. w 2026. Comité final 3



H. w 2026. 4. REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.



H. w 2026. 1.0 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.



H. w 2026. 3. FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO



H. w 2026. H. w 2026. 3. FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

	
H. w 2026. 3. FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO	H. w 2026. 3. FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO
	
H. w 2026. 4. REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.	H. w 2026. H. w 2026 2. REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO EN SISTEMA RESIEMBRA.
	
H. w 2026 5. REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO	H. w 2026 5. REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

TRD- 700

	
H. w 2026 5. REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO	H. w 2026 5. REALIZAR LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
TRD – 700

Tame, septiembre 21 de 2026

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que, el contratista **TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4 R/L JULIEHT PAOLA AYA** identificado Cedula de ciudadanía No. 60.267.178 de Pamplona N.S, cumplió con la ejecución del 100% del acta de recibo final y las actividades programadas del contrato de suministro No.196 de 2026., cuyo objeto es: **" APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.".** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual y acta de recibo final.

Se expide en Tame-Arauca, a los 21 días del mes de septiembre de 2026.

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretearía De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente
Supervisor

Tame, septiembre 21 de 2026

LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que, el contratista TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4 R/L JULIEHT PAOLA AYA identificado Cedula de ciudadanía No. 60.267.178 de Pamplona N.S, cumplió con los pagos del *sistema de seguridad social durante el mes de Abril planillas No.* 9504149277 y 9510995427 Fechas de pago : 02 de mayo de 2026 y 10 de septiembre respectivamente, mes de Mayo de 2026 planillas No. 9505893221 y 9510996020 Fechas de pago : 02 de junio de 2026 y 10 de septiembre respectivamente, Mes de Junio planilla No. 9507408524 Fecha de pago : 02 de julio de 2026 y Mes de Julio planilla No. 9509051399 Fecha de pago : 03 de agosto de 2026 en el marco de la ejecución de las actividades programadas del contrato de suministro No. 196 de 2026, cuyo objeto es ": APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA." Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

ANEXA: Soporte de pago de seguridad social.

Se expide en Tame-Arauca, a los 21 días del mes de septiembre de 2026.

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretearía De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente

Libertad y Orden	OBJETO:	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	
	CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA NIT.900885335-4	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 10/04/2026	VALOR INICIAL DE CONTRATO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE INICIO: 14/04/2026		ACTA DE RECIBO FINAL 02- JULIO-2026
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME	PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES		
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 13 DE JULIO DE 2026	VALOR A GIRAR: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00)	FECHA PRESENTE ACTA 02 - JULIO- 2026
	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA : 02 DE JULIO DE 2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026						VALOR PRESENTE ACTA	
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	**REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**						
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19	$ 833.120,00	$ 15.829.280,00	19	$ 15.829.280,00
2	**REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silleteria, video Beam, refrigerios)	Unidad	3	$ 3.512.185,00	$ 10.536.555,00	3	$ 10.536.555,00
3	**FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19	$ 5.278.120,00	$ 100.284.280,00	19	$ 100.284.280,00
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19	$ 1.291.000,00	$ 24.529.000,00	19	$ 24.529.000,00

Libertad y Orden	OBJETO:	APOYO Y FORTALE[illegible]NTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	TAME
	CONTRATISTA:	TAS SOLUCIONES S.A.S R/L JULIETH PAOLA AYA NIT.900885335-4	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 10/04/2026	VALOR INICIAL DE CONTRATO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE INICIO: 14/04/2026		ACTA DE RECIBO FINAL 02- JULIO-2026
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME	PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES		
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 13 DE JULIO DE 2026	VALOR A GIRAR: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00)	FECHA PRESENTE ACTA 02 - JULIO- 2026
	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA : 02 DE JULIO DE 2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026						VALOR PRESENTE ACTA	
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
4	**REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.**				$ -		$ -
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550	$ 5.651,50	$ 48.320.325,00	8.550	$ 48.320.325,00
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19	$ 785.876,00	$ 14.931.644,00	19	$ 14.931.644,00
SUMAS IGUALES					$ 214.431.084,00		$ 214.431.084,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO						$	**214.431.084,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO						$	**214.431.084,00**
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL						$	**214.431.084,00**
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME						$	-

NOTA: EL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00)

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretearía De Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente -Supervisor

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal

TAS SOLUCIONES S.A.S
R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	TAS SOLUCIONES S.A.S. NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
OBJETO	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
SUPERVISOR	MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Supervisor Municipal, TAS SOLUCIONES S.A.S., R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026
CONTRATISTA	TAS SOLUCIONES S.A.S. identificado con NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 60.267.178 expedida en Pamplona.
OBJETO	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISTRO
VALOR	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($214.431.084,00)
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así:

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

	• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. • Planillas de enfoque diferencial en físico y digital en formato Excel(Cuando aplique). • Registro Fotográfico físico y digital. • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Certificación de Ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda. • Acta de recibo final. • Informe del Supervisor. • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado. • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales. • Y los demás requisitos que solicite el supervisor. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, *según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o* el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. **PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la Legalización. **PARÁGRAFO CUARTO:** El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

	cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. **ANTICIPO:** Para el presente proceso contractual el Municipio no entregará al contratista anticipo. **PARÁGRAFO CUARTO:** El Municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 DE JULIO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	2 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	2 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fueron iniciadas el día catorce (14) de abril de 2026, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en calidad de Supervisor Municipal y TAS SOLUCIONES S.A.S identificado con NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 60.267.178 expedida en Pamplona, en calidad de Contratista, por valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2026, así:

CDP Y RP					
DETALLE	FUENTE	NUMERO	FECHA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	IL81794 Inversión local NBI y cuarta, quinta y sexta categoría	CDP 20260115 001	15/01/2026	SGR.03.IL.171702-2025-817794- 0003 Apoyo y fortalecimiento para la resiembra de 19 hectáreas de la línea productiva de cacao para la comunidad afrodescendiente de municipio de Tame-Arauca	$ 214.436.744, 10

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

CDP Y RP					
DETALLE	FUENTE	NUMERO	FECHA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SPGR	126	15/01/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.436.744, 10
REGISTRO PRESUPUESTAL	SPGR - 2026	RPR20260414001	14/04/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.431.084,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	SPGR	526	14/04/2026	00IL-1702-1100-2025-81794-0003 APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	$ 214.431.084,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula SÉPTIMA – GARANTÍAS del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedida el diez (10) de abril de 2026.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	No. COQ-100009080 ANEXO No.0	10/04/2026	10/11/2026	$ 21.443.108,40
	Calidad del servicio		10/04/2026	10/01/2027	$ 21.443.108,40
	Calidad y correcto funcionamiento		10/07/2026	10/07/2027	$ 21.443.108,40

b) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO, expedida el diecisiete (17) de abril de 2026.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
	Cumplimiento	No. COQ-100009080 ANEXO No.1 y 2	14/04/2026	14/11/2026	$ 21.443.108,40
	Calidad del servicio		14/04/2026	14/01/2027	$ 21.443.108,40

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Calidad y correcto funcionamiento		14/07/2026	14/07/2027	$ 21.443.108,40

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 214.431.084,00	
Valor Acta de Recibo Final		$ 214.431.084,00
Saldo a favor Municipio de Tame		$ 00,00
VALOR TOTAL	$ 214.431.084,00	$ 214.431.084,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día dos (2) de julio de 2026, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS , actuando como Alcalde, la Señora MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en calidad de Supervisor Municipal y TAS SOLUCIONES S.A.S identificado con NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 60.267.178 expedida en Pamplona, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 214.431.084,00
Valor Acta de Recibo Final	$ 214.431.084,00
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final	$ 00,00
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final	$ 214.431.084,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato de suministro No. 196 De 2026, consistió en el APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA el cual tiene las siguientes actividades:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.		

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Brindar asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de la línea productiva de cacao en sistema resiembra	Unidad	19
2.	REALIZAR CAPACITACIÓN Y TALLER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.		
2.1	Talleres en Manejo Fitosanitario y Poda (incluye: alquiler de sitio, silletería, video Beam, refrigerios)	Unidad	3
3.	FORTALECER LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.		
3.1	Guadañadora, eje giratorio B45, 41,5 CC	Unidad	19
3.2	CARRETILLA TIPO VAGÓN PLÁSTICA. Carretilla 8ft3, bandeja plástica, mgos/madera, llanta ligera, 2 llantas neumaticas de rodada lisa con rin de 3 aspas	Unidad	19
4.	REALIZAR RESIEMBRA DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO.		
4.1	Suministro de Plántulas de cacao para patronaje	Unidad	8.550
4.2	Transporte de Plántulas de cacao para patronaje (puesta en sitio)	Unidad	19

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la unidad ejecutora la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que mediante Resolución No. 321 del dieciocho (18) de marzo de 2026, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. SA-SI-TA-001-2026.

- ✓ Que mediante Resolución No. 367 del siete (07) de abril de 2026, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Selección Abreviada Subasta Inversa No. SA-SI-TA-001-2026, a la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S identificado con NIT 900.885.335-4 R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 60.267.178 expedida en Pamplona.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

- ✓ Que el día diez (10) de abril de 2026, se suscribió el Contrato de Suministro No. 196 de 2026, entre el Municipio de Tame y TAS SOLUCIONES S.A.S - R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ NIT No. 900.885.335-4, cuyo objeto es la APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA, por un valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00); y un plazo de ejecución de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de Suministro No. 196 de 2026, mediante Comunicación de Supervisión se designó como Supervisor Inicial Municipal desde diez (10) de abril de 2026 a la Señora MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

- ✓ Que el día catorce (14) de abril de 2026 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 196 de 2026, entre la Señora MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de Supervisor Municipal y TAS SOLUCIONES S.A.S - R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ NIT No. 900.885.335-4 en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación inicial para el día trece (13) de julio de 2026.
- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día el dos (2) de julio de 2026 , según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 196 de 2026 suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ÁNGEL BASTOS Alcalde, la Señora MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de Supervisora Municipal y la Señora JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ R/L TAS SOLUCIONES S.A.S., en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00);.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La oficina Asesora jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato.
  - Planillas de enfoque diferencial en físico y digital en formato Excel (Cuando aplique).
  - Registro Fotográfico físico y digital.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

- Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda.
- Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda.
- Acta de recibo final.
- Informe del Supervisor.
- Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado.
- Acta de liquidación del contrato
- Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
- Y los demás requisitos que solicite el supervisor.

✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 196 de 2026 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda al TAS SOLUCIONES S.A.S - R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ NIT No. 900.885.335-4, la suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 196 de 2026 se concluye que al momento de la liquidación al Municipio de Tame no se presenta Saldo a Favor según Acta de Recibo Final.

✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 196 de 2026, suscrito entre el Municipio de Tame y TAS SOLUCIONES S.A.S - R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ .

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a TAS SOLUCIONES S.A.S - R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ, la Suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 214.431.084,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame NO tiene un saldo a favor, por concepto de Acta de Recibo Final.

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 196 DE 2026

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma en el Municipio de Tame a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026.

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Supervisor Municipal

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

TAS SOLUCIONES S.A.S
R/L JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
Contratista

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

ANEXO NO.13 SOPORTE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549
"Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos"

TAS
SOLUCIONES S.A.S

NIT: 900885335-4

DECLARACION JURAMENTADA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tame, septiembre 11 de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
La Ciudad

Referencia: Contrato de suministro No.196 de 2026

OBJETO: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA".

La suscrita **JULIETH PAOLA AYA RODRÍGUEZ**, identificado C. C. No. 60.267.178 de Pamplona N.S obrando en representación de TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4 y el señor PABLO ROMERO IVICA en calidad de contador públicos T.P. 158092-T de TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y el servicio nacional de aprendizaje SENA durante los meses de mayo y junio del 2026, y que se encuentra exonerada de portes según lo enunciado en el ART 114 – 1 E.T .

Art. 114 - 1. Exoneración de aportes.

Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los anteriores aportes se ven reflejadas en el proceso de: **AUTOR RETENCIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**, con el objetivo de contrarrestar la afectación del recaudo por el beneficio que se le otorga a las personas jurídicas de no pagar aportes de salud y aportes parafiscales Sena e ICBF.

Lo anterior en virtud de que se ha brindado pago oportuno a los aportes cuando a ello ha habido lugar, la presente se expide en el Municipio de Tame – Arauca, con destino a la Alcaldía Municipal de Tame.

Dado a los once (11) días del Mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
C.C. 60.267.178 de Pamplona N.S
Representante Legal

PABLO ROMERO IVICA
T.P. 158092-T
CONTADOR PÚBLICO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.854.213
ROMERO IVICA
PABLO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1986
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
03-ENE-2005 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL


República de Colombia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
158092-T
PABLO
ROMERO IVICA
C.C. 1116854213
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DEL AREA ANDINA
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
168650


83934
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, - Junta Central
de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z 3 C 5 B 2 4 A A 7 4 9 C B F 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO ROMERO IVICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116854213 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 158092-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	535153757	9509051399	E	2026/08/11	2026/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,949,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (16 Afiliados)																						$20,133,992	$3,221,800			$20,133,992	$805,800			$20,372,792	$815,400			$20,133,992		$106,100		$0	$0		$4,949,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (16 Afiliados)																						$20,133,992	$3,221,800			$20,133,992	$805,800			$20,372,792	$815,400			$20,133,992		$106,100		$0	$0		$4,949,100
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (16 Afiliados)																						$20,133,992	$3,221,800			$20,133,992	$805,800			$20,372,792	$815,400			$20,133,992		$106,100		$0	$0		$4,949,100
1	CC	1116855322	AVILA CRISTIAN	X	X														X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,864	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$14,700
2	CC	60267178	AYA JULIETH																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	96195062	BOHORQUEZ HERLEY	X																230301	12	$1,560,000	$249,600	EPS037	12	$1,560,000	$62,400	CCF67	12	$1,560,000	$62,400	14-11	12	$1,560,000	0.522%	$8,200	12	$0	$0	SI	$382,600
4	CC	1098758486	CAMARGO LEONARDO																	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
5	CC	1094279057	CAPACHO DALLY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	17594367	CASTRO ARLEY	X	X														X	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,864	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$14,700
7	CC	17549863	ESCOBAR DARIO	X	X														X	230301	2	$120,000	$19,200	EPS037	2	$120,000	$4,800	CCF67	2	$125,000	$5,000	14-11	2	$120,000	0.522%	$700	2	$0	$0	SI	$29,700
8	CC	1026264930	GARCIA DENNIS	X	X														X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,864	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$14,700
9	CC	1110495867	HERREÑO EDUARDO	X	X														X	25-14	2	$360,000	$57,600	EPS037	2	$360,000	$14,400	CCF67	2	$364,900	$14,600	14-11	2	$360,000	0.522%	$1,900	2	$0	$0	SI	$88,500
10	CC	1032440156	MULATO JOHANNA		X														X	230301	13	$758,726	$121,400	EPS041	13	$758,726	$30,400	CCF67	13	$977,626	$39,200	14-11	13	$758,726	0.522%	$4,000	13	$0	$0	SI	$195,000
11	CC	1116870617	PINEDA LEIDY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
12	CC	96195669	PLAZAS JAVIER																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
13	CC	96194837	SANABRIA DIEGO																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
14	CC	1020483214	SANCHEZ YEFFERSON																	230301	30	$2,200,000	$352,000	ESSC24	30	$2,200,000	$88,000	CCF67	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
15	CC	1116861751	TUNAROSA YONIER	X	X														X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,864	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	SI	$14,700
16	CC	1094277845	USMA PEDRO	X																230301	15	$2,000,000	$320,000	EPS041	15	$2,000,000	$80,000	CCF67	15	$2,000,000	$80,000	14-11	15	$2,000,000	0.522%	$10,500	15	$0	$0	SI	$490,500
Total			**Afiliados(16)**																			$20,133,992	$3,221,800			$20,133,992	$805,800			$20,372,792	$815,400			$20,133,992		$106,100		$0	$0		$4,949,100

2574

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$3,221,800	$0	$0	$3,221,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,203,000	$0	$0	$1,203,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,018,800	$0	$0	$2,018,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$106,100	$0	$0	$106,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$106,100	$0	$0	$106,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$815,400	$0	$0	$815,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	16	$815,400	$0	$0	$815,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$805,800	$0	$0	$805,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$88,000	$0	$0	$88,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$460,000	$0	$0	$460,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$185,300	$0	$0	$185,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				16	$4,949,100	$0	$0	$4,949,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	441729841	9507408524	E	2026/07/08	2026/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,194,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (14 Afiliados)																					$21,126,169	$3,380,400			$21,126,169	$845,300			$21,430,969	$857,600			$21,126,169		$111,100		$0	$0		$5,194,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)																					$21,126,169	$3,380,400			$21,126,169	$845,300			$21,430,969	$857,600			$21,126,169		$111,100		$0	$0		$5,194,400
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (14 Afiliados)																					$21,126,169	$3,380,400			$21,126,169	$845,300			$21,430,969	$857,600			$21,126,169		$111,100		$0	$0		$5,194,400
1	CC	1116855322	AVILA CRISTIAN	X	X													X	23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF67	2	$121,627	$4,900	14-11	2	$116,727	0.522%	$700	2	$0	$0	SI	$29,000
2	CC	60267178	AYA JULIETH																25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	96195062	BOHORQUEZ HERLEY		X													X	23030 1	12	$1,560,000	$249,600	EPS037	12	$1,560,000	$62,400	CCF67	12	$1,668,333	$66,800	14-11	12	$1,560,000	0.522%	$8,200	12	$0	$0	SI	$387,000
4	CC	1098758486	CAMARGO LEONARDO																25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
5	CC	1094279057	CAPACHO DALLY																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	17549863	ESCOBAR DARIO	X	X													X	23030 1	2	$120,000	$19,200	EPS037	2	$120,000	$4,800	CCF67	2	$125,000	$5,000	14-11	2	$120,000	0.522%	$700	2	$0	$0	SI	$29,700
7	CC	1026264930	GARCIA DENNIS	X	X													X	23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF67	2	$121,627	$4,900	14-11	2	$116,727	0.522%	$700	2	$0	$0	SI	$29,000
8	CC	1110495867	HERREÑO EDUARDO	X	X													X	25-14	2	$360,000	$57,600	EPS037	2	$360,000	$14,400	CCF67	2	$375,000	$15,000	14-11	2	$360,000	0.522%	$1,900	2	$0	$0	SI	$88,900
9	CC	1032440156	MULATO JOHANNA																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
10	CC	1116870617	PINEDA LEIDY																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
11	CC	96195669	PLAZAS JAVIER																23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
12	CC	96194837	SANABRIA DIEGO																25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
13	CC	1020483214	SANCHEZ YEFFERSON																23030 1	30	$2,200,000	$352,000	ESSC24	30	$2,200,000	$88,000	CCF67	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
14	CC	1094277845	USMA PEDRO		X													X	23030 1	15	$2,000,000	$320,000	EPS041	15	$2,000,000	$80,000	CCF67	15	$2,166,667	$86,700	14-11	15	$2,000,000	0.522%	$10,500	15	$0	$0	SI	$497,200
Total		**Afiliados(14)**																			$21,126,169	$3,380,400			$21,126,169	$845,300			$21,430,969	$857,600			$21,126,169		$111,100		$0	$0		$5,194,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$3,380,400	$0	$0	$3,380,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,193,600	$0	$0	$1,193,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,186,800	$0	$0	$2,186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$111,100	$0	$0	$111,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$111,100	$0	$0	$111,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$857,600	$0	$0	$857,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	14	$857,600	$0	$0	$857,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$845,300	$0	$0	$845,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$88,000	$0	$0	$88,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$457,600	$0	$0	$457,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$229,600	$0	$0	$229,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				14	$5,194,400	$0	$0	$5,194,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	643715170	9510996020	E	2026/06/09	2026/09/10	BANCO DAVIVIENDA	93	$505,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (2 Afiliados)																						$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,100			$1,925,996	$77,100			$1,925,996		$10,100		$0	$0		$472,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,100			$1,925,996	$77,100			$1,925,996		$10,100		$0	$0		$472,600
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																						$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,100			$1,925,996	$77,100			$1,925,996		$10,100		$0	$0		$472,600
1	CC	1085101153	CHEDRAGUI KEVIN	X																	23030 1	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF67	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	0.522%	$5,800	19	$0	$0	SI	$272,100
2	CC	1115726921	FLOREZ EYLEEN	X	X																25-14	14	$817,089	$130,800	EPS041	14	$817,089	$32,700	CCF67	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	0.522%	$4,300	14	$0	$0	SI	$200,500
Total			**Afiliados(2)**																			$1,925,996	$308,300			$1,925,996	$77,100			$1,925,996	$77,100			$1,925,996		$10,100		$0	$0		$472,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$308,300	$21,400	$0	$329,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$130,800	$9,100	$0	$139,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$177,500	$12,300	$0	$189,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,100	$700	$0	$10,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$10,100	$700	$0	$10,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$77,100	$5,400	$0	$82,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$77,100	$5,400	$0	$82,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$77,100	$5,400	$0	$82,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$32,700	$2,300	$0	$35,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,400	$3,100	$0	$47,500
TOTAL				2	$472,600	$32,900	$0	$505,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	357646579	9505893221	E	2026/06/09	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,656,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (22 Afiliados)																						$23,006,346	$3,681,700			$23,006,346	$921,100			$23,281,459	$932,200			$23,006,346		$121,600		$0	$0		$5,656,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (22 Afiliados)																						**$23,006,346**	**$3,681,700**			**$23,006,346**	**$921,100**			**$23,281,459**	**$932,200**			**$23,006,346**		**$121,600**		**$0**	**$0**		**$5,656,600**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (22 Afiliados)																						**$23,006,346**	**$3,681,700**			**$23,006,346**	**$921,100**			**$23,281,459**	**$932,200**			**$23,006,346**		**$121,600**		**$0**	**$0**		**$5,656,600**
1	CC	1116855322	AVILA CRISTIAN	X	X														X	23030 1	5	$291,818	$46,700	EPS04 1	5	$291,818	$11,700	CCF67	5	$303,977	$12,200	14-11	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	Si	$72,200
2	CC	60267178	AYA JULIETH																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS03 7	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
3	CC	1030589933	BASTOS OSCAR	X	X														X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS04 1	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,700
4	CC	1098758486	CAMARGO LEONARDO																	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS03 7	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
5	CC	1094279057	CAPACHO DALLY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	74321068	CORREDOR CARLOS	X	X														X	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS00 5	4	$233,454	$9,400	CCF67	4	$243,181	$9,800	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,900
7	CC	17549897	ENCISO BENIGNO	X	X														X	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS04 1	4	$233,454	$9,400	CCF67	4	$243,181	$9,800	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,900
8	CC	17549863	ESCOBAR DARIO		X														X	23030 1	14	$840,000	$134,400	EPS03 7	14	$840,000	$33,600	CCF67	14	$887,500	$35,500	14-11	14	$840,000	0.522%	$4,400	14	$0	$0	Si	$207,900
9	CC	1026264930	GARCIA DENNIS	X	X														X	23030 1	5	$291,818	$46,700	EPS04 1	5	$291,818	$11,700	CCF67	5	$303,977	$12,200	14-11	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	Si	$72,200
10	CC	1116854779	GARZON KELMAN	X	X														X	23030 1	5	$291,818	$46,700	EPS04 1	5	$291,818	$11,700	CCF67	5	$303,977	$12,200	14-11	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	Si	$72,200
11	CC	96190266	GUTIERREZ YEBRAIL	X	X														X	23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS03 7	4	$233,454	$9,400	CCF67	4	$243,181	$9,800	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,900
12	CC	1110495867	HERREÑO EDUARDO		X														X	25-14	14	$2,520,000	$403,200	EPS03 7	14	$2,520,000	$100,800	CCF67	14	$2,662,500	$106,500	14-11	14	$2,520,000	0.522%	$13,200	14	$0	$0	Si	$623,700
13	CC	1032440156	MULATO JOHANNA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
14	CC	1116870617	PINEDA LEIDY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
15	CC	96195669	PLAZAS JAVIER																	23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS03 7	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
16	CC	88224569	RINCON EDWIN	X	X														X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS04 1	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,700
17	CC	96192939	RODRIGUEZ KEWIN	X	X														X	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS00 5	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,700
18	CC	96194837	SANABRIA DIEGO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
19	CC	1020483214	SANCHEZ YEFFERSON																	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	ESSC2 4	30	$2,200,000	$88,000	CCF67	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
20	CC	1116858242	SARMIENTO HERMEN	X	X														X	23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS03 7	4	$233,454	$9,400	CCF67	4	$243,181	$9,800	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,900
21	CC	1010187239	TABARES DARWING	X	X														X	23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS03 7	1	$58,364	$2,400	CCF67	1	$60,796	$2,500	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,700
22	CC	1094277845	USMA PEDRO	X																23030 1	15	$2,000,000	$320,000	EPS04 1	15	$2,000,000	$80,000	CCF67	15	$2,000,000	$80,000	14-11	15	$2,000,000	0.522%	$10,500	15	$0	$0	Si	$490,500
Total	**Afiliados(22)**																					$23,006,346	$3,681,700			$23,006,346	$921,100			$23,281,459	$932,200			$23,006,346		$121,600		$0	$0		$5,656,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$3,681,700	$0	$0	$3,681,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,414,200	$0	$0	$1,414,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,258,100	$0	$0	$2,258,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$121,600	$0	$0	$121,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$121,600	$0	$0	$121,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$932,200	$0	$0	$932,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	22	$932,200	$0	$0	$932,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$921,100	$0	$0	$921,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$88,000	$0	$0	$88,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$481,700	$0	$0	$481,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$269,500	$0	$0	$269,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$81,900	$0	$0	$81,900
TOTAL				22	$5,656,600	$0	$0	$5,656,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	643703759	9510995427	E	2026/05/11	2026/09/10	BANCO DAVIVIENDA	122	$78,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (1 Afiliados)																						$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$1,600		$0	$0		$71,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$1,600		$0	$0		$71,700
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																						$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$1,600		$0	$0		$71,700
1	CC	1115726921	FLOREZ EYLEEN	X	X															25-14	5	$291,818	$46,700	EPS04	5	$291,818	$11,700	CCF67	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	SI	$71,700
Total Afiliados(1)																						$291,818	$46,700			$291,818	$11,700			$291,818	$11,700			$291,818		$1,600		$0	$0		$71,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,700	$4,200	$0	$50,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$46,700	$4,200	$0	$50,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$200	$0	$1,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,600	$200	$0	$1,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$1,100	$0	$12,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$11,700	$1,100	$0	$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$1,100	$0	$12,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$11,700	$1,100	$0	$12,800
TOTAL				1	$71,700	$6,600	$0	$78,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900885335	4	TAS SOLUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	CRA 28 13 12 VILLA GABRIELA	TAME-ARAUCA	8886645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	268193841	9504149277	E	2026/05/11	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,110,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (11 Afiliados)																						$16,756,351	$2,681,200			$16,756,351	$670,400			$16,756,351	$670,400			$16,756,351		$88,000		$0	$0		$4,110,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (11 Afiliados)																						$16,756,351	$2,681,200			$16,756,351	$670,400			$16,756,351	$670,400			$16,756,351		$88,000		$0	$0		$4,110,000
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (11 Afiliados)																						$16,756,351	$2,681,200			$16,756,351	$670,400			$16,756,351	$670,400			$16,756,351		$88,000		$0	$0		$4,110,000
1	CC	60267178	AYA JULIETH																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
2	CC	1098758486	CAMARGO LEONARDO																	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
3	CC	1094279057	CAPACHO DALLY	X																23030 1	23	$1,342,361	$214,800	EPS041	23	$1,342,361	$53,700	CCF67	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	0.522%	$7,100	23	$0	$0	SI	$329,300
4	CC	17549863	ESCOBAR DARIO	X																23030 1	5	$300,000	$48,000	EPS037	5	$300,000	$12,000	CCF67	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$300,000	0.522%	$1,600	5	$0	$0	SI	$73,600
5	CC	1110495867	HERREÑO EDUARDO	X																25-14	5	$900,000	$144,000	EPS037	5	$900,000	$36,000	CCF67	5	$900,000	$36,000	14-11	5	$900,000	0.522%	$4,700	5	$0	$0	SI	$220,700
6	CC	1032440156	MULATO JOHANNA	X																23030 1	17	$992,180	$158,800	EPS041	17	$992,180	$39,700	CCF67	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	0.522%	$5,200	17	$0	$0	SI	$243,400
7	CC	1116870617	PINEDA LEIDY	X																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
8	CC	96195669	PLAZAS JAVIER																	23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF67	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
9	CC	96194837	SANABRIA DIEGO																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF67	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
10	CC	1020483214	SANCHEZ YEFFERSON	X																23030 1	18	$1,320,000	$211,200	ESSC24	18	$1,320,000	$52,800	CCF67	18	$1,320,000	$52,800	14-11	18	$1,320,000	0.522%	$6,900	18	$0	$0	SI	$323,700
11	CC	1094277845	USMA PEDRO		X															23030 1	15	$2,000,000	$320,000	EPS041	15	$2,000,000	$80,000	CCF67	15	$2,000,000	$80,000	14-11	15	$2,000,000	0.522%	$10,500	15	$0	$0	SI	$490,500
Total		**Afiliados(11)**																				$16,756,351	$2,681,200			$16,756,351	$670,400			$16,756,351	$670,400			$16,756,351		$88,000		$0	$0		$4,110,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$2,681,200	$0	$0	$2,681,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,080,200	$0	$0	$1,080,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,601,000	$0	$0	$1,601,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$88,000	$0	$0	$88,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$88,000	$0	$0	$88,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$670,400	$0	$0	$670,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	11	$670,400	$0	$0	$670,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$670,400	$0	$0	$670,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,800	$0	$0	$52,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$374,100	$0	$0	$374,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$173,400	$0	$0	$173,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				11	$4,110,000	$0	$0	$4,110,000

2450

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

FACTURA, RESOLUCION DIAN, CERTIFICACIÓN BANCARIA Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO.

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549
"Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos"

2451

TAS
SOLUCIONES S.A.S
NIT: 900885335-4

TAS
SOLUCIONES S.A.S

Tame, septiembre 21 de 2026

SEÑORES
MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
Ciudad

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONSIGNACIÓN CUENTA BANCARIA

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para autorizar la consignación los recursos correspondientes del contrato de suministro No.196 de 2026 con objeto: APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTÁREAS DE LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.". A la cuenta de CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No. 506469997957 a nombre de la empresa TAS SOLUCIONES S.A.S NIT.900885335-4.

Quedo atenta a cualquier sugerencia o inquietud.

Atentamente,

JULIETH PAOLA AYA RODRIGUEZ
R/L TAS SOLUCIONES S.A.S

Dirección: Carrera 28 # 13 - 12 Barrio Villa gabriela Tame, Arauca
Email: tassolucioness.a.s.@gmail.com
Movil: 3102316549
"Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos"

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 06/04/2026

Dirigido a : .

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TAS SOLUCIONES S A S** con NIT **900.885.335-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 506469997957

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, septiembre 17 de 2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAME

C E R T I F I C A QUE

TAS SOLUCIONES SAS
R/L: Paola Aya Rodríguez
NIT. 900.885.335-4

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
TAME

HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1cfe43ceacad25a769b1ecd3cbe8b021255558d5ca2bd693415099b90d97db8d98134d21142beeca55798101b05f1b9

Número de Factura: FETA-1
Fecha de Emisión: 02/10/2026
Fecha de Vencimiento: 05/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TAS.SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: TAS.SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900885335
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CR 28 13 12 BRR VILLA GABRIELA
Teléfono / Móvil: 3102316549
Correo: tassolucioness.a.s@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CL 15 N 14-20
Teléfono / Móvil: 8886394
Correo: hacienda@tame-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000111	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No196 de 2026 con objeto APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 19 HECTAREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA DE CACAO PARA LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA	NIU	1,00	$ 180.194.188,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.236.895,76	19.00			$ 180.194.188,24

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/10/2026 15:23:29
Documento validado por la DIAN:
02/10/2026 15:23:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	180194188.24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180194188.24
IVA	34236895.76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	34236895.76
Total neto factura (=)	214431084
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 214431084

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	180.194.188,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.194.188,24
IVA	34.236.895,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.236.895,76
Total neto factura (=)	214.431.084,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 214.431.084,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764116588467 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-10-02
