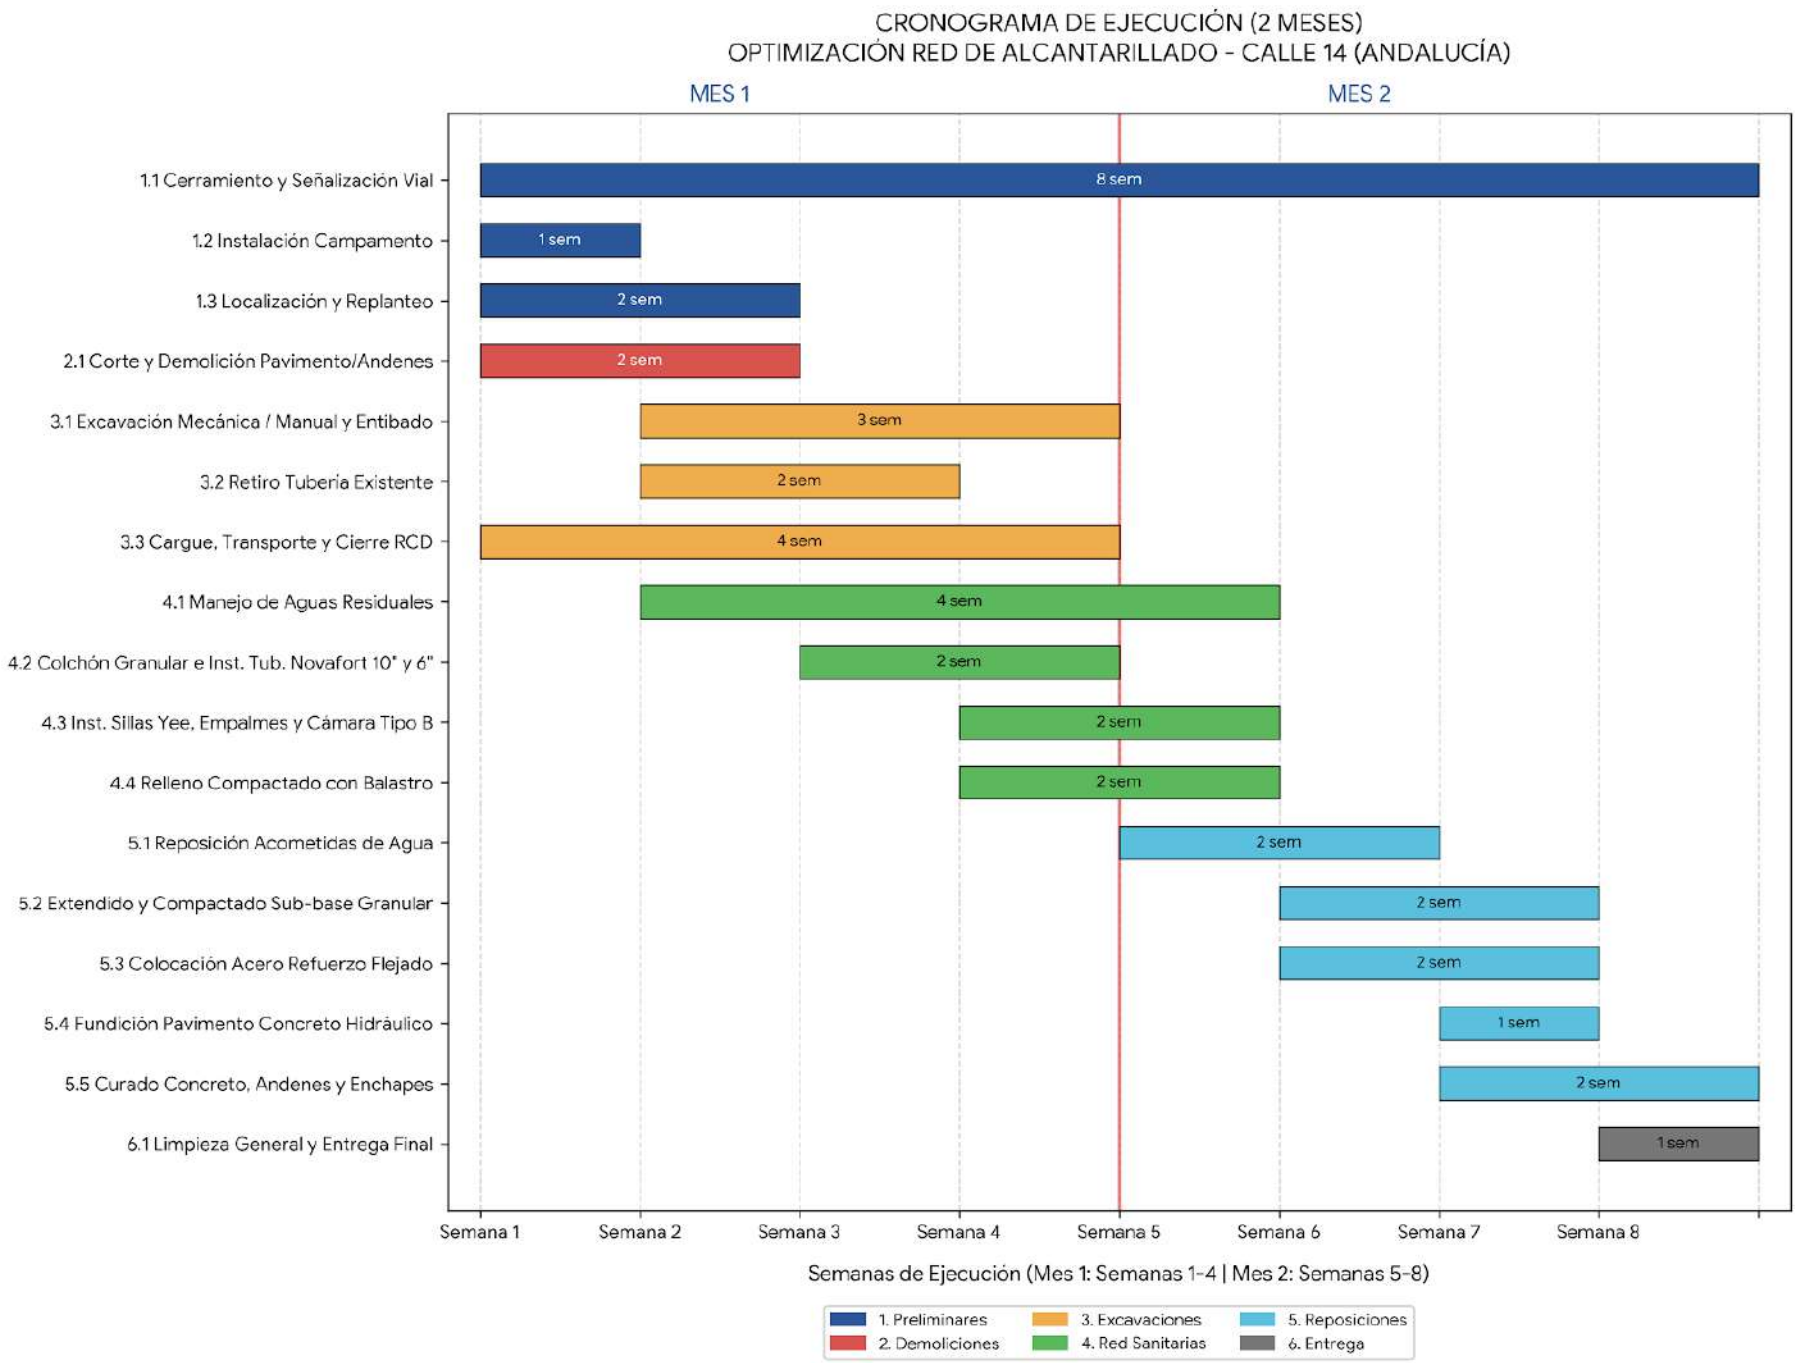

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (2 MESES)
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO - CALLE 14 (ANDALUCÍA)
MES 1
MES 2
1.1 Cerramiento y Señalización Vial
8 sem
1.2 Instalación Campamento
1 sem
1.3 Localización y Replanteo
2 sem
2.1 Corte y Demolición Pavimento/Andenes
2 sem
3.1 Excavación Mecánica / Manual y Entibado
3 sem
3.2 Retiro Tubería Existente
2 sem
3.3 Cargue, Transporte y Cierre RCD
4 sem
4.1 Manejo de Aguas Residuales
4 sem
4.2 Colchón Granular e Inst. Tub. Novafort 10" y 6"
2 sem
4.3 Inst. Sillas Yee, Empalmes y Cámara Tipo B
2 sem
4.4 Relleno Compactado con Balastro
2 sem
5.1 Reposición Acometidas de Agua
2 sem
5.2 Extendido y Compactado Sub-base Granular
2 sem
5.3 Colocación Acero Refuerzo Flejado
2 sem
5.4 Fundición Pavimento Concreto Hidráulico
1 sem
5.5 Curado Concreto, Andenes y Enchapes
2 sem
6.1 Limpieza General y Entrega Final
1 sem
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semanas de Ejecución (Mes 1: Semanas 1-4 | Mes 2: Semanas 5-8)
1. Preliminares
2. Demoliciones
3. Excavaciones
4. Red Sanitarias
5. Reposiciones
6. Entrega
