
ADICIÓN CONVENIO 2988 - 2024

Nota: Diagrama que refleja la planeación de los municipios adicionados dentro del Modificatorio 6, prorroga 2 y adición 01, dado que las actividades de los Municipios de Pandi y El Colegio dentro del convenio inicial ya están finalizados.

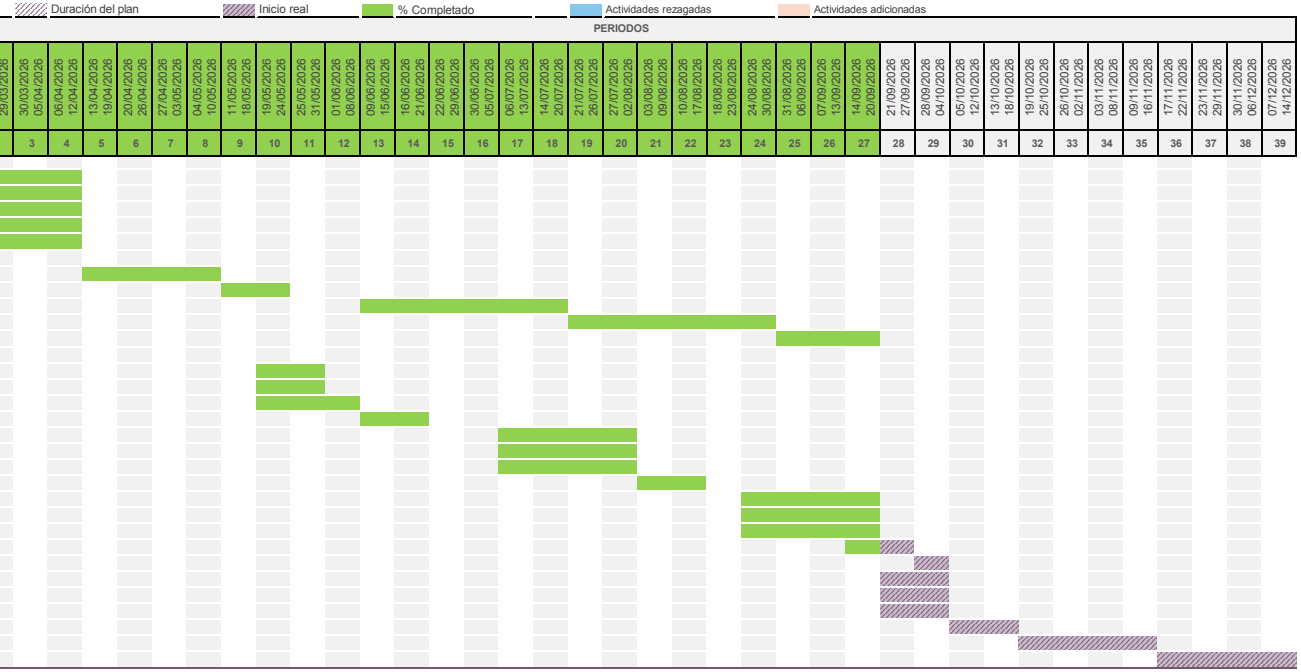

	ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO
FASE 1	PREOPERATIVA					
	Validación inventario de trámites	1	4	1	4	100,0%
	Priorización por impacto	1	4	1	4	100,0%
	Programación de visitas	1	4	1	4	100,0%
	Cruce cartográfico preliminar	1	4	1	4	100,0%
	Plan operativo por municipio	1	4	1	4	100,0%
FASE 2	BARRIDO PREDIAL					
	Socialización Inicial	5	4	5	4	100,0%
	Ejecución operativa Etapa 1 (243 trámites)	9	2	9	2	100,0%
	Ejecución operativa Etapa 2 (852 trámites)	13	6	13	6	100,0%
	Ejecución operativa Etapa 3 (852 trámites)	19	6	19	6	100,0%
	Ejecución operativa Etapa 4 (487 trámites)	25	3	25	3	100,0%
FASE 3	CONSERVACIÓN					
	Validaciones topológicas Etapa 1	10	2	10	2	100,0%
	Revisión técnico-jurídica Etapa 1	10	2	10	2	100,0%
	Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Eta	10	3	10	3	100,0%
	Vía gubernativa Etapa 1	13	2	13	2	100,0%
	Validaciones topológicas Etapa 2	17	4	17	4	100,0%
	Revisión técnico-jurídica Etapa 2	17	4	17	4	100,0%
	Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Eta	17	4	17	4	100,0%
	Vía gubernativa Etapa 2	21	2	21	2	100,0%
	Validaciones topológicas Etapa 3	24	4	24	4	100,0%
	Revisión técnico-jurídica Etapa 3	24	4	24	4	100,0%
	Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Eta	24	4	24	4	100,0%
	Vía gubernativa Etapa 3	27	2	27	2	50,0%
	Ejecución de támite de oficina Etapa 5	29	1	29	1	0,0%
	Validaciones topológicas Etapa 4 y 5	28	2	28	2	0,0%
	Revisión técnico-jurídica Etapa 4 y 5	28	2	28	2	0,0%
	Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Eta	28	2	28	2	0,0%
	Vía gubernativa Etapa 4 y 5	30	2	30	2	0,0%
	Socialización de cierre	32	4	32	4	0,0%
	Consolidación e informe final	36	4	36	4	0,0%

ANGELA MILENA PINEDA ROJAS
SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN ACTUALIZACION Y FORMACIÓN

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
SUPERVISION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Proyecto: RHONAL DONATO CAF/ACC
Proyecto: Julian David Villamil Rubiano - DOT
Reviso: Erika Andrea Oliveros Roa - DOT
Reviso: Karen Franco - DOT
