
CONTRATO DE INTERVENTORIA
084-2025 INT (119251)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

| ELABORO | APROBÓ |
|---|---|
|  |  |
| MARIA AUXILIADORA CARDENAS LIZARAZO<br>Residente de Interventoría | FRANCISCO JAVIER GUEVARA MÉNDEZ<br>Representante Legal Interventoría |

INFORME TÉCNICO MENSUAL 1
PERIODO: 02/ ABRIL/25 AL 30/ABRIL/25
VERSIÓN 0

# TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Componente técnico: Descripción de actividades Contratista
3. Actividades ejecutadas por interventoría.
4. Segmentos viales contractuales
5. Comité de obra
6. Ítems No Previstos
7. Correspondencia
8. Registro fotográfico
9. Conclusiones y Recomendaciones
10. Anexos
    - Informes semanales
    - Informe ejecutivo
    - Actas de comité
    - Informe tecnico del contratista

# 1. INTRODUCCIÓN

El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local se ha venido encargando de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa “Mejor Movilidad para Todos” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de los ciudadanos; dada esta iniciativa de brindar un mejor estado de nuestras vías el FDLS durante el año 2023 optó por invertir en un nuevo proyecto de construcción de segmentos viales bajo el contrato de obra 460-2023.

El contrato 1010-2024 cuyo objeto contractual es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. A la fecha de este informe inició actividades en Casablanca, Parque Piloto, Niza sur, Potosí, Bochalema y Costa azul. El contratista Consorcio Conservación PG cuenta con un plazo de 10 meses para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 02/abril/2025. El valor total del contrato en mención es igual a TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 13.033.377.846,00) M/CTE.

## 2. COMPONENTE TÉCNICO

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista durante el lapso de tiempo correspondiente a este informe:

- Se realiza recorrido de verificación de frentes de obra y se toma el respectivo registro de estos.

**CASABLANCA**

**11005566, 11014376, 11005623, 11005728 Y 11005765**






Durante el mes de abril se llevaron a cabo actividades de:


- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.
- ✔ Inspección de redes.
- ✔ Levantamiento topográfico.

# TIBABUYES


**11006438, 11011976, 11011977, 11006546, 11011978, 11006617.**

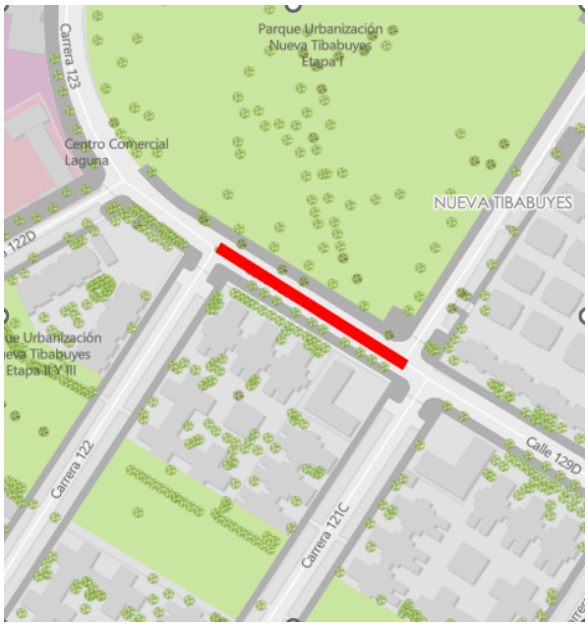

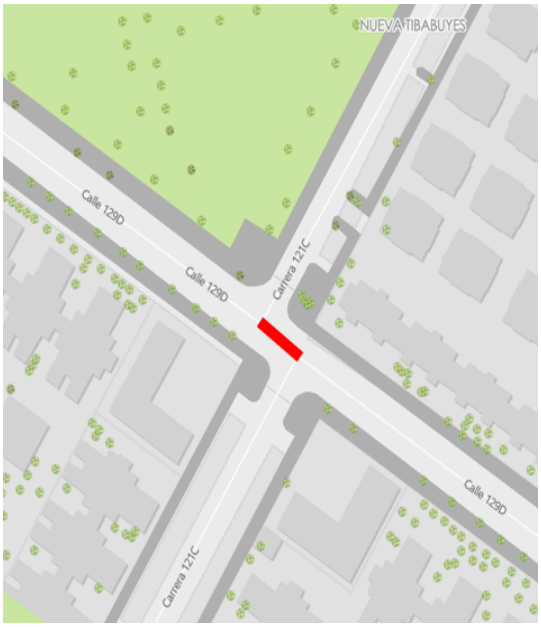

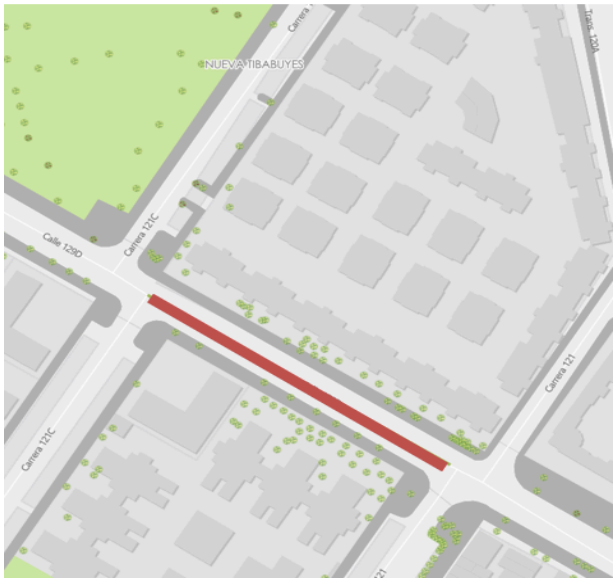

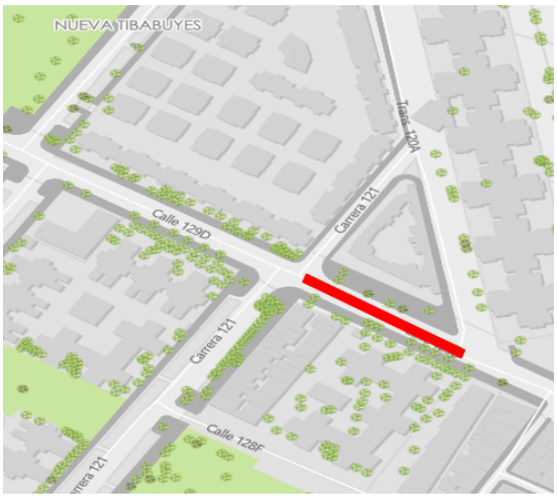

- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.
- ✔ Inspección de redes.

**COSTA AZUL**


**11005215**




- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.
- ✔ Inspección de redes.
- ✔ Levantamiento topográfico.

## POTOSI


**11011188**

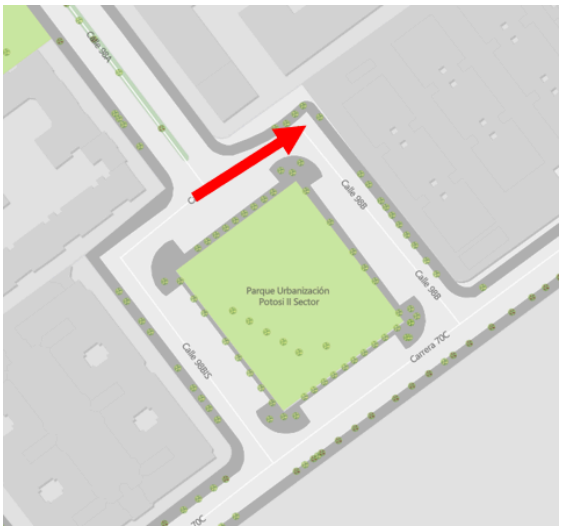


- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.

## BOCHALEMA

**11004156, 11013439, 11004110, 11004080**

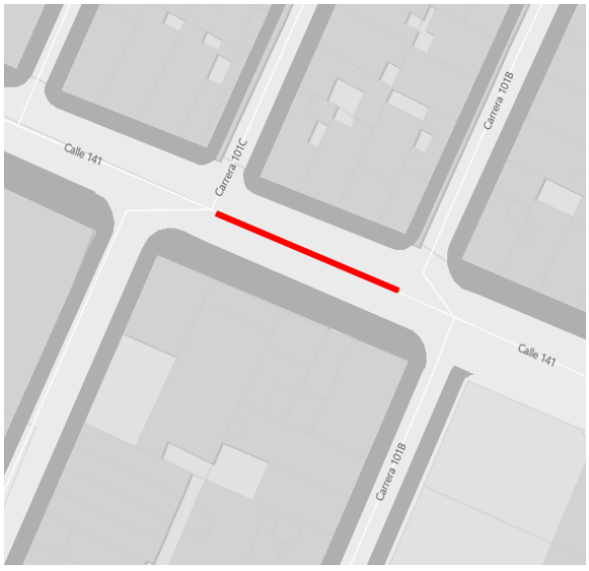













- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.
- ✔ Inspección de redes.
- ✔ Levantamiento topográfico.

**NIZA SUR**

**11010613, 11010621**

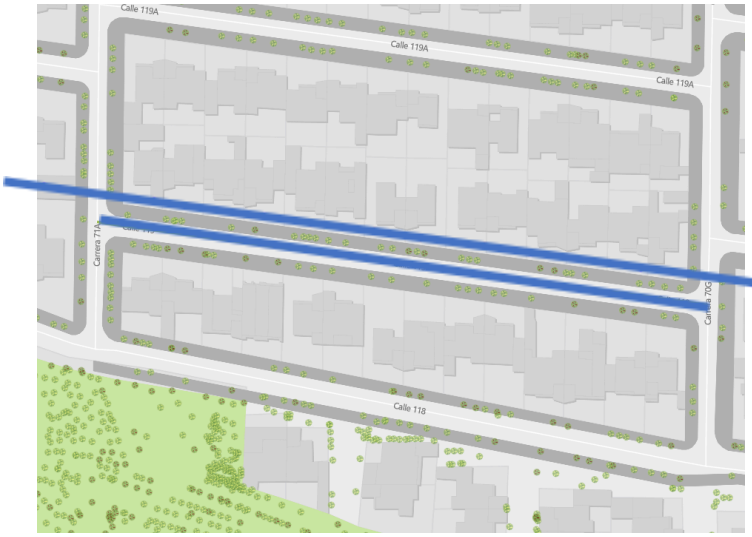

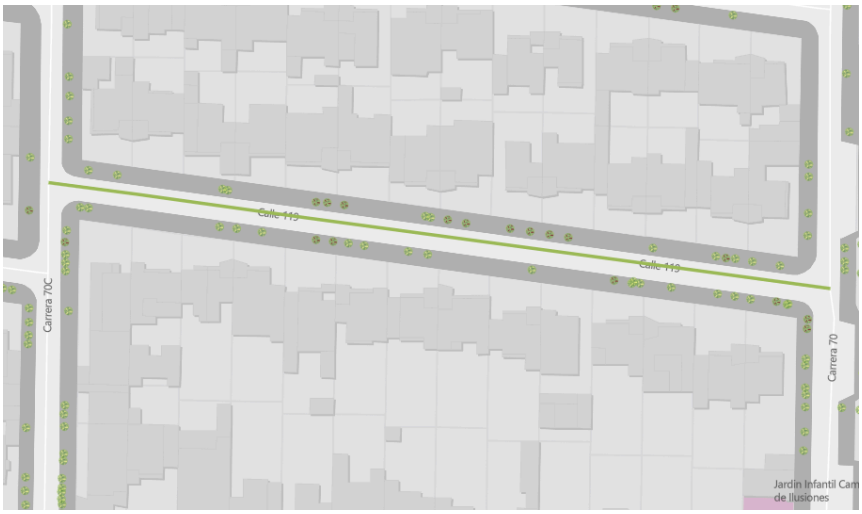
- ✔ Auscultación con el fin de extraer las muestras correspondientes para el estudio de suelos.
- ✔ Inspección de redes.
- ✔ Levantamiento topográfico.

**SUBA CENTRO**

**11005331**




✔ En este frente de obra se realiza visita de verificación sin embargo teniendo en cuenta el transito de SITP y el ancho reducido de la via no se pudo realizar actividades a la fecha.

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

Durante este periodo la interventoría realizo las siguientes actividades:

- Acompañamiento topográfico a todas las actividades realizadas por el contratista.
- Recorrido de los componentes para verificación de actividades y de los implementos necesarios para el inicio de obra.
- Solicitud de documentación requerida para el desarrollo eficaz del contrato.

## 4. SEGMENTOS VIALES CONTRACTUALES

| N° | ID | CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11014399 | 91013890 | CALZADA | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS | SAN FRANCISCO |
| 2 | 5 | 11014396 | 91013885 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A | SAN FRANCISCO |
| 3 | 6 | 11014397 | 91013842 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO | SAN FRANCISCO |
| 4 | 7 | 1100643 | 173503 | CALZADA | CLL 129 | KR 1222 | KR 121 C | TIBABUYES |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | | | D | | | |
| **5** | 8 | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | TIBABUYES |
| **6** | 9 | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | TIBABUYES |
| **7** | 10 | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | TIBABUYES |
| **8** | 11 | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | TIBABUYES |
| **9** | 12 | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | TIBABUYES |
| **10** | 18 | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | POTOSI |
| **11** | 19 | 11006116 | 53781 | CALZADA | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 | LA CHUCUA |
| **12** | 20 | 11004672 | 173797 | CALZADA | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | EL POA |
| **13** | 27 | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | COSTA AZUL |
| **14** | 28 | 11008694 | 167909 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE |
| **15** | 29 | 11010147 | 167437 | CALZADA | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO |
| **16** | 34 | 11004156 | 173807 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | EL POA |
| **17** | 35 | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | EL POA |
| **18** | 36 | 11004110 | 173808 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | EL POA |
| **19** | 37 | 11004080 | 173809 | CALZADA | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | EL POA |
| **20** | 49 | 11005418 | 171265 | CALZADA | CLL 145 A | CRA 90 A | CRA 91 | SUBA CENTRO |
| **21** | 50 | 11005417 | 171267 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO NORTE | SUBA CENTRO |
| **22** | 51 | 11005536 | 171266 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO SUR | SUBA CENTRO |
| **23** | 52 | 11005794 | 172488 | CALZADA | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | LA CHUCUA |
| **24** | 53 | 11003955 | 176248 | CALZADA | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | LA CAMPIÑA |
| **25** | 66 | 11010612 | 168694 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR |
| **26** | 73 | 11009243 | 170403 | CALZADA | CL 128B | KR 84C | KR 85 | CIUDAD HUNZA |
| **27** | 74 | 1100918 | 170384 | CALZADA | CL 128B | KR 84 | KR 84A | CIUDAD HUNZA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | | | | |
| **28** | 75 | 11009224 | 170385 | CALZADA | CL 128B | KR 84B | KR 84A | CIUDAD HUNZA |
| **29** | 76 | 11009242 | 170386 | CALZADA | CL 128B | KR 84C | KR 84B | CIUDAD HUNZA |
| **30** | 83 | 11013565 | 52298 | ANDEN | TV 94 | CL 129A | CL 129B | EL RINCÓN |
| **31** | 84 | 11008140 | 52290 | ANDEN | TV 94 | KR 93D BIS A | KR 93D | EL RINCÓN |
| **32** | 85 | 11008154 | 52288 | ANDEN | TV 94 | CL 128D | KR 93D BIS A | EL RINCÓN |
| **33** | 86 | 11008062 | 52294 | ANDEN | DG 129B BIS | KR 93C | KR 93B | EL RINCÓN |
| **34** | 87 | 11007844 | 51210 | ANDEN | CL 130D | KR 88C | KR 88B | TABERIN |
| **35** | 88 | 11007885 | 51745 | ANDEN | KR 89 | CL 130B BIS | CL 130C | NARANJOS |
| **36** | 89 | 11006690 | 52944 | ANDEN | CL 132C | KR 92A | KR 93 BIS | VILLA ELISA |
| **37** | 90 | 11006280 | 52970 | ANDEN | CL 135 | KR 94C | KR 94F | VILLA ELISA |
| **38** | 91 | 11004054 | 56027 | ANDEN | KR 111A | CL 139 | CL 140 | LAS FLORES |
| **39** | 92 | 11009644 | 515990 | ANDEN | CL 129 | KR 56 | KR 56A | PRADO VERANIEGO |
| **40** | 93 | 11009650 | 515930 | ANDEN | CL 129 | AK 55 | KR 55B | PRADO VERANIEGO |
| **41** | 94 | 11009653 | 515910 | ANDEN | CL 129 | KR 55 B | KR 55B | PRADO VERANIEGO |
| **42** | 95 | 11010114 | 45831 | ANDEN | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | PRADO VERANIEGO |
| **43** | 104 | 11004461 | 56171 | ANDEN | TV 126 | CL 134 | CL 135B | LA GAITANA |
| **44** | 109 | 11005104 | 55555 | ANDEN | CL 124 | CL 132C BIS | CL 132D | LA GAITANA |
| **45** | 110 | 11014679 | 55494 | ANDEN | CL 132D | KR 118 | KR 124 | LA GAITANA |
| **46** | 111 | 11005262 | 173654 | ANDEN | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | LA GAITANA |
| **47** | 112 | 11007171 | 53561 | ANDEN | KR 100A | CL 130 | CL 130C | LAGO DE SUBA |
| **48** | 113 | 11007373 | 53559 | ANDEN | KR 100A | CL 129C | CL 130 | LAGO DE SUBA |
| **49** | 114 | 11007426 | 52761 | ANDEN | CL 129C | KR 99A | KR 100A | LAGO DE SUBA |
| **50** | 115 | 1100649 | 54069 | ANDEN | KR 102 | CL 131 | CL 131B | AURES |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | | | | | | |
| **51** | 116 | 11007528 | 53375 | ANDEN | TV 102A | CL 128C | CL 128B | EL RINCÓN |
| **52** | 117 | 11008687 | 51343 | ANDEN | CL 128BIS | KR 93D | KR 93A | EL RINCÓN |
| **53** | 118 | 11008803 | 51341 | ANDEN | CL 128BIS | KR 93A | KR 93 | EL RINCÓN |
| **54** | 119 | 11004800 | 55745 | ANDEN | CL 140A | KR 100 | KR 100A | EL POA |
| **55** | 120 | 11004755 | 55781 | ANDEN | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| **56** | 121 | 11004799 | 55734 | ANDEN | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| **57** | 122 | 11007176 | 52412 | ANDEN | CL 130C | KR 98 | KR 98A | AURES |
| **58** | 123 | 11007276 | 92074905 | ANDEN | KR 97 | CL 130B | CL 130C | AURES |
| **59** | 127 | 11009086 | 50696 | ANDEN | CL 128B | CL 87D | CL 88 | CIUDAD HUNZA |
| **60** | 128 | 11009172 | 50604 | ANDEN | KR 86B | CL 128B | CL 128B BIS | CIUDAD HUNZA |
| **61** | 129 | 11009208 | 50602 | ANDEN | KR 86B | CL 128 | CL 128B | CIUDAD HUNZA |
| **62** | 130 | 11008562 | 92064676 | ANDEN | KR 84A | CL 129A | CL 129C | CIUDAD HUNZA |
| **63** | 131 | 11008818 | 51476 | ANDEN | KR 93 | CL 128BIS | CL 128BIS | EL RINCÓN |
| **64** | 132 | 11014651 | 55697 | ANDEN | CL 136A | KR 112 | KR 118 | VILLA MARIA I |
| **65** | 139 | 11008662 | 46033 | ANDEN | KR 53 | CL 135 | CL 136 | PRADO VERANIEGO |
| **66** | 140 | 11008527 | 45971 | ANDEN | CL 136 | KR 53 | KR 53B | PRADO VERANIEGO |
| **67** | 141 | 11008663 | 45956 | ANDEN | CL 135 | KR 53 | KR 53B | PRADO VERANIEGO |
| **68** | 142 | 11004683 | 173291 | CALZADA | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | VILLA MARIA I |
| **69** | 144 | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B | SUBA CENTRO |
| **70** | 152 | 11003803 | 171249 | CALZADA | CL 148 | KR 91 | KR 92 | LA CAMPIÑA |
| **71** | 153 | 11010414 | 167430 | CALZADA | KR 51A | CL 127 | CL 127A | ATABANZA |
| **72** | 154 | 11010586 | 167135 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | 155 | 11010578 | 167136 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| **74** | 156 | 11010602 | 167018 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| **75** | 157 | 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| **76** | 158 | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A | NIZA SUR |
| **77** | 159 | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C | NIZA SUR |
| **78** | 160 | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL 146F | KR 75 | KR 74 | CASABLANCA |
| **79** | 161 | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F | KR 74 | KR 73A | CASABLANCA |
| **80** | 162 | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL 146F | KR 73A | KR 73 | CASABLANCA |
| **81** | 163 | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR 73 | KR 72C | CASABLANCA |
| **82** | 164 | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA |

## PRIORIZACION 1

| PRIORIZACION | CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | POTOSI | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | COSTA AZUL | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11004156 | 173807 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | BOCHALEMA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | BOCHALEMA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11004110 | 173808 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 | KR 102 | BOCHALEMA | MANTENIMIENTO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | C | | | PERIÓDICO |
| 1 | 11004080 | 173809 | CALZADA | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | BOCHALEMA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 1 | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL 146F | KR 75 | KR 74 | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F | KR 74 | KR 73A | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL 146F | KR 73A | KR 73 | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR 73 | KR 72C | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| 1 | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |

## PRIORIZACION 2

| CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11008694 | 167909 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11010147 | 167437 | CALZADA | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11010612 | 168694 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11004683 | 173291 | CALZADA | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | VILLA MARIA I | RECONSTRUCCIÓN |
| 11010586 | 167135 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| 11010578 | 167136 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| 11010602 | 167018 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |

## 5. COMITES DE OBRA

| FECHA | TEMA |
|---|---|
| 04/04/25 | Comité Integral |
| 11/04/23 | Comité Integral |
| 25/12/23 | Comité Integral |

## 6. ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo por parte del contratista de obra se remitieron para aprobación 2 ítems No Previstos:

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 8002 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADOENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCLUYE IVA. | $20.205 |
| 8003 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADOENTRE 18" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA IDONEA, SEÑALIZACION BASICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA, INCLUYE IVA. | $21.734 |

Es preciso aclarar que estos no han sido aprobados, porque nos encontramos a la espera de la remisión de los APUs contractuales.

# 7. CORRESPONDENCIA

## ❖ CORRESPONDENCIA ENVIADA

| FECHA | REFERENCIA | RADICADO | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE | COMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-001 | **2025-611-0074422** | Presentacion a la alcaldia para notificaciones y comunicaciones dirigida a la interventoria torres y asociados | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **ADMINISTRATIVO** |
| 10/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-002 | | Propuesta diseño de marcacion dotacion | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | PRENSA ALCALDIA Prensa.suba@gobiernobogota.gov.co | **ADMINISTRATIVO** |
| 10/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-003 | **2025-611-008722-2** | Remisión Acta de Inicio INTV | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **ADMINISTRATIVO** |
| 10/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-004 | | Presentacion al contratista para notificaciones y comunicaciones dirigida a la interventoria torres y asociados | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **ADMINISTRATIVO** |
| 10/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-005 | **2025-611-008723-2-20256110089502** | Presentacion a la alcaldia para notificaciones y comunicaciones del contratista de obra | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **ADMINISTRATIVO** |
| 15/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-006 | **2025-611-007685-2** | Revisión hojas de vida contratista (12 hv) | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SST-A** |
| 15/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-007 | | Revision plan de dialogo ciudadano | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SOCIAL** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-009 | | Entrega de proyección del arte de la valla móvil y punto PAC | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | PRENSA ALCALDIA Prensa.suba@gobiernobogota.gov.co | **SOCIAL** |
| 15/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-010 | **20256110091632** | Remision polizas anexo 1 acta de inicio CONTRATO DE OBRA 1010-2024-LP (119226) | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **ADMINISTRATIVO** |
| 15/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-011 | | SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO Y VACTOR EAAB | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | EAAB Rciro@acueducto.com.co | **TECNICO** |
| 16-04-2025 | TYA-FDLS-084-2025-012 | | Revision SST | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SST-A** |
| 16/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-013 | | REVISIÓN Y OBSERVACIONES PMT 6 TRAMOS | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **PMT** |
| 22/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-014 | | REVISION PLAN DE CALIDAD | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SST-A** |
| 22/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-015 | | solicitud componente SST | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SST-A** |
| 22-04-2025 | TYA-FDLS-084-2025-016 | **20256110094302** | REMISION HV INTERVENTORIA | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **TECNICO** |
| 24/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-017 | **20256110099582** | REMISION PLAN DE CALIDAD INTERVENTORÍA CTO-084-2025 | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **SST-A** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-018 | | Revisión maquinaria mínima 1 | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **SST-A** |
| 24/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-020 | | APROBACION PMT | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **PMT** |
| 25-04-2025 | TYA-FDLS-084-2025-021 | **20256110099602** | Remision polizas anexo 1 Y 2 acta de inicio CONTRATO DE INTERVENTORIA | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **ADMINISTRATIVO** |
| 25/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-022 | | OBSERVACIONES PLAN AMBIENTAL | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG info@promotorapuga.com | **AMBIENTAL** |
| 25/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-023 | **20256110099612** | REMISIÓN INFORMES SEMANALES 1-3 | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | FNDLS-INFRAESTRUCTURA | **TECNICO** |
| 29/04/2025 | TYA-FDLS-084-2025-024 | | IDIGER- Solicitud de visita técnica de valoración de la condición de riesgos inminente para CIV 11004683 Villa María 1 – Localidad SUBA | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | radicacionentradas@idiger.gov.co | **TECNICO** |



## ❖ CORRESPONDENCIA RECIBIDA


| FECHA | REFERENCIA | ASUNTO | ENVÍA | RECIBE | RESPUESTA | COMMPONENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/04/2025 | D-20-2025-50 | CORREOS PARA NOTIFICACION DE CORRESPONDENCIA Y NUMEROS DE CONTACTO PROFESIONALES | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-004** | **ADMINISTRATIVO** |
| 10/04/2025 | D-21-2025-50 | HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO REQUERIDO COP | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-006** | **SSTA** |
| 10/04/2025 | D-22-2025-50 | MAQUINARIA | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-018** | **SSTA** |
| 10/04/2025 | D-24-2025-50 | AMBIENTAL Y SST | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-012** | **SSTA** |
| 10/04/2025 | D-25-2025-50 | PLAN DE DIALOGO CIUDADANO | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-007** | **SOCIAL** |
| 10/04/2025 | D-26-2025-50 | PLAN DE CALIDAD | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-014** | **SSTA** |
| 10/04/2025 | EMAIL CONSORCIO PG 10/4/2025 | PMT 6 TRAMOS | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-013** | **PMT** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | D-23-2025-50 | HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-006** | **TECNICO** |
| 15/04/2025 | D-27-2025-50 | POLIZAS ACTA DE INICIO COP | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-010** | **ADMINISTRATIVO** |
| 15/04/2025 | EMAIL CONSORCIO PG | Entrega de proyección del arte de la valla móvil y punto PAC | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA- FDLS -084-2025-009** | **SOCIAL** |
| 16/04/2025 | D-28-2025-50 | Solicitud analisis NP para lavado y sondeo de tuberias de alcantarillado | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | | **TECNICO** |
| 22/04/2025 | D-30-2025-50 | Rta comunicado TYA-FDLS-084-2025-007 subsanación observaciones plan de dialogo ciudadano | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | | **SOCIAL** |
| 23/04/2025 | D-31-2025-50 | Rta comunicado TYA-FDLS-084-2025-013 del 16/04/2025 (observaciones al PMT) | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **TYA-FDLS-084-2025-020** | **PMT** |
| 24/04/2025 | D-32-2025-50 | REDICACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO SECRETARIA DE MOVILIDAD | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | **INFORMATIVO** | **PMT** |
| 24/04/2025 | D-33-2025-50 | PMT PROPUESTAS SUBA CENTRO Y PARQUE PILOTO (REUNION DE TRANSMILENIO) | Representante Legal Luis Orlando Pulido | Representante Legal Francisco Javier Guevara Mendez | | **PMT** |

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| RECORRIDO DE VERIFICACION DE SEGMENTOS FASE 1 |         |
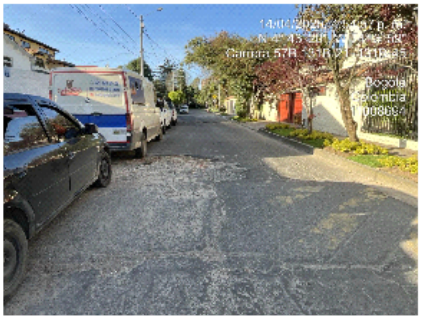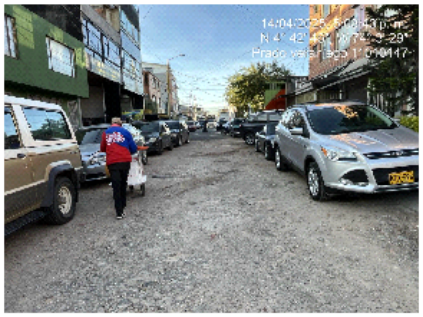
| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| RECORRIDO DE VERIFICACION DE SEGMENTOS FASE 2 |         |
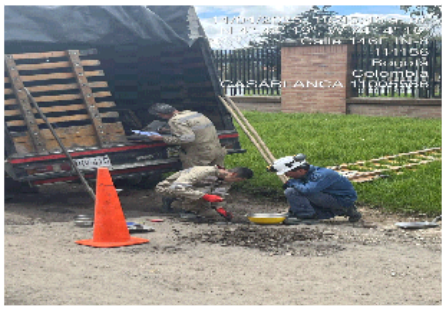
| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| | |
| FRENTE CASABLANCA |         |

| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |

**FRENTE TIBABUYES (PARQUE PILOTO)**









| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |

**FRENTE COSTA AZUL**















| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |

**FRENTES NIZA SUR**
























| | |
|---|---|
| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | **Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025** |
| | CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| | **Informe No.1: 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025** |
| | |
| **FRENTES POTOSI** |   |
| |   |

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✔ El contratista se encuentra haciendo los diagnósticos correspondientes para dar inicio a la fase de ejecución de obra la cual se tiene prevista para el 12 de mayo de 2025.
- ✔ La interventoría ha llevado a cabo el acompañamiento correspondiente con su personal técnico dentro del cual se encuentra residente, topografía e inspector.
- ✔ Actualmente el contrato de obra 1010-2024 se encuentra en fase preliminar la cual tiene una duración de 2 meses.
- ✔ Durante el mes de abril se ejecutaron las actividades correspondientes para el desarrollo de los diagnósticos.
- ✔ Se recomienda al contratista realizar mesas de trabajo en conjunto con la interventoría para aclarar todas las dudas que tenga sobre documentación y el desarrollo de actividades.
- ✔ Se recomienda al contratista informar con una anterioridad mínima de 3 días calendario sobre cualquier actividad que se vaya a realizar y que no esté dentro de las contractuales.

# ANEXO 1

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | Versión 0<br>26/5/2021 | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|---|

**SEMANA No.** 1 (Consecutivo) **DEL** 2/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 6/4/2025 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2)**

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Contratista)

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 13.033.377.846,00 | Valor Inicial | $ 1.629.172.198,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| Valor Adicional 2 | $ - | Valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Adicional 3 | $ - | Valor Adicional 3 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 13.033.377.846,00 | Valor Actualizado | $ 1.629.172.198,00 |
| Plazo Inicial | DIEZ (10) MESES | Plazo Inicial | ONCE (11) MESES |
| Plazo Prórroga 1 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Actualizado | DIEZ (10) MESES | Plazo Actualizado | ONCE (11) MESES |
| Fecha de Iniciación | 2/4/2025 | Fecha de Iniciación | 2/4/2025 |
| Fecha de Terminación Inicial | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Inicial | 1/3/2026 |
| Fecha de Terminación Actual | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Actual | 1/3/2026 |

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**AVANCE GENERAL**

**Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:**

Durante la primera semana de ejecucion del contrato de obra se llevo a cabo el primer comité de seguimiento en las instalaciones de la Alcaldia de Suba donde participaron la supervisicion del ente contratante el Ing Exmelin Lemus y el Ing Alejandro Ramirez, por parte del contratista de obra y la interventoria, durante el desarrollo de la reunion se deja claridad de algunos temas importantes como la radicacion de las cuentas de cobro a la entidad contratante la cual debe ser durante los primeros 10 dias del mes.
La parte tecnica inicia hablando de los 8 frentes de obra en los cuales se van iniciar actividades de obralos cuales son:

- Parque piloto
- Cll146F casa blanca,
- Cll 141 pórtico,
- Cra 92 con 145A suba centro
- Cra 51A con 127 A atabanza
- Cll 137 BIS Tibabuyes
- Cra 98 Chucua
- Cra 70 D Potosi

Se le aclara al contratista la importancia de los PMT a la hora de dar inicio a las actividades asi como las demoras en la SDM para dichas aprobaciones.

Esta información se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

**Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes**

| N° | COI No. | Frente | CIV | Vía | Desde | Hasta | Radicado SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Actividades realizadas por interventoría:**

La interventoria realiza acompañamiento en comité N° 1 de seguimiento y hara parte del recorrido que se realizara el 8 de abril para verificar los segmentos viales a iniciar.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

**Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este item)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.** | **Estado** | **Comentarios** |
| | | | |

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | Versión 0<br>26/5/2021 | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|---|

**SEMANA No.** 1 (Consecutivo) **DEL** 2/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 6/4/2025 (dd-mm-aa)


**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## AVANCE FINANCIERO

| | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **Atraso /Avance** |
| Obra Programada ($) | | | | | |
| Obra Programada (%) | | | | | |

**Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado**

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.

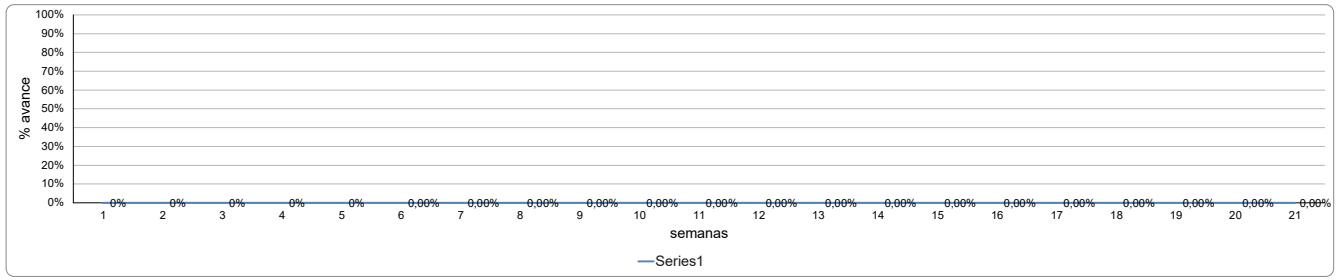


| Sem No. | Desde | Hasta | Acumulado financiero | |
|---|---|---|---|---|
| | | | % program. | % ejecutado |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE DE TRÁNSITO:**

Por parte de la entidad contratante se recuerda la importancia de la implementacion de los PMT para cada uno de los segmentos viales a intervenir y la celeridad que se le debe dar a la gestion de solicitud de aprobacion de estos por parte de los especialistas correspondientes.

**FORESTAL:**

No aplica durante esta semana.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

Por parte del FDLS el Ing. Fabian quien es el encargado de la gestion ambiental da las pautas a seguir para dar inicio, desarrollo y fin al proceso ambiental del contrato de obra, proceso del cual estara a cargo el desde la apertura del pin hasta el cierre del mismo.

**COMPONENTE SOCIAL:**

La entidad precisa la importancia del componente social en el desarrollo del proyecto, ya que la participacion de los profesionales sociales es de vital incidencia para una buena ejecucion desde las reuniones de inicio hasta las reuniones de finalizacion, por otra parte la necesidad de un plan de gestion social acorde y muy completo y el cumplimiento de los % estipulados por la Alcaldia para personas vulnerables.

**COMPONENTE SST:**

Al igual que los componentes Social y ambiental, el componente SST tambien debe presentar su plan de gestion y de calidad para el contrato de obra e interventoria documentos de suma importancia para el desarrollo y seguimiento del proyecto.

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

## 5. ANEXOS

| No. | Nombre anexo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

Nota

Firmado en el mes de: ABRIL (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|

**SEMANA No.** 1 **DEL** 2/4/2025 **AL** 6/4/2025


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 1

CIV 11006438-PARQUE PILOTO

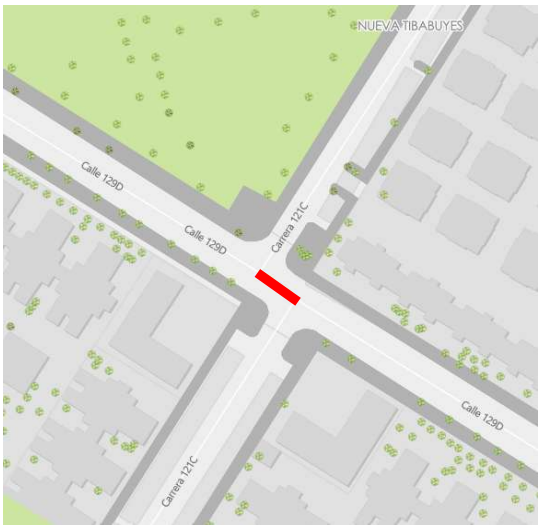


Fotografía 2

CIV 11011976-PARQUE PILOTO

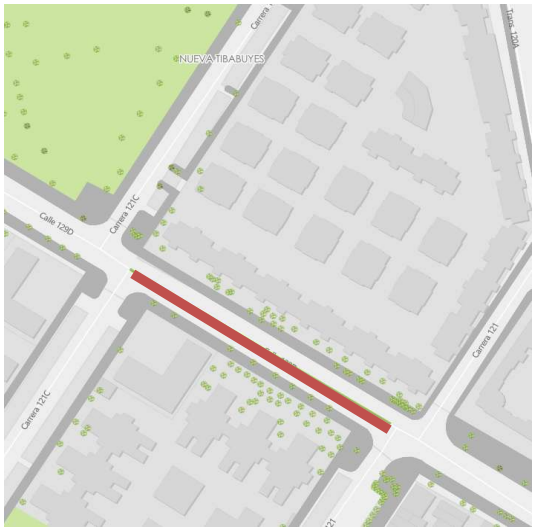


CIV-11011977 PARQUE PILOTO




CIV-11006546 PARQUE PILOTO

**SEMANA No.** 1 **DEL** 2/4/2025 **AL** 6/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

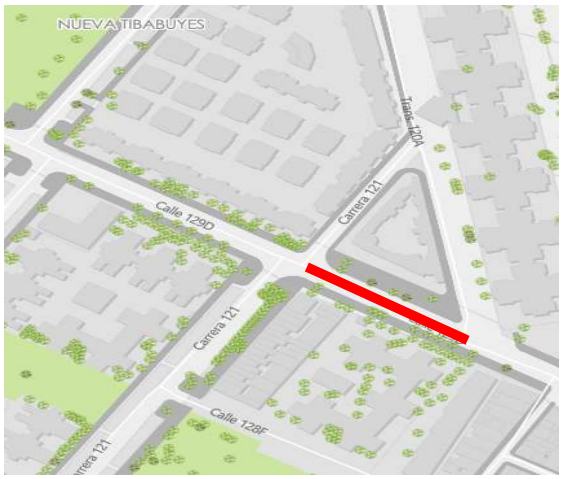



Foto 05

CIV-11011978 PARQUE PILOTO




Fotografía 06

CIV-11006617 PARQUE PILOTO




Fotografía 07

CIV- 11011188 POTOSI




Fotografía 08

CIV- 11005215 TIBABUYES

**SEMANA No.** 1 **DEL** 2/4/2025 **AL** 6/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 09

CIV-110005794 LA CHUCUA




Fotografía 10

CIV- 11005331 SUBA CENTRO

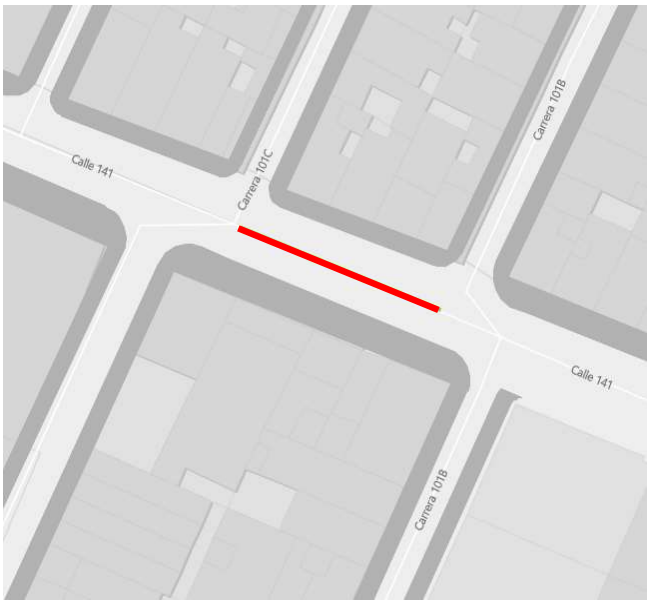


Fotografía 15

CIV-11004156 PORTICO




Fotografía 16

CIV- 11013439 PORTICO

**SEMANA No.** 1 **DEL** 2/4/2025 **AL** 6/4/2025


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografía 17

CIV- 11004110 PORTICO

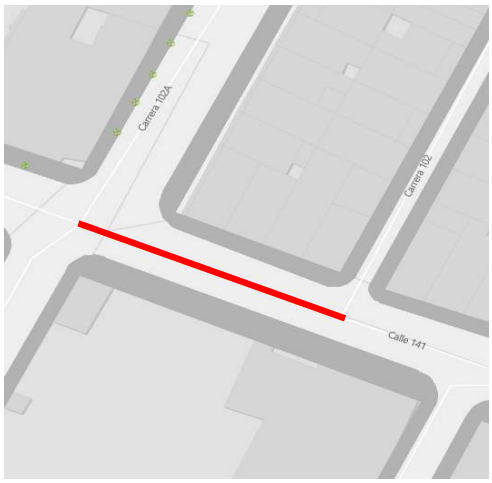



Fotografía 18

CIV 11004080 PORTICO




Fotografía 19

CIV- 11010613 ATABANZA

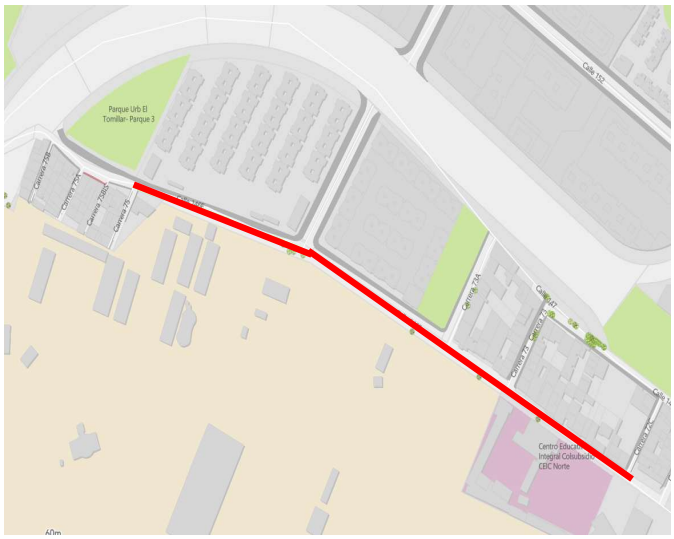


Fotografía 20

CASABLANCA- CIVs 11005566, 11014376, 11005623, 11005728 y 11005765.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

**PROCESO**
**Contrato de obra**
**OFICINA DE INFRAESTRUCTURA**
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

Versión 0
26/5/2021

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

**SEMANA No.** 2 (Consecutivo) **DEL** 7/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 13/4/2025 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2)**

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Contratista)

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 13.033.377.846,00 | Valor Inicial | $ 1.629.172.198,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| Valor Adicional 2 | $ - | Valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Adicional 3 | $ - | Valor Adicional 3 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 13.033.377.846,00 | Valor Actualizado | $ 1.629.172.198,00 |
| Plazo Inicial | DIEZ (10) MESES | Plazo Inicial | ONCE (11) MESES |
| Plazo Prórroga 1 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Actualizado | DIEZ (10) MESES | Plazo Actualizado | ONCE (11) MESES |
| Fecha de Iniciación | 2/4/2025 | Fecha de Iniciación | 2/4/2025 |
| Fecha de Terminación Inicial | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Inicial | 1/3/2026 |
| Fecha de Terminación Actual | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Actual | 1/3/2026 |

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO
Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**AVANCE GENERAL**

**Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:**

Durante esta semana se realizó recorrido de verificación de los frentes de priorización 1 dados por el FDLS donde se evidenciarón varios factores en algunos de los segmentos viales que permiten realizar un ajuste a dicho listado, un ejemplo de esto es la presencia de raices en el segmento vial de Atabanza 11010414 lo cual retrasa la intervención dados los permisos ambientales que se deben implementar, otro es el civ de la chucua 11005794 el cual no se encuentra en un estado tan deplorable para categorizarlo como priorizacion 1, los demas segmentos viales dados si seguiran en el orden de la fase 1 sin ningún inconveniente, finalizando el recorrido se llevó a cabo una reunión en el frente de casablanca donde asistió el señor alcalde de la localidad y donde se le explicó a la comunidad de la zona la intervención a realizar. Adicional a esto se llevó a cabo una reunión con el EAB con el fin de esclarecer los parametros de intervención de los contratos en la cual se dejo claridad que no se superara los 1.5 m de profundidad para reparación de redes y que toda conexión errada sera eliminada asi como tambien el compromiso de parte de ellos de realizar un acompañamiento permanente a las actividades que correspondan.

| SECTOR | CIV | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE PILOTO | 11006438 | CLL 129 D | KR 122 | KR 121 C |
| | 11011976 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C |
| | 11011977 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| | 11006546 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 |
| | 11011978 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 |
| | 11006617 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |
| POTOSÍ | 11011188 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |
| TIBABUYES | 11005215 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |
| CHUCUA | 11005794 | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A |
| SUBA CENTRO | 11005331 | KR 92 | CL 145A | CL 145B |
| PORTICO | 11004156 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C |
| | 11013439 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C |
| | 11004110 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 |
| | 11004080 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A |
| ATABANZA | 11010414 | KR 51A | CL 127 | CL 127A |
| CASABLANCA | 11005566 | CL 146F | KR 75 | KR 74 |
| | 11014376 | CL 146F | KR 74 | KR 73A |
| | 11005623 | CL 146F | KR 73A | KR 73 |
| | 11005728 | CL 146F | KR 73 | KR 72C |
| | 11005765 | CL 146F | KR 72C | KR 72B |

Esta información se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

**Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes**

| N° | COI No. | Frente | CIV | Vía | Desde | Hasta | Radicado SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Actividades realizadas por interventoría:**

La interventoria realiza acompañamiento en comité N° 2 de seguimiento e hizo parte del recorrido que se realizó el 8 de abril para verificar los segmentos viales a iniciar.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

**SEMANA No.** 2 (Consecutivo) **DEL** 7/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 13/4/2025 (dd-mm-aa)


**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## AVANCE FINANCIERO

| | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **Atraso /Avance** |
| Obra Programada ($) | | | | | |
| Obra Programada (%) | | | | | |

**Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado**

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.




| Sem No. | Desde | Hasta | Acumulado financiero % program. | Acumulado financiero % ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE DE TRÁNSITO:**

El contratista de obra ya remitió el 10 de abril de 2025 por correo electronico 6 PMTs para la revisión y aprobación correspondiente por parte de la interventoria los cuales seran radicados en un periodo de 15 dias aproximadamente.

**FORESTAL:**

No aplica durante esta semana.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

Por parte del profesional ambiental del contratista se remitió el 10 de abril de 2025 por correo electronico el MAO con el fin de que sea revisado y verificado por parte de la interventoria para su posterior radicacion al FDLS.

**COMPONENTE SOCIAL:**

La entidad precisa la importancia del componente social en el desarrollo del proyecto, ya que la participacion de los profesionales sociales es de vital incidencia para una buena ejecucion desde las reuniones de inicio hasta las reuniones de finalizacion, por otra parte la necesidad de un plan de gestion social acorde y muy completo y el cumplimiento de los % estipulados por la Alcaldia para personas vulnerables.

**COMPONENTE SST:**

Al igual que los componentes Social y ambiental, el componente SST presento la documentación del personal y maquinaria el 10 de abril de 2025 por correo electronico los cuales ingresaran en los proximos dias para la ejecución de actividades por parte del contratista de obra los cuales estan siendo verificados por la interventoria.

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

## 5. ANEXOS

| No. | Nombre anexo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

Nota

Firmado en el mes de: ABRIL (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|

**SEMANA No.** 2 **DEL** 7/4/2025 **AL** 13/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




Fotografia 1

FRENTE DE OBRA ATABANZA




Fotografía 2

FRENTE DE OBRA SUBAZAR




FOTOGRAFIA 3

FRENTE DE OBRA PARQUE PILOTO




FOTOGRAFIA 4

FRENTE DE OBRA PARQUE PILOTO

**SEMANA No.** 2 **DEL** 7/4/2025 **AL** 13/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** **084 DEL 2025** (Número de Contrato)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DEL 2024** (Número de Contrato)




Foto 05

FRENTE DE OBRA TIBABUYES




Fotografía 06

FRENTE DE OBRA PORTICOS




Fotografía 07

FRENTE DE OBRA CHUCUA




Fotografía 08

FRENTE DE OBRA CASABLANCA

**SEMANA No.** 2 **DEL** 7/4/2025 **AL** 13/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** **084 DEL 2025** (Número de Contrato)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DEL 2024** (Número de Contrato)




Fotografía 09

REUNION CASABLANCA

Fotografía 10

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | Versión 0<br>26/5/2021 | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|---|

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 14/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 20/4/2025 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2)**

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Contratista)

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 13.033.377.846,00 | Valor Inicial | $ 1.629.172.198,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| Valor Adicional 2 | $ - | Valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Adicional 3 | $ - | Valor Adicional 3 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 13.033.377.846,00 | Valor Actualizado | $ 1.629.172.198,00 |
| Plazo Inicial | DIEZ (10) MESES | Plazo Inicial | ONCE (11) MESES |
| Plazo Prórroga 1 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Actualizado | DIEZ (10) MESES | Plazo Actualizado | ONCE (11) MESES |
| Fecha de Iniciación | 2/4/2025 | Fecha de Iniciación | 2/4/2025 |
| Fecha de Terminación Inicial | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Inicial | 1/3/2026 |
| Fecha de Terminación Actual | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Actual | 1/3/2026 |

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**AVANCE GENERAL**

**Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTA SEMANA POR EL CONTRATISTA DE OBRA FUERON LAS SIGUIENTES:
LA EJECUCIÓN DE APIQUES EN LOS FRENTES DE PRIORIZACIÓN FASE 1 PARA EL ESTUDIO DE SUELOS INICIANDO EN CASABLANCA CON 4 DE ESTOS, CONTINUANDO CON EL FRENTE DE PARQUE PILOTO CON 2, POTOSI 1, NIZA SUR 1 EN CADA SEGMENTO, TIBABUYES 1 Y PORTICO 1, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN EL SEGMENTO VIAL DE SUBA CENTRO NO SE PUDO REALIZAR DICHA ACTIVIDAD DADO EL ANCHO DE LA VIA Y EL PASO DE TRANSPORTE URBANO POR LO CUAL ESTA PENDIENTE.
POR OTRO LADO SE DIÓ INICIO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS SEGMENTOS VIALES 11005566, 11014376, 11005623, 11005728 Y 11005765 PERTENECIENTES AL SECTOR DE CASABLANCA.
SE REALIZÓ EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FRENTES PARA PRIORIZACIÓN 2 POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORIA.

Esta información se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

**Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes**

| N° | COI No. | Frente | CIV | Vía | Desde | Hasta | Radicado SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Actividades realizadas por interventoría:**

La interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a las actividades ejecutadas durante la semana. La topografía de interventoría verifico las actividades de levantamiento topográfico en el frente de Casablanca.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

**Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este item)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.** | **Estado** | **Comentarios** |
| | | | |

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | Versión 0<br>26/5/2021 | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|---|

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 14/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 20/4/2025 (dd-mm-aa)


**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## AVANCE FINANCIERO

| | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **Atraso /Avance** |
| Obra Programada ($) | | | | | |
| Obra Programada (%) | | | | | |

**Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado**

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.

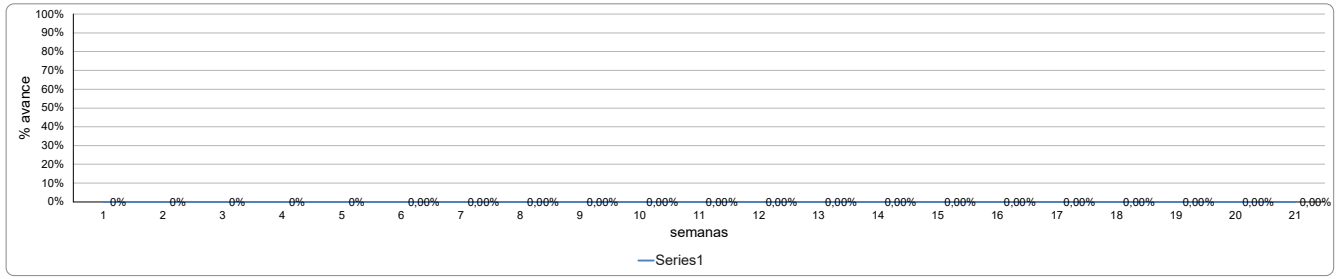


| Sem No. | Desde | Hasta | Acumulado financiero % program. | Acumulado financiero % ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE DE TRÁNSITO:**

El contratista de obra ya remitió 6 PMTs los cuales fueron observados por parte de la interventoría el 16 de abril de 2025 por correo electrónico y se espera sean subsanados en el menor tiempo posible esto teniendo en cuenta que los tiempos de aprobación en la SDM son demorados.

**FORESTAL:**

No aplica durante esta semana.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

Por parte del profesional ambiental del contratista se remitió el MAO con el fin de que sea revisado y verificado por parte de la interventoría para su posterior radicación al FDLS. De igual forma ya se inicio la verificación correspondiente por parte del contratista de los elementos arbóreos presentes en el sector de atabanza.

**COMPONENTE SOCIAL:**

La profesional social de interventoría remitió las observaciones correspondientes al plan de dialogo ciudadano del contratista de obra el 15 de abril de 2025 por correo electrónico las cuales a la fecha no han sido subsanadas, de igual forma nos encontramos a la espera de la ubicación del PAC para la visita de verificación pertinente.

**COMPONENTE SST:**

Por parte de la interventoría se envió al contratista de obra las observaciones pertinentes el 16 de abril de 2025 por correo electrónico a la documentación del personal y maquinaria que fue remitido, de igual forma se le recordó que esta debe ser enviada con anterioridad mínima de 2 días para su verificación y aprobación.

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

## 5. ANEXOS

| No. | Nombre anexo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

Nota

Firmado en el mes de: ABRIL (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|

**SEMANA No.** 3 **DEL** 14/4/2025 **AL** 20/4/2025

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 1

APIQUES SECTOR CASABLANCA




Fotografía 2

APIQUES SECTOR CASABLANCA

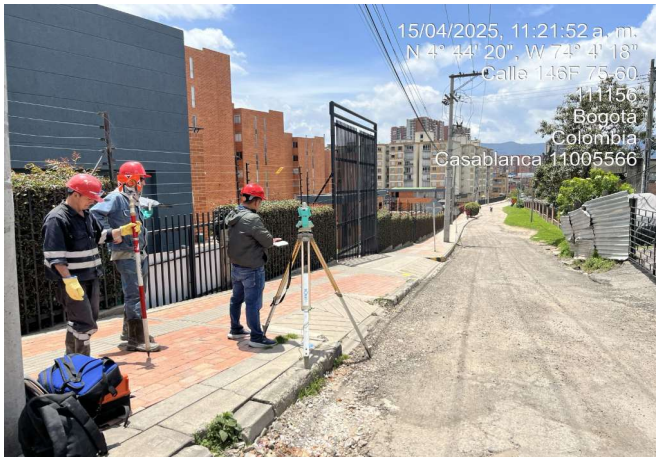


FOTOGRAFIA 3

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CASABLANCA




FOTOGRAFIA 4

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CASABLANCA




Foto 05

APIQUES POTOSI




Fotografía 06

APIQUES POTOSI




Fotografía 07

APIQUES NIZA SUR




Fotografía 08

APIQUES NIZA SUR




Fotografía 09

APIQUES PORTICO




Fotografía 10

APIQUES PORTICO




Fotografía 11

APIQUES TIBABUYES




Fotografía 12

APIQUES PARQUE PILOTO





Fotografía 13

CHUCUA PRIORIZACION 2




Fotografía 14

PRIORIZACION 2 11008694

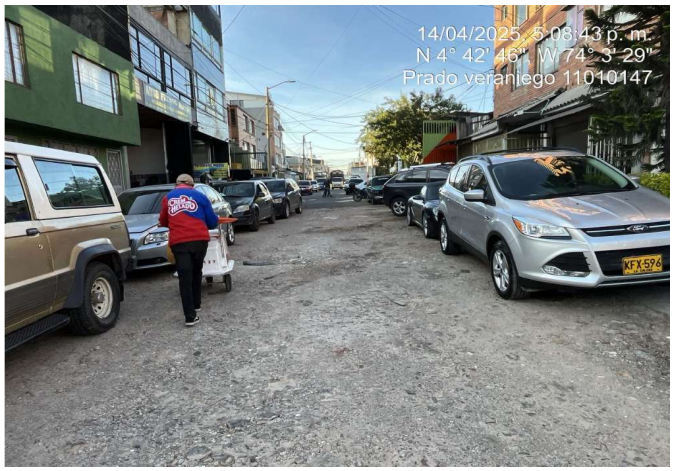


Fotografía 15

PRIORIZACION 2 PRADO VERANIEGO




Fotografía 16

NIZA SUR PRIORIZACION 2

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|---|
| | PROCESO | | |
| | Contrato de obra | Versión 0 | |
| | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 26/5/2021 | |
| | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | | |

**SEMANA No.** 4 (Consecutivo) **DEL** 21/4/2025 (dd-mm-aa) **AL** 27/4/2025 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

**CONTRATISTA** CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razon social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 13.033.377.846,00 | Valor Inicial | $ 1.629.172.198,00 |
| Valor Adicional 1 | $ - | Valor Adicional 1 | $ - |
| Valor Adicional 2 | $ - | Valor Adicional 2 | $ - |
| Valor Adicional 3 | $ - | Valor Adicional 3 | $ - |
| Valor Actualizado | $ 13.033.377.846,00 | Valor Actualizado | $ 1.629.172.198,00 |
| Plazo Inicial | DIEZ (10) MESES | Plazo Inicial | ONCE (11) MESES |
| Plazo Prórroga 1 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Prórroga 2 | 0 | Plazo Prorroga 1 | 0 |
| Plazo Actualizado | DIEZ (10) MESES | Plazo Actualizado | ONCE (11) MESES |
| Fecha de Iniciación | 2/4/2025 | Fecha de Iniciación | 2/4/2025 |
| Fecha de Terminación Inicial | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Inicial | 2/3/2026 |
| Fecha de Terminación Actual | 1/2/2026 | Fecha de Terminación Actual | 2/3/2026 |

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

### AVANCE GENERAL

**Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTA SEMANA POR EL CONTRATISTA DE OBRA FUERON LAS SIGUIENTES:

SE LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECCION DE REDES DE LOS SEGMENTOS VIALES 11006438, 11011976, 11011977, 11006546, 11011978, 11006617 PERTENECIENTE AL SECTOR DE TIBABUYES EL PARQUE PILOTO, SIGUIENDO CON EL SEGMENTO VIAL 11005215 DE COSTA AZUL, 11004156, 11013439, 11004110, 11004080 DEL POA.

SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACION CON EL FIN DE AÑADIR MÁS SEGMENTOS A LA PRIORIZACION 2 QUE UNA VEZ SOCIALIZADOS CON LA ENTIDAD EL LISTADO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11008694 | 167909 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE | MANTENIMIENTO PERIÓDICO | FDLS |
| 11010147 | 167437 | CALZADA | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO | MANTENIMIENTO PERIÓDICO | |
| 11010612 | 168694 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO | |
| 11004683 | 173291 | CALZADA | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | VILLA MARIA I | RECONSTRUCCIÓN | |
| 11010586 | 167135 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN | CONTRATISTA |
| 11010578 | 167136 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN | |
| 11010602 | 167018 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN | |
| 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN | |

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

**Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes**

| N° | COI No. | Frente | CIV | Vía | Desde | Hasta | Radicado SDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Actividades realizadas por interventoría:**

LA INTERVENTORIA REALIZO ACOMPAÑAMIENTO AL RECORRIDO REALIZADO, ADICIONAL A ESTO SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR PARTE DE NUESTRA CUADRILLA TOPOGRAFICA.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

**Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este item)**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.** | **Estado** | **Comentarios** |
| | | | |
| | | | |

**AVANCE FINANCIERO**

| | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | **Atraso /Avance** |
| Obra Programada ($) | | | | | |
| Obra Programada (%) | | | | | |

**Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado**

A la fecha no se ha dado inicio a las actividades de obra por lo cual no se tiene informacion de avance.

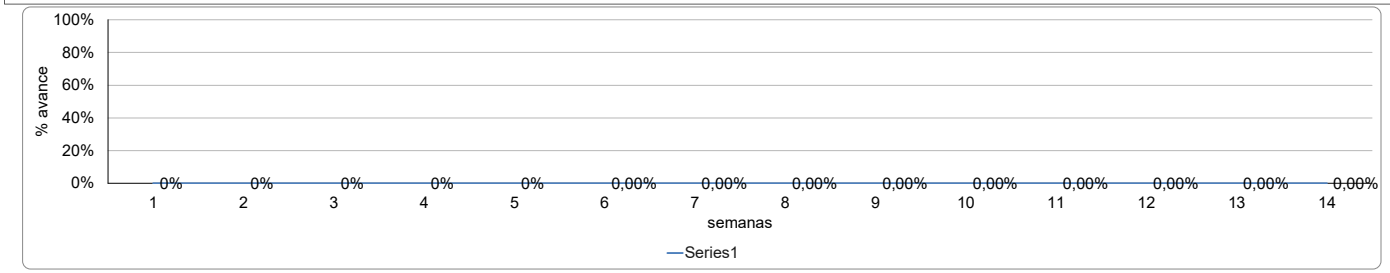


| Sem. No. | Desde | Hasta | Acumulado financiero % progr am. | Acumulado financiero % ejecut ado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE DE TRÁNSITO:**

Por parte de la interventoria se dio visto bueno a 4 PMTs de los sectores de Casablanca, Niza sur, Tibabuyes y Potosi los cuales fueron radicas ante la secretaria de movilidad el dia 24 de abril de 2025 y se encuentra a espera de aprobacion. Sin embargo los otros 2 PMTs remitidos tuvieron observaciones. Con lo que respecta al segmento vial 11005331 de suba centro se deb eesperar a que trasmilenio emita su concepto tecnico.

**FORESTAL:**

No aplica durante esta semana.

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

La interventoria remitio las observaciones correspondientes al MAO con el fin de que sean subsanadas a la mayor brevedad, de igual forma se solicito el inventario forestal de los frentes a iniciar y los formatos que correspondan para la apertura del pin.

**COMPONENTE SOCIAL:**

Se recibe por parte del contratista subsanación plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica
Asistencia a comité de obra

**COMPONENTE SST:**

por parte de la interventoria el dia 23 de abril se remitieron observaciones a la maquinaria minima requerida que exige el contrato para los 8 frentes de cobra a iniciar intervencion.

.

**4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)**

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:**

**RECOMENDACIONES:**

**5. ANEXOS**

| No | Nombre anexo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

N :

Firmado en el mes de: ABRIL (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S. | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA<br>PROCESO<br>Contrato de obra<br>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|---|---|---|

**SEMANA No.** 4 **DEL** 21/4/2025 **AL** 27/4/2025


**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




Fotografía 1

LEVANTAMIENTO CASABLANCA

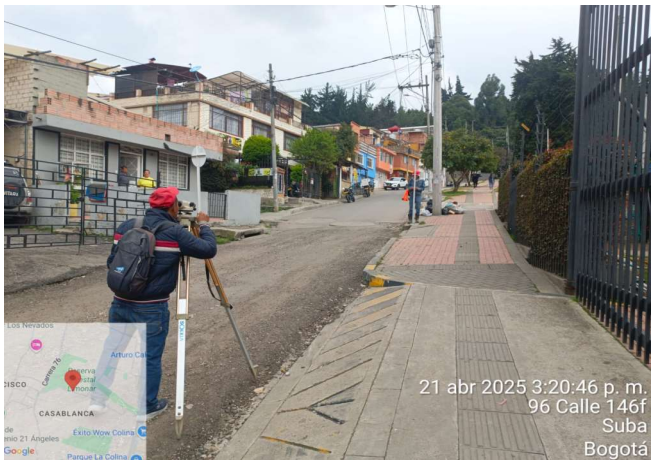


Fotografía 2

LEVANTAMIENTO CASABLANCA




FOTOGRAFIA 3

INSPECCION DE REDES CASABLANCA




FOTOGRAFIA 4

INSPECCION DE REDES CASABLANCA





Foto 05

LEVANTAMIENTO EN EL CIV 11005215 DE COSTA AZUL





Fotografia 06

INSPECCION DE REDES 11005215

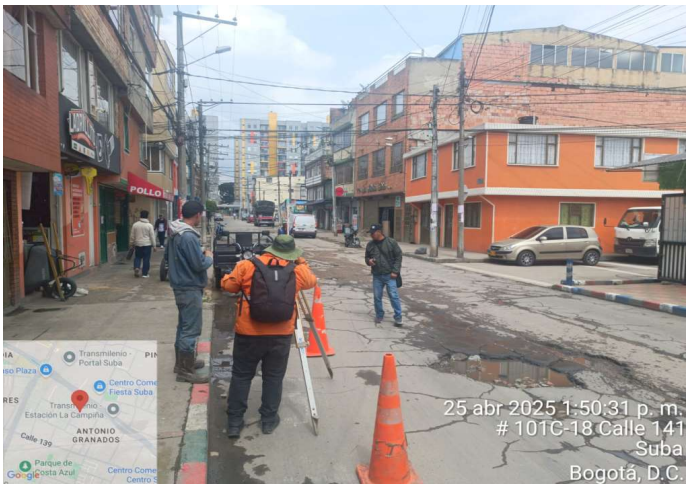


Fotografía 07

LEVANTAMIENTO SECTOR BOCHALEMA (PORTICO)

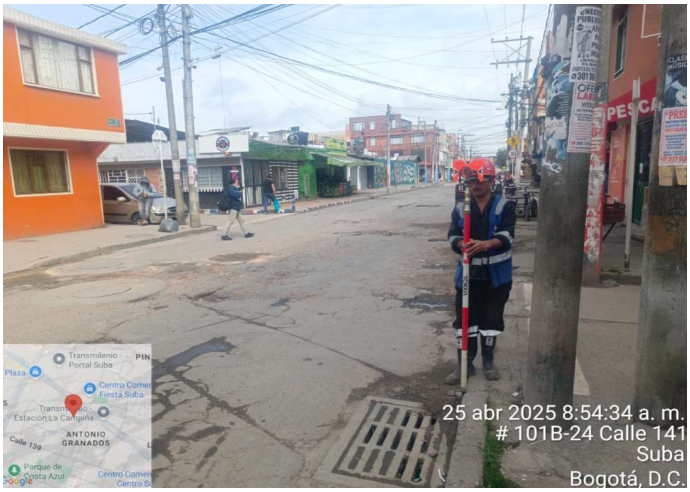


Fotografía 08

LEVANTAMIENTO BOCHALEMA




Fotografía 09

INSPECCION DE REDES NIZA SUR




Fotografía 10

INSPECCION DE REDES NIZA SUR




Fotografía 11

INSPECCION DE REDES NIZA SUR




Fotografía 12

VISITA CIVS FASE 2




Fotografía 13

VISITA CIVS FASE 2




Fotografía 14

VISITA CIVS FASE 2




Fotografía 15

VISITA CIVS FASE 2

Fotografía 16

# ANEXO 2

| No. | ORD. | CIV | VIA | DESDE | HASTA | PK_ID | BARRIO | AREA INTERVENCIÓN (m²) | LONGITUD (m) | AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²) | KM/CARRIL | MATERIAL | DISEÑOS FDLS | PRIORIZACION | INSPECCION | PMT | EXCLUIDOS | CONSTRUCCION | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | DÍAS DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11014399 | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS | 91013890 | SAN FRANCISCO | 210,97 | 61,1 | 211,0 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 2 | 2 | 11014396 | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A | 91013885 | SAN FRANCISCO | 149,55 | 47,3 | 149,6 | 0,04 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 3 | 3 | 11014397 | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO | 91013842 | SAN FRANCISCO | 277,28 | 57,9 | 277,3 | 0,08 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 4 | 4 | 11006438 | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | 173503 | TIBABUYES | 865,9 | 84,60 | 865,9 | 0,25 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 5 | 5 | 11011976 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | 472369 | TIBABUYES | 176,12 | 16,80 | 176,1 | 0,05 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 6 | 6 | 11011977 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | 472370 | TIBABUYES | 958,99 | 95,60 | 959,0 | 0,27 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 7 | 7 | 11006546 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | 173502 | TIBABUYES | 141,26 | 14,10 | 141,3 | 0,04 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 8 | 8 | 11011978 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | 472371 | TIBABUYES | 669,44 | 68,00 | 669,4 | 0,19 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 9 | 9 | 11006617 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | 173501 | TIBABUYES | 472,92 | 39,40 | 472,9 | 0,14 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 10 | 10 | 11011188 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | 168477 | POTOSI | 265,05 | 29,20 | 265,1 | 0,08 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 11 | 11 | 11006116 | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 | 53781 | LA CHUCUA | 253,26 | 45,50 | 136,0 | 0,04 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 12 | 12 | 11004672 | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | 173797 | EL POA | 251,18 | 68,5 | 251,2 | 0,07 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 13 | 13 | 11005215 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | 800044 | COSTA AZUL | 379,27 | 58,30 | 379,3 | 0,11 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 14 | 14 | 11008694 | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | 167909 | COLINA CAMPESTRE | 896,82 | 138,10 | 896,8 | 0,26 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 15 | 15 | 11010147 | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | 167437 | PRADO VERANIEGO | 619,79 | 91,1 | 619,8 | 0,18 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 16 | 16 | 11004156 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | 173807 | EL POA | 200,58 | 25,3 | 200,6 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 17 | 17 | 11013439 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | 91020581 | EL POA | 86,47 | 10,6 | 86,5 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 18 | 18 | 11004110 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | 173808 | EL POA | 136,07 | 17,6 | 136,1 | 0,04 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 19 | 19 | 11004080 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | 173809 | EL POA | 280,26 | 37,10 | 280,3 | 0,08 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 20 | 20 | 11005418 | CLL 145 A | CRA 90 A | CRA 91 | 171265 | SUBA CENTRO | 218,04 | 36,50 | 218,0 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 21 | 21 | 11005417 | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO NORTE | 171267 | SUBA CENTRO | 229,39 | 77,9 | 229,4 | 0,07 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 22 | 22 | 11005536 | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO SUR | 171266 | SUBA CENTRO | 203,85 | 67,3 | 203,9 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 23 | 23 | 11005794 | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | 172488 | LA CHUCUA | 802,32 | 123,0 | 802,3 | 0,23 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 24 | 24 | 11003955 | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | 176248 | LA CAMPIÑA | 667,09 | 129,3 | 667,1 | 0,19 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 25 | 25 | 11010612 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | 168694 | NIZA SUR | 134,47 | 21 | 134,5 | 0,04 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 26 | 26 | 11009243 | CL 128B | KR 84C | KR 85 | 170403 | CIUDAD HUNZA | 68,39 | 10,2 | 68,4 | 0,02 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 27 | 27 | 11009180 | CL 128B | KR 84 | KR 84A | 170384 | CIUDAD HUNZA | 217,98 | 47,6 | 218,0 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 28 | 28 | 11009224 | CL 128B | KR 84B | KR 84A | 170385 | CIUDAD HUNZA | 200,04 | 46,3 | 200,0 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 29 | 29 | 11009242 | CL 128B | KR 84C | KR 84B | 170386 | CIUDAD HUNZA | 130,4 | 25,4 | 130,4 | 0,04 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 30 | 30 | 11013565 | TV 94 | CL 129A | CL 129B | 52298 | EL RINCÓN | 171,15 | 35,3 | 171,2 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 31 | 31 | 11008140 | TV 94 | KR 93D BIS A | KR 93D | 52290 | EL RINCÓN | 62,19 | 42,1 | 62,2 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 32 | 32 | 11008154 | TV 94 | CL 128D | KR 93D BIS A | 52288 | EL RINCÓN | 193,55 | 59,4 | 193,6 | 0,06 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 33 | 33 | 11008062 | DG 129B BIS | KR 93C | KR 93B | 52294 | EL RINCÓN | 544,8 | 50,0 | 544,8 | 0,16 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 34 | 34 | 11007844 | CL 130D | KR 88C | KR 88B | 51210 | TABERIN | 57,61 | 57,3 | 57,6 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 35 | 35 | 11007885 | KR 89 | CL 130B BIS | CL 130C | 51745 | NARANJOS | 13,22 | 12,9 | 13,2 | 0,00 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 36 | 36 | 11006690 | CL 132C | KR 92A | KR 93 BIS | 52944 | VILLA ELISA | 115,84 | 57,7 | 115,8 | 0,03 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 37 | 37 | 11006280 | CL 135 | KR 94C | KR 94F | 52970 | VILLA ELISA | 175,52 | 111,7 | 175,5 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 38 | 38 | 11004054 | KR 111A | CL 139 | CL 140 | 56027 | LAS FLORES | 315,63 | 124,3 | 315,6 | 0,09 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 39 | 39 | 11009644 | CL 129 | KR 56 | KR 56A | 515990 | PRADO VERANIEGO | 88,96 | 26,3 | 89,0 | 0,03 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 40 | 40 | 11009650 | CL 129 | AK 55 | KR 55B | 515930 | PRADO VERANIEGO | 183,92 | 52,1 | 183,9 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 41 | 41 | 11009653 | CL 129 | KR 55 B | KR 55B | 515910 | PRADO VERANIEGO | 383,03 | 99,4 | 383,0 | 0,11 | | | X | X | | | | X | | | | 0 |
| 42 | 42 | 11010114 | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | 45831 | PRADO VERANIEGO | 199,93 | 82,2 | 199,9 | 0,06 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 43 | 43 | 11004461 | TV 126 | CL 134 | CL 135B | 56171 | LA GAITANA | 307,15 | 147,5 | 307,2 | 0,09 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 44 | 44 | 11005104 | CL 124 | CL 132C BIS | CL 132D | 55555 | LA GAITANA | 44 | 17,4 | 44,0 | 0,01 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 45 | 45 | 11014679 | CL 132D | KR 118 | KR 124 | 55494 | LA GAITANA | 217,77 | 127,5 | 217,8 | 0,06 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 46 | 46 | 11005262 | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | 173654 | LA GAITANA | 245,33 | 91,2 | 245,3 | 0,07 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 47 | 47 | 11007171 | KR 100A | CL 130 | CL 130C | 53561 | LAGO DE SUBA | 419,54 | 29,8 | 419,5 | 0,12 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 48 | 48 | 11007373 | KR 100A | CL 129C | CL 130 | 53559 | LAGO DE SUBA | 406,97 | 111,2 | 407,0 | 0,12 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 49 | 49 | 11007426 | CL 129C | KR 99A | KR 100A | 52761 | LAGO DE SUBA | 274,57 | 85,8 | 274,6 | 0,08 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 50 | 50 | 11006499 | KR 102 | CL 131 | CL 131B | 54069 | AURES | 172,28 | 86,1 | 172,3 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 51 | 51 | 11007528 | TV 102A | CL 128C | CL 128B | 53375 | EL RINCÓN | 102,56 | 25,4 | 102,6 | 0,03 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 52 | 52 | 11008687 | CL 128BIS | KR 93D | KR 93A | 51343 | EL RINCÓN | 318,24 | 144,4 | 318,2 | 0,09 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 53 | 53 | 11008803 | CL 128BIS | KR 93A | KR 93 | 51341 | EL RINCÓN | 188,18 | 105,3 | 188,2 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | 0 |
| 54 | 54 | 11004800 | CL 140A | KR 100 | KR 100A | 55745 | EL POA | 71,37 | 35,85 | 71,4 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | |
| 55 | 55 | 11004755 | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | 55781 | EL POA | 78,95 | 33,53 | 79,0 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | |
| 56 | 56 | 11004799 | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | 55734 | EL POA | 112,21 | 43,91 | 112,2 | 0,03 | | | X | | | | | X | | | | |

| No. | ORD. | CIV | VIA | DESDE | HASTA | PK_ID | BARRIO | AREA INTERVENCIÓN (m²) | LONGITUD (m) | AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²) | KM/CARRIL | MATERIAL | DISEÑOS FDLS | PRIORIZACION | INSPECCION | PMT | EXCLUIDOS | CONSTRUCCION | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | DÍAS DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | 11007176 | CL 130C | KR 98 | KR 98A | 52412 | AURES | 80,04 | 37,12 | 80,0 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | |
| 58 | 58 | 11007276 | KR 97 | CL 130B | CL 130C | 92074905 | AURES | 577,2 | 110,78 | 577,2 | 0,16 | | | X | | | | | X | | | | |
| 59 | 59 | 11009086 | CL 128B | CL 87D | CL 88 | 50696 | CIUDAD HUNZA | 84,18 | 40,93 | 84,2 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | |
| 60 | 60 | 11009172 | KR 86B | CL 128B | CL 128B BIS | 50604 | CIUDAD HUNZA | 124 | 59,83 | 124,0 | 0,04 | | | X | | | | | X | | | | |
| 61 | 61 | 11009208 | KR 86B | CL 128 | CL 128B | 50602 | CIUDAD HUNZA | 178,98 | 90,89 | 179,0 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | |
| 62 | 62 | 11008562 | KR 84A | CL 129A | CL 129C | 92064676 | CIUDAD HUNZA | 73,08 | 36,47 | 73,1 | 0,02 | | | X | | | | | X | | | | |
| 63 | 63 | 11008818 | KR 93 | CL 128BIS | CL 128BIS | 51476 | EL RINCÓN | 46,59 | 17,8 | 46,6 | 0,01 | | | X | | | | | X | | | | |
| 64 | 64 | 11014651 | CL 136A | KR 112 | KR 118 | 55697 | VILLA MARIA I | 139,72 | 69,3 | 139,7 | 0,04 | | | X | | | | | X | | | | |
| 65 | 65 | 11008662 | KR 53 | CL 135 | CL 136 | 46033 | PRADO VERANIEGO | 166,44 | 62,3 | 166,4 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | |
| 66 | 66 | 11008527 | CL 136 | KR 53 | KR 53B | 45971 | PRADO VERANIEGO | 326,37 | 99,2 | 326,4 | 0,09 | | | X | | | | | X | | | | |
| 67 | 67 | 11008663 | CL 135 | KR 53 | KR 53B | 45956 | PRADO VERANIEGO | 258,28 | 99,6 | 258,3 | 0,07 | | | X | | | | | X | | | | |
| 68 | 68 | 11004683 | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | 173291 | VILLA MARIA I | 904,13 | 170,7 | 904,1 | 0,26 | | | X | | | | | X | | | | |
| 69 | 69 | 11005331 | KR 92 | CL 145A | CL 145B | 172977 | SUBA CENTRO | 191,04 | 43,2 | 191,0 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | |
| 70 | 70 | 11003803 | CL 148 | KR 91 | KR 92 | 171249 | LA CAMPIÑA | 389,68 | 91,2 | 389,7 | 0,11 | | | X | | | | | X | | | | |
| 71 | 71 | 11010414 | KR 51A | CL 127 | CL 127A | 167430 | ATABANZA | 2267,19 | 215,3 | 2267,2 | 0,65 | | | X | | | | | X | | | | |
| 72 | 72 | 11010586 | KR 54A | CL 122A | CL 124A | 167135 | RECREO DE LOS FRAIL | 996,62 | 61,60 | 996,6 | 0,28 | | | X | | | | | X | | | | |
| 73 | 73 | 11010578 | KR 54B | CL 122A | CL 124A | 167136 | RECREO DE LOS FRAIL | 1517,46 | 164,00 | 1517,5 | 0,43 | | | X | | | | | X | | | | |
| 74 | 74 | 11010602 | CL 122A | KR 54 | KR 54A | 167018 | RECREO DE LOS FRAIL | 410,93 | 68,80 | 410,9 | 0,12 | | | X | | | | | X | | | | |
| 75 | 75 | 11010587 | CL 122A | KR 54A | KR 54B | 167019 | RECREO DE LOS FRAIL | 379,47 | 64,40 | 379,5 | 0,11 | | | X | | | | | X | | | | |
| 76 | 76 | 11010613 | CL 119 | KR 70G | KR 71A | 168611 | NIZA SUR | 1236,92 | 192,80 | 1236,9 | 0,35 | | | X | | | | | X | | | | |
| 77 | 77 | 11010621 | CL 119 | KR 70 | KR 70C | 168609 | NIZA SUR | 1214,83 | 190,50 | 1214,8 | 0,35 | | | X | | | | | X | | | | |
| 78 | 78 | 11005566 | CL 146F | KR 75 | KR 74 | 169503 | CASABLANCA | 786,24 | 145,40 | 786,2 | 0,22 | | | X | | | | | X | | | | |
| 79 | 79 | 11014376 | CL 146F | KR 74 | KR 73A | 91011826 | CASABLANCA | 1242,26 | 133,30 | 1242,3 | 0,35 | | | X | | | | | X | | | | |
| 80 | 80 | 11005623 | CL 146F | KR 73A | KR 73 | 169502 | CASABLANCA | 434,38 | 61,10 | 434,4 | 0,12 | | | X | | | | | X | | | | |
| 81 | 81 | 11005728 | CL 146F | KR 73 | KR 72C | 169501 | CASABLANCA | 757,44 | 113,90 | 757,4 | 0,22 | | | X | | | | | X | | | | |
| 82 | 82 | 11005765 | CL 146F | KR 72C | KR 72B | 169500 | CASABLANCA | 187,95 | 27,10 | 188,0 | 0,05 | | | X | | | | | X | | | | |

**OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA**

| CIV | GDC | MD19 (CM) | CONCRETO 3000 | MR 41 (cm) | AR_BG establecemnt+SOLID (cm) | AR_BG (cm) | AR_SBG (cm) | Geotextil sep. | Rajón incluye sello (cm) | Material selec (cm) | GEOCELDA | Geosintético | Prof. Intervención (m) | SARDINEL | DEMARCACION | OBSERVACIÓN | % EJECUTADO | VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO | VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014399 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11014396 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11014397 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006438 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11011976 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11011977 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006546 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11011978 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006617 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11011188 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006116 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004672 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005215 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008694 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11010147 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004156 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11013439 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004110 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004080 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005418 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005417 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005536 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005794 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11003955 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11010612 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009243 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009180 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009224 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009242 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11013565 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008140 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008154 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008062 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007844 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007885 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006690 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006280 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004054 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009644 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009650 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009653 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11010114 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004461 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005104 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11014679 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11005262 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007171 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007373 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007426 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11006499 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007528 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008687 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008803 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004800 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004755 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11004799 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

| CIV | GDC | MD19 (CM) | CONCRETO 3000 | MR 41 (cm) | AR_BG establcement+SOLID (cm) | AR_BG (cm) | AR_SBG (cm) | Geotextil sep. | Rajón incluye sello (cm) | Material selec (cm) | GEOCELDA | Geosintético | Prof. Intervención (m) | SARDINEL | DEMARCACION | OBSERVACIÓN | % EJECUTADO | VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO | VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11007176 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11007276 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009086 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009172 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11009208 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008562 | | | | | | | | | | | | | - | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | $ - | $ - | $ - | |
| 11008818 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11014651 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11008662 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11008527 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11008663 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11004683 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11005331 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11003803 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010414 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010586 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010578 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010602 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010587 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010613 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11010621 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11005566 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11014376 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11005623 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11005728 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |
| 11005765 | | | | | | | | | | | | | | | | EN ETAPA DIAGNOSTICOS | 0% | | | | |

# ANEXO 3

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | COMITE #2 CONTRATOS 1010-2024 - 084-2025 | | |
| **Fecha:** | 04-04-2025 | **Hora de inicio:** 10:40 | **Modalidad:** Presencial X / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | HANGAR - ALCALDIA | **Hora de finalización:** ____ | |
| **Dependencia:** | TORRE ESTRUCTURA | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1018417354 | Christian Fabian Barrera Dos | Dir Interventoría | Torres y Asociados | | | | | | | | | X | 3132471470 | |
| CC | 79800692 | Luis Emilio Blanco | Bs Infraestr | Torres y Asociados | | | | | | | | | X | 3102009455 | |
| CC | 52712303 | Claudia Forero C | Prof apoyo | Torres y Asociados | | | | | | | | | X | 3115236633 | |
| CC | 79779272 | [illegible] | Dir. Obra | Cons Consorcio PG. | | | | | | | | | X | RESIDENTECCPTGL @GMAIL.COM | |
| CC | 1116992123 | Mauricio Romero V | Dir obra | Cons. Consorc. | | | | | | | | | X | " | |
| CC | 1093402779 | Gladys Becerra | Res social | Cons Construcción | | | | | | | | | X | " | |
| CC | 1015413086 | OSCAR MOYA | Coordinador | CSO consorcio PG | | | | | | | | | X | ingenieria@ctorresyasociados.com | |
| C. | 7181761 | Andi Acosta | Andi | Torres FDLS | | X | | | | | | | X | ingeniería y arquitectura @ gmail.com | |
| CC | 79924196 | Edwin Lima | Edwin | FDLS - INTER | | | X | | | | | | | 3103142837 | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Hangar Alcaldia
FECHA: 04-04-2025 LUGAR: Hangar Alcaldia
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento
HORA DE INICIO: 10:40 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIO | TÉCNICO/ | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIO | LIBRE | CONTRATI | | | | |
| Dayana Ulonis | | 6 | 6 | | | | | | x | Pol S Interseccionam | alginni.ui@bibliotecapu.co | 3133733370 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ No. 01 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMITE No1 socialización supervisión, interventoría 084-2025-INT y contratista COP 1010-2024 | | NA | |
| 2 | | | | |

REVISIÓN DE COMPROMISOS

COMPONENTE TÉCNICO

El Ing. Exmelin Lemus supervisor de la secretaria de infraestructura inicia la presentación del grupo de asistentes y explicando cada componente para el desarrollo administrativo y técnico del proyecto

CUENTAS DE COBRO: Se deben radicar en la entidad los primeros diez (10) días calendario de cada mes, debidamente validas por la interventoría
El formato de la cuenta de cobro en el encabezado debe decir: cuenta de cobro No1, la información fue revisada, validada y aprobada por la interventoría de acuerdo con sus funciones. Los formatos se compartirán nuevamente por el grupo.

Es importante que la cuenta sea radicada los primeros días de cada mes teniendo en cuenta toda la documentación que se debe aportar por el contratista e interventoría y los tramites internos de la administración.

La cuenta de cobro se radica de manera física en el CDI, donde se digitaliza toda la información (tiempo +- 2-3 días), posterior a ello pasan a la secretaria de infraestructura para revisión, para la cuenta No1 se harán las respectivas observaciones de manera verbal de lo que se debe corregir y/o anexar teniendo en cuenta que es la primera cuenta y el contratista y la interventoría están iniciando a conocer los lineamientos de la entidad, para la cuenta No2 la devolución será por oficio
Si por alguna razón hay actualizaciones de formato el supervisor estará informando con tiempo

Después de ser revisada y aprobada por infraestructura pasa al CAF (coordinación de Administración Financiera) donde dura de 3 a 4 días en revisión, si no hay observaciones para a contractual, donde revisan la parte Jurica y dependiendo a la cantidad de cuentas radicadas que tenga la oficina la revisión demora de 2 a 3 días. De la oficina Jurídica pasa al Despacho, revisan y con el apoyo de la secretaria de infraestructura hace observaciones si apli o no y pasa a firma del alcalde. En este periodo de revisión van más o menos 23 días, después de la firma del alcalde para a contabilidad y presupuesto (estampillas, creación usuario) en hacienda puede demorar 3- 4 días. La secretaria de hacienda cierra a fin de mes, abre la 1ra a 2da semana de cada mes. E inicia pagos primero a las personas naturales y continua con la cuantas de las personas jurídicas
Por lo anterior es importante radicar las cuentas completas y en los formatos establecidos para no generar retrocesos.

La factura: para radicar la cuenta puede ser proforma y ya cuando esté aprobada la misma, subsanado las observaciones si las hay se envía la factura definitiva al correo de infraestructura infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co
La entidad no avala prestamos, ni hechos cumplidos sino está avalado por la interventoría y la alcaldía el contratista se hace responsable de las actividades ejecutadas sin aprobación.

PARTE TÉCNICA: ya se cuenta con los 8 frentes de obra que de manera simultánea se puede iniciar:
Casa blanca 146 f y 129E es de los primeros frentes que se deben intervenir, es importante que el personal en obra sea especialista de tráfico para agilizar el tema con movilidad.
Para los tramites de PMT la primera radicación el contratista tiene dos meses para el diagnóstico, pero la entidad recomienda iniciar con la primera fase durante el mes de abril, en los dos meses se debe entregar el diagnostico de todos los frentes; la entidad propone agilizar esta fase 1(etapa de diagnóstico PMT, socializaciones) y que se inicie actividades de ejecución en la primera semana del mes de mayo y se puede ir adelantando la fase 2 y 3 para que se haga una entrega posterior y definitiva a la interventoría.

El contratista de obra manifiesta que para el tema de PMT ya iniciaron con aforos y solicitan los datos de la interventoría para poder remitir la información adelantada.

El contratista informa la intención de iniciar con actividades de topografía y los diagnósticos estructurales por las dudas que han surgido hasta el momento y con las priorizaciones de los siguientes frentes:

- Tibabuyes CIV 11005215 tramo CLL 137 BIS – desde CRA 103 hasta CRA 103 C: dice que está para mantenimiento, pero está es para reconstrucción total y tiene una bahía de parqueadero, ¿hace parte del CIV o solo se va a ejecutar la vía? La supervisión informa que solo se va a intervenir la vía

El contratista: de igual forma con el resultado del diagnóstico cambiaran los términos de la columna de intervención, ya con la visita del especialista se podrá definir lo que es o no mantenimiento, rehabilitación, Etc.
En la vía de Tibabuyes hay dos postes en la vía interfiriendo, para lo cual la entidad aclara que no se va a intervenir urbanismo, lo que se puede realizar es cuando se vaya a realizar el confinamiento se deja la "pestaña" la intervención es solo para la malla vial, el contrato no incluye espacio público

- Casa blanca: la supervisión informa que se deberá correr hacia la vía los 20-30 cm para confinamiento de la misma, el contratista dice que hay unas cajas de gas después de las casas que están afectando las salidas y que toca reducir y ampliar el tramo ya que no es un tramo uniforme
  La entidad informa que los propietarios van a hacer una restitución voluntaria para esos predios, ya la entidad hablo con los propietarios y dejaron un acta donde se llegó al acuerdo de la restitución voluntaria
  Contratista: en los últimos CIV'S de ese tramo la vía pasa de 10 a 7m y hay invasión de espacio público, la entidad aclara que es un contrato de conservación y se debe ejecutar como está en el contrato

  Una de las propuestas de la entidad es correrse unos 20 a 30 cm con el apoyo de topografía para el prefabricado en el costado sur para poderlo atracar, porque es una zona verde que aplica para construcción y con la retroexcavadora se podría descapotar esa área y reconformar esa terraza. Para lo cual el contratista dice que al correr esos 20-30 cm ya finalizado el tramo va a limitar con unos árboles, y pregunta cómo será el manejo de esos árboles ya que están con placa.
  La entidad: en campo se revisará como se dará el manejo de la vía para no afectar los árboles y el caso del muro toca tumbarlo, pero es importante que los especialistas del proyecto verifiquen el estado del mismo y las alternativas que se pueden manejar, y estas alternativas deben quedar en la bitácora de obra.

  Hay un tramo frente al conjunto que el pavimento está nuevo, pero si el contratista junto con la interventoría (especialistas) considera necesario demolerlo y volverlo a hacer o si en dado caso se debe dejar claro la longitud del tramo y ubicación exacta que no se va a intervenir para el tema de pólizas.

- Tramo suba centro: la entidad ya está realizando acercamientos con Transmilenio para el tema de desvíos. La estructura es en adoquín, se está planteando hacer todo el segmento hasta la av. suba y tramo restante, pero se deberá verificar con los especialistas para revisar la necesidades y justificación para el cambio de toda la sección.

- NIZA SUR: el contratista ya hizo un recorrido con geotecnia y manifestó que la intervención será de rehabilitación sin embargo se pasará el diagnóstico completo del especialista. La entidad informa que ya está adelantando el tema con la secretaria de ambiente para el tema de los árboles que se encuentran en este tramo y que esta envié el concepto respectivo si es posible la tala por emergencia o el paso a seguir y con los especialistas revisar y plantear una opción que ofrezca garantía a la calzada.

- Contratista e interventoría solicitan la última versión del listado de tramos priorizados

- Los frentes a intervenir:
  Parque Piloto
  Cll146F Casa Blanca,
  Cll. 141 Pórtico,
  Cra. 92 con 145A Suba Centro
  Cra. 51A con 127A - Atabanza
  Cll. 137 BIS Tibabuyes
  Cra. 98 Chucua
  Cra. 70 D Potosí

Se realizará recorrido en campo obra e interventoría el martes 8 de abril de 2025, si surge alguna duda que se requiera de la entidad se realizaría visita el miércoles en horas de la tarde

Fase de diagnóstico: el contratista entregará a la interventoría planes de gestión, técnicos, ambientales, PMT, maquinaria, hojas de vida del personal social, diagnósticos
Estos diagnósticos que entregará el contratista serán de forma visual inicialmente, tipo de intervención y posterior la estructura tipo, el contratista informa que trabaja dos tipos de propuesta, la interventoría manifiesta que depende de la intervención así mismo se solicitara 3 propuestas.

La interventoría solicita al contratista compartir la información con la que ya cuentan para ir revisando, y se iniciará a realizar trabajo en conjunto para iniciar las actividades de diagnóstico.

La entidad aclara que el tramo se libera cuando esté completa y firmada la lista de chequeo, la cual debe estar firmada por los profesionales correspondientes

<u>Medios de comunicación</u>
La entidad solicita a la interventoría enviar un oficio notificando el correo oficial y el contratista debe informar a la interventoría del correo oficial
Grupo de wpp informativo

COMPONENTE SOCIAL
El contratista debe entregar el informe plan de dialogo ciudadano, se tendrán un personal asignado que son los auxiliares y guías cívicos, en plan de dialogo se debe plasma toda la información de cómo se va a hacer seguimiento al contrato, se debe cumplir con unos porcentajes % dentro ellos se encuentran: mano de obra no calificada, desplazados por la violencia etc.
La entidad aclara la importancia del profesional social y solicita a la interventoría un profesional idóneo para hacer el acompañamiento al contratista y dar respuesta en los tiempos para los requerimientos del contratista.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

La entidad solicita al contratista e interventoría que informen por el grupo o en comité la propuesta para la socialización en los diferentes frentes, la entidad revisa la agenda con el alcalde para poder definir y aprobar fechas y realizar el respectivo acompañamiento cuando la agenda lo permita.

COMPONENTE AMBIENTAL

En el sector de potosí hay 4 pinos con plaqueas que están interfiriendo en la vía, se propone dejar una bahía o se hace una isla. Se revisará en campo la mejor alternativa para esta propuesta que no afecte la estructura de la vía a futuro.

El Ing. Fabian Herrera es el ingeniero ambiental por parte de la alcaldía y explica los procedimientos para cargue y apertura del PIN: él es el profesional encargado para tramitar el PIN ambiental, tema de cargue de documentación, reportes mensuales, manejo RCD - decreto 507 de 2023
El Programa ambiental ya debe estar aprobado para la apertura del PIN, el contrato no se puede liquidar sin antes realizar el trámite del cierre del PIN
Se continua con el cargue de la documentación mensual hasta el final del contrato, termina el contrato se cierra el PIN

Se comparte el contacto del Ing. Fabian Herrera 311 8946142
Se recomienda hacer el trámite del conjunto profesional PIGA, la interventoría y el contratista

Prensa
Solicitar en la oficina de prensa el modelo y color de identificación del personal de interventoría y contratista
los modelos de las vallas son tipo IDU color rojo y solicitar las piezas institucionales.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recorrido en campo de los frentes priorizados | Contratista e interventoría | 8/4/2025 | |
| 2 | Enviar el listado actualizado de los frentes priorizados | supervisión | 7/4/2025 | |
| 3 | Radicar oficio de los correos oficiales de la interventoría | interventoría | 2/04/2025 | |
| 4 | Radicar oficio de los correos oficiales del contratista a la interventoría | Contratista | 7/5/2025 | |
| 5 | Solicitar en la oficina de prensa el modelo y color de identificación del personal de interventoría y contratista | Contratista e interventoría | 7/5/2025 | |
| | | | | |

Elaborada por: Profesional de Apoyo - Interventoría

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comite de seguimiento | | |
| **Fecha:** | 11 de abril del 2025 | **Hora de inicio:** 15:51 | **Modalidad:** ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta |
| **Lugar:** | Sala Hangar | **Hora de finalización:** ____ | |
| **Dependencia:** | Infraestructura | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 1090488111 | Maria A Cardenas | | Torres y Asociados | | | X | | | | | | | Mariaisabelcardenas@gmail.com | |
| CC | 79800692 | Luis Emilio Blanco | | Torres y Asocios | | | | | | | | | X | sibatorres@gmail.com | |
| CC | 527120303 | Claudia M. Forero | | Torres y Asociados | | | | | | | | | X | subatorresyasociados@gmail.com | |
| CC | 79797272 | David Hanao. | | Consorcio PG. | | | X | | | | | | | Residente CLPG12@Gmail.com | |
| CC | 1116998173 | Mauricio Romero | | Consorcio PG | | | X | | | | | | | ing.mromero@gmail.com | |
| CC | 88002563 | Paul Rangel Paez | | Consorcio PG | | | X | | | | | | | Sisoma@promotorapuga.com | |
| CC | 1098401779 | Gladys Becerra | | Consorcio PG | | | X | | | | | | | Contratacionsstconsorciopg@ | |
| | 1118566890 | Alejandro Ramirez S. | | FDLS Infraestructura | | | X | | | | | | X | ramirezingenieria@gmail.com | |
| | 79 | Exmelin Lamus F | | Infra - FDLS | | | X | | | | | | | exmelinlamus@gmail.com | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comite de Seguimiento | | |
| **Fecha:** | 11 de abril de 2025 | **Hora de inicio:** _____ | **Modalidad:** ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta |
| **Lugar:** | Sala Hangar | **Hora de finalización:** _____ | |
| **Dependencia:** | Infraestructura | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1018417359 | Christian Fabian Barrera Donoso | Director de Infraestructura | Inte Ltda 2 MV | | | | | | | | | X | christianbarrera@amcs.com.co. | |
| CC | 7/148 6[illegible] | [illegible] | — | FDLG [illegible] | | X | X | | | | | | X | algmed.vi gmi @gobierno.gov.co | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ No 02 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LOS COMPROMISOS QUE SE ACORDARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECORRIDO DE FRENTES DE PRIORIZACIÓN | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | 08/04/2025 | SI |
| 2 | REMISION DE OFICIO CON INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | TORRES Y ASOCIADOS | 11/04/2025 | SI |
| 3 | SOLICITAR A PRENSA LA APROBACION DE LOS MODELOS DE DOTACION DEL PERSONAL | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | 11/04/2025 | SI |
| 4 | LISTADO DE PRIORIZACIÓN FASE 1 | FDLS | 08/04/2025 | SI |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

| REVISIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CUMPLIÓ CON EL RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE LOS FRENTES DE PRIORIZACIÓN EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA DE OBRA. |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIÓ A LA ENTIDAD LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA POR MEDIO DE OFICIO EN EL CUAL SE RESALTAN LOS NÚMEROS DE TELÉFONO DE LOS PROFESIONALES, LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y LAS DIRECCIONES DE LAS OFICINAS. |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE RADICÓEL OFICIO ANTE LA OFICINA DE PRENSA CON EL MODELO DE LA DOTACIÓN DE INTERVENTORÍA AL CORREO DE PRENSA, CON EL FIN DE RECIBIR LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LOS CHALECOS DEL PERSONAL. |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE ENVIÓ EL LISTADO DE PRIORIZACIÓN 1, PERO QUE TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES REALIZADOS SE SOLICITA EL NUEVO ACTUALIZADO. |
| COMPONENTE TÉCNICO |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE DURANTE EL RECORRIDO DE OBRA A LOS FRENTES DE PRIORIZACIÓN SE EVIDENCIARON VARIOS FACTORES IMPORTANTES QUE PERMITEN REALIZAR UN CAMBIO EN EL ORDEN DE INTERVENCIÓN QUE ACTUALMENTE SE TIENE POR PARTE DE FDLS. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA QUE EL SEGMENTO VIAL 11010414 DEL SECTOR DE ATABANZA SEA MODIFICADO DE LA FASE DE PRIORIZACIÓN 1 TENIENDO EN CUENTA QUE SE EVIDENCIA DENTRO DE EL LA PRESENCIA DE RAÍCES DE VARIOS ELEMENTOS ARBOREOS LOS CUALES PUEDEN RETRASAR LA INTERVENCIÓN PUESTO QUE SE DEBE VERIFICAR ANTE LOS ENTES CORRESPONDIENTES EL ESTADO AMBIENTAL DE ESTOS. |
| LA INTERVENTORÍA APOYA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA DE REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL CIV 11010414 Y DEL SEGMENTO VIAL 11005794 DE LA CHUCUA ESTE ÚLTIMO TENIENDO EN CUENTA QUE SU INTERVENCIÓN NO ES URGENTE, YA QUE SU ESTADO ACTUALMENTE NO ES DEPLORABLE O INTRANSITABLE. |
| EL FDLS EN CABEZA DEL ING EXMELIN LEMUS Y EL ING ALEJANDRO RAMÍREZ, SE HACE UN AJUSTE A LA LISTA DE PRIORIZACIÓN FASE 1 TENIENDO EN CUENTA LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA POR LO CUAL DEFINEN EL LISTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: |

| SECTOR | CIV | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE PILOTO | 11006438 | CLL 129 D | KR 122 | KR 121 C |
| | 11011976 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C |
| | 11011977 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| | 11006546 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 |
| | 11011978 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 |
| | 11006617 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |
| POTOSÍ | 11011188 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |
| TIBABUYES | 11005215 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |
| NIZA SUR | 11010621 | CL 119 | KR 70 | KR 70C |
| SUBA CENTRO | 11005331 | KR 92 | CL 145A | CL 145B |
| PÓRTICO | 11004156 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C |
| | 11013439 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C |
| | 11004110 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 |
| | 11004080 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A |
| NIZA SUR | 11010613 | CL 119 | KR 70G | KR 71A |
| CASABLANCA | 11005566 | CL 146F | KR 75 | KR 74 |
| | 11014376 | CL 146F | KR 74 | KR 73A |
| | 11005623 | CL 146F | KR 73A | KR 73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11005728 | CL 146F | KR 73 | KR 72C |
| | | 11005765 | CL 146F | KR 72C | KR 72B |

UNA VEZ DEFINIDO EL LISTADO DE PRIORIZACIÓN 1 LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ASIGNA ALGUNOS SEGMENTOS VIALES LOS CUALES SERÁN OBJETO DE INTERVENCIÓN PARA LA FASE 2 LOS CUALES DEBEN SER VISITADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA SABER SI EXISTE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECIAL QUE NO PERMITA SU INTERVENCIÓN DENTRO DE ESTA FASE, LOS CIVs MENCIONADOS SON:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POTOSÍ | 11006116 | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 |
| TIBABUYES | 11008694 | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 |
| TIBABUYES | 11010147 | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A |
| LA CHUCUA | 11010612 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 |
| LA CHUCUA | 11004683 | KR 109 A | CL 136A | CL 139 |

PARA COMPLETAR LOS 8 FRENTES DE LA SEGUNDA FASE, EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ LAS VISITAS CORRESPONDIENTE Y LOS ESCOGERÁ DE ACUERDO A LA LOGÍSTICA DE EJECUCIÓN.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL DÍA LUNES 14 DE ABRIL, EL CONTRATISTA INICIARÁ CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN DE REDES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ESTA ACTIVIDAD INICIARÁ EN EL FRENTE DE CASABLANCA Y SE HARÁ EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

LA INTERVENTORÍA SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EL LISTADO DEL PERSONAL DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTE DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

LA ENTIDAD INDICA QUE SE DEBE REMITIR UN OFICIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA AL EAB CON EL LISTADO DE PRIORIZACIÓN 1 Y 2 EL DÍA LUNES SIN FALTA, SOLICITANDO EL VACTOR PARA EL DIAGNÓSTICO DE DICHAS REDES.

LA ENTIDAD SOLICITA A LA INTERVENTORÍA EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA ECONÓMICA POR LO CUAL SOLICITA QUE AL MIÉRCOLES 16 DE ABRIL YA DEBEN ESTAR LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE RADICADAS.

LA ENTIDAD INDAGA POR LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR SI EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ESTÁN DE ACUERDO CON LA ENTREGADA O SE HARÁ ALGUNA MODIFICACIÓN, A LO CUAL LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN REALIZAR UNA REVISIÓN A DICHA LISTA Y ENTREGAR LAS OBSERVACIONES QUE SE TENGA EN EL PRÓXIMO COMITÉ.

LA ENTIDAD SOLICITA LOS PLANES DE GERENCIA DE LOS CONTRATOS A LO CUAL SE MANIFIESTA QUE EL DÍA 16 DE ABRIL QUEDARAN RADICADOS ANTE EL FDLS.

LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LAS FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS SEGMENTOS VIALES, A LO CUAL EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE A PARTIR DEL LUNES 14 DE ABRIL SE INICIARA A RECOPILAR LA INFORMACIÓN EN CAMPO DE CADA UNO DE ESTOS PARA POSTERIORMENTE EMPEZAR CON LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN.

EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTARÁ DANDO LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO.

**COMPONENTE PMT**

LA INTERVENTORÍA EXPRESA, QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SE REMITIERON 6 PMTs LOS CUALES SERÁN REVISADOS POR EL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE Y SI HAY OBSERVACIONES SERÁN REMITIDAS EL DÍA MARTES 15 DE ABRIL.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE UNA VEZ REVISADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA LOS PMT, ESTOS SERÁN RADICADOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA SU APROBACIÓN, SE ESTIMA EN 15 DÍAS APROXIMADAMENTE PARA ESTE TRÁMITE.

**COMPONENTE SOCIAL**

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE REMITIÓ A LA INTERVENTORÍA LA PRIMERA VERSIÓN DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO, POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA SE REMITIRÁN LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2025.

| |
|---|
| LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LA UBICACIÓN DEL PAC SIN EMBARGO EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE AÚN NO CUENTAN CON ESTE A LO CUAL SE LE DA UN PLAZO HASTA EL 21 DE ABRIL PARA SU DISPOSICIÓN. |
| **COMPONENTE AMBIENTAL** |
| EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE YA SE REMITIÓ A LA INTERVENTORÍA EL MAO CON EL FIN DE QUE SE APRUEBE O SE LE REMITAN LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES. |
| **COMPONENTE SST** |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. |

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSPECCIÓN DE REDES E INICIO DE AUSCULTACION POR EL TRAMO DE CASABLANCA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 14/04/25 | Terminado fase 1 inspección se terminó Casablanca Y Tibabuyes se inició |
| 2 | OFICIO AL EAB CON LISTADO DE PRIORIZACIÓN | TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 14/04/25 | 15/4/2025 ok |
| 3 | HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA | TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 16/04/25 | 22/4/2025 ok |
| 4 | PLAN DE GERENCIA | CONSORICO CONSERVACION PG | MIÉRCOLES 16/04/2025 | |
| 5 | INICIO DE OBRA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | |
| 6 | OFICIO OBSERVACIONES A PMTs RADICADOS | TORRES Y ASOCIADOS | MARTES 15/04/2025 | 16/4/2025 ok |
| 7 | OFICIO OBSERVACIONES PLAN DE DIÁLOGO | TORRES Y ASOCIADOS | MIÉRCOLES 16/04/2025 | 16/4/2025 ok |
| 8 | OFICIO OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA | TORRES Y ASOCIADOS | MIÉRCOLES 16/04/2025 | Ok personal maquinaria pendiente |
| 9 | UBICACIÓN DEL PAC | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 21/04/2025 | En proceso Firmando contrato a 3 cuadras alcaldía al occidente |
| 10 | OFICIO OBSERVACIONES MAO | TORRES Y ASOCIADOS | MIÉRCOLES 16/04/2025 | 23/4/2025 En revisión |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RECORRIDO INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE LA SEGUNDA FASE, PLANTEAR LOS FRENTES QUE SE DEBERÍA INTERVENIR | CONSORCIO CONSERVACION PG / TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 14/04/25 | Se realizo el recorrido |

NOTA: AGREGUE O ELIMINE LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS PARA REGISTRAR LOS ASISTENTES Y LOS COMPROMISOS DE LA REUNIÓN.

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoría
FECHA: 25 de abril de 2025 LUGAR: Hangar Alcaldía
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TE | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATIST | | | | |
| Claudia Marcela Forero | | | | | | | | | | Interventoría Torres & Asociados | Subatorres y asociados @gmail.com | 3115236633 | |
| Angie Henao Cardona | | | X | | | | | | | Interventoría Torres y Asoc. | subatorres y asociados @gmail.com | 3106273842 | Angie H. |
| Laura Brigitte Castaño González | | | | 1 | X | | | | | Interventoría Torres y Asoc. | subatorres y asociados @gmail.com | 3138388798 | |
| Andres Felipe Ordoñez Gomez | | | | | | | | | | Interventoría Torres y asociados | subatorres y asociados @ gmail.com | 3103658479 | |
| Paul Rangel Páez | | | X | | | | | | | CSO Conservación PG | Sisoma@promotoraspg .com | 3228740659 | |
| Mauricio Romero V | | | X | | | | | | | Cso Conservación PG | ing.mromero0 @gmail.com | 3208079294 | |
| OSCAR MAYO | | | | | | | | | | CSO CONSERVACIÓN PC | ingenieria@promotoraspg.com | 3203406028 | |
| Luis O. Pulido G | | | | | | | | | | Cso Conservacion PC | gerencia@promotoraspg.com | 3132830093 | |
| DAVID A. GARCIA S | | | | | | | | | | CSO CONSERVACION PG | RESIDENTE CCPGTZ@GMAIL.COM | 3212028335 | |
| EXMESIN LOPEZ F | | | X | | | | | | | FDLS INGENIERIA | ing.lopezfranco@gm | 7-31-2025 | |
| ALEJANDRO VIANA | | X | X | | | | | | X | FDLS INFRAESTRUCTURA | alejandro.viana@bogota.gov.co | | |
| Alejandro Ramírez Sandoval | | | X | | | | | | X | FDLS infraestructura. | FDLS ingenieriasramirez@gmail.com | 6020022 Ext-1194 | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____

FECHA: 25 de abril de 2025 LUGAR: Hangar Alcaldía

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento

HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: _____

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TE | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATIST | | | | |
| Maria A Cadena | | | X | | | | | | | Torres y Asociados | — | 3114752609 | Maria AC |
| Christian Fabian Barrera | | | X | | | | | | | Torres y Asociados | | 3132471471 | |
| Luis Enrico Blanco | | | X | | | | | | | Torres y Asociados | | 3102009055 | |
| [illegible] | | X | X | | | | | | X | Fras Consultoría | — | 3[illegible] | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ NO 03 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LOS COMPROMISOS QUE SE ACORDARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APIQUES E INSPECCION DE REDES | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 14/04/25 | SI |
| 2 | OFICIO AL EAB CON LISTADO DE PRIORIZACION | TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 14/04/25 | SI |
| 3 | HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA | TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 16/04/25 | SI |
| 4 | PLAN DE GERENCIA | CONSORICO CONSERVACION PG | MIERCOLES 16/04/2025 | NO |
| 5 | INICIO DE OBRA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | SIGUE EN PIE |
| 6 | OFICIO OBSERVACIONES A PMTs RADICADOS | TORRES Y ASOCIADOS | MARTES 15/04/2025 | SI |
| 7 | OFICIO OBSERVACIONES PLAN DE DIALOGO | TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 16/04/2025 | SI |
| 8 | OFICIO OBSERVACIONES A DOCUMENTACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA | TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 16/04/2025 | SI |
| 9 | UBICACIÓN DEL PAC | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 21/04/2025 | NO |
| 10 | OFICIO OBSERVACIONES MAO | TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 16/04/2025 | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RECORRIDO INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE LA SEGUNDA FASE, PLANTEAR LOS FRENTES QUESE DEBERIA INTERVENIR | CONSORCIO CONSERVACION PG / TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 14/04/25 | SI |

**REVISIÓN DE COMPROMISOS**

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE MUESTRAS PARA LOS ESTUDIOS DE SUELOS EN LOS FRENTES DE PRIORIZACION 1 EXCEPTO EN SUBA CENTRO TENIENDO EN CUENTA EL TRANSITO DEL SITP Y EL ANCHO DE LA VIA ES REDUCIDO POR LO CUAL QUEDA PENDIENTE.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIÓ AL EAB EL OFICIO CORRESPONDIENTE CON EL LISTADO DE PRIORIZACIONES Y LA SOLICITUD DE VACTOR.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE RADICARON LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL QUE CORRESPONDE, SIN EMBARGO, LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE ESTA INFORMACION ESTA INCOMPLETA TENIENDO EN CUENTA QUE FALTA PERSONAL DE TOPOGRAFIA, ESPECIALISTAS Y PERSONAL DE APOYO Y SE DA UN PLAZO HASTA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL PARA LA REMISIÓN DE LAS HOJAS PENDIENTES.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA NO SE CUMPLIO CON LA REMISION DEL PLAN DE GERENCIA, LA ENTIDAD SOLICITA LA RADICACION DE ESTE EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INICIO DE OBRA SIGUE EN PIE PARA EL 12 DE MAYO DE 2025.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIO EL OFICIO DE OBSERVACIONES A LOS PMTs EN LA FECHA ACORDADA AL CONTRATISTA DE OBRA Y QUE ESTAS FUERON SUBSANADAS A LA MENOR BREVEDAD POR LO CUAL A LA FECHA TENEMOS 4 PMTs RADICADOS ANTE LA SDM PARA APROBACION.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE POR PARTE DEL COMPONENTE SOCIAL SE ENVIARON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE DIALOGO Y QUE SE ENCUENTRAN A LA ESPERA DE LA SUBSANACION DE TODAS ESTAS.

LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO CUMPLIO CON LA INSTALACION DEL PAC EN LA FECHA ESTIPULADA, SIN EMBARGO, AL DIA 25 DE ABRIL YA CUENTAN CON LA UBICACIÓN DE DICHO PUNTO.

LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE REMITIO DOS OFICIOS CON LAS OBSERVACIONES DEL PERSONAL Y LA MAQUINARIA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL DIA 25 DE ABRIL REMITIÓ LAS OBSERVACIONES AL MAO CON EL FIN DE QUE SEAN SUBSANADAS A LA MAYOR BREVEDAD.

LA INTERVENTORIA INDICA QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO DE LOS SEGMENTOS VIALES DE FASE 2 INDICADOS POR LA ENTIDAD Y SE REVISARON OTRAS OPCIONES PARA INCLUIR A ESTA FASE.

**COMPONENTE TÉCNICO**

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS DADOS PARA LA SEGUNDA FASE POR PARTE DE LA ENTIDAD ENTRE LOS CUALES TENEMOS

| CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11006116 | 53781 | CALZADA | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 | LA CHUCUA |
| 11008694 | 167909 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE |
| 11010147 | 167437 | CALZADA | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO |
| 11010612 | 168694 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR |
| 11004683 | 173291 | CALZADA | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | VILLA MARIA I |

EL CONTRATISTA DE OBRA EN CONCORDANCIA CON LA INTERVENTORÍA MANIFIESTAN QUE EL SEGMENTO VIAL 11006116 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO POR LO CUAL NO ES NECESARIA UNA INTERVENCION Y ES UNA OPCION PARA PROCESO DE EXCLUSIÓN.

LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SI LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA ESTAN DE ACUERDO EN QUE EL SEGMENTO VIAL 11006116 NO AMERITA INTERVENCION SE HAGA LA RESPECTIVA SOLICITUD DE EXCLUSION SOPORTADA POR PARTE DE SUS ESPECIALISTAS.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE UNA VEZ VISITADOS LOS SEGMENTOS VIALES ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA EN EL SECTOR DE NIZA SUR SE EVIDENCIA QUE EXISTEN OTROS 3 SEGMENTOS MAS CONTINUOS A LA INTERVENCION QUE ESTAN ASIGNADOS AL CONTRATO 1009, POR LO CUAL SOLICITA VER LA POSIBILIDAD DE HACER UN AJUSTE QUE PERMITA QUE SEA EL CONTRATO DE OBRA 1010 EL QUE LOS EJECUTE.

LA ENTIDAD INDICA QUE SE DEBE HACER UNA REVISIÓN CON EL CONTRATO 1009 PARA SABER SI SE TIENE ALGUN ADELANTO POR PARTE DE ELLOS EN DIAGNOSTICOS O SI ESTAN DE ACUERDO CON REALIZAR EL AJUSTE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CONSERVACIÓN PG.

EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EN EL SEGMENTO VIAL 11004683 HAY UNAS VIVIENDAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE CIMENTACION EN LAS CUALES SE EVIDENCIA AGRIETAMIENTO E INCLINACIÓN.

LA ENTIDAD INDICA QUE SE DEBE REMITIR UN OFICIO POR PARTE DE INTERVENTORÍA AL IDIGER SOLICITANDO UN CONCEPTO TECNICO DE ESTA SITUACION CON EL FIN DE QUE SE PROGRAME UNA VISITA.

LA INTERVENTORIA INDICA QUE REALIZO RECORRIDO PARA VERIFICAR OTRAS OPCIONES DE INTERVENCION PARA LA FASE DE PRIORIZACION 2 EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SE TIENEN LOS SIGUIENTES CIVs LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE UN SECTOR RESIDENCIAL QUE USA TALANQUERA:

| CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010586 | 167135 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 11010578 | 167136 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 11010602 | 167018 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES |

LA ENTIDAD INDICA QUE EL USO DE TALANQUERA LE DA CARÁCTER DE PRIVATIZACION A UNA VIA POR LO CUAL DEBE REALIZAR UNA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE LA ZONA PARA VERIFICAR LA POSIBILIDAD DEL RETIRO DE ESTA Y PODER CONTINUAR CON LA INTERVENCION DE LOS SEGMENTOS.

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LOS SEGMENTOS VIALES 11005418, 11005417 Y 11005536 DEL SECTOR DE SUBA CENTRO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO AMERITAN UNA INTERVENCION PRIORITARIA ESTE CONCEPTO LO DEBEN DAR LOS ESPECIALISTAS DE PAVIMENTOS.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SI EL SEGMENTO VIAL 11005331 DE SUBA CENTRO ES VIABLE DEJARLO EN FASE 1 TENIENDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD EN LA DEFINICION DEL PMT.

LA ENTIDAD INDICA QUE ESTE SEGMENTO VIAL DE SUBA CENTRO SERA PASADO A FASE 2 TENIENDO EN CUENTA LOS CONTRATIEMPOS PRESENTADOS POR EL PMT.

LA ENTIDAD INDAGA SI YA SE HIZO EL RECORRIDO DE TODOS LOS SEGMENTOS VIALES ADJUDICADOS AL CONTRATO DE OBRA 1010.

LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE EL DIA MARTES 29 DE ABRIL SE LLEVARA A CABO RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA PARA CONOCER LOS CIVs FALTANTES.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTO DOS ITEMS NO PREVISTOS PARA APROBACION PARA LO CUAL SOLICITA EL LINEAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO SU VISTO BUENO.

LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE DEBE REALIZAR EL APU DE LA ACTIVIDAD NO PREVISTA Y ADJUNTAR LA JUSTIFICACION DEL PRECIO YA SEA DEL IDU, EAAB O POR COTIZACIONES, ADICIONAL A ESTO SE DEBE DILIGENCIAR EL ACTA DE FIJACION LA CUAL DEBE IR FIRMADA POR LOS DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES.

| |
|---|
| LA ENTIDAD INDICA QUE PARA LA APROBACIÓN DE LOS ITEMS NO PREVISTOS NO ES NECESARIO REALIZAR MODIFICATORIOS AL CONTRATO SIMPLEMENTE SE APRUEBA POR INTERVENTORÍA Y POSTERIORMENTE POR LA SUPERVISIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. |
| LA ENTIDAD SOLICITA COMUNICARSE CON EL INGENIERO MAURICIO MAHECHA DEL EAB PARA VERIFICAR LAS REDES DEL SECTOR DE PORTICO. |
| LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE REMITIO AL EAB UN DOCUMENTO CON LOS SEGMENTOS DE PRIORIZACION 1 SIN EMBARGO NO TUVIERON RESPUESTA, TENIENDO EN CUENTA EL AJUSTE HECHO EN EL LISTADO SE HABLARA NUEVAMENTE CON LA INGENIERA GINA CON EL FIN DE REMITIRLE NUEVAMENTE DICHO LISTADO ACTUALIZADO. |
| LA ENTIDAD CONTRATANTE LE RECUERDA A LA FIRMA INTERVENTORÍA QUE DEBE CUMPLIR A CABALIDAD CON EL PERSONAL, INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS OFRECIDOS EN LA OFERTA ECONÓMICA, LO ANTERIOR DEBE SER REPORTADO Y SOPORTADO EN LAS DIFERENTES ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.<br>ASÍ MISMO, EL INTERVENTOR DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPUESTOS POR EL EJECUTOR DEL CONTRATO |
| LA ENTIDAD LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA GEOREFERENCIACION DE LOS SEGMENTOS VIALES, PARA LO CUAL, EL CONTRATISTA MANIFIESTA, QUE ESTO SE REALIZARA PARA LA ENTREGA FINAL DE LOS PLANOS RECORD. |
| LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SE PUEDE CONTAR CON LAS ESTRUCTURAS DE LOS SEGMENTOS DE PRIORIZACION 1. |
| EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE APROXIMADAMENTE EN 15 DIAS SE REALIZARÁ UNA ENTREGA PARCIAL DE LOS MISMOS. |
| LA ENTIDAD INDICA QUE LA INTERVENTORIA DEBE PRESENTAR SU CUENTA DE COBRO LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL MES, POR LO CUAL SOLICITA LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION FALTANTE. |
| UNA VEZ REALIZADA LA REUNION CON LOS PROFESIONALES DEL CONTRATO 1009 SE TOMA LA DECISION DE QUE CADA UNO EJECUTE LOS SEGMENTOS YA ADJUDICADOS ESTO TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES PREVIAS QUE CADA GRUPO HA REALIZADO A LA FECHA. |
| COMPONENTE PMT |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE DIO VISTO BUENO A LOS PMTs DE LOS FRENTES DE CASABLANCA, NIZA SUR, TIBABUYES Y POTOSI LOS CUALES YA FUERON RADICADOS A LA SDM. |
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE EL PAGO DEL COMPONENTE SI SE DEBE PRESENTAR UN PRESUPUESTO POR SEGMENTO VIAL O SI LA SUPERVISION MANEJA OTRA FORMA DE GENERAR DICHO PAGO. |
| LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE EL PAGO DE LOS COMPONENTES SE HAGA SEGÚN EL AVANCE DEL PROYECTO AL COSTO DIRECTO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE SE DISCRIMINA DICHO VALOR POR SEGMENTO VIAL. |
| LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LA LISTA DE CHEQUEO DE CALIFICACION DEL COMPONENTE PMT. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LAS LISTAS DE CALIFICACIONES INICIAN UNA VEZ HAYAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DE OBRA. |
| COMPONENTE SOCIAL |
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE EL PUNTO PAC DEL CONTRATISTA DE OBRA EL CUAL A LA FECHA DEL COMITÉ AUN NO ESTA INSTALADO, PERO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE YA SE ENCUENTRA UBICADO, POR LO CUAL, EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DE 2025 YA SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE. |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA EL LISTADO DEL PERSONAL SOCIAL QUE SE VA IMPLEMENTAR PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL COMPONENTE. |
| LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA LA CUAL DEBE ESTAR COMPUESTA POR LOCALIDAD, VULNERABILIDAD, CONFLICTO ARMADO Y PERSONAL FEMENINO. |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA EL AVISO PREVIO A LAS REUNIONES DE INICIO PARA CADA UNO DE LOS FRENTES. |
| COMPONENTE AMBIENTAL |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

| |
|---|
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE REMITIERON LAS OBSERVACIONES AL MAO Y SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SUBSANACIONES. |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA EL INVENTARIO FORESTAL DE LOS FRENTES DE OBRA PROXIMOS A INICIAR. |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES PARA LA APERTURA DEL PIN AMBIENTAL. |
| **COMPONENTE SST** |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE REMITIO EL OFICIO DE OBSERVACIONES AL PERSONAL Y A LA MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA PARA LA BUENA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DANDOLE CLARO CUMPLIMIENTO A LA NECESIDAD QUE SE EXIGE EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. |

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA | TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 28/04/25 | |
| 2 | PLAN DE GERENCIA | CONSORICO CONSERVACION PG | MIERCOLES 29/04/2025 | |
| 3 | INICIO DE OBRA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | |
| 4 | OFICIO AL IDIGER | TORES Y ASOCIADOS | LUNES 28/04/2025 | |
| 5 | RECORRIDO DE SEGMENTOS VIALES | CONSORCIO CONSERVACION PG Y TORRES Y A SOCIADOS | MARTES 29/05/2025 | |
| 6 | ENTREGA DE AVANCE DEL DISEÑO DE ESTRUCTURAS | CONSORCIO PG | LUNES 12/05/2025 | |

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoría Torres y Asociados
FECHA: 09 Mayo 2025 LUGAR: Ofc Interventoría
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite Seguimiento
HORA DE INICIO: 11:20 HORA DE FINALIZACIÓN: 1:15 pm

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TE | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATIST | | | | |
| Luis Emiro Blanco | | | | | | | | | X | Torres Asociados SAS | subatorresyasociados 2025 @gmail.com | 3102009455 | |
| Claudia M. Forero | | | | | | | | | | Torres y Asociados | subatorresyasociados 2025 @gmail.com | 3115236633 | |
| Angie Paola Toro | | | | | | | | | | Torres y Asociados | subatorresyasociados 2025@gmail.com | 3196603599 | |
| Paul Rangel Páez | | | | | | | | | X | CSO Conservación | sisoma@promotorapuga.com | 3228770857 | |
| ESCRIBA FIRMA | | | | | | | | | X | CSO Construcción PG | ingenieriacepromotiles.com | 3203406028 | |
| [illegible] | | | | | | | | | X | CSO Conservación PG | [illegible] | 3[illegible] | |
| Cindy Becerra | | | | | | | | | | CSO Conservacion PG | [illegible] | [illegible] | |
| Angie Herao Cardona | | | X | | | | | | X | Torres y Asociados | subatorresyasociados2025@g. | 3106273842 | |
| Maria A Cardenas Lizarazo | | | X | | | | | | | Torres y Asociados | " | 3114752809 | |
| Daniel felipe Suarez | | | X | | | | | | | Torres y Asociados | Subatorresyasociadas2025@ | 3115235677 | |
| EXMELIN HANIO LEMUS F | | | X | | | | | | | FDLS - INTERVENTOR | ing.lemus.tobar@gmail | 303 342 8837 | |
| Chrishan Fabian Barrera Dam | | | X | | | | | | | Torres y asociados SAS | chrishan.barrera@amcia.com.co | 313 247 4720 | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Interventoría Torres y Asociados
FECHA: 09 mayo de 2025 LUGAR: Ofc Interventoría
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento
HORA DE INICIO: 11:20 am HORA DE FINALIZACIÓN: 1:15 pm

ASISTENTES:

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIO | TÉCNICO/ | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIO | LIBRE | CONTRATI | | | | |
| Alejandra Vanegas | | X | X | | | | | | X | Torres Interventoría | alejandra.vanegas@gobiernobogota.gov.co | 3157287275 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ NO 04 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA | TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 28/04/25 | SI |
| 2 | PLAN DE GERENCIA | CONSORICO CONSERVACION PG | MIERCOLES 29/04/2025 | SI |
| 3 | INICIO DE OBRA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | SIGUE EN PIE |
| 4 | OFICIO AL IDIGER | TORES Y ASOCIADOS | LUNES 28/04/2025 | SI |
| 5 | RECORRIDO DE SEGMENTOS VIALES | CONSORCIO CONSERVACION PG Y TORRES Y A SOCIADOS | MARTES 29/05/2025 | SI |
| 6 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS | CONSORCIO PG | SABADO 12/05/2025 | SIGUE EN PIE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| REVISIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CUMPLIO CON LA RADICACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO. |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA REMITIO EL PLAN DE GERENCIA EL MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 Y YA FUE RADICADO. |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INICIO DE OBRA SE TIENE PREVISTO PARA EL 12 DE MAYO DE 2025 Y SIGUE EN PIE. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE REMITIO EL OFICIO A IDIGER SOLICITANDO VISITA EN VILLA MARIA LO CUAL SE CUMPLIO. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA PRIORIZACION 1 SE DEBEN ENTREGAR EL 12 DE MAYO POR PARTE DEL CONTRATISTA. |
| COMPONENTE TECNICO |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE LA FASE DE PRIORIZACION 2 SE VE AFECTADA POR LA VISITA DE IDIGER AL SEGMENTO VIAL 11004683 DE VILLA MARIA DADA LA RESTRICCION DE CIRCULACION PEATONAL EN LOS ANDENES DE LAS DOS VIVIENDAS AFECTADAS POR LO CUAL ESTE CIV SE TENDRIA QUE PASAR A FASE 3 O 4. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE DURANTE LA VISITA REALIZADA EN COMPAÑÍA DE IDIGER SE SOLICITA LA EVACUACION DE LOS DOS PREDIOS DADO EL ESTADO ESTRUCTURAL EN EL CUAL SE ENCUENTRAN, POR PARTE DEL INGENIERO FELIPER DE IDIGER SE PASARA UN IINFORME TECNICO EL CUAL SERA ALLEGADO AL CORREO DE LA INTERVENTORIA EN APROXIMADAMENTE 10 DIAS. |
| EL CONTRATISTA SOLICITA VALIDAR EL CAMBIO DEL SEGMENTO 11004683 DEL FASE DE PRIORIZACION 2 PARA FASE 3 DADA LAS CIRCUNSTANCIAS, SIN EMBARGO, ES DE ANOTAR QUE LOS PROPIETARIOS ENTREGAN UN DOCUMENTO EN EL CUAL EXIMEN A LA ALCALDIA DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA INTERVENCION DE LA VIA, A LO CUAL SE LES HACE LA OBSERVACION QUE EN DICHO DOCUMENTO SE DEBE EXIMIR TANTO A LA INTERVENTORIA COMO AL CONTRATISTA Y A LA ALCALDIA DE SUBA. |
| EL FDLS EN CABEZA DEL ING EXMELIN LEMUS MANIFIESTA QUE POR PARTE DEL EDIL JOSE SE LE MENCIONO QUE EL ESTADO DE LAS VIVIENDAS NO AFECTA LA INTERVENCION DE LA VIA, SIN EMBARGO, LA ENTIDAD ESPERARA EL INFORME TECNICO DEL IDIGER PARA VERIFICAR ESTE TEMA Y TOMAR LA DECISION DE SI SE INTERVIENE O NO ESTE SEGMENTO VIAL. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MENCIONA QUE INICIARA LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA LOS SEGMENTOS VIALES DE PRIORIZACION FASE 2 POR LO CUAL NECESITA UNA DEFINICION CLARA DE LOS CIVs DE ESTA FASE. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE SE DE VIABILIDAD PARA LA INTERVENCION DE ESTE SEGMENTO EL TEMA COMPLICADO PUESTO QUE LOS ANDENES NO PODRAN SER UTILIZADOS COMO SENDEROS PEATONALES A LA HORA DE LAS INTERVENCIONES. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE DURANTE LA REUNION DEL EAB SE DEJO CLARIDAD QUE NO TIENEN LA DISPONIBILIDAD DE VACTOR Y EQUIPO CCTV PARA PRESTAR POR LO CUAL RECOMIENDAN AL CONTRATISTA HACERLO POR CUENTA PROPIA A COSTO DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA SE MENCIONA QUE SI SE LLEVA A CABO ALGUNA INTERVENCION EN LAS RED DE ACUEDUCTO SE DEBEN CAMBIAR TODAS LAS MANGUERAS DE LAS DOMICILIARIAS Y SI SE REQUIEREN CIERRES SE DEBEN ENTREGAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES PARA LOS EMPATES CON ANTERIORIDAD, SE LLEVARA A CABO UNA REUNION EL DIA MARTES EN ALGUNOS SEGMENTOS VIALES DEL LOTE 1 A LA CUAL ASISTIRA EL RESIDENTE DE OBRA LOTE 2 CON EL FIN DE MOSTRARLE LA SITUACION DE PORTICO. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SEGÚN EL EAB HAY QUE VERIFICAR SI LAS BOCACALLES A LAS QUE VAMOS A REALIZAR LOS EMPATES DE SUMIDEROS EN EL FRENTE DE PROTICO ACTUALMENTE CUENTAN CON GARANTIAS O POLIZAS DE ESTABILIDAD PORQUE SI ES ASI NO PODRIAMOS REALIZAR DICHA INTERVENCION. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE EL EAB SOLICITO ACOMPAÑAR AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD. |
| LA ENTIDAD INDICA QUE ENTREGUEMOS UNA PROGRAMACION DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD AL EAB, PERO SIN EMBARGO NO RETRASEMOS NUESTRAS ACTIVIDADES SI LOS PROFESIONALES DE ELLOS NO ASISTEN. |
| LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE CUALQUIER CONEXIÓN ERRADA DEBE SER ELIMINADA Y REPORTADA AL EAB. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE YA SE TIENE LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR PARA APROBACION DE INTERVENCION POR SEGMENTO VIAL LA CUAL DEBE CUMPLIR A CABALIDAD EL CONTRATISTA DE OBRA PARA PODER DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE EL DIA LUNES 12 DE MAYO REMITIRA LA PROGRAMACION GENERAL SIN EMBARGO DENOTA QUE ESTA PUEDE SER OBJETO DE AJUSTES. |
| LA ENTIDAD INDICA QUE SEGÚN LAS PERSPECTIVA DE LA SUPERVISION EL CONTRATO 1010 DE CONSERVACION SE ENCUENTRA ATRASADO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, ESTO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION PRELIMINAR NECESARIA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DE OBRA. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE EL DIA 15 DE MAYO SE HARA ENTREGA DEL PRIMER PAQUETE DE DISEÑO DE PAVIMENTOS A LA INTERVENTORIA CON EL FIN DE QUE ESTE SEA REVISADO POR EL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE. |

LA ENTIDAD INDICA QUE LA ZONA VERDE DE CASABLANCA QUE COLINDA CON LA ESPOL SE DEBE ALINEAR Y DEJARLO LO MAS ESTETICAMENTE POSIBLE.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE CONTINUA CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN SUBA CENTRO Y PARQUE PILOTO DURANTE ESTA SEMANA CON EL FIN DE TERMINAR E INICIARLA MATERIALIZACION DE LOS DATOS.

LA ENTIDAD INDAGA POR LOS APUs CONTRACTUALES LOS CUALES EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR EL 12 DE MAYO DE 2025 A LA INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA INDAGA SOBRE LA INCLUSION DE LOS SEGMENTOS VIALES DE NIZA SUR QUE SE MENCIONARON DURANTE EL RECORRIDO.

LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE PARA PODER LLEVAR A CABO CUALQUIER INCLUSION LA COMUNIDAD DEBE HACER LA SOLICITUD FORMAL, ADICIONAL A ESTO SE DEBE CONTAR CON UN BALANCE FINANCIERO DEFINIDO PARA CONOCER SI ALCANZA LA PLATA Y QUE SE PRESENTEN LAS ESTRUCTURAS, ADICIONAL A ESTO VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ARBOLES ANTE LA SECRETARIA DE AMBIENTE.

LA ENTIDAD INDAGA SI EXISTEN SEGMENTOS PARA EXCLUSION A LO CUAL LA INTERVENTORIA INDICA QUE SI EXISTEN 10 CIVs QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO SERIAN OBJETO DE INTERVENCION PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR UN INFORME TECNICO AVALADO POR EL ESPECIALISTA.

EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE EL DIA MARTES 13 DE MAYO ENTREGARA EL INFORME TECNICO DE LA EXCLUSION DE LOS SEGMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO LOS CUALES SON:

| CIV | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014399 | 91013890 | CALZADA | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| 11014396 | 91013885 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| 11014397 | 91013842 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| 11005418 | 171265 | CALZADA | CLL 145 A | CRA 90 A | CRA 91 | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 11005417 | 171267 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO NORTE | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 11005536 | 171266 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO SUR | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 11006116 | 53781 | CALZADA | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 | LA CHUCUA | RECONSTRUCCIÓN |
| 11009644 | 515990 | ANDEN | CL 129 | KR 56 | KR 56A | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 11009650 | 515930 | ANDEN | CL 129 | AK 55 | KR 55B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 11009653 | 515910 | ANDEN | CL 129 | KR 55 B | KR 55B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |

LA INTERVENTORIA QUEDA A LA ESPERA DE LA REMISION DEL INFORME TECNICO DE EXCLUSION CON EL FIN DE QUE SEA REVISADO Y AVALADO UNA VEZ VERIFICADOS EN CAMPO.

LA INTERVENTORA INDICA QUE LA CUENTA DE COBRO N°1 DE TORRES Y ASOCIADOS SAS SERA ALLEGADA EL DIA LUNES 12 DE MAYO DE 2025.

LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LA FECHA DE INICIO DE OBRA DE CASABLANCA, A LO CUAL EL CONTRATISTA INDICA QUE UNA VEZ REMITIDO EL PAQUETE DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y SEAN APROBADOS POR LA INTERVENTORIA SE HARA LA REUNION DE INICIO FINALIZANDO EL MES DE MAYO Y SE PROGRAMARIA EL INICIO DE OBRA PARA EL 03 DE JUNIO DE 2025.

| |
|---|
| EL CONTRATISTA LE SOLICITA A LA ENTIDAD LA DEFINICION DE LA FASE DOS, LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE A MAS TARDAR EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO YA SE TENDRA LA FASE 2 DEFINIDA. |
| COMPONENTE PMT |
| EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE A LA FECHA YA INICIO LAS SOCIALIZACIONES SOLICITADAS POR LA SDM PARA LA APROBACION DEL PMT EN LOS FRENTES DE COSTA AZUL, POTOSI, CASABLANCA Y SE TIENE PROGRAMADO PARA EL DIA 10 DE MAYO EN NIZA SUR. |
| EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL DIA VIERNES 23 DE MAYO SE ESPERA SALGAN APROBADOS LOS PMTS |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE EL DIA 8 DE MAYO DE 2025 LLEGARON UNAS OBSERVACIONES DE TRANSMILENIO PARA EL PMT DE SUBA CENTRO Y SOLICITAN LA RADICACION DE DICHO DOCUMENTO PARA VERIFICAR Y DAR EL VISTO BUENO. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE DEBEN TENER EN CUENTA QUE EN LA ZONA TRANSITAN BUSES PATRONES LO QUE PUEDE DIFICULTAR EL TEMA DEL PMT. |
| LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO EL INFORME TECNICO DEL MAL ESTADO QUE PRESENTA LA CONTINUIDAD DEL SEGMENTO VIAL DE SUBA CENTRO 11005331 CON EL FIN DE QUE SEA INCLUDIO ESTO DEBE SER AVALADO POR LOS ESPECIALISTAS Y DEBE SER ENTREGADO EL DIA 15 DE MAYO DE 2025. ESTO CON EL FIN DE QUE SEA TENIDO EN CUENTA DENTRO DEL PMT A GESTIONAR. |
| LA ENTIDAD SOLICITA AL CONTRATISTA E INTERVENTORIA VERIFICAR Y ADELANTAR EL TEMA DE LAS DEMARCACIONES ANTE LA SDM EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CONTRATO QUE A LA FECHA SE TIENEN DEFINIDOS CASABLANCA Y PARQUE PILOTO. |
| COMPONENTE SOCIAL |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION DEL PLAN DE DIALOGO CIUDADANO TENIENDO EN CUENTA QUE AUN NO SE HABIA DEFINIDO EL PERSONAL SOCIAL Y SE ESTABA CONCILIANDO LA LISTA DE CHEQUEO DE CALIFICACION DEL COMPONENTE. |
| LA INTERVENTORIA LE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE 3 CALIFICACIONES IGUAL O MENOR DEL 90% CONLLEVA A APREMIOS. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE DENTRO DEL PERSONAL SE DEBE CUMPLIR CON UN 30% DE MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD DEL CUAL 5% MUJERES Y 5% CONFLICO ARMADO Y 5%PERSONAS EN VULNERABILIDAD, ADICIONAL DENTRO DEL PORCENTAJE GENERAL CONTRATAR UN 13.8% DE MUJERES EL NO CUMPLIMIENTO AFECTA LA CALIFICACION DEL COMPONENTE SOCIAL. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL AFICHE INFORMATIVO Y EL AVISO PAC EL CUAL ESTA A CARGO DE APROBACION POR PARTE DE PRENSA. ADICIONAL A ESTO SE LES RECUERDA LA IMPORTANCIA DEL VIDEO BEEM Y LA IMPLEMENTACION DE REFRIGERIOS EN LAS REUNIONES DE INICIO. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE PARA LAS REUNIONES DE SOCIALIZACION SE DEBEN NOTIFICAR 5 DIAS ANTES, Y PARA DICHAS REUNIONES SE DEBE HACER PRESENTACION LA CUAL DEBE SER APROBADA POR INTERVENTORIA Y LA SUERVISION. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE DURANTE LAS REUNIONES DE INICIO SE DEBE CONFORMAR LOS COMITÉ DE PARTICIPACION Y SE DEBE NOTIFICAR LA VISITA PARA ACTAS DE VECINDAD, DE LAS CUALES ES IMPORTANTE DEJAR CLARIDAD QUE SI UN PREDIO NO ATIENDE A LA PRIMERA SE DEBEN HACER 3 VISITAS DEJANDO EL SOPORTE. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL PERSONAL DE ACTAS DE VECINDAD DEBE ESTAR CONFORMADO POR UN TECNICO Y UN SOCIAL LA CANTIDAD DE EQUIPOS NO IMPORTA. ESTAS ACTAS DEBEN SER ENTREGADAS A INTERVENTORIA EN MEDIO FISICO Y DIGITAL. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LA ENTREGA DEL INVENTARIO PREDIAL DEBE SER CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LAS ACTAS DE VECINDAD. |
| COMPONENTE AMBIENTAL |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES DEL MAO Y EL PLAN DE RESIDUOS LLEGO HASTA EL DIA 09 DE MAYO EN HORAS DE LA MAÑANA POR LO CUAL NO SE ALCANZO A REVISAR PARA EL COMITÉ DE OBRA. |
| EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE NO TIENE CLARIDAD CON LOS FORMATOS PARA APERTURA DEL PIN, Y SOLICITA MESA DE TRABAJO EL LUNES 12 DE MAYO PARA ACLARAR TODAS LAS DUDAS QUE SE TIENEN CON RESPECTO A INFORMES Y DEMAS DOCUMENTACION. |
| COMPONENTE SST |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE HAN REMITIDO LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD DE TODO EL PERSONAL, QUE LA MATRIZ DE PERSONAL NO ESTA ACTUALIZADA Y ESTA DEBE SER REMITIDA POR CORREO ELECTRONICO. |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE LA INFORMACION DE PERSONAL DEBE VENIR POR ARCHIVO DE PERSONA EN LA CUAL DEBE VENIR EXAMEN OCUPACIONAL, HOJA DE VIDA, CEDULA, ARL, PLANILLA DE AFILIACION Y CONTRATO SI APLICA. |
| EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LA DOCUMENTACION SE ENVIO SIN EMBARGO EL DIA LUNES 12 DE MAYO SE COMPROMETEN A ENVIAR LOS FALTANTES. |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C<br>SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

| |
|---|
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE NO SE HA RECIBIDO DOCUMENTACION DE VEHICULOS COMO TARJETAS DE PROPIEDAD, SOAT, TECNMECANICA Y SIN EMBARGO ESTOS ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES. |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE HA REMITIDO INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL COMPONENTE SST. |
| LA ENTIDAD INDICA QUE YA SE LLEVA MAS DE UN MES DE HABER INICIADO LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES POR LO CUAL YA CADA COMPONENTE DEBE ESTAR AL DIA CON SUS INFORMES Y SU INFORMACION EN GENERAL. |
| LA ENTIDAD INDICA QUE PERSONAL QUE NO TENGA SU DOTACION NO ESTA AUTORIZADO A REALIZAR ACTIVIDADES DE VISITAS NI LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD. |
| LA ENTIDAD SOLICITA REVISAR SI EL PERSONAL QUE ESTA AL 100% AL CONTRATO DEBE ESTAR AFILIADO AL CONSORCIO. |

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | CUMPLIÓ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAMACION GENERAL DE OBRA | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | |
| 2 | PRIMERA ENTREGA DE DISEÑOS | CONSORCIO CONSERVACION PG | JUEVES 15/05/25 | |
| 3 | APUs CONTRACTUALES | CONSORCIO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/25 | |
| 4 | INFORME TECNICO DE EXCLUSION | CONSORICO CONSERVACION PG | MARTES 13/05/2025 | |
| 5 | CUENTA DE COBRO N°1 INTERVENTORIA | TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 12/05/2025 | |
| 6 | INICIO DE OBRA | CONSORICO CONSERVACION PG | MARTES 03/06/2025 | |
| 7 | DEFINICION FASE 2 | FDLS | MIERCOLES 14/05/2025 | |
| 8 | INFORME TECNICO DE INCLUSION DE CIV CONTINUO SUBA CENTRO | CONSORICO CONSERVACION PG | JUEVES 15/04/2025 | |
| 9 | MESA DE TRABAJO SST AMBIENTAL | CONSORCIO CONSERVACION PG-TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 12/05/2025 | |
| 10 | DOCUMENTACION DE PERSONAL | CONSORICO CONSERVACION PG | LUNES 12/05/2025 | |
| 11 | SOCIALIZACION PMT NIZA SUR | CONSORICO CONSERVACION PG | SABADO 10/05/2025 | |

Elaborada por: María A. Cardenas Interventoría

# ANEXO 4

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1010 DE 2024**

**"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"**




# INFORME TÉCNICO No. 1

## ETAPA DE DIAGNOSTICO

**PERIODO DEL 1 AL 31 DE ABRIL DE 2025**

**CONSORCIO CONSERVACIÓN PG**
**BOGOTÁ D.C.**

| | | |
|---|---|---|
| Versión | Descripción | Fecha |
| **1** | **Se elabora el documento** | **03/05/2025** |
| | | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Ing. Javier Agudelo**<br>**Residente Técnico**<br>**Contratista** | **Ing. Mauricio Romero**<br>**Director de Obra**<br>**Contratista** | **Ing. María Cárdenas**<br>**Residente Técnico**<br>**Interventoría** |

| | **Listado de Anexos** | | |
|---|---|---|---|
| **Anexo** | **Denominación** | **Edición** | **Fecha Actualización** |
| | | | |
| | | | |

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. OBJETIVOS ..... 5
2.1 OBJETIVO GENERAL ..... 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO ..... 5
4. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ..... 7
4.1 LIMITES ..... 7
4.2 UPZ BARRIOS Y VEREDAS ..... 7
5. IDENTIFICACION DE SEGMENTOS A INTERVENIR ..... 9
6. ETAPA DE DIAGNOSTICO (LABORES REALIZADAS) ..... 10
6.1 FRENTE DE OBRA DE CASA BLANCA ..... 11
6.2 FRENTE DE OBRA DE PARQUE PILOTO ..... 13
6.3 FRENTE DE SUBA CENTRO ..... 16
6.4 FRENTE DE OBRA DE TIBABUYES ..... 16
6.5 FRENTE DE PORTICO ..... 17
6.6 FRENTE DE OBRA DE POTOSÍ ..... 19
6.7 FRENTE DE OBRA DE NIZA SUR ..... 19
6.8 FRENTE DE OBRA DE NIZA SUR ..... 20
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ..... 21
8. CONCLUSIONES ..... 22

## 1. INTRODUCCIÓN

La Administración Distrital en cabeza del Fondo de Desarrollo Local de Suba, estructuró un contrato con el objeto de "*EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO*". El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos; en la actualidad esta infraestructura de la localidad de Suba se encuentra en avanzado estado de deterioro, lo cual implica mayores tiempos en el desplazamiento de las personas, dificultando el comercio, el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad.

Al recuperar la malla vial se mejora la movilidad de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad.

El problema que se pretende resolver con la implementación de este proyecto, consiste en el desarrollo de acciones, en este caso, la realización de obras de mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación, que cuentan con estudios y que al ejecutar dichas actividades permiten mejorar y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de las actividades de infraestructura vial, espacio público y movilidad existente, que se encuentra en regular o mal estado, realizando intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, la infraestructura y su entorno, mediante la optimización de la infraestructura vial, para mejorar las condiciones de movilidad, con criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación pública de espacios dignos, sostenibilidad ambiental y social, todo ello orientado al mejoramiento de la calidad de vida.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo estipulado y acordado en los términos de referencia del contrato, relacionando los soportes de las diferentes actividades realizadas en cumplimiento de los Planes de manejo de Tráfico y que dan fe de las acciones a ejecutar en cumplimiento de la normatividad legal vigente y lo exigido por la secretaría distrital de Movilidad.

### 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar cumplimiento a las exigencias contractuales del Contrato de Obra 1010-2024, en especial a las obligaciones del Contratista en referencia a la implementación de los PMT en los diferentes tramos viales a intervenir.
- Presentar el avance en la implementación de la señalización exigida por la secretaría de Movilidad realizada, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.
- Ejecutar mecanismos de comunicación entre Contratista e interventoría, dando respuesta a las solicitudes presentadas durante el periodo a reportar.


## 3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

| OBJETO DEL CONTRATO |
|---|
| EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. |

| ENTIDAD CONTRATANTE | |
|---|---|
| Entidad | ALCALDÍA LOCAL DE SUBA |
| **CONTRATISTA** | |
| Nombre | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |
| No. de Contrato | 1010-2024-LP (119226) |
| Representante Legal | LUIS ORLANDOM PULIDO GARCIA |
| Director de obra | MAURICIO ROMERO |
| Dirección | CALLE 147 No. 96-05 LOCAL ESQUINA |

| | |
|---|---|
| Teléfono | 311 5239142 |
| Correo Electrónico | info@promciviles.com |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 11.099.321.036,00 |
| VALOR TOTAL OBRAS (INC. AIU) | $ 13.033.377.846,00 |
| VALOR COMPONENTES (INC. AIU) | $ 1.080.274.082,00 |
| VALOR DIAGNOSTICO Y DISEÑO | $ 375.641.901,00 |
| VALOR PROV. INTER. REDES SERV. PUBLICOS | $ 57.481.971,00 |
| VALOR PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA | $420.658.856,00* |
| *Se aclara que este valor corresponde a la partida disponible contractualmente para los ajustes de precios por cambio de vigencia. | |
| DURACION DEL CONTRATO | DIEZ (10) MESES |
| FECHA DE INICIO | 2 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION INCIAL | 1 DE FEBRERO DE 2026 |
| **INTERVENTORÍA** | |
| Nombre | TORRES Y ASOCIADOS SAS |
| No. de Contrato | 084 DE 2025 |
| Representante Legal | FRANCISCO JAVIER GUEVARA MÉNDEZ |
| Director de Interventoría | CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL |
| Dirección | CARRERA 90A #145-61 APTO 201 |
| Teléfono | 310 2009455 |
| Correo Electrónico | subatorrresyasociados2025@gmail.com |
| VALOR CONTRATO INICIAL INTERVENTORÍA | $ 1.629.172.198 |

## 4. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

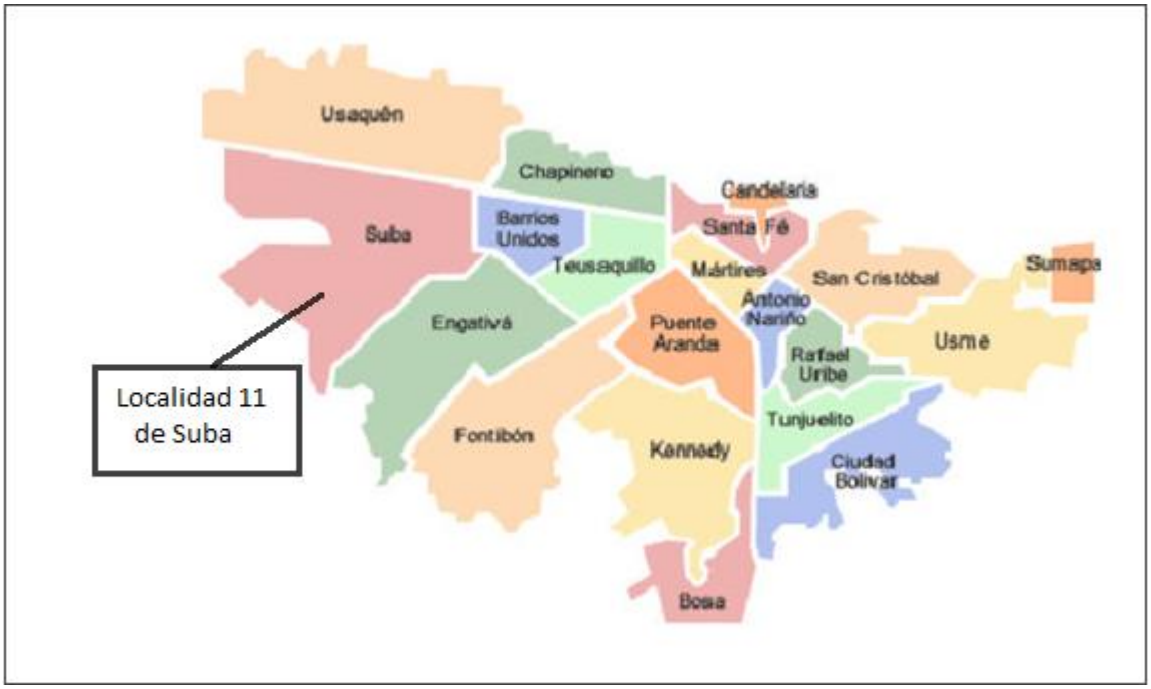


### 4.1 LIMITES

Norte: Rio Bogotá y calle 220 con el municipio de Chía (Cundinamarca).

Sur: Rio Juan Amarillo y calle 100, con las localidades de Engativá y Barrios Unidos, respectivamente.

Este: Autopista Norte con la localidad de Usaquén

Oeste: Rio Bogotá con el municipio de Cota (Cundinamarca).

Coordenadas: 4º44’28” N 74º05’02” O/ 4.741, -74.084

### 4.2 UPZ BARRIOS Y VEREDAS

- **La Academia:** La Academia
- **Guaymaral:** Guaymaral, Conejera.
- **San José de Bavaria:** Gibraltar, Guicani, Mirandela, Nueva Zelandia, Oikos, San Felipe, San José de Bavaria, Santa Catalina, Tejares del Norte, Villanova, Villa del Prado, Villa Lucy.

- **Britalia:** Britalia, Britalia San Diego, Calima Norte, Cantagallo, Cantalejo, El Paraíso de los 12 Apóstoles, Gilmar, Granada Norte, Granjas de Namur, La Chocita, Los Elíseos, Pijao de Oro, Portales del Norte, San Cipriano, Villa Delia, Vista Bella.

- **El Prado:** Alcalá, Atabanza, Bernal y Forero, Cacihia, Canódromo, La Sultana, Libertadores, Los Prados de La Sultana, Madeira, Manuela Arluz, Mazurén, Niza IX, Prado Pinzón, Prado Sur, Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego Sur, San José del Spring, San José del Prado, Santa Helena, Tarragona, Tierra Linda, Victoria Norte, Villa Morena.

- **La Alhambra:** Alhambra, Batán, El Recreo de los Frailes, Estoril, Ilarco, Malibú, Mónaco, Pasadena, Puente Largo.

- **Casablanca Suba:** Atenas, Catalayud, Casa Blanca I y II, Casablanca Norte Suba, Del Monte, El Velero, Escuela de Carabineros.

- **Niza:** Calatrava, Campania, Ciudad Jardín Norte, Colina Campestre, Colinas de Suba, Córdoba, Covadonga, Gratamira, Iberia, Lagos de Córdoba, Las Villas, Lindaraja, Niza, Niza Norte, Niza Suba, Niza VIII, Prado Jardín, Provenza, Rincón de Iberia, Sotileza.

- **La Floresta:** Andes Norte, Club los Lagartos, Coasmedas, Julio Florez, La Alborada, La Floresta Norte, Morato, Nuevo Monterrey, Pontevedra, Potosí, Santa Rosa, San Nicolás, Teusacá.

- **Suba:** Acacias, Alaska, Alcázar de Suba, Almendros Norte, Alto de la Toma, Bosques de San Jorge, Campanela, El Pencil, Suba Compartir, El Pinar, El Pino, El Pórtico, El Salitre, Java, La campiña, La Fontana, Las Orquídeas, Londres, Miraflores, Monarcas, Navetas, Pinar de Suba, Prados de Suba, Portal de Las Mercedes, Almendros de Suba, Las Flores, Pradera de Suba, Prados de Suba, Rincón de Santa Inés, San Francisco, Santa Isabel, Suba Centro, Tuna Alta, Tuna Baja, Turingia, Vereda Suba Cerros, Villa del Campo, Villa Esperanza, Villa Hermosa, Villa Susana.

- **El Rincón:** Alcaparros, Almirante Colón, Almonacid, Altos de Chozica, Altos de la Esperanza, Amberes, Antonio Granados, Arrayanes, Aures, Bochalema, Catalina, Ciudad Hunza, Ciudadela Cafam, Costa Azul, Costa Rica, El Aguinaldo, El Arenal, El Carmen, El Cerezo, El Cóndor, El Jordán-La Esperanza, El Poa, El Naranjal, El Ocal, El Palmar, El Pórtico, El Progreso, El Refugio de Suba, El Rubí, El Tabor, Gloria Lara de Echeverri, Guillermo Núñez, Jaime Bermeo, Japón, Java II Sector, La Aguadita, La Alameda, La Aurora, La Chucua, La Esmeralda, La Esperanza (Calle 131 A), La Estanzuela, La Flor, La Flora, La Manuelita, La Palma, Lagos de Suba, Las Flores, Lombardía/comuneros, Los Arrayanes, Los Naranjos, Los Nogales, Naranjos Altos, Nuevo Corinto, Palma Aldea, Porterrillo, Prados de Santa Bárbara, Puerta del Sol, Rincón de Suba, Rincón El Cóndor, Rincón-Escuela, Riobamba, Rodrigo Lara Bonilla, San Cayetano, San Isidro Norte, San Jorge, San Miguel, San Pedro, Santa Ana de Suba, Toberín, Telecom Arrayanes, Teusaquillo de Suba, Tibabuyes, Trinitaria, Villa Alexandra, Villa Catalina, Villa Elisa, Villa María, Villas del Rincón.

- **Tibabuyes:** Atenas, Berlín, Bilbao, Cañiza I, II y III, Carolina II y III, El Cedro, Compartir, La Gaitana, La Isabela, Lisboa, Los Nogales de Tibabuyes, Miramar, Nueva Tibabuyes, Nuevo Corinto, Prados de Santa Bárbara, Rincón de Boyacá, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, San Carlos de Tibabuyes, San Pedro de Tibabuyes, Santa Cecilia, Santa Rita, Tibabuyes Universal, Toscana, Vereda Suba-Rincón, Vereda Tibabuyes, Verona, Villa Cindy, Villa de las Flores, Villa Gloria.

## 5. IDENTIFICACION DE SEGMENTOS A INTERVENIR

Los trabajos para ejecutarse en el contrato: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO" comprende los siguientes segmentos viales de intervención para construcción vial, relacionadas en la siguiente tabla.

**Tabla 4: segmentos priorizados**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2

LISTADO DE PRIORIZACIÓN FASE I

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129D | KR122 | KR121C |
| 2 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129D | KR121 C | KR121C |
| 3 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| 4 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129D | KR121 | KR 121 |
| 5 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 120 |
| 6 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |
| 7 | 6 | POTOSÍ | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |
| 8 | 4 | TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |
| 9 | 3 | SUBA CENTRO | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B |
| 10 | 5 | PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CL 141 | KR 101B | KR 101C |
| 11 | 5 | PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 101C |
| 12 | 5 | PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 102 |
| 13 | 5 | PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CL 141 | KR 102 | KR 102A |
| 14 | 8 | NIZA SUR | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A |
| 15 | 7 | NIZA SUR | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C |
| 16 | 1 | CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL146F | KR75 | KR74 |
| 17 | 1 | CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL146F | KR74 | KR 73A |
| 18 | 1 | CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL146F | KR73A | KR73 |
| 19 | 1 | CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR73 | KR 72C |
| 20 | 1 | CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL146F | KR72C | KR 72B |

## 6. ETAPA DE DIAGNOSTICO (LABORES REALIZADAS)

En la presente etapa de diagnóstico se han realizado cada una de las siguientes actividades:

- Toma de apiques de todos los sectores priorizados en la primera fase, se realizaron 12 apiques en total distribuidos así:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2
APIQUES

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | CANT. DE APIQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129D | KR122 | KR121C | 3 |
| 2 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129D | KR121 C | KR121C | |
| 3 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | |
| 4 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129D | KR121 | KR 121 | |
| 5 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 120 | |
| 6 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | |
| 7 | 6 | POTOSÍ | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | 1 |
| 8 | 4 | TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | 1 |
| 9 | 3 | SUBA CENTRO | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B | 0 |
| 10 | 5 | PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CL 141 | KR 101B | KR 101C | 1 |
| 11 | 5 | PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 101C | |
| 12 | 5 | PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 102 | |
| 13 | 5 | PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CL 141 | KR 102 | KR 102A | |
| 14 | 8 | NIZA SUR | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A | 1 |
| 15 | 7 | NIZA SUR | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C | 1 |
| 16 | 1 | CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL146F | KR75 | KR74 | 4 |
| 17 | 1 | CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL146F | KR74 | KR 73A | |
| 18 | 1 | CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL146F | KR73A | KR73 | |
| 19 | 1 | CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR73 | KR 72C | |
| 20 | 1 | CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL146F | KR72C | KR 72B | |
| | | | | | | | TOTAL DE APIQUES | | 12 |

- Se ha realizado el correspondiente levantamiento topográfico e Inspección de redes y de los frentes de obra que se encuentran resaltados en la tabla que se indica a continuación:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E INSPECCIÓN DE REDES

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129D | KR122 | KR121C |
| 2 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129D | KR121 C | KR121C |
| 3 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| 4 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129D | KR121 | KR 121 |
| 5 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 120 |
| 6 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |
| 7 | 6 | POTOSÍ | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |
| 8 | 4 | TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |
| 9 | 3 | SUBA CENTRO | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B |
| 10 | 5 | PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CL 141 | KR 101B | KR 101C |
| 11 | 5 | PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 101C |
| 12 | 5 | PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 102 |
| 13 | 5 | PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CL 141 | KR 102 | KR 102A |
| 14 | 8 | NIZA SUR | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A |
| 15 | 7 | NIZA SUR | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C |
| 16 | 1 | CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL146F | KR75 | KR74 |
| 17 | 1 | CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL146F | KR74 | KR 73A |
| 18 | 1 | CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL146F | KR73A | KR73 |
| 19 | 1 | CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR73 | KR 72C |
| 20 | 1 | CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL146F | KR72C | KR 72B |

- Se han presentado a la Interventoría del proyecto cinco (5) planes de manejo de tráfico – PMT, los cuales, ya fueron aprobados cuatro (4) y a su vez radicados ante La Secretaría de Movilidad de Bogotá para su respectiva aprobación.

  Los PMT que están en proceso de aprobación por la Secretaria de Movilidad de Bogotá se encuentran relacionados y resaltados en la siguiente tabla:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2
PMT PRESENTADOS A LA SERCRETARÍA DE MOVILIDAD


| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129D | KR122 | KR121C |
| 2 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129D | KR121 C | KR121C |
| 3 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| 4 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129D | KR121 | KR 121 |
| 5 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 120 |
| 6 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |
| 7 | 6 | POTOSÍ | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |
| 8 | 4 | TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |
| 9 | 3 | SUBA CENTRO | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B |
| 10 | 5 | PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CL 141 | KR 101B | KR 101C |
| 11 | 5 | PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 101C |
| 12 | 5 | PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 102 |
| 13 | 5 | PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CL 141 | KR 102 | KR 102A |
| 14 | 8 | NIZA SUR | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A |
| 15 | 7 | NIZA SUR | 11010621 | 168509 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C |
| 16 | 1 | CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL146F | KR75 | KR74 |
| 17 | 1 | CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL146F | KR74 | KR 73A |
| 18 | 1 | CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL146F | KR73A | KR73 |
| 19 | 1 | CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR73 | KR 72C |
| 20 | 1 | CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL146F | KR72C | KR 72B |

## 6.1 FRENTE DE OBRA DE CASA BLANCA


EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.
CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2
FRENTE DE OBRA DE CASA BLANCA

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL146F | KR75 | KR74 |
| 2 | 1 | CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL146F | KR74 | KR 73A |
| 3 | 1 | CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL146F | KR73A | KR73 |
| 4 | 1 | CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR73 | KR 72C |
| 5 | 1 | CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL146F | KR72C | KR 72B |

**CIV 11005566**

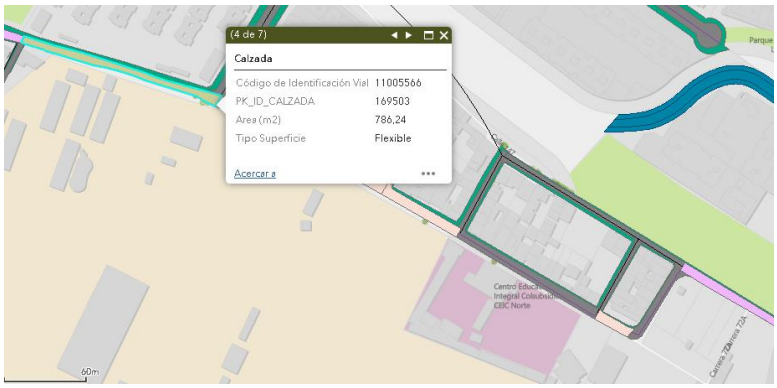



**CIV 11014376**

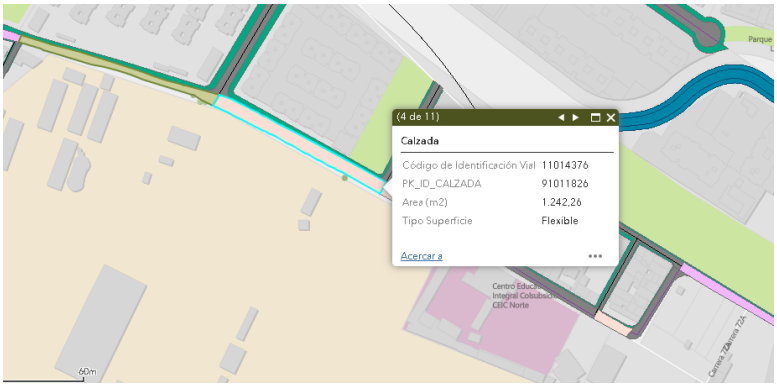



**CIV 11005623**



**CIV 11005728**

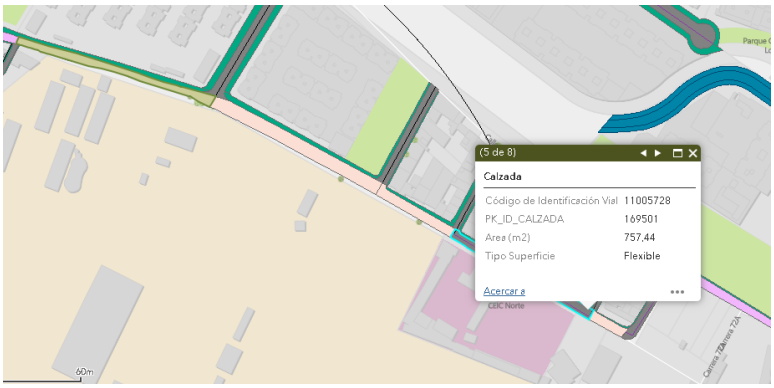


**CIV 11005765**

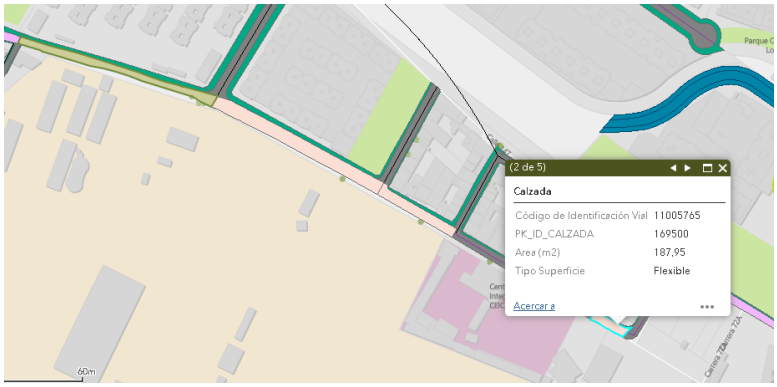



## 6.2 FRENTE DE OBRA DE PARQUE PILOTO


| | |
|---|---|
| | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL<br>E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA<br>D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. |
| | CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2 |
| | FRENTE DE OBRA DE PARQUE PILOTO |

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129D | KR122 | KR121C |
| 2 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129D | KR121 C | KR121C |
| 3 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C |
| 4 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129D | KR121 | KR 121 |
| 5 | 2 | PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 120 |
| 6 | 2 | PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A |


**CIV 11006438**

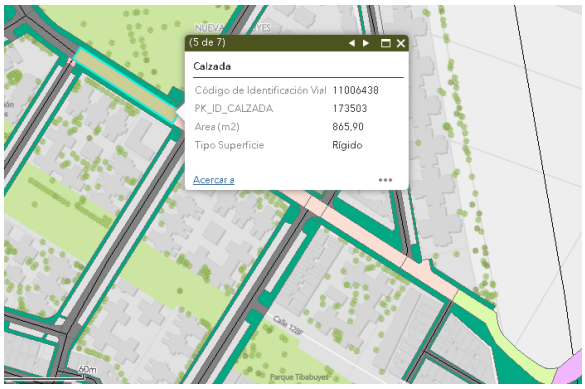



**CIV 11011976**

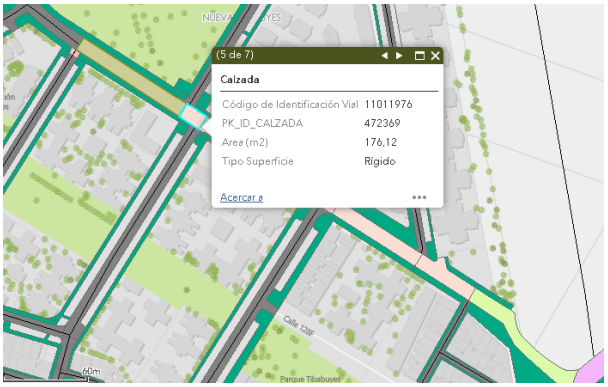



**CIV 11011977**

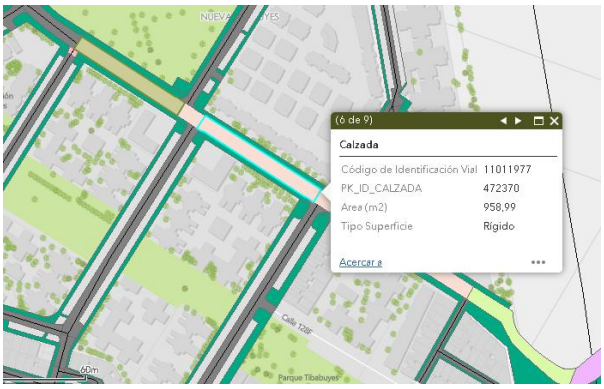


**CIV 11006546**

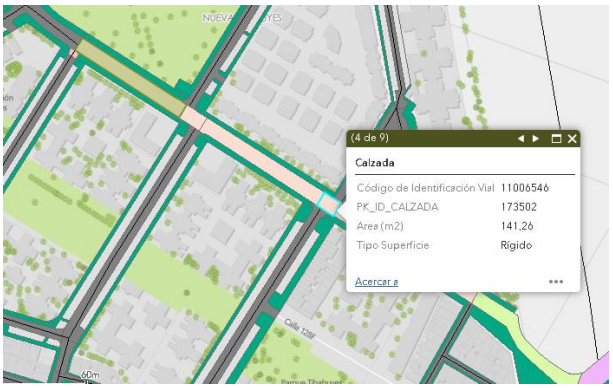


**CIV 11011978**

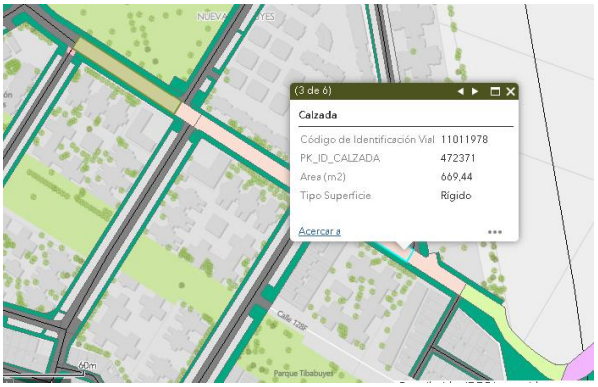


**CIV 11006617**

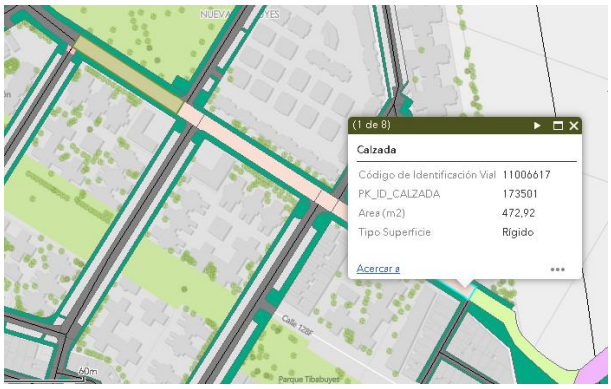


## 6.3 FRENTE DE SUBA CENTRO

| | | |
|---|---|---|
| | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**<br>**CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2**<br>**FRENTE DE OBRA DE SUBA CENTRO** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SUBA CENTRO | 11005331 | 172977 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B |

**CIV 11005331**

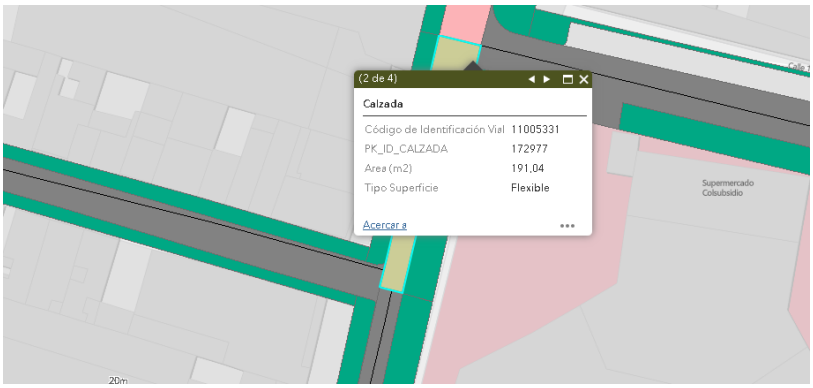



## 6.4 FRENTE DE OBRA DE TIBABUYES

| | | |
|---|---|---|
| | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**<br>**CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2**<br>**TIBABUYES** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C |

**CIV 11005215**

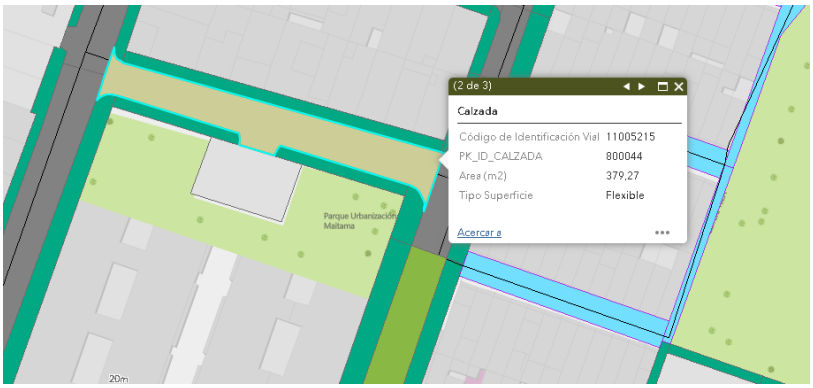



## 6.5 FRENTE DE PORTICO


| | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL<br>E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA<br>D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.<br>CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2<br>PORTICO | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |
|---|---|---|

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CL 141 | KR 101B | KR 101C |
| 2 | 5 | PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 101C |
| 3 | 5 | PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CL 141 | KR 101C | KR 102 |
| 4 | 5 | PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CL 141 | KR 102 | KR 102A |


**CIV 11004156**

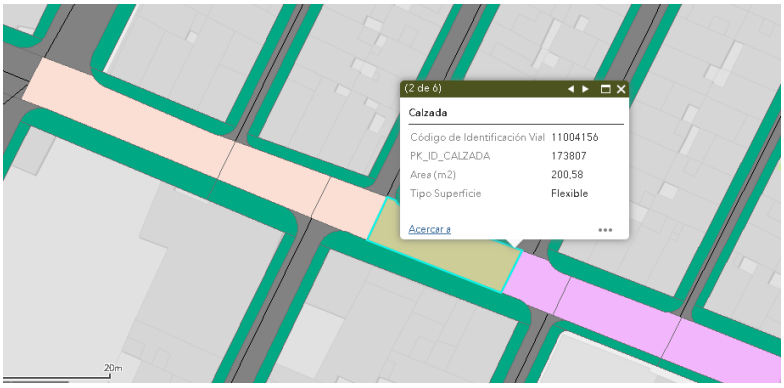

**CIV 11013439**

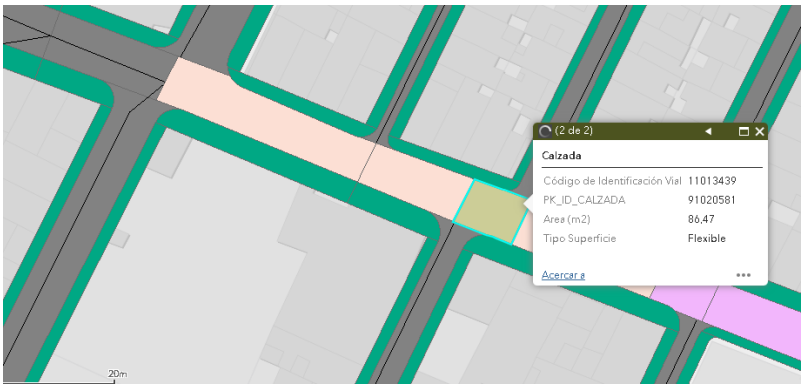


**CIV 11004110**

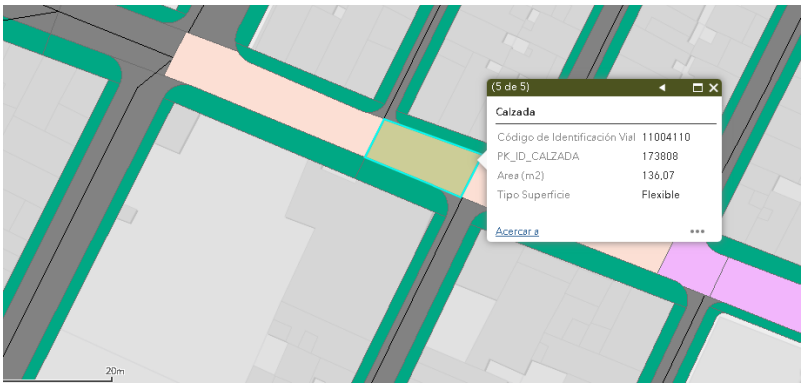


**CIV 11004080**




## 6.6 FRENTE DE OBRA DE POTOSÍ

| | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL<br>E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA<br>D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.<br>CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2<br>POTOSÍ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |
|---|---|---|

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | POTOSÍ | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B |

**CIV 11011188**

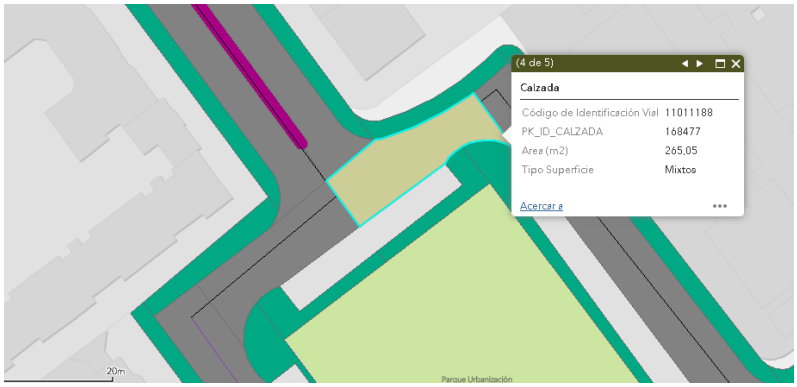



## 6.7 FRENTE DE OBRA DE NIZA SUR

| | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL<br>E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA<br>D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.<br>CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2<br>NIZA SUR | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |
|---|---|---|

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NIZA SUR | 11010621 | 168609 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C |

**CIV 11010621**

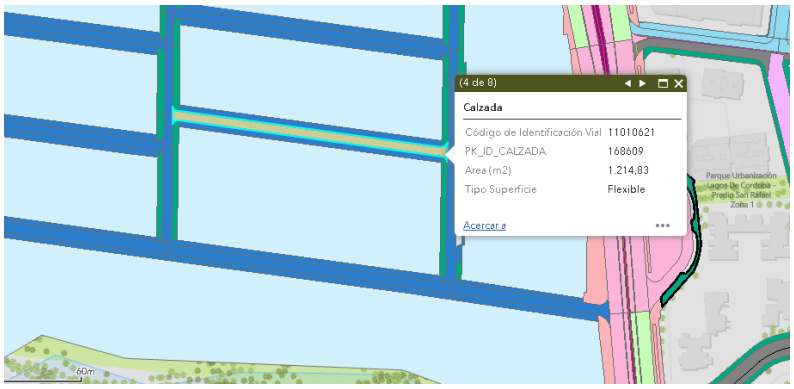


## 6.8 FRENTE DE OBRA DE NIZA SUR

| | | |
|---|---|---|
| | **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**<br>**CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024, GRUPO 2**<br>**NIZA SUR** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO Alcaldía Local de Suba |

| No. | PRIORIZACIÓN FDLS | SECTOR | CIV | PK ID CALZADA | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NIZA SUR | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A |

**CIV 11010613**

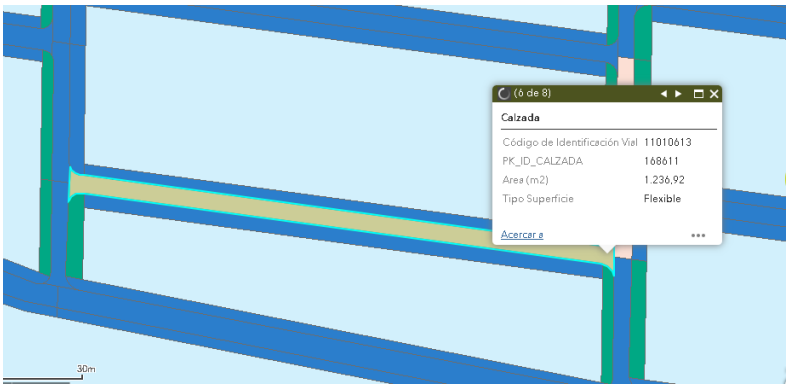

## 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO




**Tramo de Casa Blanca.- Apiques y toma de muestras de suelo**



**Tramo Parque Piloto.- Apiques y toma de muestras de suelo**



**Tramo de Potosí.- Apiques y toma de muestras de suelo**



**Tramo de Niza Surí.- Apiques y toma de muestras de suelo**



**Tramo de Casa Blanca.- Levantamiento Topográfico**

## 8. CONCLUSIONES

- Los PMT para los frentes que se relacionan a continuación ya se encuentra aprobados por la Interventoría y presentados ante la Secretaría de Movilidad:

| SECTOR | CIV | PK ID CALZADA |
|---|---|---|
| POTOSÍ | 11011188 | 168477 |
| TIBABUYES | 11005215 | 800044 |
| NIZA SUR | 11010613 | 168611 |
| NIZA SUR | 11010621 | 168609 |
| CASABLANCA | 11005566 | 169503 |
| CASABLANCA | 11014376 | 91011826 |
| CASABLANCA | 11005623 | 169502 |
| CASABLANCA | 11005728 | 169501 |
| CASABLANCA | 11005765 | 169500 |

- Se realizan los ensayos de laboratorio pertinentes a las extracciones de suelo realizadas para la elaboración de diseños.

- Se realiza el levantamiento topográfico e inspección de redes de los siguientes frentes:

| SECTOR | CIV | PK ID CALZADA |
|---|---|---|
| POTOSÍ | 11011188 | 168477 |
| TIBABUYES | 11005215 | 800044 |
| NIZA SUR | 11010613 | 168611 |
| NIZA SUR | 11010621 | 168609 |
| CASABLANCA | 11005566 | 169503 |
| CASABLANCA | 11014376 | 91011826 |
| CASABLANCA | 11005623 | 169502 |
| CASABLANCA | 11005728 | 169501 |
| CASABLANCA | 11005765 | 169500 |

**ANEXO 1**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y ESTADO DEL TIEMPO**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

CONSERVACIÓN MALLA VIAL CONTRATO 1010—2024 - GRUPO 2

INFORME DE ACTIVIDADES Y ESTADO DEL TIEMPO

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 3 | MAYO | 2025 |

| | |
|---|---|
| SOLEADO | S |
| LLUVIOSO | LL |
| TORMENTA | T |

| ITEM | PRIORIZACIÓN | SECTOR | CIV | TRAMO | DESDE | HASTA | TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | | |
