CONSORCIO
W SEDES

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO DE OBRA N° 3036-2026

OBJETO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ATACO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

3036-2026

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01

PERIODO DE EJECUCIÓN

07 DE JULIO DE 2026 – 07 DE AGOSTO 2026

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1 - ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 4
2. GENERALIDADES 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
3. COMPONENTE LEGAL 16
3.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA 16
3.2. EVALUACIÓN GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA 16
4. COMPONENTE FINANCIERO 18
4.1. ESTADO FINANCIERO 18
5. COMPONENTE TÉCNICO 18
5.1. EVALUACIÓN AVANCE DE OBRA 18
5.2. NOVEDADES DE ORDEN TÉCNICO 18
5.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 18
5.5. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS 30
5.6. CONTROL DE EQUIPOS 31
5.7. CONTROL DEL CLIMA 31
6.1. TRAMITES Y PERMISOS 32
6.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA 32
7. COMPONENTE SOCIAL 32
7.1. NOVEDADES DE ORDEN SOCIAL 32
8. RECOMENDACIONES 33
8.1. RECOMENDACIONES AL CONTRATANTE 33
8.2. RECOMENDACIONES A LA INTERVENTORÍA 33
9. CONCLUSIONES 33
10. ANEXOS 33
10.1. COPIA DE PÓLIZAS 33
10.2. FICHAS TÉCNICAS 33

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Principal 5
Ilustración 2 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Nuestra Señora de Lourdes..... 5
Ilustración 3 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Camilo Torres..... 6
Ilustración 4 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Balsillas..... 6
Ilustración 5 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede San Pedro 7
Ilustración 6 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Canoas Copete ... 7
Ilustración 7 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Canoas San Roque 8
Ilustración 8 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Buenavista 8
Ilustración 9 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Cupilicua 9
Ilustración 10 Institución Educativa Berlín Sede la nueva primavera..... 9
Ilustración 11 Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan - Sede Principal 10
Ilustración 12 Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan Sede El Balso 10
Ilustración 13Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan Casa de zinc..... 11
Ilustración 14 Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan sede el salado 11
Ilustración 15Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan sede Pensilvania 12
Ilustración 16 Institución Educativa Santiago Pérez Sede Campo hermoso 12
Ilustración 17Institución Educativa Santiago Pérez Sede la unión..... 13
Ilustración 18Institución Educativa Santiago Pérez Sede El Triunfo 13
Ilustración 19 Institución Educativa Santiago Pérez Sede La Ensillada..... 14
Ilustración 20 Institución Educativa Santiago Pérez Sede El Darien 14
Ilustración 21 Institución Educativa Antonio Nariño Sede Monteloro 15
Ilustración 22 Institución Educativa Antonio Nariño Sede Madroñal 15
Ilustración 23 Institución Educativa Antonio Nariño Sede las brisas 16

TABLAS

TABLA 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 16
TABLA 2 ACTAS AL CONTRATO..... 17
TABLA 3 PÓLIZAS 18
TABLA 4 RELACIÓN DE ACTAS 18
TABLA 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 22
TABLA 6 CONTROL DE QUIPOS..... 31
TABLA 7 CONTROL DEL CLIMA..... 32

1. INTRODUCCIÓN.

En el marco del Contrato de Obra No. 3006 de 2026, la Gobernación del Tolima ha identificado la necesidad de llevar a cabo un proyecto integral de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de las sedes educativas del municipio de Ataco, Tolima. Este proyecto tiene como objetivo realizar las intervenciones necesarias para mejorar las condiciones físicas de las instalaciones educativas, garantizando espacios adecuados, funcionales y seguros para el desarrollo de las actividades académicas y el bienestar de la comunidad educativa.

El alcance del contrato abarca un conjunto de intervenciones orientadas al mejoramiento y ampliación de la infraestructura existente en las diferentes sedes educativas contempladas dentro del proyecto. Estos trabajos comprenden la ejecución de las actividades de obra necesarias para adecuar, mejorar y optimizar las condiciones de los espacios, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

Las intervenciones se desarrollarán de manera organizada y coordinada en las diferentes sedes educativas del municipio de Ataco, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada una de ellas, así como la programación establecida para la ejecución de las actividades. De esta manera, se busca garantizar un adecuado manejo de los recursos, tiempos y frentes de trabajo, permitiendo avanzar de manera eficiente en el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.


Este proyecto no solo busca atender las necesidades de mejoramiento y conservación de la infraestructura educativa, sino también contribuir a la generación de espacios dignos, adecuados y funcionales para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La intervención se ejecutará bajo los estándares técnicos establecidos, procurando el cumplimiento de las actividades, especificaciones y plazos definidos contractualmente, así como la calidad de las obras ejecutadas.

2. GENERALIDADES

2.1. LOCALIZACIÓN


El proyecto se ejecutará en las diferentes sedes educativas contempladas dentro del contrato, ubicadas en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, como se evidencia en las ilustraciones correspondientes.

ILUSTRACIÓN 1. Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Principal

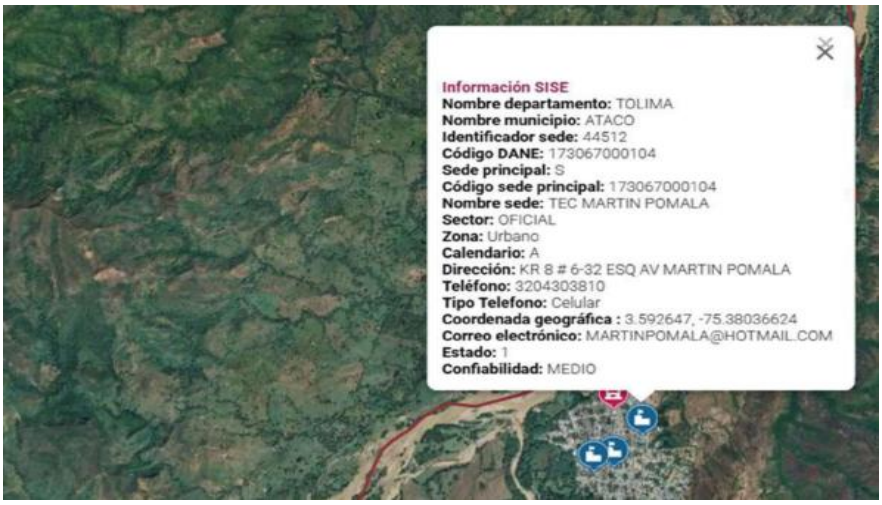


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 2 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Nuestra Señora de Lourdes

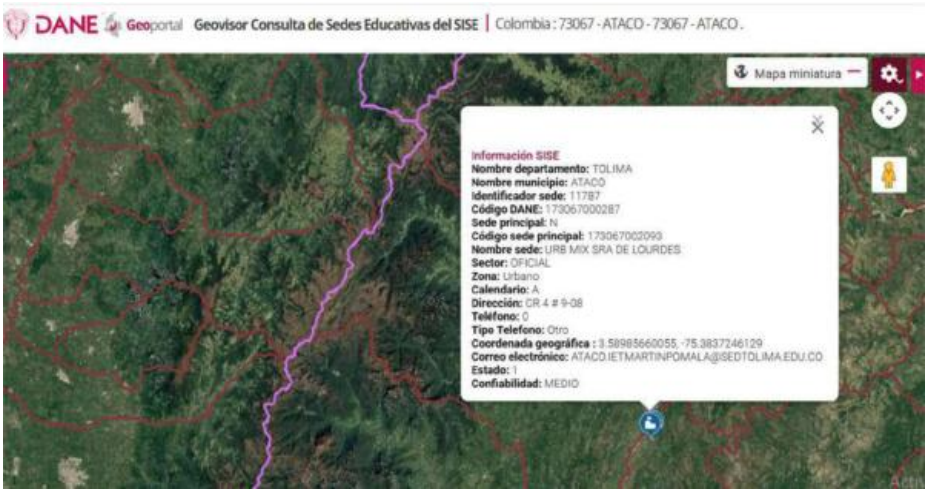


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 3 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Camilo Torres

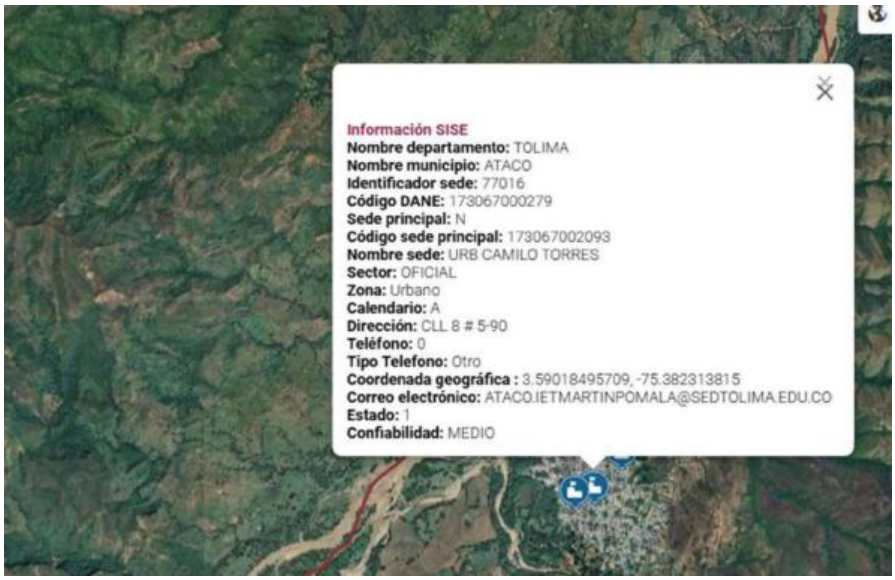


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 4 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Balsillas

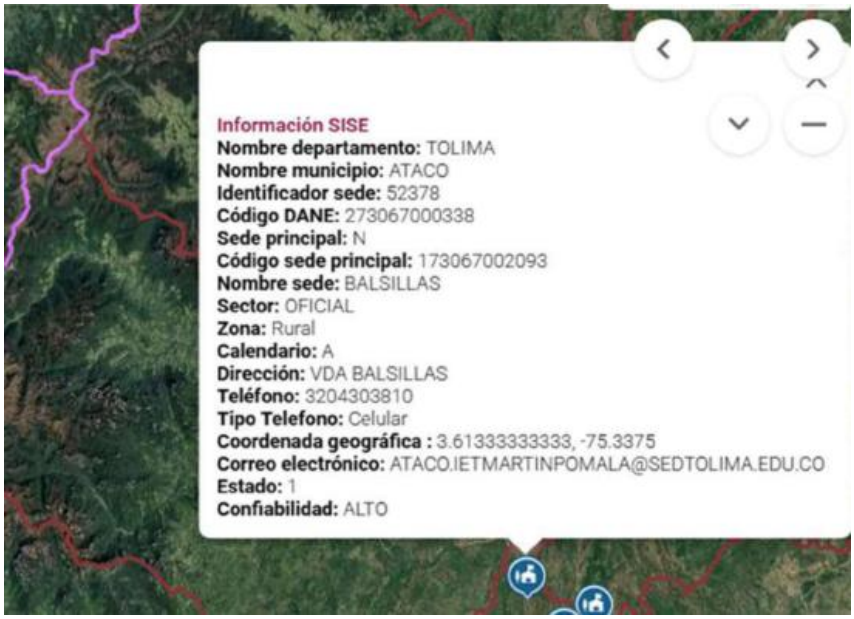


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 5 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede San Pedro

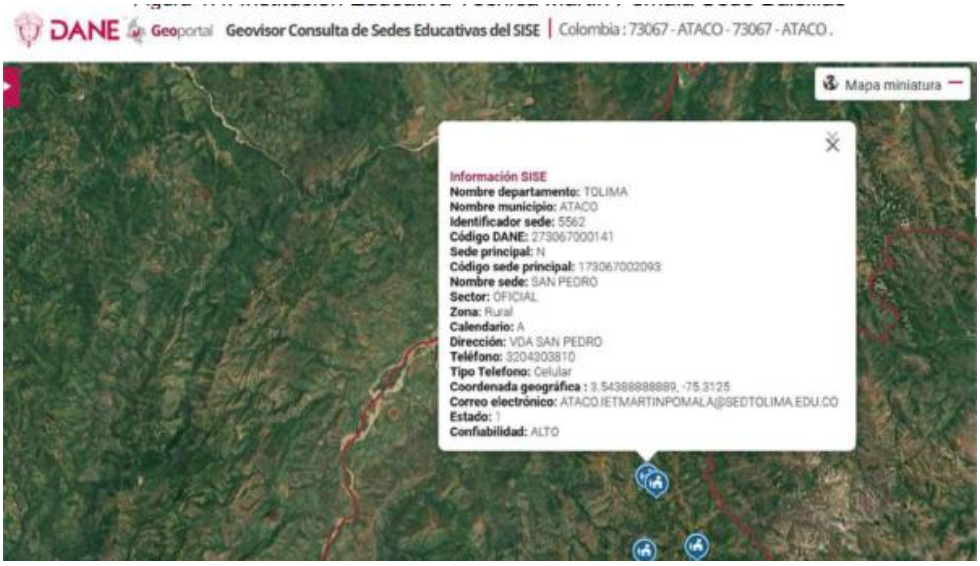

Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 6 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Canoas Copete

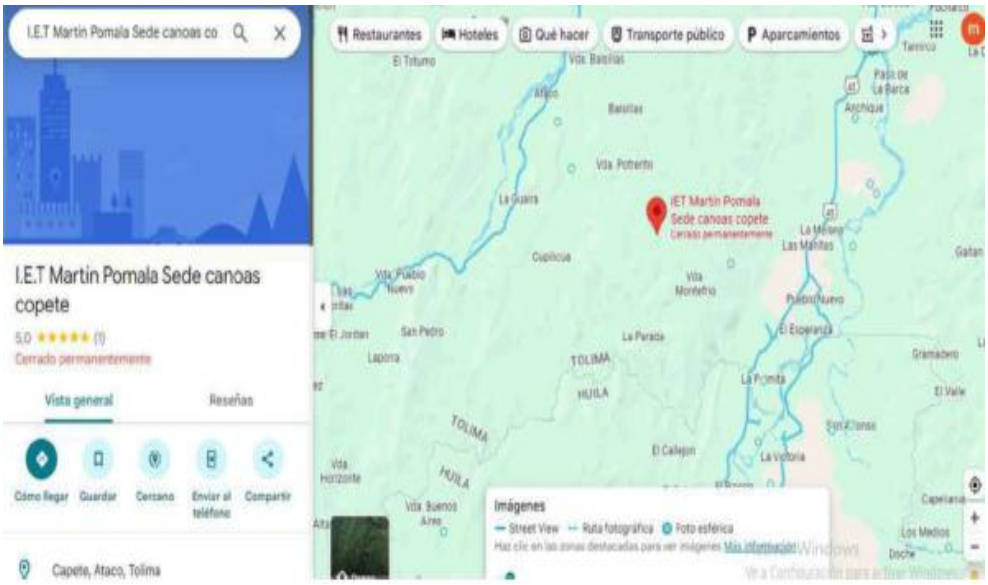


Fuente: https://www.google.com/maps

Ilustración 7 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Canoas San Roque




Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 8 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Buenavista

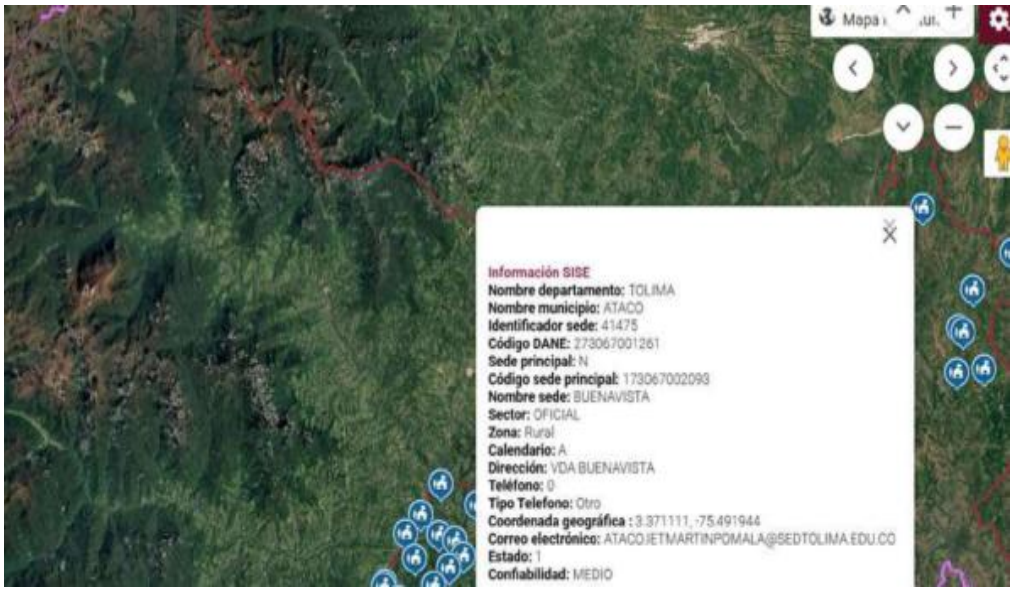


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 9 Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Cupilicua

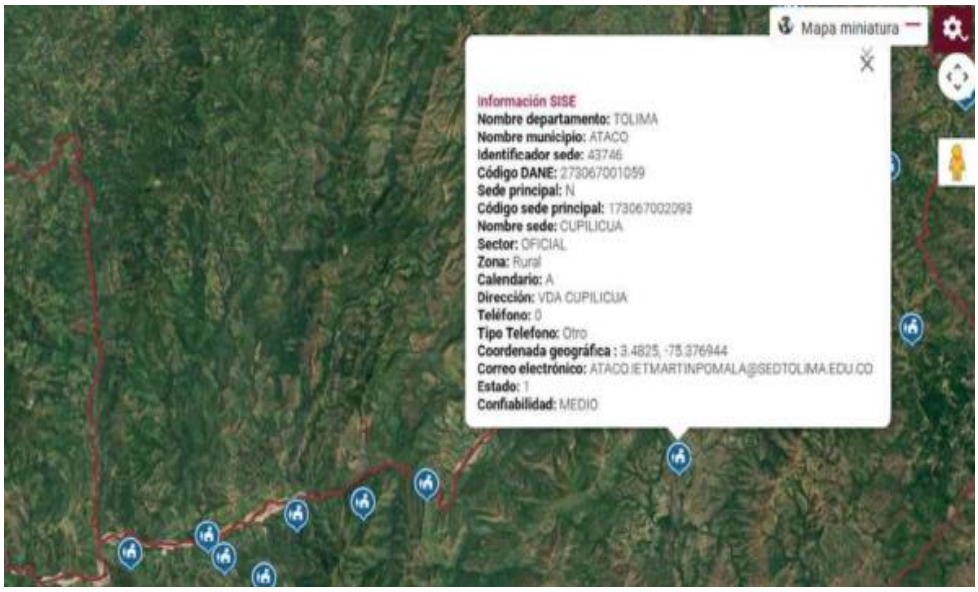


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 10 Institución Educativa Berlín Sede la nueva primavera

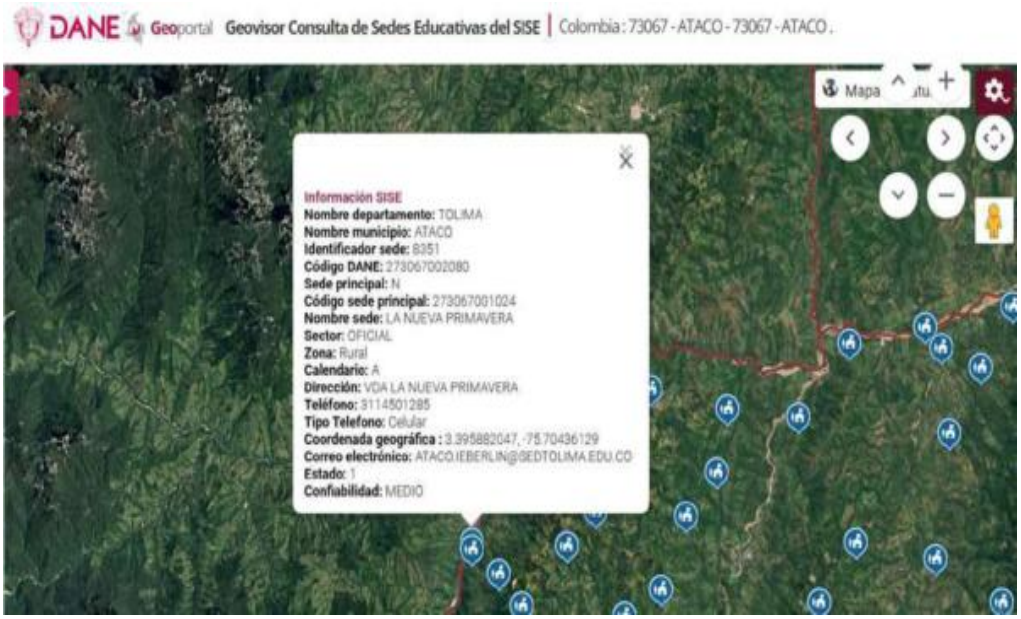


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 11 Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan - Sede Principal

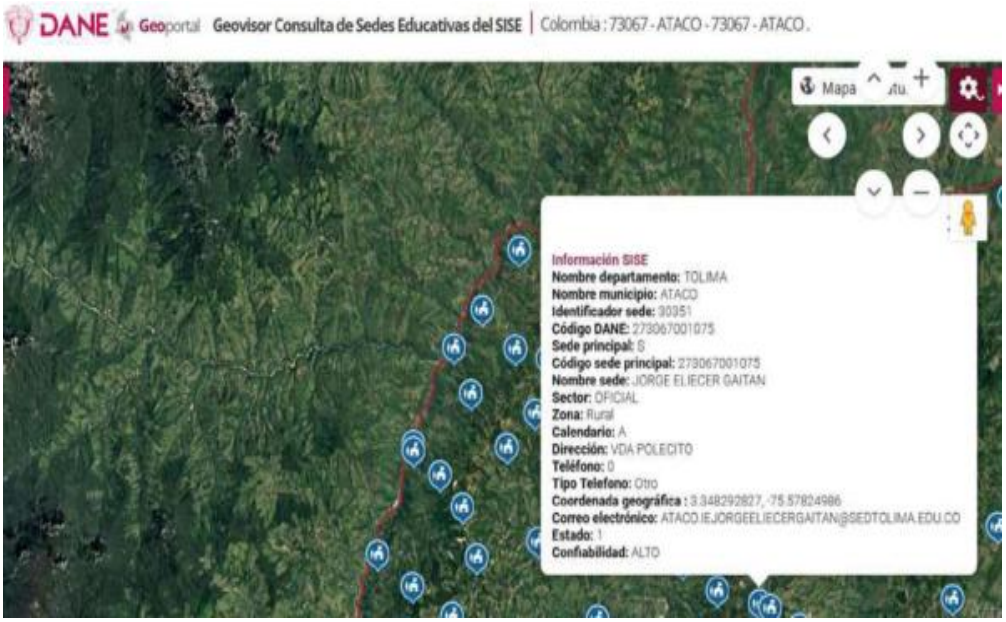


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 12 Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan Sede El Balso

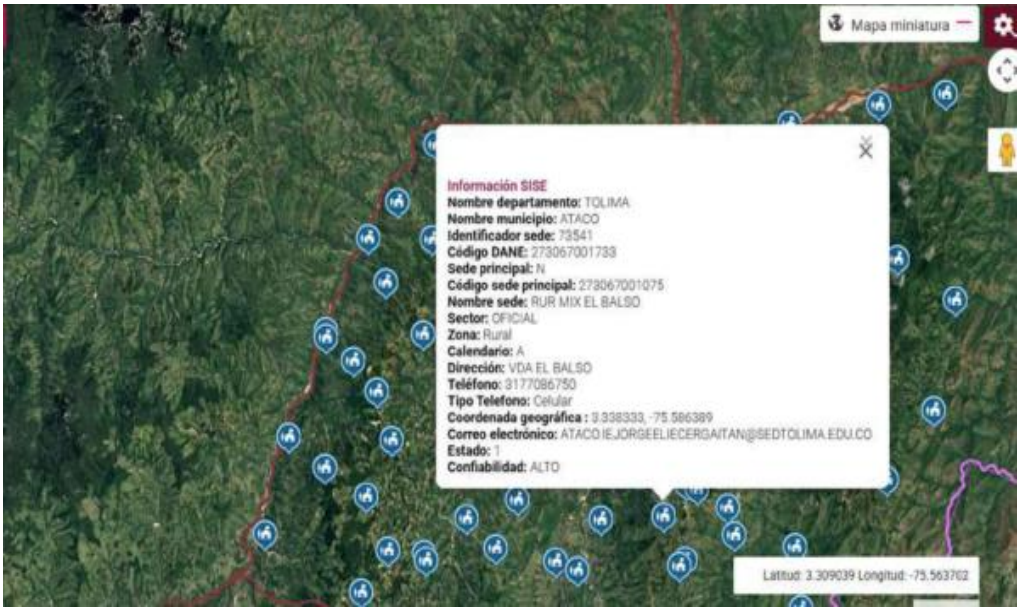


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 13Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan Casa de zinc

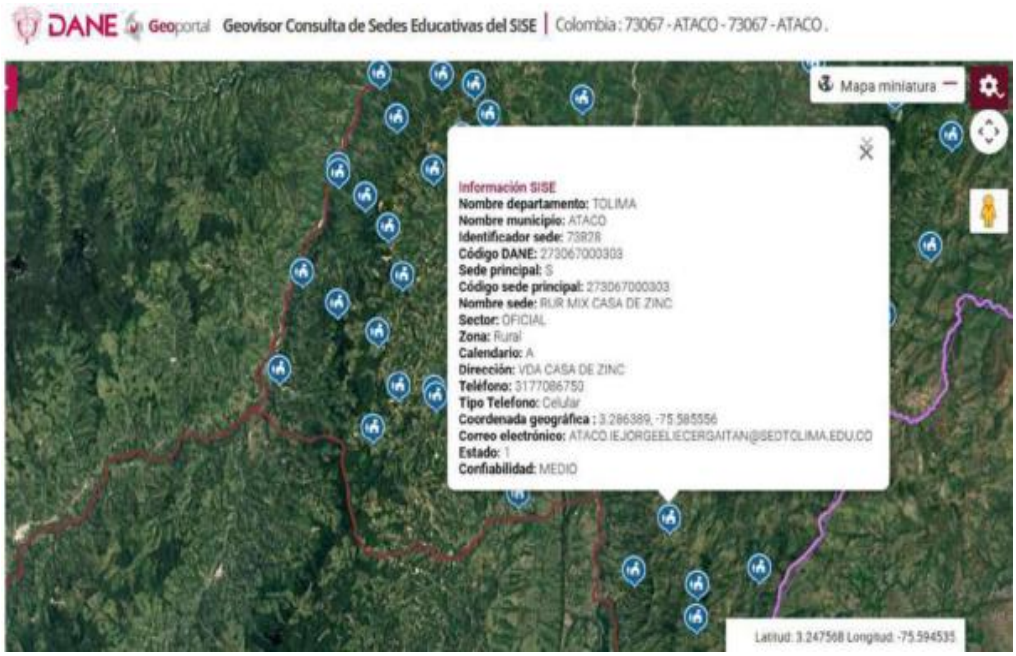


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 14 Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan sede el salado

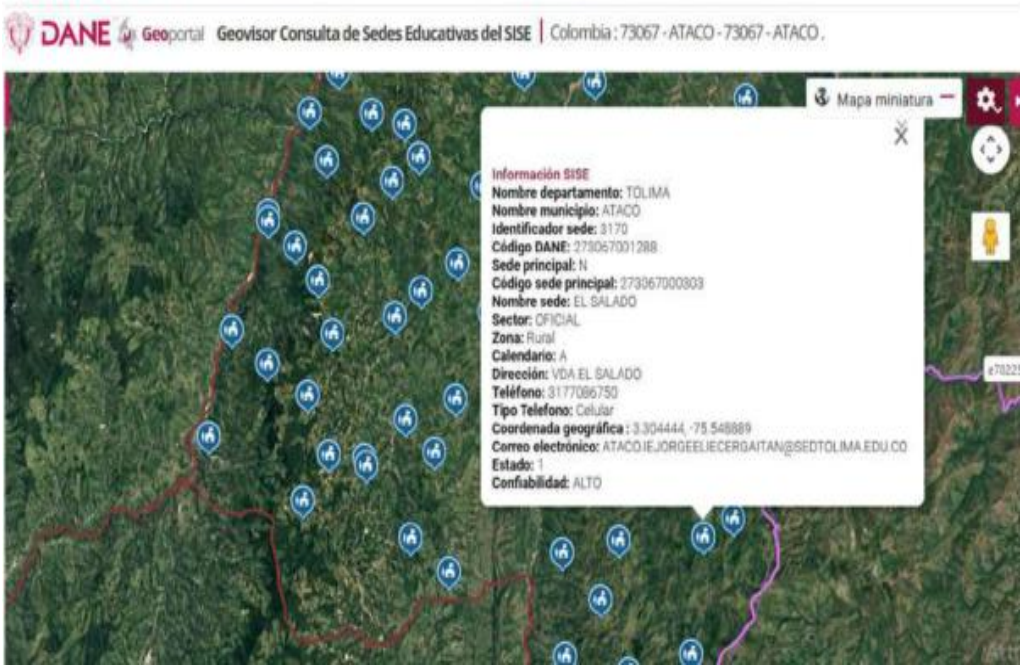


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 15Institución Educativa Jorge Elicer Gaitan sede Pensilvania

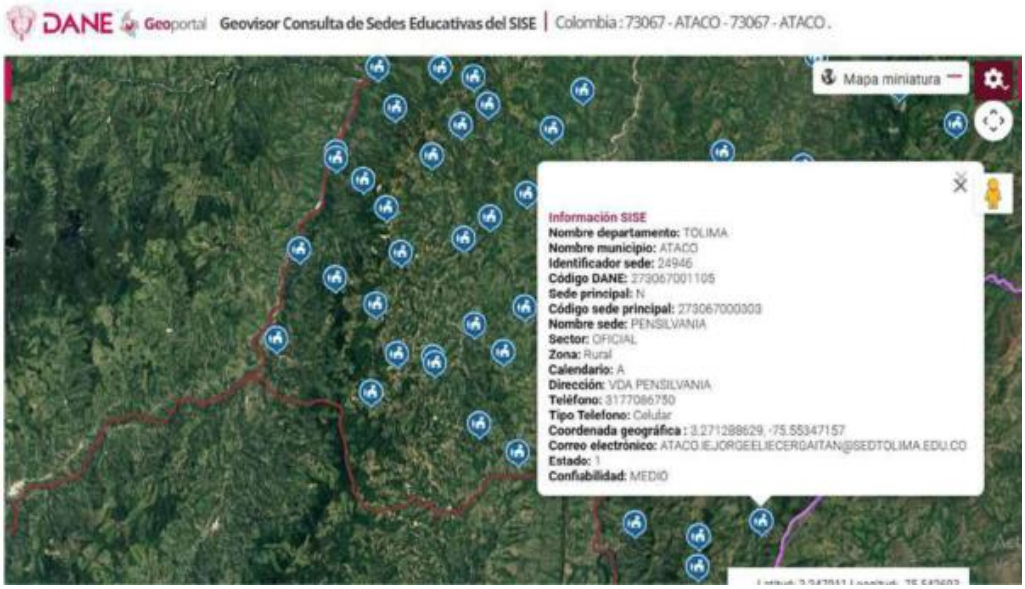


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 16 Institución Educativa Santiago Pérez Sede Campo hermoso

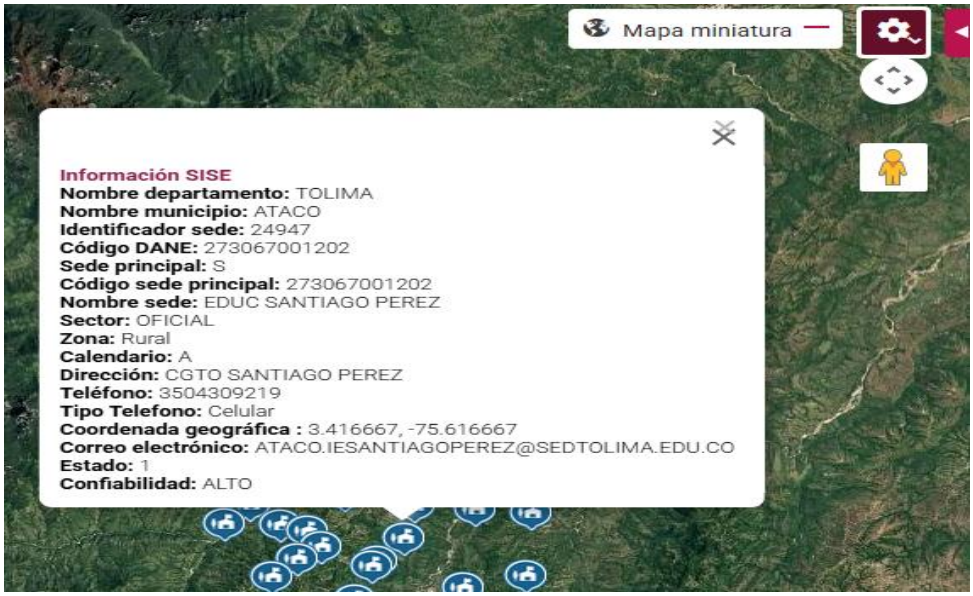


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 17Institución Educativa Santiago Pérez Sede la unión

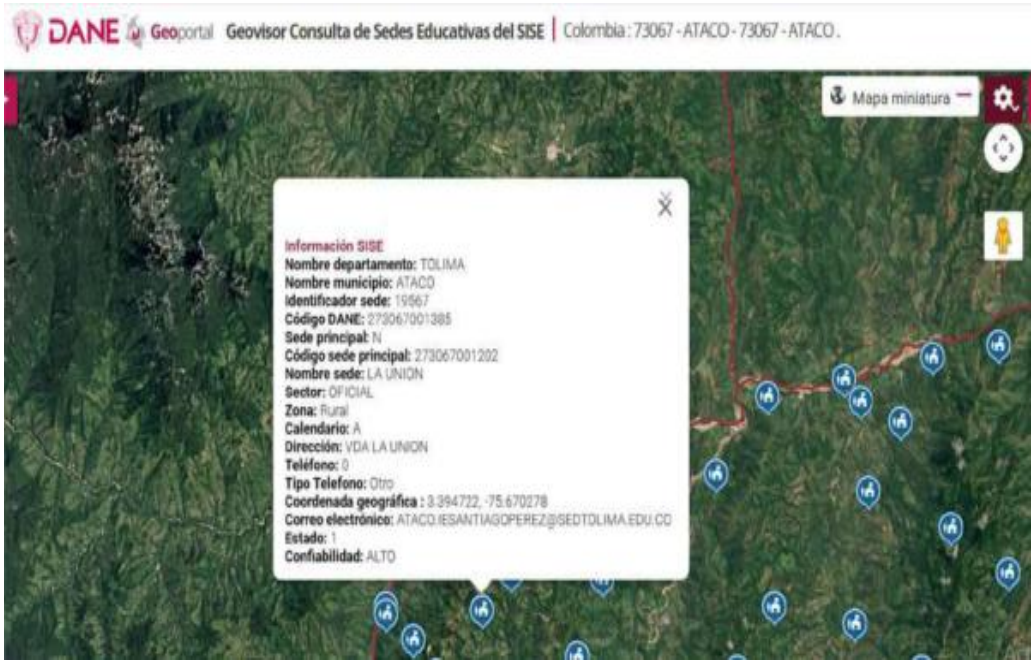


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 18Institución Educativa Santiago Pérez Sede El Triunfo

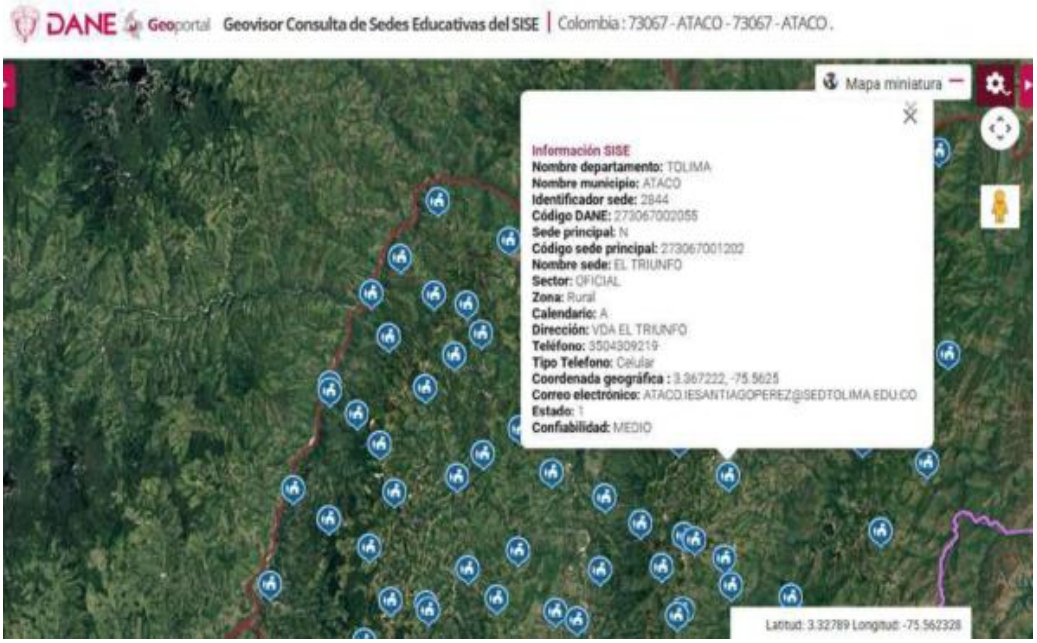


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 19 Institución Educativa Santiago Pérez Sede La Ensillada

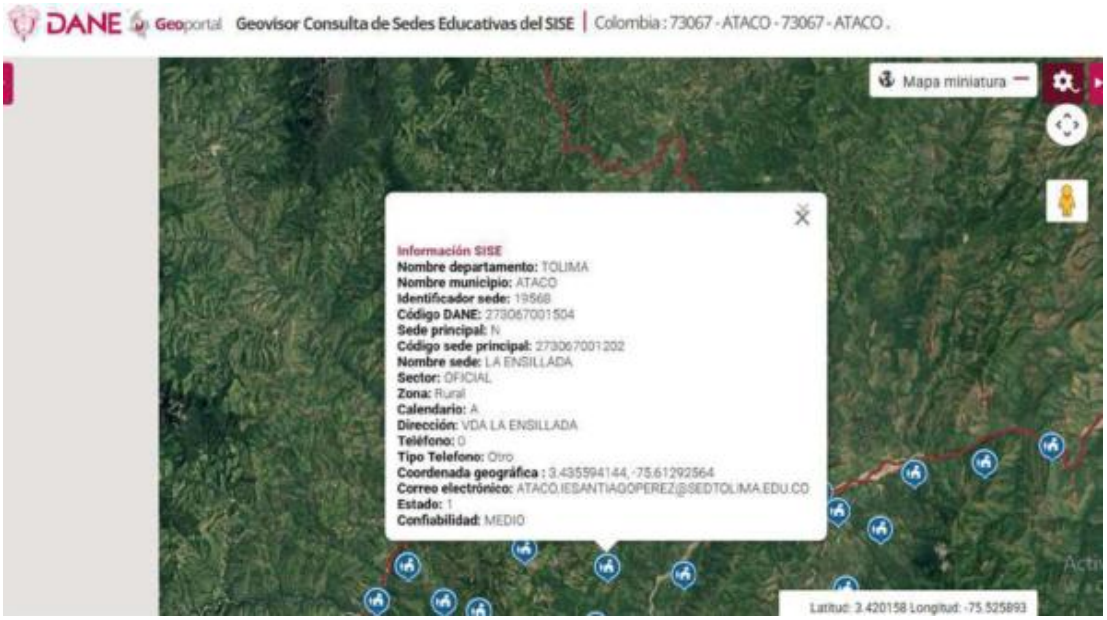


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 20 Institución Educativa Santiago Pérez Sede El Darien

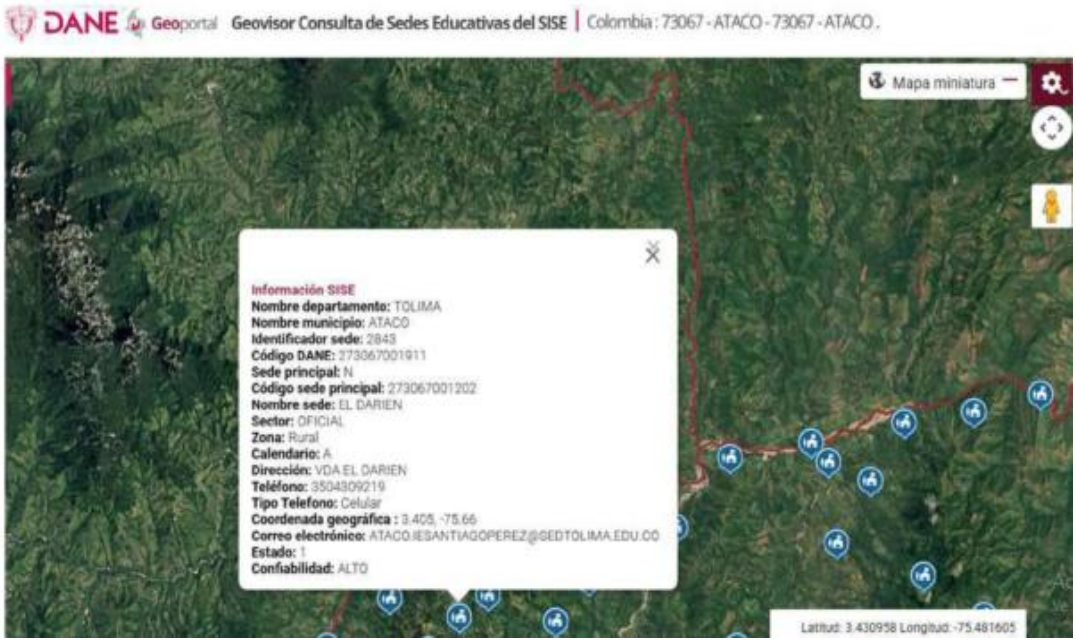


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 21 Institución Educativa Antonio Nariño Sede Monteloro

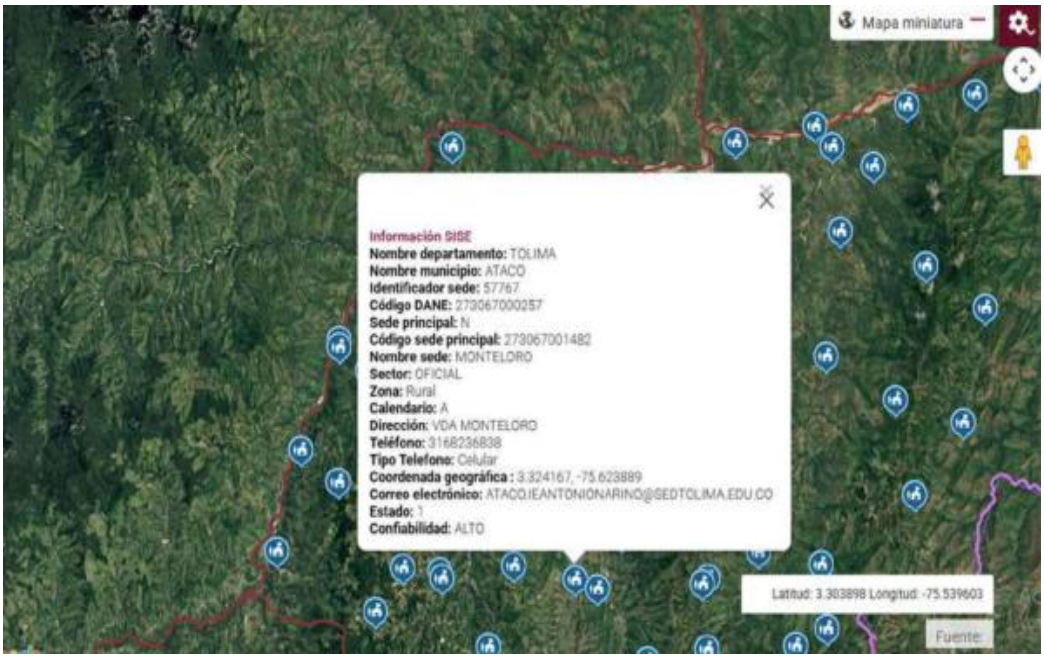


Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 22 Institución Educativa Antonio Nariño Sede Madroñal

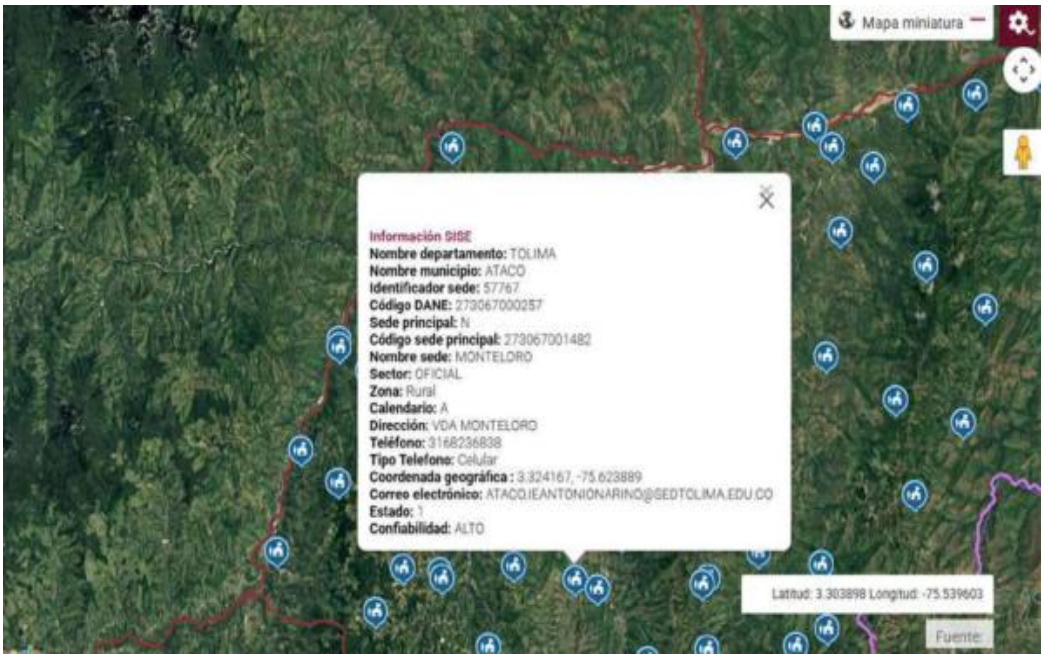

Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

Ilustración 23 Institución Educativa Antonio Nariño Sede las brisas

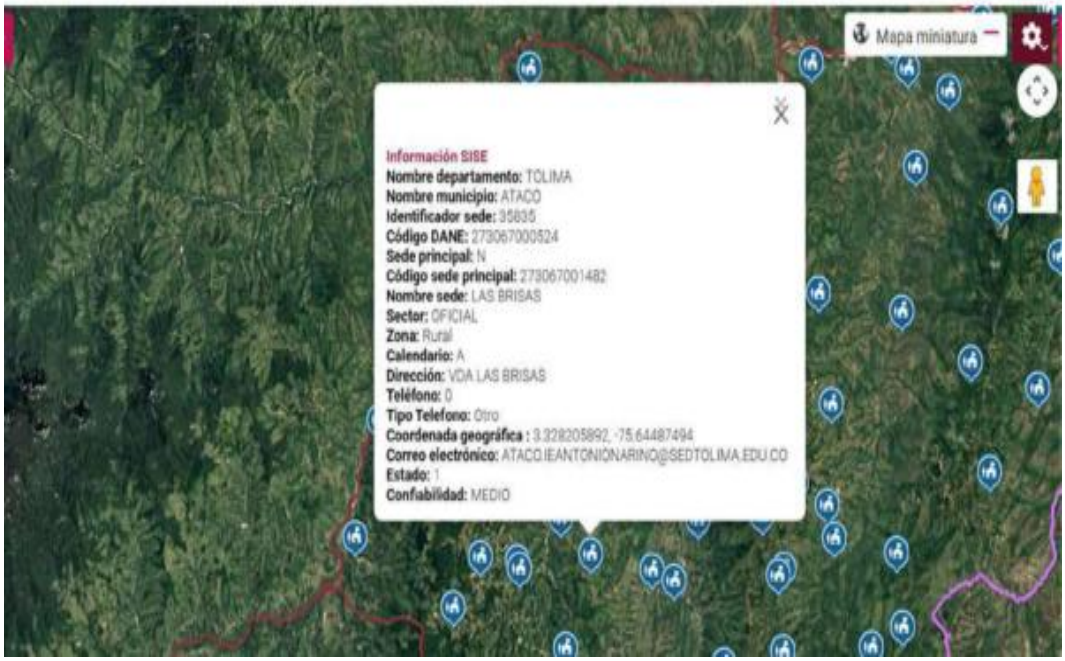

Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/consulta-geosise/?utm_source=chatgpt.com

3. COMPONENTE LEGAL

3.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA

El número de contrato es 3006 de 2026. El objeto del contrato consiste en el "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ATACO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

El plazo para la ejecución del contrato inicial es de 8 meses, el valor total del mismo asciende a un valor de $4.281.367.423.00. El contratista encargado de la ejecución de este proyecto es EL CONSORCIO W SEDES, identificado con el NIT 902.021.774-4.

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
PRORROGA AL CONTRATO	N/A
ADICIÓN AL CONTRATO	N/A

TABLA 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

3.2. EVALUACIÓN GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo del presente informe no se presentan garantías al contrato de obra.

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE INICIO	09 DE MARZO DE 2026
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A

TABLA 2 ACTAS AL CONTRATO

ANEXO 0

Póliza de cumplimiento	11-44-101270962		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	26-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
Seriedad de la oferta	*27-11-2025*	*27-03-2026*	$458.663.789.00

ANEXO 1

Póliza de cumplimiento	11-44-101279770		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	16-03-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
Cumplimiento	*09-03-2026*	*09-03-2027*	$1.284.410.227.00
Estabilidad y calidad de la Obra	*SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS*		$1.284.410.227.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	*09-03-2026*	*09-03-2027*	$214.068.372.00

Póliza de RCE	11-40-101090229		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	16-03-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
Predios labores y operaciones	*09-03-2026*	*09-11-2026*	$ 700.362.000.00
Daño emergente y lucro cesante	*09-03-2026*	*09-11-2026*	$ 700.362.000.00
Prejuicios extrapatrimoniales	*09-03-2026*	*09-11-2026*	$ 700.362.000.00

ANEXO 2

Póliza de cumplimiento	11-44-101279770		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	10-07-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	

			ASEGURADO
Cumplimiento	*07-07-2026*	*07-07-2027*	$1.284.410.227.00
Estabilidad y calidad de la Obra	*SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS*		$1.284.410.227.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e ind	*07-07-2026*	*09-03-2030*	$214.068.372.00

Póliza de RCE	11-40-101090229		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	10-07-2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
Predios labores y operaciones	*07-07-2026*	*09-03-2027*	$700.362.000.00
Daño emergente y lucro cesante	*07-07-2026*	*09-03-2027*	$700.362.000.00
Prejuicios extrapatrimoniales	*07-07-2026*	*09-03-2027*	$700.362.000.00

TABLA 3 PÓLIZAS

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1. ESTADO FINANCIERO

ACTAS	VALOR DEL ACTA	ESTADO
ACTA DE CORTE No.1	N/A	N/A

TABLA 4 RELACIÓN DE ACTAS

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. EVALUACIÓN AVANCE DE OBRA

El avance de obra que se tiene general en el presente informe corresponde a un (11.03%) equivalente a $472.041.225.50 correspondiente al valor ejecutado respecto del valor total del contrato.

5.2. NOVEDADES DE ORDEN TÉCNICO

Durante el desarrollo de este informe no se registraron novedades

5.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas en el presente informe son:

5.3.1. Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Nuestra Señora de Lourdes

SEDE 2 - NUESTRA SEÑORA DE LOURDES			
1,0			
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	794,28
1,2	DEMOLICION MURO (e: 10 cm a 15cm)	M2	60,46
1,2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	10,77
1,4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	10,00
2,0			
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA DE COLOR	M2	794,28
2,2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE PINTURA (CERCHA)	ML	1133,80
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	41,93
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CERCHAS CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO	ML	681,66
3,0			
3,3	COLUMNETAS Y VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,12*0,15	ML	10,77
3,4	ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	KG	106,56
3,5	MURO EN BLOQUE #5	M2	32,36
3,6	COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,12*0,15	ML	13,00
3,7	PAÑETE CON MORTERO 1:4 SOBRE MAMPOSTERIA	M2	46,48
3,10	ENCHAPE BAÑOS - PARED	M2	54,55
4,0			
4,1	PINTURA EXTERIOR TIPO 1 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)	M2	503,03
4,2	PINTURA INTERIOR TIPO-2 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)	M2	571,76
4,3	ESMALTE A 3 MANOS SOBRE CARPINTERIA METALICA	M2	192,20
4,6	RESANE SOBRE MURO	M2	105,00
5,0			
5,1	REGATA Y RESANE DE REGATA PARA INSTALACIONES (ELECTRICAS E HIDRAULICAS)	ML	68,83

7,0			
7,3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	UND	14,15
9,0	**PISOS BASES**		
9,1	POLIETILENO NEGRO CAL 6	M2	9,10
10,0	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
10,4	TUBERIA PRESION PVC 1/2" - Incluye accesorios	ML	43,30
12.1.2	**RED INTERNA PVCP AGUA FRIA**		
12.1.2.1	TUBERÍA PVCP Ø 1" RDE 21	ML	48,30
12.1.4	**PUNTOS HIDRAULICOS PVCP - A.F**		
12.1.4.2	Lavamanos Ø ½"	UND	3,00
12,2	**REDES DE EVACUACION AGUAS RESIDUALES A.R.**		
12.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria Ø 2"	ML	4,50
12.2.3.2	**PUNTOS SANITARIOS A.R.**		
12.2.3.4	Lavamanos Ø 2"	UND	3,00
13,0	**APARATOS SANITARIOS**		
13,2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	7,00
13,3	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	3,00

5.3.2. Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Principal

SEDE 5 - PRINCIPAL MARTIN POMALA			
1,0			
1,2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	17,00
1,3	RETIRO DE ESCOMBROS (incluye cargue, transporte y disposicion final a sitio autorizado)	M3	20,00
1,4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	3,00
1,5	DESMONTE TEJA TERMOACUSTICA	M2	677,13
1,6	DESMONTE CIELO RASO FALSO	M2	1027,03
1,7	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	114,00
2,0			
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA DE COLOR	M2	677,13
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CERCHAS CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO	ML	9,30


2,6	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y CANALES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO MANUAL	ML	55,30
2,7	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	55,30
3,0	**MAMPOSTERIA**		
3,7	PAÑETE CON MORTERO 1:4 SOBRE MAMPOSTERIA	M2	1,74
4,0			
4,1	PINTURA EXTERIOR TIPO 1 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)	M2	66,78
4,4	CIELO RASO CONFORMADO POR LAMINAS DE PVC (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE)	M2	822,67
4,5	PINTURA GRIS BASALTO EN VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCRTURA DE CONCRETO	M2	128,15
4,6	RESANE SOBRE MURO	M2	124,54
4,7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 TRES MANOS	M2	92,25
7,0			
7,3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	116,80
9,0			
9,1	POLIETILENO NEGRO CAL 6	M2	20,00
9,3	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	12,00
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO TIPO LLAVE SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	6,00

5.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO


TABLA 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Institución Educativa Técnica Martin Pomala Sede Nuestra Señora de Lourdes

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
DESMONTE DE CUBIERTA	DEMOLICION MURO (e: 10 cm a 15cm)
	
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

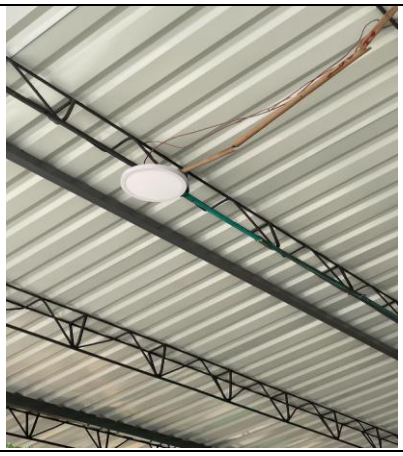
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA DE COLOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA DE COLOR
	
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE PINTURA (CERCHA)	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE
	



ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO	MURO EN BLOQUE #5
	
COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,12*0,15	PINTURA EXTERIOR TIPO 1 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)
	
PINTURA INTERIOR TIPO-2 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)	ESMALTE A 3 MANOS SOBRE CARPINTERIA METALICA

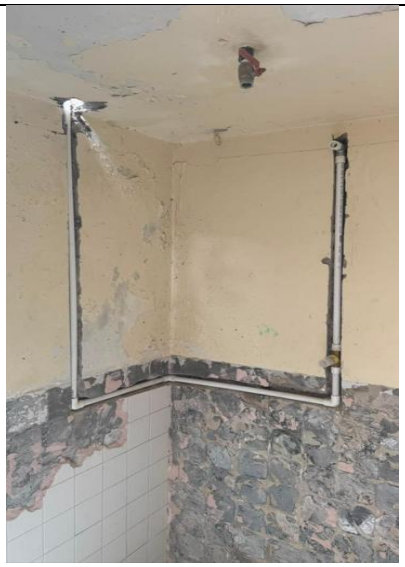	
REGATA Y RESANE DE REGATA PARA INSTALACIONES (ELECTRICAS E HIDRAULICAS)	SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE RED CABLEADO
	
SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE RED CABLEADO	SALIDA PUNTO CON TOMA ELECTRICA DOBLE INCLUYE RED CABLEADO

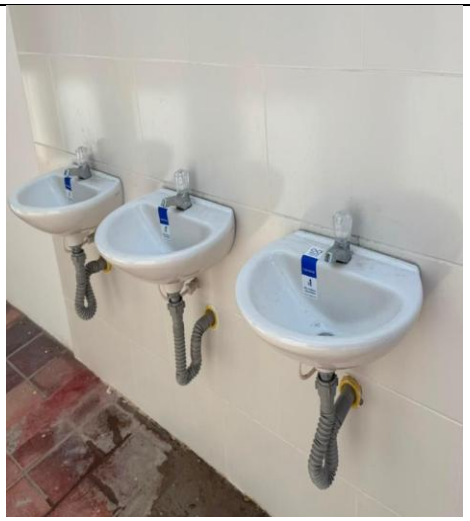	
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)
	
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	RETIRO DE ESCOMBROS (incluye cargue, transporte y disposicion final a sitio autorizado)
	
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	DESMONTE TEJA TERMOACUSTICA
	

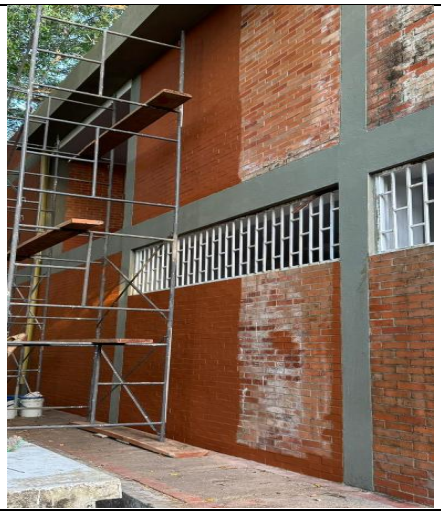DESMONTE CIELO RASO FALSO	DESMONTE DE LUMINARIAS
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA DE COLOR	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y CANALES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO MANUAL
	
IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL EN CONCRETO	PAÑETE CON MORTERO 1:4 SOBRE MAMPOSTERIA
	

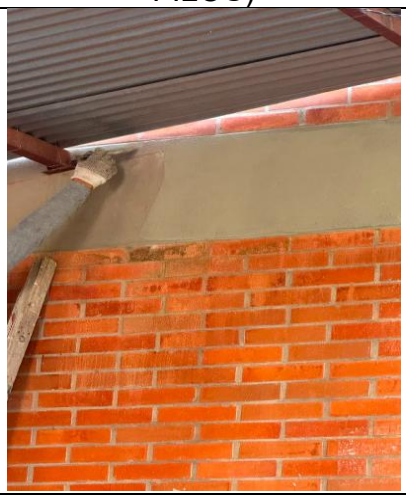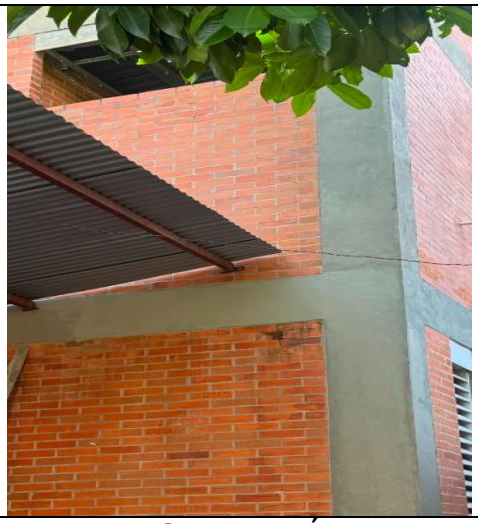PINTURA EXTERIOR TIPO 1 A TRES CAPAS (INCLUYE RESANES Y FILOS)	CIELO RASO CONFORMADO POR LAMINAS DE PVC (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE)
	
PINTURA GRIS BASALTO EN VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCRTURA DE CONCRETO	RESANE SOBRE MURO
	
PINTURA EN VINILO TIPO 1 TRES MANOS	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

	
POLIETILENO NEGRO CAL 6	GRIFERIA LAVAMANOS
	
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO TIPO LLAVE SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA)	

5.5. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS

Durante la instalación de los diferentes materiales, se lleva a cabo un proceso de validación exhaustivo que incluye inspecciones visuales y verificaciones mecánicas in situ, garantizando que los materiales estén libres de daños y que la instalación se realice conforme a los estándares establecidos.

5.6. CONTROL DE EQUIPOS

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al período abarcado por el presente informe, se emplearon herramientas menores especializadas para llevar a cabo las distintas tareas. Esto con el objetivo de asegurar un funcionamiento óptimo y una ejecución eficiente de las actividades. Al final del informe, se adjuntan los resultados de las inspecciones realizadas a los diferentes equipos, los cuales fueron fundamentales para garantizar su operatividad y el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

INSPECCION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	
1	ESCALERA TIPO TIJERA
2	HERRAMIENTAS MANUALES
3	ANDAMIO ESTRUCTURAL

TABLA 6 CONTROL DE QUIPOS

5.7. CONTROL DEL CLIMA

Se relaciona a continuación el control del clima durante el periodo del presente informe:

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		1 Soleado 33°C / 23°C	**2** Soleado 33°C / 23°C	**3** Part. Nublado 34°C / 22°C	**4** Soleado 34°C / 23°C	**5** Part. Nublado 33°C / 23°C
6 Despejado 34°C / 23°C	**7** Soleado 33°C / 23°C	**8** Nubosidad Var. 32°C / 22°C	**9** Chubasco Aislado 31°C / 22°C	**10** Soleado 33°C / 23°C	**11** Despejado 34°C / 23°C	**12** Part. Nublado 33°C / 23°C
13 Soleado 34°C / 24°C	**14** Despejado 35°C / 23°C	**15** Part. Nublado 33°C / 23°C	**16** Soleado 34°C / 23°C	**17** Llovizna Breve 32°C / 22°C	**18** Part. Nublado 33°C / 23°C	**19** Despejado 34°C / 23°C
20 Soleado 35°C / 23°C	**21** Part. Nublado 34°C / 22°C	**22** Soleado 34°C / 23°C	**23** Despejado 35°C / 24°C	**24** Part. Nublado 33°C / 23°C	**25** Chubasco Tarde 31°C / 22°C	**26** Part. Nublado 33°C / 22°C

27 Soleado 34°C / 23°C	**28** Despejado 35°C / 23°C	**29** Soleado 34°C / 23°C	**30** Part. Nublado 33°C / 23°C	**31** Despejado 34°C / 23°C		

TABLA 7 CONTROL DEL CLIMA

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes al presente informe, se presentaron condiciones climáticas mayormente favorables, caracterizadas por períodos de tiempo seco y baja presencia de lluvias. Las precipitaciones registradas fueron ocasionales y de corta duración, sin generar afectaciones significativas en el desarrollo de las actividades ni retrasos en la ejecución de los diferentes frentes de trabajo.

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVOS

6.1. TRAMITES Y PERMISOS

Durante el período comprendido en el presente informe no se realizaron tramites administrativos.

6.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Al final del documento se anexan consolidado de correspondencia enviada durante el periodo del presente informe.

6.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Al final del documento se anexan consolidado de correspondencia recibida durante el periodo del presente informe.

7. COMPONENTE SOCIAL

7.1. NOVEDADES DE ORDEN SOCIAL

Durante el periodo objeto del presente informe se presentaron novedades de orden público en el municipio de Ataco, Tolima, relacionadas con hechos de violencia y presencia de grupos armados ilegales, generando condiciones de seguridad que requirieron seguimiento y medidas preventivas para el desarrollo de las actividades del proyecto.

8. RECOMENDACIONES

8.1. RECOMENDACIONES AL CONTRATANTE

Durante el periodo del presente informe no se presentan recomendaciones al contratante.

8.2. RECOMENDACIONES A LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del presente informe no se presentan recomendaciones a la interventoría.

9. CONCLUSIONES

En el presente informe se expone de manera detallada y técnica el estado de avance del proyecto, haciendo especial énfasis en las actividades ejecutadas correspondientes al capítulo de obras preliminares. A la fecha, se evidencia un progreso positivo en relación con el cronograma establecido, reflejando un porcentaje significativo en la ejecución.

Es importante destacar que, con el objetivo de mantener y ampliar dicho adelanto, se han intensificado los esfuerzos operativos y de coordinación, en aras de asegurar el cumplimiento riguroso de los plazos contractuales y propiciar el desarrollo exitoso del proyecto.

Asimismo, se mantiene una comunicación permanente y estratégica con los proveedores, con el fin de verificar la disponibilidad oportuna de materiales y recursos requeridos. Esta gestión proactiva busca mitigar cualquier riesgo de interrupción en la ejecución de la obra, garantizando así la continuidad y eficiencia del proceso constructivo.

10. ANEXOS

10.1. COPIA DE PÓLIZAS

10.2. FICHAS TÉCNICAS

CONSORCIO W SEDES
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá
