Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2026

Informe de supervisión correspondiente al 01 al 30 de septiembre del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00149 del once (11) de junio del dos mil veintiséis (2026) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Cedula de ciudadanía	1.019.040.806
Cargo en la dependencia	EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Unidad de dependencia	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Correo electrónico	Carlos.perezca@ejercito.mil
Teléfono	3136988819

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-015-2025			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	136-1-2025			
Unidad	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"			
Objeto	"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" DEL EJERCITO NACIONAL-LOTE 2 MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLATA DE ZAPATERIA"			
Valor Inicial	TRES MIL QUINCE MILLONES DE $ 3.015.000.000,00).			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	TRES MIL QUINCE MILLONES DE $ 3.015.000.000,00).			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
14/02/2026	23/12/2026		14/02/2026	
Aplica Acta de inicio	**SI**	X	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Sr. JESÚS HIGOR ROJAS VARGAS	79.937.939	IMPOCOSER S.A.S	830.025.916-0

4. Información Presupuestal

19 OCT 2026

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
29625	13/11/2025	$ 11.000.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
141025	18-02-2025	$ 3.015.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**


La información de material ambiental fue presentada con el informe del mes de junio del 2026.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El 04 de septiembre de 2026 IMPOCOSER presentó documentación correspondiente a la guía de transporte internacional de DHL, asociada al envío identificado con el número de seguimiento 5000233722 y a la preparación del envío, como soporte de las gestiones adelantadas para la adquisición y el transporte de los repuestos requeridos. De acuerdo con la información aportada, dichos repuestos habían sido solicitados y se encontraban en proceso de envío hacia Colombia.

Los documentos se incorporan como evidencia del seguimiento a la gestión logística realizada por el contratista. No obstante, queda pendiente verificar la llegada de los repuestos y su posterior entrega, a fin de confirmar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con su suministro.



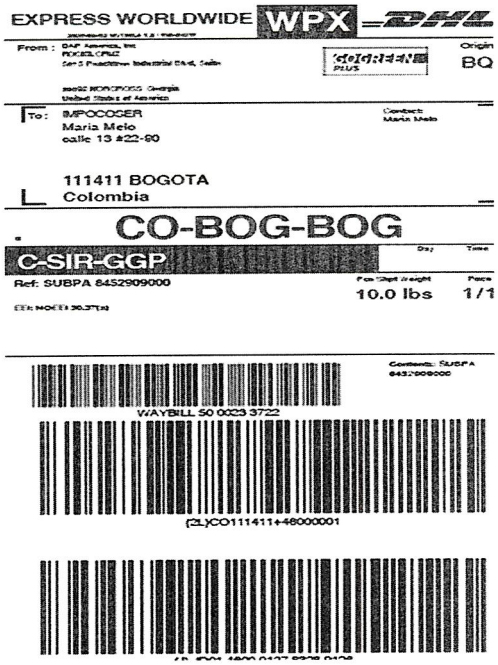

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 04 de septiembre de 2026, mediante el Acta de Reunión No. 2026692013239366, se llevó a cabo una reunión de seguimiento al Contrato de Compraventa No. 136-1-2025, en la cual se verificaron las novedades presentadas durante el proceso de ajuste y calibración requerido para cada una de las máquinas donde se evidencio lo siguiente, así;

Se realizó la verificación del estado actual del **Contrato de Compraventa No. 136-1-25**, en compañía del Comité Técnico Evaluador, Ingeniero de Planta de Zapatería y contratista. Durante la revisión se evaluó el estado de cada una de las máquinas adquiridas, identificando las novedades presentadas en cuanto a funcionamiento, calibración, repuestos, accesorios y demás componentes. Como resultado de esta inspección, se evidenció el siguiente estado:

✓ **MAQUINAS DOS AGUJAS DE POSTE CON PIER RODANTE**

- Total, máquinas: 7
- 5 trabajando
- 1 barra partida – Diente Partidos
- 1 diente Partidos

Durante la verificación realizada se evidenció que dos (2) máquinas presentan los dientes partidos. Se deja constancia de que dichas máquinas no presentaban esta novedad en verificaciones anteriores. Al respecto, la empresa IMPOCOSER informó que procederá a realizar la solicitud al fabricante DÜRKOPP para la reposición de los repuestos requeridos. Una vez recibida la respuesta por parte de, *DURKOPP* informará al supervisor la fecha estimada de entrega e instalación de los repuestos, con el fin de realizar el respectivo seguimiento hasta su solución.

Adicionalmente, la necesidad de realizar el cambio de la barra del rodachín y la planchuela de una de las máquinas. De acuerdo con lo informado por IMPOCOSER, a la fecha se han gestionado los elementos requeridos y se encuentra pendiente únicamente la llegada de la planchuela, para proceder posteriormente con la instalación y puesta en funcionamiento de los componentes.

IMPOCOSER hace entrega de Rastreo de guía DHL con el fin de verificar el estaus del repuesto requerido el cual se anexa a esta acta.

MAQUINA REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA

- Total: 3
- 2 trabajando
- 1 cambio de planchuela

Se encuentra pendiente el cambio de la planchuela para el INSERT, repuesto que fue solicitado por el contratista a DÜRKOPP, con el propósito de realizar la correspondiente reposición.

De acuerdo con lo informado por el contratista, durante la fecha de seguimiento se tiene previsto confirmar la respuesta del fabricante respecto de la solicitud realizada. Una vez se cuente con dicha confirmación, el contratista deberá informar al supervisor la fecha programada para la entrega e instalación de la planchuela, con el fin de realizar el respectivo seguimiento hasta la culminación de la actividad.

- ✓ **MAQUINA ZIGZADORA**
  - Total: 1

IMPOCOSER realizó el cambio de la planchuela; sin embargo, la guía quedó a una altura inferior a la requerida para el correcto funcionamiento de la máquina.

En consecuencia, se realizar el ajuste correspondiente de la guía, de acuerdo con las condiciones técnicas y de operación requeridas.

- ✓ **MAQUINAS DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM**
  - Total: 2
  - Estado: Trabajando

Durante la puesta en marcha de la máquina se presentó una falla que generó daño en uno de sus componentes, identificándose la necesidad de realizar el cambio de una planchuela.

De acuerdo con lo informado por el contratista, el repuesto tiene prevista su llegada para el lunes 07 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual se procederá con su respectiva instalación.

- ✓ **MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER**
  - Total: 1
  - Estado: Trabajando

- ✓ **MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2 MM**
  - Total: 1
  - Estado: Trabajando

- ✓ **MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)**
  - Total: 1

- El 04 de septiembre de 2026 se elaboró el Informe No.2026692001948301, dirigido al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO), en el cual se indica de acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento contractual, a la fecha se evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos y novedades presentadas y verificadas durante la reunión de seguimiento y gestión registrada en el Acta No. 2026692013239366.

Se revisó el estado de la maquinaria, evidenciando que la mayoría de los equipos se encuentran operativos y trabajando.

En las máquinas de DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE, cinco (5) se encuentran operativas y dos (2) presentan dientes partidos; adicionalmente, está pendiente la llegada de una planchuela para completar la reparación de una máquina. En las REFILADORAS PARA CALZADO, dos (2) están funcionando y una (1) requiere cambio de planchuela. La MÁQUINA ZIGZADORA requiere ajuste de la guía después del cambio de la planchuela. Por su parte, las MÁQUINAS DE DOS AGUJAS DE POSTE CON FOLDER DE 1,5 CM presentan una novedad relacionada con el cambio de una planchuela, cuyo repuesto está pendiente de instalación.

Las demás máquinas relacionadas se encuentran reportadas en funcionamiento. Se deja constancia de los compromisos adquiridos por el contratista para gestionar los repuestos ante el fabricante DÜRKOPP, informar las fechas estimadas de entrega e instalación y realizar los ajustes necesarios, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y efectuar el seguimiento hasta la solución de las novedades identificadas.

- El 16 de septiembre de 2026 se elaboró el Informe No. 2026692002048011, dirigido al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO), con fundamento en el seguimiento realizado por la supervisión y el Comité Técnico Evaluador, cuyo resultado quedó consignado en el Informe No. 2026692029816663. Se evidenció que los equipos han sido sometidos a actividades de ajuste, calibración y pruebas operacionales para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y garantizar su adecuado funcionamiento.

  A la fecha de corte, se encuentra pendiente únicamente la instalación del repuesto INSERT de la máquina de dos agujas de poste con pie rodante, ET-03242 (INT-01). Una vez instalado, se deberá realizar la validación técnica y la prueba operacional correspondiente. Con la superación de esta novedad, se completaría la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 16 equipos.

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICICACIÓN TECNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 01 INSERT
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

- El 25 de septiembre de 2026 se elaboró el Informe No. 2026692002136841, dirigido al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO), con fundamento en el seguimiento realizado por la supervisión y el Comité Técnico Evaluador, cuyo resultado quedó consignado en el Informe

No. 2026692029816663. Como resultado, se evidenció que los equipos han sido objeto de ajustes, calibración y pruebas operacionales, encontrándose pendiente únicamente la instalación de 02 INSERT de la ET-3242 MÁQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE (INT - 01). y el ajuste de ajuste de la guia y planchuela de la MAQUINA ZIGZADORA- INT – 01 para puesta en funcionamiento, actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos conforme a las condiciones técnicas requeridas

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICICACIÓN TECNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 02 INSERT
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	AJUSTE DE LA GUIA Y PLANCHUELA
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

El contratista IMPOCOSER S.A.S. ha atendido las actividades requeridas para garantizar la operatividad de los equipos. Una vez instalado el repuesto pendiente, se deberá efectuar la validación técnica y la prueba operacional correspondiente para verificar su funcionamiento y determinar el cierre de la novedad, completando así la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los dieciséis (16) equipos contemplados en el contrato.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica toda vez que no se recibió el objeto contractual

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

- **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
---	---	---	---	---	---

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	---	---	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 3.015.000.000,00	$ 0,00	% 0,00

- **Porcentajes de Ejecución**

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/09/2026**	**0,00 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/09/2026**	**0,00 %**

- **Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales**

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		---

- **Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria**

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	---
Prorroga	01	31/12/2025	---	14/02/2026	Se realiza prorroga al contrato hasta 14/02/2026
Modificación	---	---	---	---	---
Suspensión	---	---	---	---	---
Reinicio	---	---	---	---	---
Aclaratoria	---	---	---	---	---
Otros	---	---	---	---	---

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

- **Información de Pólizas**

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		*17058396* Anexo 0	*19-12-202*	$ 1.809.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	*$ 904.500.000,00*	*17/12/2025*	*1/07/2027*
Calidad y correcto de funcionamiento	30	*$ 904.500.000,00*	*17/12/2025*	*1/07/2027*
Salarios y prestaciones sociales	--------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	--------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	--------	----------	----------	----------

Póliza prorroga N° 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		*17058396* Anexo 1	*07-01-2026*	$ 1.809.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	*$ 904.500.000,00*	*17/12/2025*	*01-10-2027*
Calidad y correcto de funcionamiento	30	*$ 904.500.000,00*	*17/12/2025*	*17-12-2025*
Salarios y prestaciones sociales	--------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	--------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	--------	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

- **Información Debido Proceso**

Plazo de ejecución	14/02/2026
Motivo de presunto incumplimiento	Clausula Sexta – Plazo de Ejecución
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	14/05/2026
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	19/05/2026
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	Ajustes a la maquinaria y culminación de capacitación al personal operador, transferencia de conocimiento
Estado a la fecha	La empresa realizo la instalación de maquinaria se encuentra en proceso de ajustes solicitados de acuerdo a la necesidad de producción de la planta de zapatería, la transferencia de conocimiento fue realizada, esto de acuerdo que se llevó a

	cabo audiencia de apertura del proceso sancionatorio el 21 de mayo de 2026; en esta diligencia se presentó solicitud de recepción extemporánea por parte del contratista, solicitud que se respondió de manera favorable por la Ordenación del Gasto a través de comunicación oficial RAD. No. 0387 - FORPO – OJURI – 302-10-29 del 26 de mayo de 2026, donde se dio viabilidad para recibir la maquinaria objeto del trabajo.

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Anexos:

- Acta de Seguimiento No. 2026692013239366 de fecha 04 de septiembre de 2026.
- oficio informe No. 2026692001948301, dirigido a FORPO de fecha 04 de septiembre de 2026.
- oficio informe No. 2026692002048011, dirigido a FORPO con anexo Oficio de comité evaluador No. 2026692029816663 de fecha 16 de septiembre de 2026.
- oficio informe No. 2026692002136841, dirigido a FORPO con anexo Oficio de comité evaluador No. 2026692029816663 de fecha 25 de septiembre de 2026.
- guía de transporte internacional de DHL (Waybill) y un documento de preparación de envío.

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 136-1-25

19 OCT 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 6 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 11 Fecha de emisión: 2026-01-16

Acta No. 2026692013239366		Fecha	4 de septiembre de 2026
		Lugar	
Asunto	Acta de reunión de seguimiento Contrato de Compra Venta N 136-1-25 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA NO. SUBASTA 015-2025"		
Hora inicio	10:15 horas	Hora finalización	11:00 horas
Participantes	MY.CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Supervisor contrato de Compraventa No. 136-1-25 TO. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA MURCIA Comité técnico Evaluador Contrato 136-1-25 TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA Ingeniera Planta Zapatería BAINT TO.WILIAM AVILA Jefe de planta Zapatería BAINT TO.ALBA MURCIA Supervisor Planta Zapatería BAINT DIANA CUELLAR AGUILAR Asesora IMPOCOSER		
Ausentes	N/A		

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la lista personal asistente
Socializacion estado de maquinaria lote.1

DESARROLLO:

1. Se verifica la lista de personal asistente el cual se compromete a cumplir cada uno de los compromisos expuestos en la siguiente acta de reunión.

2. Se realizó la verificación del estado actual del Contrato de Compraventa No. 136-1-25, en compañía del Comité Técnico Evaluador, Ingeniero de Planta de Zapatería y contratista. Durante la revisión se evaluó el estado de cada una de las máquinas adquiridas, identificando las novedades presentadas en cuanto a funcionamiento, calibración, repuestos, accesorios y demás componentes. Como resultado de esta inspección, se evidenció el siguiente estado:

   ✓ **MAQUINAS DOS AGUJAS DE POSTE CON PIER RODANTE**

   - Total máquinas: 7
   - 5 trabajando
   - 1 Barra partida – Diente Partidos
   - 1 Diente Partidos

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

Durante la verificación realizada se evidenció que dos (2) máquinas presentan los dientes partidos. Se deja constancia de que dichas máquinas no presentaban esta novedad en verificaciones anteriores. Al respecto, la empresa IMPOCOSER informó que procederá a realizar la solicitud al fabricante DÜRKOPP para la reposición de los repuestos requeridos. Una vez recibida la respuesta por parte de, *DURKOPP* informará al supervisor la fecha estimada de entrega e instalación de los repuestos, con el fin de realizar el respectivo seguimiento hasta su solución.

Adicionalmente, la necesidad de realizar el cambio de la barra del rodachín y la planchuela de una de las máquinas. De acuerdo con lo informado por IMPOCOSER, a la fecha se han gestionado los elementos requeridos y se encuentra pendiente únicamente la llegada de la planchuela, para proceder posteriormente con la instalación y puesta en funcionamiento de los componentes.

IMPOCOSER hace entrega de Rastreo de guía DHL con el fin de verificar el estaus del repuesto requerido el cual se anexa a esta acta.

MAQUINA REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA

- Total: 3
- 2 Trabajando
- 1 Cambio de planchuela

Se encuentra pendiente el cambio de la planchuela para el INSERT, repuesto que fue solicitado por el contratista a DÜRKOPP, con el propósito de realizar la correspondiente reposición.

De acuerdo con lo informado por el contratista, durante la fecha de seguimiento se tiene previsto confirmar la respuesta del fabricante respecto de la solicitud realizada. Una vez se cuente con dicha confirmación, el contratista deberá informar al supervisor la fecha programada para la entrega e instalación de la planchuela, con el fin de realizar el respectivo seguimiento hasta la culminación de la actividad.

✓ **MAQUINA ZIGZADORA**

- Total: 1

IMPOCOSER realizó el cambio de la planchuela; sin embargo, la guía quedó a una altura inferior a la requerida para el correcto funcionamiento de la máquina.

En consecuencia, se realizar el ajuste correspondiente de la guía, de acuerdo con las condiciones técnicas y de operación requeridas.

✓ **MAQUINAS DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM**

- Total: 2
- Estado: Trabajando

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 6 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 11 Fecha de emisión: 2026-01-16

Durante la puesta en marcha de la máquina se presentó una falla que generó daño en uno de sus componentes, identificándose la necesidad de realizar el cambio de una planchuela.

De acuerdo con lo informado por el contratista, el repuesto tiene prevista su llegada para el lunes 07 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual se procederá con su respectiva instalación.

✓ **MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER**

- Total: 1
- Estado: Trabajando

✓ **MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2 MM**

- Total: 1
- Estado: Trabajando

✓ **MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)**

- Total: 1

COMPROMISOS:

Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
MAQUINAS DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM: Cambio de planchuela	IMPOCOSER	07-09-2026
MAQUINA ZIGZADORA: Relizar ajuste y/o calibracion	IMPOCOSER	07-09-2026
MAQUINA REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA: Cofirmar respuesta de DÜRKOPP para establecer fecha de cambio de planchuela.	IMPOCOSER	07-09-2026
MAQUINAS DOS AGUJAS DE POSTE CON PIER RODANTE: Cofirmar respuesta de DÜRKOPP para establecer fecha de cambio de repuestos.	IMPOCOSER	07-09-2026

CONVOCATORIA:

TO.DIANA PATRICIA RINCON ARIAS
Secretario de la Reunión

TO. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA MURCIA
Comité técnico Evaluador Contrato 136-1-25

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compra Venta N 136-1-25
Quien preside la reunión

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 5 Código: FC-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 11 Fecha de emisión: 2026-01-16

Acta No. 2026692013239366:	Fecha: 4 de septiembre de 2026 Lugar:BAINT	Presidida por: MY.CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Asunto:	Acta de reunión de seguimiento Contrato de Compra Venta N 136-1-25 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA NO. SUBASTA 015-2025"	

Asistentes a la reunión:

No.	Grado. Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico Institucional	Unidad	Firma
	Diana Cuéllar Aguilar	Asesora	dianacuelbr@imprenta.gov.co	IMPRENTA	
	Ty William Alejandro Ariza	Jefe Planta	williamariv@gmail.com	Baint	
	TO2 Alba Murcia	Supervisor	alba.murcia@ejercito.mil.co	Baint	
	TO.S. Andrea Monroy	Ing planta	andrea.monroy@	BAINT	
	TO. Brayan Sebastian Lozano	Ing- Mtto	brayan.lozanemurcia@	BAINT	

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

EXPRESS WORLDWIDE WPX

2026-03-02 WAYBILL: 1.0.*30-0321*

From : DAP America, Inc
ROGEL CRUZ
5975 Peachtree Industrial Blvd. Suite

30092 NORCROSS Georgia
United States of America

Origin:
BOK

To : IMPOCOSER
Maria Melo
calle 13 #22-90

Contact:
Maria Melo

111411 BOGOTA
Colombia

CO-BOG-BOG

C SIR GGP

Day Time

Ref: SUBPA 8452909000

Per/Shpt Weight: 10.0 lbs

Piece: 1/1

EEI: NOEEI 30.37(n)

Contents: SUBPA 8452909000

WAYBILL 50 0023 3722

(2L)CO111411+48000001

(J) JD01 4600 0127 8328 9126

WAYBILL DOC

Not to be attached to package - Hand to Courier

2026/09/02 MYDHL+ /

Shipper :

DAP America, Inc
ROGIEL CRUZ
5875 Peachtree Industrial Blvd, Suite
30092 NORCROSS Georgia
United States of America

Contact:
+17704468162

Receiver :

IMPOCOSER
Maria Melo
calle 13 #22-90
111411 BOGOTA
Colombia

Contact:
Maria Melo
+573104858349
carlera@impocoser.com

US-BQK-AHN CO-BOG-BOG

Product Details:

[P] EXPRESS WORLDWIDE (48)

Payer Details

Freight A/C: IMPEXONI
Duty A/C: Receiver Will Pay
Taxes A/C: Receiver Will Pay

Features / Services (Service Code)

Duties & Taxes Unpaid(DS)
GoGreen Plus - Carbon Reduced(FD)

Shipment Details

Ref: SUBPA 8452909000
Custom Val: 1,660.64 USD
EEI: NOEEI 30.37(a)

Cust Decl Shpt Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM):	Pieces
10.0 lbs	1

Name (In Capital Letters) | Signature | Date (DD/MM/YYYY)

Contents: SUBPA
8452909000

WAYBILL 50 0023 3722

License Plates of pieces in shipment
JD014600012783289128

Maria Melo From IMPOCOSER has created a shipment for you!

A shipping label has been prepared for you. Enter the Waybill Number when scheduling pickup.

Schedule a Pickup

Waybill Tracking Number
5000233722

Ship To

Maria Melo
IMPOCOSER
calle 13 #22-90
BOGOTA
111411
Colombia
3104856349
cartera@impocoser.com

Shipment Details

Shipper's Reference: SUBPA 8452909000
Delivery Option: EXPRESS WORLDWIDE
Shipment Type: PACKAGE
Number of Packages: 1
Piece ID: JD014600012783289126
Total Weight: 10.0 LBS
Dimensional Weight: 6.1 LBS
Chargeable Weight: 10.0 LBS
Declared Value: 1,660.6 USD
Description of Contents: SUBPA 8452909000

Important

- Do not seal your shipment as the courier must inspect the contents.
- Attach one copy of the label securely to each package and give the other to the courier.
- You or a representative must be present when the courier arrives. Shipments cannot be left outside or in "safe" places for the courier to pickup.
- Ensure your packages are packed and labeled correctly to avoid damage or delays. Follow DHL's Packing with Care
- Contact Maria Melo if you have any questions.

14:28 Uber 14:42

DHL

Rastreo y Seguimiento

Introduzca los números de rastreo

5000233722

Rastrear

Código de rastreo: **5000233722**

Este embarque está gestionado por: **DHL Express**

Envío en espera del siguiente proceso.

Última actualización: viernes, 4 de septiembre de 2026, 12:10 p.m. (UTC -04:00), MIAMI GATEWAY - Florida - USA

Origen: **SMYRNA - Georgia - USA**

Destino: **BOGOTA - COLOMBIA**

Entrega Estimada

7 de septiembre de 2026 - Al Final del Día

Más Detalles

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692001948301: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C, 4 de septiembre de 2026

Al contestar cite radicado:
2026-201-02984-R

Fecha: 2026-09-07 Hora: 09:28:00
Remitente(s): Carlos Ernesto Perez Cardona
Destinatario(s): DIRECCIÓN GENERAL
Folios: 6
Adjuntos/Anexos:0

Señor
WILSON FERNANDO CARVAJAL CABALLERO
Director General Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional FORPO
Carrera 66 a N° 43-18
Bogotá, D.C

Asunto: Director General Fondo Rotatorio de la Policía Nacional FORPO

Con toda atención, me permito informar el estado actual de acuerdo a seguimiento del Contrato de Compra Venta N° 136-1-25 Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa No. 015-2025, cuyo objeto es la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria industrial para la planta de zapatería del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" del Ejército Nacional, especificamente el Lote 1: MAQUINARIA DE por el valor de TRES MIL QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 3.015.000.000,00) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, IVA incluido y demás impuestos aplicables.

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento contractual, a la fecha se establece compromisos en la reunión de seguimiento consignada en el Acta No.2026692013239366, en la cual se abordaron los siguientes temas:

MAQUINA REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA

- Total: 3
- 2 Trabajando
- 1 Cambio de planchuela

Se encuentra pendiente el cambio de la planchuela para el INSERT, repuesto que fue solicitado por el contratista a DÜRKOPP, con el propósito de realizar la correspondiente reposición.

De acuerdo con lo informado por el contratista, durante la fecha de seguimiento se tiene previsto confirmar la respuesta del fabricante respecto de la solicitud realizada. Una vez se cuente con dicha confirmación, el contratista deberá informar al supervisor la fecha programada para la entrega e instalación de la planchuela, con el fin de realizar el respectivo seguimiento hasta la culminación de la actividad.

Radicado N° 20268920019463O1 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

- ✓ MAQUINA ZIGZADORA
  - Total: 1

IMPOCOSER realizó el cambio de la planchuela; sin embargo, la guía quedó a una altura inferior a la requerida para el correcto funcionamiento de la máquina.

En consecuencia, se realizar el ajuste correspondiente de la guía, de acuerdo con las condiciones técnicas y de operación requeridas.

- ✓ MAQUINAS DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM
  - Total: 2
  - Estado: Trabajando

Durante la puesta en marcha de la máquina se presentó una falla que generó daño en uno de sus componentes, identificándose la necesidad de realizar el cambio de una planchuela.

De acuerdo con lo informado por el contratista, el repuesto tiene prevista su llegada para el lunes 07 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual se procederá con su respectiva instalación.

- ✓ MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER
  - Total: 1
  - Estado: Trabajando
- ✓ MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2 MM
  - Total: 1
  - Estado: Trabajando
- ✓ MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)
  - Total: 1

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compraventa
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: (07 Siete Folios)

Proyectó: SO. Daniel Arcos
Supervisó Administración de Producción BAINT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692002048011: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C, 16 de septiembre de 2026

Señor
WILSON FERNANDO CARVAJAL CABALLERO
Director General Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional FORPO
Carrera 66 a N° 43-18
Bogotá, D.C

Asunto: Informe Estado Actual Contrato de Compra Venta N 136-1-25

Con toda atención, me permito informar el estado actual de acuerdo a seguimiento del Contrato de Compra Venta N° 136-1-25 Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa No. 015-2025, cuyo objeto es la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria industrial para la planta de zapatería del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" del Ejército Nacional, específicamente el Lote 1: MAQUINARIA DE por el valor de TRES MIL QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 3.015.000.000,00) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, IVA incluido y demás impuestos aplicables.

De acuerdo con el seguimiento efectuado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el **Informe del Comité Técnico Evaluador No. 2026692029816663**, se evidenció que los equipos que presentaban observaciones se encuentran en proceso de **ajuste final, validación técnica y realización de pruebas operacionales**, actividades requeridas para verificar el cumplimiento integral de los parámetros de funcionamiento, desempeño, confiabilidad y calidad establecidos para los equipos.

A la fecha de corte del presente informe, **únicamente se encuentra pendiente la instalación del repuesto INSERT correspondiente a la ET-3242 – máquina de dos agujas de poste con pie rodante (INT-01)**. Una vez efectuada dicha instalación, deberá realizarse la respectiva validación técnica y prueba operacional, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y proceder con el cierre de la observación, de ser procedente.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA	ESPECIFICICACIÓN TECNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 01 INSERT

Radicado N° 2026692002048011 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

De acuerdo con el seguimiento efectuado, se evidencia que el contratista **IMPOCOSER S.A.S.** ha atendido las actividades de calibración, ajuste, pruebas operacionales y verificación funcional requeridas para garantizar la adecuada operatividad y confiabilidad de los equipos.

A la fecha, se encuentra pendiente únicamente la **instalación y validación técnica del INSERT ET-03242**, correspondiente a la máquina de dos agujas de poste con pie rodante **(INT-01)**. Una vez culminada esta actividad y verificada técnicamente su operación, se completaría la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los **16 equipos correspondientes a las 7 categorías de maquinaria** contempladas en las especificaciones técnicas del contrato.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compraventa
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: (01 Un Folio)

Proyectó: TO. Diana Ruiz
Supervisó Administración de Producción BAINT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692029816663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3

Bogotá, D.C, 16 de septiembre de 2026

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón De Intendencia N°1 "Las Juanas"
Supervisor del contrato 136-1-25
Carrera 46 N° 20C - 79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Estado técnico contrato 136-1-25

Con toda atención me permito informar sobre el estado actual de la maquinaria adquirida al contratista IMPOCOSER S.A.S. con NIT 830.025.916-0, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., bajo el CONTRATO DE **COMPRAVENTA No. 136-1-25**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N.1 "LAS JUANAS" DEL EJÉRCITO NACIONAL. LOTE 1: MAQUINARIA DE COSTURA PLANTA DE ZAPATERÍA".** Al momento, se han efectuado las labores de ejecución y puesta en funcionamiento, priorizando la puesta a punto de los equipos. Dicha actividad deberá ejecutarse en la planta de zapatería del BAINT, cumpliendo con las condiciones técnicas exigidas y en coordinación previa con el supervisor del contrato, sin que se generen costos adicionales para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas".

En la actualidad, los equipos que presentaban observaciones se encuentran en proceso de ajuste final, validación técnica y pruebas operacionales, etapas necesarias para verificar el cumplimiento integral de los parámetros de funcionamiento, desempeño, confiabilidad y calidad exigidos por la planta de producción. **Al momento, únicamente se encuentra pendiente la instalación del repuesto INSERT de la ET-3242 máquina dos agujas de poste con pie rodante (INT - 01).**

Radicado N° 2026692029816663 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICICACIÓN TECNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 01 INSERT
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

Con la instalación y validación técnica del insert (INSERT ET 03242) en la máquina dos agujas de poste con pie rodante (INT - 01), se dará por completada en su totalidad la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 16 equipos correspondientes a las 7 categorías de maquinaria contempladas en las especificaciones técnicas del contrato. Asimismo, se evidencia la atención oportuna por parte del contratista IMPOCOSER S.A.S. en la ejecución de las actividades de calibración, ajuste, pruebas operacionales y verificación funcional requeridas para garantizar la operatividad y confiabilidad de los equipos.

Respetuosamente,

TE. CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
Comité técnico evaluador

TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
Comité técnico evaluador

TO. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA
Comité técnico evaluador

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692002136841: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C, 25 de septiembre de 2026

Señor
WILSON FERNANDO CARVAJAL CABALLERO
Director General Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional FORPO
Carrera 66 a N° 43-18
Bogotá, D.C

Asunto: Informe Estado Actual Contrato de Compra Venta N 136-1-25

Con toda atención, me permito informar el estado actual de acuerdo a seguimiento del Contrato de Compra Venta N° 136-1-25 Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa No. 015-2025, cuyo objeto es la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria industrial para la planta de zapatería del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" del Ejército Nacional, específicamente el Lote 1: MAQUINARIA DE por el valor de TRES MIL QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 3.015.000.000,00) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, IVA incluido y demás impuestos aplicables.

De acuerdo con el seguimiento efectuado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el Informe del Comité Técnico Evaluador No. 2026692031149113, se evidenció las siguientes novedades.

En desarrollo de las actividades de seguimiento a la ejecución contractual, se verificó el estado de entrega, instalación, ajuste y puesta en funcionamiento de los equipos correspondientes a las diferentes categorías de maquinaria contempladas en las especificaciones técnicas.

A la fecha del presente informe, la mayoría de los equipos entregados se encuentran instalados y operativos, sin registrarse novedades adicionales en las máquinas relacionadas. No obstante, durante la verificación técnica se identificaron algunas actividades que permanecen pendientes de ejecución por parte del contratista, las cuales deberán ser atendidas y validadas antes de considerar culminadas en su totalidad las actividades de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

En particular, se encuentra pendiente la instalación de 02 INSERT de la ET-3242 máquina dos

Radicado N° 2026692002136841 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

agujas de poste con pie rodante (INT - 01). y el ajuste de AJUSTE DE LA GUIA Y PLANCHUELA PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos conforme a las condiciones técnicas requeridas.

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 02 INSERT
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	AJUSTE DE LA GUIA Y PLANCHUELA
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

En consecuencia, se encuentra pendiente por parte del contratista IMPOCOSER S.A.S. la culminación de las actividades anteriormente señaladas.

Una vez se realice la instalación de los dos (02) INSERT correspondientes a la ET 03242, se efectúe el ajuste de la guía y planchuela de la máquina zigzadora ET 03257, y se adelanten las respectivas pruebas de funcionamiento y validaciones técnicas, se podrá determinar la culminación de las actividades pendientes relacionadas con la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.

Se deja constancia de que el contratista IMPOCOSER S.A.S. ha venido adelantando actividades de calibración, ajuste, pruebas operacionales y verificación funcional de los equipos entregados; no obstante, deberá culminar las actividades pendientes con el fin de garantizar la totalidad de las condiciones técnicas requeridas y la adecuada operatividad de los equipos.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compraventa
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: (01 Un Folio)

Proyecto: TO. Diana Bincon
Superviso Administración de Producción BAINT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692031149113: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3

Bogotá, D.C, 25 de septiembre de 2026

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón De Intendencia N°1 "Las Juanas"
Carrera 46 N° 20 C- 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Novedades contrato de compraventa N 136-1-25

Con toda atención me permito informar sobre el estado actual de la maquinaria adquirida al contratista IMPOCOSER S.A.S. con NIT 830.025.916-0, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., bajo el CONTRATO DE **COMPRAVENTA No. 136-1-25**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N.1 "LAS JUANAS" DEL EJÉRCITO NACIONAL. LOTE 1: MAQUINARIA DE COSTURA PLANTA DE ZAPATERÍA"**. Al momento, se han efectuado las labores de ejecución y puesta en funcionamiento, priorizando la puesta a punto de los equipos. Dicha actividad deberá ejecutarse en la planta de zapatería del BAINT, cumpliendo con las condiciones técnicas exigidas y en coordinación previa con el supervisor del contrato, sin que se generen costos adicionales para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas".

En la actualidad, los equipos que presentaban observaciones se encuentran en proceso de ajuste final, validación técnica y pruebas operacionales, etapas necesarias para verificar el cumplimiento integral de los parámetros de funcionamiento, desempeño, confiabilidad y calidad exigidos por la planta de producción. **Al momento, se encuentra pendiente la instalación de 02 INSERT de la ET-3242 máquina dos agujas de poste con pie rodante (INT - 01). y el ajuste de AJUSTE DE LA GUIA Y PLANCHUELA PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**

Radicado N° 2026692031149113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	ESPECIFICICACIÓN TECNICA	CANTIDAD ENTREGADA	NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE	ET 03242 MAQUINA DOS AGUJAS DE POSTE CON PIE RODANTE INT - 01	7	PENDIENTE ENTREGA 02 INSERT
MAQUINA PLANA DE TRIPPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM	ET 00393 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS A 2MM INT - 02	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM	ET 03263 MAQUINA DE DOS AGUJAS POSTE CON FOLDER 1,5 CM INT - 01	2	SIN NOVEDAD
MAQUINA ZIGZADORA	ET 03257 MAQUINA ZIGZADORA- INT - 01	1	AJUSTE DE LA GUIA Y PLANCHUELA
MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER	ET 00411 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE DE 20 MM CON FOLDER INT 2	1	SIN NOVEDAD
MAQUINA RIFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA	ET 05691 MAQUINA DE POSTE REFILADORA PARA CALZADO PIE RODANTE DE UNA AGUJA INT - 0	3	SIN NOVEDAD
MAQUINA TRIPLE TRNSPORTE UNA AGUJA (FOLDER TRABAJO PESADO)	ET 03251 MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE UNA AGUJA FOLDER TRABAJO PESADO INT - 01	1	SIN NOVEDAD

Con la instalación y validación técnica del insert (INSERT ET 03242) en la máquina dos agujas de poste con pie rodante (INT - 01), se dará por completada en su totalidad la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 16 equipos correspondientes a las 7 categorías de maquinaria contempladas en las especificaciones técnicas del contrato. Asimismo, se evidencia la atención oportuna por parte del contratista IMPOCOSER S.A.S. en la ejecución de las actividades de calibración, ajuste, pruebas operacionales y verificación funcional requeridas para garantizar la operatividad y confiabilidad de los equipos.

Respetuosamente,

TE. CAMILO ANDRES RODRIGUEZ
Comité técnico evaluador

TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
Comité técnico evaluador

TO. BRAYAN SEBASTIAN LASERNA
Comité técnico evaluador

14:28 Uber 14:42

Rastreo y Seguimiento

Introduzca los números de rastreo

5000233722

Rastrear

Código de rastreo: **5000233722**

Este embarque está gestionado por: **DHL Express**

Envío en espera del siguiente proceso.

Última actualización: viernes, 4 de septiembre de 2026, 12:10 p.m. (UTC -04:00), MIAMI GATEWAY - Florida - USA

Origen: **SMYRNA - Georgia - USA**

Destino: **BOGOTA - COLOMBIA**

Entrega Estimada

7 de septiembre de 2026 - Al Final del Día

Más Detalles

EXPRESS WORLDWIDE **WPX** DHL

2026-09-02 MYDHL - 1.0 * 20-0621*

From : DAP America, Inc
RODEL CRUZ
5875 Peachtree Industrial Blvc, Suite

GOGREEN PLUS

Origin:
BQK

30092 NORCROSS Georgia
United States of America

To : IMPOCOSER
Maria Melo
calle 13 #22-90

Contact:
Maria Melo

111411 BOGOTA
Colombia

CO-BOG-BOG

C-SIR-GGP

Day Time

Ref: SUBPA 8452909000

Pce/Shpt Weight: **10.0 lbs**

Piece: **1/1**

EEI: NOEEI 30.37(a)

Contents: SUBPA 8452909000

WAYBILL 50 0023 3722

(2L)CO111411+48000001

(J) JD01 4600 0127 8328 9126

WAYBILL DOC

Not to be attached to package - Hand to Courier

2026-09-22 MYDHL+ /

WPX

Shipper :
DAP America, Inc
ROCIEL CRUZ
5875 Peachtree Industrial Blvd, Suite
30092 NORCROSS Georgia
United States of America

Contact:
+17704468162

Receiver :
IMPOCOSER
Maria Melo
calle 13 #22-90
111411 BOGOTA
Colombia

Contact:
Maria Melo
+573104856349
cartera@impocoser.com

US-BQK-AHN CO-BOG-BOG

Product Details:
[P] EXPRESS WORLDWIDE (48)

Payer Details
Freight A/C: IMPEXONL
Duty A/C: Receiver Will Pay
Taxes A/C: Receiver Will Pay

Features / Services (Service Code)
Duties & Taxes Unpaid(DS)
GoGreen Plus - Carbon Reduced(FD)

Shipment Details
Ref: SUBPA 8452909000
Custom Val: 1.660,64 USD
EEI: NOEEI 30.37(a)

Cust Decl Shpt Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM):	Pieces
10.0 lbs	1

Name [in Capital Letters] | Signature | Date (DD.MM.YYYY)

WAYBILL 50 0023 3722

Contents: SUBPA 8452909000

License Plates of pieces in shipment
JD014500012783289126

Maria Melo From IMPOCOSER has created a shipment for you!

A shipping label has been prepared for you. Enter the Waybill Number when scheduling pickup.

Schedule a Pickup

Waybill Tracking Number
5000233722

Ship To

Maria Melo
IMPOCOSER
calle 13 #22-90
BOGOTA
111411
Colombia
3104856349
cartera@impocoser.com

Shipment Details

Shipper's Reference: SUBPA 8452909000
Delivery Option: EXPRESS WORLDWIDE
Shipment Type: PACKAGE
Number of Packages: 1
Piece ID: JD014600012783289126
Total Weight: 10.0 LBS
Dimensional Weight: 6.1 LBS
Chargeable Weight: 10.0 LBS
Declared Value: 1,660.6 USD
Description of Contents: SUBPA 8452909000

Important

- Do not seal your shipment as the courier must inspect the contents.
- Attach one copy of the label securely to each package and give the other to the courier.
- You or a representative must be present when the courier arrives. Shipments cannot be left outside or in "safe" places for the courier to pickup.
- Ensure your packages are packed and labeled correctly to avoid damage or delays. Follow DHL's Packing with Care
- Contact Maria Melo if you have any questions.
