REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 DE 2026

MARIA SONIA TORRES MORA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

TAURAMENA 2026

FECHA: (22/10/2026)

INFORME DE SUPERVISION No. 05

CONTRATO No.	286 del 20 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Servicios
OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
R/LEGAL	FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES Contrato No. 289 de 2026
VALOR CONTRATO	$ 449.999.999,00
FECHA INICIACIÓN	04 de Mayo de 2026
FECHA TERMINACIÓN	30 Octubre de 2026
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
PERIODO DE EJECUCIÓN	del 04 de Septiembre de 2026 al 03 de octubre de 2026
% AVANCE FINANCIERO	76,77%
% AVANCE FISICO	85,00%
FECHA PRESENTE INFORME	22 de octubre de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Septima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
	Con la ejecución del contrato de Servicio No. 286 de 2026, para el periodo comprendido entre el 04 de septiembre de 2026 al 03 de octubre de 2026, GROUP BINARIOS LTDA garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 operadores de medios tecnológicos, para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de "CCTV" con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia, investigación y búsqueda de hechos delictivos en tiempos realces o cuando ocurre un hecho delictivo. Igualmente en este mismo periodo se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de "CCTV" y sus componentes tecnológicos con una cuadrilla conformada por 2 técnicos, quienes adelantaron las labores técnicas para garantizar el funcionamiento de las cámaras de seguridad, la sala de control, red de fibra óptica, red de radio enlaces y sistema de red eléctrica

REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.	regulada de los puntos de cámaras de seguridad. Por otra parte para el periodo comprendido del 04 de septiembre de 2026, al 03 de octubre de 2026 con el soporte técnico realizado por el contratista a todo el sistema de video vigilancia "CCTV" se encuentran en funcionamiento y con conexión al centro de monitoreo 56 cámaras de seguridad grabando y visualizándose, el contratista realizo el respectivo soporte técnico a la red de fibra óptica y la red de radio enlaces, sistema de red de energía eléctrica, soporte técnico al sistema de grabación, sistema de visualización y de monitoreo garantizando su funcionalidad. Y se reinstalaron 3 alarmas comunitarias las cuales están en proceso de pruebas, ajustes técnicos y entregas a los presidentes de las juntas de acción comunal para ser agregados los usuarios para un total de 7 alarmas comunitarias con soporte técnico realizado por el contratista Durante el periodo comprendido del 04 de septiembre de 2026 al 03 de octubre de 2026 con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: sujetos sospechosos 18, acto contrario a la seguridad y convivencia 18, conato de incendio 2, acompañamiento con cámara 4, accidente de transito 4, captura 2, mascota perdida 5, consumo alucinógenos 18, comercio alucinógenos 2, incautación de arma blanca 5, comparendos 12, búsqueda de evidencias 5, riña 3, incautación de alucinógenos 2, para un total de 100 eventos reportados; a la fecha del presente informe el contrato 286 de 2026 presenta una ejecución del 76,77% financiera y ejecución física del 85,00% del contrato Se dio cumplimiento al Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana PISCC 2024- 2027. Dimensión Estratégica 2: Fortalecimiento Institucional con Tecnología para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Tauramena. META DE PRODUCTO: Mantenimiento avanzado y correctivo, suministro de repuestos, soporte técnico para el sistema de video vigilancia de cámaras de seguridad, en el área urbana y rural del Municipio. INDICADOR: Cámaras mantenidas en operación
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	22

2. GARANTIAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato	X			04 de mayo 2026
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	X			04 de mayo 2026
Calidad y correcto funcionamiento	X			04 de mayo 2026

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
57-46-101012162	SEGUROS DEL ESTADO	cumplimiento	$ 44.999.999,90	20 de Abril de 2026	28 de febrero de 2027	NO
		Salarios, prestaciones e indemnizaciones	$ 22.499.999,95	20 de Abril de 2026	20 de octubre de 2029	NO
		Calidad y correcto funcionamiento	$ 44.999.999,90	20 de Abril de 2026	20 de octubre de 2027	NO
57-46-101012162	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil extracontractual	$ 350.181.000,00	20 de Abril de 2026	20 de octubre de 2026	NO

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 449.999.999			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No.				
Valor Acta No.01			$ 64.035.584,00	$ 64.035.584,00
Valor Acta No.02			$ 61.969.920,00	$ 61.969.920,00
Valor Acta No.03			$ 64.035.584,00	$ 64.035.584,00
Valor Acta No.04			$ 93.437.824,56	$ 93.437.824,56
Valor Presente Acta No.05			$ 61.969.920,00	$ 61.969.920,00
Saldo por ejecutar			$ 104.551.166,44	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 449.999.999**		**$ 449.999.999**	**$ 345.448.832,56**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo no se materializo ningun riesgo

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Informe de actividades No. 05	20 de octubre de 2026
Acta de visita - Supervision	septiembre de 2026
Acta parcial No. 05	22 de Octubre de 2026

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe parcial No. 05 con sus respectivos soportes, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	PUNTAJE:	N/A	

6. ANEXOS

1. **Anexo 1.** Informe de actividades No. 05 con sus respectivos anexos

Registros fotograficos

Planillas de Seguridad Social

Factura electronica

2. **Anexo 2.** Informe de supervision No. 05

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Apoyo a la supervisón

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***Garantizar la prestación del servicio de equipo humano permanente de 4 operadores de Medio Tecnológico (O.M.T.) incluye 1 supervisor, para la central de monitoreo que se encuentra ubicada en la estación de policía de TAURAMENA, para monitorear el CCTV durante las veinticuatro (24) horas del día, de domingo a domingo, con turnos de 8 horas cada uno. Este personal debe ser calificado, idóneo y con experiencia especifica en el cargo, este personal debe contar con los elementos de dotación de calidad e idoneidad para la atención oportuna y eficiente de sus actividades de acuerdo con su contrato. Presentar a la supervisión, hojas de vida y soporte de los elementos de dotación entregados para la correcta prestación del servicio. (Por única vez con el primer informe).***

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA en cumplimiento de la presente actividad, garantiza la prestación del servicio con equipo humano permanente de 4 operadores de Medio Tecnológico (O.M.T.) relacionados – Recurso Humano, en la central de monitoreo ubicada en la estación de policía de TAURAMENA, monitoreando el CCTV durante las veinticuatro (24) horas del día, de domingo a domingo, con turnos de 8 horas cada uno.
Cabe resaltar que los servicios fueron prestados con personal calificado, idóneo y con experiencia relevante en el cargo y en general, durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, contaron con todos los elementos de dotación de buena calidad que permitieron atender con prontitud y eficiencia las labores del objeto contractual.
Ver Anexo No. 1 - Recurso humano
Ver Anexo No. 12 – Entrega de dotación

2	***Asumir la totalidad de la carga salarial y prestaciones de seguridad social, de los Operadores de Medios Tecnológicos (O.M.T.), que se requieran para la prestación de este servicio; cancelando cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato, so pena de ser reportado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y/o al Ministerio de la Protección Social. El contratista deberá aportar de manera mensual los soportes que acrediten dichos pagos prestacionales.***

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, Para el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, GROUP BINARIOS LTDA asumió la totalidad de la carga salarial y prestaciones de seguridad social de los operadores de medios tecnológicos (OMT) requeridos para la prestación del servicio del objeto contractual, cancelando oportunamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

Ver Anexo No. 2 – Aportes de seguridad social.
Ver Anexo No. 3 – Certificado de seguridad social y parafiscales.
Ver Anexo No. 4 – Desprendibles de Pago del Personal.

3	**Presentar a la supervisión el soporte de entrega al personal del servicio de O.M.T. de la respectiva credencial, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Por única vez con el primer informe).**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, Dando cumplimiento a la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA entregó la credencial al personal relacionado del presente informe, bajo las condiciones exigidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

4	***Realizar de forma permanente la revisión de los eventos transmitidos en tiempo real a las pantallas (Video Wall), producto de las imágenes registradas en las diferentes cámaras del CCTV de seguridad ciudadana instaladas en el municipio; eventos que constituyan amenaza o que ayuden a prevenir delitos o problemáticas que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana. Se debe entregar reporte detallado de estos eventos, los cuales deben ser entregados de manera mensual a la Supervisión.***

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA a través de los operadores de medios tecnológicos (OMT) relacionados en – Recurso Humano del presente informe durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, se realizó de forma permanente la revisión de eventos trasmitidos en tiempo real a las pantallas (Video Wall), producto de las imágenes registradas en las diferentes cámaras del CCTV de seguridad ciudadana instaladas en el municipio de los eventos que constituyeron amenaza o que ayudaron a prevenir delitos o problemáticas que pudieron afectar la convivencia y seguridad ciudadana.

Dichos eventos se encuentran visibles en el Anexo No 5 del presente informe denominado Detalle de Eventos, anexo No 6 denominado registro fotográfico de evento y anexo 7 estadísticas de eventos. Es importante aclarar que dichos eventos son clasificados como confidenciales.

Ver Anexo No. 6 – Detalle de eventos.
Ver Anexo No. 7 – Registro fotográfico de eventos
Ver Anexo No. 8 – Estadísticas de eventos

5	***Reportar de manera inmediata mediante correo electrónico o en medio físico a la Supervisión, SIJIN , Policía Nacional Municipal y/o Ejercito Nacional de los incidentes negativos (homicidios, robos, atracos, accidentes fatales, asonadas, atentados, secuestros) ocurridos en las ubicaciones donde se tenga percepción por las cámaras de seguridad del CCTV. Estos incidentes deberán ser reportados de manera mensual a la Supervisión, detallando la novedad o evento presentado.***

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, Para el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, de manera asíncrona se detectaron e informaron cuatro (04) incidentes negativos que fueron reportados. Dichos reportes se encuentran visibles
Ver Anexo No. 9 - Incidentes negativos

6	**De llegar a presentarse incidentes negativos (homicidios, robos, atracos, accidentes fatales, asonadas, atentados, secuestros), se debe coordinar las acciones pertinentes según sea el caso con la red de apoyo de la Policía Nacional, SIJIN, Ejército, Bomberos, gestores de convivencia, hospital y otras entidades de emergencia.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, se presentaron cuatro (4) incidentes negativos detallados en el presente informe, en el que se detallan las acciones realizadas.
Ver Anexo No. 9 - Incidentes negativos

7	**Se deberá diligenciar en tiempo real y con letra legible el libro actualizado de minuta, con los respectivos reportes de novedades de turno, equipos y materiales de cada puesto de trabajo, el cual se debe presentar copia a la supervisión del contrato de manera mensual.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA a través de su personal diligenció en tiempo real y con letra legible el libro de minuta visible en el anexo No. 10 – Copia de la Minuta, el cual registra todas las novedades de turno, equipos de trabajo y materiales del puesto de trabajo entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026.
Ver Anexo No. 10 – Copia de la minuta

8	**El contratista y el equipo de operadores con su respectivo supervisor debe mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada o que llegue a su conocimiento con ocasión del desarrollo del objeto contractual. Para ello deberán Fimnar compromiso, código de ética, para Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, GROUP BINARIOS LTDA adjunta compromiso de confidencialidad donde la empresa y cada uno de sus colaboradores mantienen la reserva profesional sobre la información recibida en ocasión del desarrollo del objeto contractual.
Ver Anexo No. 13 – Documentos de confidencialidad

9	**Cuando se requiera; asistir al comité civil de convivencia ciudadana y presentar soporte a la superVisión del contrato debidamente firmado por los asistentes.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad, Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, no se realizaron comités civiles de convivencia y seguridad ciudadana.

10	**Reportar de manera inmediata cualquier falla presentada en las cámaras, DVR'S o computadores al personal técnico encargado de la entidad, con el fin de tomar las acciones pertinentes.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad GROUP BINARIOS LTDA, UUna vez ocurridas las fallas, los operadores de medios tecnológicos – Recurso Humano, reporto las fallas en las cámaras, DVR'S o computadores al personal técnico, el Reporte de Fallas se encuentra un resumen de los reportes realizados a la entidad.
Ver Anexo No. 11 – Reporte de fallas

11	**Cuando se requiera, brindar apoyo a la supervisión en los informes de gestión solicitados por las entidades de control.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026 no se requirió apoyo por parte de la supervisión.

12	**Para la suscripción del acta de inicio deberá presentar a la supervisión para aprobación de cuatro (4) Hojas de Vida de operadores de medios tecnológicos con Curso de Fundamento y/o Reentrenamiento en Medios tecnológicos y Copia de la acreditación del personal como operadores de medios tecnológicos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con experiencia mínima de seis meses como operador de medios tecnológicos y experiencia específica de 3 meses operando salas de video o CCTV de entidades públicas. 1 supervisor debe certificar haber pertenecido como miembro activo a las fuerzas militares o Policia Nacional o Departamento administrativo de seguridad. En un periodo superior a 5 años.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad GROUP BINARIOS LTDA en cumplimiento de la presente actividad, garantizo la entrega de las hojas de vida del equipo humano para la suscripción del acta de inicio las cuales cumplieron los requisitos exigidos y fueron aprobadas por la supervisión.
El equipo de trabajo ha sido seleccionado rigurosamente y cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la entidad para la prestación del servicio.

B) MANTENIMIENTO CCTV

13	**Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo diario de las cámaras pertenecientes al circuito cerrado de televisión CCTV y alarmas comunitarias asignadas a la estación de Policia Tauramena. De igual manera Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de enlace radio RF de transmisión, fibra óptica, UPS de 1KVA, switches, conexión acometida eléctrica, transformador 220VAC- 110VAC. Mantenimiento preventivo y correctivo diario de los equipos pertenecientes a la sala de monitoreo como lo son: monitor de 55 pulgadas, cuarto técnico, rack con equipos, NVRS, siwtch, UPS 6 KVA, Planta eléctrica, Aire acondicionado, tableros eléctricos, radio base de comunicación con sus accesorios, y reguladores. Para la ejecución de esta actividad se requiere contar como minimo con Un (1): Técnico electricista o técnico electrónico, con experiencia general minima de 5 años acreditada con la fecha de expedición del diploma, experiencia especifica, como minimo haber participado en Un (01) contrato, cuyo alcance haya sido suministro o instalación o mantenimiento de sistemas CCTV, instalados con medio de transmisión en fibra óptica. Un (1): Técnico en sistemas y/o técnico electricista: Experiencia general de mínimo de tres (3) años acreditada con la fecha de expedición del diploma, experiencia específica, como mínimo haber participado en Un (01) contrato, cuyo alcance haya sido suministro o instalación o mantenimiento de sistemas CCTV, instalados con medio de transmisión en fibra óptica. Presentar a la supervisión, hojas de vida y soporte de los elementos de dotación entregados para la correcta prestación del servicio. (Por única vez con el primer informe).**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad GROUP BINARIOS LTDA, Para el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, se ejecutaron labores de asistencia y soporte técnico al sistema CCTV del municipio de Tauramena, las cuales se encuentran detalladas en el correspondiente informe de mantenimiento relacionado.
Así mismo, se garantizó la prestación del servicio técnico mediante la asignación de dos (2) técnicos visibles como recurso humano, cuyas hojas de vida fueron relacionadas en el presente Informe. Con ello se evidenció que el personal asignado cuenta con la formación, idoneidad y experiencia requerida para el desarrollo de las actividades contratadas.

Por otra parte, se llevó a cabo, con el apoyo del personal técnico, mantenimiento de tipo de diagnóstico y correctivo. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de cámaras de seguridad, incluyendo la revisión, diagnóstico, ajuste y/o corrección de los componentes asociados a su operación. Adicionalmente, se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico regulado que alimenta los puntos de cámaras de seguridad, así como de la infraestructura de la red de fibra óptica.

	De igual manera, se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el sistema de radioenlace, orientadas a garantizar la continuidad y estabilidad de las comunicaciones. Asimismo, se realizaron ajustes y actividades de mantenimiento en el Centro de Control, incluyendo el sistema de grabación, el sistema de visualización de video, los equipos de monitoreo y la red de comunicaciones. De manera complementaria, se continúa con la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el sistema de alarmas comunitarias, con el propósito de garantizar su adecuada operación y disponibilidad. En concordancia con lo anterior, las actividades ejecutadas y los respectivos soportes técnicos se encuentran consignados en el Anexo No. 14 – Soporte – Servicio Técnico.
	Que, durante el periodo objeto de reporte, se realizaron pruebas de funcionamiento, diagnóstico y verificación de los equipos, identificándose que algunas de las desconexiones presentadas fueron ocasionadas por una interrupción en el suministro de energía eléctrica. En consecuencia, se procedió con la inspección y reactivación de los interruptores eléctricos correspondientes, logrando restablecer la alimentación, conectividad y operatividad de los sistemas de videovigilancia afectados.
	De igual manera, durante el desarrollo de estas actividades se efectuaron las respectivas pruebas de continuidad, funcionamiento y verificación de la red de fibra óptica, mediante las cuales se identificó una falla que actualmente afecta la comunicación y transmisión de las señales provenientes de las cámaras de videovigilancia. Ante esta situación, el personal técnico inició las labores de inspección, diagnóstico y localización del punto de afectación sobre el tendido de fibra óptica, con el propósito de determinar la ubicación y naturaleza de la falla y, posteriormente, ejecutar las actividades técnicas requeridas para su reparación y restablecimiento integral de la comunicación. Ver Anexo No. 14 – Soporte – Servicio Técnico Ver Anexo No. 1 – Recurso Humano – Hojas de vida
14	**Mantenimiento Preventivo Se define como la acción técnica administrativa que se lleva a efecto para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o elemento. Con el propósito de mantenerlos en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan en defectos mayores. La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a plena capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando paradas largas por averias graves, lo cual proporciona grandes costos**
	Se reviso el cumplimiento de la presente actividad GROUP BINARIOS LTDA , rPara el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, se ejecutaron labores de mantenimiento preventivo al sistema de CCTV del municipio, durante las cuales se identificaron diferentes novedades, entre ellas fallas en canales de video, dispositivos averiados y cortes en la fibra óptica.
	Frente a las novedades identificadas durante el periodo, se ejecutaron las actividades correspondientes de diagnóstico, mantenimiento correctivo, reparación y restablecimiento, con el propósito de garantizar la recuperación de la operatividad de los equipos y servicios en el menor tiempo posible. De igual manera, se atendieron oportunamente los requerimientos específicos reportados por el personal del Centro de Monitoreo y por la supervisión del contrato, dando cumplimiento a las actividades, compromisos y obligaciones establecidos contractualmente.
	Por otra parte, se dio continuidad al proceso de diagnóstico y reparación de las alarmas comunitarias que presentaban novedades y se encontraban pendientes de atención de periodos anteriores. Para estos equipos se realizó el seguimiento técnico correspondiente, verificando y reportando su estado actual, así como las gestiones adelantadas para su diagnóstico, reparación y/o recuperación funcional directamente con el fabricante, cuando la naturaleza de la falla así lo requirió.
	En consecuencia, las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron atender las fallas y novedades identificadas, efectuar el seguimiento de los equipos pendientes de intervención y contribuir a la continuidad operativa de los sistemas de seguridad electrónica, en concordancia con las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato.
	Finalmente, desde el punto de vista técnico, las actividades ejecutadas contribuyeron al sostenimiento de la disponibilidad, funcionalidad y continuidad operativa del sistema de videovigilancia CCTV y de las alarmas comunitarias del municipio. Asimismo, se mantuvo el seguimiento técnico y administrativo de aquellos equipos que requieren intervenciones especializadas, repuestos específicos o procesos de reparación directamente por parte del fabricante, con el fin de facilitar su recuperación y posterior puesta en servicio. Ver Anexo No. 14 – Soporte – Servicio Técnico

15	**Mantenimiento Correctivo El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se utiliza cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente y se tiene que entrar a reparar. Esto origina cargas de trabajo, equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por pago de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata. En resumen, son las consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado.**

Se reviso el cumplimiento de la presente actividad GROUP BINARIOS LTDA, Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre de 2026, se realizaron mantenimientos conforme a las necesidades identificadas, siguiendo los lineamientos técnicos y administrativos establecidos.

Se realizaron mantenimientos correctivos de carácter urgente a los sistemas de alarmas comunitarias que se encontraban fuera de servicio, con el propósito de restablecer su funcionamiento y garantizar la adecuada operatividad de estos sistemas.

7 alarmas instaladas de las cuales se encuentran en funcionamiento las 7, y 2 alarmas en espera de entrega por proveedor

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Apoyo a la supervisón

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 1

A: Durante la operación sala de control

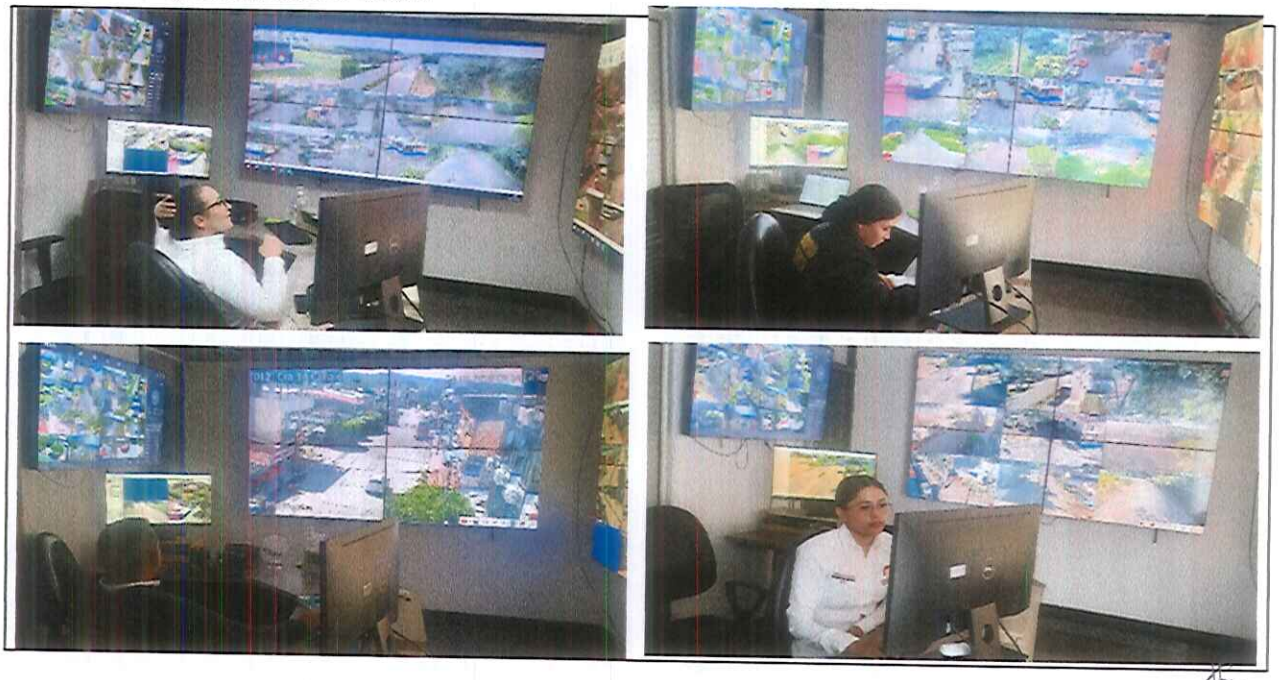

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 2

B: Soporte técnico **camaras de seguridad**





ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 03
PC: soporte tecnico camaras de seguridad





FOTOGRAFÍA No. 04: soporte tecnico en la resitlacion de alarmas comunitarias









ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 05: alarmas comunitarias conectadas al sistema

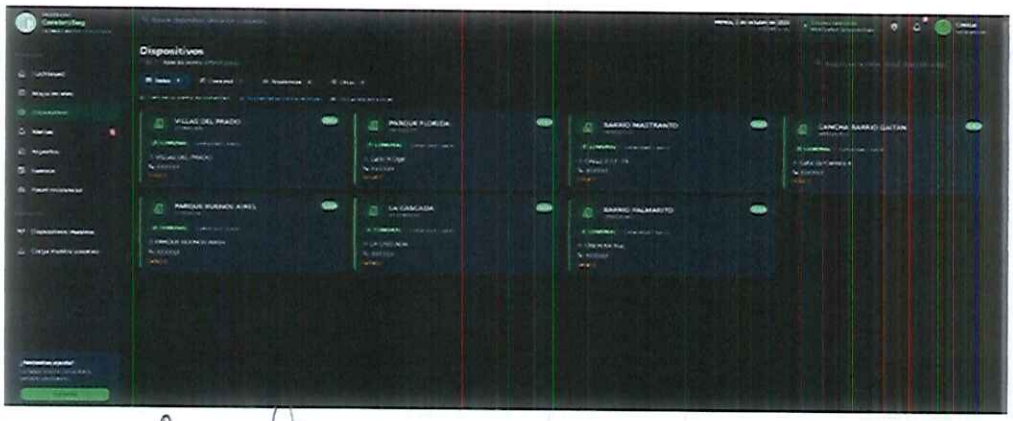

MARIA SONIA TORRES MORA
Cargo: SUPERVISOR

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	Servicios de Operación sala de contro	DIA	180	153	100%	1722%	27	$ 1.246.946	$ 224.450.280	$ 190.782.738,00
2	Valor ejecutado Servicios de soporte técnico	DIA	180	153	100%	1722%	27	$ 818.718,00	$ 147.369.240	$ 125.263.854,0
3	Bolsa de Repuesto	GL	1,000	0,37	100%	0%	0	$ 78.180.479	$ 78.180.479	$ 29.402.240,6
								COSTO DIRECTO TOTAL	$ 449.999.999	$ 345.448.832,56
								VALOR POR EJECUTAR		$ 104.551.166,44

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Apoyo a la Supervision

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

V/CONTRATADO	V/ EJECUTADO	PORCENTAJE
$ 449.999.999	$ 345.448.832,56	76.77%



MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISION

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 05

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MAYO	1	Revision Documentos				N/A
	2			ACTA INICIO	Seguimiento	N/A
	3				Seguimiento	N/A
	4		ACTA INICIO 04/05/2026	ACTA PARCIAL No. 1	Seguimiento	N/A
JUNIO	1			ACTA PARCIAL No. 2	Seguimiento	N/A
	2				Seguimiento	N/A
	3				Seguimiento	N/A
	4			Actas de visitas	Seguimiento	N/A
JULIO	1			ACTA PARCIAL No. 3	Seguimiento	N/A
	2				Seguimiento	N/A
	3				Seguimiento	N/A
	4			Actas de visitas	Seguimiento	N/A
AGOSTO	1			ACTA PARCIAL No. 4	Seguimiento	N/A
	2				Seguimiento	N/A
	3				Seguimiento	N/A
	4			Actas de visitas	Seguimiento	N/A
SEPTIEMBRE	1			ACTA PARCIAL No. 5	Seguimiento	N/A
	2				Seguimiento	N/A
	3				Seguimiento	N/A
	4			Actas de visitas	Seguimiento	N/A

MARIA SONIA TORRES MORA
Supervision

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Apoyo a la Supervision

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 22 A.M, del día 4 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza la visita técnica Con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, al centro de monitoreo con el fin de realizar la verificación del estado de funcionamiento del centro de monitoreo, se revisa el sistema de grabación, sistema de visualización, sistema de monitoreo, sistema comunicaciones, sistema de energía eléctrica regulada, también se verifica el cumplimiento de operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, se revisa la minutas de anotaciones de incidentes de inseguridad registrados, se verifica la funcionalidad del sistema de alarmas comunitarias y se verifica las cantidades de alarmas conectadas al sistema cerebroseg, se le manifiesta al contratista que continue con el proceso de soporte técnico a las alarmas

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad para el siguiente periodo

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS		

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 12 A.M , del día 5 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicada en el barrio Manantial el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, la instalación de la alarma comunitaria, una vez instalada por el contratista de verifica la funcionalidad, quedando como compromiso realizar el acompañamiento con el presidente de la junta de acción Comunal para la entrega y realizar la capacitación y enrolamiento de usuarios

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico a los demás puntos de cámaras de seguridad afectados

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS		

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 10 A.M, del día 7 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicada en el barrio Gaitán el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, la instalación de la alarma comunitaria, una vez instalada por el contratista de verifica la funcionalidad, quedando como compromiso realizar el acompañamiento con el presidente de la junta de acción Comunal para la entrega y realizar la capacitación y enrolamiento de usuarios

.

.

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con el soporte técnico al sistema CCTV

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 10 A.M , del día 9 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado ENTRADA TAURAMENA el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla con el sistema eléctrico, el contratista realizo el ajuste a la acometida eléctrica y restableció la energía eléctrica y quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

.

.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS		

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 18 A.M, del día 11 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la SALIDA VEREDA AGUABLANCA el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla con el Switch de comunicaciones, el contratista realizo el ajuste al switch de comunicaciones y quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo la cámara de seguridad

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS		

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 11: 12 A.M, del día 14 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en el PARQUE PASO CUSIANA el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el hilo de fibra óptica, el contratista realizo la fusión del hilo averiado de la fibra óptica y restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

.

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará el soporte técnico al sistema

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**

ACTA DE VISITA

Siendo las 11:20 A.M , del día 15 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la VÍA CABAÑAS LA QUESERIA el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de radio enlace, el contratista realizo el ajuste al radio enlace y restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará el soporte técnico al sistema CCTV

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO		

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 28 A.M, del día 17 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicada en la entrada a San Agustín el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, de la cámara de seguridad, el contratista revisa el estado de los equipos tecnológicos y encontró que no había energía en los equipos tecnológicos, además la conexión de la red de fibra óptica no está conectando en el centro de monitoreo, el personal técnico realiza la revisión técnica de la acometida eléctrica, y pudo establecer que los breakes de habían saltado debido a un sobre voltaje, revisan el respectivo voltaje y se encontraba dentro del rango establecido, los técnicos procedieron a subir los breakes restableciendo la energía, del inversor, se realizan las pruebas de funcionamiento de la cámara de seguridad, switch de comunicaciones, conexión de la red de fibra óptica y todo quedo funcionando dentro de la normalidad y el punto de cámara de seguridad quedo conectado con el centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico a todo el sistema CCTV

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION

CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		**CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 18 A.M, del día 18 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en el BARRIO LA CASCADA el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de radio enlace, el contratista realizo el ajuste al radio enlace y restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico a todo el sistema CCTV

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO		

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 22 P.M, del día 19 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en el PARQUE EL MASTRANTO el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de radio enlace, el contratista realizo el ajuste al radio enlace y restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará el soporte técnico al sistema de cámaras de seguridad

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 31 A.M, del día 21 del mes de agosto de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la AVENIDA PARKWAYel ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de energía , el contratista realizo el ajuste al sistema eléctrico y se enciende nuevamente los equipos de la cámara de seguridad y se restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO		

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 27 P.M , del día 23 del mes de SEPTIEMBRE de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la PLAN DEL JAGUITO el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se habia desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de energia , el contratista realizo el ajuste al sistema eléctrico y se enciende nuevamente los equipos de la cámara de seguridad y se restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad sobre la marginal de la selva

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policia nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO		

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 10 A.M, del día 24 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la CARRERA 14, CALLE 4 el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de energía , el contratista realizo el ajuste al sistema eléctrico y se enciende nuevamente los equipos de la cámara de seguridad y se restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 11 A.M, del día 25 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la CARRERA 4, CALLE 13ª el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a un bloque en el Switch de comunicaciones , el contratista realizo el reinicio del Switch de comunicaciones y se enciende nuevamente los equipos de la cámara de seguridad y se restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

.

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 11: 12 AM, del día 28 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al punto de cámara de seguridad ubicado en la CALLE 18A, CARRERA 15 el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, del funcionamiento de este punto de cámara de seguridad la cual se había desconectado con el centro de monitoreo debido a una falla en el sistema de energía , el contratista realizo el ajuste al sistema eléctrico y se enciende nuevamente los equipos de la cámara de seguridad y se restableció la conexión con el centro de monitoreo, quedo nuevamente en funcionamiento y conectada al centro de monitoreo

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad sobre la marginal de la selva

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 55 AM, del día 29 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza la visita técnica Con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, al punto de cámara de seguridad del barrio Gaitán con el propósito de verificar el funcionamiento y confioguracion de la alarma comunitarias, se hace pruebas de funcionamiento desde la aplicación de CerebroSeg, pruebas de función de botones de activación como alarma de emergencia, alertas de incendio, ley seca, alerta de sismo, alerta de psicoactivas, disposición de basura entre otras funciones, y se puedo establecer que esta funcionando correctamente.

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad sobre la marginal de la selva

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 39 AM, del día 30 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza la visita técnica Con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, al centro de monitoreo con el propósito de verificar el funcionamiento del software instalado en el computador despachador del operador de medios tecnológicos se revisa la configuración de las 7 alarmas comunitarias configuradas, se hace pruebas de funcionamiento desde la aplicación de CerebroSeg, pruebas de función de botones de activación como alarma de emergencia, alertas de incendio, ley seca, alerta de sismo, alerta de psicoactivas, disposición de basura entre otras funciones, y se pudo establecer que están funcionando correctamente

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara la revisión de cada punto de cámara de seguridad sobre la marginal de la selva

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4. operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9:12A.M, del día 1 del mes de octubre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza la visita técnica Con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, al punto de cámara de seguridad del barrio la Florida con el propósito de verificar el funcionamiento y confioguracion de la alarma comunitarias, se hace pruebas de funcionamiento desde la aplicación de CerebroSeg, pruebas de función de botones de activación como alarma de emergencia, alertas de incendio, ley seca, alerta de sismo, alerta de psicoactivas, disposición de basura entre otras funciones, y se puedo establecer que esta funcionando correctamente

.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continua con el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS		

LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	**77.190.262**	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	**1.116.550.167**	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐ **NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 01 A.M , del día 2 del mes de octubre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza la visita técnica Con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, al punto de cámara de seguridad del barrio Buenos aires con el propósito de verificar el funcionamiento y confioguracion de la alarma comunitarias, se hace pruebas de funcionamiento desde la aplicación de CerebroSeg, pruebas de función de botones de activación como alarma de emergencia, alertas de incendio, ley seca, alerta de sismo, alerta de psicoactivas, disposición de basura entre otras funciones, y se puedo establecer que esta funcionando correctamente

.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS		

DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA OPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 22 A.M, del día 3 del mes de septiembre de 2026 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 286 – 2026, OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

SITUACION OBSERVADA

Se realiza visita técnica al centro de monitoreo con el ingeniero responsable del soporte técnico y el personal técnico del contratista "Group Binarios, para la verificación, el estado del sistema de alarmas comunitarias para el periodo comprendido del 04 de septiembre al 03 de octubre, se verifica y se pudo ver que en la plataforma Cerebroseg se encuentran enroladas al sistema 7 alarmas comunitarias en funcionamiento que son: 1 BARRIO MANANTIAL, 2 BARRIO MASTRANTO, 3 BARRIO GAITÁN, 4 LA CASCADA, 5 PARQUE BUENOS AIRES, 6 PARQUE FLORIDA, 7 VILLA DEL PRADO, por otra parte se encuentran funcionando 56 cámaras de seguridad.

El ingeniero Oscar Alejandro Alfonso responsable del soporte técnico manifiesta se de desinstalaran los radios y se harán soporte técnico para dejarlos operativos.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE		

RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
