Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9560049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 4:24:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20260000200
Objeto del contrato	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/08/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/08/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/08/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CUBARA BOYACA

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONS 57 SAS

COLOMBIA, Cubará
Número de documento 9018725469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES 57 SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	108900548828

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ *Fecha de aprobación:* 12/06/2026 11:39:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: GILDARDO MURCIA BUITRAGO *Fecha de aprobación:* 12/06/2026 11:59:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
Proceso de Contratación	SAMC-007-2026
Título de la oferta	SAMC-007-2026
Cuantía del contrato	490.203.286,52 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/08/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/08/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas para terminar *(12/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20039543	Seriedad de la oferta	-	49.020.329,00 COP	-	7/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9560049
Proveedor CONSTRUCCIONES 57 SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ESTUDIO PREVIO SAMC-007-2026.pdf	ESTUDIO PREVIO SAMC-007-2026.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP_0001.pdf	CDP_0001.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

430

Dirección de notificaciones calle 4 No 4 - 43
Ubicación CO-BOY-15223 - Cubará
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Cubará
Dirección calle 4 No 4 - 43
Código postal 151420

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 4 No 4 - 43	COLOMBIA > Boyacá > Cubará

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9560049

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 490.203.286,52	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 490.203.286,52
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	OBRAS	1,00	UN	490.203.286,52	490.203.286,52	490.203.286,52	490.203.286,52

cumentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO SAMC-007-2026.pdf	ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO SAMC-007-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	490.203.286,52
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑ Sí ☐ No *	490.203.286,52
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		490.203.286,52

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
202500000010511	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2026000251	CDP	No se ha iniciado		490.203.286,52 COP	00-00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

432

ANEXO 2. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 20260000200

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4010555730

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000114818 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	26	05	2026
FECHA DE IMPRESIÓN	26	05	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

DIRECCIÓN: CR 3 # 7 - 74 BRR JARDIN CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA TELÉFONO: 3219563091

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	28/05/2026	07/09/2026	49,020,329.00

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGÚN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE OBRA DE PÚBLICA No. SAMC-007-2026, CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****49,020,329.00	$ ***********49,020	$****20,000.00	$ *******13,114	$ ***********82,134

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO	9188	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000401055573

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD821780A0AF9795C

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia firma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2025

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar América Latina 2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4010608000

PÓLIZA No: 400-47-994000115054 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2026	19	06	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

DIRECCIÓN: CR 3 # 7 - 74 BRR JARDIN CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA TELÉFONO: 3219563091

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE CUBARA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.099.196-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	12/06/2026	12/12/2026	49,020,329.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/06/2026	12/12/2026	147,060,987.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	12/06/2026	12/08/2029	49,020,329.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	98,040,658.00

BENEFICIARIOS
NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N 20260000200 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***343,142,303.00	$ ********1,350,141	$****20,000.00	$ ******260,327	$ ********1,630,467

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO	9188	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ "SERVICIOS" OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000401060800

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD82178090FF47E5F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia firma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimoprimera Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2025

Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMERICA LATINA 2025

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4010608026

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000029526 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CABECERA** COD. AGE: 400 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
19	06	2026		12	06	2026	23:59	12	08	2026	23:59	61	19	06	2026

A LAS A LAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	12	06	2026	23:59	12	08	2026	23:59	61

A LAS A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

DIRECCIÓN: CR 3 # 7 - 74 BRR JARDIN CIUDAD: SARAVENA, ARAUCA TELÉFONO: 3219563091

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

DIRECCIÓN: CR 3 # 7 - 74 BRR JARDIN CIUDAD: **SARAVENA, ARAUCA** TELÉFONO: 3219563091

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUCCIONES 57 S.A.S NIT : 901872546

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: CUBARÁ

DIRECCION: CORREGIMIENTO EL GUAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 350,181,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350,181,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350,181,000.00		
	RCE PATRONAL	350,181,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350,181,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 800099196 - MUNICIPIO DE CUBARA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***350,181,000.00	$ **********175,570	$****20,000.00	$ *******37,158	$ **********232,729

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO	9188	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000401060802

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD82178090FF47E5D CLIENTE BHROJAS 0

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensor-consumidor-financiero**

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor ga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000029526 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

ASEGURADO: **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.872.546-9**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N 20260000200 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000029526 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCCIONES 57 S.A.S IDENTIFICACION: 901.872.546-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S	901872546-9	CORREGIMIENTO EL GUAMO	CUBARÁ	350,181,000.00	175,570	212,729

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
175,570	212,729

438

ANEXO 3. BITACORA DE OBRA

	BITÁCORA DE OBRA			
	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA 20260000200	1	2	7	2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR**	ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	**Nit de Persona Jurídica No:**	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se firma acta de inicio del contrato de obra publica Nº 20260000200, por parte del contratista y el supervisor, el cual autoriza la supervicion el inicio de las actividades del contrato en referencia.

2. Se realiza la entrega de dotación para los profesionales adminitrativos, Ingeniero Civil Residente y la Profesional HSEQ vinculados a la presente obra No. 20260000200

2. Se inicia con la elaboración de los documentos técnicos de acuerdo al pliego de condiciones del proceso SAMC-007-2026, en el item 8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA OBRA, con el fin de dar cumpliento al proceso de licitacion, los cuales se solicitan los siguientes documentos:
-Hojas de vida del personal profesional
-Relación del equipo mínimo obligatorio
-Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Programacion de Obra
- Plan de manejo de tránsito - PMT

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado			
Ing. Director de Interventoria		Cadenero			
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		x		Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

	BITÁCORA DE OBRA				
	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	
CONTRATO DE OBRA LP-07-2025	2	3	7	2026	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR**	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	**Nit de Persona Jurídica No:**	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se continua en oficina con la elaboración de los documentos técnicos de acuerdo al pliego de condiciones del proceso SAMC-007-2026, donde se trabajo en los siguientes documentos:
-Hojas de vida del personal profesional
-Relación del equipo mínimo obligatorio
-Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Programacion de Obra
- Plan de manejo de tránsito - PMT

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado			
Ing. Director de Interventoria		Cadenero			
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SEÑALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X		Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA Nº 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

		BITÁCORA DE OBRA			
		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	20260000200	3	4	7	2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. El dia sabado 4 de julio del 2026 el personal administrativo no laboró.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado			
Ing. Director de Interventoria		Cadenero			
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:			X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A2132020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

		BITÁCORA DE OBRA			
		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA	20260000200	4	5	7	2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. El dia domingo 5 de julio del 2026 el personal administrativo no laboro.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado			
Ing. Director de Interventoria		Cadenero			
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Mezcladora	Planta Electrica Disel
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto
Rana Vibro compactadora	Taladro
Herramienta Menor	
Pulidora	

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:			X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A213[illegible]2020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
5	6	7	2026

CONTRATO DE OBRA	20260000200
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9
Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se finaliza con la elaboración de los documentos técnicos de acuerdo al pliego de condiciones del proceso SAMC-007-2026, dando cumpliento a los requisitos del pliego y realizando la entrega de los documentos a la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas mediante un oficio presentando los siguientes documentos tecnicos:
-Hojas de vida del personal profesional
-Relación del equipo mínimo obligatorio
-Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Programacion de Obra
- Plan de manejo de tránsito - PMT

De acuerdo a lo anterior la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas en representacion del Arq. Jesus Ivan Quiñones Rueda, aprobò los documentos tecnicos del proceso SAMC-07-2026, donde el supervisor le manifesta al contratista para dar inicio a las actividades del contrato de obra publica 20260000200 el dia 07 de julio del 2026.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado			
Ing. Director de Interventoria		Cadenero			
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Mezcladora	Planta Electrica Disel
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto
Rana Vibro compactadora	Taladro
Herramienta Menor	
Pulidora	

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia
No. HORAS:		X	

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA Nº 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

	BITÁCORA DE OBRA			
	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA 20260000200	6	7	7	2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR**	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	**Nit de Persona Jurídica No:**	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se socializa el contrato de obra publica Nº 20260000200 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ", donde hizo presencia la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas en representacion del Arq. Jesus Ivan Quiñones Rueda y el profesional Diego Alejandro Sierra, el Contratista en representacion del Ing. Carlos Andres Sanabria Rodriguez, el presidente de la Junta Comunal en representacion de Yhonatan Alberto Toloza Landazabal y la comunidad en general del Centro poblado el Guamo del municipio de Cubara - Boyaca.

PERSONAL EN OBRA						TIEMPO PERDIDO	
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Causa	Horas
						Paros comunidad	
Ing. Director de Obra		Topógrado	1			Seguridad física	
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1			Lluvias	
Ing. Residente de Obra	1	Paletero					
Ing. Residente de Interventoria		Oficial					
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes					
Ing. Electrico		HSEQ	1				

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X	X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA Nº 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
7	8	7	2026

CONTRATO DE OBRA	20260000200
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9
Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se da inicio con la instalación de la estación topográfica para realizar el respectivo levantamiento del SISTEMA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ., incluyendo el parque principal y las casas aledañas que están sobre la vía, donde se intervino el tramo del pozo existente al pozo Nº6.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Mezcladora	Planta Electrica Disel
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto
Rana Vibro compactadora	Taladro
Herramienta Menor	
Pulidora	

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Retro Excavadora

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:	X			Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

		BITÁCORA DE OBRA				
		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	
CONTRATO DE OBRA	20260000200	8	9	7	2026	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se continua con la instalación de estacas para georreferenciar el levantamiento topográfico sobre el tramo del pozo N° 6 hasta el pozo N° 5, incluyendo las cotas de las viviendas domiciliarias para la tubería corrugada de 6".

2. Se presentaron fuertes lluvias impidiendo la continuacion de la topografia.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	Equipo de topografia
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	Retro Excavadora
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SEÑALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X	X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A2138202[illegible]-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
9	10	7	2026

CONTRATO DE OBRA	20260000200
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9
Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se continua con la instalación de estacas para georreferenciar el levantamiento topográfico sobre el tramo del pozo N° 6 hasta el pozo N° 5, incluyendo las cotas de las viviendas domiciliarias para la tubería corrugada de 6".

2. Se presentaron lluvias en las horas de la mañana.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Mezcladora	Planta Electrica Disel
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto
Rana Vibro compactadora	Taladro
Herramienta Menor	
Pulidora	

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Equipo de topografia
Retro Excavadora

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACIÓN TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X	X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

		BITÁCORA DE OBRA				
		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	
CONTRATO DE OBRA	20260000200	10	11	7	2026	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. El dia sabado 11 de julio del 2026 el personal administrativo y operativo profesional no laboró.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	Equipo de topografia
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	Retro Excavadora
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X	X	Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

	BITÁCORA DE OBRA			
	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO
CONTRATO DE OBRA 20260000200	11	12	7	2026

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR**	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	**Nit de Persona Jurídica No:**	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. El dia domingo 12 de julio del 2026 el personal profesional administrativo y operativo, no laboró por ser día dominical

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	Equipo de topografia
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	Retro Excavadora
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:	X			Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA Nº 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

		BITÁCORA DE OBRA				
		CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	
CONTRATO DE OBRA	20260000200	12	13	7	2026	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	SUPERVISOR	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	Nit de Persona Jurídica No:	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se inicia con la instalación de estacas para georreferenciar el levantamiento topográfico sobre el tramo del pozo N° 5 hasta el pozo N° 4 y el tramo del pozo N° 5 al pozo existente, incluyendo las cotas de las viviendas domiciliarias para la tubería corrugada de 6".

2. Se presentaron fuertes lluvias en las horas de la tarde.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria	1	Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA

Mezcladora	Planta Electrica Disel
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto
Rana Vibro compactadora	Taladro
Herramienta Menor	
Pulidora	

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

Equipo de topografia
Retro Excavadora

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:		X		Suficiente:	Insuficiente:	Suficiente:	Insuficiente:

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

	BITÁCORA DE OBRA				
	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	
CONTRATO DE OBRA 20260000200	13	14	7	2026	

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ	**SUPERVISOR**	ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Nit de Persona Jurídica No:	NIT. 901.872.564-9	**Nit de Persona Jurídica No:**	N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Se realiaza la solicitud ante la Secretaria de Planeacion y Obras públicas, la suspensión de las actividades por el motivo de las fuertes lluvias que se estan presentando en la region como se puede evidenciar en los pronosticos del IDEAM, ya que las fuertes lluvias afectó la vía nacional en la vereda caño negro que comunica el departamento de Arauca con Boyaca donde esto ocasiono y restringio el paso de materiales para la ejecución de la obra, como la tuberia corrugada sanitaria de marca pavco de 6'' y 8'' pulgadas, cemento de marco cemex y acero fy= 60.000 psi.

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
Ing. Director de Obra		Topógrado	1		
Ing. Director de Interventoria		Cadenero	1		
Ing. Residente de Obra	1	Paletero			
Ing. Residente de Interventoria		Oficial			
Ing. Ambiental de Obra		Ayudantes			
Ing. Electrico		HSEQ	1		

TIEMPO PERDIDO

Causa	Horas
Paros comunidad	
Seguridad física	
Lluvias	

HERRAMIENTA UTILIZADA EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
Mezcladora	Planta Electrica Disel	Equipo de topografia
Vibro de Concreto	Cortadora de Concreto	Retro Excavadora
Rana Vibro compactadora	Taladro	
Herramienta Menor		
Pulidora		

ESTADO DEL TIEMPO	Soleado	Nublado	Lluvia	SENALIZACION TEMPORAL		SEGURIDAD INDUSTRIAL	
No. HORAS:	X	X		Suficiente:	Insuficiente	Suficiente:	Insuficiente

OBSERVACIONES

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Matricula No. A21382020-1090480860
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 4. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERSONAL

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES 57 SAS R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ

CONTRATISTA: NEYLA YAJAIRA POSADA AULI
CEDULA DE CIUDADANÍA: 37.396.910 de Cúcuta.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HSEQ PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.00,00) M/CTE

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos, CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.500.302 expedida en Arauquita, actuando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES 57 SAS con Nit. 901.872.546 - 9 domiciliado en Cubara – Boyaca y NEYLA YAJAIRA POSADA AULI, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.396.910 de Cúcuta – N de S, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales como HSEQ, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza como profesional HSEQ.

SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE, por (1) mes, pagaderos al final de los servicios prestados.

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de la revisoría fiscal y de este contrato así lo exijan.

QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de (1) mes y regirá a partir de la fecha en que se firme.

Para constancia se firma en Cubara a los dos (02) días del mes de julio de 2026.

Edición

NEYLA YAJAIRA POSADA AULI
C.C 37.396.910 Cúcuta – N - S
Contratista

CARLOS ANDRES SANABRIA R.
C.C 1.116.500.302 Arauquita - Arauca
Contratante

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE:	CONSTRUCCIONES 57 SAS R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO CABEZAS CABEZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	93.372.569 de Ibague
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA"
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos, CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.500.302 expedida en Arauquita, actuando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES 57 SAS con Nit. 901.872.546 - 9 domiciliado en Cubara – Boyaca y LUIS FERNANDO CABEZAS CABEZAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 93.372.569 de Ibague, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales como TOPOGRAFO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza como profesional TOPOGRAFO.

SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000,00) M/CTE, por (02) meses, pagaderos al final de los servicios prestados.

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA".

CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de la revisoría fiscal y de este contrato así lo exijan.

CONSTRUCCIONES
NIT. 901872546-9

QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de (2) meses y regirá a partir de la fecha en que se firme.

Para constancia se firma en Cubara a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

Edición

LUIS FERNANDO CABEZAS CABEZAS .
C.12.456.511 de San Alberto Cesar
Contratista

CARLOS ANDRES SANABRIA R.
C.C 1.116.500.302 Arauquita - Arauca
Contratante

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES 57 SAS R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ

CONTRATISTA: HELIO MARTINEZ BLANCO

CEDULA DE CIUDADANÍA: 12.456.511

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CADENERO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA"

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 3.501.810,00) M/CTE.

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos, CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.500.302 expedida en Arauquita, actuando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES 57 SAS con Nit. 901.872.546 - 9 domiciliado en Cubara – Boyaca y HELIO MARTINEZ BLANCO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 12.456.511 de San Alberto Cesar, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales como CADENERO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza como profesional TOPOGRAFO.

SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.501.810,00) M/CTE, por (02) meses, pagaderos al final de los servicios prestados.

TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar "AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA".

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de la revisoría fiscal y de este contrato así lo exijan.

QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de (2) meses y regirá a partir de la fecha en que se firme.

Para constancia se firma en Cubara a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

Helio Martinez B.

HELIO MARTINEZ BLANCO.
C.12.456.511 de San Alberto Cesar
Contratista

CARLOS ANDRES SANABRIA R.
C.C 1.116.500.302 Arauquita - Arauca
Contratante

ANEXO 5. ACTA DE AVANCE DE OBRA

Acta de Avance de Obra 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	20260000200	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**FECHA DE INICIO CONTRATO** 2/07/2026
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	$ 490.203.286,52	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL** DOS (02) MESES
		VALOR ANTICIPO (0%) $ 0,00	**FECHA DE TERMINACION** 1/09/2026
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S R/L. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ NIT. 901.872.564-1	**VALOR ADICIONAL No. 1** $ 0,00	
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeacion y Obras Publicas	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA** 14/07/2026	
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	**ESTADO** EJECUCION	
PERIODO DEL ACTA:	02/07/2026 - 14/07/2026		

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron el Arquitecto, JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA, Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra Publica No. LP-07-2025, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y el Señor CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ R/L CONSTRUCCIONES 57 S.A.S NIT. 901.872.546-9 en calidad de contratista, para entregar y recibir la presente acta en la cual se consignan las siguientes cantidades del Contrato de Obra Publica No. LP-07-2025, ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Municipio de Cubará.

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CANTIDADES DEL 02/07/2026 HASTA EL 14 DE JULIO DEL 2026			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO	ML	751,81	$ 6.799,00	$ 5.111.556,19	308,27	$ 6.799,00	$ 2.095.927,73	308,27	$ 2.095.927,73
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS VARIAS									
2.1	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	2086,27	$ 40.564,00	$ 84.627.456,28	-	$ 40.564,00	$ 0,00	-	-
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	38,02	$ 163.030,00	$ 6.198.400,60	-	$ 163.030,00	$ 0,00	-	-
2.3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ARENA DE RÍO PARA CAMA DE TUBERÍA	M3	580,40	$ 170.375,00	$ 98.885.650,00	-	$ 170.375,00	$ 0,00	-	-
2.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	1524,60	$ 63.018,00	$ 96.077.242,80	-	$ 63.018,00	$ 0,00	-	-
2.5	CARGE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	599,69	$ 29.134,00	$ 17.471.368,46	-	$ 29.134,00	$ 0,00	-	-
SUBOTAL					**$ 303.260.118,14**			**$ 0,00**		-
3	CONCRETOS									
3,01	SOLADO CONCRETO f'c = 2500 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M	M2	21,22	$ 70.035,00	$ 1.486.142,70	-	$ 70.035,00	$ 0,00	-	
3,02	PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,10 M DIAMETRO EXT=1,50 M	UND	5,00	$ 767.462,00	$ 3.837.310,00	-	$ 767.462,00	$ 0,00	-	
3,03	ANILLO EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO, E=0,10 M DIAMETRO EXT=1,40 M	ML	5,53	$ 1.390.038,00	$ 7.686.910,14	-	$ 1.390.038,00	$ 0,00	-	
3,04	TAPA EN CONCRETO 3000 PSI, REFORZ. D EXT=1,40 M E=0,20 M PARA POZO DE INSPECCIÒN INCL ARO Y TAPA HF	UND	5,00	$ 1.913.129,00	$ 9.565.645,00	-	$ 1.913.129,00	$ 0,00	-	
3,05	CAJAS DE INSPECCION MEDIDAS INTERNAS DE 0,50 M X 0,50 M X 0,50 M EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE TAPA); ESPESOR DE	UND	22,00	$ 900.269,00	$ 19.805.918,00	-	$ 900.269,00	$ 0,00	-	
3,06	EMBOQUILLADO DE TUBERIA	UND	62,00	$ 69.803,00	$ 4.327.786,00	-	$ 69.803,00	$ 0,00	-	
3,07	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO DE INSPECCIÓN DINT. 1.20 M	UND	5,00	$ 358.540,00	$ 1.792.700,00	-	$ 358.540,00	$ 0,00	-	
3,08	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAJA DE REGISTRO AREA 0,5 X 0,5 M	UND	22,00	$ 103.330,00	$ 2.273.260,00	-	$ 103.330,00	$ 0,00	-	
Subtotal					**$ 50.775.671,84**			**$ 0,00**		-
4										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE Ø = 8"	ML	621,55	$ 170.215,00	$ 105.797.133,25	-	$ 170.215,00	$ 0,00	-	-
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE Ø = 6"	ML	130,26	$ 132.435,00	$ 17.250.983,10	-	$ 132.435,00	$ 0,00	-	-
4.3	SUMINISTRO E INTALACION DE KIT SILLA YEE SANITARIA 8"x6" Y KIT DE CODO EN PVC 45° 6" CON HIDROSELLOS 6"	UND	22,00	$ 363.992,00	$ 8.007.824,00	-	$ 363.992,00	$ 0,00	-	-
Subtotal					**$ 131.055.940,35**			**$ 0,00**		-
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 490.203.286,52**			**$ 2.095.927,73**		**$ 2.095.927,73**
				VALOR TOTAL	$ 490.203.286,52			$ 2.095.927,73		$ 2.095.927,73

Valor Inicial del contrato	**$ 490.203.286,52**
Valor Anticipo 30%	**$ 147.060.985,96**
Cantidades del 02/07/2026 hasta 14/07/2026	**$ 2.095.927,73**
Valor Total Ejecutado Acumulado	**$ 2.095.927,73**
Saldo por Ejecutar de la presente acta	**$ 488.107.358,79**
Porcentaje de Ejeución Financiera Acumulada	**0,43%**

SON: Dos millones noventa y cinco mil novecientos veintisiete mil setenta y tres centavos. ($ 2.095.927,73) M/CTE

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE AVANCE DE OBRA N1, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los 14 días del mes de julio del año 2026.

Firma: _____

CONSTRUCCIONES 57 S.A.S
R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
NIT. 901.872.546-9
Contratista

Firma: _____

JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PUBLICAS
Matrícula No. A21382020-1090480860

467


ANEXO 6. MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSTRUCCIONES 57 NIT. 901872546-9	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**	**Código:** DIE-01-M03-F16 **Versión:** 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES	**Fecha:** 14/07/2024

OBJETO: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	PRELIMINARES	1.1	UNIDAD:
1.		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO	ML

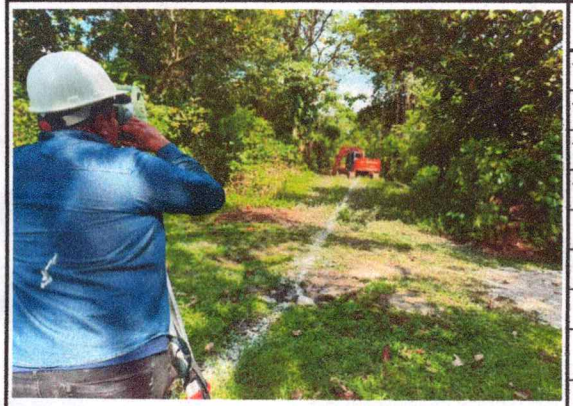

UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	PROFUND.			
Tramo 01: Pozo No. 01 - Pozo No. 02	61,84				1,00	61,84
Tramo 02: Pozo No. 02 - Pozo No. 03	73,17				1,00	73,17
Tramo 03: Pozo No. 03 - Pozo No. 04	96,00				1,00	96,00
Tramo 04: Pozo No. 04 - Pozo Existente	77,26				1,00	77,26
TOTAL CONTRATADO						751,81
CANTIDAD EJECUTADA ACTA N°1						308,27
% DE AVANCE ACTA N°1						41,00%
CANTIDAD POR EJECUTAR						443,54
TOTAL						**308,27**

PLANO/DISEÑO A CONSULTAR	Distribución del Alcantarillado

Proyecto:

ING. CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCCIONES 57 S.A.S
NIT: 901872546-9
Cargo: Ingeniero Residente

Aprobó:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Matricula No. A21382020-7090480860

ANEXO 7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSTRUCCIONES 57
NIT 901672546-9

ORDEN DE SERVICIO

Señores
ASOCIACIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE COLOMBIA
Cra 17 N° 26 – 73 Barrio Modelo
Cel. 3123652965
Saravena – Arauca

Ref: Contrato de Obra Pública SAMC-007-2026 Cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

La empresa CONSTRUCCIONES 57 S.A.S realiza la orden de servicio para lo siguiente:

1. RETRO EXCAVADORA 312

ORDEN DE SERVICIO	MAQUINA	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO
001	RETRO EXCAVADORA 312 POR MOVIMIENTO DE TIERRA	MUNICIPIO DE CUBARA	Se define esta fecha una vez se socialice el contrato en referencia.

VALOR DE LA MAQUINA HORA	IVA	STAND BY	TRANSPORTE	SOLICITADO POR
200.000,00	NO APLICA	4 HORAS DE LUNES A SABADO	$ 800.000,00	CONSTRUCCIONES 57 S.A.S

La presente orden de servicio incluye operador y combustible, teniendo en cuenta la seguridad social de la persona que va a operar la maquina con sus respectivos elementos de seguridad.

La empresa construcciones 57 S.A.S realiza un abono de ocho millones de pesos ($8.000.000,00) a la empresa ASOCIACIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE COLOMBIA por transferencia a la cuente 506100236948 cuenta de Ahorros Dama del banco de DAVIVIENDA.

Se firma en el municipio de Cubara a los tres (03) días del mes de julio del 2026.

Nombre: CONSTRUCCIONES 57 S.A.S
R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
Dirección: CR 8 # 7 – 74 barrio Jardín, Cubara Boyacá
Celular: 3219563091
Correo electrónico: construcciones57sas@gmail.com

Cubara, Boyacá 06 de julio de 2026

Señores:
Alcaldía Municipal de Cubará, Boyacá
ARQUITECTO: JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRA OBRAS PÚBLICAS
Supervisor del contrato

Ref: Contrato de obra SAMC-007-2026, "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"

Asunto: Entrega de documentos de acuerdo al pliego de condiciones del proceso de licitación pública SAMC-007-2026 donde exige en el capitulo 8.1 Información para el control de la obra, los siguientes requisitos:

Cordial saludo,

Yo, Carlos Andrés Sanabria Rodríguez, identificado como Representante Legal de la empresa **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S**, identificada con NIT. 901.872.546-9, realizo la entrega de los documentos técnicos de acuerdo al pliego de condiciones definitivo del proceso de Licitación Pública No. SAMC-007-2026, capítulo 8.1 **"Información para el control de la ejecución de la obra"**.

En ese sentido, se entregan los siguientes documentos:

1. Hojas de vida del personal profesional
2. Relación del equipo mínimo obligatorio
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
4. Programa de obra
5. Plan de manejo de tránsito – PMT

Agradeciendo la atención a la presente;

06/07/2026
Diego A. Sierra B.
Profesional de Apoyo a la
Secretaría de Planeación.

CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCCIONES 57 SAS
NIT: 901.872.546-9
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 54202-342374 NTS

Cubará Boyacá, 06 Julio del 2026

Señor

YHONATAN ALBERTO TOLOZA LANDAZABAL
Presidente de Junta de acción comunal
Vereda el Guamo

Asunto: Solicitud de autorización para cierre temporal de la vía.

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización para el cierre temporal de las vías que serán intervenidas en la vereda El Guamo, en el marco del Contrato de Obra Pública No. 20260000200, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".**

Esta medida se requiere durante el tiempo de ejecución de las obras, con el propósito de informarle oportunamente a la comunidad, garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes durante el desarrollo de las actividades operativas del presente contrato.

Se firma a los (06) días del mes de julio del 2026 en Cubara, Boyacá

06/07/2026
Diego A. Sierra B.
Profesional de apoyo a la
secretaria de Planeación.

Nombre: CONSTRUCCIONES 57 S. A. S
Dirección: CR 3 #7 – 74 Barrio jardín, Cubara.
Celular: 3219563091
Correo electrónico: construcciones57@gmail.com

Se anexa copia a la secretaria de planeación.

467

Cubará Boyacá, 06 Julio del 2026

Señor

YHONATAN ALBERTO TOLOZA LANDAZABAL
Presidente de Junta de acción comunal
Vereda el Guamo

Asunto: Solicitud de autorización para cierre temporal de la vía.

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de solicitar la autorización para el cierre temporal de las vías que serán intervenidas en la vereda El Guamo, en el marco del Contrato de Obra Pública No. 20260000200, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".**

Esta medida se requiere durante el tiempo de ejecución de las obras, con el propósito de informarle oportunamente a la comunidad, garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes durante el desarrollo de las actividades operativas del presente contrato.

Se firma a los (06) días del mes de julio del 2026 en Cubara, Boyacá

Nombre: CONSTRUCCIONES 57 S. A. S
Dirección: CR 3 #7 – 74 Barrio jardín, Cubara.
Celular: 3219563091
Correo electrónico: construcciones57@gmail.com

06-07-2026

Se anexa copia a la secretaria de planeación.

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

Cubara 14 de julio del 2026

OFICIO No. 1 de 2026

SEÑORES
ALCALDIA DE CUBARA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Cubara – Boyacá

Ref: Contrato de Obra Pública SAMC-007-2026 Cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

Asunto: Suspensión del contrato de obra publica

Cordial Saludo;

Yo, **Carlos Andrés Sanabria Rodríguez**, identificado como Representante Legal de la empresa **CONSTRUCCIONES 57 S.A.S.**, identificada con NIT **901.872.546-9**, en mi calidad de contratista del **Contrato de Obra Pública SAMC No. 007-2026**, me permito solicitar formalmente la **suspensión del contrato de obra pública SAMC-007-2026**, con los siguientes hechos que se exponen a continuación:

Como es de conocimiento público, durante los últimos días se han presentado intensas precipitaciones en la región, las cuales han generado una grave emergencia vial en el departamento de Arauca, Boyacá y Norte de Santander, como consecuencia de esta situación, se produjo el **colapso del puente ubicado en el sector de Caño Negro**, así como el puente localizado **en el municipio de Tame**, afectando significativamente la movilidad y el acceso hacia el municipio de Cubará y la zona de ejecución del proyecto, estas circunstancias han imposibilitado el tránsito normal de maquinaria amarilla, equipos y materiales para el desarrollo de las actividades del contrato en referencia.

Adicionalmente, el **Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)**, a través de sus boletines y pronósticos hidrometeorológicos, ha reportado que el municipio de **Cubará (Boyacá)** se encuentra dentro de las zonas con **alta probabilidad de precipitaciones**, registrando condiciones climáticas adversas que incrementan el riesgo de crecientes súbitas, movimientos en masa, afectaciones a la infraestructura vial y restricciones en la movilidad; de acuerdo a las condiciones climáticas que se están presentando en la región impiden la ejecución de la actividad **excavación mecánica** donde presenta un alto riesgo al ser ejecutada debido a que se puede ocasionar derrumbes o colapsos de los suelos y llevar a un riesgo la integridad físico de los trabajadores quienes podrían resultar atrapados o lesionados como consecuencia del colapso de las excavaciones.

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9


De acuerdo a lo mencionado anteriormente la empresa solicita la suspensión del contrato de obra publica por un tiempo de un (01) Mes a partir de la fecha del presente oficio, lo cual se reiniciaran las actividades del contrato una vez se supere las situaciones mencionadas anteriormente, se adjunta a continuación soportes técnicos que acreditan los acontecimientos presentados como son registro fotográfico de los accesos y boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

Se firma a los catorce (14) días del mes de julio del 2026 en Cubara, Boyacá.

Nombre: CONSTRUCCIONES 57 S.A.S
R/L CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
Dirección: CR 3 # 7 – 74 barrio Jardín, Cubara Boyacá
Celular: 3219563091
Correo electrónico: construcciones57sas@gmail.com

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

REGISTRO FOTOGRAFICO

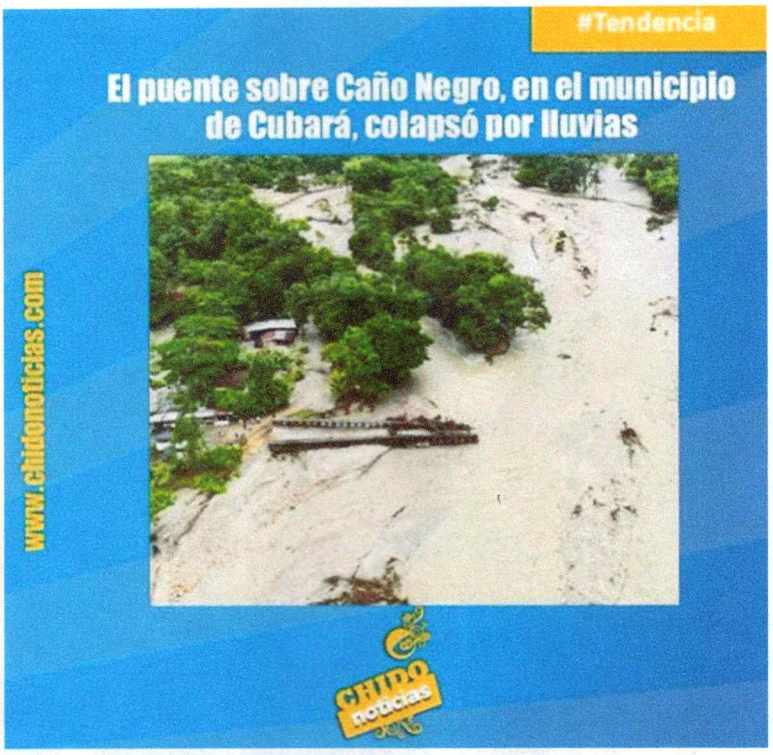


El puente sobre Caño Negro, en el municipio de Cubará, colapsó como consecuencia de las fuertes lluvias y el aumento del caudal, afectando la movilidad entre Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca). De acuerdo con la información conocida, esta situación dificulta el traslado de pacientes, personal de salud, medicamentos e insumos médicos. Ante este panorama, se ha planteado la necesidad de apoyo con transporte aéreo para garantizar la atención oportuna de quienes requieren servicios de salud.




CONSTRUCCIONES
NIT. 901872546-9



Fuertes lluvias dejan incomunicado a Arauca tras colapso de puentes y derrumbes en vías

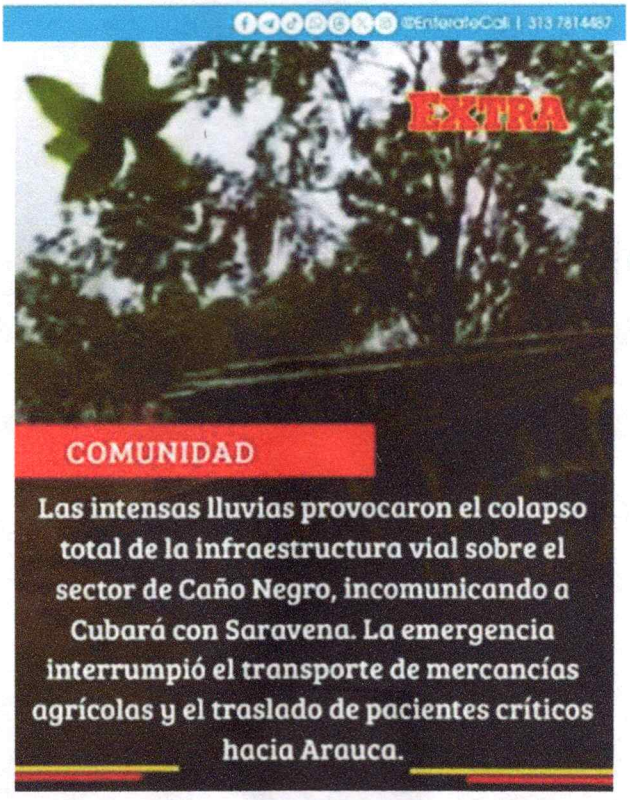

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

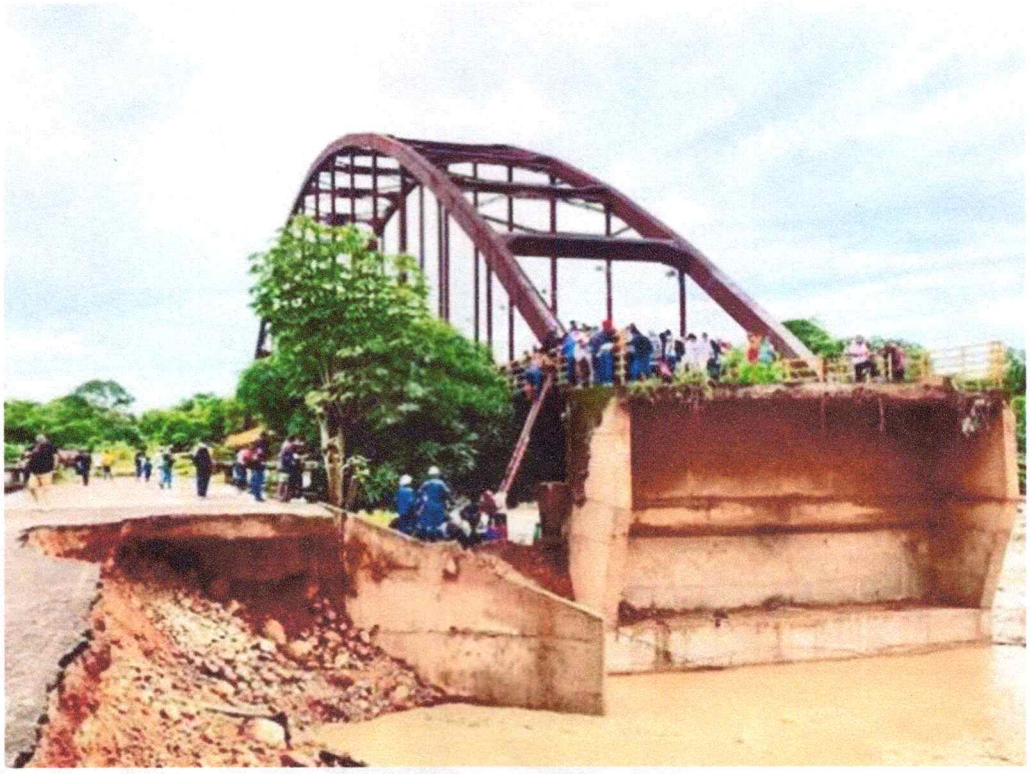



473

ANEXO 8. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO OBRA No. 20260000200

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ".

ENTREGADO A:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SUPERVISOR

Cubara, julio de 2026

321 2591262
321 9563091
Construcciones57sas@gmail.com
Cr 3 # 7-74 B. Jardin
Cubara-Boyacá

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 20260000200

OBJETO: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLNTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO	ML	308,27	$6.799,00	$2.095.927,73



ING. CARLOS ANDRÉS SANABRIA RODRIGUEZ
R/L: CONSTRUCCIONES 57 S.A.S
NIT 901872546-9
CARGO: INGENIERO RESIDENTE

ANEXO 9. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

CONSTRUCCIONES 57
NIT. 901872546-9

Cubara, Boyacá 06 de julio de 2026

Señores:
Alcaldía Municipal de Cubará, Boyacá
ARQUITECTO: JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DE OBRA OBRAS PÚBLICAS
Supervisor del contrato

Ref: Contrato de obra pública N° 20260000200 "**AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ**".

Asunto: Disponibilidad de Equipos

Cordial saludo,

Yo, Carlos Andrés Sanabria Rodríguez, identificado como Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES 57 S.A.S, identificada con NIT. 901.872.546-9, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa cuenta con la maquinaria mínima requerida para la ejecución del objeto contractual correspondiente al contrato de obra pública 20260000200. la maquinaria y equipos se alquilan a las empresa y asociaciones de la región donde se interviene el presente contrato.

En ese sentido, certificamos que la empresa dispone de la siguiente maquinaria y equipos contemplados en el contrato para la ejecución de las actividades:

1. Retroexcavadora
2. Estacion Topográfica – Nivel
3. Vibro compactador tipo rana
4. Mezcladora
5. Pulidora
6. Planta Eléctrica Diesel
7. Bomba Sumergible
8. Tronzadora

Así mismo, nos comprometemos a que los equipos anteriormente relacionados estarán disponibles y en óptimas condiciones de funcionamiento para la ejecución del contrato en referencia.

Agradeciendo la atención a la presente;

CARLOS ANDRES SANABRIA RODRIGUEZ
R/L CONSTRUCCIONES 57 SAS
NIT: 901.872.546-9
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA N° 54202-342374 NTS
