CAS (logo)	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	11/05/2026				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/01/2026	Y EL	31/01/2026

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO FORMULAR EL PLAN DE Objeto ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RIO OPON Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	12 MESES
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 265.881.681,84
PROCESO No.:	CM2-029-2025	FECHA DE INICIO:	31/12/2025
CONTRATO No.:	N° 01509-2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2026
CONTRATISTA:	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO	LOCALIZACIÓN	SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	CC NO. 7.160.171	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	APOYO SUPERVISIÓN	RODOLFO SANCHEZ RUIZ / SEBASTIÁN CORREA RUEDA

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	31/12/2025	31/12/2025	30/12/2026	12 MESES				
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**12 MESES**				
% AVANCE FISICO				**28%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BY-100060808	27/01/2026		**CUMPLIMIENTO**	31/12/2025	7/10/2027	$53.176.336.37
				PAGO DE SALARIOS	31/12/2025	32/12/2029	$53.176.336.37
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2027	$53.176.336.37
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	BY-100010241	21/01/2026		**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**	31/12/2025	1/10/2027	$284.700.000.00

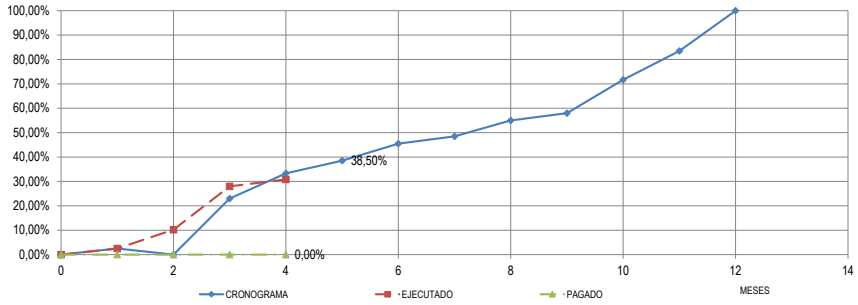
2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 265.881.681,84				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 265.881.681,84				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 265.881.681,84				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 265.881.681,84				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,50%	2,50%	0,00%
2	9,70%	10,20%	0,00%
3	23,00%	28,00%	0,00%
4	33,30%	30,80%	0,00%
5	38,50%		
6	45,50%		
7	48,50%		
8	55,00%		
9	58,00%		
10	71,70%		
11	83,50%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	23,00%	
EJECUTADO	28,00%	
ATRASOS	5,00%	
DESEMPEÑO		1,22
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	265.881.681,84
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

AVANCES DEL MES: Se alcanzó 30,80% de avance físico acumulado frente a 33,30% programado (rezago de solo 2,5 puntos porcentuales). Fase 1 de Acciones Previas completada al 100% (20%). En Fase de Diagnóstico se avanzó 7,80 pp con: (i) Primera campaña de monitoreo ejecutada (21-25 abr) en 5 puntos con muestras fisicoquímicas, microbiológicas y sedimentos; (ii) 30 encuestas de censo realizadas en sectores estratégicos + espacialización de predios; (iii) Socialización realizada en Barrancabermeja; (iv) Cálculos de oferta hídrica, demanda y caudales ambientales finalizados. La interventoría realizó acompañamiento técnico y seguimiento quincenal.

DIFICULTADES PRINCIPALES: (1) Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas, derrumbes y crecientes súbitas) que afectaron movilidad y obligaron a ajustes operativos (uso de ADCP y retraso de un día en el primer punto de monitoreo). (2) Desconfianza comunitaria persistente hacia la CAS (temor a cobros y percepción de abandono institucional), que reduce asistencia a socializaciones y disposición a entregar información del censo. (3) Licencias de Survey123 y ArcGIS Pro aún no habilitadas en usuario institucional de la CAS (se usó licencia personal temporal). (4) Limitado acceso a algunos expedientes de la CAS.

REPROGRAMACIONES: Socializaciones programadas para el 25 de abril canceladas por derrumbes y riesgo en vías; reprogramadas para el 2 y 3 de mayo de 2026 (comunicado mediante OF-PORH.0025 y OF-PORH.0046). Ajustes menores en cronograma de monitoreo por condiciones climáticas y de seguridad del personal.

RECOMENDACIONES: 1. Fortalecer articulación con alcaldías y líderes comunitarios para mejorar confianza y asistencia a socializaciones (priorizar jornadas del 2-3 de mayo). 2. Gestionar ante CAS la habilitación definitiva de licencias institucionales de Survey123 y ArcGIS Pro. 3. Evaluar solicitud de ajuste de cronograma o apoyo logístico adicional si persisten condiciones climáticas y de acceso adversas. 4. Documentar lecciones aprendidas de la primera campaña de monitoreo para optimizar las siguientes.

RIESGOS Y ALERTAS: ALTO - Desconfianza comunitaria persistente que puede afectar avance del censo y socializaciones (mitigación: articulación con alcaldías + comunicación clara del propósito de planificación del PORH). MEDIO - Condiciones climáticas y de acceso vial que pueden retrasar campañas futuras (mitigación: flexibilidad de cronograma y documentación de ajustes). MEDIO - Demora en habilitación de licencias institucionales (mitigación: gestión prioritaria ante CAS + migración de información una vez habilitadas

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>


OF – PORH.O – 033

Barrancabermeja, 06 de abril del 2026.

Ingeniera:
María Fernanda Abella Amaya
Directora Interventoría PORH Opón

ASUNTO: Cambio de Coordenadas

Cordial saludo

En el Marco del desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 0113-2025**, cuyo objeto es la **'Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la corriente principal del río Opón y sus principales tributarios, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)'**, se remiten las coordenadas ajustadas en campo, dado que los previamente establecidas no resultaban aptas para la medición de caudal, bien sea porque la sección no cumplía con las condiciones técnicas requeridas o porque la ubicación no correspondía al cauce principal del río Opón.

SOLICITUD CAMBIO DE PUNTOS DE MONITOREO


CAS Corporación Autónoma Regional de Santander — Ambiente

San Gil, 06 de abril de 2026

OFICIO SPL 034.2026 - 06-04-2026

Señor
EDNA ROCIO CASTELLANOS MASTINEZ
Representante legal
Interventoría contrato de consultoría No. 0113-2025
Email: ingcastellanos@gmail.com


Asunto: Respuesta a comunicación 80.35-4004.2026 "Remisión para visto bueno y aprobación – Plan Operativo del Contrato de Consultoría No. 0113-2025"

Respetuosos Saludos,

En virtud del oficio OF -PORH.O-013, la supervisión acusa recibido e informa que una vez revisado el Plan Operativo del Contrato de Consultoría No. 0113-2025 presentado por la interventoría, se manifiesta realizar las observaciones al Plan de Trabajo y Cronograma presentado por la **UNIÓN TEMPORAL PORH**, representada legalmente por **CARLOS EDUARDO MANTILLA ESPINEL**, identificado con C.C. 13.746.478 de Bucaramanga, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA - Obligaciones del contratista en el marco del contrato de consultoría No. 0113-2025.

De acuerdo al análisis de la información contenida en el oficio de la asunto "Remisión para visto bueno y aprobación - Plan Operativo del Contrato de Consultoría No. 0113-2025" se presentan las siguientes observaciones.

VISTO BUENO PLAN OPERATIVO


ASUNTO: Formatos Socialización PORH Opón.

En el Marco del desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 0113-2025**, cuyo objeto es la **'Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la corriente principal del río Opón y sus principales tributarios, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)'**, se realizó el envío del formato de Socialización del PORH Opón y la proyección de invitación para Socialización para su revisión y aprobación y posterior envío al CAS.


Nodos 1: Municipios de Vélez, Landázuri, La Paz y Contratación.
Fecha: sábado 25 de abril 2026
Lugar: Vélez, vereda el Cuadro, escuela rural el Cuadro.
Hora: 9:00 am a 10:00 a.m.

Nodos 2: Municipios de El Guacamayo, Santa Helena del Opón y Contratación.
Fecha: sábado 25 de abril de 2026
Lugar: Salón John F. Kennedy, zona urbana del municipio de Contratación.
Hora: 3:00 pm a 5:00 p.m.

Nodos 3: Municipios de: Barrancabermeja, Simacota, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Puerto Parra
Fecha: viernes 24 de abril de 2026
Lugar: Barrancabermeja, vereda bocas de la Colorada. Salón Comunal Vereda Bocas de la Colorada.
Hora: 10:00 am a 12:00 m.

Sin embargo, estas fechas están sujetas a cambios de acuerdo a la evolución del paro en las vías nacionales

CRONOGRAMA DE NUCLEOS SOCIALIZADORES


OF – PORH.O – 037

Barrancabermeja, 14 de abril del 2026.

Ingeniera:
María Fernanda Abella Amaya
Directora Interventoría PORH Opón

ASUNTO: Entrega informe tiempos de viaje

En el Marco del desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 0113-2025**, cuyo objeto es la **'Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la corriente principal del río Opón y sus principales tributarios, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)'**, se realiza el envío del informe de tiempos de viaje del río Opón, para su revisión y aprobación.

Agradecemos mucho su atención y comunicación.

ENTREGA INFORME TIEMPO DE VIAJES


OF – PORH.O – 039

Barrancabermeja, 15 de abril del 2026.

Ingeniera:
María Fernanda Abella Amaya
Directora Interventoría PORH Opón


ASUNTO: Cronograma Puntos de Monitoreo y Socializaciones

En el Marco del desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 0113-2025**, cuyo objeto es la **'Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la corriente principal del río Opón y sus principales tributarios, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)'**, se remite el cronograma de monitoreo del río Opón, con el fin de dar inicio a la primera campaña de monitoreo, programada del 20 al 24 de abril de 2026.


La campaña inicia el día 20, 21 y 22 de abril de 2026 con el monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico del río Opón. Posteriormente, se realizará la toma de sedimentos los días 23 y 24 de abril de 2026. De manera paralela, el 23 de abril de 2026 se llevará a cabo las actividades relacionadas con vertimientos.


Adicionalmente, se comparte cronograma de socializaciones en el río Opón.


NUEVO CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN



INFORME PRELIMINAR DE INTERVENTORÍA No. 04


INFORME ABRIL



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>



SUPERVISOR / INTERVENTOR
Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MASTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	SEBASTIÁN CORREA RUEDA	ING AMBIENTAL, CONTRATISTA	
REVISO	RODOLFO SANCHEZ RUIZ	ING PROFESIONAL ESP	
V.B:			
