| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 20/01/2026 |

**Proceso de Contratación**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | 14 de septiembre de 2026 | | | | |
| INFORME No. | 1 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL : | 10/08/2026 | Y EL | 9/09/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. CO1.PCCNTR.6906345 del 16 de octubre de 2024 entre la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Gobernación de Santander cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "PROTECCION DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | PLAZO INICIAL CONTRATO | CUATRO MESES Y VEINTIDOS DÍAS |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 36.634.208,00 |
| PROCESO No.: | MC2-017-2026 | FECHA DE INICIO: | 10/08/2026 |
| CONTRATO No.: | 1005-2026 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31/12/2026 |
| CONTRATISTA: | ESA SERVICIOS INTEGRADOS OC | LOCALIZACIÓN | El Carmen de Chucurí y Barrancabermeja |
| NIT CONTRATISTA: | 830.130.670-3 | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental |
| LINK DE PROCESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | APOYO SUPERVISIÓN | NATALIA ESTEVEZ CORREDOR |

## 1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Inicio Contrato | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 31/12/2026 | 4 M Y 22 D | NA | 31/12/2026 | Si | Se actualiza con acta de inicio |
| **PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)** | | | | **4 M Y 22 D** | **0** | | | |
| **% AVANCE FISICO** | | | | **13%** | | | | |

## 1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | HASTA | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** | BY-100068555 | 20/08/2026 | **3** | **CUMPLIMIENTO** | 10/08/2026 | 10/07/2027 | $ 7.326.841,60 |
| | | | | **PAGO DE SALARIOS** | | | |
| | | | | **CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS** | | | |
| | | | | **CALIDAD DEL SERVICIO** | 10/08/2026 | 10/07/2027 | $ 3.663.420,80 |
| | | | | **AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS** | | | |
| | | | | **ESTABILIDAD DE LA OBRA** | | | |
| | | | | **BUEN MANEJO DEL ANTICIPO** | | | |
| | | | | **PRESTACIONES SOCIALES** | 10/08/2026 | 5/01/2030 | $ 3.663.420,80 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL** | BY-100012148 | 20/08/2026 | **2** | **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | 10/08/2026 | 31/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| | | | | **PATRONAL** | 10/08/2026 | 31/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| | | | | **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | 10/08/2026 | 31/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| | | | | **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | 10/08/2026 | 31/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| | | | | **BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL** | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |


**2. EJECUCION PRESUPUESTAL**

| | | ADICIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0,00 | CONCEPTO | ACTUALIZAR POLIZA | FECHA | VALOR |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 0,00 | | | | |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 0,00 | | | | |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 36.634.208,00 | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 36.634.208,00 | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0,00 | | | | |
| VALOR TOTAL + ADICION(ES) | $ 36.634.208,00 | | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 0,00 | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 36.634.208,00 | | | | |
| % POR PAGAR | 100,00% | | | | |
| % AVANCE FINANCIERO | 0,00% | TOTAL DE ADICIONES | | | $ - |

**2.1. SITUACION FINANCIERA**

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | $ - |

## 3. CURVA "S"

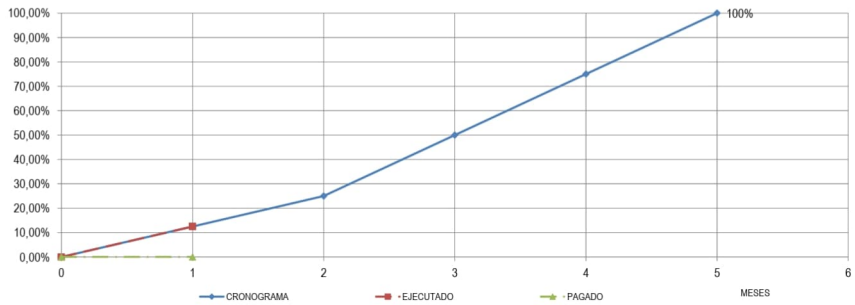


| MES/DIAS | CRONOGRAMA | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 13% | 13% | 0% |
| 2 | 25% | | |
| 3 | 50% | | |
| 4 | 75% | | |
| 5 | 100% | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMADO** | 12,50% | |
| **EJECUTADO** | 12,50% | |
| **ATRASOS** | 0,00% | |
| **DESEMPEÑO** | | 1,00 |
| **% PAGADO A LA FECHA** | 0,00% | |
| **Pendiente por Ejecutar total** | $ | 36.634.208,00 |
| **% POR CANCELAR A LA FECHA** | 100,00% | |
| **Índice de avance financiero** | | 0,00 |

Notas:

**PROGRAMADO**

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

**EJECUTADO**

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

**% PAGADO A LA FECHA**

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

## 4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

Para efectos del seguimiento a la ejecución física del contrato, el porcentaje programado se establece con base en el cumplimiento de las actividades principales previstas, correspondientes a la realización de ocho (8) talleres, y no exclusivamente en función del tiempo transcurrido del plazo contractual. En este sentido, considerando que los ocho (8) talleres tienen una participación equivalente dentro de la ejecución física, se asigna a cada uno un peso porcentual del 12,5 %, para un total del 100 %.

El avance programado acumulado se determina de acuerdo con las fechas establecidas para la realización de cada taller. Por lo anterior, el porcentaje de ejecución física programada puede diferir del porcentaje de plazo contractual transcurrido, teniendo en cuenta que la programación de las actividades no se distribuye de manera uniforme durante los cuatro (4) meses y veintidós (22) días de ejecución del contrato.

RIESGOS Y ALERTAS

A la fecha no se ha evidenciado riegos ni alertas en la ejecución del contrato

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el primer mes de ejecución, se realiza el primer taller asociado al componente forestal, en donde se desarrollaron las temáticas de: concepto e importancia de los servicios ecosistémicos, regulación hídrica y protección de fuentes de agua, conservación de la biodiversidad, captura y almacenamiento de carbono y cambio climático, acciones de conservación y restauración aplicables en los predios rurales.

**5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>**


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>


<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR

**Nombre:** EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - Subdirectora de Planeación y

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Natalia Alejandra Estevez Corredor | Contratista | |
| REVISO: | | | |
| V.B: | | | |
