	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/07/2026				
INFORME No.	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/08/2026	Y EL	3/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	280.000.000,00
PROCESO No.:	CI-002-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01216-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GAUDALUPE		LOCALIZACIÓN	Municipio de Guadalupe	
NIT CONTRATISTA:	800.099.694-9		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	STEFI DANITZA PORRAS PÉREZ	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	17/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	
Prórroga No. 1		4/07/2026	18/09/2026	2 meses /15 dias		18 de septiembre de 2026	Si	Aunque el estudio tiene un 73 % de avance, aún están pendientes las etapas técnicas de análisis, modelación, zoni


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 30.000.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 280.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 280.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 30.000.000,00				
% POR PAGAR	10,71%				
% AVANCE FINANCIERO	89,29%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"

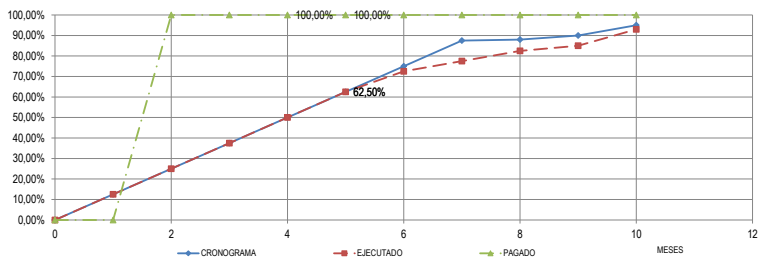

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	12,50%	0,00%
2	25,00%	25,00%	100,00%
3	37,50%	37,50%	100,00%
4	50,00%	50,00%	100,00%
5	62,50%	62,50%	100,00%
6	75,00%	72,50%	100,00%
7	87,50%	77,50%	100,00%
8	88,00%	82,50%	100,00%
9	90,00%	85,00%	100,00%
10	95,00%	93,00%	100,00%

PROGRAMADO	95,00%	
EJECUTADO	93,00%	
ATRASOS	-2,00%	
DESEMPEÑO		0,98
% PAGADO A LA FECHA	89,29%	
Pendiente por Ejecutar total	$	30.000.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	10,71%	
Índice de avance financiero		0,96

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

El día 26 de agosto de 2026 la secretaria de agricultura, medio ambiente y desarrollo rural solicita al contratista un informe del avance de las actividades ejecutadas como insumo para la conformación del informe de actividades mensual del convenio interadministrativo a presentar a la CAS.

El día 31 de agosto de 2026 la Corporación para el Desarrollo Ambiental Colombiano CORDEAM informa que el profesional ANDRÉS RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.100.975.159 de San Gil, estará realizando actividades de campo en el municipio de Guadalupe, Santander, a partir del 1 de septiembre de 2026.

Las actividades por desarrollar hacen parte del levantamiento de información requerido para la actualización del Estudio Básico de Amenazas del municipio y comprenden la identificación y caracterización general de las edificaciones, la realización de una inspección visual, el diligenciamiento del "Formato de Campo, Diagnóstico Estructural e Inspección Visual – Edificaciones" y, cuando resulte necesario, la toma de registros fotográficos como soporte de la información recopilada.

El día 1 de septiembre de 2026 se realizó el comité de avance 04 en el cual se verifica el cumplimiento de las actividades realizadas, así como el avance en la ejecución del contrato de consultoría derivado. Destacando avances en el estudio de avenida torrencial, delimitación y zonificación de amenazas por movimiento en masa y amenazas por inundación rural.


Se estableció un porcentaje de avance acumulado del convenio de 93% con un porcentaje de avance en el periodo del 8%.

El municipio adelantó la supervisión del contrato de consultoría No. MG-CM-001-2026 para el periodo de ejecución del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2026 donde se establece:


Avance en la consolidación, procesamiento, análisis y estructuración de la información técnica obtenida durante las diferentes jornadas de campo desarrolladas previamente, con el fin de elaborar los productos requeridos para el Estudio Básico de Amenazas.

En este sentido, se realiza la conformación del documento técnico final, de manera preliminar se estructuran los análisis ya realizados


5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>




Cobertura de la tierra área rural



Analisis curvas hipsometricas de las microcuencas



Punto morfodinámico PMC-019. Caída de roca y suelo residual



Avance analisis Hidrologico - guadalupe



Punto morfodinámico PMC-020. Deslizamiento traslacional

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	STEFI DANITZA PORRAS PÉREZ	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			
