Medellín, 11 de noviembre de 2026

Señores
SENA REGIONAL CALDAS

Referencia: Proceso Mínima Cuantía MC-CLD-CAI-037-2026

Objeto: contratar mediante suminstro elementos de protección y dotación para los aprendices pertenecientes a los programas de formacion fec formación especial campesina y fep formación especializada para la economía popular que imparte el centro de automatización industrial sena regional caldas de acuerdo con la descripcion detallada en la ficha tecnica.

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual por seis (6) días calendario.

Cordial saludo,

En calidad de contratista del proceso MC-CLD-CAI-037-2026, EQS DOTACIONES S.A.S. se permite solicitar respetuosamente la revisión y ampliación del plazo de ejecución contractual, actualmente establecido hasta el 15 de noviembre de 2026, teniendo en cuenta las circunstancias presentadas durante el inicio y desarrollo del suministro.

Es importante precisar que el contrato se encuentra estructurado bajo la modalidad de suministro por monto agotable, razón por la cual la definición de las cantidades y tallas requeridas depende de las necesidades y solicitudes efectuadas por la entidad.

En este sentido, desde el 20 de octubre de 2026, fecha registrada como inicio de ejecución contractual, nuestra empresa adelantó las gestiones correspondientes ante la supervisión para obtener la información necesaria que permitiera programar el suministro.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2026, reiteramos dicha solicitud, ocasión en la cual la supervisión manifestó que aún no disponía del listado de beneficiarios con las respectivas tallas de calzado, indicando que esperaba contar con esta información el lunes 26 de octubre.

Durante estas comunicaciones dejamos constancia de la necesidad de contar con la información pendiente para avanzar en la ejecución del suministro. El 26 de octubre se adelantaron nuevas gestiones para concretar las cantidades requeridas y la supervisión confirmó el envío de información ajustada al correo electrónico de nuestra empresa.

Por lo anterior, solicitamos tener en consideración que, aunque el contrato registraba una fecha de inicio del 20 de octubre, la definición de la información necesaria para programar los suministros se desarrolló durante los días posteriores, circunstancia que incidió en el tiempo efectivamente disponible para la preparación y entrega de los elementos contratados.

En virtud de lo expuesto, y con el propósito de garantizar una entrega integral, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y tallas requeridas, solicitamos respetuosamente ampliar el plazo de ejecución hasta el 21 de noviembre de 2026, sin modificación del valor contractual ni de las demás condiciones pactadas.


Reiteramos nuestro compromiso con la correcta ejecución del contrato y nuestra disposición para aportar los soportes de las comunicaciones sostenidas con la supervisión.

Agradecemos que la presente solicitud sea puesta en conocimiento del ordenador del gasto y del área jurídica competente, para su respectiva evaluación y pronunciamiento formal.

Cordialmente,

SANDRA MILENA ARIAS LÓPEZ
Representante Legal
EQS DOTACIONES S.A.S.

Anexos: Se adjuntan los soportes documentales correspondientes a las comunicaciones sostenidas con la supervisión del contrato, los cuales permiten evidenciar las gestiones adelantadas por EQS DOTACIONES S.A.S. para obtener oportunamente la información necesaria para la ejecución del suministro, así como las fechas en que dicha información fue solicitada y suministrada.

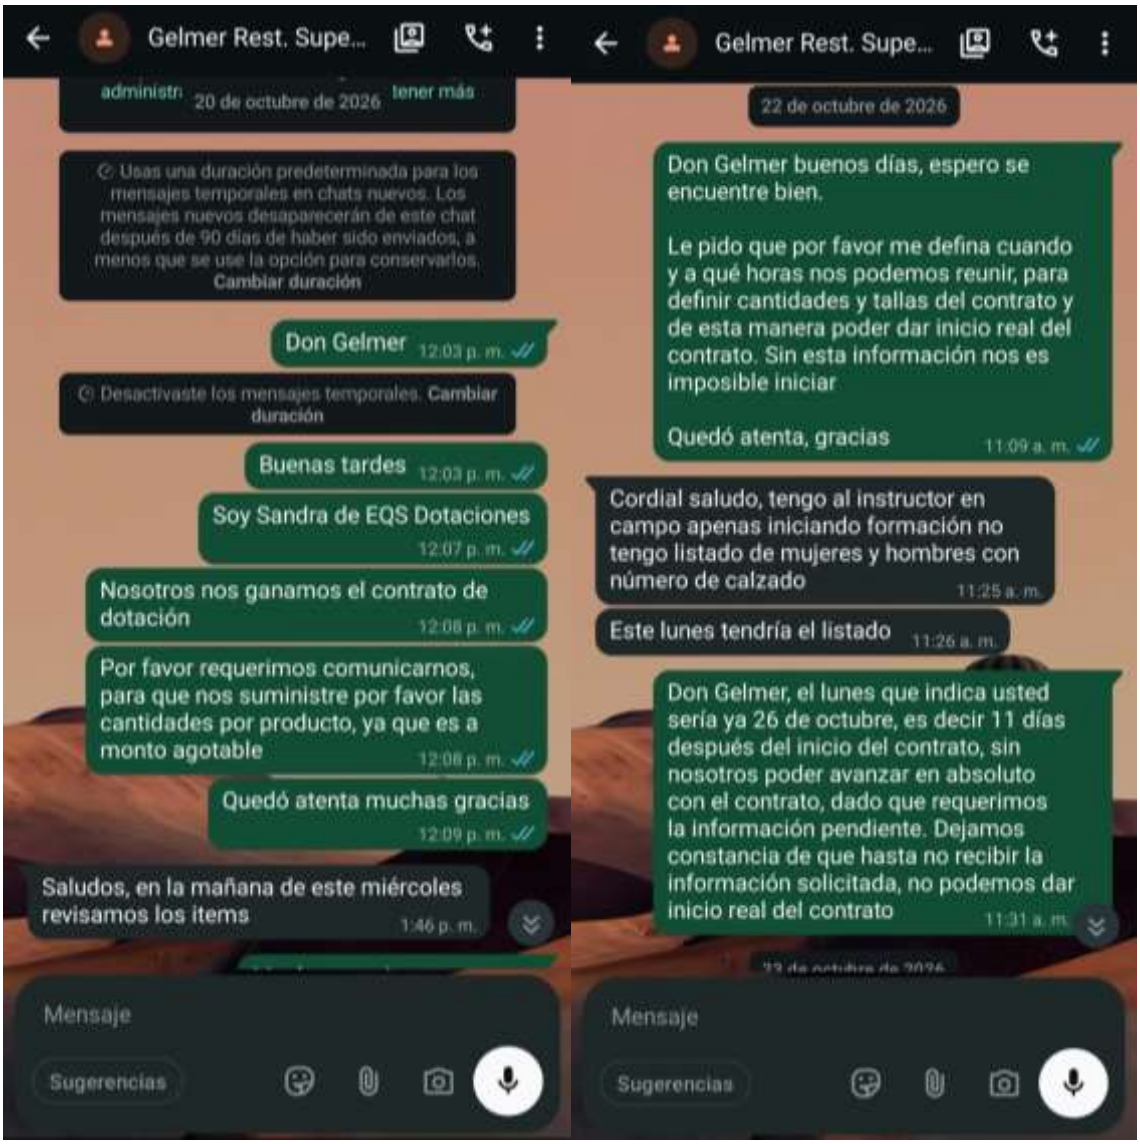


Gelmer Rest. Supe...
23 de octubre de 2026
Cordial saludo 9:48 a. m.
Me puedes compartir el correo para relacionar infornacion 9:49 a. m.
Buenos días 10:00 a. m.
Don Elmer 10:00 a. m.
Si sr 10:00 a. m.
comercial@eqsdotaciones.com 10:01 a. m.
26 de octubre de 2026
Llamada perdida
Tocar para volver a llamar 9:05 a. m.
Cordial saludo 9:06 a. m.
Llamada perdida
Tocar para volver a llamar 9:07 a. m.
A qué hora puedo llamar para concretar cantidades? 9:22 a. m.
Mensaje
Sugerencias


Gelmer Rest. Supe...
26 de octubre de 2026
Reenviado
sena caldas 10:23 a. m.
0:15 10:23 a. m.
0:23 1:50 p. m.
Gracias pronto lo hare 4:20 p. m.
Documento enviado nuevamente a su correo ajustado según lo indicado 4:48 p. m.
Mil gracias 4:48 p. m.
30 de octubre de 2026
Llamada
Sin respuesta 3:46 p. m.
Llamada perdida
Tocar para volver a llamar 4:15 p. m.
Mensaje
Sugerencias
