INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

INFORME MENSUAL 0 4

GRUPO No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 701-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.



FEBRERO 28 DE 2021

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 4

a. Contrato de obra 4

b. Contrato de interventoría 6

2. ASPECTOS TÉCNICO 7

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general 7

b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda. 8

c. Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad. 13

d. Soluciones adoptadas 13

e. Recomendaciones pertinentes 13

f. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo. 13

Se realiza exposición en los puntos anteriores. 13

g. Estado del tiempo mes de FEBRERO DE 2021 14

Lluvia 14

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 15

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso. 15

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría). 15

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso. 15

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato. 16

i. Pólizas 16

4. ASPECTOS SOCIALES 18

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR. 18

RENUNCIAS 22

b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social. 22

c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra. 22

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES 23

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra. .. 23

RELACIÓN DE VALOR EN EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2021 23

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago. 23

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso. 23

d. Cortes y pagos efectuados en el periodo 24

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

CLASE: CONTRATO DE OBRA

NÚMERO: 695-2020

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020	
REPRESENTANTE	JORGE HERNANDO PINZÓN CASTIBLANCO	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.".	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
FIDUCIA No.		
DIRECCIÓN:	Calle 12ª 68C-03 Bogotá D.C.	
TELÉFONOS:	7430070 EXT 405-406-908	dirlicitaciones.familiamic@gmail.com; obracivil.gepm@gmail.com
Consorciado No. 1.	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	
NIT	900.372.215-7	
REPRESENTANTE	JORGE PINZON CASTIBLANCO	
C.C. R.L.	19.367.698	
Consorciado No. 2.	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	
NIT	800.242.738-7	
REPRESENTANTE	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO	
C.C. R.L.	1.026.253.028	
PARTICIPACIÓN		

GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	90% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
LADOINSA	10% / MANEJO TÉCNICO y ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE ABRIL DE 2021
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES
VALOR CONTRATO	$3.728.543.252
FECHA ADICIÓN No. 1	------
VALOR ADICIÓN No. 1	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252
FECHA PRÓRROGA No. 1	------
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$3.728.543.252

b. Contrato de interventoría

CLASE: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO: 701-2020

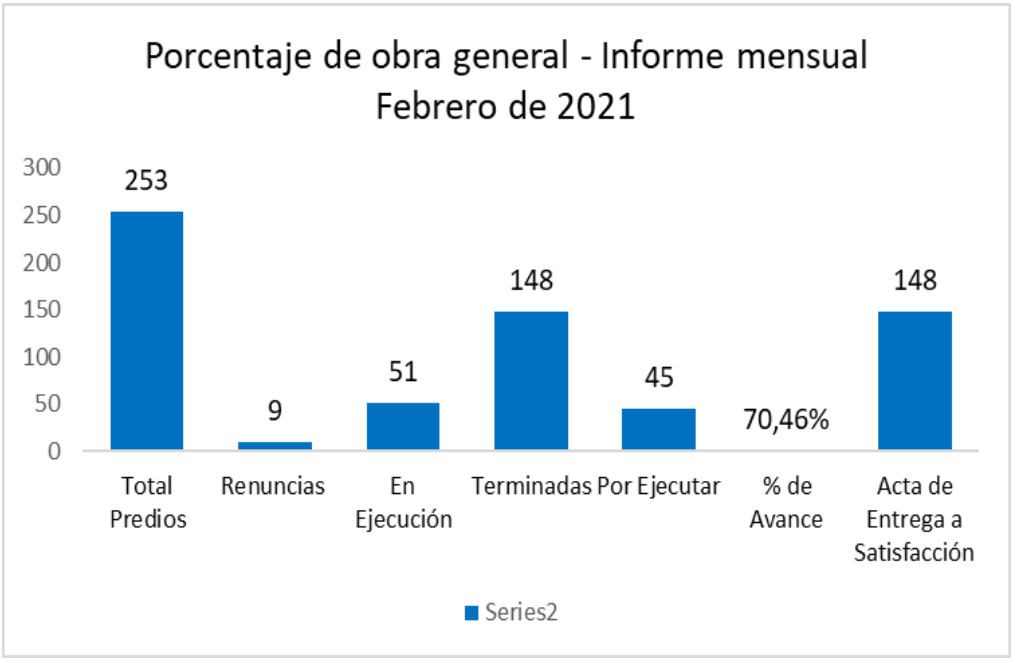
CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: **860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	4 DE NOVIEMBRE DE 2020	
FECHA DE FINALIZACIÓN	3 DE MAYO DE 2021	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES	
VALOR CONTRATO	$894.285.952	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$894.285.952	

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

En el desarrollo de las actividades en el mes de FEBRERO de 2021, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra, es importante indicar que así las viviendas se encuentren validada no indica que se encuentren en ejecución.

Total Predios	Validación				Ejecución				
			Renuncias		En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
253			9		51	148	45	70,46%	148
					0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
253			**9**		**51**	**148**	**45**	**70,46%**	**148**



b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

Para cada una de las viviendas, en el mes del presente informe se registran los siguientes indicadores en relación con las 96 viviendas en desarrollo, estos datos muestran el avance general.

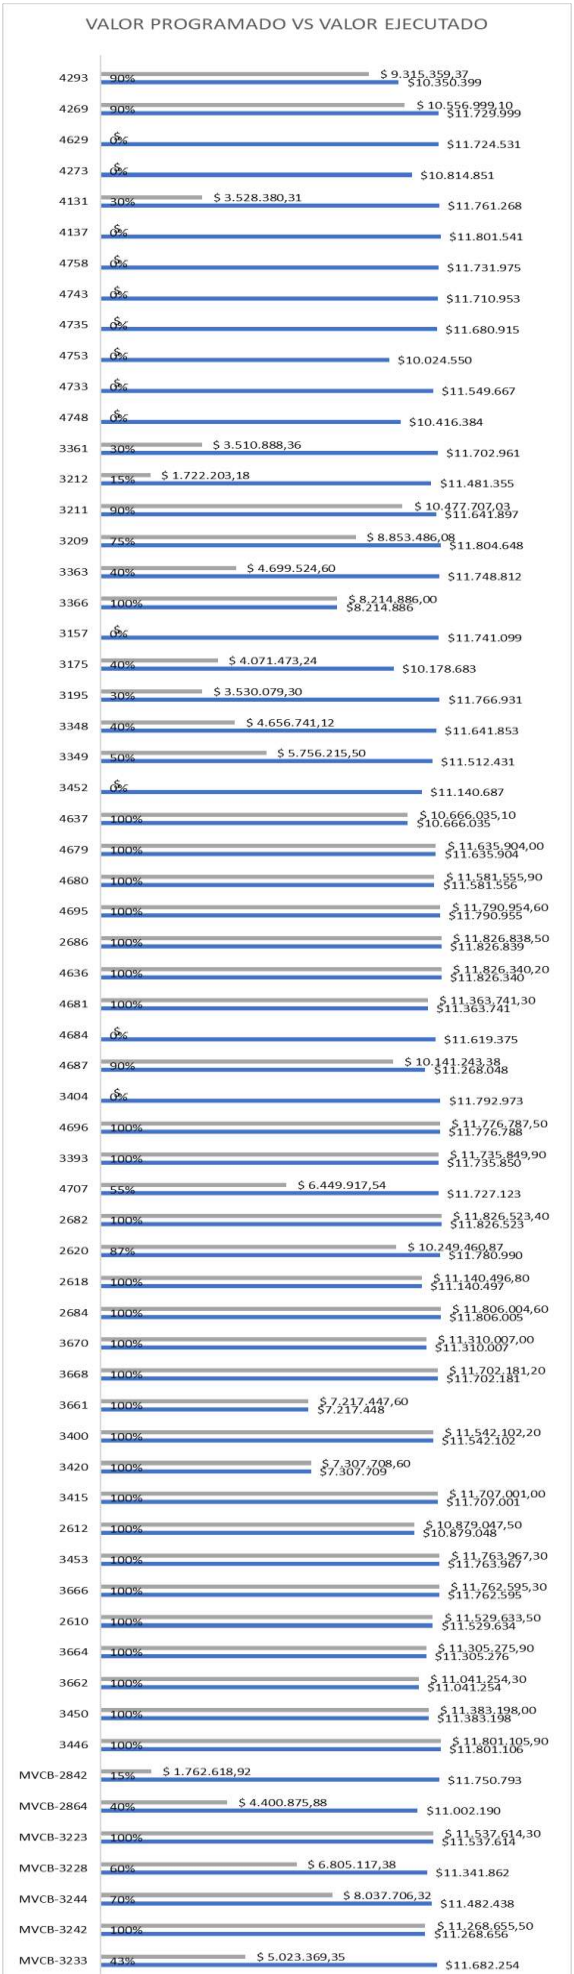
100%	$	1.660.074.240,70	148
50% a 99%	$	267.050.994,70	30
1% a 49%	$	78.364.075,08	21
0%		0	54

Programación de obra:

De acuerdo con la programación de obra expuesta por el contratista, para el presente informe se expone lo siguiente:

1. Para el mes de febrero se tiene programado continuar con la ejecución de las actividades en 253 viviendas sin generar la entrega final de estas que se programan para el mes de abril de 2021.

2. Durante este periodo, así no se culminará con la realización de las validaciones según la programación de obra, es importante indicar que el contratista desarrolla la logística para adelantar la entrega de viviendas y co- participación con las actividades de validación pendientes.

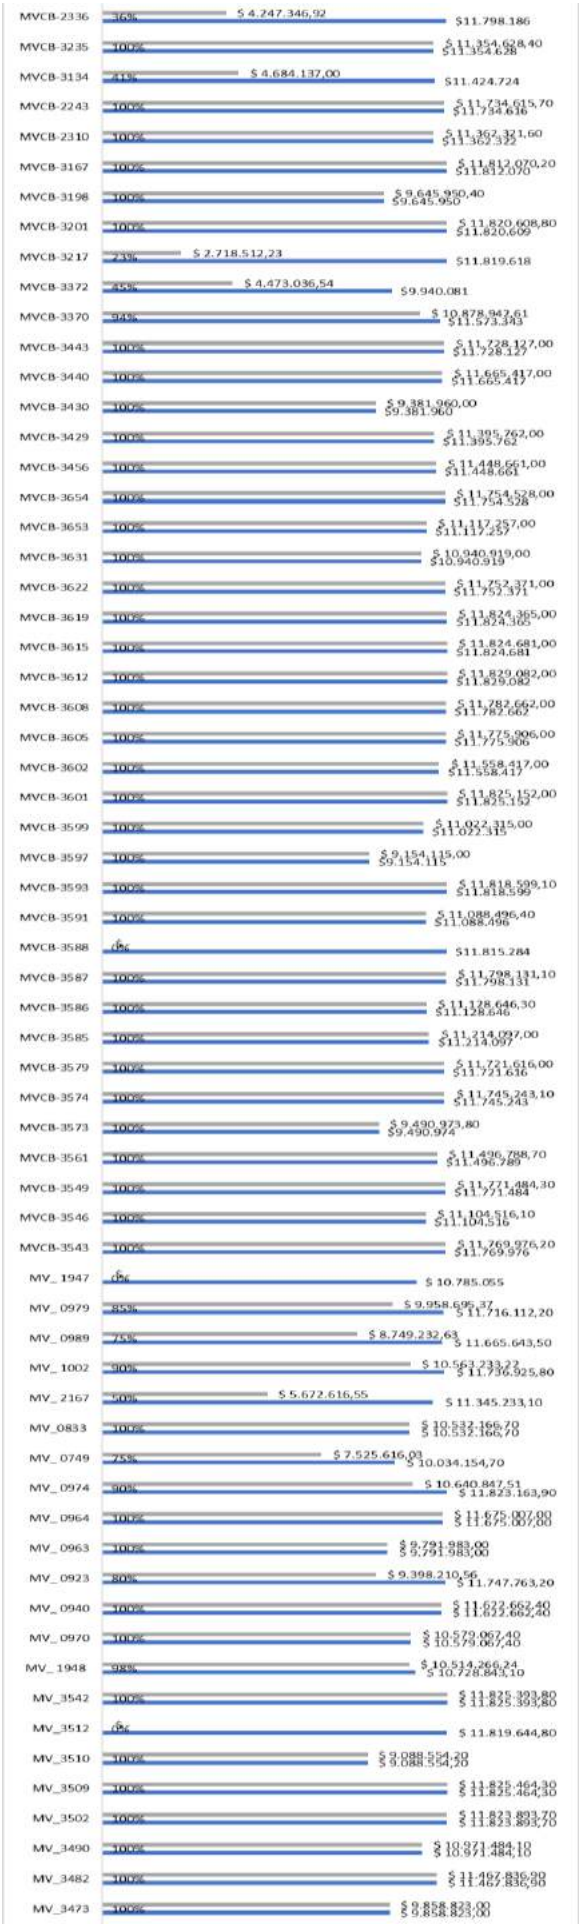


INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

INFORME AVANCE DE OBRA AL MES DE FEBRERO DE 2021

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

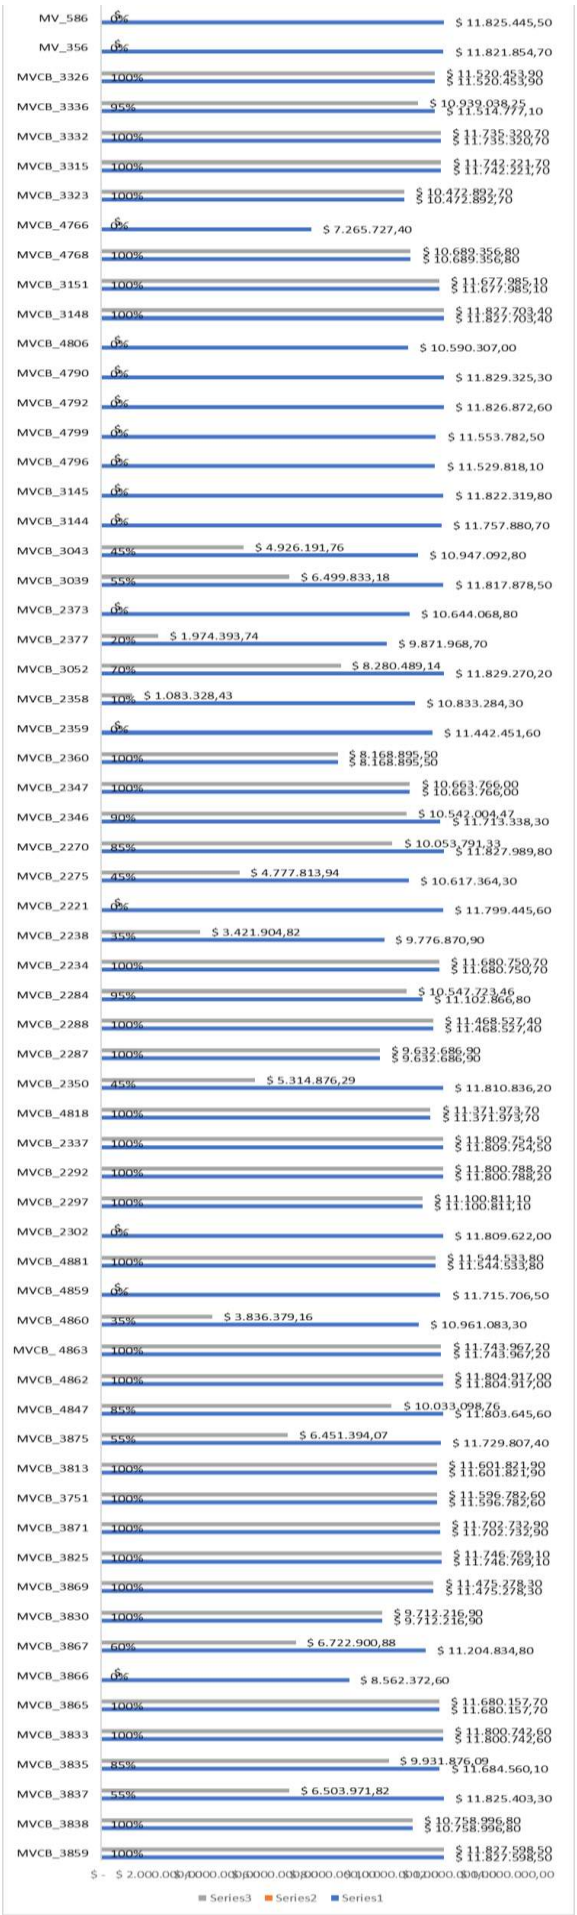
Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia



INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT									Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	JUAN PABLO II	Barrios	Predios	Total Predios	Validación				Ejecución				
							Renuncias		En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq o Ing. Responsable	Camila Giraldo Jimenez	9	253	253			9		51	148	45	70,46%	148
		0	0						0	0	0	0,00%	0
Técnico Responsable		0	0						0	0	0	0,00%	0
		0	0						0	0	0	0,00%	0
Subtotal			253	253			9		51	148	45	70,46%	148

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										NOVIEMBRE				DICIEMBRE	FEBRERO
Proyecto				FASE I			Tiempo Programacion			SEMANA DEL 4 AL 8	SEMANA DEL 9 AL 15	SEMANA DEL 16AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 06	SEMANA DEL 22 AL 28
No.	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha terminada	F. Inicio	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana	17 semana
1	MVCB_3859	KR 18U 66B 80 SUR	MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS	SI	$ 11.827.599,00	$ 11.827.598,50	22/1/2021	12/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	MVCB_3838	KR 18U 66B 81 SUR	MARIA DE JESUS GONZALEZ	SI	$ 10.758.997,00	$ 10.758.996,80	26/1/2021	10/2/2021	26/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	MVCB_3837	KR 18U 66B 77 SUR	GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES	SI		$ 11.825.403,30	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	55%
4	MVCB_3835	KR 18U 66B 69 SUR	FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES	SI	$ 11.684.560,00	$ 11.684.560,10	27/1/2021	11/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	85%
5	MVCB_3833	KR 18U 66B 59 SUR	LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS	SI		$ 11.800.742,60	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6	MVCB_3865	KR 18U 66B 46 SUR	ANA TERESA VALENCIA GRANADOS	SI	$ 11.680.157,00	$ 11.680.157,70	22/1/2021	15/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7	MVCB_3866	KR 18U 66B 38 SUR MJ	RAFAEL FRANCO CASTRO	SI		$ 8.562.372,60	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	MVCB_3867	KR 18U 66B 34 SUR	NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO	SI		$ 11.204.834,80	4/2/2021	19/2/2021	4/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	60%
9	MVCB_3830	KR 18U 66B 41 SUR	CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA	SI		$ 9.712.216,90	22/1/2021	24/2/2021	22/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	MVCB_3869	KR 18U 66B 22 SUR	CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN	SI	$ 11.475.278,00	$ 11.475.278,30	27/11/2020	15/1/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	MVCB_3825	KR 18U 66B 11 SUR MJ	LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES	SI	$ 11.746.779,00	$ 11.746.769,10	1/12/2020	25/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
12	MVCB_3871	KR 18U 66B 10 SUR MJ	MILY YOMARA CALDERÓN CUESTA	SI	$ 11.702.732,00	$ 11.702.732,90	27/11/2020	2/2/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13	MVCB_3751	KR 18V 66B 11 SUR	MARIA JUDITH LERMA VARGAS	SI	$ 11.596.783,00	$ 11.596.782,60	26/11/2020	29/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	100%
14	MVCB_3813	TV 18U BIS 66B 64 SUR	MARIA LUCILA IBAGUE	SI	$ 11.601.821,00	$ 11.601.821,90	26/11/2020	29/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	13%	18%	100%
15	MVCB_3875	KR 18T BIS 66B 17 SUR	ROSALBINA GIL DE SOLER	SI		$ 11.729.807,40	19/2/2021	6/3/2021	19/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	55%
16	MVCB_4847	KR 18U 67C 32 SUR	ALFER YESID CASTAÑEDA PACHÓN	SI		$ 11.803.645,60	25/11/2020	10/12/2020	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	85%
17	MVCB_4862	KR 18V BIS 67C 22 SUR	NANCY MORENO RADA	SI	$ 11.804.930,00	$ 11.804.917,00	25/11/2020	6/1/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	1%	100%

18	MVCB_ 4863	KR 18V BIS 67C 16 SUR	EULINE CARDENAS RUIZ	SI NO	$ 11.743.967,00	$ 11.743.967,20	25/11/2020	10/2/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	10%	12%	100%
19	MVCB_4860	CL 67D SUR 18U 80	RUFINA MENA MURILLO	SI NO		$ 10.961.083,30	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	35%
20	MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ	SI NO		$ 11.715.706,50	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21	MVCB_4881	CL 67C BIS SUR 18U 80	ROQUELINA MENA MURILLO	SI NO	$ 11.544.533,00	$ 11.544.533,80	3/12/2020	22/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
22	MVCB_2302	CL 67D SUR 18U 73	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.809.622,00	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	MVCB_2297	CL 68 SUR 18U 72	CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRIGUEZ	SI NO	$ 11.100.811,00	$ 11.100.811,10	26/11/2020	2/2/2021	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	11%	100%
24	MVCB_2292	CL 68 SUR 18U 48	HERNAN ANACONA PALECHOR	SI NO	$ 11.800.788,00	$ 11.800.788,20	2/12/2020	20/1/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
25	MVCB_2337	CL 68 SUR 18U 08	SARA SANCHEZ VIVAS	SI NO	$ 11.809.754,00	$ 11.809.754,50	1/12/2020	27/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
26	MVCB_4818	KR18T BIS 67C 20 SUR	ROHELFY PACHON SOTO	SI NO	$ 11.371.974,00	$ 11.371.973,70	2/12/2020	17/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
27	MVCB_2350	CL 68 SUR 18U 25	CARLOS ALFONSO SANCHEZ	SI NO		$ 11.810.836,20	8/2/2021	23/2/2021	8/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	45%
28	MVCB_2287	CL 68 SUR 18U 35	LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO	SI NO	$ 10.158.955,00	$ 9.632.686,90	2/12/2020	10/2/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
29	MVCB_2288	TV 18U BIS 68 21 SUR	SIMONA TORRES MANYOMA	SI NO		$ 11.468.527,40	27/1/2021	26/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
30	MVCB_2284	CL 68 SUR 18U 51	MARIA HELENA ANGEL BEDOYA	SI NO	$ 11.102.866,00	$ 11.102.866,80	28/1/2021	12/2/2021	28/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	95%
31	MVCB_2234	KR 18V BIS 68 13 SUR	MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO	SI NO	$ 11.680.750,00	$ 11.680.750,70	2/12/2020	30/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
32	MVCB_2238	KR 18V BIS 68 37 SUR	DIANA MARCELA TICORA LOPEZ	SI NO		$ 9.776.870,90	4/2/2021	19/2/2021	4/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	35%
33	MVCB_2221	KR 18V BIS 68A 21 SUR	KERLY JOHANNA CELY MENDEZ	SI NO		$ 11.799.445,60	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	MVCB_2275	CL 68A SUR 18U 56	JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS	SI NO		$ 10.617.364,30	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	45%
35	MVCB_2270	CL 68A SUR 18U 40	NUBIA GALLEGO CIRO	SI NO		$ 11.827.989,80	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	85%
36	MVCB_2346	CL 68A SUR 18U 30	ISIDRO BONILLA RICO	SI NO		$ 11.713.338,30	2/2/2021	17/2/2021	2/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
37	MVCB_2347	TV 18U BIS 68 26 SUR	MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA	SI NO	$ 10.663.766,00	$ 10.663.766,00	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
38	MVCB_2360	TV 18U 68 76 SUR	DAMARIS RESTREPO CHAVES	SI NO	$ 8.168.895,00	$ 8.168.895,50	27/1/2021	20/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
39	MVCB_2359	TV 18U 68A 06 SUR	CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ	SI NO		$ 11.442.451,60	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%
40	MVCB_2358	TV 18U 68A 10 SUR	ROSALBA LEON	SI NO		$ 10.833.284,30	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	10%
41	MVCB_3052	DG 68 SUR 18T 42	GENTIL CALDERON CALDERON	SI NO		$ 11.829.270,20	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	70%
42	MVCB_2377	TV 18TBISA 68 66 S	AMPARO MENDEZ	SI NO		$ 9.871.968,70	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	20%
43	MVCB_2373	TV 18T BIS A 68 84 SUR	MARTHA CECILIA ARIAS MORALES	SI NO		$ 10.644.068,80	26/2/2021	13/3/2021	26/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
44	MVCB_3039	TV 18T BIS A 68 18 SUR	FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA	SI NO		$ 11.817.878,50	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	55%
45	MVCB_3043	TV 18T BIS A 68 03 SUR	MARIA HELENA CASTELLANOS UMAÑA	SI NO		$ 10.947.092,80	9/2/2021	24/2/2021	9/2/2021	0%	0%	0%	0%	0%	45%
46	MVCB_3144	KR 18R BIS 68 20 SUR	JACQUELIN GONZALEZ AREVALO	SI NO		$ 11.757.880,70	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47	MVCB_3145	KR 18R BIS 68 12 SUR	MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ	SI NO		$ 11.822.319,80	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
48	MVCB_4796	KR 18T 67C 50 SUR MJ	OLGA GUZMAN	SI NO		$ 11.529.818,10	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%

49	MVCB_4799	CL 67C BIS SUR 18Q 91	ALICIA SANCHEZ	SI NO		$ 11.553.782,50	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	MVCB_4792	CL 68 SUR 18R 16	LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES	SI NO		$ 11.826.872,60	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
51	MVCB_4790	CL 68 SUR 18Q 76	MIREYA MELO VASQUEZ	SI NO		$ 11.829.325,30	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
52	MVCB_4806	CL 67C BIS SUR 18Q 65	LUZ ANGELA HERRERA FINO	SI NO		$ 10.590.307,00	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
53	MVCB_3148	CL 68 SUR 18R 11	OTALVINA ESPITIA FORERO	SI NO	$ 11.827.703,00	$ 11.827.703,40	6/12/2020	20/1/2021	6/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
54	MVCB_3151	KR 18R 68 21 SUR	ELVIRA PINZON SIERRA	SI NO	$ 11.677.985,00	$ 11.677.985,10	6/12/2020	15/1/2021	6/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
55	MVCB_4768	KR 18Q BIS B 67C 54 SUR	LEIDY DIANA MUÑOZ OSPINA	SI NO	$ 10.689.356,00	$ 10.689.356,80	25/1/2021	25/2/2021	25/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
56	MVCB_4766	CL 68 SUR 18Q 48 MJ	MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO	SI NO		$ 7.265.727,40	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
57	MVCB_3323	KR 18Q 68 23 SUR	ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA Y OTRO	SI NO	$ 10.472.892,00	$ 10.472.892,70	25/1/2021	17/2/2021	25/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
58	MVCB_3315	KR 18Q BIS B 68 24 SUR	YANETH TORRES GARCIA Y OTRO	SI NO	$ 11.742.221,00	$ 11.742.221,70	25/1/2021	15/2/2021	25/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
59	MVCB_3332	KR 18Q BIS B 68A 04 SUR	JORGE SANTOS VEGA LINARES	SI NO	$ 11.735.320,00	$ 11.735.320,70	25/1/2021	19/2/2021	25/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
60	MVCB_3336	DG 68A SUR 18Q 15	NANCY OSORIO	SI NO		$ 11.514.777,10	25/1/2021	9/2/2021	25/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	95%
61	MVCB_3326	DG 68B SUR 18Q 26	BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO	SI NO	$ 11.520.453,00	$ 11.520.453,90	27/1/2021	19/2/2021	27/1/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
62	MV_356	CL 36F SUR 11C 50	HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ	SI NO		$ 11.821.854,70	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
63	MV_586	CL 37 SUR 11C 33	SANTIAGO AGUIRRE GARCIA	SI NO		$ 11.825.445,50	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
64	MV_600	CL 37 SUR 11A 47	HERMINIA PEÑALOZA	SI NO		$ 10.999.306,40	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
65	MV_077IN	KR 9G 37 27 SUR	SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO	SI NO		$ 11.752.339,60	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
66	MVLO_419	KR 9K 44 60 SUR	LUCIA ARDILA MARIN	SI NO		$ 10.067.533,80	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	MVPR_0111	KR 9D 40 13 SUR	URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ	SI NO		$ 11.818.867,50	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
68	MVCA_3842	KR 8B BIS ESTE 5A 23	IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS	SI NO		$ 11.822.746,90	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
69	MVCA_4516	DG 4A 8B 18 ESTE	MARIA JULIA CORDOBA BOLAÑOS	SI NO		$ 11.654.328,30	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
70	MVCA_4231	DG 4A 8 51 ESTE	ESMERALDA VIDALES ANAYA	SI NO		$ 11.163.140,40	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	MVCA_1783	KR 10A ESTE 2 22	MARIA RUTH OSPINA	SI NO		$ 11.732.659,90	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	MVCA_2132	CL 1B BIS 11A 11 ESTE	JAIME ENRIQUE GUZMAN	SI NO		$ 11.734.923,00	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
73	MVTB_4354	KR 150 143B 30	BAUDELINO AVILA OLAYA	SI NO		$ 11.815.773,40	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
74	MVTB_3843	KR 151 143 46	GUILLERMO MONTALVO CHAVEZ	SI NO		$ 11.724.350,00	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
75	MVTB_0568	KR 152A 143 66	GLORIA DOLORES SANCHEZ DIAZ	SI NO		$ 10.894.439,50	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
76	MV_0022	KR 146A 139 36	JOSE RICARDO PRIETO GARZON	SI NO		$ 11.002.039,70	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%

77	MVBV_0741	KR 6 192A 12 MJ	BEATRIZ TRIVIÑO	SI NO		$ 11.302.044,50	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
78	MVBV_0519	KR 6A 189B 06 MJ	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA	SI NO		$ 11.300.988,00	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
79	MVBV_0890	KR 6 189A 21 MJ	MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.067.363,10	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
80	MVCE_0125	CL 161 4A 22	SALVADOR VELANDA ACERO	SI NO		$ 11.665.071,80	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81	MVCE_1995	KR 2 ESTE 161 28	JAIRO ALBERTO GARZÓN RIOS	SI NO		$ 11.018.843,90	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
82	MVCE_1034	KR 3A 163 62 MJ	JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL	SI NO		$ 11.825.269,90	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
83	MVCE_2106	KR 1B 163 91 IN 2	MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN	SI NO		$ 11.748.699,70	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
84	MVCE_0435	CALLE 161 1A 61	MARLENY MUÑOZ CASTAÑO	SI NO		$ 5.414.743,00	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	FASE DE VALIDACIÓN	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	MV_4647	KR18N BIS A 68 17 SUR	GIOVANI GUTIERREZ RIVERA	SI NO	$ 11.828.795,00	$ 11.828.775	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	70%	100%
2	MV_4669	KR18N BIS A 68 17 SUR	MARIA EUGENIA RIAÑOS	SI NO	$ 11.827.011,00	$ 11.826.810	26/11/2020	15/12/2020	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	40%	100%
3	MV_4649	CL 67C BIS SUR 18N 25	FLORALBA ACEY LOPEZ	SI NO	$ 11.803.884,00	$ 11.800.103	1/12/2020	24/12/2020	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	MV_4620	CL 67C BIS SUR 18N 22	MARIA ALICIA NAVARRO REYES	SI NO	$ 11.591.655,00	$ 11.591.653	1/12/2020	8/1/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	MV_4671	CL 68 SUR 18N 05 MJ	MARIA SHIRLEY GARCES	SI NO	$ 10.944.024,00	$ 10.944.021	2/12/2020	30/12/2020	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	25%	100%
6	MV_4865	CL 67C SUR 18V 17	ANA SOFIA AGUILERA	SI NO	$ 11.424.692,00	$ 11.424.693	26/11/2020	25/1/2021	26/11/2020	0%	0%	0%	0%	30%	100%
7	MV_4849	CL 67C SUR 18T 45	ALEYDA TORRES	SI NO	$ 11.532.188,00	$ 11.531.432	24/11/2020	29/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	15%	45%	100%
8	MV_4837	CL 67C SUR 18U 11	MARIA ALIRIA FUENTES SEPULVEDA	SI NO	$ 10.966.022,00	$ 10.966.003	25/11/2020	20/1/2021	25/11/2020	0%	0%	0%	15%	20%	100%
9	MV_4836	CL 67C SUR 18U 17 MJ	VICTOR JULIO PORTILLA	SI NO		$ 7.186.448	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	MV_4871	CL 67C SUR 18U 47	CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO	SI NO	$ 11.827.420,00	$ 11.827.420	24/11/2020	1/2/2021	24/11/2020	0%	0%	20%	20%	20%	100%
11	MV_4869	CL 67C SUR 18U 63	ROSA HELENA PAEZ DE GUEVARA	SI NO	$ 11.821.080,00	$ 11.821.057	25/11/2020	15/1/2021	25/11/2020	0%	0%	20%	0%	20%	100%
12	MV_3806	CL 67C SUR 18U 30	JOSE JIMENEZ GONZALEZ	SI NO	$ 11.247.180,00	$ 10.084.505	26/11/2020	14/1/2021	26/11/2020	0%	0%	10%	0%	10%	100%
13	MV_4661	KR 18N 67C 13 SUR	MARTHA PATRICIA CORTES HERNANDE	SI NO	$ 11.699.319,00	$ 11.699.250	3/12/2020	30/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14	MV_4660	CL 67C SUR 18N 03	BLANCA EDELMIRA SANCHEZ	SI NO	$ 11.042.322,00	$ 11.042.292	2/12/2020	7/1/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	10%	10%	100%
15	MV_4891	KR 18N 68 10 SUR	DEYANIRA MARIA ROMERO	SI NO	$ 10.388.683,00	$ 10.388.647	3/12/2020	12/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16	MV_4886	DG 68A SUR 18M 54	EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA	SI NO	$ 11.364.470,00	$ 11.363.584	3/12/2020	15/12/2020	3/12/2020	0%	0%	5%	5%	5%	100%
17	MV_3805	CL 67C SUR 18U 20	LUZ MARY VARGAS ARDILA	SI NO	$ 11.442.218,00	$ 11.442.164	28/11/2020	22/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
18	MV_3804	CL 67C SUR 18U 10	MARIA ANA CELIA	SI NO	$ 10.815.665,00	$ 10.815.665	28/11/2020	20/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
19	MV_3857	KR 18U 66B 90 SUR	CECILIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ	SI NO	$ 11.826.533,00	$ 11.826.451	28/11/2020	7/1/2021	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
20	MV_4717	KR 18P BIS 67C 08 SUR	ARACELY ZAMBRANO ROJAS	SI NO	$ 11.826.064,00	$ 11.826.064	3/12/2020	21/1/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
21	MV_4630	CL 67C SUR 18N 23	MARÍA FELISA CRUZ VARGAS	SI NO		$ 10.903.004	4/12/2020	24/2/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1	MV_2711	TV 18Q 69A 26 SUR	DANIEL LEON GOMEZ	SI NO	$ 10.420.065,00	$ 10.420.222,80	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	6%	25%	100%
2	MV_2710	TV 18Q 69A 32 SUR	MARIA HUERTAS ARIAS	SI NO	$ 11.821.510,00	$ 11.821.551,40	30 de noviembre de 2020	15 de diciembre 2020	30 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	4%	100%

3	MV_2709	TV 18Q 69A 40 SUR	ANA GOMEZ LEAL	SI NO	$ 11.825.634,00	$ 11.826.641,40	30 de noviembre de 2020	15de diciembre 2020	30 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	6%	100%
4	MV_2702	TV 18Q 69A 85 SUR	LUZ LELLY OSORIO	SI NO	$ 9.686.843,00	$ 9.867.133,40	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	20%	100%
6	MV_2707	TV 18Q 69A 40 SUR	EIDER GONZALEZ CARDONA	SI NO	$ 8.192.584,00	$ 9.598.934,00	25 de noviembre de 2020	10 de diciembre de 2020	25 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	3%	5%	100%
7	MV_2717	TV 18P BIS A 69A 86 SUR	LUIS SERRATO LOPEZ	SI NO	$ 11.121.524,00	$ 11.123.195,90	05 de diciembre de 2020	20 de diciembre de 2020	05 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	1%	100%
8	MV_2720	TV 18P BIS A 69A 74 SUR	JEISSON NIÑO BAQUERO	SI NO	$ 11.826.576,00	$ 11.827.340,30	27 de noviembre de 2020	12 de diciembre 2020	27 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	3%	100%
9	MV_2721	TV 18P BIS A 69A 70 SUR	GILBERTO AMAYA AMAYA	SI NO	$ 11.779.510,00	$ 11.779.588,00	05 de diciembre de 2020	20 de diciembre de 2020	05 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	MV_2700	TV 18P BIS A 69A 85 SUR	FLOR CHIA DIAZ	SI NO	$ 11.791.568,00	$ 11.792.851,20	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	4%	10%	100%
11	MV_2724	TV 18P BIS A 69A 58 SUR	MARCO LEON CASTIBLANCO	SI NO	$ 11.806.778,00	$ 11.806.491,50	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre de 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	1%	100%
12	MV_2727	TV 18P BIS A 69A 44 SUR	RAMONA TAFUR	SI NO	$ 11.793.765,00	$ 11.796.989,70	25 de noviembre de 2020	10 de diciembre de 2020	25 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	6%	35%	100%
13	MV_2728	TV 18P BIS A 69A 40 SUR	LEONOR PINZON	SI NO	$ 11.356.522,00	$ 11.262.132,00	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	7%	20%	100%
14	MV_2729	TV 18P BIS A 69A 36 SUR	JAIME GONZALEZ CARVAJAL	SI NO	$ 11.804.128,00	$ 11.803.771,80	24 de noviembre de 2020	09 de diciembre de 2020	24 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	3%	13%	100%
15	MV_2726	TV 18P BIS 68A 48 SUR	MARIA E. SÁNCHEZ SÁNCHEZ	SI NO	$ 11.793.546,00	$ 11.795.110,70	26 de noviembre de 2020	11 de diciembre de 2020	26 de noviembre de 2020	0%	0%	0%	0%	2%	100%
1	MV_2714	DG 69A SUR 18P 51	LUZ TORRES GARCIA	SI NO	$ 9.162.896,00	$ 9.162.951,70	08 de enero de 2021	23 de enero de 2021	08 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16	MV_2731	TV 18P BIS A 69A 32 SUR	GLORIA EDITH MARTÍNEZ LÓPEZ	SI NO	$ 11.425.507,00	$ 11.425.873,70	23 de diciembre de 2020	07 de enerode 2021	23 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
17	MV_2735	TV 18P BIS A 69A 20 SUR	LUZ MERY TRIBIÑO RODRÍGUEZ	SI NO	$ 11.054.196,00	$ 11.054.335,80	29 de diciembre de 2020	13 de enero de 2021	29 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
18	MV_2715	TV 18P BIS A 69A 11 SUR	NURY SÁNCHEZ CALDERÓN	SI NO	$ 10.512.954,00	$ 10.514.713,60	04 de enero de 2021	19 de enero de 2021	04 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
19	MV_2738	TV 18P BIS A 69A 08 SUR	MARÍA DIOMEDES GARCÍA DE TORRES	SI NO	$ 11.678.731,00	$ 11.679.195,90	04 de enero de 2021	19 de enero de 2021	04 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
20	MV_2743	TV 18P BIS 69A 11 SUR	MARÍA DEL CARMEN MORENO	SI NO	$ 11.253.009,00	$ 11.254.171,70	07 de enero de 2021	22 de enero de 2021	07 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
21	MV_2751	TV 18P BIS 69A 35 SUR	ARÍA DE LOS ÁNGELES SOTO BERMÚD	SI NO	$ 11.217.518,00	$ 11.218.597,60	23 de diciembre de 2020	07 de enero de 2021	23 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
22	MV_3465	TV 18P BIS 69A 74 SUR	GLORIA RUEDA RAMIREZ	SI NO	$ 10.954.935,00	$ 10.954.939,50	08 de enero de 2021	23 de enero de 2021	08 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
23	MV_3473	TV 18P BIS 69A 48 SUR	OLGA INES BARRAGAN AVENDAÑO	SI NO	$ 9.858.389,00	$ 9.858.823,00	06 de enero de 2021	21 de enero de 2021	06 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
24	MV_3482	TV 18P BIS 69A 30 SUR	DORA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	SI NO	$ 11.467.171,00	$ 11.467.836,90	22 de diciembre de 2020	06 de enero de 2021	22 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
25	MV_3490	TV 18P BIS 69A 14 SUR	EMMA SANCHEZ CALDERON	SI NO	$ 11.026.471,00	$ 10.971.484,10	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
26	MV_3502	TV 18P 69A 19 SUR	JOSE FOCION SOTO SILVA	SI NO	$ 11.823.415,00	$ 11.823.893,70	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
27	MV_3509	TV 18P 69A 33 SUR	MARLENY MONDRAGON AGUDELO	SI NO	$ 11.824.365,00	$ 11.825.464,30	05 de enero de 2021	20 de enero de 2021	05 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
28	MV_3510	TV 18P 69A 35 SUR	JOSE MANUEL VEGA TOVAR	SI NO	$ 9.088.791,00	$ 9.088.554,20	07 de enero de 2021	22 de enero de 2021	07 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
29	MV_3512	TV 18P 69A 39 SUR	ERNESTINA DEFELIPE GARCIA	SI NO		$ 11.819.644,80	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	MV_3542	TV 18P 69A 58 SUR	LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ	SI NO	$ 11.830.000,00	$ 11.825.393,80	24 de diciembre de 2020	08 de enero de 2021	24 de diciembre de 2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
62	MV_ 1948	KR 19 BIS 68C 30 SUR	ANA GARCIA GARCIA	SI NO		$ 10.728.843,10	21 de enero de 2021	05 de febrero de 2021	21 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	98%
57	MV_ 0970	CL 68B SUR 18X 51	MARIA ELENA RAMIREZ	SI NO	$ 10.571.322,00	$ 10.579.067,40	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%

59	MV_ 0940	CL 68B SUR 18X 68	MARIA CORREA GARZON	SI N0	$ 11.621.874,00	$ 11.622.662,40	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
60	MV_ 0923	CL 68 SUR 19 32	OCTAVIO OSORIO	SI NO		$ 11.747.763,20	21 de enero de 2021	05 de febrero de 2021	21 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	80%
56	MV_ 0963	CL 68 BIS SUR 18Z 04	JULIO ARROYO BRIÑEZ	SI NO		$ 9.791.983,00	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
55	MV_ 0964	CL 68 BIS SUR 18Z 08	CARLOS CAMARGO MUÑOZ	SI NO		$ 11.675.007,00	20 de enero de 2021	04 de febrero de 2021	20 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
58	MV_ 0974	CL 68B SUR 18X 27	MARIA AVILA PEREZ	SI NO		$ 11.823.163,90	25 de enero de 2021	09 de febrero de 2021	25 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
49	MV_ 0749	KR 19A 66C 56 SUR	MARIA RIVERA RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.034.154,70	29 de enero de 2021	13 de febrero de 2021	29 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	75%
50	MV_0833	KR 19 BIS 67D 25 SUR	JOSE PINEDA LOPEZ	SI NO		$ 10.532.166,70	29 de enero de 2021	13 de febrero de 2021	29 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
51	MV_ 2167	DG 68C SUR 18Y 05	MARIA CORTES RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.345.233,10	02 de febrero de 2021	17 de febrero de 2021	02 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	50%
52	MV_ 1002	CL 68B BIS SUR 18X 13	RAMON CALDERON ANDRADE	SI NO		$ 11.736.925,80	30 de enero de 2021	14 de febrero de 2021	30 de enero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
53	MV_ 0989	CL 68B BIS A SUR 18X 38	ILADISLAO MAPE LEIVA	SI NO		$ 11.665.643,50	01 de febrero de 2021	16 de febrero de 2021	01 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	75%
54	MV_ 0979	CL 68B BIS SUR 18Z 07	BERNARDO CORREDOR	SI		$ 11.716.112,20	02 de febrero de 2021	17 de febrero de 2021	02 de febrero de 2021	0%	0%	0%	0%	0%	85%
61	MV_ 1947	KR 19 BIS 68C 30 SUR	FERMIN AVILA	SI NO		$ 10.785.055	RENUNCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	MVCB-3543	TV 18P 69 A 54 SUR	ELIZABETH CANO TRIANA	SI NO	$ 11.769.976,00	$11.769.976	27/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%	100%
2	MVCB-3546	TV 18P 69 A 44 SUR	LEONILDE LUNA	SI NO	$ 11.104.516,00	$11.104.516	25/11/2020	28/12/2020	25/11/2020	0%	0%	0%	0%	3%	100%
3	MVCB-3549	TV 18P 69 A 36 SUR	FLOR MARINA RODRIGUEZ	SI NO	$ 11.771.484,00	$11.771.484	24/11/2020	17/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	0%	19%	100%
4	MVCB-3561	TV 18P 69 A 12 SUR	JAIRO MONTOYA	SI NO	$ 11.496.788,00	$11.496.789	24/11/2020	17/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	17%	3%	100%
5	MVCB-3573	TV 18N BIS A 69 A 27 SUR	CECILIA ULLOA DE VASALLO	SI NO	$ 9.490.973,00	$9.490.974	28/11/2020	30/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	16%	0%	100%
6	MVCB-3574	TV 18N BIS A 69 A 31 SUR	MARIA ROSALBA BARBOSOA	SI NO	$ 11.745.243,00	$11.745.243	18/12/2020	3/01/2021	18/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7	MVCB-3579	TV 18N BIS A 69 A 51 SUR	WILSON BARBOSA RAMIREZ	SI NO	$ 11.721.616,00	$11.721.616	27/11/2020	22/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	11%	100%
8	MVCB-3585	TV 18N BIS A 69 A 69 SUR	EMMA ALCIRA CELY	SI NO	$ 11.214.087,00	$11.214.097	24/11/2020	18/12/2020	24/11/2020	0%	0%	0%	15%	57%	100%
9	MVCB-3586	TV 18N BIS A 69 A 71 SUR	BLANCA CECILIA VARGAS SILVA	SI NO	$ 11.128.646,00	$11.128.646	28/11/2020	13/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	1%	100%
10	MVCB-3587	TV 18N BIS A 69 A 75 SUR	EMPERATRIZ ESPITIA DAZA	SI NO	$ 11.798.131,00	$11.798.131	27/11/2020	17/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	18%	100%
11	MVCB-3588	TV 18N BIS A 69 A 79 SUR	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL	SI NO		$11.815.284	RENUNCIO	RENUNCIO	RENUNCIO	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12	MVCB-3591	TV 18N BIS A 69 A 91 SUR	LUCY CEPEDA MARENTES	SI NO	$ 11.065.963,00	$11.088.496	27/11/2020	29/12/1900	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	9%	100%
13	MVCB-3593	TV 18N BIS A 69 A 95 SUR	ANGEL MARIA LOZANO SALAZAR	SI NO	$ 11.818.599,00	$11.818.599	28/11/2020	23/12/2020	28/11/2020	0%	0%	0%	0%	24%	100%
14	MVCB-3597	DG 69C SUR 18N38	FLOR ALBA VEGA BUITRAGO	SI NO	$ 9.154.115,00	$9.154.115	1/12/2020	5/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	11%	100%
15	MVCB-3599	TV 18N BIS A 69 A 90 SUR	ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA	SI NO	$ 11.022.315,00	$11.022.315	1/12/2020	5/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	10%	100%
16	MVCB-3601	TV 18N BIS A 69 A 82 SUR	LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA	SI NO	$ 11.825.152,00	$11.825.152	3/12/2020	23/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
17	MVCB-3602	TV 18N BIS A 69 A 78 SUR	LUZ MYRIAN MENDEZ CARDENAS	SI NO	$ 11.558.417,00	$11.558.417	3/12/2020	29/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	1%	100%
18	MVCB-3605	TV 18 BIS A 69 A 66 SUR	ETELVINA LOPEZ CAMARGO	SI NO		$11.775.906	5/01/2020	20/01/2020	5/01/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%

19	MVCB-3608	TV 18N BIS A 69 A 56 SUR	YERLYAMPARODUCUARA DUCUARA	SI / NO	$ 11.782.662,00	$11.782.662	17/12/2020	2/01/2021	17/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
20	MVCB-3612	TV 18N BIS A 69 A 46 SUR	DIMAS MORENO JIMENEZ Y OTRA	SI / NO	$ 11.829.082,00	$11.829.082	7/01/2021	22/01/2021	7/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
21	MVCB-3615	TV 18N BIS A 69 A 34 SUR	ANGILBERTO URREGO ORTIZ	SI / NO	$ 11.824.681,00	$11.824.681	22/12/2021	7/01/2021	22/12/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
22	MVCB-3619	TV 18N BIS A 69 A 18 SUR	FABIOLA LOPEZ CARDENAS	SI / NO	$ 11.824.365,00	$11.824.365	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
23	MVCB-3622	TV 18N BIS A 69 A 06 SUR	ISIDRO FLORIAN FRANCO	SI / NO	$ 11.752.371,00	$11.752.371	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
24	MVCB-3631	TV 18N BIS 69 A 35 SUR	MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS	SI / NO	$ 10.940.919,00	$10.940.919	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
25	MVCB-3653	DG 69 A SUR 18 M 44	MARIA DEL CARMNE DE SALVADOR GARAY	SI / NO	$ 11.117.257,00	$11.117.257	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
26	MVCB-3654	DG 69 A SUR 18 N 02	MARIELA AGUILAR QUINTERO	SI / NO	$ 11.754.528,00	$11.754.528	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
27	MVCB-3456	DG 69 A SUR 18 N 10	MIGUELANTONIO JIMENEZ REYES	SI / NO	$ 11.566.499,00	$11.448.661	6/01/2021	21/01/2021	6/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
28	MVCB-3429	DG 69 A SUR 18 P 12	PASCUALA NIEVES CHACON	SI / NO	$ 11.395.762,00	$11.395.762	5/01/2020	20/01/2021	5/01/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
29	MVCB-3430	DG 69 A SUR 18 P 16	HECTOR JOSE ARIAS	SI / NO	$ 9.381.960,00	$9.381.960	7/01/2021	22/01/2021	7/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
30	MVCB-3440	KR 18 Q 69 32 SUR	YMELDA RUIZ RODRIGUEZ	SI / NO	$ 11.665.417,00	$11.665.417	13/01/2021	28/01/2021	13/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
31	MVCB-3443	KR 18 Q 69 02 SUR	JULIO CESAR LEON LEON Y OTROS	SI / NO	$ 11.728.127,00	$11.728.127	15/01/2021	30/01/2021	15/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
32	MVCB-3370	TV 18 Q 69 A 05 SUR	MARIA SOLDEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO	SI / NO		$11.573.343	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	94%
33	MVCB-3372	TV 18Q 69A 15 SUR	YEIMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS	SI / NO		$9.940.081	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	45%
34	MVCB-3217	KR 18Q BIS B 69 75 SUR	MARIA FANNY VERGARA ARENAS	SI / NO		$11.819.618	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	23%
35	MVCB-3201	KR 18R 69 72 SUR	OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALEZ Y OTRO	SI / NO		$11.820.609	22/01/2021	8/01/2021	22/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
36	MVCB-3198	KR 18R 69 90 SUR	MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ	SI / NO		$9.645.950	25/01/2021	10/02/2021	25/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
37	MVCB-3167	KR 18R 69 45 SUR	AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA	SI / NO	$ 11.812.070,00	$11.812.070	21/01/2021	6/01/2021	21/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
38	MVCB-2310	KR 18R BIS 69 31 SUR	SERAFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ	SI / NO		$11.362.322	3/02/2021	18/02/2021	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
39	MVCB-2243	TV 18R BIS A 69 84 SUR	ELIAS BARRIGA MORENO	SI / NO		$11.734.616	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
40	MVCB-3134	KR 18R BIS 69 76 SUR	RUBI STELLA FORERO	SI / NO		$11.424.724	12/02/2021	27/02/2021	12/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	41%
41	MVCB-3235	KR 18R BIS 69B 10 SUR	JOSE GABRIEL OSPINA	SI / NO		$11.354.628	29/01/2021	14/02/2021	29/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
42	MVCB-2336	KR 18R BIS 69B 17 SUR	JORGE HERNANDO PARRA RINCON	SI / NO		$11.798.186	12/02/2021	27/02/2021	12/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	36%
43	MVCB-3233	KR 18R BIS 69B 22 SUR	SAUL JIMENEZ	SI / NO		$11.682.254	9/02/2021	24/02/2021	9/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	43%
44	MVCB-3242	KR 18R 69B 23 SUR	JOSE MELECIO LEON	SI / NO		$11.268.656	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
45	MVCB-3244	KR 18R 69B 31 SUR	CLAUDIA MARÍA SÁNCHEZ	SI / NO		$11.482.438	11/02/2021	26/02/2021	11/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	70%
46	MVCB-3228	KR 18R BIS 69B 40 SUR	MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA	SI / NO		$11.341.862	3/02/2021	18/02/2021	3/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	60%
47	MVCB-3223	KR 18R BIS 69B 60 SUR	LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO	SI / NO	$ 11.537.614,00	$11.537.614	27/01/2021	12/02/2021	27/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%

48	MVCB-2864	DG 69C SUR 18N 69	MIRIAN PEÑUELA GOMEZ	SI NO		$11.002.190	16/02/2021	3/03/2021	16/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	40%
49	MVCB-2842	DG 69C BIS SUR 18P 04	GUILLERMINA HERNÁNDEZ GORDILLO	SI NO		$11.750.793	23/02/2021	11/03/2021	23/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	15%
1	3446	DG 69 SUR 18N 83	ANA DE DIOS MANSO DE BATERO	SI NO	$ 11.801.064,00	$11.801.106	27/11/2020	12/02/2021	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	5%	100%
2	3450	DG 69 SUR18 N 65	ABAD LOPEZ CARDONA	SI NO	$ 11.383.137,00	$11.383.198	1/12/2020	12/02/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3	3662	DG 69 SUR 18 M 69	MARCELINA ROJAS VILLABONA	SI NO	$ 11.041.231,00	$11.041.254	1/12/2020	15/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	5%	100%
4	3664	DG 69 SUR 18M 61	MARCO JULIO TORRES RAVELO	SI NO	$ 11.305.019,00	$11.305.276	27/11/2020	14/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	35%	100%
5	2610	DG 69 SUR 18M 62	MARY LUZ GUTIERREZ	SI NO	$ 11.527.887,00	$11.529.634	4/12/2020	10/02/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6	3666	DG 69 SUR 18M 51	MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON	SI NO	$ 11.677.430,00	$11.762.595	27/11/2020	15/12/2020	27/11/2020	0%	0%	0%	0%	20%	100%
7	3453	DG 69 SUR 18N 51	JUDITH RESTREPO CHAVES	SI NO	$ 9.773.080,00	$11.763.967	1/12/2020	15/01/2021	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
8	2612	DG 69 SUR 18M 70	BLANCA LILIA PARRA DOMINGUEZ	SI NO	$ 10.879.048,00	$10.879.048	4/12/2020	2/02/2021	4/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
9	3415	DG 68B SUR 18N 79	JOSE LELIS NERI GARZON SILVA	SI NO	$ 11.706.999,00	$11.707.001	8/01/2021	22/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	3420	DG 68B SUR 18N 57	MARCO TULIO RUBIO	SI NO	$ 7.307.707,00	$7.307.709	1/12/2020	30/12/2020	1/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	3400	DG 69 SUR 18N 46	BETSABE MALAGON LOZANO	SI NO		$11.542.102	2/12/2020	16/02/2021	2/12/2020	0%	0%	0%	0%	5%	100%
12	3661	DG 69 SUR 18M 73	ANA TULIA ROJAS	SI NO	$ 7.217.407,00	$7.217.448	3/12/2020	18/12/2020	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13	3668	DG 69 SUR 18M 43	ROSALBA PAEZ VASQUEZ	SI NO		$11.702.181	12/01/2021	23/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14	3670	DG 69 SUR 18M 35	ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS	SI NO		$11.310.007	3/12/2020	23/02/2021	3/12/2020	0%	0%	0%	0%	0%	100%
15	2684	DG 68B SUR 18M 50	LIGIA JACOME NIETO	SI NO	$ 11.806.045,00	$11.806.005	8/01/2021	23/01/2021	8/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16	2618	DG 68B SUR 18M 51	GILBERTO SALAZAR PERDOMO	SI NO	$ 11.140.496,00	$11.140.497	13/01/2021	1/02/2021	13/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
17	2620	DG 68B SUR 18M 43	MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA	SI NO		$11.780.990	12/01/2021	27/01/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	87%
18	2682	DG 68B SUR 18M 42	LEONOR MORENO MENDEZ	SI NO		$11.826.523	14/01/2021	23/02/2021	14/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
19	4707	KR 18P BIS 68 22 SUR MJ	MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO	SI NO		$11.727.123	5/02/2021	20/02/2021	5/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	55%
20	3393	DG 68A SUR 18N 41	ELIZABETH PACHON TELLEZ	SI NO	$ 11.735.850,00	$11.735.850	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
21	4696	KR 18P 67C 44 SUR	LUIS EDGAR ALBARRACIN	SI NO	$ 11.776.787,00	$11.776.788	12/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
22	3404	DG 69 SUR 18N 62	MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO	SI NO		$11.792.973	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	4687	DG 68A SUR 18N 50	SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ	SI NO	$ 11.830.000,00	$11.268.048	12/01/2021	27/01/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
24	4684	KR 18N BIS B 67C 59 SUR	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA	SI NO		$11.619.375	RENUCIA	RENUNCIA	RENUCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	4681	KR 18N BIS B 67C 43 SUR	ANA ROSA CRUZ CRUZ	SI NO	$ 11.363.742,00	$11.363.741	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
26	4636	KR 18N BIS B 67C 58 SUR	ABRAHAN MUÑOZ CRUZ	SI NO	$ 11.826.340,00	$11.826.340	12/01/2021	1/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
27	2686	DG 68B SUR 18M 58	JAIRO PULIDO RUIZ Y OTRO	SI NO	$ 11.826.838,00	$11.826.839	12/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%

28	4695	KR 18P 67C 50 SUR	VITELVINA MONTES GOMEZ	SI NO	$ 11.790.954,00	$11.790.955	12/01/2021	4/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
29	4680	KR 18N BIS B 67C 35 SUR	MISAEL LEON PEREZ	SI NO	$ 11.581.555,00	$11.581.556	12/01/2021	12/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
30	4679	KR 18N BIS B 67C 31 SUR	SAIN FAJARDO VANEGAS	SI NO	$ 11.635.906,00	$11.635.904	12/01/2021	10/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
31	4637	KR 18N BIS B 67C 52 SUR	INES AURORA ACERO BAQUERO	SI NO	$ 10.666.035,00	$10.666.035	12/01/2021	2/02/2021	12/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
32	3452	DG 69 SUR 18N 55	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ	SI NO		$11.140.687	RENUCIA	RENUNCIA	RENUNCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	3349	DG 68B SUR 18Q 57	LUCILA BALLESTEROS SOLANO	SI NO		$11.512.431	18/02/2021	5/03/2021	18/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	50%
34	3348	DG 68B SUR 18Q 67	JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ	SI NO		$11.641.853	17/02/2021	04/0372021	17/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	40%
35	3195	KR 18Q BIS B 68B 09 SUR	YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO	SI NO		$11.766.931	19/02/2021	6/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	30%
36	3175	KR 18R 68 84 SUR	AMANDA FLORIAN	SI NO		$10.178.683	15/02/2021	2/03/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	40%
37	3157	KR 18R 68 75 SUR	EDILMA MARIA POVEDA HERNANDEZ	SI NO		$11.741.099	23/02/2021	7/03/2021	23/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
38	3366	DG 69 SUR 18Q 13	LUZ STELLA LOPEZ FLOREZ Y OTRO	SI NO		$8.214.886	4/02/2021	18/02/2021	4/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	100%
39	3363	DG 69 SUR 18Q 31	MIRIAN OSORIO RAMÍREZ	SI NO		$11.748.812	15/02/2021	2/02/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	40%
40	3209	DG 69 SUR 18Q 65	MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO	SI NO		$11.804.648	8/02/2021	23/02/2021	8/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	75%
41	3211	KR 18Q BIS B 69 17 SUR	MARIA INES LIZARAZO DE GAMBOA Y OTRO	SI NO		$11.641.897	15/02/2021	2/03/2021	15/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
42	3212	KR 18Q BIS B 69 25 SUR	HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA	SI NO		$11.481.355	19/02/2021	6/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	15%
43	3361	KR 18Q BIS B 69 24 SUR	OMAR CUBILLOS	SI NO		$11.702.961	19/02/2021	6/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	30%
44	4748	CL 68 SUR 18P 82 MJ	LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA	SI NO		$10.416.384	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%
45	4733	KR 18P BIS A 67C 36 SUR	AURA MARIA LUZ CUESTA ROJAS	SI NO		$11.549.667	25/02/2021	12/0372021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
46	4753	KR 18Q 67C 24 SUR	MARIA DINA GOMEZ	SI NO		$10.024.550	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	SIN VALIDAR	0%	0%	0%	0%	0%	0%
47	4735	KR 18P BIS A 67C 22 SUR	MARIA ALCIRA BELTRAN AMAYA	SI NO		$11.680.915	25/02/2021	12/0372021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
48	4743	KR 18P BIS 67C 27 SUR	BERTILDA CAÑON ALFARO	SI NO		$11.710.953	25/02/2021	12/0372021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
49	4758	CL 67C SUR 18P 81	PEDRO ANTONIO CASTRO RAMIREZ	SI NO		$11.731.975	25/02/2021	12/0372021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	4137	CL 67C SUR 18P 44	PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO	SI NO		$11.801.541	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%	0%
51	4131	CL 67C SUR 18N 68	NELLY AVILA SANTOS	SI NO		$11.761.268	19/02/2021	6/03/2021	19/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	30%
52	4273	CL 67C SUR 18N 34	MARIA MARLEN HERNANDEZ DE CORTES	SI NO		$10.814.851	25/02/2021	12/0372021	25/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	0%
53	4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO		$11.724.531	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	FASE DE VALIDACION	0%	0%	0%	0%	0%	0%
54	4269	CL 67C SUR 18N 16	EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA	SI NO		$11.729.999	26/01/2021	10/02/2021	26/01/2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%
55	4293	CL 67B SUR 18N 05	FLOR EDITH ERAZO	SI NO		$10.350.399	2/02/2021	18/02/2021	2/02/2021	0%	0%	0%	0%	0%	90%

INFORMEMENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA	1/3/2021	**PERIODO No.**	4	DEL	**1/2/2021**	AL	**28/2/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorias técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitablidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACION:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACION:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSION:	0	**FECHA DE SUSPENSION:	0
**FECHA DE REINICIACION:	0	**FECHA DE REINICIACION:	0
FECHA DE TERMINACION:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACION:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	894.285.952	VALOR INICIAL :	3.728.543.252,00
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Lievano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/4/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

JUAN PABLO II - LAS LOMAS - PUERTO RICO - LOS LACHES - EL CONSUELO

FECHA: 28/02/2021

MVCB_3859 - MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS: SSe realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 12 de Febrero de 2021

MVCB_3838 - MARIA DE JESUS GONZALEZ : Se realiza entrega unilateral de la vivienda el dia 10 de Febrero de 2021, ya que la beneficiaria presenta inconformidad en cuando a los precios establecidos. Se realiza toma de medidas en compañía de la beneficiario y socializacion de presupuesto y actividades ejecutadas. Se realiza informe por parte de Contratista e Intrventoria.

10-02-2021: MVCB_3837 - GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES: Se realiza visita de seguimiento tecnico donde se evidencia avance en alistados de piso y pañete en algunos muros de cocina y baño. Preparacion de muros de baño para instalacion de enchape. Se inicia enchape en mesón existente y se les hace la corrección por desnivel.

10-02-2021: MVCB_3835 - FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES: Se realiza visita de seguimiento tecnico donde se evidencia avance en instalacion de enchape de baño. Se realiza la construcción de muros divisorios entre cocina y habitación. Se realiza construcción del mesón nuevo e inicio del enchape.

MVCB_3833 - LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021.
MVCB_3865 - ANA TERESA VALENCIA GRANADOS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Febrero de 2021.
12-02-2021: MVCB_3867 - NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO: Se realiza visita de seguimiento tecnico donde se evidencia inicio de actividades el dia 12-02-2021, se inicia con pañete en cocina.
MVCB_3871 - CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 24 de Febrero de 2021
MVCB_3869 - CARMEN JULIA BARRETO BELTRAN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Enero de 2021
MVCB_3825 - LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Enero de 2021
MVCB_3871 - MILY YOMARA CALDERON CUESTA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Febrero de 2021
MVCB_3751 - MARIA JUDITH LERMA VARGAS Y OTRO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Diciembre de 2020
MVCB_3813 - MARIA LUCILA IBAGUE: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Diciembre de 2020
23-02-2021: MVCB_3875 - ROSALBINA GIL DE SOLER: Se realiza visita de seguimiento en la vivienda donde se evidencia avance en instalacion cubierta.
24-02-2021: MVCB_4847 - ALFER YESID CASTANEDA PACHON: Se realiza visita por parte de Contratista e Interventoria en donde el Beneficiario manifiesta no permitir nuevamente el ingreso del personal debido a las dificultades que se han presentado durante la ejecucion de las obras. Se realiza acta y se programa visita con SDHT.
MVCB_4862 - NANCY MORENO RADA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 06 de Enero de 2021
MVCB_4863 - EULINE CARDENAS RUIZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Febrero de 2021.
23-02-2021: MVCB_4860 - RUFINA MENA MURRILLO: Se realiza visita de seguimiento en la vivienda donde se evidencia poco avance en la ejecucion de las actividades, se solicita al Contratista demoler todo el enchape instalado en la cocina ya que se encuentra en mal estado y no esta instalado de la manera adecuada.
MVCB_4881 - ROQUELINA MENA MURILLO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 22 de Enero de 2021
MVCB_2297 - CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRÍGUEZ: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Febrero de 2021
MVCB_2292 - HERNAN ANACONA PALECHOR : Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Enero de 2021
MVCB_2337 - SARA SANCHEZ VIVAS: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 27 de Enero de 2021.
MVCB_4818 - ROHELFY PACHON SOTO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
23-02-2021: MVCB_2350 - CARLOS ALFONSO SANCHEZ: Se realiza visita de seguimiento en la vivienda donde se evidencia avance en alistado e instalacion de enchape de piso en hall y dos habitaciones. Se inicia con preparacion de muros para instalacion de enchape en zona de lavado y cocina. Se realiza enchape de piso y pared en baño.
MVCB_2287 - LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 10 de Febrero de 2021
26-02-2021: MVCB_2288 - SIMONA TORRES MANYOMA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
25-02-2021: MVCB_2284 - MARIA HELENA ANGEL BEDOYA: Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia que aun no se ha realizado la instalacion de la canal, adicional a esto se presentan filtraciones de agua en cubierta nueva. Se le solicita al Contratista subsanar estas actividades con la mayor brevedad posible.
MVCB_2234 - MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 30 de Diciembre de 2020
24-02-2021: MVCB_2238 - DIANA MARCELA TICORA LOPEZ: Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia poco avance en la ejecucion de las actividades, adicional a esto l beneficiaria manifiesta llevar una semana sin baño por tal motivo se le solicita al Contratista dar prioridad a la ejecucion de actividades en esta zona. Se evidencia instalacion de enchape de piso en habitacion 1.

24-02-2021: MVCB_2275 - JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS: Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia que no hay personal operativo realizando ninguna actividad.
24-02-2021: MVCB_2270 - NUBIA GALLEGO CIRO: Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia avance en aplicación de pintura en habitaciones, acabados de boquilla en enchape de piso de baño y cocina y se finaliza instalacion de enchape de piso.
24-02-2021: MVCB_2346 - ISIDRO BONILLA RICO: Se realiza visita de seguimiento tecnico en la vivienda donde se evidencia que se finaliza intervencion en baño y cocina. Pendiente ultima capa de pintura y detalles en boquilla.
MVCB_2347 - MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021
MVCB_2360 - DAMARIS RESTREPO CHAVES: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Febrero de 2021.
18-02-2021: MVCB_3052 - GENTIL CALDERON CALDERON: Se realiza visita de seguimiento a la vivienda donde se evidencia avance en toma de niveles, alistado e instalacion de enchape de piso.
MVCB_2377 - AMPARO MENDEZ: Se realiza visita de seguimiento tecnico donde se evidencia avance en
28-01-2021: MVCB_2373 - MARTHA CECILIA ARIAS MORALES: Se realiza visita de seguimiento donde se prioriza cambio de cubierta.
18-02-2021: MVCB_3039 - FLOR ALICIA LOAIZA ARBOLEDA: Se realiza visita de seguimiento tecnico donde se evidencia avance en demolicion de enchape de piso de habitaciones, preparacion de pisos de zonas comunes, demolicion de meson de cocina. Alistados e instalacion de enchape de pisos.
09-02-2021: MVCB_3043 - MARIA HELENA CASTELLANOS UMAÑA: Se realiza visita de seguimiento a la vivienda donde se evidencia avance en
MVCB_3144 - JACQUELIN GONZALEZ AREVALO:
28-01-2021: MVCB_3145 - MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ: Se realiza validacion de la vivienda en la cual se prioriza adecuaciones en una zona de la cubierta, baño y cocina.
MVCB_3148 - OTALVINA ESPITIA FORERO: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 20 de Enero de 2021
MVCB_3151 - ELVIRA PINZON SIERRA: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 15 de Enero de 2021.
19-02-2021: MVCB_4768 - LEIDY DIANA MUÑOZ OSPINA: Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso de habitaciones y zonas comunes. Instalacion de enchape de piso y pared en cocina y zona de lavado.
20-01-2021: MVCB_4766 - MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO: Se realiza validacion de la vivienda en donde se prioriza adecuaciones en primer piso, intervencion de alistados y enchape de piso generales, La beneficiaria solicita instalacion de baranda para escaleras debido a que es de la tercera edad.
17-02-2021: MVCB_3323 - ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
15-02-2021: MVCB_3315 - YANETH TORRES GARCIA: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
19-02-2021: MVCB_3332 - JORGE SANTOS VEGA LINARES: Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion.
19-02-2021: MVCB_3336 - NANCY OSORIO: Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion total de cubierta y perfileria. Alistados e instalacion de enchape de piso. Pendiente impermeabilizacion de canal.
19-02-2021: MVCB_3326 - BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.
17-02-2021: MV_356 - HECTOR ULISES ROMERO MENDEZ: Se realiza validacion de la vivienda donde se prioriza cambio de cubierta. Baño: Demolición de enchape piso y muro completo, cambio de combo, instalación de puerta.
MV_586 - SANTIAGO AGUIRRE GARCIA:

MV_600 - HERMINIA PEÑALOZA:

MV_077IN - SILVIA AMPARO MUÑOZ GUERRERO:

17-02-2021: MVLO_419 - LUCIA ARDILA MARIN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia que las zonas a intervenir fueron ya mejoradas por la beneficiaria, se dialoga con la beneficiaria donde nos solicita intervenir el siguiente piso, quedando con el compromiso para una próxima visita. Posible renuncia.

MVPR_0111 - URIEL JOSE CALDERON MUÑOZ:

MVCA_3842 - IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS:

MVCA_4516 - MARIA JULIA CORDOBA BOLAÑOS:

MVCA_4231 - ESMERALDA VIDALES ANAYA:

15-02-2021: MVCA_1783 - MARIA RUTH OSPINA: Se realiza validacion de la vivienda donde se prioriza intervencion en habitaciones, cocina, sala, baño. Patio: Picado, alistado y enchape. Hall de acceso: Picado, alistado y enchape. Habitaciones: alistado y enchape. Baño: Demolición de enchape piso y pared, alistado piso, enchape en piso y muros, instalación de combo.

MVCA_2132 - JAIME ENRIQUE GUZMAN:

MVBV_0741 - BEATRIZ TRIVIÑO:

MVBV_0519 - MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA:

28-01-2021: MVBV_0890 - MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ: Se realizó visita de validación en la cual se prioriza intervencion en habitación: (Demolición de muro), pañete, alistado, enchape, guarda escoba, cielo raso. Baño: pañete, alistado, enchape, instalación de combo sanitario. Cocina: Pañete, pintura, alistado, enchape, construcción de mesón. Sala: Pañete, pintura, alistado, enchape.

MVCE_0125 - SALVADOR VELANDA ACERO:

MVCE_1995 - JAIRO ALBERTO GARZÓN RIOS:

MVCE_1034 - JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL:

MVCE_2106 - MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN:

3

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ARBORIZADORA ALTA

Barrio o Territorio:__JUAN PABLO II_

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Componente Técnico: Registre aquí el consolidado del avance de la validación y verificación del alcance inicial de cada vivienda por proyecto.
COMPONENTE TECNICO ARBORIZADORA ALTA
DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE OBRA SE TIENE QUE ESTAR INTERVINIENDO 18 VIVENDAS,SIN EMBARGO A LA FECHA SOLO SE VIENE EJECUTANDO 12 CASAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL PRIMER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 1 MES.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL SEGUNDO GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 22 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 25 DIAS. EL CONTRATISTA DA INICIO A ESTE GRUPO EL DIA 17 DE AGOSTO.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL TERCER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 28 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 19 DIAS. EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA DADO INICIO A LAS SEIS(6) VIVIENDAS DEL GRUPO COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA GRAFICA SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN 15-08-18 AL 15-09-18 ARBORIZADORA ALTA
4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA
JUAN PABLO II
FECHA: 22/02/2021
14-12-2020 al 15-12-2020 MV_4647 GIOVANI GUTIERREZ RIVERA: Se realiza entrega de lMVCB_4647 al beneficiario Giovani Gutierrez Rivera con presupuesto final de ejecucion de $11.828.793, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
14-12-2020 al 15-12-2020 MV_4669 MARIA EUGENIA RIAÑOS : Se realiza entrega de lMVCB_4669 al beneficiario Maria Eigenia Riaños con presupuesto final de ejecucion de $11.827.012, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
04-01-2021 al 08-01-2021 MV_4620 MARIA ALICIA NAVARRO: Se realiza entrega de lMVCB_4620 al beneficiario Maria Alicia Navarro con presupuesto final de ejecucion de $11.591. 655, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%. . Nota: En este MV_4620 queda pendiente tema de cubierta por corte de teja que dejaron a ras y puede ingresarse el agua.
21-12-2020 al 24-12-2020 MV_4649 FLORALBA ACEY LOPEZ: Se realiza entrega del MVCB_4649 al beneficiario Floralba Acey Lopez con presupuesto final de ejecucion de $11.803.884 , mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
28-12-2020 al 30-12-2020 MV_4671 MARIA SHIRLEY GARCES: Se realiza entrega del MVCB_4671 al beneficiario Maria Shirley Garces con presupuesto final de ejecucion de $10.944.024.77, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
25-01--2021 al 31-01-2021 MV_4865 ANA SOFIA AGUILERA: :Se realiza entrega el dia 25-01-2021 del MVCB_4865 a la beneficiaria Carmelina Arcila De Castaño con presupuesto final de ejecucion de $ 11.424.692,80 , mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.(en Habitación 1-2, cocina, baño, zona de ropa.)

28-12-2020 al 29-12-2020 MV_4849 ALEYDA TORRES SEPULVEDA: Se realiza entrega del MVCB_4849 al beneficiario Aleyda Torres Sepulveda con presupuesto final de ejecucion de $11.532.188, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
18-01--2021 al 23-01-2021 MV_4837 MARIA ALIRIA FUENTES: Se realiza entrega el dia 20-01-2021 del MVCB_4837 al a beneficiaria Maria Aliria Fuentes Sepulveda con presupuesto final de ejecucion de $10.966.022, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%. (en habitación ,sala, comedor, ,cocina y zona de ropa, baño, local.)
10-02-2021 MVV_4836 VICTOR JULIO PORTILLA: se realiza visita de segumiento para evidenciar el estado actual de la vivienda donde el beneficiario indica que no cuenta con los recursos necesarios para realizar las adecuaciones que necesitan para ejecutar el mejoramiento de vivienda asignado. Renuncia Voluntaria.
01-02--2021 al 06-02-2021 MV_4871 CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO : Se realiza entrega el dia 01-02-2021 del MVCB_4871 a la beneficiaria Carmelina Arcila De Castaño con presupuesto final de ejecucion de $ 11.827.420 , mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.(en Habitación 1-2, cocina, baño, zona de ropa. hall 1, 2)
11-01--2021 al 16-01-2021 MV_4869 ROSA HELENA: Se realiza entrega el dia 15-01-2021 del MVCB_4869 a la beneficiaria Rosa Helena Paez de Guevara con presupuesto final de ejecucion de $ 11.821.080, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.(en Habitación 1-2 , lavanderia, patio, sala, baño, cocina.) pendiente instalación puerta habitación principal.
11-01-2020 al 16-01-2021 MV_3806 JOSE JIMENEZ :Se realiza entrega el dia 14-01-2021 del MVCB_3806 al beneficiario Jose Jimenez Gonzalez con presupuesto final de ejecucion de $ 11.247.180 , mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.(en Habitación 1-2-3, sala-cocina, baño.) pendiente juatificación del valor del presupuesto final por parte del contratista a interventoria.
28-12-2020 al 30-12-2020 MV_4661 MARTHA PATRICIA CORTES: Se realiza entrega del MVCB_4661 al beneficiario Martha Patricia Cortes con presupuesto final de ejecucion de $11.699.319, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%. Nota: se le informa al contratista que el alistado de piso se encuentra en mal estado en habitación1, 2 y zona de ropa se recomienda levantar el material ya que se esta realizando mal esta actividad , el contratista continua actividad con pegacor , cemento para mejorar y continuan con el enchape .se le hace la observación que interventoria no se hace responsable de las actividades realizadas en estas zonas intervenidas por garantia.
04-01-2021 al 07-01-2021 MV_ 4660 BLANCA EDELMIRA SANCHEZ : Se realiza entrega del MVCB_4660 al beneficiario Blanca Edelmira Sanchez con presupuesto final de ejecucion de $11.042.322, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
11-01--2021 al 16-01-2021 MV_4891 DEYANIRA MARIA ROMERO ARIZA: Se realiza entrega el dia 12-01-2021 del MVCB_4891 de la beneficiaria Deyanira Maria Romero Ariza con presupuesto final de ejecución de $ 10.388.683 en mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100% (habitaciones 1,2,3 , cocina, sala, hall, zona lavanderia, baño.)
14-12-2020 al 15-12-2020 MV_ 4886 EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA: Se realiza entrega de IMVCB_4886 al beneficiario Emma Mateus con presupuesto final de ejecucion de $11.364.471, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100%.
18-01--2021 al 23-01-2021 MV_ 3805 LUZ MARY VARGAS ARDILA: Se realiza entrega el dia 22-01-2021 del MVCB_3805 a la beneficiaria Luz Mary Vargas Ardila con presupuesto final de ejecucion de $ 11.442.218, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100% (En habitación principal, sala, cocina, baño, levante de muro.)
18-01-2021 al 23-01-2021 MV_ 3804 MARIA ANA CELIA IBAÑEZ: Se realiza entrega el dia 20-01-2021 del MVCB_3804 a la beneficiaria Maria Ana Celia Ibañez con presupuesto final de ejecucion de $ 10.815.665, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100% (En cocina, sala, comedor, baño.)
04-12-2020 al 07-01-2021 MV_3857 CECILIA MEJIA DE RODRIGUEZ: Se realiza entrega del MVCB_3857 a la beneficiaria Cecilia Mejia De Rodriguez con presupuesto final de ejecucion de $11.826.533, mejoramiento de vivienda en zona intervenida al 100%.
18-01-2021 al 23-01-2021 MV_4717 ARACELY ZAMBRANO ROJAS : Se realiza entrega el dia 21-01-2021 del MVCB_4717 a la beneficiaria Aracely Zambrano Rojas con presupuesto final de ejecucion de $ 11.826.064, mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100% (En cocina, sala, comedor, baño, zona de ropa, hall. cielo raso en las areas intervenidas,)
22-02-2021 al 27-02-2021 MV_ 4630 MARIA FELISA CRUZ VARGAS; Se realiza entrega el dia 24-02-2021 del MVCB_4630 a la beneficiaria Maria Felisa Cruz Vargas con presupuesto final $ 10.903.004, Mejoramiento de vivienda de zonas intervenidas al 100% (En habitación 1, 2, hall, baño, cocina, zona de ropas)

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas

ARBORIZADORA ALTA

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II , CIUDAD BOLIVAR

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II

FECHA: Del 22-02-21 Hasta 28-02-2021.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 1948 ANA GARCIA GARCIA: En el transcurso de la semana se evidencio que hay negligencia por parte de contratista en ejecutar las correcciones recibidas por parte de esta interventoria, ademas se esta a la espera de que contratista realice las actividades acordadas para cerrar el presupuesto, para el recibimiento conforme de la vivienda.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 0923 OCTAVIO OSORIO: En el transcurso de la semana se evidencio que se ejecuto actividades de: enchape de piso en habitacion nº 1 del primer piso. Instalacion de combo sanitario en el baño. Construccion del meson en la cocina.

26-02-2021. MV_ 0964 CARLOS CAMARGO MUÑOZ: Entregada.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 0974. MARIA AVILA PEREZ. En el transcurso de la semana se evidencio que el presupuesto esta apunto de ser ejecutado en su totalidad, ocurrio en la semana la novedad de que la beneficiaria comenta que se le extravio una pulidora, por esta causa no dejo entrar mas personal a la obra, lo cual generara retrasos en la culminacion de la obra en la vivienda.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 0749 MARIA RIVERA RODRIGUEZ. Se proyecta actividades de enchape de piso en habitacion nº 1 del primer piso. Intervencion del patio en el primer piso, se ha observado en la vivienda falla en la logistica de materiales lo cual retrasara la obra en la vivienda.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 2167 MARIA CORTES RODRIGUEZ. Se proyecto actividades de: pañete de muro en zona social. Pintura en habitacion habitacion nº 1 y zona social.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 1002 RAMON CALDERON ANDRADE. En el transcurso de la semana se evidencio que hay negligencia por parte de contratista en ejecutar las correcciones recibidas por parte de esta interventoria, ademas se esta a la espera de que contratista realice las actividades acordadas para cerrar el presupuesto, para el recibimiento conforme de la vivienda. Se realiza preparacion de superficie para colocacion de alistado de piso.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 0989 ILADISLAO MAPE LEIVA. Se ejecuto enchape de muro en la cocina. Enchape de piso en halls, patio. Instalacion combo sanitario. Se evidencio inasistencia de los maestros en la obr lo cual genera retrasos en la misma.

22-02-2021 al 28-02-2021. MV_ 0979 BERNARDO CORREDOR. Se ejecuto: instalacion de pvc y pintura en habitacion nº 2. Instalacion de la puerta en el baño. Pintura en escaleras. Instalacion del lavadero en el patio. Guarda escoba en el patio.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se evidencio en el transcurrir de la semana que el rendimiento de la mano de obra es medio, lo cual puede mejorar.	Contratista	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio: Juan Pablo II, Ciudad Bolivar

Se comunico a contratista que en todos los mejoramientos de viviendas donde se ejecuto las actividades de alistado de piso y pañete de muro se evidencio fisuras o grietas por la utilizacion del agregado fino de arena lavada o degradada la cual no tuvo buen comportamiento, lo cual fue comunicado a contratista pero siguio utilizando la misma arena, dicho comportamiento de esta arena es responsabilidad unica y exclusivamente de contratista, a quien le fue solicitado los respectivos certificados de calidad de todos los materiales utilizados en los mejoramientos de viviendas. En el transcurso de las ejecuciones se evidencio en la zona: A y en todos los mv de la zona D, la utilizacion de un pegacor empacado en bolsas blancas plasticas; sin sellos ni etiquetas de calidad; el cual carece de adherencia, con muchisima presencia de agregado arcilloso, con baja presencia de latex; por lo cual se recomendo a contratista en presencia de subcontratista paralizar su uso, pero siguio utilizando el mismo pegacor, por ende dicho comportamiento de este pegacor es responsabilidad unica y exclusivamente de contratista,

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TECNICO
Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra. **Fase de validación y apropiación.**
Componente Técnico: Registre aquí el consolidado del avance de la validación y verificación del alcance inicial de cada vivienda por proyecto.
COMPONENTE TECNICO ARBORIZADORA ALTA
DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE OBRA SE TIENE QUE ESTAR INTERVINIENDO 18 VIVENDAS,SIN EMBARGO A LA FECHA SOLO SE VIENE EJECUTANDO 12 CASAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL PRIMER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 1 MES.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL SEGUNDO GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 22 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 25 DIAS. EL CONTRATISTA DA INICIO A ESTE GRUPO EL DIA 17 DE AGOSTO.
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL TERCER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 28 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 19 DIAS. EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA DADO INICIO A LAS SEIS(6) VIVIENDAS DEL GRUPO COMO SE
4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA
BARRIO JUAN PABLO II **FECHA: 23/11/2020**
MVCB_3543 : ELIZABETH CANO TRIANA: Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 30/12/2020
MVCB_3546 : LEONILDE LUNA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/12/2020
MVCB_3549 : FLOR MARINA RODRIGUEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020
MVCB_3561 : JAIRO MONTOYA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020
MVCB_3573 : CECILIA ULLOA DE VASALLO : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 30/12/2020
MVCB_3574 : MARIA ROSALBA BARBOSDA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/01/2021
MVCB_3579 : WILSON BARBOSA RAMIREZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 22/12/2020
MVCB_3585 : EMMA ALCIRA CELY : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/12/2020
MVCB_3586 : BLANCA CECILIA VARGAS SILVA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 14/01/2021.
MVCB_3587 : EMPERATRIS ESPITIA DAZA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 17/12/2020.
MVCB_3588 : MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL : RENUNCIA.
MVCB_3591 : LUCY CEPEDA MARENTES : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/12/2020.

MVCB_3593 : ANGEL MARIA LOZANOSALAZAR : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/12/2020.
MVCB_3597 : FLOR ALBA VEGA BUITRAGO Y OTROS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 05/01/2021.
MVCB_3599 : ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 05/01/2021.
MVCB_3601 : LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/12/2020.
MVCB_3602 LUZ MIRIAN MENDEZ CARDENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/12/2020.
MVCB_3605 : ETELVINA LOPEZ CAMARGO : El día 11/02/2021 se les explica a las beneficiarias las actividades a realizar, para dar por culminadas las actividades en la vivienda y así poder entregarla para la tercera semana del mes de febrero.
MVCB_3608 : YERLEY AMPARO DUCUARA DUCUARA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 15/01/2021.
MVCB_3612 :DIMAS MORENOJIMENEZ Y OTRA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 03/02/2021.
MVCB_3615 : ANGILBERTO URREGO ORTIZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 01/02/2021.
MVCB_3619 : FABIOLA LOPEZ CARDENAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3622 : ISIDRO FLORIAN FRANCO : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3631 : MARIA VIBIAN REYES CASTELLANOS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 28/01/2021.
MVCB_3653 : MARIA DEL CARMEN DE SALVADOR GARAVITO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 02/02/2021.
MVCB_3654 : MARIELA AGUILAR QUINTERO : PENDIENTE; Entrega de vivienda a beneficiarios el día 03/02/2021.
MVCB_3656 : MIGUEL ANTONIO JIMENEZ REYES : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 22/01/2021.
MVCB_3429 : PASCUALA NIEVES CHACON : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 29/01/2021.
MVCB_3430 : HECTOR JOSE ARIAS : Entrega de vivienda a beneficiarios el dia 22/01/2021.
MVCB_3440 : YMELDA RUIZ RODRIGUEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 02/02/2021.
MVCB_3443 : JULIO CESAR LEON LEON Y OTRA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 05/02/2021.
MVCB_3370 : MARIA SOLEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO : Se realiza chequeo de actividades para su entrega el día 01/03/2021.
MVCB_3372 : YEYMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS : Se están ejecutando actividades en cocina y alistado de piso.
MVCB_3217 : MARIA FANNY VERGARA ARENAS : Ejecución de actividades de alistado de piso para posterior enchape.
MVCB_3201 : OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALES Y OTROS : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/02/2021.
MVCB_3198 : MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 18/02/2021.
MVCB_3167 : AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 09/02/2021.
MVCB_2310 : SERAFINA HERNANDEZ RAMIREZ : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.

MVCB_2243 : ELIAS BARRIGA MORENO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 25/02/2021.

MVCB_3134 : RUBI STELLA FORERO : Se presentan dificultades en la ejecución del piso de la entrada principal se considera la ejecución de una placa de sobre piso para garantizar su durabilidad.

MVCB_3235 : JOSE GABRIEL OSPINA : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.

MVCB_2336 : JORGE HERNANDO PARRA RINCON : Se chequea la instalación de la cubierta de la casa.

MVCB_3233 : SAUL JIMENEZ : Se realiza el chequeo de actividades de piso en la zona del local de la casa.

MVCB_3242 : JOSE MELECIO LEON : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 23/02/2021.

MVCB_3244 : CLAUDIA MARIA SANCHEZ : Se realiza el cheque de actividades de enchape en la zona de cocina y sala comedor.

MVCB_3228 : MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA : Chequeo de actividades para su posterior entrega el día 01/03/2021.

MVCB_3223 : LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO : Entrega de vivienda a beneficiarios el día 09/02/2021.

MVCB_2864 : MIRIAN PEÑUELA GOMEZ : Se realizan actividades de cubierta y pañete en la zona de ropas.

MVCB_2842 : GUILLERMINA HERNANDEZ GORDILLO : Se chequea actividades del alistado de pisos en la vivienda.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas

ARBORIZADORA ALTA

Barrio o Territorio:_____JUAN PABLO II_____

Se presenta una preocupación en las viviendas en ejecución pues los materiales no son de una muy buena calidad, tenemos inconvenientes con los agregados y el pegacor que se están utilizando para intervenir las viviendas.

- En la arena se ha solicitado en varias ocasiones el certificado de cantera o ficha técnica.
- En cuestión del pegacor llego en un embolsado casero sin cumplir con un buen sellado y mucho menos tiene certificado de calidad.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TECNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Componente Técnico: Registre aquí el consolidado del avance de la validación y verificación del alcance inicial de cada vivienda por proyecto.

COMPONENTE TECNICO ARBORIZADORA ALTA

DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE OBRA SE TIENE QUE ESTAR INTERVINIENDO 18 VIVENDAS,SIN EMBARGO A LA FECHA SOLO SE VIENE EJECUTANDO 12 CASAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA.

EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL PRIMER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 1 MES.

EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL SEGUNDO GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 22 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 25 DIAS. EL CONTRATISTA DA INICIO A ESTE GRUPO EL DIA 17 DE AGOSTO.

EJECUCION DE ACTIVIDADES EN VIVIENDAS DEL TERCER GRUPO: FECHA PROGRAMADA DE INICIO 28 DE AGOSTO - FECHA DE TERMINACION 15 DE SEPTIEMBRE)DURACION 19 DIAS. EL CONTRATISTA A LA FECHA NO HA DADO INICIO A LAS SEIS(6) VIVIENDAS DEL GRUPO COMO SE

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA
JUAN PABLO II
FECHA: 28/02/2021
MV_ 3670 ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS : Se realizo entrega de vivienda el dia 23/02/2021
MV_ 2620 MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA : Se realizo aplicación de pinturas en sala , se instalo baldosa en sala donde se evidencian dilataciones de asta 5 mm , se evidencia una mala instalación de baldosa en general , se evidencio pañete fisurado , cielo razo no se encuentra a nivel , se evidencia desnivel de 3 cm , instalación de bocapuertas en sala mal instaladas , varias baldosas huecas y hundidas , se recomendo al contratista tomar las medidas pertienentes para subsanar esta observaciones
MV_ 2682 LEONOR MORENO MENDEZ : Se realizo entrega de vivienda el dia 23/02/2021
MV_ 4687 SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ: A la fecha el contratista no ha remitido informe del presupuesto final sustentando valor adicional para actividades ejecutadas en la vivienda
MV_ 3668 ROSALBA PAEZ VASQUEZ : Se realizo entrega de vivienda el dia 23/02/2021
MV_ 4707 MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO : Se realizo placa de contrapiso en patio , instalación de baldosa en patio y habitación , instalación de enchape pared en cocina y baño
MV_ 4293 FLOR EDITH ERAZO : Se realizo visita tecnica donde se evidenciaron las siguientes observaciones : mala instalación de enchape pared en cocina , aplicación de boquilla en general , cambio de laminas de pvc , cambio de tuberia sanitaria en baño (lavamanos) , remates contra pared en patio , instalación de enchape pared en patio (lavadero) , mala instalación de baldosa en sala , mala instalación de cielo razo en habitación y baño
MV_ 4269EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA : Se realizo instalación de baldosa en pisos de hall y cocina , instalción de enchape pared en cocina
MV_ 3175 AMANDA FLORIAN : Se realizo alistado de pisos en sala , intalación de baldosa en patio
MV_ 3209 MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO : Continuan con la instalación de baldosa piso en hall y habitaciones, construcción de meson en cocina , instalación de enchape pared en cocina , aplicación de pinturas en general
MV_ 3195 YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO : Se realizo desmonte de cubierta , demolición de muro en baño , instalación de cubierta , lavantamiento de mamposteria en baño y culatas
MV_ 3348 JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ : Se realizo instalción de tuberia sanitaria en baño y patio , alistado de pisos , construcción de meson en cocina , instalción de cielo razo en habiatciones
MV_ 3349 LUCILA BALLESTEROS SOLANO : Se realizo instalación de baldosas en habitaciones y sala
MV_ 3212 HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA : Se realizo aplicación de pañetes en habitacion y cocina
MV_ 3361 OMAR CUBILLOS : Se realizo instalción de tuberia aguas lluvias , desmonte de cubierta en habitación , instalación de enchape pared en cocina , demolición de enchape paed existente en baño
MV_ 3363 MIRIAN OSORIO RAMÍREZOMAR CUBILLOS : Se realizo instalación de baldosa en habitación 1, alistado de pisos en patio y habitación 2 , instalación de tuberia sanitaria en baño , instalación de enchape pared en baño
MV_ 4131 NELLY AVILA SANTOS : Se realizo instalación de baldosa en habitación y hall , aplicación de estuco acrilico en hall y habitaciones

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ARBORIZADORA ALTA

Barrio o Territorio: JUAN PABLO II , CIUDAD BOLIVAR

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3837



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se realiza enchape en hall entrada principal.



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se inicia enchape en muro de cocina.



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se realiza enchape de piso en habitación 2 y pintura.



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Continuación de enchape de baño.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3835



FECHA: 22-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza la actividad de pintura en habitación , sala.



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se realiza enchape en muros de cocina ,piso, en meson se hace la observación de la correción de los lineales (enchape)



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se realiza enchape en zona de hall 2 acceso a (baño, cocina, habitación, sala)



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se inicia la instalación de sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3867



FECHA: 22-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se inicia pintura en habitación 1



FECHA: 22-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se continuo pañete en muros en sala.



FECHA: 22-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: continuación de pañete en muros zona de patio, lavanderia



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se continua con la construcción de meson.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3830



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se intervino zona de cocina enchape en muros, piso,construcción de meson, pintura.



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: se intervino habitación 1, 2 , 3, hall 1, 2, acceso principal a las habitaciones, cocina, baño.



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se intervino la zona de baño, lavanderia.



FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega del MVCB_3830 a la beneficiariaClaudia Mireya Esperanza Cabrera.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2350



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza adecuacion de puntos hidrosanitarios.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de meson de cocina, pañete y enchape de piso.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza adecuacion de puntos hidrosanitarios.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de meson de cocina, pañete y enchape de piso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCB_2288



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza intervencion en la cocina.(Construccion de meson, instalacion de enchape de piso, pared y meson y aplicación de pintura)



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza intervencion en baño. (Instalacion de enchape de piso y pared en la zona de la cabina, preparacion de muros y aplicación de pintura, instalacion de combo sanitario)



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza intervencion en zona de lavado. (Instalacion de enchape de piso y pared, Instalacion de combo sanitario)



FECHA: 26-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiario la cual recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2270



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape. Se realiza aplicación de boquilla.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de enchape de piso y pared en cocina.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de enchape de muro e instalacion de lavadero.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura en habitaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3052





FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion, alistado e instalacion de enchape de piso en habitaciones y hall.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3039



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza toma de niveles, maestras para realizar alistado de piso. Preparacion de muros para instalacion de enchape.



FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion de muros para instalacion de enchape y se inicia con alistado en cocina.





FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion, alistado e instalacion de enchape de piso en habitaciones y sala

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3043





FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de estuco en habitaciones y hall.





FECHA: 23-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de mochetas y se funde meson de cocina.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DERECHO DE PETICIÓN - MVCA_3842









FECHA: 24-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza vista de derecho de Petición.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACIÓN - MVTB_4354



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza visita de validación .



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zona a intervenir Cocina.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zona a intervenir Habitación 1, 2, Hall.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: : Zona a intervenir Cocina , Baño.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACIÓN - MVTB_3843



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realizo visita de Validación.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir habitación 1, 2.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir Cocina, Baño, Hall.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zona a intervenir sala y zona de ropa.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACIÓN - MVTB_0568



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realizo visita de Validación.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir habitaciín 1, 2, hall.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zona a intervenir Cocina.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir Hall, Sala, Habitación 3,4.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACIÓN - MV_0022



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza vista de Validación.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir Habitación 1 ,2, Baño.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zonas a intervenir Sala, Habitación 3, Zona de ropas.



FECHA: 25-FEB-2021

DESCRIPCIÓN: Zona a intervenir Cocina.

c. Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

Se presenta una preocupación en las viviendas en ejecución pues los materiales por calidad, tenemos inconvenientes con los agregados y el pegacor que se están utilizando para intervenir las viviendas.

d. Soluciones adoptadas

La interventoría, en sus funciones contractuales, mediante oficios se le informa y solicita al contratista que los materiales y las obras deben cumplir con los estándares de calidad de las especificaciones técnicas, y que deben hacer llegar a la interventoría todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto

e. Recomendaciones pertinentes

Se genera recomendaciones para dar continuidad a las adecuaciones de cada una de las viviendas dejando registro de modificaciones, cambios o ajustes que posteriormente puedan generar alguna queja o reclamo. De igual manera, se deja registro de las solicitudes en relación con actividades y materiales utilizados en la ejecución del proyecto.
Oficios de solicitud: INP- SDHT-G2- 2020- 008, INP- SDHT-G2- 2020- 019, INP- SDHT-G2- 2020- 022, INP- SDHT-G2- 2020- 034, INP- SDHT-G2- 2020- 049, INP- SDHT-G2- 2020- 050

f. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.

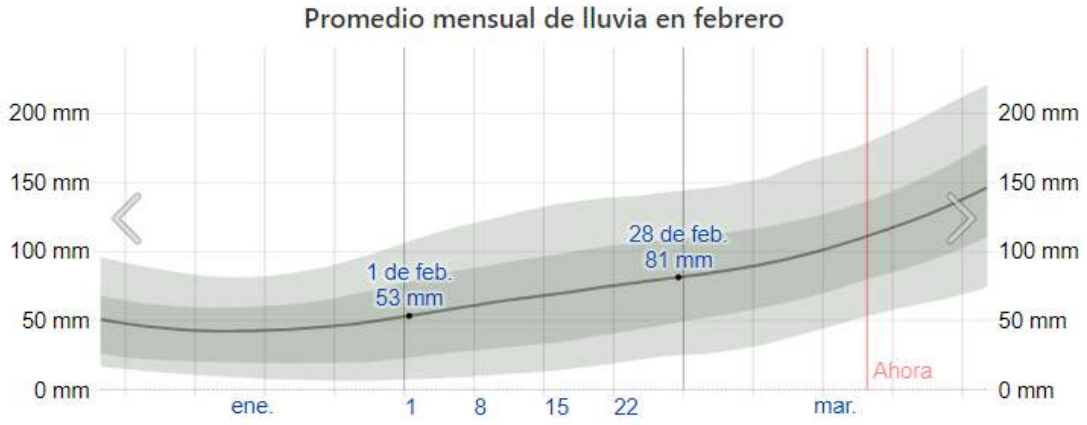
Se realiza exposición en los puntos anteriores.

g. Estado del tiempo mes de FEBRERO DE 2021

Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo móvil de 31 días centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante 31 días móviles en febrero en Aeropuerto El Dorado **aumenta rápidamente**, comenzando el mes con **53 milímetros**, cuando rara vez excede **108 milímetros** o es menos de **7 milímetros**, y terminando el mes con **81 milímetros**, cuando rara vez excede **144 milímetros** o es menos de **25 milímetros**.



La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo móvil de 31 días centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La línea delgada punteada es el equivalente de nieve en líquido promedio correspondiente.

Fuente: weatherspark.com/m/147155/2/Tiempo-promedio-en-febrero-en-Aeropuerto-El-Dorado-Colombia

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

Para el mes del presente informe no se registran situaciones de incumplimiento por parte del contratista.

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

- VER ANEXO OBRA (1)
- VER ANEXO INTERVENTORÍA (2)

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)

ANEXO DE OBRA (1)

ANEXO INTERVENTORÍA (2)

SE ANEXA CD CON INFORMACIÓN

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

i. Pólizas

DATOS GENERALES

No. De póliza: NB–100141335
No. De Certificado: 70934191
Fecha de Expedición: 12/11/2020

TOMADOR	UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020	No. DOC. IDENTIDAD	901.421.989–3
DIRECCIÓN	CLL 12 A # 68 C – 03	TELÉFONO	7430070
ASEGURADO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061–9
DIRECCIÓN	CLL 52 N° 13–64 PISO 12	TELÉFONO	3649400
BENEFICIARIO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061–9
DIRECCIÓN	CLL 52 N° 13–64 PISO 12	TELÉFONO	3649400

OBJETO DEL CONTRATO

ASEGURADORA

Compañía Mundial de seguros S. A

CUMPLIMIENTO

VIGENCIA DESDE: 00:00 Horas del 04/11/2020
VIGENCIA HASTA: 24:00 Horas del 04/10/2021
SUMA ASEGURADA: 745,708,650.40

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

VIGENCIA DESDE: 00:00 Horas del 04/11/2020
VIGENCIA HASTA: 24:00 Horas del 04/10/2021

SUMA ASEGURADA: 1,118,562,975.60

PRESTACIONES SOCIALES

VIGENCIA DESDE: 00:00 Horas del 04/11/2020
VIGENCIA HASTA: 24:00 Horas del 04/10/2024
SUMA ASEGURADA: 186,427,162.60

ESTABILIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE: 00:00 Horas del 04/04/2021
VIGENCIA HASTA: 24:00 Horas del 04/04/2022
SUMA ASEGURADA: 745,708,650.40

4. ASPECTOS SOCIALES

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL
Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra. **Fase de validación y apropiación:**
4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLÍVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
RENUNCIAS
10/02/2021 MVCB_4836 VICTOR JULIO POTILLA El día 10 de febrero se atiende a visita programada con anterioridad, con apoyo de SDHT y dirección de obra y de interventoría, para determinar el estado actual de la vivienda, donde el propietario y beneficiario de la vivienda indica no tener las llaves de la vivienda para poder ingresar; de igual manera se le explica al beneficiario los tiempos que tenía para la adecuación de la vivienda, en el cual el señor Víctor Julio Portilla indica que no cuenta con el dinero para dichas adecuaciones que se necesitan para ejecutar el mejoramiento de vivienda, por tal motivo el beneficiario RENUNCIA VOLUNTARIAMNETE al subsidio otorgado a nombre propio, deseando poder postularse para nuevos proyectos de mejoramientos de vivienda asignados por SDHT.
La beneficiaria remite derecho de peticion "Con respecto al as visitas realizadas por el contratistas de obra para la ejecución de mi subsidio, se me ha manifestado por parte de ellos que las obras que se van a realizar no son acordes con lo estipulado en el expediente entregado por la caja de vivienda popular y que por ley y mandato de la alcaldesa deben ser inferior, esto resulta perjudicial a favor mío por que la ejecución y el derecho que tengo de acceder al valor del subsidio será menor a lo que por ley está estipulado y de lo que está presupuestado por la caja de vivienda popular, esto resulta menos obra ejecutada y menor beneficio para mí y mi familia, solicito atentamente se

respete el presupuesto de obra y se ejecuten las obras acorde a lo manifestado en el expediente por la caja de vivienda popular a la SDHT."
PQRS
MVCB_ 4863 EULINE CARDENAS RUIZ Se realiza visita de seguimiento para hacer la entrega satisfacción del mejoramiento de vivienda asignado; a la vez para evidenciar que las inconformidades expuestas en el PQRS quedaran subsanadas, se procede a dar cierre al PQRS establecido por la beneficiaria.
USAQUEN
BARRIO O TERRITORIO: Buenavista – Cerros del norte – Urbanización santa Cecilia
RENUNCIAS
23/02/2021 Visita de revalidación MVCE_1995 Jairo Alberto Garzón Ríos. Casa 20. Zona E. Beneficiario renunció al subsidio por inconformidad con mano de obra y los materiales a utilizar, argumentando que él y sus hijos saben de construcción y prefieren arreglar su casa a su gusto.
PQRS
No se presentaron en el transcurso de la semana
SANTA FE
BARRIO O TERRITORIO: Laches – El consuelo
RENUNCIAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PQRS
24/02/2021 Visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.

SUBA
BARRIO O TERRITORIO: Bilbao segundo sector
RENUNCIAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PQRS
No se presentaron en el transcurso de la semana
RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO O TERRITORIO: Las lomas – El mirador sur – Puerto rico
RENUNCIAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PQRS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PAC
El jueves 04/02/2021; Se atendieron a algunos beneficiarios para preguntar cómo acceder a los subsidios y la dirección de la Secretaria de Hábitat y de la caja de vivienda popular. El sábado 05/02/2021; Se atendió la beneficiaria del MVCB_4687 Sixta Tulia Martínez, indicando que tiene dudas con respecto a los precios y la ejecución del presupuesto; por tal motivo solicita una visita por parte del área técnica, para que le sea aclaradas las actividades y los costos de ejecución.
HISTORIAS DE VIDA
MVCB-3242, Jose Melecio León. Familia de tipología extensa, conformada por la pareja, dos hijas y un nieto; oriundos del departamento de Cundinamarca, el beneficiario ha sacado adelante a su familia a través de la empleabilidad. Llegó a Bogotá hace más de 30 años, en busca de mejorar la calidad de vida, ya que las oportunidades en su lugar de origen eran mínimas. Aportó en la transformación del barrio, a través del trabajo comunitario y barrial que se realizaba en la época, recuerda con agrado y nostalgia las situaciones que han pasado a través de los años, así como los cambios de la familia y el

entorno. Expresa abiertamente agradecimiento por la oportunidad y se siente bendecido por el apoyo.
MVCB-2842, Guillermina Hernandez Gordillo. Familia de tipología extensa, conformada por la pareja, hija y nieto; oriundos del departamento del Tolima, la beneficiaria ha sacado adelante a su familia a través del oficio de la costura y la elaboración de helados caseros. Llegó a Bogotá hace más de 35 años, en busca de mejorar la calidad de vida con los progenitores, durante el ejercicio recuerda como su padre construyo la vivienda bajo las premisas, cultura y arte de la construcción de la época y del municipio de San Luis. Aportó en la transformación del barrio, a través del trabajo comunitario y barrial, recuerda con agrado y nostalgia las situaciones que han pasado a través de los años, así como los cambios de la familia y el entorno. Expresa abiertamente agradecimiento por la oportunidad y se siente bendecido por el apoyo.
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
08/02/2021 MVCB_4629 Jorge Andrés Jímenez, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, de igual manera las actividades que se ejecutaran en la vivienda, solicita que nuevamente le expliquen las actividades de la cubierta, se realiza un compromiso de habilitar espacios para ingreso de material, debido a que aún no ha habilitado los espacios. Para el 09/02/2021, aun no ha habilitado los espacios. Para el 10/02/2021, Con el acompañamiento de la coordinación social de la Secretaria del hábitat, director de interventoría, y área Social y Técnica de interventoría y contratista, visitan la vivienda para verificar los espacios, sin embargo, no se permite el ingreso a una de las habitaciones para verificar medidas, el beneficiario se compromete a habilitar espacios de la vivienda para el día jueves 11 de febrero. Para el 11/02/2021, se acerca personal de obra, Área técnica, social de interventoría y contratista, para poder ingresar a la vivienda, sin embargo, aún no están habilitados los espacios. Según compromiso el día 10 de febrero con secretaria de Hábitat. nuevamente se realiza un acta, pero el beneficiario se niega a firmarla. para el 12/02/2021 Se realiza un informe técnico social describiendo cada una de las visitas realizadas al predio. enviado al Director de la Interventoría.
MVCB_4847- ALFER YESID CASTAÑEDA El día 26 de febrero 2021; se realiza vista de obra técnica y social por parte del contratista e interventoría, para solicitar al beneficiario que dejara la reactivación de las obras, teniendo en cuenta que se no se generaron los compromisos pactados en ocasiones anteriormente establecidos. En el cual en esta visita el beneficiario indica que no se desea continuar con la obra debido a solo los reprocesos que se han presentado y por la falta de profesionalismo tanto del contratista de obra como de la interventoría en relación al no cumplimiento de los compromisos establecidos. Por tal razón el señor ALFER YESID CASTAÑEDA como beneficiario del subsidio indica que no dejara ingresar más personal de obra ni de profesionales de contratista e interventoría y que no dejara termina con la ejecución de la obra hasta que ejerza su derecho de imponer una tutela o en su defecto que se realicé una reunión directamente con personal de la Secretaria de Hábitat, de Personería, Contraloría, y Veeduría Ciudadana.

RENUNCIAS

MVCB_1947	KR 19 BIS 68C 30 SUR	FERMIN AVILA	
MVCB_3512	TV 18P 69A 39 SUR	ERNESTINA DEFELIPE GARCIA	EDWIN
MVCB_3588	TV 18N BIS A 69 A 79 SUR	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL	MAURICIO
MVCB_3452	DG 69 SUR 18N 55	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ	MILLER
MVCB_4684	KR 18N BIS B 67C 59 SUR	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA	MILLER
MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74 - PLAN TERRAZAS	EVELIA MUÑOZ	CAMILA
MVCB_2302	CL 67D SUR 18U 73	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO	CAMILA
MVCB_4836	CL 67C SUR 18U 17 MJ	VICTOR JULIO PORTILLA	DIANA
MVCE_1995	KR 2 ESTE 161 28	JAIRO ALBERTO GARZÓN RIOS	CAMILA

b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

- VER ANEXO INFORME SOCIAL (4)

c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

- VER ANEXO INFORME SOCIAL (5)

ANEXO INFORME SOCIAL (4)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	4/03/2021	**PERIODO No.**	4	DEL	**1/02/2021**	AL	**2/03/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventorías técnica, jurídica, social, administrativa y financiera, para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la secretaría distrital de hábitat.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 2, la ejecución de 253 mejoramientos de vivienda, localizados en 5 localidades: Usaquén, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Suba, Santafé y Ciudad Bolívar, esta última incluye una (1) Intervención de Mejoramiento Integral.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	701-2020	CONTRATO No.:	695--2020
PLAZO INICIAL:	6 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	4 de noviembre de 2020
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de abril 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 894.285.952,00	VALOR INICIAL :	$ 3.728.543.252,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -IMPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	4/11/2020	3/04/2021	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$0,00	#¡DIV/0!	
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$0,00	#¡DIV/0!	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
VALIDACIONES REALIZADAS
2/2/ 2021, MVCB- 3372, Yeimy Ines Ramirez Gonzalez. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
2/2/ 2021, MVCB- 3242, José Melecio León. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
2/2/ 2021, MVCB- 2842, Guillermina Hernandez Gordillo. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
3/2/ 2021, MVCB- 2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
3/2/ 2021, MVCB- 3217, Maria Fanny Vergara Arenas. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
05/02/2021 MVCB_3157 Edilma Poveda Hernandez, se realiza la respectiva validación y caracterización por parte del área social
9/2/ 2021, MVCB- 3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza validación del predio, se realiza proceso tecnico de vefiricacion, planos y medición de espacios.
16/02/2021 MVCB_ 4743 Bertilda Cañon, Visita de validación y se realiza caracterización
16/02/2021 MVCB_ 4137 Pedro Antonio Pineda, Visita de validación y se realiza caracterización
17/02/2021 MVCB_ 4733 Aura María Cuesta Rojas, Visita de validación y se realiza caracterización
17/02/2021 MVCB_4796 Olga Guzman, Visita de validación y se realiza caracterización
17/02/2021 MVCB_ 4758 Pedro Antonio Castro, Visita de validación y se realiza caracterización
18/02/2021 MVCB_ 4735 María Alcira Beltrán, Visita de validación y se realiza caracterización
18/02/2021 MVCB_4792 Luz Marina Mendivelso, Visita de validación y se realiza caracterización
18/02/2021 MVCB_4790 Mireya Melo Vasquez, Visita de validación y se realiza caracterización
18/02/21 MVCB_4806 Luz Angela Herrera, Visita de validación y se realiza caracterización
19/02/2021 MVCB_4799 Alicia Sanchez, Visita de validación y se realiza caracterización
22/2/2021, MVCB_3539 Marta Isabell Becerra Merida, se realiza visita de caracterización, no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica.
24/2/2021, MVCB_2753 Edna Mariza Garzon Tirado, se realiza visita de caracterización, no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica.
24/2/2021, MVCB_2756 Flora Maria Ibañes Correa, se realiza visita de caracterización, no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica.
24/2/2021, MVCB_3144 Jackeline Gonzalez Arevalo, se realiza visita de caracterización, no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica.
25/2/2021, MVCB_3405 Elena Villalobos Aponte, se realiza visita de caracterización, no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica.

APERTURAS
01/02/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Apertura de obra. Donde se ingreso material a la vivienda, se le presento los maestros de obra y se inicio la bitácora con la nota de inicio.
02/02/2021 MVCB_0979 Bernardo Corredor. Apertura de obra. Donde se ingreso material a la vivienda, se le presento los maestros de obra y se inicio la bitácora con la nota de inicio.
02/02/2021 MVCB_2167 Maria Betsabe Cortes Rodríguez. Apertura de obra. Donde se ingreso material a la vivienda, se le presento los maestros de obra y se inicio la bitácora con la nota de inicio.
02/02/2021 MVCB_2275 Jose Hernando Segura, Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
02/02/2021 MVCB_2270 Nubia Gallego Ciro Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
02/02/2021 MVCB_2346 Isidro Bonilla Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
02/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. Apertura de obra: se registró en la bitácora la nota de inicio de intervención de obra en la vivienda. Previamente, el Contratista llevó el material al predio para dicha intervención, así mismo se presentaron los maestros que intervendran obra en el predio.
3/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
3/2/ 2021, MVCB- 2310, Serafina Hernandez. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
04/02/2021 MVCB_2238 Diana Marcela Ticora Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
04/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Apertura de obra: se registró en la bitácora la nota de inicio de intervención de obra en la vivienda. Previamente, el Contratista llevó el material al predio para dicha intervención.
04/02/2021 MVCB_3366 Luz Stella López Florez, se socializa a la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, de igual menera las actividades que se ejecutaran en la vivienda.
05/02/2021 MVCB_4707 María Eladia Giraldo, se socializa a la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, de igual menera las actividades que se ejecutaran en la vivienda.
5/2/ 2021, MVCB- 3242, José Melecio León. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
5/2/ 2021, MVCB- 2243, Elias Barriga Morenoa. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
5/2/ 2021, MVCB- 3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
08/02/2021 MVCB_3209 Martha Isabel Gamboa , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales
8/02/2021, MVCB_2350 Carlos Alfonso Sanchez Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
9/2/ 2021, MVCB- 3233, Saul Jimenez. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
9/02/2021 MVCB_3052 Gentil Calderon Calderon Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la hija del beneficiario las labores a realizar.
9/02/2021 MVCB_2377 Amparo Mendez Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.

9/02/2021 MVCB_2358 Rosalbina Leon Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
9/02/2021 MVCB_3039 Flor Alicia Loaiza Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
9/02/2021 MVCB_4860 Rufina Mena Murillo se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
9/02/2021 MVCB_3043 Maria Helena Castellanos se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
11/2/ 2021, MVCB- 3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
12/2/ 2021, MVCB- 2336, Jorge Hernando Parra Rincon. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
12/2/ 2021, MVCB- 3134, Rubi Stella Forero. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
15/02/2021 MVCB_3175 Amanda Florian , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
15/02/2021 MVCB_3363 Mirian Osorio , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
15/02/2021 MVCB_3211 María Inés Lizarazo , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
16/2/ 2021, MVCB-3372, Yeimmy Ines Ramirez Grisales. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
16/2/ 2021, MVCB- 3217, Maria Fany Vergara Arenas. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
16/2/ 2021, MVCB-2864, Mirian Peñuela Gomez. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
17/02/2021 MVCB_ 3348 Jhon Jimmy Daza, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
18/02/2021 MVCB_ 3349 Lucila Ballesteros, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
19/02/2021 MVCB_ 3361 Omar Cubillos, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
19/02/2021 MVCB_ 4131 Nelly Avila Santos, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
19/02/2021 MVCB_3212 Helberth Arturo Solorza , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
19/02/2021 MVCB_3195 Jazmin Triana, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
19/02/2021 MVCB 3875 Rosalbina Gil De soler. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica al beneficiario las labores a realizar.
22/2/ 2021, MVCB-3539, Marta Isabell Becerra Merida. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
23/2/ 2021, MVCB-2842, Guillermina Hernandez Gordillo. Se realiza apertura a las labores de obra del predio, se realiza entrega de bitacora y se explica a la beneficiaria las labores a realizar.
23/02/2021 MVCB_3157 Edilma María Poveda , se socializa a la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
25/02/2021 MVCB_4743 Bertilda Cañon , se socializa a la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
25/02/2021 MVCB_4733 Aurora Cuesta , se socializa al la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
25/02/2021 MVCB_4758 Pedro Antonio Castro , se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC

25/02/2021 MVCB_4735 María Alcira Beltrán , se socializa al la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
25/02/2021 MVCB_4273 María Malen Hernandez , se socializa al la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
26/02/2021 MVCB_2373 Matha Cecilia Arrias, se socializa al la beneficiaria actas de inicio y actas sociales, se le brinda información de la función de la bitácora y atención en el PAC
APERTURAS FALLIDAS
03/02/2021 MVCB_4629 Jorge Andés Jimenez, se realiza acompañamiento al área técnica y social del contratista para apertura de vivienda, sin embaargo el beneficiario manifiesta que no es posible realizarla, debido a que tenía una calamidad domestica.
08/02/2021 MVCB_4629 Jorge Andrés Jímenez, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, de igual menera las actividades que se ejecutaran en la vivienda, solicita que nuevamente le expliquen las actividades de la cubierta, se realiza un compromiso de habilitar espacios para ingreso de material, debido a que aún no ha habilitado los espacios. (No firma actas de presupuesto)
SEGUIMIENTOS SOCIALES
01/02/2021 MVCB-4630 María Felisa Cruz casa 54 zona B, se realiza visita de seguimiento, no está presente mano de obra en la vivienda.
01/02/2021 MVCB_4871 Carmelina Arcila Casa 4 - Zona C, Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presentan novedades por parte social. Vivienda próxima a entregar.
01/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
01/02/2021 MVCB-3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria no se encuentra en vivienda, pero señora madre manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
01/02/2021 MVCB-3838 María de Jesús Gonzalez casa 12 Zona C Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, beneficiaria manifiesta inquietud acerca de elemento estructural preexistente en esquina de habitación, que recubre tubo de baño, esperando fuera nivelado con el piso, pero se le reitera la explicación que el proyecto trabaja sobre la estructura existente.
01/02/2021 MVCB_4637 Ines Aurora Acero, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de montura de puerta del baño y terminación de acabados, sin novedades
01/02/2021 MVCB_4629 Jorge Andés Jimenez, se realiza acompañamiento al área técnica de la interventoria a respectiva vivienda donde el beneficiario, sin embargo, no se permitió el ingreso.
01/02/2021 MVCB_4684, Carta de renuncia del señor Antonio Pulido
1/2/ 2021, MVCB- 3605, Etelvina Lopez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica realiza seguimiento, atendiendo a compromiso realizado en visita de Secretaria Distrital del Hábitat, interventor técnico toma medidas y revisa con el familiar de la beneficiaria cada una de las actividades desarrolladas
1/2/ 2021, MVCB- 3654, Mariela Aguilar Quintero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
1/2/ 2021, MVCB- 3653, Maria del Carmen Salvador Garavito. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
1/2/ 2021, MVCB- 3443, Julio Cesar León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
01/02/2021 MVCB_2743 María del Carmen Moreno, autorizado Jairo Puentes. Visita de seguimiento de obra. Pañete en habitación, autorizado no refiere ninguna inconformidad.
01/02/2021 MVCB_3509 Marleny Mondragón. Visita de seguimiento de obra. Subsanar llaves de cocina y baño grifería, piezas cocas para poder realizar la entrega, sin embargo tener en cuenta que el esposo de la beneficiaria solicita mas arreglos de los pactados, se les explico que no es una remodelación sino un mejoramiento.
01/02/2021 MVCB_0974 María Angélica Aviña. Autorizado Segundo Granados. Seguimiento de obra. Pañetes y sobrepiso, no refieren ninguna inconformidad.
01/02/2021 MVCB_0833 José Gilberto Pineda López. Seguimiento de obra. Pañete en paredes y enchape en cocina. Se resolvieron dudas del beneficiraio frente a temas tecnicos.
01/02/2021 MVCB_0749 Maria del Transito Rivera Rodriguez. Visita de seguimiento de obra. Sobrepiso y demolicion de cocina. Beneficiaria no refiere ninguna inconformidad.
01/02/2021 MVCB-3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se verifica que no se ha iniciado la intervención, no se evidencia mano de obra en vivienda.
02/02/2021 MVCB-3838 María de Jesús Gonzalez casa 12 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
02/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de baño y zona de lavado.
2/2/ 2021, MVCB- 3167, Aura Rosa Gomez de Bedoya. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

2/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
2/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
02/02/2021 MVCB-3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se verifica avances en enchape de piso de pasillo y zona de lavado.
02/02/2021 MVCB_3446 Ana Manso, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en cocina y baño, sin novedades.
02/02/2021 MVCB_3450 Abad López se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en cocina, se le aclara al beneficiario información referente al presupuesto.
02/02/2021 MVCB_3446 Ana Manso, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en cocina y baño, sin novedades.
02/02/2021 MVCB_4696 Luis Albarracín, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en pisos en pisos de habitación N. 2, el área técnica toma respectivas medidas, sin novedades
02/02/2021 MVCB_4695 Vitelvina Montes, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se evidencia todas las actividades realizadas, el área técnica toma respectivas medidas, sin novedades
02/02/2021 MVCB-3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. HIjo de beneficiaria (quien fue autorizado por escrito para estar pendiente en su vivienda) manifiesta estar conforme con labores de obra adelantadas hasta el momento en su vivienda, se observan avances en enchape de piso de sala.
02/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, sin novedad en el área social.
02/02/2021 MV_3838 María de Jesús Gonzalez Casa 12 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, se observan avances en enchape de piso de sala. Beneficiaria manifiesta estar conforme con labores de obra adelantadas hasta el momento en su vivienda.
02/02/2021 1 MV_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C.Se hace acompañamiento del área social al área técnica, se verifica inicio de labores de cambio de cubierta, las cuales se solicitaron suspender desde la Interventoría porque el personal no contaba con los elementos de protección personal ni elementos de protección contra caídas
02/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de demolición en baño.
03/02/2021 MVCB_3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio se observan avances en enchape de toda la zona de lavado y estuco en habitación
03/02/2021 MVCB_3838 María de Jesús Gonzalez Casa 12 Zona C Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio beneficiaría reitera inquietud sobre elemento en concreto que recubre tubería y enchape de cocina, por lo que área técnica reitera aclaración de condiciones del proyecto de mejoramiento, se registra en bitácora y beneficiaria firma a conformidad.
03/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio. Área técnica da indicaciones precisas a maestro de obra para labores de demolición.
03/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio, beneficiario no se encuentra presente, esposa manifiesta estar conforme con actividades de obra adelantada hasta el momento en su vivienda.
03/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio. HIjo de beneficiaria (quien fue autorizado por escrito para estar pendiente en su vivienda) manifiesta estar conforme con labores de obra adelantadas hasta el momento en su vivienda.
03/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio, beneficiaria no se encuentra en predio, espacio deshabitado mientras labores de obra.
03/02/2021 MVCB_3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C . Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría y Directora de obra del Contratista en seguimiento al predio, sin novedad en aspecto social
03/02/2021 MVCB_4679 Sain Fajardo, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en pisos en pisos de habitación, cocina y sala, enchape de cocina, beneficiario conforme con actividades.
03/02/2021 MVCB_4680 Misael Leon, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en habitación, inicio de enchape en baño en habitación, cocina se funde meson, paredes pañetadas.
03/02/2021 MVCB_4681 Ana Rosa Cruz, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de intalación de PVC, hall y cocina, enchape de piso de patio, hall, cocina y habitación N. 1
03/02/2021 MVCB_4687 Sixta Martinez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades completas ecepto (lavadero), sin embargo, el área técnica del contratista verifica baldosas para cambio, solicitando al subcontratista
03/02/2021 MVCB_2620 Manuel Mosquera, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en cocina y baño

03/02/2021 MVCB_2686 Jairo Pulido, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en piso de cocina, hall baño y habitación N. 1, N. 2, baño y cocina, sin novedades sociales.
3/2/ 2021, MVCB- 3443, Julio Cesar Leon. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
03/02/2021 MVCB_3668 Rosalba Paez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape pisos de habitaciones N. 1, N. 2 y N.3, baño y patio
03/02/2021 MVCB_2743 María del Carmen Moreno, autorizado Jairo Puentes. Visita de seguimiento de obra, donde se evidencia continuidad de pañetes y pisos.
03/02/2021 MVCB_0833 José Gilberto Pineda López. Seguimiento de obra. Se evidencia demolición de baño y enchape de cocina.
03/02/2021 MVCB_0749 Maria del Transito Rivera Rodriguez. Visita de seguimiento de obra. Se evidencia enchape de pisos y pañete de baño.
03/02/2021 MVCB_0974 María Angélica Aviña. Autorizado Segundo Granados. Seguimiento de obra. Se evidencia pañete de paredes, sobrepisos. Se resuelven dudas con beneficiarios a la entrada de personas al predio.
03/02/2021 MVCB_0970 Maria Helena Ramirez. Autorizado Eliberto Guerrero. Seguimiento de obra. Falta detalle para acabado de obra y entrega de la vivienda. Beneficiarios estan contentos con el mejoramiento.
03/02/2021 MVCB_0940 Maria Delfina Correa. Visita de seguimiento de obra. Donde se evidencia cubierta de cocina y pintura en paredes.
03/02/2021 MVCB_0923 Octavio Osorio. Autorizada Luz Amparo Osorio. Visita de Seguimiento de obra. Se evidencia pañetes en paredes, obra con demoras en vivienda.
03/02/2021 MVCB_0964 Carlos Arturo Camargo Muñoz. Visita de seguimiento de obra. Se evidencia pañete en cocina y enchapes en pisos.
03/02/2021 MVCB_0963 Julio Gentil Arroyo. Visita de seguimiento de obra. Se eviencia puesta de cielo raso, se resuelven dudas frente al mejoramiento.
03/02/2021 MVCB_1002 Ramón Calderón autorizada Leidy Calderón. Seguimiento de obra. Se evidencia sobrepisos en vivienda y se solucionaron dudas a la autorizada.
03/02/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Seguimiento de obra. Se evidencia sobrepisos, pañete y enchape de cocina, se resuelven dudas frente a meson de cocina a los trabajadores.
03/02/2021 MVCB_1948 Ana Paulina Garcia. Visita de seguimiento de obra. Se evidencia placa de meson y sobrepisos.
03/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B . Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, sin novedad en el área social.
04/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C . Se realiza visita de seguimiento al predio. HIjo de beneficiaria (quien fue autorizado por escrito para estar pendiente en su vivienda) dice que se encuentran conformes y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
04/02/2021 MVCB_3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C . Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria dice que se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.Se evidencian labores de enchape de piso en habitación
04/02/2021 MVCB_3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, se realiza visita de seguimiento al predio. Aspecto social sin novedad. Se evidencian avances en enchape de piso de pasillo de acceso a vivienda y en alistado de piso en habitaciones.
04/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria no se encuentra en predio, esposo dice que se encuentran conformes con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
4/2/ 2021, MVCB- 3605, Etelvina Lopez. Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado, sin embargo no se encuentra el familiar de la beneficiaria en el predio. Se indica a la beneficiaria que se pasara nuevamente el lunes 8 de febrero del año en curso.
4/2/ 2021, MVCB- 3167, Aura Rosa Gomez de Bedoya. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
4/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
4/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
4/2/ 2021, MVCB- 3443, Julio Cesar Leon. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
4/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
4/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

4/2/ 2021, Se realiza verificacion de atencion a la comunidad en PAC de 12:30 pm a 3:00 pm, se atendio a las solicitudes realizadas por algunos beneficiarios que se comunicaron telefonicamente
04/02/2021 MVCB_3509 Marleny Mondragón. Visita de seguimiento de obra. Donde se evidencia que ya estan solucionando las observaciones pendientes. Sin embargo se hizo una entrega parcial ya que los beneficiariarios ocuparon espacios intervenidos.
04/02/2021 MVCB_0979 Bernardo Corredor. Visita de seguimiento de obra. Se evidencia demolición de cocina y baño, se resuelven dudas en obra a los maestros.
04/02/2021 MVCB_ 4847 Alfer Jesid Castañeda Se realiza seguimiento social de obra, dando cumplimiento a los compromisos estipulados; se presenta el nuevo personal de obra y por ende las actividades a ejecutar.
04/02/2021 MVCB_ 2275 Jose Hernando Segura se realiza acompañamiento social, se evidencia avance de obra, sin novedad desde la parte social
04/02/2021 MVCB_ 2270 Nubia Gallego se realiza acompañamiento social, se evidencia avance de obra, sin novedad desde la parte socia
04/02/2021 MVCB_ 2346 Isidro Bonilla se realiza acompañamiento social, se evidencia avance de obra, sin novedad desde la parte socia
04/02/2021 MVCB_ 2347 Maria Dora Elizabeth Martinez Avance de obra, sin novedad desde la parte social
04/02/2021 MVCB_ 2288 Simona Torres se realiza acompañamiento social, se evidencia avance de obra, sin novedad desde la parte socia
04/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B . Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, beneficiaria manifiesta inquietud sobre borde de pared de entrada al baño y accesorios del baño, se comunica al área técnica para dar solución.
04/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario no se encuentra en predio, esposa comunica que beneficiario solicita no se demuela enchape de una pared de la cocina, se atiende solicitud y se registra en bitácora.
05/02/2021 MVCB_3838 María de Jesús Gonzalez Casa 12 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria no se encuentra en predio, esposo dice que se encuentran conformes con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de cocina y habitación de primer piso, así como en instalación de cielo razo en habitación y sala en segundo piso.
05/02/2021 MVCB_3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria no se encuentra en vivienda, pero señora madre manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en estuco de pared de baño y enchape de piso.
05/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, sin novedad en el área social.
05/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario no se encuentra en vivienda, pero señora esposa manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en demolición de mesón de cocina y enchape de baño.
05/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, sin novedad en el área social.
05/02/2021 MVCB_3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, sin novedad en el área social. Beneficiaria despejó el área de cocina para que se pueda iniciar intervención de obra
05/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, sin novedad en el área social.
05/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. No se encuentra mano de obra en el predio, por lo tanto no se han iniciado labores de obra.
05/02/2021 MVCB_3366 Luz Stella López Florez, se realiza seguimiento a respectiva vivienda por solicitud del señor Hugo, esposo de la beneficiaria, quien manifesto renunciar a algunas activiidades comtempladas en las actas de inicio, sin embargo, la beneficiaria manifiesta que esta conforme y de acuerdo con lo que se ejecutará en la viivenda. Se registra dicha visita en bitacora.
05/02/2021 MVCB_2682 Leonor Moreno, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape de piso de habitación N.2
05/02/2021 MVCB_2620 Manuel Mosquera, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape de hall y enchape de cocina no se presenta novedades sociales
05/02/2021 MVCB_4269 Emma Zulinda Ordoñez, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de pañete en paredes de habitación N.4 y baño provado, no se presenta novedades sociales
05/02/2021 MVCB_4293 Flor Erazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de demolición de pisos existentes , inicio de enchape en cocina, retiro de lavadora, se atiende inquietudes por parte de la beneficiaria, no se presenta novedades sociales
5/2/ 2021, MVCB- 3167, Aura Rosa Gomez de Bedoya. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

5/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
5/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
5/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
5/2/ 2021, MVCB- 3223, Luz Maria Ariza Roncancio. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
08/02/2021 MVCB_4687 Sixta Martinez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, se evidencia la montura de lavadero, el cual estaba pendiente, el área técnica de la interventoría toma respectivas medidas.
08/02/2021 MVCB_4696 Luis Albarracín, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, el área técnica de la interventoría toma respectivas medidas.
08/02/2021 MVCB_4679 Sain Fajardo, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de pintura en habitaciones
08/02/2021 MVCB-4630 María Felisa Cruz casa 54 zona B, se realiza visita de seguimiento, beneficiaria se encuentra conforme con las labores adelantadas hasta el momento en su vivienda.
08/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. No se encuentra mano de obra en el predio, por lo tanto no se han iniciado labores de obra.
08/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Presenta inquietud acerca de adecuación de canal de lluvia, porque teme se entre el agua en dado caso que llueva, se transmite el mensaje al área técnica para su gestión.
08/02/2021 MVCB-3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria no se encuentra en vivienda, pero señora madre manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Avance en instalación de enchape de piso de habitaciones.
08/02/2021 MVCB-3838 María de Jesús Gonzalez casa 12 Zona C Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, beneficiaria se muestra inconforme por los valores que ha revisado en el presupuesto.
08/02/2021 MVCB-3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se verifica el avance en la instalación de la cubierta. Área social sin novedad.
08/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C.. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se verifica el avance en demolición de enchape de cocina. Área social sin novedad.
08/02/2021 MVCB-3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. HIjo de beneficiaria (quien fue autorizado por escrito para estar pendiente en su vivienda) manifiesta estar conforme con labores de obra adelantadas hasta el momento en su vivienda, se observan avances en instalación de cielo raso.
8/2/ 2021, Se realiza apoyo al trabajo de oficina en referencia a la organización de carpetas para remitir a la Secretaria Distrital de Habitat.
08/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape del baño. Sin novedad en el área social.
08/02/2021 MVCB_4680 Misael Leon, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en cocina, las actividades en general ya se encuentran ejecutadas.
09/02/2021 MVCB_0833 José Gilberto Pineda López. Seguimiento de obra. Donde se evidencia trabajos con el cielo raso y pintura, se resuelve dudas con el beneficiario en cuento a las actividades y presupuesto.
09/02/2021 MVCB_0749 Maria del Transito Rivera Rodriguez. Visita de seguimiento de obra. El cual estan montando la estructura para el meson y terminación de enchape en pisos. Beneficiaria no refiere ninguna duda.
09/02/2021 MVCB_0923 Octavio Osorio. Autorizada Luz Amparo Osorio. Visita de Seguimiento de obra. El cual estan en trabajo de pintura en habitaciones segundo piso, autorizada no refiere dudas en cuanto al mejoramiento.
09/02/2021 MVCB_1002 Ramón Calderón autorizada Leidy Calderón. Seguimiento de obra. El cual se evidencia trabajos en enchape de pisos.
09/02/2021 MVCB_1948 Ana Paulina Garcia. Visita de seguimiento de obra. Se evidencia boquilla de pisos y terminacion de enchapes cocina. Se resuelve dudas en cuanto a presupuesto planteado en la vivienda.
09/02/2021 MVCB__3366 Luz Stella López Florez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal trayendo material, sin novedades por parte de la beneficiaria
09/02/2021 MVCB_3446 Ana Manso, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en patio y montura de lavadero, PCV en cocina, baño e ingreso de vivienda, sin novedades.
09/02/2021 MVCB_3400 Betsabe Malagón, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en baño y montura de PCV en habitación y sala, sin novedades
09/02/2021 MVCB_3668 Rosalba Paez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra trayendo material para culminar la vivienda, se evidencia goteo en baño, la beneficiaria satisfecha con actividades realizadas al momento.
09/02/2021 MVCB_2682 Leonor Moreno, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades alistado de pisos, sin novedades no se encontraba la beneficiaria.
09/02/2021 MVCB_2620 Manuel Mosquera, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape de pisos en cocina, hall y enchape en baño.
09/02/2021 MVCB_2686 Jairo Pulido, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, esta pendiente medidas por parte del área técnica, y corrección de pendientes, para poder realizar la entrega.

09/02/2021 MVCB_3393 Elizabeth Pachon, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, esta pendiente medidas por parte del área técnica, y corrección de pendientes, para poder realizar la entrega.
9/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_3326 Bibian Calderon Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_2360 Damaris Restrepo Chavez Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_2284 Maria Helena Castellanos Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_4768 LEIDY Diana Muñoz Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_3323 Elia Maria Ariza De Peña Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_3315 Yaneth Torres Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
9/02/2021 MVCB_3332 Jorge Santos Vega Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
09/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, sin novedad en el área social.
09/02/2021 MVCB_4681 Ana Rosa Cruz, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, esta pendiente medidas por parte del área técnica, y corrección de pendientes, para poder realizar la entrega.
10/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario no se encuentra en vivienda, esposa manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.
10/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de piso de habitación.
10/02/2021 MVCB-3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se verifica avances en instalación de cielo raso en baño. Área social sin novedad.
10/02/2021 MVCB-3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio. Sin novedad en el área social.
10/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. No se encuentra mano de obra en el predio, por lo tanto no se han iniciado labores de obra.
10/02/2021 1 MV_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C.Se hace acompañamiento del área social al área técnica, se verifican labores de cambio de cubierta y existencia de escombros y reguero aun sin recoger en el piso de toda la vivienda, el cual se encuentra enchapado y no hace parte del mejoramiento. Sin novedad en el área social.
10/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de construcción de mesón en cocina.
10/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/02/2021 MVCB_2350 Carlos Alfonso Sanchez Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/02/2021 MVCB_2288 Simona Torres Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/02/2021 MVCB_2347 Maria Dora Elizabeth Martinez Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
10/02/2021 MVCB_2270 Nubia Gallego Ciro Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

	10/02/2021 MVCB_2346 Isidro Bonilla Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	10/02/2021 MVCB_2238 Diana Marcela Ticora Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	10/02/2021 MVCB_2684 Ligia Jacome, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, esta pendiente medidas por parte del área técnica, y corrección de pendientes, para poder realizar la entrega.
	11/02/2021 MVCB_3446 Ana Manso, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, el personal de obra ya finalizó las respecivas actividades, esta pendiente puerta de baño
	11/02/2021 MVCB_3450 Abad López se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades en baño y habitación, para pronta entrega
	11/02/2021 MVCB_3859 María del Pilar PatiñoVanegas casa 11 Zona C, Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica. Viivienda próxima a entregarse.
	11/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no está mano de obra presente. Sin novedad en el área social.
	11/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. se realiza visita de seguimiento al predio. Esposa de beneficiario se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en resanes de pañete en baño y cocina.
	11/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C.Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de piso de cocina.
	11/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C. Vivienda próxima a entregar, falta instalación de puerta.
	11/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Mano de obra del proyecto no se encontraba presente en vivienda, por lo que no se tiene avance. Propietarios de predio habian contratado a un maestro aparte, para resanar paredes (actividad no incluida en mejoramiento), luego de cambio de cubierta, por premura de ocupar la vivienda. Posteriormente se habla con beneficiaria para recordar que no se pueden tener obras paralelamente en la casa, que se intervendrá la cocina y luego de hacer
	11/02/2021 MVCB_3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C . se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de cocina.
	11/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. Se encuentra mano de obra iniciando intervención en vivienda.
	11/2/ 2021, MVCB- 3605, Etelvina Lopez. Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado, se informa a las beneficiarias el resultado del ejercicio de medición. La residente técnica indica que se realizara alistado de pisos habitaciones 3 y 4, pañete de pisos habitación 3 y 4 y ducha eléctrica. El equipo reitera que ejecutadas dichas actividades se dará por terminada la intervención y que las actividades programadas son inamovibles. La beneficiaria acepta y se firma bitácora..
	11/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	11/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	11/2/ 2021, MVCB-3370, Maia Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	11/02/2021 MVCB_2682 Leonor Moreno, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en piso de corredor y habitación, sin novedades por parte de la beneficiaria
	12/02/2021 MVCB_4269 Emma Zulinda Ordoñez, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en habitación 3 y alistado de pisos, sin novedades por parte de la beneficiaria
	12/02/2021 MVCB_4293 Flor Erazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en pisos, montura e instalación de PVC, enchape general en conina no se presenta novedades sociales
	12/02/2021 MVCB_4707, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de desmonte de lavader, pañete en cocina y patio, alistado en habitación N. 1, no se presenta novedades sociales
	12/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C .Vivienda próxima a entregar, faltante puerta. Sin novedad en el área social.
	12/02/2021 MVCB_3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C . Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria dice que se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda.Se evidencian labores de enchape de piso en cocina.
	12/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio.Sin mano de obra, por lo tanto no hay avance.
	12/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B . Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica de Interventoría en seguimiento al predio, beneficiaria manifiesta estar conforme con las labores adelantadas en su vivienda, sin embargo solicita se le pueda hacer pronta entrega.
	12/02/2021 MVCB_3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario no se encuentra en predio, esposa comunica que se encuentran conformes con las actividades de obra adelantadas en su vivienda hasta el momento.
	12/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiario no se encuentra en vivienda, pero señora esposa manifiesta estar conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de mesón de cocina.
	12/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento de obra, se evidencian actividades de pañete. Área social sin novedad.
	12/2/ 2021, MVCB-3370, Maia Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

	12/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	12/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/02/2021 MVCB_1948 Ana Paulina Garcia. Visita de seguimiento de obra. Falta detalles para terminar, los beneficiarios están inconformes con la obra, por lo que se les explico las actividades y se logro adicionar otras que no estaban contempladas.
	15/02/2021 MVCB_1002 Ramón Calderón autorizada Leidy Calderón. Seguimiento de obra. Donde se verifica que ya faltan detalles para la entrega.
	15/02/2021 MVCB_0923 Octavio Osorio. Autorizada Luz Amparo Osorio. Visita de seguimiento de obra. El cual ya estan avanzando en el primer piso, en cocina y baño. Beneficiaria no refiere ninguna inconformidad.
	15/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. beneficiaria se encuentra conforme con las labores adelantadas hasta el momento en su vivienda.
	15/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape de cocina. Sin novedad en el área social.
	15/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C.. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio, se encuentra nota en bitácora, mediante la cual el beneficiario solicita el cambio de personal mano de obra, debido a poco avance en las labores de mejoramiento.
	15/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, Se evidencia que el autorizado por la beneficiaria, se encuentra realizando actividades complementarias de obra, a pesar de haberle indicado en repetidas ocasiones que no se pueden ejecutar actividades paralelas, mientras la intervención este en ejecución. En consecuencia se suspende la obra por 24 horas a fin de que terminen la labor que se encuentran desarrollando y se genera el compromiso de esperar la terminación de obra para que los beneficiarios puedan retomar la ejecución de acciones propias
	15/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	15/2/ 2021, MVCB-3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/2/ 2021, MVCB-3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, vivienda próxima a entregar. Sin novedad en el área social.
	16/02/2021 1 MV_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C.Se hace acompañamiento del área social al área técnica, Personal mano de obra no está presente en la vivienda. Sin novedad en el área social.

	16/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape de pañete en área aledaña de cocina. Sin novedad en el área social.
	16/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Presenta inquietud porque no hay material desde el 11 de febrero, por lo que no evidencia avance de obra.
	16/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio.Personal mano de obra no está presente en vivienda.
	16/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de pañete de muros. Sin novedad en el área social.
	16/02/2021 MVCB_0749 Maria del Transito Rivera Rodriguez. Visita de seguimiento de obra. El cual se verifica enchapes en piso, pero va en atraso de obra por falta de espacio en la vivienda y materiales.
	16/02/2021 MVCB_1002 Ramón Calderón autorizada Leidy Calderón. Seguimiento de obra. Donde se evidencia boquilla en enchapes y detalles, se resuelven dudas con los beneficiarios en cuanto a las actividades y presupuesto de obra.
	16/02/2021 MVCB_0833 José Gilberto Pineda López. Seguimiento de obra. Donde se verifica que la obra ya concluyo, se procedera en alistar papeleria para la entrega formal con el beneficiraio.
	16/02/2021 MVCB_2288 Simona Torres Manyoma Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_ 2347 Maria Dora Elizabeth Martinez Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_2284 Maria Helana Angel Bedoya Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_3052 Gentil Calderon Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_4847 Alfer Yesid Castañeda Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social, sien embargo el beneficiario presenta dudas en cuando a el area de la zona de lavado, el area tecnica solicita levantar el enchape de piso de la zona de lavado para realizar el alistado de piso pertinente para dejar la pendiente hacia el desague.
	16/02/2021 MVCB_4768Leidy Diana Muñoz Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	16/02/2021 MVCB_3336 Nancy Osorio Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/02/2021 MVCB_3332 Jorge Santos Vega
	17/02/2021 MVCB_3039 Flor Alicia Loaiza
	17/02/2021 MVCB_4293 Flor Erazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades, tales como adecuación de algunas baldosas que les toco levantar nuevamente, por solicitud técnica, se atiende inquietudes por parte de la beneficiaria
	17/2/ 2021, MVCB- 3201, Ofelia Evangelia Velasquez Gonzalez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB- 3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, el interventor técnico solicita el cambio de trabajadores a causa de la poca calidad de las actividades hasta el momento desarrolladas, previa revisión de la solicitud, se realiza el cambio de maestros. Se socializa la decisión tomada al beneficiario, quien refiere estar complacido con la decisión, teniendo en cuenta que es conocedor del oficio y personalmente había presentado inquietudes a la residente frente al tema.
	17/2/ 2021, MVCB-3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	17/2/ 2021, MVCB-3134, Rubi Stella Forero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
	18/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

18/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
18/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
18/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
18/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
18/02/2021 MVCB_4707 María Eulalia Giraldo, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de base en concreto en baño, enchape de pisos en habitaciones, inicio de montura de meson en cocina, se solicita retirar escobrosen la parte del exterior de la vivienda, sin novedades por parte del área social
18/02/2021 MVCB_3363 Mirian Osorio, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, no se encontro personal en obra, se evidencio en la vivienda en la habitación N.1 piso preparado para alistado
18/02/2021 MVCB__3366 Luz Stella López Florez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando detalles finales para entrega de vivienda, beneficiaria manifiesta estar conforme con actividades
18/02/2021 MVCB_ 3348 Jhon Jimmy Daza, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de demolición de meson de cocina, demolición de zona de lavado.
18/02/2021 MVCB_3211 María Inés Lizarazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape de pisos en habitación N.1 y N.2 y parte de sala, demolición de meson de cocina, demolición de enchape en baño, sin novedades por parte de la beneficiaria
18/02/2021 MVCB_3209 Martha Isabel Gamboa, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en pisos, sala, comedor y hall, inicio de enchape en habitación N. 1 y en cocina, la beneficiaria manifiesta estar muy agradecida y conforme con lo que se esta realizando
18/02/2021 MVCB_3175 Amanda Florian , se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en pisos de habitación N.1 y N.2, sin novedades
18/02/2021 MVCB_0979 Bernardo Corredor. Seguimiento de obra. El cual se verifica pañetes en zona de ropas. Beneficiario no refiere n inguna inconformidad.
18/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica al seguimiento de avance de obra en el predio, sin novedad en el área social.
18/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio.Beneficiario no se encuentra en vivienda, sin embargo dejó escrito en bitácora solicitud de encuentro para explicación de actividades y presupuesto de obra ante un familiar de él (porque familiar es profesional en construcción, según lo expresado por esposa de beneficiario), por lo que se dió respuesta recordando que al momento de inicio de obra se explicó claramente ante beneficiario y familiares presentes, las actividades de mejoramiento a realizar y el presupuesto a emplear en dichas obras.
18/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda. Se observan avances en enchape de piso de habitación.
18/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de pintura en muros de habitaciones.
18/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Se hace acompañamiento del área social al área técnica, durante visita se verifica avance de obra en pañete de muros en zona de lavado. Sin novedad en el área social.
18702/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Seguimiento de obra. Donde se evidencia pañetes en paredes y enchapes de pisos. Se quedo con cita con el beneficiario el dia de mañana 19 para resolver dudas.
19/02/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Seguimiento de obra. El cual se resolvio dudas con el beneficiario frente al presupuesto y actividades.
19/02/2021 MVCB_ 3349 Lucila Ballesteros , se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de preparacion de superficie en habitaciones y sala, sin novedades
19/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3134, Rubi Stella Forero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social

19/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB- 2336, Jorge Hernando Parra Rincon. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
19/2/ 2021, MVCB-3372, Yeimy Ines Ramirez Grisales. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB-3372, Yeimy Ines Ramirez Grisales. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB-3217, Maria Fanny Vergara Arenas. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB-3134, Rubi Stella Forero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB- 3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
22/02/2021 MVCB_0749 María del Transito Rivera Rodríguez. Visita de seguimiento de obra. El cual se evidencia actividad en habitación en enchapes. Beneficiaria no reporta ninguna inconformidad.
22/02/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Visita Seguimiento de obra. Donde se evidencia que están en trabajos en cocina, en arreglos de mesón y acabados.
22/02/2021 MVCB_2167 María Betsabe Cortes Rodríguez. Visita Seguimiento de obra. Donde se evidencia labores en enchapes de pisos, cocina y baño.
22/02/2021 MVCB_1948 Ana Paulina García. Visita de seguimiento de obra. El cual se verifica que ya terminaron obras en la vivienda, falta hacer la revisión por parte del área técnica de interventoría para entrega.
22/02/2021 MVCB_3195 Jazmin Triana, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, no se encontro personal de obra, la beneficiaria manifiesta al área técnica se de inicio a las obras.
22/02/2021 MVCB_ 3348 Jhon Jimmy Daza, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de alistado en baño y lavadero, preparación de mexcla para cocina, no hay novedades por parte de la beneficiaria
22/02/2021 MVCB_3175 Amanda Florian , se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en pisos de habitación N.1 y N.2 y alistado en piso de patio, sin novedades
22/02/2021 MVCB_ 3349 Lucila Ballesteros , se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando ón actividades de recalzado de muro, enchape en habitación N.1 y N.2, sin novedades por parte de la beneficiaria
22/02/2021 MVCB_3363 Mirian Osorio, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando ón actividades de enchape de pisos habitación N.1 adecuación de puntos para araña en baño, no se encuentra la beneficiaria en la vivienda.
22/02/2021 MVCB_3209 Martha Isabel Gamboa, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, no se encontro personal de obra, en el momento se han realizadado actividades de enchape en pisos y paredes de cocina, pvc en habitación, cocina, sala y comedor, no se encontraba la beenficiaria, nos atendio el hijo.
22/02/2021 MVCB_3211 María Inés Lizarazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de enchape en sala, comedor, habitación N.1, inicio de enchape zona de lavanderia, sin novedades por parte de la beneficiaria.
22/02/2021 MVCB_2361 Omar Cubillos, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades de mesón, demolición de enchape existente en baño, placa en habitación N.2, beneficiario satisfecho con lo realizado al momento.
22/02/2021 MVCB_3212 Helberth Solorza, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, se encontro personal de obra realizando actividades pañetes en sala y alcoba, se atiende inquietud por parte del beneficiario, referente a realizar de su parte una obra en la fachada, se le informa que no se pueden tener obras alternas.

22/02/2021 MVCB_3668 Rosalba Paez, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra verificando que ya fueron realizadas y ejecutadas todas las actividades, pendiente el área técnica definir la entrega de la vivienda, beneficiaria conforme con actividades.
22/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Visita de seguimiento. No está presente mano de obra en vivienda.
22/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape de cocina. Beneficiario manifiesta preocupación por poco avance de obra
22/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C.Beneficiario solicitó reunión para aclarar inquietudes junto con un familiar, porque le han surgido en el proceso constructivo. Se espera la siguiente semana poder acordar cita de encuentro con el área técnica y social del proyecto, dependiendo de la disponibilidad de tiempo del beneficiario porque se encuentra constantemente laborando.
22/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio. Beneficiaria se encuentra conforme y a gusto con las labores realizadas hasta el momento en su vivienda
22/2/ 2021, MVCB-2864, Mirian Peñuela Gomez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
23/2/ 2021, MVCB-3244, Claudia Maria Sanchez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
23/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
23/2/ 2021, MVCB- 2336, Jorge Hernando Parra Rincon. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
23/02/2021 MVCB_2620 Manuel Mosquera, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra los cuales quedan unos pendientes, la persona encargada de la vivienda manifiesta que la comuniccaion del personal de obra no ha sido la más adecuada con ellos, se le solicita a los maestros solo entenderse con el área técnica y se solicita la pronta entrega de la viivenda, debido a que los benficiarios ya se encuentran utlizando la mayoria de los espacios.
23/02/2021, MVCB_2346 Isidro Bonilla Avance de obra, sin novedad desde la parte social
23/02/2021, MVCB_2270 Nubia Gallego Avance de obra, sin novedad desde la parte social
23/02/2021, MVCB_2238 Diana Marcela Ticora se evidencia poco avance de obra, se solicita al área técnica darle prioridad al área del baño, puesto que llevan días sin tener acceso al baño
23/02/2021 MVCB__2288, Simona Torres Manyoma Avance de obra, sin novedad desde la parte social
23/02/2021 MVCB_2350 Caelos Alfonso Sanchez, Avance de obra, sin novedad desde la parte social
23/02/2021 MVCB_4860 Rufina Mena, Poco avance de obra, en el cual la beneficiaria refiere estar inconforme con la ejecución, indicando que no hay áreas terminadas, generando solo reprocesos.
23/02/2021, MVCB_4847 Alfer Castañeda, Poco avancé de obra, se incumplieron compromisos de entrega de vivienda al día de hoy, no hay personal de obra ejecutando actividades desde hace 6 días
24/2/ 2021, MVCB-3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/2/ 2021, MVCB-3372, Yeimy Ines Ramirez Grisales. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/2/ 2021, MVCB-3217, Maria Fanny Vergara Arenas. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga Moreno. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/2/ 2021, MVCB-2864, Mirian Peñuela Gomez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
24/02/2014 MVCB_0979 Bernardo Corredor. Visita de seguimiento de obra. Donde se soluciono problemas con filtraciones en la placa del primer piso, por tubería ejecutada por el mejoramiento. Se soluciono dudas a los beneficiarios.
24/02/2021 MVCB_1948 Ana Paulina García. Visita de seguimiento de obra. Se acerco al predio para solucionar duda del día de la entrega de la vivienda, el cual se les informo que en el transcurso de la otra semana se hará la entrega.
24/02/2021 MVCB_2167 María Betsabe Cortes Rodríguez. Visita Seguimiento de obra. Donde se verifico actividades de terminación de enchapes, pañetes y pinturas.
24/02/2021 MVCB_4707 María Eulalia Giraldo, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape de cocina en general, sin novedades por parte del área social

24/02/2021 MVCB_4131 Nelly Avila, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape en pisos de habitación N.1 y N. 2, y área de hall, sin novedades por parte del área social
24/02/2021 MVCB_4269 Emma Zulinda Ordoñez, se realiza visita de seguimiento a vivienda con el fin de verificar los avances de obra, se encontró personal realizando actividades de enchape general en pisos de habitaciones, pintura general y enchape en cocina, sin novedades por parte del área social, la beneficiaria manifiesta estar conforme y contenta con las actividades realizadas.
24/02/2021 MVCB_4293 Flor Erazo, se realiza visita de seguimiento al predio con el fin de verificar los avances de obra, las obras ya se encuentran finalizadas, no se encontro la beneficiaria. Pendinte que el área técnica defina la entrega de la vivienda
24/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape de cocina. Sin novedad en el área social.
24/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de enchape de pañete en área aledaña de cocina. Sin novedad en el área social.
24/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Se realiza visita de seguimiento. No está presente mano de obra en vivienda.
24/02/2021 MVCB_3043 Maria Helena Castellanos Avance de obra, sin novedad desde la parte social
24/02/2021 MVCB_3039 Flor Alicia Loaiza Avance de obra, sin novedad desde la parte social
24/02/2021 MVCB_3052 Gentil Calderon Avance de obra, sin novedad desde la parte social
24/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
25/2/ 2021, MVCB-3370, Maria Soledad Garcia Cardona. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
25/2/ 2021, MVCB-3134, Rubi Stella Forero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
25/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
25/2/ 2021, MVCB-2864, Mirian Peñuela Gomez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
25/2/ 2021, MVCB-2842, Guillermina Hernandez Gordillo. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
26/2/ 2021, MVCB-3134, Rubi Stella Forero. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
26/2/ 2021, MVCB- 2336, Jorge Hernando Parra Rincon. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
26/2/ 2021, MVCB-3233, Saul Jimenez. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
26/02/2021 MVCB_0749 María del Transito Rivera Rodríguez. Visita de seguimiento de obra. El cual se evidencia remates para poder hacer la entrega de la vivienda.
26/02/2021 MVCB_0989 Iladislao Mape Leiva. Visita Seguimiento de obra. Donde se verifica terminado de remates para pronta entrega.
26/02/2021 MVCB-3837 Gelman Orlando Casa 13 Zona C se realiza visita de seguimiento al predio.Beneficiario no se encuentra en vivienda, sin embargo esposa manifiesta conformidad por las labores de obra efectuadas hasta el momento en su vivienda.
26/02/2021 MVCB_3835 Fabio Ancizar Trujillo Casa 14 Zona C. Se realiza acompañamiento por parte del área social al área técnica en seguimiento al predio,se verifican labores de instalación de sanitario.
26/02/2021 MVCB_3867 Nubia del Carmen Serna Casa 18 Zona C. Se hace acompañamiento del área social al área técnica, durante visita se verifica avance de obra en construcción de mesón de cocina. Sin novedad en el área social.
26/2/ 2021, MVCB- 3228, Maria de Jesus Ramirez de Chitiva. Se realiza acompañamiento por parte del àrea social al àrea tècnica al seguimiento de avance de obra en el predio, no se presenta novedades por parte social
26/02/2021, MVCB_4847 Alfer Castañeda, El día 26 de febrero 2021; se realiza vista de obra técnica y social por parte del contratista e interventoría, para solicitar al beneficiario que dejara la reactivación de las obras, teniendo en cuenta que se no se generaron los compromisos pactados en ocasiones anteriormente establecidos. En el cual en esta visita el beneficiario indica que no se desea continuar con la obra debido a solo los reprocesos que se han presentado y por la falta de profesionalismo tanto del contratista de obra como de la interventoría en relación al no cumplimiento de los compromisos establecidos. Por tal razón el señor ALFER YESID CASTAÑEDA como beneficiario del subsidio indica que no dejara ingresar más personal de obra ni de profesionales de contratista e interventoría y que no dejara termina con la ejecución de la obra hasta que ejerza su derecho de imponer una tutela o en su defecto que se realicé una reunión directamente con personal de la Secretaria de Hábitat, de Personería, Contraloría, y Veeduría Ciudadana.

ENTREGAS
01/02/2021 MVCB_4871 Carmelina Arcila. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
1/2/ 2021, MVCB- 3615, Angilberto Urrego Ortiz. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
01/02/2021 MVCB_2714 Luz Belia Torres. Entrega de vivienda. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
01/02/2021 MVCB_4636 Abraham Muñoz, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
01/02/2021 MVCB_2618 Gilberto Salazar, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
02/02/2021 MVCB_2612 Blanca Parra, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
02/02/2021 MVCB_2297 Consuelo De Jesus Grajales. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
02/02/2021 MVCB_3871 Mily Yomara Calderon. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
02/02/2021 MVCB_4637 Ines Aurora Acero, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
2/2/ 2021, MVCB- 3653, Maria del Carmen Salvador Garavito. Se realiza entrega del predio al beneficiario a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
2/2/ 2021, MVCB- 3440, Ymelda Ruiz Rodriguez. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
3/2/ 2021, MVCB- 3654, Mariela Aguilar Quintero, Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
3/2/ 2021, MVCB- 3612, Dimas Moreno, Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
03/02/2021 MVCB_3510 José Manuel Vega. Entrega de vivienda. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
04/02/2021 MVCB_4695 Vitelvina Montes. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
5/2/ 2021, MVCB- 3443, Julio Cesar Leon, Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
05/02/2021 MVCB_2743 María del Carmen Moreno, autorizado Jairo Puentes. Entrega de vivienda. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
08/02/2021 MVCB_0970 Maria Helena Ramirez. Autorizado Eliberto Guerrero. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
09/02/2021 MVCB_4687 Sixta Martinez, se realiza visita contratista e interventoria del área social y técnico para realizar la entrega de la vivienda, sin embargo, la beneficiaria no recibió la entrega de la vivienda, porque la hija, (señora Flor es quien la autoriza a ella). Al hablar por teléfono con la señora Flor nos manifiesta que no está de acuerdo con el presupuesto por los valores, a pesar que en otras oportunidades se le socializó. Manifestó hoy que ella iba a comunicarse directamente con La Secretaria de Hábitat. Cabe aclarar que la señora Flor no tiene ninguna autorización, por parte de beneficiaria. ENTREGA UNILATERAL
9/2/ 2021, MVCB- 3223, Luz Maria Ariza Roncancio. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
9/2/ 2021, MVCB- 3167, Aura Rosa Gomez de Bedoya. Se realiza entrega del predio al beneficiario a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
10/02/2021 MVCB_2610 Mary Luz Gutierrez, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
10/02/2021 MVCB_3509 Marleny Mondragón. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
10/02/2021 MVCB_4679 Sain Fajardo, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario

10/02/2021 MVCB_4681 Ana Rosa Cruz, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
10/02/2021 MVCB-3838 María de Jesús Gonzalez casa 12 Zona C Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria no acepta firmar porque dice estar inconforme con precios en presupuesto y medidas.
10/02/2021 MVCB_4863 Euline Carcenas Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, se da cieer al PQRS establecido por la beneficiariaquedando todo subsanado en la vivienda.
10/02/2021 MVCB_2287 Luz Marina Gomez Cedeño Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje.
10/02/2021 MVCB_3393 Elizabteh Pachon, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
11/02/2021 MVCB_0940 Maria Delfina Correa. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
11/02/2021 MVCB_2684 Ligia Jacome, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
11/02/2021 MVCB_4696 Luis Albarracín, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
11/02/2021 MVCB_2686 Jairo Pulido, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
12/02/2021 MVCB_4680 Misael León, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
12/02/2021 MVCB_3446 Ana de Dios Manso, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
12/02/2021 MVCB_3450 Abad López, se entrega vivienda a satisfacción del beneficiario
12/02/2021 MVCB_3859 Maria Del Pilar Patiño Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje.
15/02/2021 MVCB_3865 Ana Teresa Valencia Granados Casa 16 Zona C Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; HIjo de beneficiaria (quien fue autorizado por escrito por su señora madre), firma a satisfacción el cierre de obras de mejoramiento en su vivienda)
15/02/2021 MVCB 3315 Janeth Torres Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
16/02/2021 MVCB_3400 Betsabe Malagon, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
17/02/2021 MVCB_0833 José Gilberto Pineda López. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
17/02/2021 MVCB_3323 Elia Maria Ariza. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
17/02/2021 MVCB_0963 Julio Gentil Arroyo. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
18/02/2021 MVCB_3366 Luz Stella López, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
18/2/ 2021, MVCB-3201, Ofelia Evangelina Velasquez Gonzalez. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
18/2/ 2021, MVCB-3198, Maria del Carmen Vega Gamez. Se realiza entrega del predio al beneficiario a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
19/02/2021, MVCB_3332 Jorge Santos Vega, Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
19/02/2021, MVCB_3326 Bibian Stella Calderon Bejarano, Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.

20/02/2021 MVCB_3833 Leidy Maide Sosa Contreras Casa 15 Zona C. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
20/02/2021, MVCB_2347 Maria Dora Elizabeth Martinez, Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
20/02/2021, MVCB_2360, Damaris Restrepo Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
22/2/ 2021, MVCB-3605, Etelvina Lopez Camargo. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
23/2/ 2021, MVCB-2310, Serafina Hernandez Ramirez. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
23/2/ 2021, MVCB-3235, Jose Gabriel Ospina. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
23/02/2021 MVCB_3668 Rosalba Paez, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
23/02/2021 MVCB_2682 Leonor Moreno, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
23/02/2021 MVCB_3670 Isabel Coronado, se entrega vivienda a satisfacción de la beneficiaria
23/2/ 2021, MVCB-3242, Jose Melecio León. Se realiza entrega del predio a la beneficiaria a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
24/02/2021 MVCB_4630 María Felisa Cruz Casa 54 Zona B. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
24/02/2021 MVCB-3830 Claudia Mireya Esperanza Cabrera casa 19 Zona C. Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
25/02/2021 MVCB_4768 Leidy Diana Muñoz Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
25/2/ 2021, MVCB-2243, Elias Barriga. Se realiza entrega del predio al beneficiario a satisfación, con entrega de canecas y manual de reciclaje, posterior a capacitación impartida por el contratista
26/02/2021 MVCB_0964 Carlos Arturo Camargo Muñoz. Entrega de obra. Donde se firmo la documentación de la carpeta de archivo, se le socializo el manual de uso y mantenimiento, y se entrego las tres canecas por parte del contratista como plus con el tema de reciclar.
26/02/2021 MVCB_2288 Simona Torres Se realiza visita para entrega de vivienda, se socializa el manual de uso y mantenimiento y se entregan tres canecas para deposito de residuos sólidos y reciclaje; beneficiaria firma a satisfacción la documentación.
RENUNCIAS
10/02/2021 MVCB_4836 VICTOR JULIO POTILLA El día 10 de febrero se atiende a visita programada con anterioridad, con apoyo de SDHT y dirección de obra y de interventoría, para determinar el estado actual de la vivienda, donde el propietario y beneficiario de la vivienda indica no tener las llaves de la vivienda para poder ingresar; de igual manera se le explica al beneficiario los tiempos que tenía para la adecuación de la vivienda, en el cual el señor Víctor Julio Portilla indica que no cuenta con el dinero para dichas adecuaciones que se necesitan para ejecutar el mejoramiento de vivienda, por tal motivo el beneficiario RENUNCIA VOLUNTARIAMNETE al subsidio otorgado a nombre propio, deseando poder postularse para nuevos proyectos de mejoramientos de vivienda asignados por SDHT.
La beneficiaria remite derecho de peticion "Con respecto al as visitas realizadas por el contratistas de obra para la ejecución de mi subsidio, se me ha manifestado por parte de ellos que las obras que se van a realizar no son acordes con lo estipulado en el expediente entregado por la caja de vivienda popular y que por ley y mandato de la alcaldesa deben ser inferior, esto resulta perjudicial a favor mío por que la ejecución y el derecho que tengo de acceder al valor del subsidio será menor a lo que por ley está estipulado y de lo que está presupuestado por la caja de vivienda popular, esto resulta menos obra ejecutada y menor beneficio para mí y mi familia, solicito atentamente se respete el presupuesto de obra y se ejecuten las obras acorde a lo manifestado en el expediente por la caja de vivienda popular a la SDHT."
PQRS
MVCB_ 4863 EULINE CARDENAS RUIZ Se realiza visita de seguimiento para hacer la entrega satisfacción del mejoramiento de vivienda asignado; a la vez para evidenciar que las inconformidades expuestas en el PQRS quedaran subsanadas, se procede a dar cierre al PQRS establecido por la beneficiaria.
USAQUEN
BARRIO O TERRITORIO: Buenavista – Cerros del norte – Urbanización santa Cecilia

VALIDACIONES REALIZADAS
19/02/2021 Visita de revalidación MVBV_0741 Beatriz Triviño. Barrio Buenavista
19/02/2021 Visita de revalidación MVBV_0890 María Matilde Alfonso de Rodríguez, barrio Buenavista
19/02/2021 Visita de revalidación MV_0519 María del Rosario López, atiende visita Jairo Cruz (hijo). Barrio Buenavista
23/02/2021 Visita de revalidación MVCE_2106 María del Tránsito Barón, casa 22 zona E.
23/02/2021 Visita de revalidación MVCE_1034 Joan David Leguizamon, casa 21 zona E.
23/02/2021 Visita de revalidación MVCE_0435 Marleny Muñoz, zona E.
APERTURAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se presentaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
23/02/2021 Visita de revalidación MVCE_1995 Jairo Alberto Garzón Ríos. Casa 20. Zona E. Beneficiario renunció al subsidio por inconformidad con mano de obra y los materiales a utilizar, argumentando que él y sus hijos saben de construcción y prefieren arreglar su casa a su gusto.
PQRS
No se presentaron en el transcurso de la semana
SANTA FE
BARRIO O TERRITORIO: Laches – El consuelo
VALIDACIONES REALIZADAS
15/02/2021 Visita de revalidación MV_2132 Jaime Enrique Guzmán casa 11 zona E Barrio El Consuelo
15/02/2021 Visita de revalidación MV_4516 María Julia Cordoba casa 8 zona E. Barrio Los Laches
15/02/2021 Visita de validación MV_1783 María Ruth Ospina. Barrio El Consuelo

17/02/2021 Visita de revalidación MVCA_4231 Esmeralda Vidales casa 9 zona E. Barrio Los Laches
17/02/2021 Visita de revalidación MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 Barrio Los Laches.
APERTURAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se presentaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PQRS
24/02/2021 Visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.
SUBA
BARRIO O TERRITORIO: Bilbao segundo sector
VALIDACIONES REALIZADAS
25/02/2021 Visita de validación MV_0022 José Ricardo Prieto Garzón casa 15 zona E barrio Berlín
25/02/2021 Visita de validación MVTB_4354 Baudelino Ávila Olaya casa 12 zona E barrio Bilbao
25/02/2021 Visita de validación MVTB_3843 Guillermo Montalvo Sánchez Q.E.P.D - Atiende visita hijo William Montalvo casa 13 zona E barrio Bilbao
25/02/2021 Visita de validación MVTB_0568 Gloria Dolores Sánchez Díaz casa 14 zona E barrio Bilbao

APERTURAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se presentaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
PQRS
No se presentaron en el transcurso de la semana
RAFAEL URIBE URIBE
BARRIO O TERRITORIO: Las lomas – El mirador sur – Puerto rico
VALIDACIONES REALIZADAS
MVLO-586 Santiago Aguirre García. Visita de revalidación. Zona E Barrio Lomas.
MVRP-O111 Uriel José Calderón. Visita de revalidación. Zona E Barrio Puerto Rico.
MV_0771 Silvia Amparo Muñoz Guerrero. Visita de revalidación. Zona E Barrio Lomas.
MV_600 Herminia Peñaloza. Visita de revalidación. Zona E Barrio Lomas.
17/02/2021 Visita de validación MV_356 Héctor Ulises Romero Mendez casa 1 zona E barrio Las Lomas
17/02/2021 Visita para validación MVLO_419 Lucía Ardila Marín Barrio El Mirador Sur Casa 5. Posible renuncia, porque beneficiaria solicitó un crédito y realizó mejoras en su vivienda, porque según ella no podia esperar más el subsidio.
APERTURAS
No se presentaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se presentaron en el transcurso de la semana

SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se presentaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS

No se presentaron en el transcurso de la semana

RENUNCIAS

No se presentaron en el transcurso de la semana

PQRS

No se presentaron en el transcurso de la semana

PAC

El jueves 04/02/2021; Se atendieron a algunos beneficiarios para preguntar cómo acceder a los subsidios y la dirección de la Secretaria de Hábitat y de la caja de vivienda popular.
El sábado 05/02/2021; Se atendió la beneficiaria del MVCB_4687 Sixta Tulia Martínez, indicando que tiene dudas con respecto a los precios y la ejecución del presupuesto; por tal motivo solicita una visita por parte del área técnica, para que le sea aclaradas las actividades y los costos de ejecución.

HISTORIAS DE VIDA

MVCB-3242, Jose Melecio León. Familia de tipología extensa, conformada por la pareja, dos hijas y un nieto; oriundos del departamento de Cundinamarca, el beneficiario ha sacado adelante a su familia a través de la empleabilidad. Llegó a Bogotá hace más de 30 años, en busca de mejorar la calidad de vida, ya que las oportunidades en su lugar de origen eran mínimas. Aportó en la transformación del barrio, a través del trabajo comunitario y barrial que se realizaba en la época, recuerda con agrado y nostalgia las situaciones que han pasado a través de los años, así como los cambios de la familia y el entorno. Expresa abiertamente agradecimiento por la oportunidad y se siente bendecido por el apoyo.

MVCB-2842, Guillermina Hernandez Gordillo. Familia de tipología extensa, conformada por la pareja, hija y nieto; oriundos del departamento del Tolima, la beneficiaria ha sacado adelante a su familia a través del oficio de la costura y la elaboración de helados caseros. Llegó a Bogotá hace más de 35 años, en busca de mejorar la calidad de vida con los progenitores, durante el ejercicio recuerda como su padre construyo la vivienda bajo las premisas, cultura y arte de la construcción de la época y del municipio de San Luis. Aportó en la transformación del barrio, a través del trabajo comunitario y barrial, recuerda con agrado y nostalgia las situaciones que han pasado a través de los años, así como los cambios de la familia y el entorno. Expresa abiertamente agradecimiento por la oportunidad y se siente bendecido por el apoyo.

BARRIO O TERRITORIO

HISTORIAS DE VIDA

BARRIO O TERRITORIO

HISTORIAS DE VIDA

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

08/02/2021 MVCB_4629 Jorge Andrés Jímenez, se socializa al beneficiario actas de inicio y actas sociales, de igual menera las actividades que se ejecutaran en la vivienda, solicita que nuevamente le expliquen las actividades de la cubierta, se realiza un compromiso de habilitar espacios para ingreso de material, debido a que aún no ha habilitado los espacios. Para el 09/02/2021, aun no ha habilitado los espacios.
Para el 10/02/2021, Con elacompañamiento de la coordinación social de la Secretaria del habitát, director de Interventoria, y área Social y Técnica de interventoria y contratista, visitan la vivienda para verificar los espacios, sin embargo, no se permite el ingreso a una de las habitaciones para verificar medidas, el beneficiario se compromete a habiltar espacios de la vivienda para el día jueves 11 de febrero.
Para el 11/02/2021, se acerca personal de obra, Área técnica, social de interventoria y contratista, para poder ingresar a la vivienda, sin embargo, aún no están habilitados los espacios. Según compromiso el día 10 de febrero con secretaria de Hábitat. nuevamente se realiza un acta, pero el beneficiario se niega a firmarla.
para el 12/02/2021 Se realiza un informe téncico social describiendo cada una de las visitas realizadas al predio. enviado al Director de la Interventoría.

MVCB_4847- ALFER YESID CASTAÑEDA

El día 26 de febrero 2021; se realiza vista de obra técnica y social por parte del contratista e interventoría, para solicitar al beneficiario que dejara la reactivación de las obras, teniendo en cuenta que se no se generaron los compromisos pactados en ocasiones anteriormente establecidos. En el cual en esta visita el beneficiario indica que no se desea continuar con la obra debido a solo los reprocesos que se han presentado y por la falta de profesionalismo tanto del contratista de obra como de la interventoría en relación al no cumplimiento de los compromisos establecidos.
Por tal razón el señor ALFER YESID CASTAÑEDA como beneficiario del subsidio indica que no dejara ingresar más personal de obra ni de profesionales de contratista e interventoría y que no dejara termina con la ejecución de la obra hasta que ejerza su derecho de imponer una tutela o en su defecto que se realicé una reunión directamente con personal de la Secretaria de Hábitat, de Personería, Contraloría, y Veeduría Ciudadana.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Durante el transcurso de la semana se llevo a cabo acompañamiento a las visitas de seguimiento de los predios en los cuales ya se iniciaron labores de obra, Se evidencia que en algunas viviendas no se a dado inicio a las actividades de ejecución ya que no se cuenta con materiales ni maestros en las viviendas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Imagen

Visita de seguimiento MVCB_ 3838 Casa 12 Zona C. María de Jesús	**Visita de Seguimiento MV_3830 Casa 19**	**Visita de seguimiento de obra MVCB_3865 Casa 16 Zona C.** Ana Teresa
		
Entrega de vivienda MV_4871 Casa 4 Zona C	**Apertura MV_3837** Gelman Orlando Casa 13 Zona C	**Apertura MV_3867Casa 17 Zona C**
		

MVCB- 4636 Abraham Muñoz ENTREGA	MVCB- 2618 Gilberto Salazar ENTREGA	MVCB- 2612 Blanca Parra ENTREGA
		
MVCB- 4637 Ines Aurora Acero. ENTREGA	**MVCB- 4629 Jorge Andés Jimenez, Seguimiento**	**MVCB- 3446 Ana Manso Seguimiento**
		

MVCB_3372 Validación Yeimy Ines Ramirez Gonzalez	MVCB_3242 Validación Jose Melecio León	MVCB_2842 Validación Guillermina Hernandez Gordillo
		
MVCB_2243 Validación Elias Barriga Moreno	**MVCB_3217 Validación Maria Fanny Vergara Arena**	**MVCB_3228 Apertura Maria de Jesus Ramirez de Chitiva**
		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CRONOGRAMA METODOLOGÍA HISTORIAS DE VIDA

MV	ID	NOMBRE DE BENEFICIARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FECHA DE INTERVENCIÓN	OBSERVACIÓN (actividades según cronigrama de obra)
MVCB_3666		MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON	DG 69 SUR 18M 51	7658304-3203260744	26/11/2020	Registro fotográfico - ANTES Y CONTEXTO SOCIAL, Implementación de entrevista semiestructurada, Apertura de la vivienda dia 27 de diciembre
			DG 69 SUR 18M 51		17/12/2020	Recopilación material fotográfico AVANCE DE OBRA
			DG 69 SUR 18M 51		18/12/2020	Entrega de vivienda, Registro fotográfico Final
			DG 69 SUR 18M 51		8/01/2021	Grabacion video final, para historia de vida 1y 2
MVCB_2724		MARCO ANTONIO LEON CASTIBLANCO	TV 18P BIS A 69A 58 SUR	3212047730 - 7619106	7/12/2020	Registro fotográfico - ANTES Y CONTEXTO SOCIAL
			TV 18P BIS A 69A 58 SUR		17/12/2020	Implementación de entrevista semiestructurada
			TV 18P BIS A 69A 58 SUR		26/11/2020	Apertura
			TV 18P BIS A 69A 58 SUR		18/12/2020	Recopilación material fotográfico AVANCE DE OBRA
			TV 18P BIS A 69A 58 SUR		19/12/2020	Entrega de vivienda, Registro fotográfico Final

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1		3751	26/11/2020	29/12/2020	MARIA JUDITH LERMA VARGAS	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	KR 18V 66B 11 SUR	3208392659 - 3661296		X			Se realiza visita social, en el cual la beneficiaria demuestra inconformidad, debido a la falta de material, puesto que perjudica el avance de obra, y por tal razón el personal de obra no tiene como ejecutar las actividades		el dia 11 de diciembre se realiza visita de seguimiento social con el area social de obra para dar cierre al PQRS sin embargo la beneficiaria refiere que no firmara el cierre ya que nuevamente no tiene materiales en la vivienda y los maestros no pueden ejecutar actividades.	el dia 10 de diciembre se realiza visita por parte del area social de interventoria con el fin de realizar seguimiento al PQRS presentado por la beneficiaria, evidenciando que las obras avanzan adecuadamente por lo cual se solicita al area social de obra realizar el cierre correspondiente, ya que la beneficiaria refiere no tener inconvenientes; se realiza acompañamiento el dia 11 de diciembre evidenciando que nuevamente no cuentan con material en la vivienda por lo cual no se puede dar cierre al PQRS, el dia 22 y 24 de diciembre se realiza acompañamiento a la vivienda la beneficiaaria muestra inconformidad por que no tiene material en la vivienda para acabar las actividades; Se da por cerrado el PQRS, debido a que ya se culminó la obra y se realizara la entrega del mejoramiento de vivienda.	Se da por cerrado el PQRS, debido a que ya se culminó la obra y se realizara la entrega del mejoramiento de vivienda.		***X***
2		4649	1/11/2020	24/12/2020	FLOR ALBA ACEY	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	CL 67C BIS SUR 18N 25			X			Beneficiaria presentó queja mediante llamada telefónica el día sábado 5 diciembre 2020 durante atención del PAC, debido a que se dio apertura de obra desde el 1 de diciembre de 2020 y aun no se inician labores constructivas en su predio		El miércoles 9 de diciembre se visitó predio para cierre de PQRS, debido a que ya se iniciaron labores de obra.	Se hizo el acompañamiento en visita de seguimiento y verificación de la presencia de trabajadores en labores de obra			***X***
3		2337	7/01/2021	8/01/2021	SARA SANCHEZ	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	CL 68 SUR N° 18 A - 08	3042647118		X			Se realiza visita social de seguimiento en el cual los beneficiarios estan demasiado molestos e inconformes por que desde el dia 08 de diciembre de 2020 tienen escombro botado fuera de la vivienda y no recogen con constancia y los vecinos del secto tomaron esta zona como botadero de basura		Desde el momento de la apertura del PQRS se alertó y se gestionó con al área encargada para que generara la recogida del escombro y de la basura evidenciada. El día 07/01/2020 se realizó la recogida de todo el escombro y la basura acumulada a las 4:00 pm; por tal motivo el día 08/01/2021 se realizó la visita para la verificación del estado de la vivienda por tal motivo se da por cerrado el PQRS.	Se hizo el acompañamiento en visita de seguimiento y verificación de la presencia de trabajadores para el retiro de escombros en la vivienda	se da por cerrado el PQRS, debido a quese recogio el escombro de la vivienda a.		***X***
4		4863	27/01/2021	10/02/2021	EULINE CARDENAS	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	JUAN PABLO II	KR 18V BIS 67C 16			X			Se realiza PQRSya que la beneficiaria refiere estar inconforme por las multiples demoras en la ejecucion de la obra, refiriendo que los maestros no vienen constantemente, desde el dia 23 de enero, el espacio del baño es mmuy reducido, rompieron un tubo en el area del lavadero lo cual genero que se presentara humedad por filtracion de agua en el primer piso, se daño un closet por el movimiento, dañaron una pala la cual no han repuesto, deben una factura de las compras que realizo por solicitud del maestro por un valo de $38.200, la vivienda cumplio 2 meses de ejecucion y no se ve avance de obra por lo cual se solicita se de prioridad a la vivienda y se pueda subsanar lo solicitado dpor la beneficiaria		Desde el momento de la apertura del PQRS se alertó y se gestionó con al área encargada para que se de solucion en cuanto a los requerimientos solicitados por la beneficiaria	se hizo acompañamiento y visita de seguimiento y verificacion evidenciando que todo lo solicitado por la beneficiaria quedo subsanado	se da por cerrado el PQRS, el contratista da solucion a la solicitado por la beneficiaria.		***X***

5		MVCA_3842	8/07/2021		IMELDA LOPEZ DE CEBALLOS	SANTA FE	CENTRO ALTO	LOS LACHES	KR 8B BIS ESTE 5A 23	3123070448-2332876	X				La beneficiaria remite derecho de peticion "Con respecto al as visitas realizadas por el contratistas de obra para la ejecución de mi subsidio, se me ha manifestado por parte de ellos que las obras que se van a realizar no son acordes con lo estipulado en el expediente entregado por la caja de vivienda popular y que por ley y mandato de la alcaldesa deben ser inferior, esto resulta perjudicial a favor mío por que la ejecución y el derecho que tengo de acceder al valor del subsidio será menor a lo que por ley está estipulado y de lo que está presupuestado por la caja de vivienda popular, esto resulta menos obra ejecutada y menor beneficio para mí y mi familia, solicito atentamente se respete el presupuesto de obra y se ejecuten las obras acorde a lo manifestado en el expediente por la caja de vivienda popular, a la SDHT."		El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.	El 24 de febrero 2021 se realiza visita de atención de derecho de petición MVCA_3842 Imelda López de Ceballos casa 7 zona E. Barrio Los Laches. Hace presencia la SDH, la Interventoría y el Contratista (área técnica y social) para dar claridad a la beneficiaria y familiares, acerca de las actividades y presupuesto del mejoramiento de vivienda.			***x***
6		MVCB_0974	23/02/2021		MARIA ANGELICA AVILA PEREZ	CIUDAD BOLIVAR	HABITARTE 2019	COMPARTIR - CIUDAD BOLIVAR	CLL 68 B SUR N° 18 X 27			X			Desde el día miércoles 17 de enero del 2021, el maestro llevo un auxiliar nuevo para la ayuda en las obras, el día sábado se presento un presunto robo de una pulidora marca Bosch de 7 pulgadas y 2.200 W y 8500 RPM, por lo cual solicita sea devuelta o se reponga con las mismas especificaciones de la que se perdió. Para así dejar sacar el material y herramienta de los trabajadores de obra.			fue quie levanta PQRS mediante visita al predio		***x***	

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MV_0022	JOSE RICARDO PRIETO GARZON	BARRIO BERLIN																				
MVCB_2618	GILBERTO SALAZAR PERDOMO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	01/0272021	SI	SI	X			X								
MVCB_2684	LIGIA JACOME NIETO	JUAN PABLO II	X			SE NOTIFICA A LOS BENEFICIARIOS POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÒNICA LA VISITA A REALIZAR.	5/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2686	JAIRO PULIDO RUIZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2729	JAIME GONZÁLEZ CARVAJAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2743	MARÍA DEL CARMEN MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	5/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2751	MARÍA DE LOS ÁNGELES SOTO BERMÚDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3052	GENTIL CALDERON CALDERON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021															
MVCB_3157	EDILMA MARIA POVEDA HERNANDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se	23/02/2021															
MVCB_3167	AURA ROSA GOMEZ DE BEDOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3175	AMANDA FLORIAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021															

MVCB_3195	YAZMIN ALICIA TRIANA GUERRERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021															
MVCB_3209	MARTHA ISABEL GAMBOA LIZARAZO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/02/2021	6/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3211	MARIA INES LIZARAZO DE GAMBOA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021	2/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3212	HELBERTH ARTURO SOLORZA ACOSTA	JUAN PABLO II	X		S	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021															
MVCB_3326	BIBIAN STELLA CALDERON BEJARANO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021															
MVCB_3336	NANCY OSORIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_3348	JOHN JIMMY DAZA ANTOLINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	17/02/2021															
MVCB_3361	OMAR CUBILLOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1902/2021															
MVCB_3430	HECTOR JOSE ARIAS	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	21/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3450	ABAD LOPEZ CARDONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	12/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3452	BRIGETTE CORDOBA GOMEZ	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_3482	DORA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/12/2020	26/01/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_0923	OCTAVIO OSORIO	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	2/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0940	MARIA DELFINA CORREA GARZON	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	1102/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0963	JULIO GENTIL ARROYO BRIÑEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		X	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021															
MVCB_0964	CARLOS ARTURO CAMARGO MUÑOZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	26/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0970	MARIA ELENA RAMIREZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		S	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	20/01/2021	8/02/2021	S	S	X			X								
MVCB_0979	BERNARDO CORREDOR	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0989	ILADISLAO MAPE LEIVA	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/02/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3542	LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/12/2020	28/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3543	ELIZABETH CANO TRIANA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3587	EMPERATRIZ ESPITIA DAZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3588	MARIA ISABEL CARRASCO BERNAL	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_3591	LUCY CEPEDA MARENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3593	ANGEL MARIA LOZANO SALAZAR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	22/12/2020	SI	SI	X			X								

MVCB_3597	FLOR ALBA VEGA BUITRAGO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020															
MVCB_3605	ETELVINA LOPEZ CAMARGO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	22/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3608	YERLY AMPARO DUCUARA DUCUARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	17/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3612	DIMAS MORENO JIMENEZ Y OTRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3654	MARIELA AGUILAR QUINTERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3661	ANA TULIA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3662	MARCELINA ROJAS VILLABONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3664	MARCO JULIO TORRES RAVELO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_4293	FLOR EDITH ERAZO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/01/2021	4/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4671	MARIA SHIRLEY GARCES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_4679	SAIN FAJARDO VANEGAS	JUAN PABLO II			SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4680	MISAEL LEON PEREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	12/02/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4681	ANA ROSA CRUZ CRUZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4684	LUIS ANTONIO PULIDO PRADA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_4707	MARIA ELADIA GIRALDO CASTAÑO	JUAN PABLO II	X			SE NOTIFICA A LOS BENEFICIARIOS POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÓNICA LA VISITA A REALIZAR.	5/02/2021															
MVCB_4733	AURA MARIA LUZ CUESTA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021															
MVCB_4735	MARIA ALCIRA BELTRAN AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021															
MVCB_4743	BERTILDA CAÑON ALFARO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021															
MVCB_4748	LUIS HERNANDO GRACIA ZAMORA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_4753	MARIA DINA GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/03/2021															
MVCB_4837	MARIA ALIRIA FUENTES SEPULVEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4849	ALEIDA TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2270	NUBIA GALLEGO CIRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	feb-21															
MVCB_2275	JOSÉ HERNANDO SEGURA CORTÉS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021															
MVCB_2360	DAMARIS RESTREPO CHAVES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021															

MVCB_2373	MARTHA CECILIA ARIAS MORALES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/02/2021															
MVCB_2700	FLOR HELIA CHIA DIAZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2702	LUZ LELLY OSORIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2707	EIDER GONZÁLEZ CARDONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2709	ANA MERCEDES GOMEZ LEAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/11/2020	28/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2710	MARIA DE LOS ANGELES HUERTAS ARIAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/11/2020	21/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2711	DANIEL LEÓN GÓMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2714	LUZ BELIA TORRES GARCÍA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	1/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2715	NURY SÁNCHEZ CALDERÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/01/2021	21/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2720	JEISSON ALEXANDER NIÑO BAQUERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020															
MVCB_2721	GILBERTO AMAYA AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X		X									

MVCB_2724	MARCO ANTONIO LEÓN CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X		X									
MVCB_2726	MARIA ERMELINDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	24/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2727	RAMONA TAFUR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2728	LEONOR PINZÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_2731	GLORIA EDITH MARTÍNEZ LÓPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2735	LUZ MERY TRIBIÑO RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/12/2020	28/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2738	MARÍA DIOMEDES GARCÍA DE TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/01/2021	20/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3366	LUZ STELLA LOPEZ FLOREZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021															
MVCB_3370	MARIA SOLDEDAD GARCIA CARDONA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3372	YEIMY INES RAMIREZ GRISALES Y OTROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021															
MVCB_3429	PASCUALA NIEVES CHACON	JUAN PABLO II																				

MVCB_3465	GLORIA RUEDA RAMIREZ	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	30/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3490	EMMA SANCHEZ CALDERON	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021															
MVCB_3502	JOSE FOCION SOTO SILVA	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	27/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3561	JAIRO MONTOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3656	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	6/01/2021	22/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3813	MARIA LUCILA IBAGUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3867	NUBIA DEL CARMEN SERNA RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021															
MVCB_4273	MARIA MARLEN HERNANDEZ DE CORTES Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021															
MVCB_4620	MARIA ALICIA NAVARRO REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020															
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_4630	MARÍA FELISA CRUZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	24/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4766	MARIA OLGA ROMERO DE PULIDO	JUAN PABLO II																				
MVCB_2221	KERLY JOHANNA CELY MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/03/2021															

MVCB_2238	DIANA MARCELA TICORA LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/02/2021															
MVCB_2284	MARIA HELENA ANGEL BEDOYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021															
MVCB_2287	LUZ MARINA GOMEZ CEDEÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2288	SIMONA TORRES MANYOMA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	26/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2292	HERNAN ANACONA PALECHOR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2297	CONSUELO DE JESÚS GRAJALES RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	2/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2310	SERAFINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/02/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2336	JORGE HERNANDO PARRA RINCON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/02/2021															
MVCB_2337	SARA SANCHEZ VIVAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020															

MVCB_2346	ISIDRO BONILLA RICO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021															
MVCB_2358	ROSALBA LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021															
MVCB_2359	CARMEN ROSA MARTÍNEZ PÉREZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_2610	MARY LUZ GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/12/2020	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2682	LEONOR MORENO MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	14/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2842	GUILLERMINA HERNÁNDEZ GORDILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	23/02/2021															
MVCB_3134	RUBI STELLA FORERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/02/2021															
MVCB_3144	JACQUELIN GONZALEZ AREVALO	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_3145	MARIA ESTHER GONZALEZ GOMEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3148	OTALVINA ESPITIA FORERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/12/2020	20/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3151	ELVIRA PINZON SIERRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3198	MARIA DEL CARMEN VEGA GAMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_3201	OFELIA EVANGELINA VELASQUEZ GONZALEZ Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021															
MVCB_3217	MARIA FANNY VERGARA ARENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021															

MVCB_3223	LUZ MARIA ARIZA RONCANCIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3228	MARIA DE JESUS RAMIREZ DE CHITIVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/02/2021															
MVCB_3233	SAUL JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021															
MVCB_3235	JOSE GABRIEL OSPINA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3242	JOSE MELECIO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3315	YANETH TORRES GARCIA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_3323	ELIA MARIA ARIZA DE PEÑA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_3332	JORGE SANTOS VEGA LINARES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_3393	ELIZABETH PACHON TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3400	BETSABE MALAGON LOZANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020															
MVCB_3404	MARIA EUGENIA TORRES RAVELO Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_3415	JOSE LELIS NERI GARZON SILVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/01/2021	22/01/2021	SI	SI	X	X		X								

MVCB_3420	MARCO TULIO RUBIO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3440	YMELDA RUIZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3443	JULIO CESAR LEON LEON Y OTRA	JUAN PABLO II			SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	5/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3446	ANA DE DIOS MANSO DE BATERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	12/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3573	CECILIA ULLOA DE VASALLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3574	MARIA ROSALBA BARBOSDA	JUAN PABLO II	X			Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	18/12/2020															LA CASA SE ENCONTRABA LISTA PARA ENTREGA DESDE EL 15/01/21 PERO LA BENEFICIARIA NO SE ENCONTRABA EN BOGOTA Y NO PUDO PRESENTARSE PARA LA ENTREGA HASTA EL 29/01/2021
MVCB_4131	NELLY AVILA SANTOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	19/02/2021															
MVCB_4137	PEDRO ANTONIO PINEDA PINEDA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_4661	MARTHA PATRICIA CORTES HERNANDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_4669	MARIA EUGENIA RIAÑO MOJICA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_4695	VITELVINA MONTES GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	4/02/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4696	LUIS EDGAR ALBARRACIN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	11/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4717	ARACELY ZAMBRANO ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	29/12/2020	21/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4758	PEDRO ANTONIO CASTRO RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/02/2021															
MVCB_4847	ALFER YESID CASTANEDA PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020															
MVCB_4891	DEYANIRA MARIA ROMERO ARIZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/20202	12/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2347	MARIA DORA ELISABET MARTINEZ SANABRIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021															
MVCB_2350	CARLOS ALFONSO SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/02/2021															
MVCB_2612	BLANCA LILIA PARRA DOMINGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	4/12/2020	2/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2167	MARIA BETSABE CORTES RODRIGUEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021	6/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0974	MARIA ANGELICA AVILA PEREZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/01/2021															
MVCB_2864	MIRIAN PEÑUELA GOMEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	16/02/2021															
MVCB_0749	MARIA DEL TRANSITO RIVERA RODRIGUEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_0833	JOSE GILBERTO PINEDA LOPEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021															
MVCB_1002	RAMON CALDERON ANDRADE	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	30/01/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_1947	FERMIN AVILA	MARANDU	RENUNCIA																			
MVCB_1948	ANA PAULINA GARCIA GARCIA	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	21/01/2021	1/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3473	OLGA INES BARRAGAN AVENDAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	28/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3510	JOSE MANUEL VEGA TOVAR	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	7/01/2021	3/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3512	ERNESTINA DEFELIPE GARCIA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_3546	LEONILDE LUNA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	28/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3549	FLOR MARINA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	17/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3599	ROSA ELVIRA DUCUARA DE DUCUARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/11/2020															
MVCB_3653	MARIA DEL CARMNE DE SALVADOR GARAVITO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	8/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3666	MARIA AURORA SILVA VIUDA DE GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3668	ROSALBA PAEZ VASQUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	13/01/2021	23/02/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3670	ISABEL ADRIANA CORONADO ARIAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	23/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3804	MARIA ANA CELIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020															
MVCB_3805	LUZ MARY VARGAS ARDILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	22/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3825	LIGIA ROSARIO TORRES DE MORALES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020															
MVCB_4649	FLORALBA ACEY LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	24/12/2020	SI	SI	X			X				Beneficiaria presentó queja mediante llamada telefónica el día sábado 5 diciembre 2020 durante atención del PAC, debido a que se dio apertura de obra desde el 1 de diciembre de 2020 y aun no se inician labores constructivas en su predio	El miércoles 9 de diciembre se visitó predio para cierre de PQRS, debido a que ya se iniciaron labores de obra.	4 dias		
MVCB_4687	SIXTA TULIA MARTINEZ MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	9/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4790	MIREYA MELO VASQUEZ	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_4792	LUZ MARINA MENDIVELSO TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_4799	ALICIA SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_4806	LUZ ANGELA HERRERA FINO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/03/2021															
MVCB_4836	VICTOR JULIO PORTILLA	JUAN PABLO II	RENUNCIA																			
MVCB_4859	EVELIA MUÑOZ	JUAN PABLO II	PLAN TERRAZA																			
MVCB_4860	RUFINA MENA MURRILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021															
MVCB_4865	ANA SOFIA AGUILERA GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020															
MVCB_4869	ROSA HELENA PAEZ DE GUEVARA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	25/11/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4881	ROQUELINA MENA MURILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	22/01/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4886	EMMA TEOFILDE MATEUS DE PINEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	19/12/2020	SI	SI	X			X									
MVCB_2302	LORENA MARGARITA ESPAÑA MONTENEGRO	JUAN PABLO II																					
MVCB_3806	JOSE JIMENEZ GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	14/01/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4269	EMMA ZULINDA ORDOÑEZ ESCARRAGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/01/2021	3/03/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4637	INES AURORA ACERO BAQUERO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	12/01/2021	2/02/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4660	BLANCA EDELMIRA SANCHEZ CACERES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020																
MVCB_4871	CARMELINA ARCILA DE CASTAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2021	1/02/2021	SI	SI	X			X									
MVBV_0519	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ VDA DE TEJADA	BUENAVISTA																					
MVBV_0741	BEATRIZ TRIVIÑO	BUENAVISTA																					
MVBV_0890	MARIA MATILDE ALFONSO DE RODRIGUEZ	BUENAVISTA																					
MVCA_1783	MARIA RUTH OSPINA	EL CONSUELO																					
MVCA_2132	JAIME ENRIQUE GUZMAN	EL CONSUELO																					
MVCA_4231	ESMERALDA VIDALES ANAYA	LOS LACHES																					
MVCE_0125	SALVADOR VELANDA ACERO	BARRIO EL CERRO - USAQUEN PARTE BAJA (VILLA NIDYA)																					
MVCE_1034	JOAN DAVID LEGUIZAMON VILLAMIL	URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA																					
MVCE_2106	MARIA DEL TRANSITO BARON SANTIESTEBAN	URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA																					
MVCB_2234	MARIA OLGA SILVA VARGAS Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/12/2020	30/12/2020	SI	SI	X			X									
MVCB_2243	ELIAS BARRIGA MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	5/02/2021	25/02/2021	SI	SI	X			X									

MVCB_2377	AMPARO MENDEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	9/02/2021															
MVCB_2620	MANUEL MARINO MOSQUERA MOSQUERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	14/01/2021	4/03/2021	X	X	X			X								
MVCB_2717	LUIS ANGEL SERRATO LÓPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3244	CLAUDIA MARÍA SÁNCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	11/02/2021	5/03/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3349	LUCILA BALLESTEROS SOLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	18/02/2021															
MVCB_3363	MIRIAN OSORIO RAMÍREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	15/02/2021															
MVCB_3453	JUDITH RESTREPO CHAVES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	1/12/2020	15/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3579	WILSON BARBOSA RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/11/2020	22/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3585	EMMA ALCIRA CELY	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	24/11/2020	18/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3586	BLANCA CECILIA VARGAS SILVA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020	14/01/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3601	LUIS FERNANDO ARIZA MEDINA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/11/2020	23/12/2020	SI	SI	X			X								

MVCB_3602	LUZ MYRIAM MENDEZ CARDENAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	3/12/2020	29/12/2020	SI	SI	X			X								
MVCB_3615	ANGILBERTO URREGO ORTÍZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/12/2020	1/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3619	FABIOLA LOPEZ CARDENAS	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_3751	MARIA JUDITH LERMA VARGAS Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/11/2020	29/12/2020	SI	SI	X		X					Se realiza visita social, en el cual la beneficiaria demuestra inconformidad, debido a la falta de material, puesto que perjudica el avance de obra, y por tal razón el personal de obra no tiene como ejecutar las actividades	el dia 10 de diciembre se realiza visita por parte del area social de interventoria con el fin de realizar seguimiento al PQRS presentado por la beneficiaria, evidenciando que las obras avanzan adecuadamente por lo cual se solicita al area social de obra realizar el cierre correspondiente, ya que la beneficiaria refiere no tener inconvenientes; se realiza	25 DIAS	SI	La beneficiaria firmo el cierre del PQRS en el momento que se dio por entregada la vivienda.
MVCB_3830	CLAUDIA MIREYA ESPERANZA CABRERA Y OTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	24/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3833	LEIDY MAIDE SOSA CONTRERAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021															
MVCB_3835	FABIO ANCIZAR TRUJILLO GARCES Y OTRA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	27/01/2021															
MVCB_3837	GELMAN ORLANDO JIMENEZ FUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	2/02/2021															
MVCB_3838	MARIA DE JESUS GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	26/01/2021	10/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3857	CECILIA MEJÍA DE RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	28/11/2020															
MVCB_3859	MARIA DEL PILAR PATIÑO VANEGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021	12/02/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3865	ANA TERESA VALENCIA GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras.	22/01/2021															

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutando actividades de validación como actividades de obra, estos trabajos presentaron dos cortes de obra para cobro por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020.

RELACIÓN DE VALOR EN EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2021

CANT. DE MV.	% DE AVANCE	VALOR EN EJECUCIÓN
253	70.46%	$ 345.415.069,78

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe se realizaron dos cortes:

- CORTE 3 42 VIVIENDAS
- CORTE 4 29 VIVIENDAS

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

Así mismo, el anticipo gestionado esta consignado y en cada corte se generó su amortización.

- **ANTICIPO** **$1.118.562.976**
- CORTE 1 Y 2 AMORTIZACIÓN $268.074.064.00
- CORTE 3 AMORTIZACIÓN $186.080.354.00
- CORTE 4 AMORTIZACIÓN $128.862.591.00
- **SALDO** **$535.545.967,00**

d. Cortes y pagos efectuados en el periodo

Durante el periodo de este informe se realizaron los siguientes cortes de obra:

CORTE DE OBRA

Corte de obra No. 3

TOTALES		$ 2.846.554.324,00		**$473.486.906,00**
AIU		$ 740.104.124		**$123.106.596,00**
COSTO TOTAL		**$ 3.586.658.448**		**$596.593.502,00**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$ 141.884.804		**$23.674.345,00**
COSTO TOTAL		$ 3.728.543.251		**$620.267.847,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$1.118.562.976,00**			
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE CORTE 30%	**$186.080.354,00**			**$186.080.354,00**
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	**$664.408.558,00**			
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA				**$434.187.493,00**

Corte de obra No. 4

TOTALES		$ 2.846.554.324,00		**$327.894.634,00**
AIU		$ 740.104.124		**$85.252.605,00**
COSTO TOTAL		**$ 3.586.658.448**		**$413.147.239,00**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$ 141.884.804		**$16.394.732,00**
COSTO TOTAL		$ 3.728.543.251		**$429.541.971,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$1.118.562.976,00**			
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE CORTE 30%	**$128.862.591,00**			**$128.862.591,00**
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	**$535.545.967,00**			
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA				**$300.679.380,00**

Estado general de costos

					26	CORTE 1	42	CORTE 2	29	CORTE 3	42	CORTE 4
TOTALES		$ 2.846.554.324,00		$395.330.238,00		$286.792.061,00		$473.486.906,00		$327.894.634,00		$ 474.293.051,00
AIU		$ 740.104.124		$102.785.862,00		$74.565.936,00		$123.106.596,00		$85.252.605,00		$123.316.193,00
COSTO TOTAL		$ 3.586.658.448		$498.116.100,00		$361.357.997,00		$596.593.502,00		$413.147.239,00		$597.609.244,00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$ 141.884.804		$19.766.512,00		$14.339.603,00		$23.674.345,00		$16.394.732,00		$23.714.653,00
COSTO TOTAL		$ 3.728.543.251		$517.882.612,00		$375.697.600,00		$620.267.847,00		$429.541.971,00		$621.323.897,00
VALOR DEL ANTICIPO	$1.118.562.976,00											
AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE CORTE 30%	$583.017.009,00			$155.364.784,00		$112.709.280,00		$186.080.354,00		$128.862.591,00		$186.397.169,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$535.545.967,00											

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
licitacionesinplayco@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

CORTE DE INTERVENTORÍA

Corte de interventoría No. 3

VALOR DEL CONTRATO DE interventoría 701 : ($)		CONTRATO 695
		$ 447.142.976,00
ADICIONES: ($)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)		$ 447.142.976,00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		16,02%
VALOR DEL% DE AVANCE DE LA OBRA		$ 71.630.747
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS	5%	$ 3.581.537
		$ 75.212.284

Corte de interventoría No. 4

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 701 : ($)		CONTRATO 695
		$ 447.142.976,00
ADICIONES: ($)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)		$ 447.142.976,00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		11,09%
VALOR DEL% DE AVANCE DE LA OBRA		$ 49.605.041
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS	5%	$ 2.480.252
		$ 52.085.293

ANEXO INFORME SISO

INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**INFORME HSE**	**FEBRERO**

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/2/2021	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat."	MENSUAL
HASTA	6/2/2021		SEMANA 1

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista : Se verifica que se haga la respectiva Desinfección de manos y Botas antes de ingresar al MV dando cumplimiento al protocolo, Se Realiza inducción al personal operativo que se va designando a cada MV en caso de ser nuevo y se deja encargado a cada grupo por la toma de condiciones de salud, , capacita a los Beneficiarios que se les hace entrega del mejoramiento sobre el uso de las tres canecas blanca,verde y negra para así den un buen uso y reciclaje, Se realizan charlas al personal operativo segun cronograma .

Interventoría: Se verifica en los MV que el personal cumpla con todo lo debido al SG-SST y se habla que en las nuevas aperturas el personal debe contar con todo lo debido con el Área SST. Se espera que en esta próximas aperturas el personal que tenga hacer cubierta cuente con seguridad social,cursos de altura vigentes y permisos firmados por un coordinador de alturas.

Inconformidades:

-Se entregan equipos de proteccion contra caidas en mal estado a los trabajadores

-Un 96% del personal no cuenta con casco en los Mv

-Exámenes de ingreso del personal faltante ya que llevan más de 5 dias laborando

-Falta examenes con enfasis en alturas del personal que trabaja en el mismo.

Solicitudes al contratista:

- Cursos de altura del personal que vaya a realizar actividades en alturas
- Verificar curso de altura que se adecuados a la actividad con su respectivo certificado que este avalado por el ministerio de trabajo.
- Permiso de trabajo por el ministerio de trabajo para trabajar fines de semana ya que se consideran como tiempo extra.
- Entrega de equipos de proteccion de caidas en buen estado y certificado de que son actos para su uso ya cuando se utilizaron de mas de un año.
- Ficha tecnica de estos equipos de altura
- Tener claros estos mv que se van hacer cubiertas
- Certificado de escombros
- Recoger escombro que aún sigue fuera de los MV ya que llevan más de dos días

INDUCCIÓN: se hace inducción al personal como se va asignando por vivienda por parte de la profesional sst del contratista, el cual realizará actividades en los MV aperturados socializando protocolo y políticas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar sus labores.	SI	100%
	REALIZADA	

2. Gestión Ambiental

En el momento no se tiene ningún residuo.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro	0	81,2	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	No se entregaron certificados de escombro

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

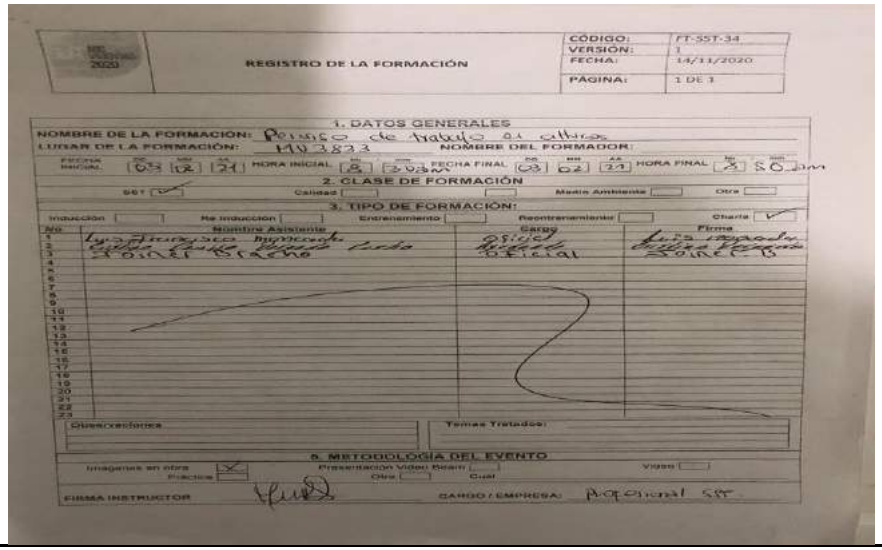
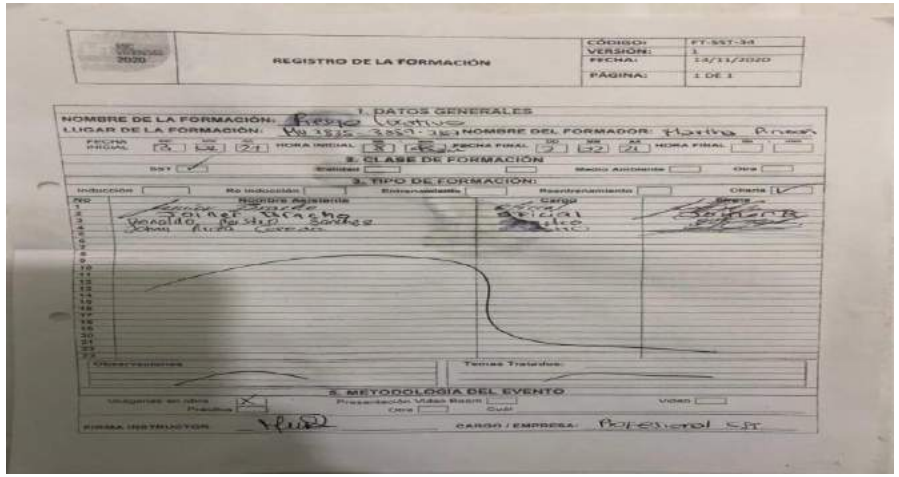
3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por festivos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**484**	**1**	**596**	**0**	**0**
Total Acumulado	**484**	**1**	**596**	**0**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

FECHA	CHARLA	FOTOS
3/2/2021	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	
3/2/2021	RIESGO LOCATIVO	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Permiso de trabajo en alturas
LUGAR DE LA FORMACIÓN: MV 3823
NOMBRE DEL FORMADOR:
FECHA INICIAL: 03 02 21 HORA INICIAL: 8:30 FECHA FINAL: 03 02 21 HORA FINAL: 5:30 pm

2. CLASE DE FORMACIÓN
SST: ✓ Calidad: Medio Ambiente: Otra:

3. TIPO DE FORMACIÓN:
Inducción: Re inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla: ✓

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Ingeniero Raymundo Cano Pardo	Oficial Oficial	
2	Daniel Arcaha		

Observaciones: Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO
Imagenes en obra: ✓ Presentación Video Beam: Video:
Practica: Otra: Cual:
FIRMA INSTRUCTOR: CARGO / EMPRESA: Profesional SST

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Riesgo Locativo
LUGAR DE LA FORMACIÓN: MV 3823 NOMBRE DEL FORMADOR: Martha Arcaha
FECHA INICIAL: 3 02 21 HORA INICIAL: 8 FECHA FINAL: 3 02 21 HORA FINAL:

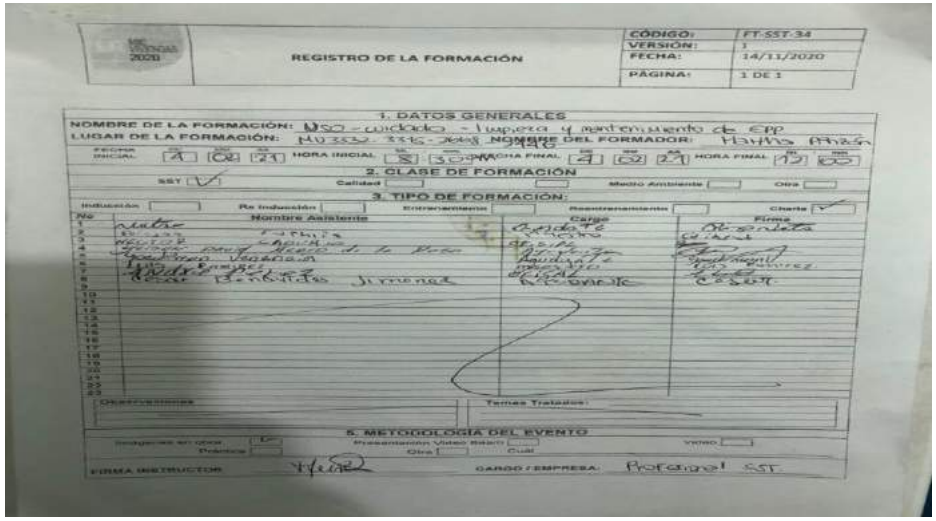
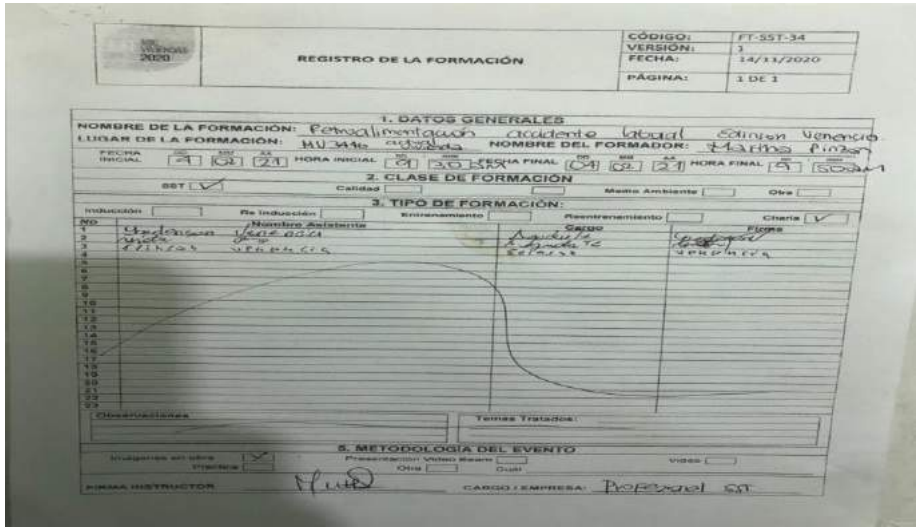
2. CLASE DE FORMACIÓN
SST: ✓ Calidad: Medio Ambiente: Otra:

3. TIPO DE FORMACIÓN:
Inducción: Re inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla: ✓

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Daniel Arcaha	Oficial	
2	Harold Bastidas Suarez	Oficial	
3	John Alba Cuevas	Oficial	

Observaciones: Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO
Imagenes en obra: ✓ Presentación Video Beam: Video:
Practica: Otra: Cual:
FIRMA INSTRUCTOR: CARGO / EMPRESA: Profesional SST

4/2/2021	USO CUIDADO - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EPP	
4/2/2021	RETROALIMENTACION ACCIDENTE LABORAL EDINSON VENENCIA	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Uso - cuidado - limpieza y mantenimiento de EPP
LUGAR DE LA FORMACIÓN: NUEVA ERA - Zona 1 NOMBRE DEL FORMADOR: Martha Arias
FECHA INICIAL: 04/02/21 HORA INICIAL: 8:30 FECHA FINAL: 04/02/21 HORA FINAL: 12:00

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST: ✓ Calidad: Medio Ambiente: Otra:

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción: Re Inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla: ✓

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Walter	Conductor	
2	[illegible]	Ayudante	
3	[illegible]	Ayudante	
4	[illegible]	Ayudante	
5	[illegible]	Conductor	

Observaciones: Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Trabajadores en obra: ✓ Presentación Video Beam: Video:
Planta: Otra: Cual:

FIRMA INSTRUCTOR: CARGO / EMPRESA: Profesional SST

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Retroalimentacion accidente laboral Edinson Venencia
LUGAR DE LA FORMACIÓN: NUEVA ERA - Vivienda NOMBRE DEL FORMADOR: Martha Arias
FECHA INICIAL: 04/02/21 HORA INICIAL: 9:30 FECHA FINAL: 04/02/21 HORA FINAL: 10:00

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST: ✓ Calidad: Medio Ambiente: Otra:

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción: Re Inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla: ✓

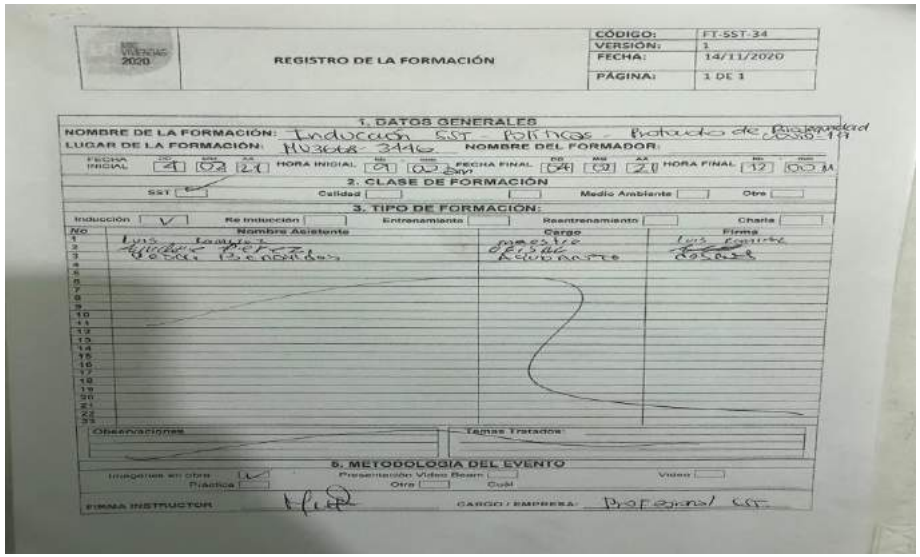
No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Anderson Jose Ruiz	Ayudante	
2	[illegible]	Ayudante	
3	[illegible]	Ayudante	

Observaciones: Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Trabajadores en obra: ✓ Presentación Video Beam: Video:
Planta: Otra: Cual:

FIRMA INSTRUCTOR: CARGO / EMPRESA: Profesional SST

4/2/2021	INDUCCION SST - POLITICAS - PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD COVID - 19	
4/2/2021	RIESGO PUBLICO	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Inducción SST - Políticas - Protocolo de Bioseguridad COVID-19
LUGAR DE LA FORMACIÓN: MV3668 3916 NOMBRE DEL FORMADOR:
FECHA INICIAL: 4 02 21 HORA INICIAL: 09 00 FECHA FINAL: 04 02 21 HORA FINAL: 12 00 M

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST: X Calidad: Medio Ambiente: Otro:

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción: X Re Inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla:

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Luis Eduardo Perez Rodriguez	Asistente Administrativo	

Observaciones:

Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Imágenes en obra: X Presentación Video Beam: Video:
Práctica: Otra: Cuál:

FIRMA INSTRUCTOR: CARGO / EMPRESA: Profesional SST

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Riesgo Publico NOMBRE DEL FORMADOR: DIDIER RUEDA
LUGAR DE LA FORMACIÓN: MV3813 3910 DUI
FECHA INICIAL: 4 02 21 HORA INICIAL: 16 00 FECHA FINAL: 4 02 21 HORA FINAL: 17 30

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST: X Calidad: Medio Ambiente: Otro:

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción: Re Inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla:

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	Julian Camilo Vanegas Gomez	Auxiliar Operativo	
2	Luis Alberto Rodriguez Rodriguez	Auxiliar Operativo	
3	Jhon Alexander Rojas Rodriguez	Auxiliar Operativo	
4	Jhon Jairo Rodriguez Rodriguez	Auxiliar Operativo	
5	Oscar Mauricio Rodriguez Rodriguez	Auxiliar Operativo	
6	Oscar Mauricio Rodriguez Rodriguez	Auxiliar Operativo	

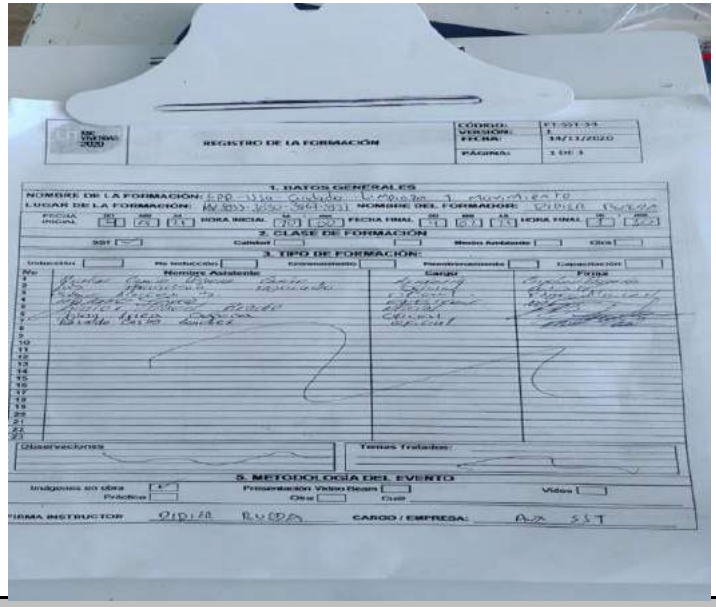
Observaciones:

Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Imágenes en obra: X Presentación Video Beam: Video:
Práctica: Otra: Cuál:

FIRMA INSTRUCTOR: DIDIER RUEDA CARGO / EMPRESA: Aux SST

4/2/2021	EPP- USO, CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar			
3.3.1 Condición Subestándar			
No	**Descripción**	**Acción Tomada**	**La Condición Continua?**
1	Se encuentra al personal sin elementos de protección personal	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**

2	Se encuentra al personal sin Dotación adecuada para las actividades a realizar	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**

3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
4	Se encuentra trabajos ya realizados y otros por realizar en alturas sin autorización	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
5	Se encuentra Escombro fuera de los Mv	Se habla con el personal y se les recuerda que deben dejar el escombro dentro del mv a menos de que el mismo dia pasen por el.	**SI**

4. Registro Fotográfico

Imagen
















SIN DOTACIÓN Y SIN EPP
02-02-21










MV-3857
ESCOMBROS
05-02-21


MV-3859
ESCOMBROS
05-02-21


MV-3833
ESCOMBROS
05-02-21


MV-3835
ESCOMBROS
05-02-21

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana
Contratista : Se verifica que se haga la respectiva Desinfección de manos y Botas antes de ingresar al MV dando cumplimiento al protocolo, Se Realiza inducción al personal operativo que se va designando a cada MV en caso de ser nuevo y se deja encargado a cada grupo por la toma de condiciones de salud, , capacita a los Beneficiarios que se les hace entrega del mejoramiento sobre el uso de las tres canecas blanca,verde y negra para así den un buen uso y reciclaje, Se realizan charlas al personal operativo segun cronograma . **Interventoría:** Se verifica en los MV que el personal cumpla con todo lo debido al SG-SST y se habla que en las nuevas aperturas el personal debe contar con todo lo debido con el Área SST. Se espera que en esta próximas aperturas el personal que tenga hacer cubierta cuente con seguridad social,cursos de altura vigentes y permisos firmados por un coordinador de alturas. Inconformidades: -Un 96% del personal no cuenta con casco en los Mv -Exámenes de ingreso del personal faltante ya que llevan más de 5 dias laborando -Falta examenes con enfasis en alturas del personal que trabaja en el mismo. **Solicitudes al contratista:** - Cursos de altura del personal que vaya a realizar actividades en alturas - Verificar curso de altura que se adecuados a la actividad con su respectivo certificado que este avalado por el ministerio de trabajo. - Permiso de trabajo por el ministerio de trabajo para trabajar fines de semana ya que se consideran como tiempo extra. - Entrega de equipos de proteccion de caidas en buen estado y certificado de que son actos para su uso ya cuando se utilizaron de mas de un año. - Ficha tecnica de estos equipos de altura - Tener claros estos mv que se van hacer cubiertas - Certificado de escombros - Recoger escombro que aún sigue fuera de los MV ya que llevan más de dos días

INDUCCIÓN: se hace inducción al personal como se va asignando por vivienda por parte de la profesional sst del contratista, el cual realizará actividades en los MV aperturados socializando protocolo y políticas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar sus labores.	SI	100%
	REALIZADA	

2. Gestión Ambiental
En el momento no se tiene ningún residuo.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro(01-02-21)	7,3	103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	
Escombro(07-02-21)	7,3	103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	

Escombro(04-02-21)	7,3	103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

3.1. Índices

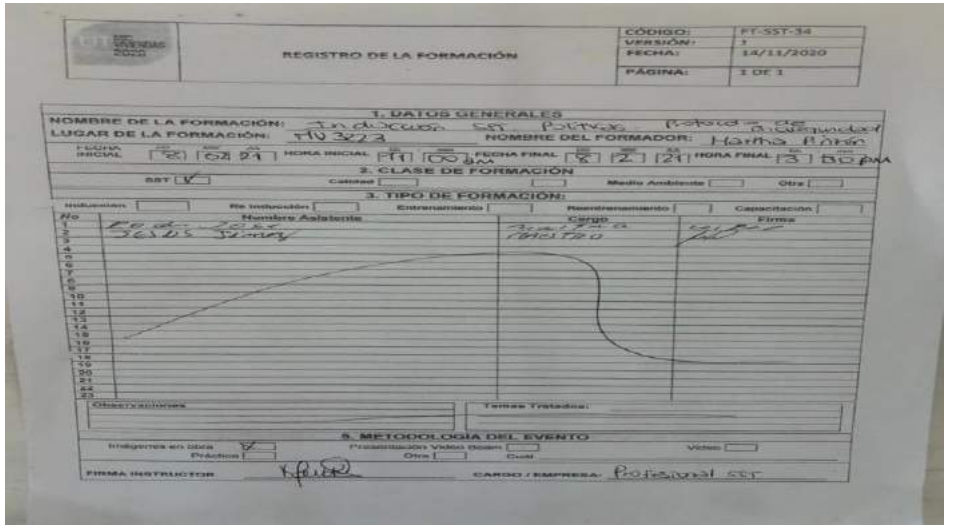
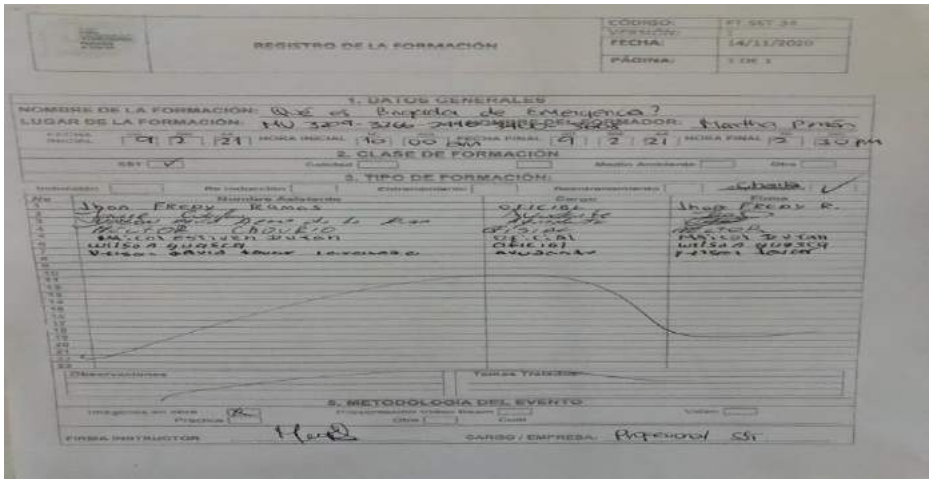
Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por festivos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**484**	**1**	**596**	**0**	**0**
Total Acumulado	**968**	**1**	**1192**	**0**	**0**

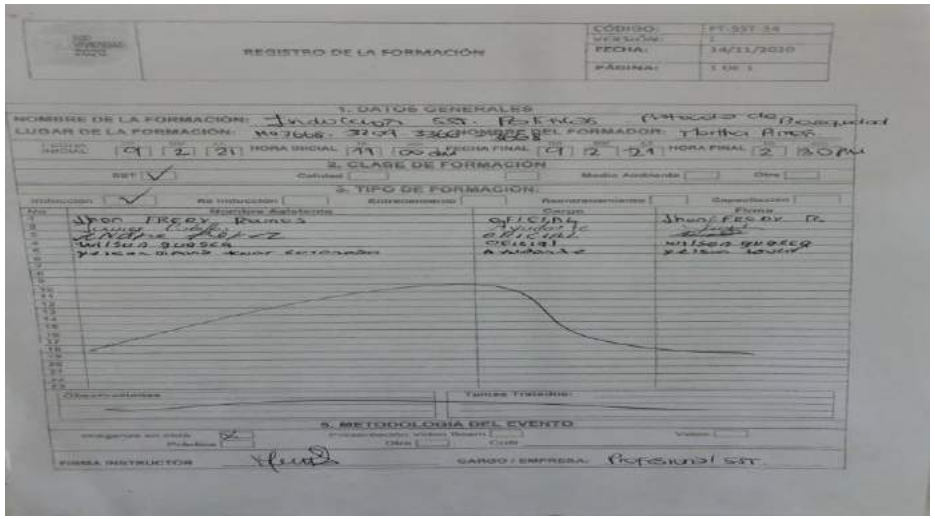
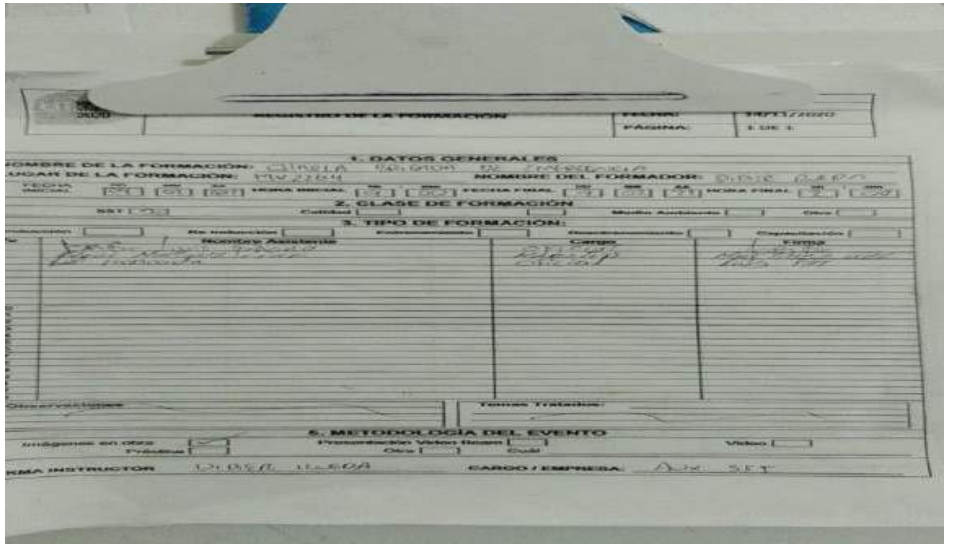
3.1.1.Incidendentalidad

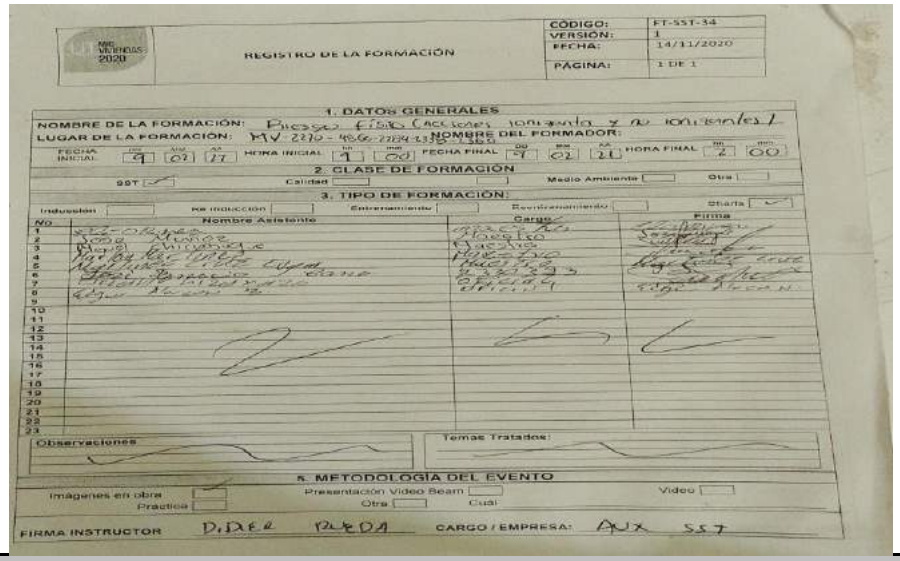
	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)

Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

FECHA	CHARLA	FOTOS
8/2/2021	INDUCCION SST - POLITICAS - PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD COVID - 19	
9/2/2021	QUE ES BRIGADA DE EMERGENCIA	

9/2/2021	INDUCCION SST - POLITICAS - PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD COVID - 19	
9/2/2021	BRIGADA DE EMERGENCIA	

9/2/2021	RIESGO FISICO	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO:	FT-SST-34
VERSIÓN:	1
FECHA:	14/11/2020
PÁGINA:	1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Riesgo Físico Condiciones inseguras y actos inseguros

LUGAR DE LA FORMACIÓN: MV 2270 - 486-2284-2350 Lab

NOMBRE DEL FORMADOR:

FECHA INICIAL: 9 / 02 / 21 HORA INICIAL: 7 00 FECHA FINAL: 9 / 02 / 21 HORA FINAL: 2 00

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST ✓ Calidad Medio Ambiente Otra

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción Re inducción Entrenamiento Reentrenamiento Charla ✓

No	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Observaciones

Temas Tratados:

4. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Imágenes en obra Presentación Video Beam Video

Practica Otra Cual

FIRMA INSTRUCTOR DIDIER PUEDA CARGO / EMPRESA: AUX SST

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar			
3.3.1 Condición Subestándar			
No	**Descripción**	**Acción Tomada**	**La Condición Continua?**
1	Se encuentra al personal sin elementos de protección personal	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
2	Se encuentra al personal sin Dotación adecuada para las actividades a realizar	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**

3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
4	Se encuentra trabajos ya realizados y otros por realizar en alturas sin autorización	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
5	Se encuentra Escombro fuera de los Mv	Se habla con el personal y se les recuerda que deben dejar el escombro dentro del mv a menos de que el mismo dia pasen por el.	**SI**

4. Registro Fotográfico

Imagen













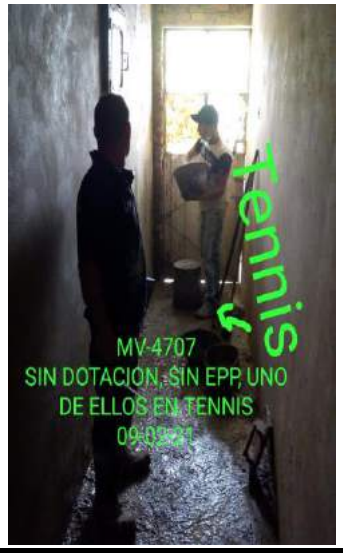





MV-3223
SIN DOTACION Y SIN EPP
08-02-21


MV-3223
SIN DOTACION Y SIN EPP
08-02-21


MV-2620
PERSONAL SIN CASCO Y SIN
GUANTES, EL TRABAJADOR NO
TIENE CAMISA MANGA LARGA
09-02-21


tennis
MV-4707
SIN DOTACION, SIN EPP, UNO
DE ELLOS EN TENNIS
09-02-21


MV-3365
SIN DOTACION NI CASCO NI
GUANTES
09-02-21

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana
Contratista : Se verifica que se haga la respectiva Desinfección de manos y Botas antes de ingresar al MV dando cumplimiento al protocolo, Se Realiza inducción al personal operativo que se va designando a cada MV en caso de ser nuevo y se deja encargado a cada grupo por la toma de condiciones de salud, , capacita a los Beneficiarios que se les hace entrega del mejoramiento sobre el uso de las tres canecas blanca,verde y negra para así den un buen uso y reciclaje, Se realizan charlas al personal operativo segun cronograma . **Interventoría:** Se verifica en los MV que el personal cumpla con todo lo debido al SG-SST y se habla que en las nuevas aperturas el personal debe contar con todo lo debido con el Área SST. Se espera que en esta próximas aperturas el personal que tenga hacer cubierta cuente con seguridad social,cursos de altura vigentes y permisos firmados por un coordinador de alturas. Inconformidades: -Un 96% del personal no cuenta con casco en los Mv -Exámenes de ingreso del personal faltante ya que llevan más de 5 dias laborando -Falta examenes con enfasis en alturas del personal que trabaja en el mismo. **Solicitudes al contratista:** - Verificar curso de altura que se adecuados a la actividad con su respectivo certificado que este avalado por el ministerio de trabajo. - Permiso de trabajo por el ministerio de trabajo para trabajar fines de semana ya que se consideran como tiempo extra. - Entrega de equipos de proteccion de caidas en buen estado y certificado de que son actos para su uso ya cuando se utilizaron de mas de un año. - Ficha tecnica de estos equipos de altura - Tener claros estos mv que se van hacer cubiertas - Certificado de escombros - Recoger escombro que aún sigue fuera de los MV ya que llevan más de dos días

INDUCCIÓN: se hace inducción al personal como se va asignando por vivienda por parte de la profesional sst del contratista, el cual realizará actividades en los MV aperturados socializando protocolo y políticas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar sus labores.	SI	100%
	REALIZADA	

2. Gestión Ambiental
En el momento no se tiene ningún residuo.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro		103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	NO SE ENTREGO ESTA SEMANA CERTIFICADOS
Escombro		103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	NO SE ENTREGO ESTA SEMANA CERTIFICADOS
Escombro		103,1	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	NO SE ENTREGO ESTA SEMANA CERTIFICADOS

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

3.1. Índices

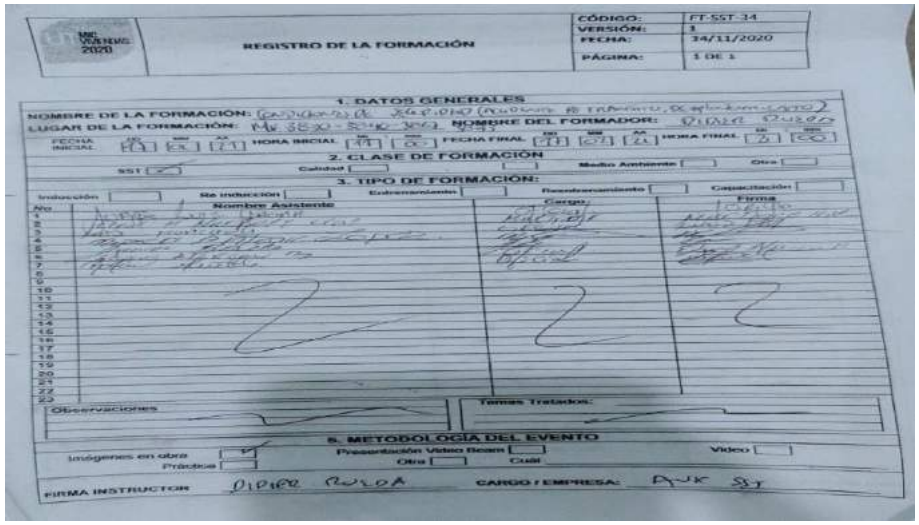
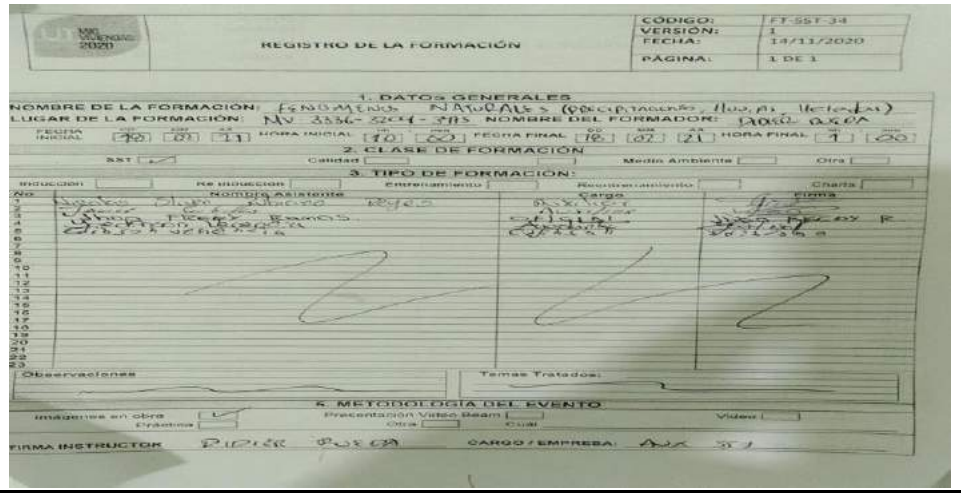
Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por festivos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**484**	**1**	**596**	**0**	**0**
Total Acumulado	**1452**	**1**	**1788**	**0**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

FECHA	CHARLA	FOTOS

17/2/2021	CONDICIONES DE SEGURIDAD	
18/2/2021	FENOMENOS NATURALES	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA FORMACIÓN: FENOMENOS NATURALES (PRECIPITACIONES, ILUVIAS, VIENTOS FUERTES)
LUGAR DE LA FORMACIÓN: NV 3336-3204-3115 NOMBRE DEL FORMADOR: DIEGO OJEDA
FECHA INICIAL: 18/01/21 HORA INICIAL: 10:00 FECHA FINAL: 18/02/21 HORA FINAL: 1:00

2. CLASE DE FORMACIÓN

SST: ✓ Calidad: Medio Ambiente: Otra:

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Inducción: Re inducción: Entrenamiento: Reentrenamiento: Charla:

No.	Nombre Asistente	Cargo	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Observaciones: Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

Imágenes en obra: ✓ Presentación Video Beam: Video:
Práctica: Otra: Cual:

FIRMA INSTRUCTOR: DIEGO OJEDA CARGO / EMPRESA: AyK SST

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar			
3.3.1 Condición Subestándar			
No	**Descripción**	**Acción Tomada**	**La Condición Continua?**
1	Se encuentra al personal sin elementos de protección personal	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
2	Se encuentra al personal sin Dotación adecuada para las actividades a realizar	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
4	Se encuentra trabajos ya realizados y otros por realizar en alturas sin autorización	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**

5	Se encuentra Escombro fuera de los Mv	Se habla con el personal y se les recuerda que deben dejar el escombro dentro del mv a menos de que el mismo dia pasen por el.	**SI**

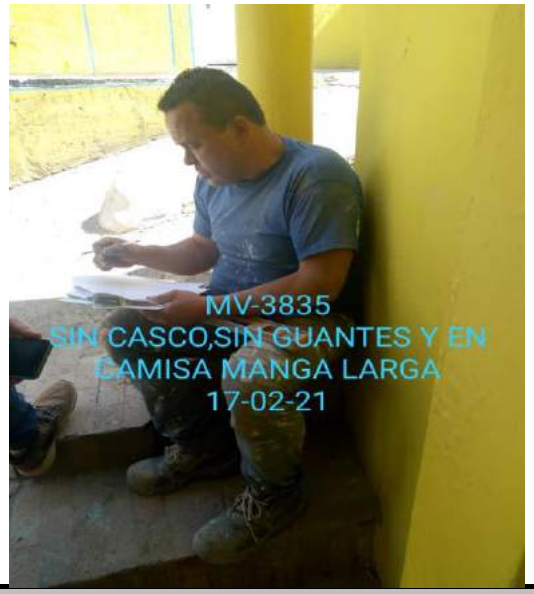
4. Registro Fotográfico

Imagen

















1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana
Contratista : Se verifica que se haga la respectiva Desinfección de manos y Botas antes de ingresar al MV dando cumplimiento al protocolo, Se Realiza inducción al personal operativo que se va designando a cada MV en caso de ser nuevo y se deja encargado a cada grupo por la toma de condiciones de salud, , capacita a los Beneficiarios que se les hace entrega del mejoramiento sobre el uso de las tres canecas blanca,verde y negra para así den un buen uso y reciclaje, Se realizan charlas al personal operativo segun cronograma . **Interventoría:** Se verifica en los MV que el personal cumpla con todo lo debido al SG-SST y se habla que en las nuevas aperturas el personal debe contar con todo lo debido con el Área SST. Se espera que en esta próximas aperturas el personal que tenga hacer cubierta cuente con seguridad social,cursos de altura vigentes y permisos firmados por un coordinador de alturas. Inconformidades: -Un 96% del personal no cuenta con casco en los Mv -Exámenes de ingreso del personal faltante ya que llevan más de 5 dias laborando -Falta examenes con enfasis en alturas del personal que trabaja en el mismo. **Solicitudes al contratista:** - Verificar curso de altura que se adecuados a la actividad con su respectivo certificado que este avalado por el ministerio de trabajo. - Permiso de trabajo por el ministerio de trabajo para trabajar fines de semana ya que se consideran como tiempo extra. - Entrega de equipos de proteccion de caidas en buen estado y certificado de que son actos para su uso ya cuando se utilizaron de mas de un año. - Ficha tecnica de estos equipos de altura - Tener claros estos mv que se van hacer cubiertas - Certificado de escombros - Recoger escombro que aún sigue fuera de los MV ya que llevan más de dos días

INDUCCIÓN: se hace inducción al personal como se va asignando por vivienda por parte de la profesional sst del contratista, el cual realizará actividades en los MV aperturados socializando protocolo y políticas que se deben tener en cuenta al momento de iniciar sus labores.	SI	100%
	REALIZADA	

2. Gestión Ambiental
En el momento no se tiene ningún residuo.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo	Cantidad m3	Acumulado	Sitio de Disposición	Observaciones
Escombro(22-02-21)	7.3 m3	117,7	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	
Escombro	7.3 m3	117,7	CEMEX (Escombrera tunjuelo)	

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

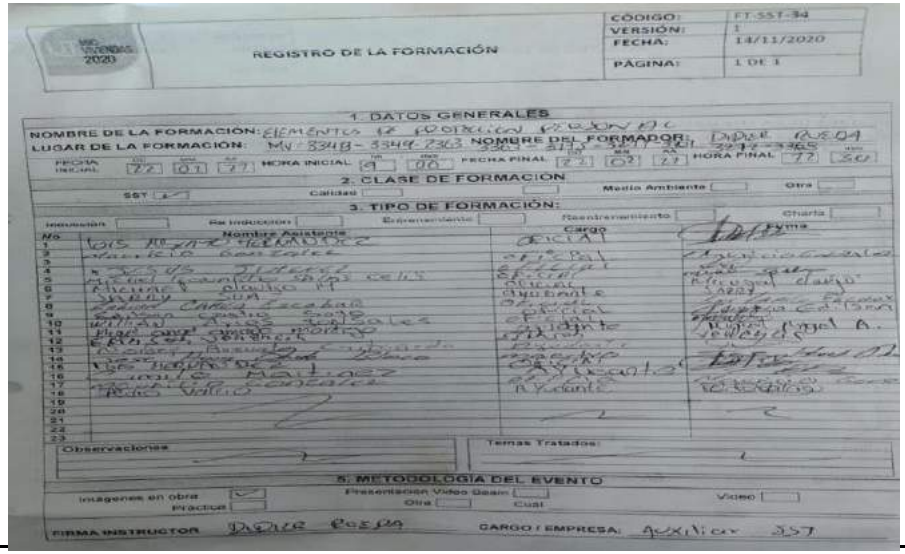
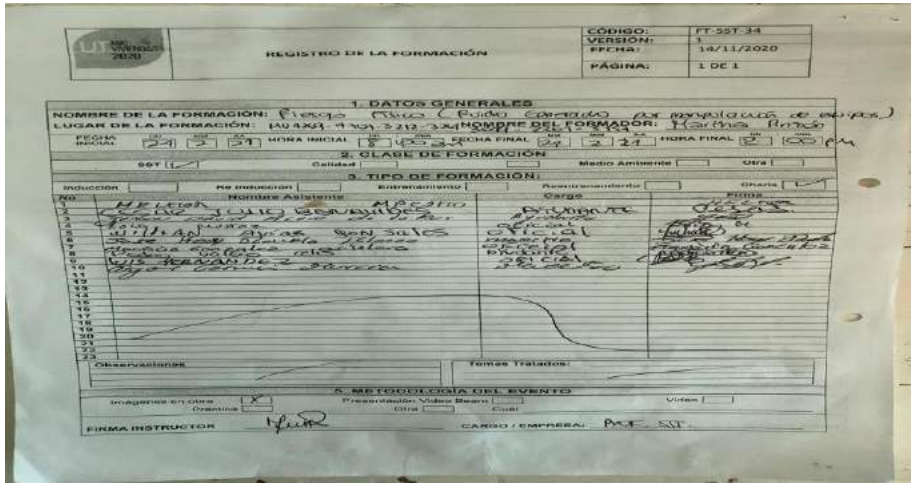
3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación	Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por festivos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
Total Semanales	**484**	**1**	**596**	**0**	**0**
Total Acumulado	**1936**	**1**	**2384**	**0**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento médico)
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2. Capacitaciones y Charlas

FECHA	CHARLA	FOTOS
22/2/2021	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
24/2/2021	RIESGO FISICO (MANIPULACION GENERADO POR MANIPULACION DE EQUIPOS)	

REGISTRO DE LA FORMACIÓN

CÓDIGO: FT-SST-34
VERSIÓN: 1
FECHA: 14/11/2020
PÁGINA: 1 DE 1

1. DATOS GENERALES

2. CLASE DE FORMACION

3. TIPO DE FORMACIÓN:

Observaciones

Temas Tratados:

5. METODOLOGÍA DEL EVENTO

FIRMA INSTRUCTOR

CARGO / EMPRESA:

3.3. Condiciones y Acciones Subsanar			
3.3.1 Condición Subestándar			
No	**Descripción**	**Acción Tomada**	**La Condición Continua?**
1	Se encuentra al personal sin elementos de protección personal	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
2	Se encuentra al personal sin Dotación adecuada para las actividades a realizar	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**
4	Se encuentra trabajos ya realizados y otros por realizar en alturas sin autorización	Se detienen actividades y se anota en Bitácora este hallazgo y se le reporta al contratista y el beneficiario que hasta que no esté subsanado no pueden seguir laborando	**SI**

5	Se encuentra Escombro fuera de los Mv	Se habla con el personal y se les recuerda que deben dejar el escombro dentro del mv a menos de que el mismo dia pasen por el.	**SI**

4. Registro Fotográfico

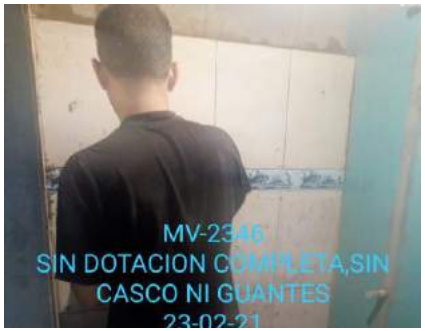
Imagen

























ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SISO

Inplayco S.A.S.

Fecha: 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES O CHARLAS					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NÚMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kgs)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TÉCNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	RELACIÓN DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
CONTRATO 695 - 2020 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020			Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaria Distrital de Hábitat. Grupo II	212	1696	0,0	0,0	2,2	0	0	15	0	15		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	2,2	0	0	0	0	0		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	2,2	0	0	15	0	15		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	2,2	0	0	0	0	0		00/00/0000	0	0					
				212	1696	0,0	0,0	2,2	0	0	0	0	0		00/00/0000	0	0					
				212	1060	0,0	0,0	2,2	0	0	0	0	0		00/00/0000	0	0					
				212	9540	0,0	0,0	13,0	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0	0	0	0		0			

ELABORÓ: JOHN RODRIGO NORENA BAEZ-PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO

MV:ACTIVOS
54

PROMEDIO DE CONSUMO DE AGUA POR MV	
LITROS	40
m3	0,04

INDICADORES SST- CONTRATO No. 4952018	
META AL PLAN AMBIENTAL 100%	%
META AL PLAN DE CALIDAD 100%	%
HORAS HOMBRE SEMANAL	9.540
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	38.160
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	30,00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADA MENSUAL	120,00

INFORME SISO
Inplayco S.A.S.

Fecha: 22 de Febrero al 27 de Febrero de 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIDAS (Fechas)	OBSERVACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION SST - POLITICAS - PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD COVID - 19, Elementos de proteccion personal - Riesgo Fisico	Se verifica que sean efectivas las charlas, de igual manera estas se hacen según el cronograma SST y novedades de los MV .				

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acomuladas mes)	29
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal Semanal	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acomuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	13
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	52

INFORME SISO

Fecha: 1 de Febrero al 28 de febrero de 2021

CONTRATO: 695 - 2020
UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
		ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE			
1	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA MAS DE DOS DIAS	0	1	18/2/2021	23/2/2021	MV 3209		
2	Se encuentra al personal sin Dotacion adecuada para las actividades a realizar	0	1	18/2/2021	18/2/2021	MV 3209		
3	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	0	1	22/2/2021	22/2/2021	CASA 58 ZONA COMPARTIR TRABAJADORA PAOLA BOHORQUEZ CUENTA CON TODAS LAS AFILIACIONES.	  	
4	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA MAS DE DOS DIAS	1	0	22/2/2021				

5	Se encuentra al personal en los MV sin estar afiliados a seguridad social	0	1	23/2/2021	23/2/2021	MV 3361 TRABAJADOR LUIS HERNANDEZ. EL TRABAJADOR TIENE EXAMEN MEDICO DE INGRESO Y CUENTA CON TODAS LAS AFILIACIONES.	
6	ESCOMBROS FUERA DE LA VIVIENDA MAS DE DOS DIAS	0	1	22/2/2021	24/2/2021	MV 3830	 
		1	5				

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	1
TOTAL ACCIONES CERRADAS	5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DEL HABITAT

INFORME SISO

Fecha: 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	X		ok	x	AXA COLPATRIA	x		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	20/11/2020	X		ok	ok	X		x	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	X		x	ok	AXA COLPATRIA	x		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	X		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	20/11/2020	X		x	x	AXA COLPATRIA	x		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	x		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	x		ok	ok	X		x	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	x		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	x		ok	ok	AXA COLPATRIA	x		
			TOTAL	**16**	**0**			**TOTAL**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
									ACTIVO	RETIRADO	
1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020		X	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA		X	
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020		X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	X		
3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021		X	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	X		
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020		X	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	X		
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020		X	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	X		
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020		X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	X		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020		X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020		X	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	X		
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020		X	CAPITAL SALUD	ADMUTUAL	POSITIVA	X		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020		X	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	X		
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020		X	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	X		
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020		X	X	PORVENIR	POSITIVA		X	envio copia de contraseña comprobando que fue rechazada en la EPS salud total ya que esta vencida
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		X	
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020		X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	X		
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020		X	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020		X	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	X		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020		X	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA		X	
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020		X	EPS SURA	COLFONDOS	POSITIVA	X		
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020		X	CONVIDA	X	POSITIVA	X		estaba cotizando en el fondo de pensiones PORVENIR; ya tiene la edad para tramitar la
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020		X	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020		X	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	X		
44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020		X	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	X		
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020		X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	X		
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		

49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020		X	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	X		
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020		X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020		X	SURA	PORVENIR	POSITIVA	X		
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020		X	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020		X	X	PORVENIR	POSITIVA	X		la EPS CAPITAL SALUD solicita los documentos de los hijo del señor MICHEL RINCON para hacer la
57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020		X	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	X		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020		X	COMPESAR	PROTECCION	POSITIVA	X		
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020		X	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA	X		
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		X	
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020		X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		X	
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020		X	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	X		
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020		X	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	X		
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020		X	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	X		
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA		X	
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020		X	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020		X	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA		X	
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		X	
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020		X	CONVIDA	PORVENIR	POSITIVA		X	
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020		X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	X		
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020		X	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA		X	
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020		X	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA		X	
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		X	
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020		X	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	X		
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020		X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021		X	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	X		
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020		X	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	X		
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020		X	X	PORVENIR	POSITIVA	X		NO HA LLEVADO LAS COPIAS DEL REGISTRO CIVIL DE LOS HIJOS
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021		X	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	X		
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021		X	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021		X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021		X	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	X		
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021		X	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	X		
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	X		
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021		X	EPS SURA	PORVENIR	POSITIVA	X		
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021		X	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	X		
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021		X	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA		X	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SISO

Fecha: 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

OBSERVACIONES

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	22/1/2020	X			X	X		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	23/11/2020	X			X	X		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	30/11/2020	30/11/2020	X			X		X	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	X	X			X	X		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	13/11/2020	X			X	X		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	30/11/2020	1/12/2020	X			X	X		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	5/11/2020	X			X		X	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	X	X		X		X		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	24/11/2020	X			X	X		
RESULTADOS:					**16**	**0**	**2**	**16**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	OBSERVACIONES

1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020			X				X	
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020	2/12/2020		X			X		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020			X			X		
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020	2/12/2020		X			X		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020	2/12/2020		X			X		
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020	2/12/2020		X	X		X		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020			X			X		
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020	2/12/2020		X			X		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020			X			X		
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020			X			X		
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020	2/12/2020		X			X		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020			X				X	
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020	14/10/2020		X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020			X			X		
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020			X			X		
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020	18/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020			X			X		

52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020	22/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020	2/12/2020		X			X		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020			X			X		
57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020	18/12/2020		X			X		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020	2/12/2020		X			X		
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020	2/12/2020		X			X		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020			X			X		
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021			X			X		
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020			X			X		
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

103	JEISSON TORRES CARREÑO	1023033517	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
104	JOSE CAÑON SANA	79452832	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
105	JOSE OSPINA MUÑOZ	449569	8/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
106	LESCARLOS BAUTISTA	1003124440	7/01/2021			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
107	OMAR GOMEZ MEDINA	M833897123021999	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
108	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
109	JONNY PALACIOS JUYO	1000514366	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
110	JOSMAN OSORIO GAONA	1022427780	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
111	LUIS REYES RODRIGUEZ	79655749	12/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
112	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1033687438	12/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
113	WILSON MORALES PEÑA	1033697359	9/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
114	ANDRES BARON ALVAREZ	1033783510	12/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
115	JHONATAN RAMIREZ MOLINA	1010209390	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
116	ROGELIO ROBLES BELLO	19935160	13/01/2021			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
117	CRISTIAN LINARES BELTRAN	1000855005	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
118	JUAN LADINO CASTELBLANCO	1033696448	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
119	ALONSO SOLER DUMAR ALEXIS	1002682938	24/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
120	ABELLO TRIANA GIOVANNY ALEXANDER	1013636864	26/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
121	PALMERO ROIMAN RAMO	948216420011	18/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
122	OSPINA TOVAR ALEJANDRO	82338410	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
123	SILVA LOPEZ LEONAL GERARDO	PE 456736120091984	17/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
124	CIPRIAN FRANCO JORGE ANATOLIO	79769383	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
125	VIVAS CALDERON OVIDIO	79493842	24/11/2020	2/12/2020		X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
126	VIVAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO	79493842	17/11/2020			X				X	
127	CRUZ CRUZ MANUEL LEONARDO	79573733	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
128	MARTINEZ BUSTOS JHONY	79583292	25/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
129	MESA LEON JOSE JAVIER	79322883	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
130	GARCIA RINCON LUIS ALFONSO	79668467	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
131	ACERO OJEDA CARLOS ARTURO	79433284	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
132	RIVERA GOMEZ WILSON ENRIQUE	11524043	23/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
133	CARDONA JARAMILLO JORGE ANTONIO	16111922	21/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
134	FORERO ARTEAGA JORGE	19350740	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
135	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
136	GOMEZ FUENTES CARLOS ANDRES	1073603255	16/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
137	MOSQUERA MOSQUERA JHON DAVID	1015460856	25/11/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
138	RUIZ CASTELLANOS CARLOS ONEIBER	1018414764	23/11/2020			X				X	
139	TORRES CARREÑO JEFFER FABIAN	1023013197	24/11/2020			X				X	
140	HERNANDEZ DIEGO HERNAN	1032405268	24/11/2020			X				X	
141	GABRIEL GARAVITO SALAMANCA	79345951	14/01/2021			X			X		
142	HABITH OROZCO OLIVERO	1051361502	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
143	JESUS JIMENEZ	M818438318091981	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
144	MIGUEL SERRATO ALVAREZ	10325113211	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
145	ROBER CESPEDES MIQUELENA	M835657422111975	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
146	WILLIAM GORDO ROJAS	1033706587	14/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
147	JOSE PINILLA GONZALEZ	79670742	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
148	WILSON PEREZ SERRATO	79975166	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
149	ADELINO MALLARINO ACEVEDO	73094673	15/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
150	DANIEL RODRIGUEZ MAHECHA	80200854	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
151	PEDRO VALERO CELIS	M835190319011994	15/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
152	KEVIN AREVALO SUAREZ	1000338453	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
153	LUIS MOLINA GUTIERREZ	80722832	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso

154	MIGUEL ORTIZ MORA	1106781809	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
155	PABLO MORA CORTES	80769891	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
156	ALFREDO GUTIERREZ LACRUZ	M944669825031995	15/01/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
157	JUSTIN TRIVIÑO DELGADO	1000727448	15/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
158	CRIPRIANO PIÑEROS	79703764	30/11/2020	2/12/2020		X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
159	JORGE BEROES	M933222013111989	14/01/2021			X			X		
160	RAUL OSORIO RINCON	79669250	17/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
161	VICTOR GUERRERO PACHECO	80126593	26/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
162	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1101879446	25/11/2020	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
163	CARLOS OVIEDO GOMEZ	1024502152	20/01/2021			X			X		
164	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1033776296	20/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
165	RAFAEL GAMEZ MARTINEZ	1065810726	20/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
166	DUVAN HERNANDEZ	1082974394	26/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
167	DEIBY PEDRAZA LONDOÑO	1012343367	10/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
168	NICOLAS RUBIANO REYES	1001276100	28/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
169	WILLIAM PEDRAZA LONDOÑO	80214620	15/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
170	OSCAR PULIDO GUEVARA	1012443203	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
171	MICHAEL CRISTIANO RAMIREZ	1033806404	4/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
172	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80774495	6/02/2021			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
173	ANDRES BARAHONA GOMEZ	80256059	22/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
174	JOHN RAMOS YAGUARA	80748603	7/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
175	EDILBERTO CAÑON CASALLAS	79924548	5/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
176	ANDRES PEREZ ARIAS	1063625214	5/02/2021	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
177	MICHEL SALAS CELIS	1033766212	17/11/2020	2/12/2020		X			X		
178	OSBAR BERNAL PAEZ	80778371	20/11/2020	2/12/2020		X			X		
179	WILSON BERNAL GUSCA	1033707175	11/02/2021	2/12/2020		X			X		
180	ANDERSON BUSTOS ZULUAGA	1000694458	8/02/2021			X			X		
181	JOHAN CESPEDES MENDOZA	1013694701	9/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
182	KEVIN MARTINEZ RODRIGUEZ	1000118548	9/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
183	EDGAR MURCIA ORDOÑEZ	14322354	12/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
184	OSWALDO RINCON	1047512742	13/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
185	LUIS HERNANDEZ BARRERO	80858697	13/01/2021	2/12/2020		X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
186	JAISON ACERO DE LA ROSA	1044391694	18/02/2021			X			X		
187	MARLON GUZMAN TRANSLAVIÑA	1007339845	15/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
188	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1024482810	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
189	LUIS CARRILLO	79460485	18/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
190	MIGUEL AMADO MONTEJO	1007392839	18/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
200	PAOLA BOHORQUEZ RUBIANO	53152764	18/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
201	EDILSON CASTRO SOTO	1033680989	25/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
RESULTADOS:				**34**	**0**	**35**	**6**				

ACUARELA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO/NO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	ACTIVO	RETIRADO	OBSERVACIONES

1	CARLOS JAVIER PALENCIA JIMENEZ	1143171522	11/12/2020			X			X		
2	ALEXIS MENDEZ GARCIA	96193680312				X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
3	ARLEY CAMILO GIRALDO ORTIZ	1.013.689.988	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
4	RONALDO CASTRO SANCHEZ	102460239	15/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
5	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
6	FERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO	773439426021978	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
7	HUMBERTO MOSCOSO GARCIA	71536150	18/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
8	IVAN ANTONIO LOPEZ CHIVATA	1002314572	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
9	JUNIOR DAVID BRACHO	Z831775706 081987	11/12/20			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
10	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRERO	79502676	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
11	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1031152755	25/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
12	MIGUEL ANGEL REY CUADROS	1024541228	4/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
13	MIGUEL RIVERO	2761157	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
14	PEDRO RUIZ ANGULO	98429140	11/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
15	PERALES FLORIAN DAIRO	85.163.998	12/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
16	RAFAEL HERNANDEZ ARANDA	834934223101995	12/12/20			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
17	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	9712761	24/11/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
18	WILMAR DELGADO	1003923499	11/12/20			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
19	WILMER ANDRES MENDIETA ALVAREZ	1022938136	9/12/2020	2/10/2020		X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
20	PEDRO MONDRAGON VACA	4047037	13/01/2021	3/01/2021		X	X			X	
21	JUAN CARLOS CERQUERA MENDEZ	80859935	2/02/2021			X			X		
22	JOINER DAVID BRACHO GONZALEZ	26126465	25/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
23	HERNAN VANEGAS IBAÑEZ	80896790	26/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
24	JUAN RAMIREZ MANCERA	79990751	23/12/2020			X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
25	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	20/12/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
26	ANGEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ	79726856	31/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
27	ANDRES DELGADO	1031182992	15/02/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
28	BRAYAN MONSALVE	1033783407	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
29	CAMILO GANOA SOTELO	1033726953	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
30	EDISON CASTRO	1033719974	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
31	EDIXON GUTIERREZ LOAIZA	86086644	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
32	JOAN ARIAS GOMEZ	1033812687	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
33	MAURICIO JAIMES LUCENA	79407194	31/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
34	WILLIAM BONILLA OSORIO	1032376827	5/09/2019			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
35	WILMER PIÑA	1237443301	30/10/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
36	EDIGAR RAMOS ROMERO	842225131101984	12/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
37	VARGAS MENDOZA DIOCEL STEVENS	1.006.857.064	5/09/2019			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
38	BRAYAN STEVEN ROJAS	1024594954	12/12/2020			X				X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
39	LUCIANO TOVAR MER	92558171	18/11/2020		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
40	ANDRES MAURICIO TORRES	1070957742	18/11/2020		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
41	GINETTE NATALIA TORRES DIAZ	1014195383	SURA		X					X	No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
42	MARIA ELENA MENCO COLON	1102870684	27/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
43	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	1013647069	18/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
44	JUAN CARLOS CORREA MARTINEZ	79273846	24/11/2020		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
45	WILMER TORRES LEAL	1012426714	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
46	NICOLAS MONTOYA SARMIENTO	79668628	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
47	RAFAEL MONTILLA MENDOZA	1043613599	29/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
48	LUIS SAMACA	79465357	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
49	LUIS FRANCISCO MIONCADA MONCADA	1098170318	2/02/2021	30/07/2020		X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
50	JOHAN ARIZA	1005294400	2/02/2021			X				X	

51	EDGAR MARTINEZ	79296107	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
52	EDGAR ANDRES ALARCON BERCALDO	1032448252	23/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
53	CRISTIAN DELGADO CASTRO	1003923418	2/02/2021	19/01/2021		X	X		X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
54	ELIO RIVERA ORTIZ	79679114	29/01/2021			X			X		
55	LUIS CHICUASAQUE ARIAS	1033728934	29/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
56	JORGE GANOA BETANCUR	1033773045	29/01/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
57	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	82946815091992	4/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
58	JOSE MUÑOZ	82497852705	4/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
59	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7330323	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
60	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4103403	15/12/2020			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
61	EDILBERTO CRUZ SANTA	106780037	4/02/2021		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
62	YESID MANUEL TAPIA	79355917	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
63	JOSE EDGAR IBAGUE	79480674	2/02/2021		X				X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
64	JOSE FRANCISCO ZAMUDIO VARGAS	1006737961	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
65	JHON FREDY URREGO	107249670	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
66	DUBERNEY LIZCANO MONROY	1083882905	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
67	JHON FREDDY TRUJILLO	17497039	2/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
68	CARLOS ALBERTO TALERO PINEDA	1033739164	21/02/2021			X			X		No se encuentra aun el reporte examenes de ingreso
RESULTADOS:				**4**			**5**		**49**	**19**	

INFORME SISO

Fecha: 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

CONTRATO: 695-2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MIC VIVIENDAS 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

ADMINISTRATIVO
UT MIC VIVIENDAS 2020

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	Yuly Andrea Casas Merchán	1.032.387.457	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
2	Adriana Ximena Santana Romero	52.476.883	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
3	Nancy Alejandra Charry Ávila	1.015.413.551	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
4	Robert Andrey Benavides Novoa	1.019.026.005	20/11/2020	22/01/2020	X		X		X		
5	Astrid Espitia López	1.023.874.373	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
6	Alba Cristina Melo Martínez	36.759.988	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
7	José Dionisio Cárdenas Bolívar	79.511.489	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
8	Omar Yesid Cifuentes Cristiano	1.124.827.565	20/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
9	Jesús Andrés Melo Gachancipá	79.690.448	30/11/2020	30/11/2020	X		X			X	
10	Adriana Castelblanco	52.428.231	20/11/2020	30/11/2020	X		X		X		
11	Sharon Adriana Arias Aldana	1.013.673.517	20/11/2020	13/11/2020	X		X		X		
12	Daniela Sanchéz Molina	1.015.463.608	30/11/2020	1/12/2020	X		X		X		
13	Martha Yolanda Pinzón Silva	1.101.685.570	20/11/2020	23/11/2020	X		X		X		
14	Paula Betancourt Uzeta	1030684980	10/12/2020	5/11/2020	X		X			X	
15	Didier Alexis Rueda Monsalve	1.100.964.716	7/1/2021	X	X		X		X		
16	Juan Andres Corredor Mayorga	1.022.401.358	28/1/2021	X	X		X		X		
RESULTADOS:					**16**	**0**	**16**	**0**	**14**	**2**	

OPERATIVO
AHME CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	

1	FLORENCIO FORERO ARTEAGA	79582932	17/11/2020			X	X			X	
2	GILDARDO DUQUE CIFUENTES	80237066	17/11/2020			X	X		X		
3	JHON BEJARANO TENZA	1013585125	17/11/2020			X	X		X		
4	JORGE MORA CORTES	80771112	17/11/2020			X	X		X		
5	ROBINSON CIFUENTES VALENCIA	1095808493	19/01/2021			X	X		X		
6	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	M836225801071979	18/11/2020			X	X		X		
7	ROBERT SALAZAR CARREÑO	M835913327071985	18/11/2020			X	X		X		
8	FABIO SILVA ORTEGA	2954992	24/11/2020			X	X		X		
9	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRRY	16833656	24/11/2020			X	X		X		
10	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	12270044	24/11/2020			X	X		X		
11	LUIS GARCES GOMEZ	79354168	13/12/2020			X	X		X		
12	WILLIAM ARIAS GONZALEZ	80063977	26/11/2020			X	X		X		
13	ANDRES DURAN ESTEPA	1033760141	1/12/2020			X	X		X		
14	NORBEY AREVALO CASTAÑEDA	18235741	1/12/2020			X	X		X		
15	HECTOR RAMIREZ GOMEZ	14259617	1/12/2020			X	X		X		
16	RIGOBERTO ESTREN CAMAÑO	1129525247	1/12/2020			X	X		X		
17	MAICOL DURAN BENITEZ	1033768558	1/12/2020			X	X		X		
18	DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	1/12/2020			X	X		X		
19	WILLIANS MERIÑO BAEZ	1032510255	10/12/2020			X	X		X		
20	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1067038139	8/12/2020			X	X		X		
21	DIEGO CORRECHA RIVERA	93207369	12/12/2020			X	X		X		
22	JOSE DOMINGO AREVALO	3232140	24/11/2020			X	X		X		
23	STIVEN PRIETO OLIVEROS	1033810108	1/12/2020			X	X		X		
24	MAURICIO FREIRE	79267381	12/11/2020			X	X		X		
25	JUAN HERAZO VALDES	79476251	17/11/2020			X	X		X		
26	SADDIEL BERTI RODRIGUEZ	942458427051975	25/11/2020			X	X		X		
27	FIDEL RODRIGUEZ	1033480242	11/12/2020			X	X			X	
28	MICHEL GAMBA MELO	1000107874	11/12/2020			X	X		X		
29	JHON MAYORGA BENAVIDES	1033721955	1/12/2020			X	X		X		
30	EDUARD VALENZUELA	1026576425	18/11/2020			X	X			X	
31	EDWIN BUITRAGO	1070919070	10/12/2020			X	X		X		
32	ISAAC MONTOYA	19212654	8/12/2020			X	X		X		
33	JHON EDWIN ZULUAGA	1032401694	1/12/2020			X	X		X		
34	OCTAVIO MOLANO	91107563	8/12/2020			X	X		X		
35	EDWIN FERREIRA BRACHO	810277414021984	10/12/2020			X	X		X		
36	JAIVER CRISPIN VANEGAS	79609536	4/12/2020			X	X		X		
37	JOSE RUIZ MUÑOZ	1033750096	8/12/2020			X	X		X		
38	LUIS EVELIO HERNANDEZ	19219713	9/12/2020			X	X		X		
39	CESAR PARDO PEÑA	79863108	8/12/2020			X	X			X	
40	DIEGO PEÑA PEÑA	1069303999	11/12/2020			X	X		X		
41	PEDRO PEÑA ROMERO	261568	10/12/2020			X	X		X		
42	ALEJANDRO RANGEL PARRA	PM801726928092000	11/12/2020			X	X		X		
43	DOMINGO MENDOZA GARCIA	PM809306716031969	10/12/2020			X	X		X		

44	JOSE RODRIGUEZ CASTIBLANCO	19399343	24/11/2020			x	x		x		
45	JONATHAN QUIMBAY RODRIGUEZ	80165089	24/11/2020			x	x		x		
46	JOSE RAVELO BLANCO	79769383	27/11/2020			x	x		x		
47	ANDRES GUTIERREZ PARRA	10331136682	12/12/2020			x	x		x		
48	BRANDON REYES RONCANCIO	1001284627	11/12/2020			x	x		x		
49	DIEGO YAGUARA GARCIA	1111337806	4/12/2020			x	x		x		
50	DIONER PULIDO GAMBA	79913877	12/12/2020			x	x		x		
51	JEDER VEGA PRIETO	79223253	11/12/2020			x	x		x		
52	JEFFERSON RAMIREZ AVILA	100022415	11/12/2020			x	x		x		
53	JOSE CORDOBA MAHECHA	80842696	12/12/2020			x	x		x		
54	JOSE MAURICIO GONZALEZ QUINTERO	79666743	26/11/2020			x	x		x		
55	LUIS BUITRAGO LAVERDE	1070916164	18/11/2020			x	x		x		
56	MICHAEL RINCON ROJAS	1000616916	12/12/2020			x	x		x		
57	ROQUE PARRA ESTUPIÑAN	13925263	1/12/2020			x	x		x		
58	RUBEN SANCHEZ SALAMANCA	1032487616	12/12/2020			x	x		x		
59	STEVEN BALLEN ARIZA	1013613490	12/12/2020			x	x		x		
60	WILSON LUNA DAZA	79767907	1/12/2020			x	x		x		
61	YAIR VEGA VEGA	1000364494	11/12/2020			x	x		x		
62	YORWIN VARGAS GONZALEZ	M836663326081993	11/12/2020			x	x			x	
63	JOSE LINARES LINARES	80376575	26/11/2020			x	x			x	
64	NERY VILLAMIZAR LOZANO	1022971724	27/11/2020			x	x		x		
65	ORLANDO DE JESUS ROJAS	1018467716	11/12/2020			x	x		x		
66	HENRY CONDE HIGARDO	772500127031	13/12/2020			x	x		x		
67	JHON ELIECER GONZALEZ	80247578	13/12/2020			x	x		x		
68	NORMAN RINCON ROJAS	1024514956	17/11/2020			x	x		x		
69	VICTOR RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	17/11/2020			x	x		x		
70	CARLOS ORTIZ CASTAÑO	1045764905	13/12/2020			x	x		x		
71	ANDRES GARCIA	80895628	15/12/2020			x	x			x	
72	CARLOS MUÑOZ MONROY	3162248	15/12/2020			x	x		x		
73	EDGAR RAMIREZ	79922315	15/12/2020			x	x			x	
74	EMMANEL GUILLEN MENDOZA	M734208408021983	15/12/2020			x	x		x		
75	JEISON LOPEZ MEJIA	1033816388	15/12/2020			x	x			x	
76	JULIAN ARAGON DEVIA	1030628205	15/12/2020			x	x			x	
77	CRISTIAN AVILA CORTES	1033814196	16/12/2020			x	x		x		
78	LUIS DURAN BENITEZ	80373984	16/12/2020			x	x		x		
79	MAYBER DUQUE RODRIGUEZ	1000693460	15/12/2020			x	x		x		
80	EDINSON VENENCIA	72120789	24/11/2020			x	x		x		
81	BRIAM LOAIZA MARTINEZ	1024534272	18/12/2020			x	x			x	
82	CESAR BENAVIDES JIMENEZ	1193036484	27/11/2020			x	x			x	
83	CRISTIAN GARCIA ROJAS	1024538808	19/12/2020			x	x			x	
84	JUAN PEROZO ROMERO	832140302061977	22/12/2020			x	x		x		
85	WILFREDO TORRES FLOREZ	944410404111983	21/12/2020			x	x		x		
86	HECTOR CHOURIO	14444608	2/12/2020			x	x		x		

87	ANGEL DUARTE ROMERO	79666071	11/12/2020			x	x		x		
88	JOSE MARTINEZ VARGAS	79666136	27/11/2020			x	x		x		
89	VICTOR RIZO MIRANDA	1066097223	5/01/2021			x	x		x		
90	EDER GONZALEZ CASTELBONDO	84062070	1/12/2020			x	x		x		
91	FERNANDO MORENO HUERTAS	3199429	26/11/2020			x	x		x		
92	ILDEFONSO PEÑARANDA IGUARAN	1118873986	1/12/2020			x	x		x		
93	MANUEL MARTINEZ DUARTE	79560342	16/12/2020			x	x		x		
94	VICTOR AVILA MARTINEZ	79595625	8/01/2021			x	x		x		
95	ALEX AREVALO CORTES	79919441	7/01/2021			x	x		x		
96	ANDRES PARRA GUTIERREZ	1023947059	7/01/2021			x	x		x		
97	ARNALDO PIÑERUA	M90671322411978	5/01/2021			x	x		x		
98	CRISTIAN VELANDIA CASTIBLANCO	1012361554	7/01/2021			x	x		x		
99	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	1043606888	6/01/2021			x	x		x		
100	FABIAN TORRES GARCIA	79808126	6/01/2021			x	x		x		
101	FRANCISCO CUBILLOS CHIQUINQUIRA	1023895682	7/01/2021			x	x		x		
102	WILLIAM GARZON	79956633	7/01/2021			x	x			x	
103	JEISSON TORRES CARREÑO	1023033517	7/01/2021			x	x		x		
104	JOSE CAÑON SANA	79452832	7/01/2021			x	x		x		
105	JOSE OSPINA MUÑOZ	449569	8/01/2021			x	x		x		
106	LESCARLOS BAUTISTA	1003124440	7/01/2021			x	x		x		
107	OMAR GOMEZ MEDINA	M833897123021999	7/01/2021			x	x		x		
108	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	7/01/2021			x	x		x		
109	JONNY PALACIOS JUYO	1000514366	7/01/2021			x	x		x		
110	JOSMAN OSORIO GAONA	1022427780	7/01/2021			x	x		x		
111	LUIS REYES RODRIGUEZ	79655749	12/01/2021			x	x		x		
112	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1033687438	12/01/2021			x	x		x		
113	WILSON MORALES PEÑA	1033697359	9/01/2021			x	x		x		
114	ANDRES BARON ALVAREZ	1033783510	12/01/2021			x	x		x		
115	JHONATAN RAMIREZ MOLINA	1010209390	13/01/2021			x	x		x		
116	ROGELIO ROBLES BELLO	19935160	13/01/2021			x	x		x		
117	CRISTIAN LINARES BELTRAN	1000855005	18/11/2020			x	x			x	
118	JUAN LADINO CASTELBLANCO	1033696448	23/11/2020			x	x			x	
119	ALONSO SOLER DUMAR ALEXIS	1002682938	24/11/2020			x	x			x	
120	ABELLO TRIANA GIOVANNY ALEXANDER	1013636864	26/11/2020			x	x			x	
121	PALMERO ROIMAN RAMO	948216420011	18/11/2020			x	x			x	
122	OSPINA TOVAR ALEJANDRO	82338410	16/11/2020			x	x			x	
123	SILVA LOPEZ LEONAL GERARDO	PE 456736120091984	17/11/2020			x	x			x	
124	CIPRIAN FRANCO JORGE ANATOLIO	79769383	23/11/2020			x	x			x	
125	VIVAS CALDERON OVIDIO	79493842	24/11/2020			x	x			x	
126	VIVAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO	79493842	17/11/2020			x	x			x	
127	CRUZ CRUZ MANUEL LEONARDO	79573733	23/11/2020			x	x			x	
128	MARTINEZ BUSTOS JHONY	79583292	25/11/2020			x	x			x	
129	MESA LEON JOSE JAVIER	79322883	23/11/2020			x	x			x	

130	GARCIA RINCON LUIS ALFONSO	79668467	16/11/2020			x	x			x	
131	ACERO OJEDA CARLOS ARTURO	79433284	16/11/2020			x	x			x	
132	RIVERA GOMEZ WILSON ENRIQUE	11524043	23/11/2020			x	x			x	
133	CARDONA JARAMILLO JORGE ANTONIO	16111922	21/12/2020			x	x			x	
134	FORERO ARTEAGA JORGE	19350740	16/11/2020			x	x			x	
135	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/11/2020			x	x			x	
136	GOMEZ FUENTES CARLOS ANDRES	1073603255	16/11/2020			x	x			x	
137	MOSQUERA MOSQUERA JHON DAVID	1015460856	25/11/2020			x	x			x	
138	RUIZ CASTELLANOS CARLOS ONEIBER	1018414764	23/11/2020			x	x			x	
139	TORRES CARREÑO JEFFER FABIAN	1023013197	24/11/2020			x	x			x	
140	HERNANDEZ DIEGO HERNAN	1032405268	24/11/2020			x	x			x	
141	GABRIEL GARAVITO SALAMANCA	79345951	14/01/2021			x	x		x		
142	HABITH OROZCO OLIVERO	1051361502	13/01/2021			x	x		x		
143	JESUS JIMENEZ	M818438318091981	14/01/2021			x	x		x		
144	MIGUEL SERRATO ALVAREZ	10325113211	14/01/2021			x	x		x		
145	ROBER CESPEDES MIQUELENA	M835657422111975	14/01/2021			x	x		x		
146	WILLIAM GORDO ROJAS	1033706587	14/01/2021			x	x		x		
147	JOSE PINILLA GONZALEZ	79670742	13/01/2021			x	x		x		
148	WILSON PEREZ SERRATO	79975166	13/01/2021			x	x		x		
149	ADELINO MALLARINO ACEVEDO	73094673	15/01/2021			x	x		x		
150	DANIEL RODRIGUEZ MAHECHA	80200854	15/01/2021			x	x			x	
151	PEDRO VALERO CELIS	M835190319011994	15/01/2021			x	x		x		
152	KEVIN AREVALO SUAREZ	1000338453	18/01/2021			x	x		x		
153	LUIS MOLINA GUTIERREZ	80722832	18/01/2021			x	x		x		
154	MIGUEL ORTIZ MORA	1106781809	18/01/2021			x	x		x		
155	PABLO MORA CORTES	80769891	18/01/2021			x	x		x		
156	ALFREDO GUTIERREZ LACRUZ	M944669825031995	15/01/2021			x	x			x	
157	JUSTIN TRIVIÑO DELGADO	1000727448	15/01/2021			x	x		x		
158	CRIPRIANO PIÑEROS	79703764	30/11/2020			x	x			x	
159	JORGE BEROES	M933222013111989	14/01/2021			x	x		x		
160	RAUL OSORIO RINCON	79669250	17/11/2020			x	x		x		
161	VICTOR GUERRERO PACHECO	80126593	26/11/2020			x	x		x		
162	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1101879446	25/11/2020			x	x		x		
163	CARLOS OVIEDO GOMEZ	1024502152	20/01/2021			x	x		x		
164	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1033776296	20/01/2021			x	x		x		
165	RAFAEL GAMEZ MARTINEZ	1065810726	20/01/2021			x	x		x		
166	DUVAN HERNANDEZ	1082974394	26/01/2021			x	x		x		
167	DEIBY PEDRAZA LONDOÑO	1012343367	10/12/2020			x	x			x	
168	NICOLAS RUBIANO REYES	1001276100	28/01/2021			x	x		x		
169	WILLIAM PEDRAZA LONDOÑO	80214620	15/01/2021			x	x		x		
170	OSCAR PULIDO GUEVARA	1012443203	2/02/2021			x	x		x		
171	MICHAEL CRISTIANO RAMIREZ	1033806404	4/02/2021			x	x		x		
172	LUIS MUÑOZ GRAJALES	80774495	6/02/2021			x	x			x	

173	ANDRES BARAHONA GOMEZ	80256059	22/01/2021			X	X		X		
174	JOHN RAMOS YAGUARA	80748603	7/01/2021			X	X		X		
175	EDILBERTO CAÑON CASALLAS	79924548	5/01/2021			X	X		X		
176	ANDRES PEREZ ARIAS	1063625214	5/02/2021			X	X		X		
177	MICHEL SALAS CELIS	1033766212	17/11/2020			X	X		X		
178	OSBAR BERNAL PAEZ	80778371	20/11/2020			X	X		X		
179	WILSON BERNAL GUSCA	1033707175	11/02/2021			X	X		X		
180	ANDERSON BUSTOS ZULUAGA	1000694458	8/02/2021			X	X		X		
181	JOHAN CESPEDES MENDOZA	1013694701	9/02/2021			X	X		X		
182	KEVIN MARTINEZ RODRIGUEZ	1000118548	9/02/2021			X	X		X		
183	EDGAR MURCIA ORDOÑEZ	14322354	12/02/2021			X	X		X		
184	OSWALDO RINCON	1047512742	13/01/2021			X	X		X		
185	LUIS HERNANDEZ BARRERO	80858697	13/01/2021			X	X		X		
186	JAISON ACERO DE LA ROSA	1044391694	18/02/2021			X	X		X		
187	MARLON GUZMAN TRANSLAVIÑA	1007339845	15/02/2021			X	X		X		
188	FABIAN ESCOBAR GOMEZ	1024482810	18/01/2021			X	X		X		
189	LUIS CARRILLO	79460485	18/02/2021			X	X		X		
190	MIGUEL AMADO MONTEJO	1007392839	18/02/2021			X	X		X		
200	PAOLA BOHORQUEZ RUBIANO	53152764	18/01/2021			X	X		X		
201	EDILSON CASTRO SOTO	1033680989	25/02/2021			X	X		X		
RESULTADOS:					**0**	**201**		**0**			

ACUARELA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	CARLOS JAVIER PALENCIA JIMENEZ	1143171522	11/12/2020			X	X		X		
2	ALEXIS MENDEZ GARCIA	96193680312				X	X		X		
3	ARLEY CAMILO GIRALDO ORTIZ	1.013.689.988	12/12/2020			X	X		X		
4	RONALDO CASTRO SANCHEZ	102460239	15/12/2020			X	X			X	
5	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	24/11/2020			X	X		X		
6	FERNANDEZ GABRIEL ALEJANDRO	################	15/12/2020			X	X		X		
7	HUMBERTO MOSCOSO GARCIA	71536150	18/11/2020			X	X		X		
8	IVAN ANTONIO LOPEZ CHIVATA	1002314572	24/11/2020			X	X		X		
9	JUNIOR DAVID BRACHO	Z831775706 081987	11/12/20			X	X		X		
10	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRERO	79502676	24/11/2020			X	X		X		
11	MARLON HUMBERTO MARTINEZ VASQUEZ	1031152755	25/11/2020			X	X		X		

12	MIGUEL ANGEL REY CUADROS	1024541228	4/12/2020			x	x		x		
13	MIGUEL RIVERO	2761157	11/12/2020			x	x		x		
14	PEDRO RUIZ ANGULO	98429140	11/12/2020			x	x		x		
15	PERALES FLORIAN DAIRO	85.163.998	12/12/2020			x	x		x		
16	RAFAEL HERNANDEZ ARANDA	834934223101995	12/12/20			x	x		x		
17	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	9712761	24/11/2020			x	x		x		
18	WILMAR DELGADO	1003923499	11/12/20			x	x		x		
19	WILMER ANDRES MENDIETA ALVAREZ	1022938136	9/12/2020	2/10/2020		x	x		x		
20	PEDRO MONDRAGON VACA	4047037	13/01/2021	3/01/2021		x	x			x	
21	JUAN CARLOS CERQUERA MENDEZ	80859935	2/02/2021			x	x		x		
22	JOINER DAVID BRACHO GONZALEZ	26126465	25/01/2021			x	x		x		
23	HERNAN VANEGAS IBAÑEZ	80896790	26/01/2021			x	x		x		
24	JUAN RAMIREZ MANCERA	79990751	23/12/2020			x	x		x		
25	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	20/12/2020		x		x		x		
26	ANGEL HERNANDO SANCHEZ GOMEZ	79726856	31/10/2020			x	x			x	
27	ANDRES DELGADO	1031182992	15/02/2020			x	x			x	
28	BRAYAN MONSALVE	1033783407	30/10/2020			x	x			x	
29	CAMILO GANOA SOTELO	1033726953	30/10/2020			x	x			x	
30	EDISON CASTRO	1033719974	30/10/2020			x	x			x	
31	EDIXON GUTIERREZ LOAIZA	86086644	30/10/2020			x	x			x	
32	JOAN ARIAS GOMEZ	1033812687	30/10/2020			x	x			x	
33	MAURICIO JAIMES LUCENA	79407194	31/10/2020			x	x			x	
34	WILLIAM BONILLA OSORIO	1032376827	5/09/2019			x	x			x	
35	WILMER PIÑA	1237443301	30/10/2020			x	x			x	
36	EDIGAR RAMOS ROMERO	842225131101984	12/12/2020			x	x			x	
37	VARGAS MENDOZA DIOCEL STEVENS	1.006.857.064	5/09/2019			x	x			x	
38	BRAYAN STEVEN ROJAS	1024594954	12/12/2020			x	x			x	
39	LUCIANO TOVAR MER	92558171	18/11/2020		x		x			x	
40	ANDRES MAURICIO TORRES	1070957742	18/11/2020		x		x			x	
41	GINETTE NATALIA TORRES DIAZ	1014195383	SURA		x		x			x	
42	MARIA ELENA MENCO COLON	1102870684	27/11/2020		x		x		x		
43	EDGAR FABIAN PENAGOS PADILLA	1013647069	18/11/2020		x		x		x		
44	JUAN CARLOS CORREA MARTINEZ	79273846	24/11/2020		x		x		x		
45	WILMER TORRES LEAL	1012426714	2/02/2021			x	x		x		
46	NICOLAS MONTOYA SARMIENTO	79668628	2/02/2021			x	x		x		
47	RAFAEL MONTILLA MENDOZA	1043613599	29/01/2021			x	x		x		
48	LUIS SAMACA	79465357	2/02/2021			x	x		x		
49	LUIS FRANCISCO MIONCADA MONCADA	1098170318	2/02/2021	30/07/2020		x	x		x		
50	JOHAN ARIZA	1005294400	2/02/2021			x	x			x	
51	EDGAR MARTINEZ	79296107	2/02/2021			x	x		x		
52	EDGAR ANDRES ALARCON BERCALDO	1032448252	23/12/2020			x	x		x		
53	CRISTIAN DELGADO CASTRO	1003923418	2/02/2021	19/01/2021		x	x		x		
54	ELIO RIVERA ORTIZ	79679114	29/01/2021			x	x		x		

55	LUIS CHICUASAQUE ARIAS	1033728934	29/01/2021			x	x		X		
56	JORGE GANOA BETANCUR	1033773045	29/01/2021			x	x		X		
57	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	82946815091992	4/02/2021			x	x		X		
58	JOSE MUÑOZ	82497852705	4/02/2021			x	x		X		
59	JOSE IGNACIO CANO NOVOA	7330323	15/12/2020			x	x		X		
60	JUAN AGUSTIN LIZARAZO	4103403	15/12/2020			x	x		X		
61	EDILBERTO CRUZ SANTA	106780037	4/02/2021		X		x		X		
62	YESID MANUEL TAPIA	79355917	2/02/2021			x	x		X		
63	JOSE EDGAR IBAGUE	79480674	2/02/2021		X		x		X		
64	JOSE FRANCISCO ZAMUDIO VARGAS	1006737961	2/02/2021			x	x		X		
65	JHON FREDY URREGO	107249670	2/02/2021			x	x		X		
66	DUBERNEY LIZCANO MONROY	1083882905	2/02/2021			x	x		X		
67	JHON FREDDY TRUJILLO	17497039	2/02/2021			x	x		X		
68	CARLOS ALBERTO TALERO PINEDA	1033739164	21/02/2021			x			X		

RESULTADOS:								**0**		**0**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MV - 2275		MV - 2270













FECHA:02/02/21

DESCRIPCIÓN:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV Y SE DEJA KIT DE BIOSEGURIDAD MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO

FECHA:02/02/21

DESCRIPCIÓN:SE REALIZA PROTOCOLO DE INGRESO AL MV Y SE DEJA KIT DE BIOSEGURIDAD MAS LA ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO DEL MV Y BENEFICIARIO
