“EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.”



INFORME TÉCNICO MENSUAL No 11

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

INTERVENTORÍA & CONSTRUCIVILES

CONTRATO No. 242 DE 2019

BOGOTÁ D. C.

MARZO DE 2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. GENERALIDADES 5
3. ROLES DEL PROYECTO 7
4. ANTECEDENTES 8
5. ACTIVIDADES GENERALES 10
6. GENERALIDADES DEL CONTRATO 12
6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
6.2. CONTRATO DE OBRA 13
6.3. RESUMEN DE GARANTIAS 13
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 14
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES 15
8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA 15
9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA 17
9.1. ACTIVIDADES DE OBRA 17
10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO 26
11. FACTURACIÓN 32
12. ALCANCE 33
13. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 33
14. CONCLUSIONES 33

1. INTRODUCCION

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos (FDLBU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Consultoría No. 242 de 2019, cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS", que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020, con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).

Este informe tecnico contiene los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2021, del contrato de Consultoría No. 242 de 2019 entre el FDLBU e INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

2. GENERALIDADES

El FDLBU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio celebró el contrato de Obra Pública No. 241 de 2019, que tiene como objeto ***EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS (CTO 241-2019).***

GENERALIDADES CONTRATO 241 DE 2020					
OBJETO DEL CONTRATO					
"**EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.**					
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	241 de 2019				
CONSTRUCTOR	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020				
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.				
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS				
VALOR INICIAL CONTRATO OBRA	$ 7.770.000.000				
VALOR ADICION No. 1 CONTRATO OBRA	$ 3.885.000.000				
TOTAL CONTRATO OBRA	$ 11.655.000.000				
VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA	$766.436.856				
VALOR ADICION No 1 CONTRATO INTERVENTORIA	$383.218.428				
VALOR INICIALCONTRATO INTERVENTORIA	$1.149.655.2484				
DURACIÓN INICIAL	8 MESES				
PRORROGA No. 1	4 MESES				
PLAZO TOTAL	12 MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	2	**DE**	MARZO	**DE**	2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	1	**DE**	NOVIEMBRE	**DE**	2020
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN 1*	24	**DE**	MARZO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION SUSPENSIÒN 1	16	**DE**	JUNIO	**DE**	2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DESPUES SUPENSIÒN 1	23	**DE**	ENERO	**DE**	2021

3. ROLES DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión, “Ejecución de las obras de la malla vial local de Barrios Unidos .

Personal profesional

Cargo	Nombre	Responsabilidad
Supervisor del Proyecto	**Dr. Antonio Carrillo** Alcalde Local de Barrios Unidos	Supervisión por parte del FDLBU a los contratos de obra e Interventoría.
Apoyo a la supervisión	**Arq. Javier Rojas**	Apoyo a la supervisión por parte del FDLBU al contrato de Interventoría.
Director de interventoría	**Ing. Carlos Arámbula.**	Director de interventoría

Residente de Interventoría	**Ing. Juan Pablo Lemus.**	Residente de la Interventoría.
Director de Obra COP 241 de 2019	**Ing. Ivan Pardo**	Dirección de la ejecución de la Obra.
Residente de obra COP 241 de 2019	**Ing. Manuel Ruiz**	Residente de obra.

4. ANTECEDENTES

La Alcaldía local de Barrios Unidos, con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito mediante el mantenimiento de las vías de la localidad, ha realizado el contrato No 241 de 2019, el cual busca priorizar e intervenir las vías de la localidad de Santa Fe y cuyo contratista es el **CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020.**

Se estableció además el contrato No.242 de 2019 firmado entre Interventoría y Construciviles SAS y el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y cuyo objeto es "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para

conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."

El plazo para la ejecución del contrato se contará a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del mismo, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos. Para este contrato queda establecido un plazo inicial de 8 meses.

Para el presente periodo dentro de las labores de ejecución del contrato en curso, se inició con la localización de los segmentos viales los cuales fueron priorizados por la alcaldía local de Barrios Unidos. Cabe destacar que dentro del proceso de intervención habrá un control permanente por parte de la **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.**

5. ACTIVIDADES GENERALES

Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por las partes.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el desarrollo de la relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias contractuales, utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento del contrato.

Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, colaboración que no debe ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común.

Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración, desentendida del desarrollo de la obra o servicio, generan a veces con éstas actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que

aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato.

Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la realización del objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo dentro de un criterio de colaboración, que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la empresa en la cual se han comprometido la administración y los particulares.

Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y en realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por la contraparte. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.

Aprobar: El personal propuesto por el contratista para le etapa de obra, las obras ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en comité, los planos record entregados por el contratista, y en general todas las acciones derivadas de la ejecución del contrato de obra.

6. GENERALIDADES DEL CONTRATO

En las tablas siguientes se encuentra la información detallada del contrato de interventoría y de obra.

6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de los diseños existentes, diagnóstico, estudios y diseños para conservación, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos."*
Contratista	*CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No.1	Cuatro (4) meses
Plazo Total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación	23 de enero de 2021
Valor inicial del Contrato	$766.436.856
Valor adicion No.1 del Contrato	$383.218.428
Valor total del Contrato	$1.149.655.2484
Interventoría	Interventoría y Construciviles SAS

6.2. CONTRATO DE OBRA

	Contrato Interventoría No. 242 de 2019
OBJETO	*""EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.*
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No.1	Cuatro (4) meses
Plazo Total	Doce (12) meses
Fecha de inicio de contrato	02 de marzo de 2019
Fecha de terminación inicial	01 de noviembre de 2020
Fecha de Suspension No. 1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No. 1	16 de junio de 2020
Fecha de Terminación	23 de enero de 2021
Valor del Contrato	$ 7.770.000.000
Valor adicion No. del Contrato	$383.218.428
Valor total del Contrato	$1.149.655.2484
Apoyo Técnico de la Supervisión FDLBU	ARQUITECTO JAVIER ROJAS

6.3. RESUMEN DE GARANTIAS

A continuación se listan las garantías suscritas para el contrato de obra, aprobadas por la supervisión, suscritas con la aseguradora Solidaria

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	14/01/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	14/01/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	14/01/2020	14/03/2021

N° DE POLIZA	AA010565 – AA010566		
Cumplimiento del Contrato	$ 2.331.000.000	02/03/2020	14/03/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$ 777.000.000	02/03/2020	14/09/2023
Estabilidad y Calidad De Obra	$ 2.331.000.000	14/03/2021	14/03/2026
Predios labores y operaciones	$ 438.901.500	02/03/2020	14/03/2021

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Barrios Unidos es la localidad número 12 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en el norte de la ciudad, limita por el norte con la localidad de Suba, por el sur con la localidad de Teusaquillo, por el oriente con la localidad de Chapinero, y por el occidente con las localidades de Engativa y Suba. Cuenta con una superficie de 11,9 Km2, y su pablacion asciende a los 300.000 habitantes.



Figura 2. Localización localidad de Barrios Unidos.

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES

El proyecto inicialmente comprende el un listado de 66 segmentos de viales priorizados por parte

Figura 1. Mapa localidades de Bogotá D.C. 2019 (http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa)

del Fondo de Desarrollo Local de Barrios unidos (FDLBU), con base en el diagnostico preliminar y el estado y deterioro de las vías de la malla local, en diferentes zonas; para brindar una mejor movilidad a los habitantes de los diferentes barrios que componen la localidad.

8.1. LISTADO INICIAL PRIORIZACIÓN DE LA ALCALDÍA

NUMERO	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA
1	12001648	Calle 75 A	Carrera 28	carrera 28 A
2	12001288	Carrera 28	Calle 83 BIS	Calle 84
3	12001302	Carrera 28	Calle 80	Calle 83 BIS
4	12001171	CALLE 84	Carrera 28	Carrera 28 B
5	12001180	CALLE 84	Carrear 27	Carrera 28
6	12000073	Carrera 67 A	Calle 95	Calle 100
7	12000753	Calle 73	Carrera 65	Carrera 65 B
8	12002465	Calle 63 F	Carrera 28	Carrera 28 A
9	12001804	Carrera 56 B	Calle 67 A	Calle 67 A BIS
10	12001759	Carrera 56 B	Calle 67 A BIS	Diagonal 67 B
11	12000914	Calle 67 D Bis	Carrera 66 A	Carrera 67
12	12001480	Carrera 62	Calle 66 C	Calle 67
13	12002585	Carrera 14 A	Calle 67	CALLE 68

14	12002610	Carrera 14 A Bis	Calle 66	Calle 67
15	12002503	Calle 63 F	Av. Carrera 24	Carrera 25
16	12002501	Calle 63 F	Carrera 25	Carrera 25 Bis
17	12002511	Calle 64	Carrera 22	Carrera 23
18	12002500	Carrera 25	Calle 63 F	Calle 64
19	12000106	Calle 97 A	carrera 58	carrera 60
20	12000110	Calle 97 A	Tranv 55	Carrera 58
21	12000147	Carrera 58	Calle 97	Calle 97 A
22	12002104	Calle 71 B	Carrera 26	Carrera 27
23	12002311	Calle 64 A	Carrera 28 b	Carrera 30
24	12002780	Carrera 21	Av. Calle 63	Calle 63A
25	12003160	Carrera 62	Calle 64	Calle 66C
26	12001447	Carrera 62	Calle 67	Calle 67A
27	12002120	KR 52	CL 64A	CL 65
28	12000448	CL 91A	KR 58	KR 59
29	12000201	CL 94	KR 64	KR 65
30	12002284	Calle 71	Carrera 19	Carrera 20
31	12001752	Carrera 50	Calle 71 A	Calle 71 C
32	12001704	Carrera 51	Calle 71 A	Calle 71 C
33	12001761	Carrera 51	Diagonal 71 BIS	Calle 71 A
34	12001762	Diagonal 71 BIS	Carrera 51	Carrera 52
35	12001849	Diagonal 71 BIS	Carrera 50	Carrera 51
36	12002699	Carrera 36 A	Calle 63	Calle 63 A
37	12002606	Calle 63 B	Carrera 35	Carrera 36
38	12002639	Carrera 36 A	Calle 63 A	Calle 63 B
39	12002614	Calle 63 B	Carrera 30	Carrera 35
40	12002593	Carrera 36 A	Calle 63 B	Calle 63 B Bis
41	12002560	Carrera 36 A	Calle 63 B Bis	Calle 63 C
42	12002645	Calle 63 A	Carrera 36 A	Carrera 36
43	12002644	Carrera 36	Calle 63 B	Calle 63 A
44	12002536	Carrera 36 A	Calle 63 C	Calle 63 G
45	12000837	Calle 79	Carrera 55 A	Carrera 55 B
46	12000436	CALLE 93	CRA47	CRA47A
47	12000423	CALLE 93	CRA 49	CRA 49A
48	12000744	CALLE 72 A	CRA 65B	CRA66
49	12000853	Calle 75	CARRERA 61	CARRERA 62
50	12002216	CL 70	KR 25	KR 26
51	12002244	CL 70	KR 24	KR 25
52	12000855	CL 67 F	KR 66 A	KR 67
53	12000874	CL 67 D BIS	KR 67	AV. KR 68
54	12001962	KR 27	CL 73 BIS	CL 74
55	12000093	KR 65 A	CL 96	CL 97
56	12000072	CL 97	KR 64	KR 65
57	12000088	CL 97 A	KR 61	KR 61 BIS
58	12000098	CL 97 A	KR 60	KR 60D
59	12000078	CL 97 A	KR 61 A	KR 61 BIS
60	12001501	CL 70 C	KR 56 B	KR 57
61	12001439	CL 78	KR 28 A	KR 28 B
62	12001473	CL 78	KR 28	KR 28A
63	12001504	CL 78	KR 27B	KR 28
64	12001518	CL 78	KR 27 A	KR 27 B
65	12002418	CL 66 A	KR 23	KR 22
66	12002481	CL 64	KR 23	KR 24

9. ACTIVIDADES INTERVENTORIA TECNICA

Para el periodo de análisis del presente informe se realizaron las actividades propias de la ejecución de obra, se dio continuidad al cronograma de ejecución de obra, se dio cumplimiento a los requerimientos de los protocolos aprobados de bioseguridad debido a la situación de salud publica ocacionada por el virus COVID-19, adicionalmente se adelantaron las siguientes actividades durante la vigencia del presente informe:

- Revision, ajuste y aprobación de los estudios y diseños de los CIV a intervenir.
- Elaboración el alcance, la metodología, el enfoque, y el Plan de Calidad,
- Elaboración del cronograma detallado del contrato.
- Levantamiento de topografía e implentacion de cotas de diseño
- Elaboración del presupuesto para la ejecución de las obras conforme a los diagnosticos y diseños realizados.
- Participarcipacion de los Comités de obra citados por la supervisión del contrato o interventoría.

9.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Para este perriodo de ejecución se dio inicio a las activiades propias de obra de los CIV priorizados, después de tener autorización y aprobación del PMT, a continuación se listan los CIV intervenidos y las actividades realizadas:

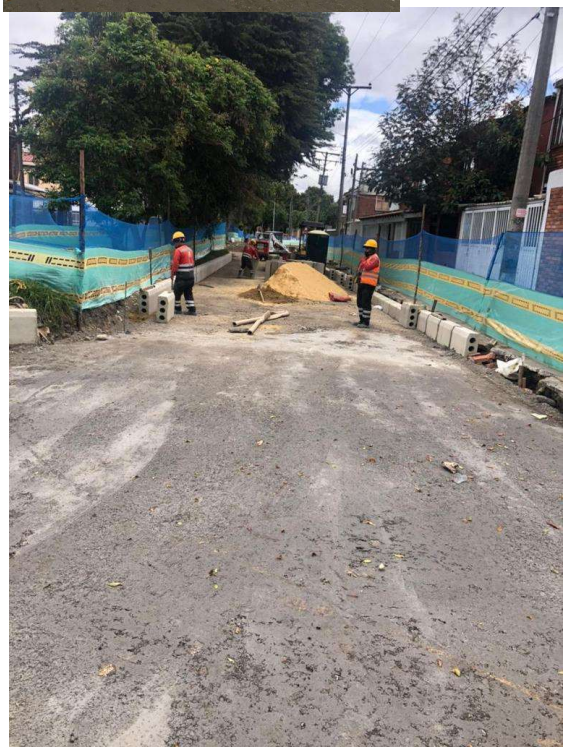
CIV 12001804 Carrera 56B entre Calle 67ª y Calle 67b. Oriental (Reconstruccion)

Para este peridodo de análisis se culmino con la rehabilitación del espacio publico, se continuo con la instalación de MBR, revisando afectaciones en las capas instaladas. Se culmino la instalación de la carpeta asfáltica, culminando con la intervención de este CIV









CIV 12001759 Carrera 56B entre Calle 67B y Diagonal 67B Oriental (Reconstruccion)

Para este peridodo de análisis se culmino con la rehabilitación del espacio publico, se continuo con la instalación de MBR, revisando afectaciones en las capas instaladas. Se culmino la instalación de la carpeta asfáltica, culminando con la intervención de este CIV



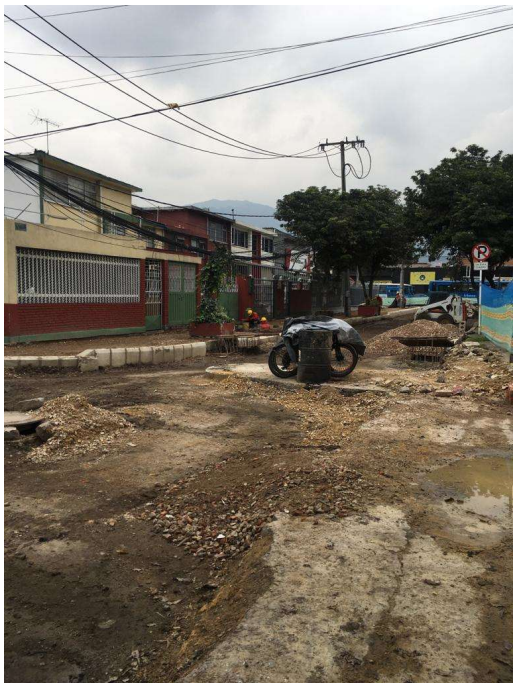




CIV 12002244 Calle 70 entre Carrera 24 y Carrera 23 (Reconstrucción)

Para este peridodo de análisis se culmino con la rehabilitación del espacio publico, se continuo con la instalación de MBR, revisando afectaciones en las capas instaladas. Se culmino la instalación de la carpeta asfáltica, culminando con la intervención de este CIV







CIV 12002216 Calle 70 entre Carrera 25 y Carrera 26

Para este peridodo de análisis se culmino con la rehabilitación del espacio publico, se continuo con la instalación de MBR, revisando afectaciones en las capas instaladas. Se culmino la instalación de la carpeta asfáltica, culminando con la intervención de este CIV.







CIV 12002104 Calle 71B entre Carrera 26 y Carrera 27

Para el periodo de análisis se realizo la instalación de material recilcado bituminoso en primera capa, se finalizo la instalación del sardinel en la totalidad del CIV, se culmino la cosntruccion del espacio publico, se culmino con la isntalacion de la carpeta asfáltica.







CIV 12000914 Calle 67 D Bis entre Carrera 66 A y Carrera 67

Para el periodo de análisis se culmino con la instalación de capa de sello del matrial tipo granular, se continuo con la instalación de material reciclado bituminoso en primera capa, se realizaron los sumideros con su respectiva conexión a la red pluvial, se instalo la totalidad del sardinel, se realizo la demolición del espacio publico existente y se dio continuidad con la contruccion de mismo.







CIV 12000874 Calle 67 D Bis entre Carrera 66 A y Carrera 68

Para el periodo de análisis se culmino con la instalación de capa de sello del matrial tipo granular, se continuo con la instalación de material reciclado bituminoso en primera capa, se realizaron los sumideros con su respectiva conexión a la red pluvial, se instalo la totalidad del sardinel, se realizo la demolición del espacio publico existente y se dio continuidad con la contruccion de mismo.







CIV 12000853 Calle 75 entre Carrera 61 y Carrera 62

Para el periodo de análisis se culmino con la instalación de capa de sello del matrial tipo granular, se continuo con la instalación de material reciclado bituminoso en primera capa, se realizaron los sumideros con su respectiva conexión a la red pluvial, se instalo la totalidad del sardinel, se realizo la demolición del espacio publico existente y se dio continuidad con la contruccion de mismo.



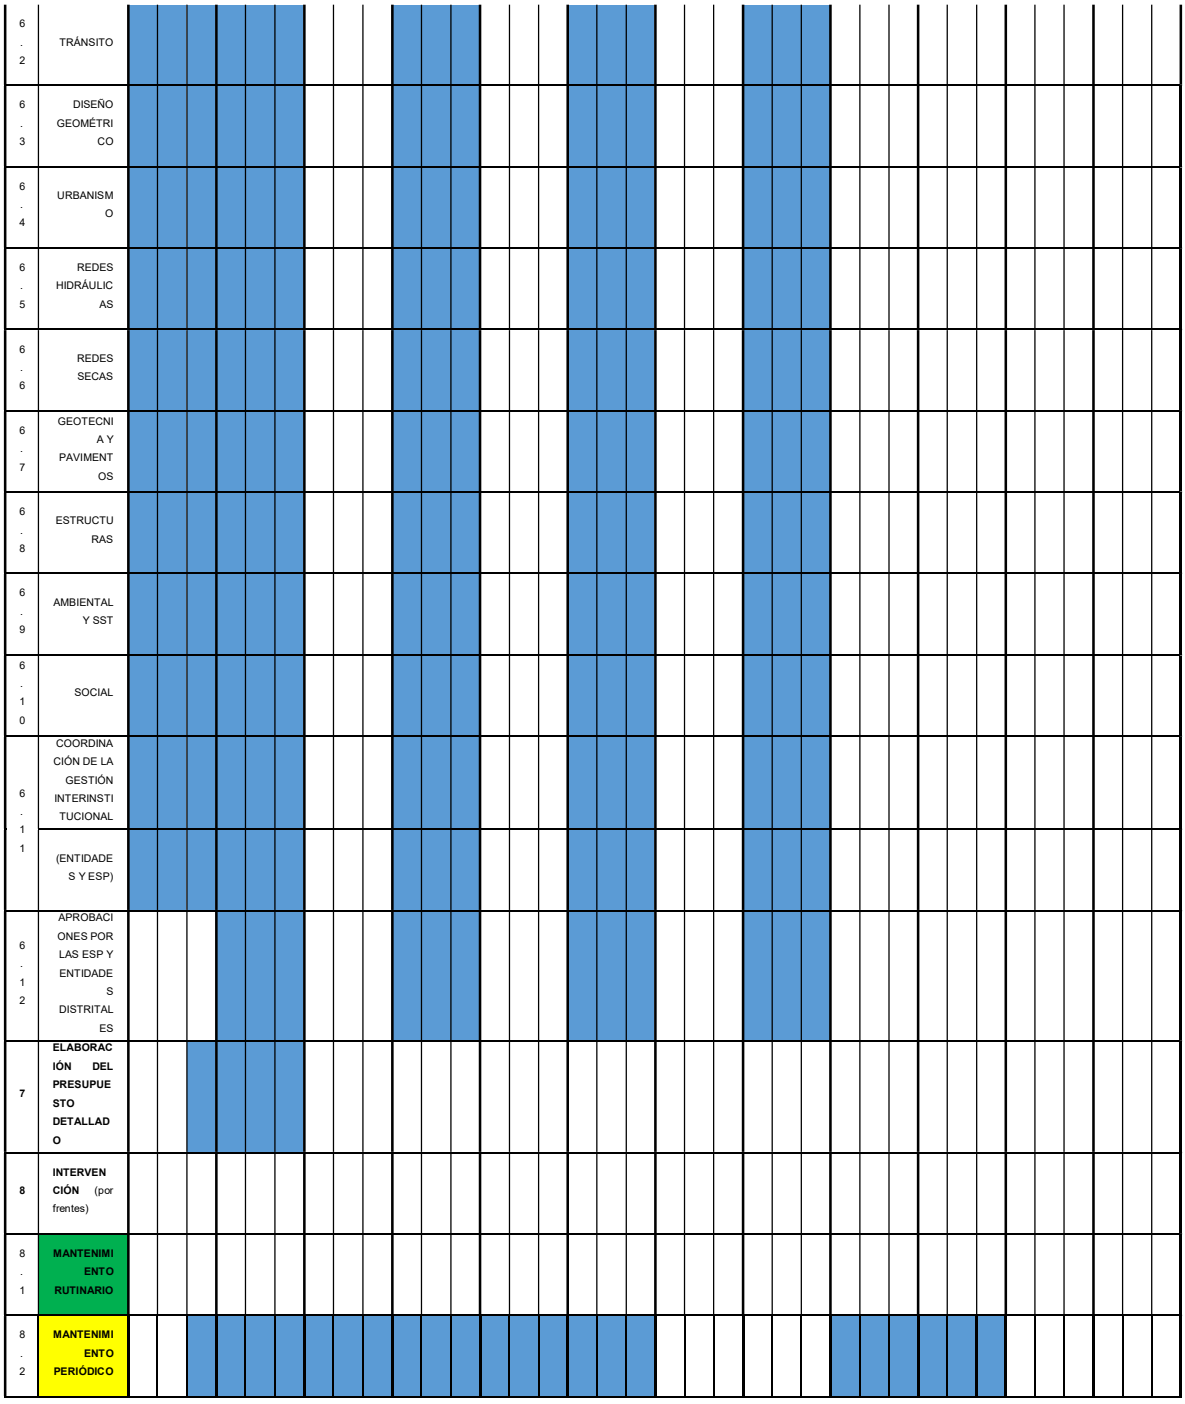


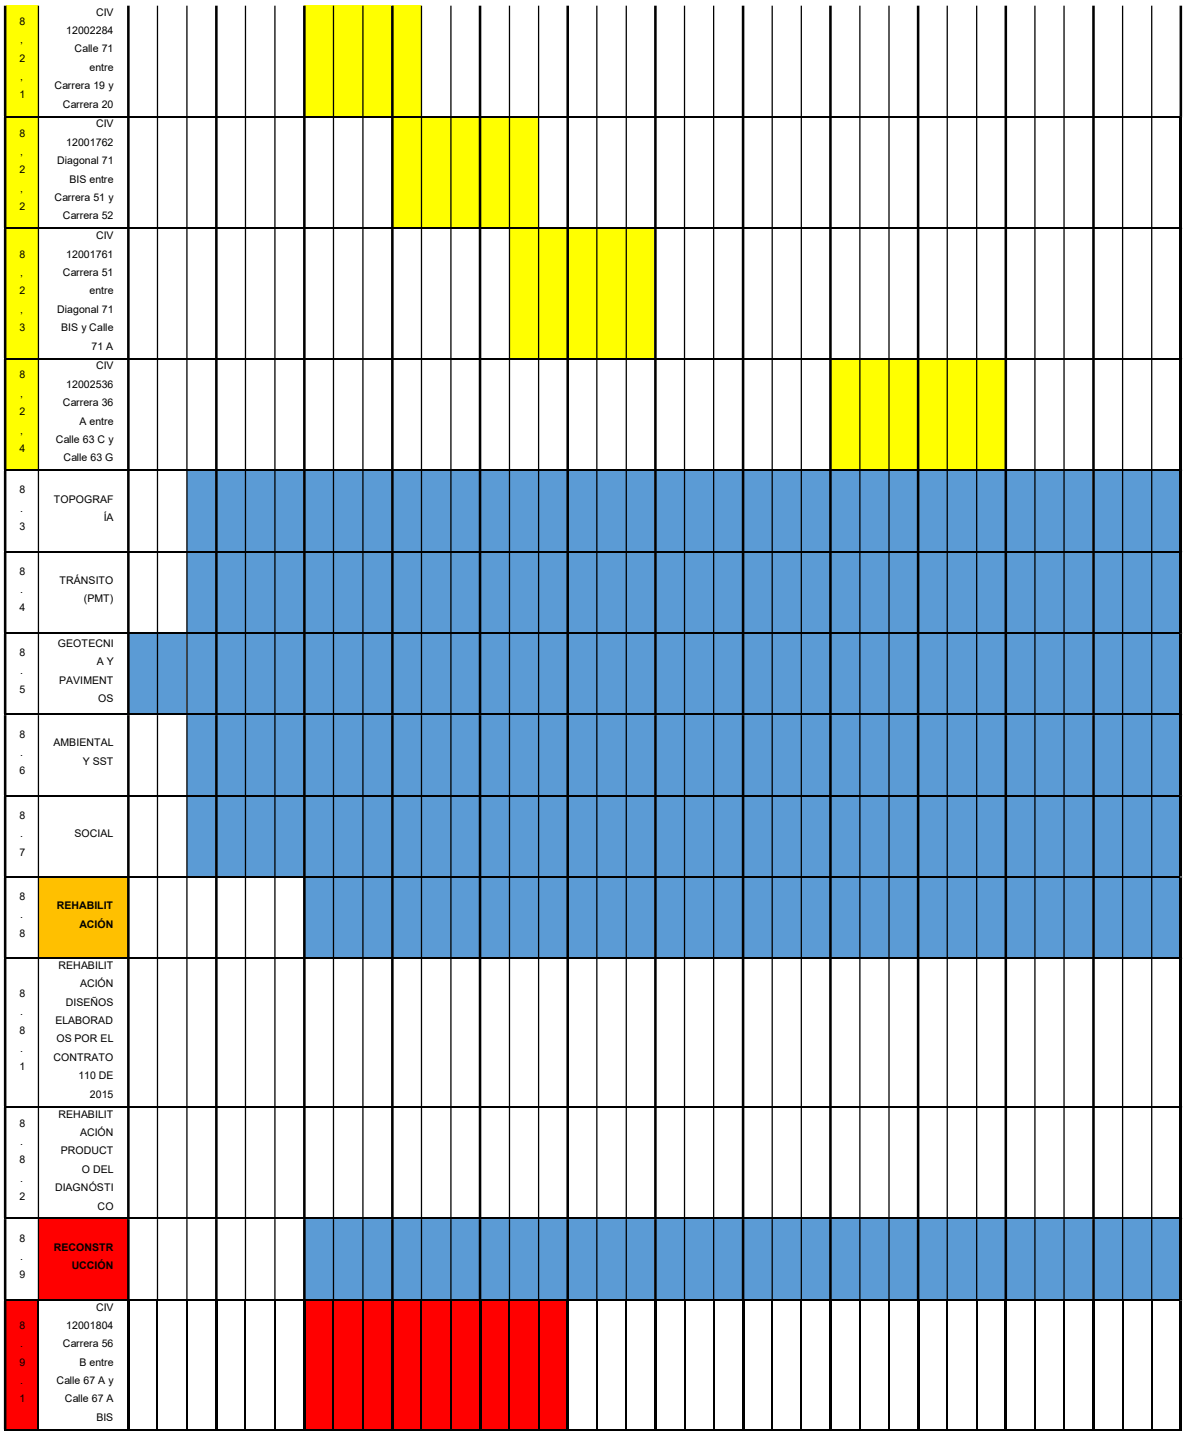


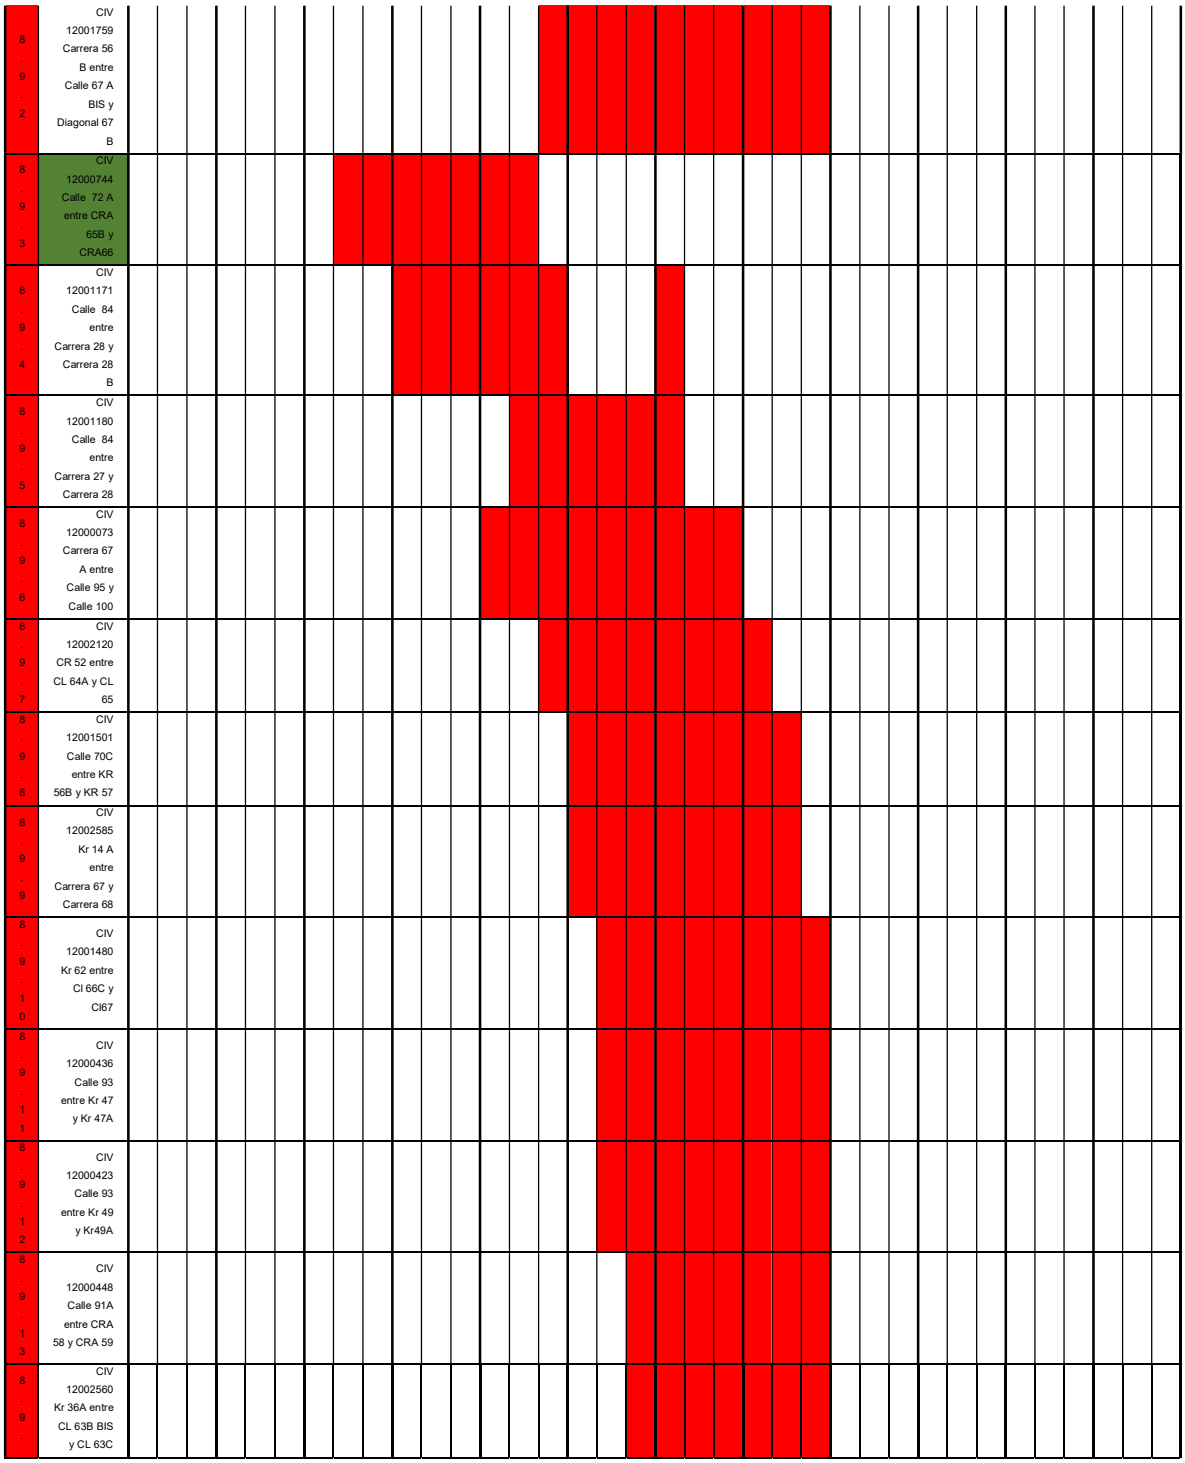
10. CRONOGRAMA ACTUALIZADO

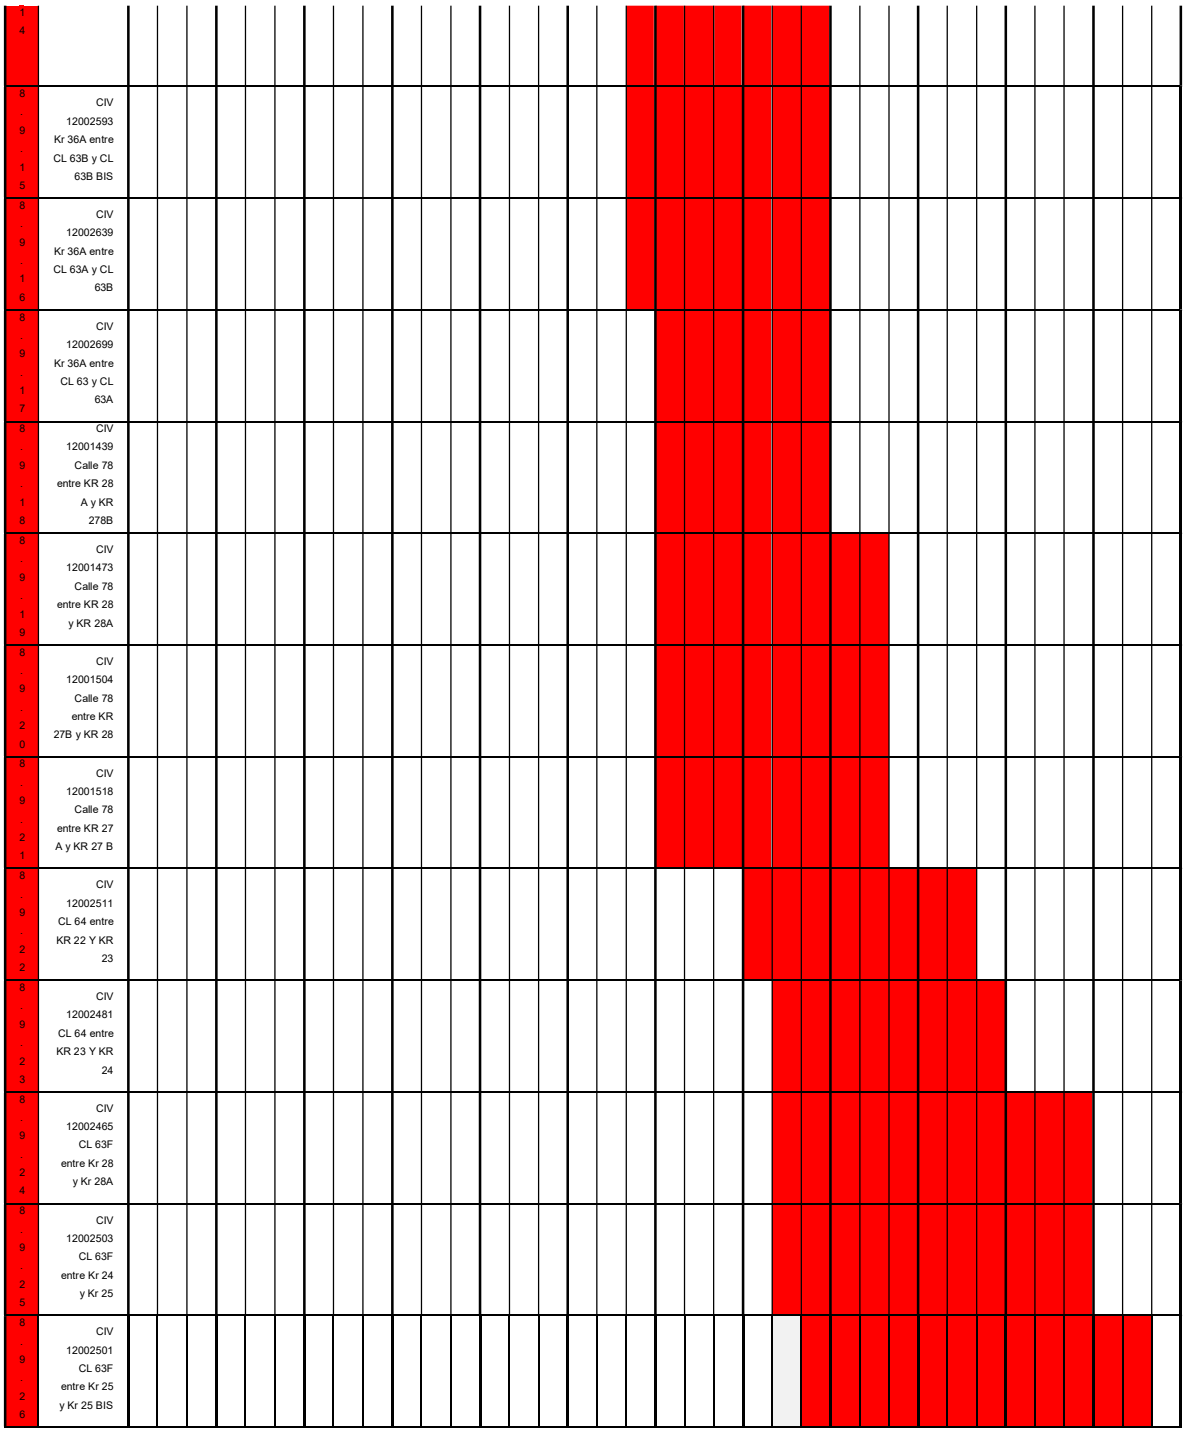
Se revisa el cronograma actualizado de las actividades presentado por el contratista.

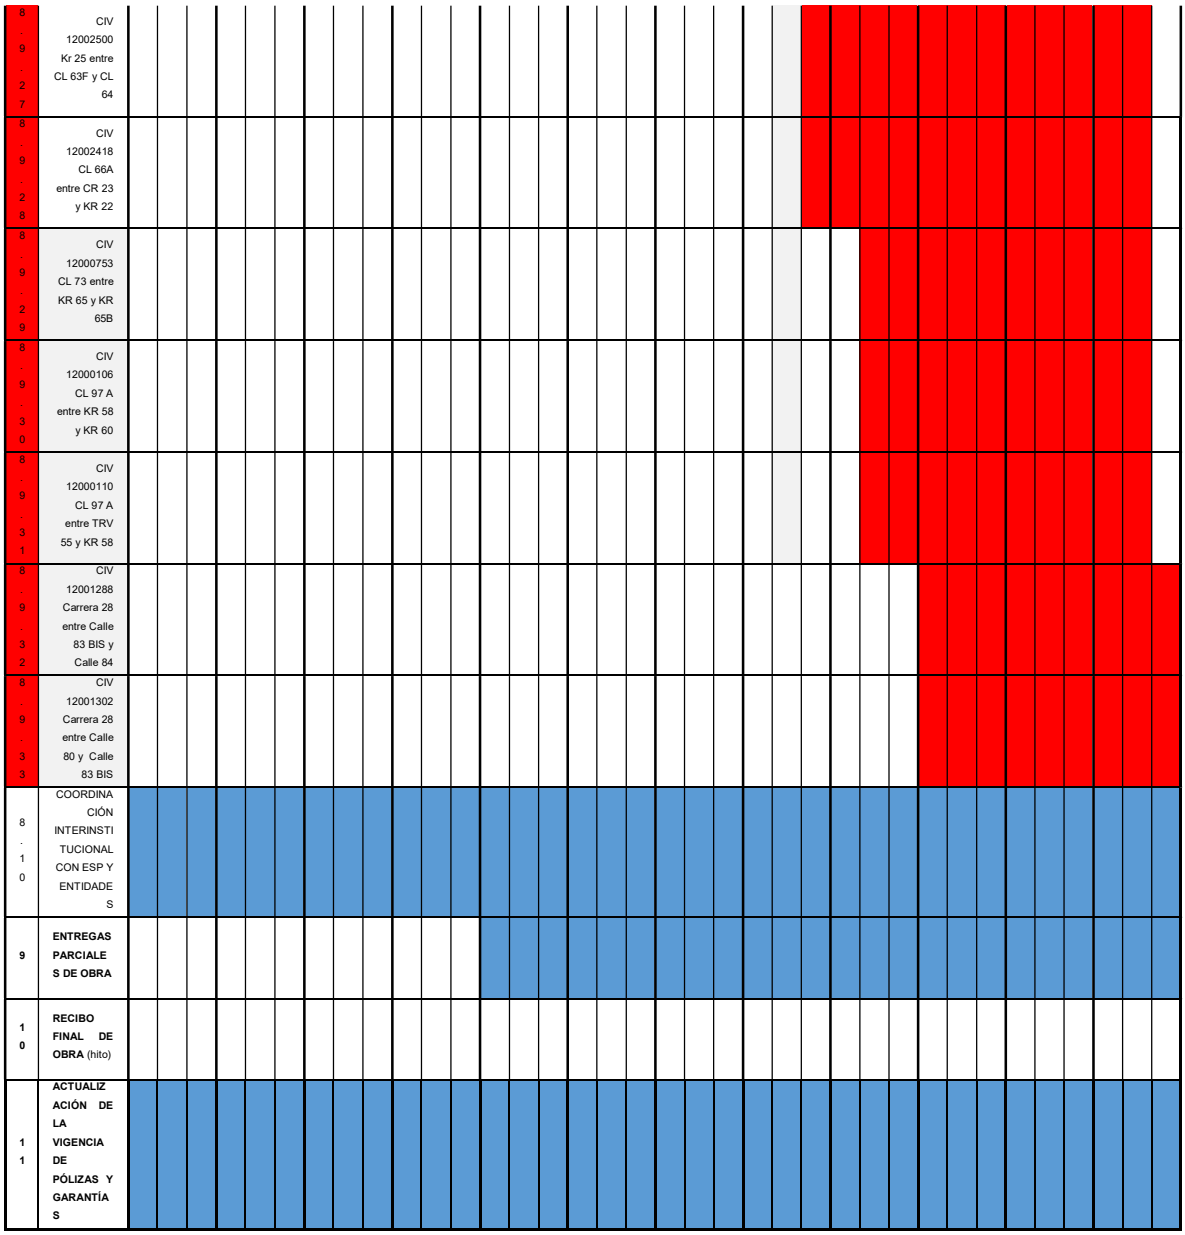
ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN CONTRATO								ADICIÓN			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**INICIO** (hito)												
2	**ELABORACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**												
3	**APROPIACIÓN DE DISEÑOS**												
3.1	APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS ELABORADOS CON EL CONTRATO 110 DE 2015												
3.2	AJUSTES A LOS DISEÑOS (En caso de requerirse)												
4	**DIAGNÓSTICO**												
4.1	ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNÓSTICO POR CIV												
5	**ESTUDIOS**												
5.1	ENSAYOS DE LABORATORIO												
5.2	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN												
6	**DISEÑOS POR COMPONENTES**												
6.1	TOPOGRAFÍA												


6.2 TRÁNSITO
6.3 DISEÑO GEOMÉTRICO
6.4 URBANISMO
6.5 REDES HIDRÁULICAS
6.6 REDES SECAS
6.7 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
6.8 ESTRUCTURAS
6.9 AMBIENTAL Y SST
6.10 SOCIAL
6.11 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
(ENTIDADES Y ESP)
6.12 APROBACIONES POR LAS ESP Y ENTIDADES DISTRITALES
7 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO
8 INTERVENCIÓN (por frentes)
8.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
8.2 MANTENIMIENTO PERIÓDICO


8.2.1 CIV 12002284 Calle 71 entre Carrera 19 y Carrera 20
8.2.2 CIV 12001762 Diagonal 71 BIS entre Carrera 51 y Carrera 52
8.2.3 CIV 12001761 Carrera 51 entre Diagonal 71 BIS y Calle 71 A
8.2.4 CIV 12002536 Carrera 36 A entre Calle 63 C y Calle 63 G
8.3 TOPOGRAFÍA
8.4 TRÁNSITO (PMT)
8.5 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
8.6 AMBIENTAL Y SST
8.7 SOCIAL
8.8 REHABILITACIÓN
8.8.1 REHABILITACIÓN DISEÑOS ELABORADOS POR EL CONTRATO 110 DE 2015
8.8.2 REHABILITACIÓN PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO
8.9 RECONSTRUCCIÓN
8.9.1 CIV 12001804 Carrera 56 B entre Calle 67 A y Calle 67 A BIS


8.9.2
CIV 12001759 Carrera 56 B entre Calle 67 A BIS y Diagonal 67 B
8.9.3
CIV 12000744 Calle 72 A entre CRA 65B y CRA66
8.9.4
CIV 12001171 Calle 84 entre Carrera 28 y Carrera 28 B
8.9.5
CIV 12001180 Calle 84 entre Carrera 27 y Carrera 28
8.9.6
CIV 12000073 Carrera 67 A entre Calle 95 y Calle 100
8.9.7
CIV 12002120 CR 52 entre CL 64A y CL 65
8.9.8
CIV 12001501 Calle 70C entre KR 56B y KR 57
8.9.9
CIV 12002585 Kr 14 A entre Carrera 67 y Carrera 68
8.9.10
CIV 12001480 Kr 62 entre Cl 66C y Cl67
8.9.11
CIV 12000436 Calle 93 entre Kr 47 y Kr 47A
8.9.12
CIV 12000423 Calle 93 entre Kr 49 y Kr49A
8.9.13
CIV 12000448 Calle 91A entre CRA 58 y CRA 59
8.9.
CIV 12002560 Kr 36A entre CL 63B BIS y CL 63C


14
8.9.15 CIV 12002593 Kr 36A entre CL 63B y CL 63B BIS
8.9.16 CIV 12002639 Kr 36A entre CL 63A y CL 63B
8.9.17 CIV 12002699 Kr 36A entre CL 63 y CL 63A
8.9.18 CIV 12001439 Calle 78 entre KR 28 A y KR 278B
8.9.19 CIV 12001473 Calle 78 entre KR 28 y KR 28A
8.9.20 CIV 12001504 Calle 78 entre KR 27B y KR 28
8.9.21 CIV 12001518 Calle 78 entre KR 27 A y KR 27 B
8.9.22 CIV 12002511 CL 64 entre KR 22 Y KR 23
8.9.23 CIV 12002481 CL 64 entre KR 23 Y KR 24
8.9.24 CIV 12002465 CL 63F entre Kr 28 y Kr 28A
8.9.25 CIV 12002503 CL 63F entre Kr 24 y Kr 25
8.9.26 CIV 12002501 CL 63F entre Kr 25 y Kr 25 BIS


8.9.27 CIV 12002500 Kr 25 entre CL 63F y CL 64
8.9.28 CIV 12002418 CL 66A entre CR 23 y KR 22
8.9.29 CIV 12000753 CL 73 entre KR 65 y KR 65B
8.9.30 CIV 12000106 CL 97 A entre KR 58 y KR 60
8.9.31 CIV 12000110 CL 97 A entre TRV 55 y KR 58
8.9.32 CIV 12001288 Carrera 28 entre Calle 83 BIS y Calle 84
8.9.33 CIV 12001302 Carrera 28 entre Calle 80 y Calle 83 BIS
8.10 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ESP Y ENTIDADES
9 ENTREGAS PARCIALES DE OBRA
10 RECIBO FINAL DE OBRA (hito)
11 ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

11. FACTURACIÓN

Para este periodo, el contratista presenta el acta parcial No. 7, dejando el siguiente balance del contrato, el porcentaje de ejecución corresponde a 81,24%

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	7.770.000.000		
ADICIÓN 1	$	3.850.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA 1			$	892.068.794
VALOR EJECUTADO ACTA 2			$	807.254.710
VALOR EJECUTADO ACTA 3			$	968.891.149
VALOR EJECUTADO ACTA 4			$	1.103.284.426
VALOR EJECUTADO ACTA 5			$	2.949.570.000
VALOR EJECUTADO ACTA 6			$	1.549.570.000
VALOR EJECUTADO ACTA 7			$	924.380.000
VALOR EJECUTADO ACTA 8			$	804.418.830
VALOR POR EJECUTAR			$	1.455.181.170
SUMAS IGUALES	$	11.620.000.000	$	11.620.000.000

12. ALCANCE

Los alcances de la Interventoría son garantizar el cumplimiento de las actividades contratadas para el contrato de obra No. 241 de 2019 entre la Alcaldía Local Barrios Unidos y el contratista Consorcio Barrios Unidos 2020.

13. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto están planteados de la siguiente forma:

- Realizar el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoría oportuna y eficaz.
- Generar una mejora continua en los procesos de planificación, control y vigilancia de las obras de la malla vial.
- Elaborar diagnósticos de las zonas, adicionalmente la ejecución específica del mantenimiento y recuperación de las vías.
- Llevar un control minucioso del presupuesto determinado para el proyecto.

14. CONCLUSIONES

Para este perido de ejecucion se identificaron las siguientes conclusiones.

- Es absolutamente imperativo el cumplimiento de los protocolos de bio seguridad, cumpliendo con los requerimentos del gobierno nacional, frente a la emergencia sanitaria Covid-19
- Todos y cada uno de los diagnosticos deben ser presentados, verificados, avalados y aprobados por la supervisión y la interventoría
- Actuelmente se encuantra en tramite la aprobación del PMT de 3 CIV

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
1	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	0
Compactadoras	0
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	LT	1500
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan activiades de excvacion manual para andenes .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
2	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves, y fuertes en las horas de las tardes, durante la jornada laboral, se inicia concreto Mr 41 para el anden civ 12001804.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
3	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	2
Topografía	0
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	0
Compactadoras	0
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	38
TRITURADO 1/3	M3	14
MBR	LT	3400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan labores de de actividades, se hacen cortes para concreto del anden, se continuan con los remates y cañuelas para cajas de inspeccion de aguas residuales.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
4	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	2
Topografía	0
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	-
Compactadoras	-
Cargadores	-
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan labores de de actividades, se hacen cortes para concreto del anden, se continuan con los remates y cañuelas para cajas de inspeccion de aguas residuales.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
5	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nubledo durante la jornada laboral, llegada de mixer para fundir los andenes en concreto , sardineles y sumideros a los civ 12001759/12001804, y se termina de fundir sardinel del separador.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
6	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia lluvioso, se continua reamte de cjas de inspeccion de cajas negras, con sus cañuelas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
8	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia lluvioso durante la jornada laboral, se rematan pozos y se termina de pañetar se hace limpieza tramo.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
9	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	DESDE	Calle 64A Bis	HASTA	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Diia nublado, y se contin ua remates y acabados.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
10	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado durante la jornada laboral, se realizan cortes y se inician las excavacion y fisuras del MBR al civ 12001759 y 12001804, se continuan con los reamtes y zocalos.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
11	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado y lluvias durante la jornada laboral, se continua con la excavacion del MBR, a las fisuras civ 12001759 /120018014,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
12	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, lluvias durante la jornada laboral, se continua con la demolicion de MBR, y se mezcla y se instala el geotextil y geomala y geocelda.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, lluvias durante jornada laboral, se hace limpieza y aseo a los civ 12001804/12001759

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
15	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	1	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, lluvias fuertes durante la jornada laboral, se rematan y limpian sumideros se instalan rejillas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
16	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves durante la jornada laboral, se mezcla y serea MBR para segunda capa en tramos de las fisuras.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
17	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleados , se encuentran en labores de andenes.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
18	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , se continua con el lavado de andenes y se realiz aseo al tramo intervenido.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
19	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , lluvias durante la jornada laboral , se continua con el aseo al tramo y se realiza nivlecion para asfalto.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
20	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

		SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA					
	TARDE					
ACCIDENTES		SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , continuidad de aseo al tra<mo intervenido.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
23	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se continua con el aseo.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
24	5	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia soleado, Se continua con el aseo general ded la via y marcacion de niveltas y simbra de asfalto.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
25	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	0

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se continuan con la istalacion de sardinel para ambos costados del civ 130018014.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
26	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves durante la jornada laboral, se hacen cortes e inician demolicion de asfalto para pega y empates.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
27	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se continua con la demolicon de asfalto para empalmes cargue y retiro de escombros.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
29	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	13001759-13001804	
NOMENCLATURA	Carrera 56B	**DESDE**	Calle 64A Bis	**HASTA**	Diagonal 67B

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se hacen imprimacion e intalacion de asfalto par primera y segunda capa

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
1	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado se instala tuberia y se realizan llenos de excavacion de tuberia .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
5	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	JJ VARGAS	CIV	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	DESDE	CRA 66A	HASTA	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

El día 05 se hace lavado de tuberías Ø 34" y Ø 18" aguas lluvias, Ø 8" aguas negras para inspección con cámara.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
5	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

El día 05 se hace lavado de tuberías Ø 34" y Ø 18" aguas lluvias, Ø 8" aguas negras para inspección con cámara.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
5	3	2021	CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
DD	MM	AA	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias fuertes durante la jornada laboral, inician excavacion manual e istlana sardinel al civ 120000874, y mezclan fresado y sub base para MBR.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

0

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
5	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

dia nublado lluvias fuertes durante la jornada laboral, se continua con la excavacion manual e instalacion de serdiedl prefabricado.y se hacen remates de cajas de inspeccion aguas negras.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
8	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado excavacion manual para serdinel

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
9	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias fuertes durante la jornada laboral.se continua con la excavacion manual apra sardineles para el civ 12000874, se realiza e4l retiro de los fallos encontrados en el trsamo a intervenir. Por saturacion del material existente.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
10	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia lluvioso durante la jornada laboral, se realizan cortes y demolicon de concreto existente para andenes en cinta ajuste, se instala concrerto 3000psi, y se continua con retiros de los fallos encontrado .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
11	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves durante la jornada laboral, se realiza la fundida de la sinta de ajuste para andenes en concreto, 3000psi, del civ 12000874,

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
12	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	1	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado , se realizan actividades de excavacion manual para sardinel prefabricado.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
15	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, lluvias leves durante la jornada laboral, se inicia mezcla y sereo MBR primera capa del civ 12000914.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
16	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	JJ VARGAS	CIV	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	DESDE	CRA 66A	HASTA	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se continua con la excavacio manual e intalacion de sardinel, para el civ 12000914.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
17	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, lluvias leves durante la jornada laboral, instalacion de sardinel del civ 12000914, y se hace limpieza del civ 12000874 y se realizan cortes de andens , exgtencion y nivelacion de subbase para andenes, se demule el concreto y se funden las cintas, se alista pista del MBR.para primera capa .

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
19	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
ARENA DE RIO	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se inicia mexcla de mbr para primera capa, lluvia sfuertes en las horas de la tarde.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
20	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se inician excavacion de sardinel e instalacion de sardinel, al civ 12000914

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
20	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	JJ VARGAS	CIV	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	DESDE	CRA 66A	HASTA	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado, se inician excavacion de sardinel e instalacion de sardinel, al civ 12000914, corte y demolicion de an denes , se realizan tomas de densidades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
24	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Dia nublado lluvias leves durante la jornada laboral, se instala y se nivlea sardinel, corte y demolicion de concreto.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
25	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACIÓN
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continúa sereo B-400, se inicia excavación manual tub Ø 8", cruce acueducto CIV 13000874. Se inicia excavación manual tub Ø 8" sumideros CIV 13000914.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector SISO, 1 comisión de topografía, 3 BOAL, 3 oficiales, 5 ayudantes.
Maquinaria: 1 minicargador.
Clima: Día nublado, lluvias en horas de la tarde.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
26	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala tub Ø 8" sumideros, se inicia lleno excavación tub Ø 8" CIV 13000914, se construye y funde placa cárcamo tub Ø 8" acueducto CIV 13000874.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector SISO, 3 BOAL, 3 oficiales, 5 ayudantes.
Maquinaria: 1 minicargador.
Clima: Día nublado, lluvias en horas de la tarde.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
27	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala tub Ø 8" sumideros, se inicia lleno excavación tub Ø 8" CIV 13000914, se construye y funde placa cárcamo tub Ø 8" acueducto CIV 13000874.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector SISO, 3 BOAL, 3 oficiales, 5 ayudantes.
Maquinaria: 1 minicargador.
Clima: Día nublado, lluvias en horas de la tarde.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
28	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	JJ VARGAS	**CIV**	12000914/12000874	
NOMENCLATURA	CALLE 67 D BIS	**DESDE**	CRA 66A	**HASTA**	CRA 67

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se instala tub Ø 8" sumideros, se inicia lleno excavación tub Ø 8" CIV 13000914, se construye y funde placa cárcamo tub Ø 8" acueducto CIV 13000874.
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 inspector SISO, 3 BOAL, 3 oficiales, 5 ayudantes.
Maquinaria: 1 minicargador.
Clima: Día nublado, lluvias en horas de la tarde.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
3	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	38
TRITURADO 1/3	M3	14
MBR	LT	3400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

EL DÍA 01 - 03 SE HACE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
EL DÍA 03 - 03 SE CONTINÚA SEREO B-400.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
3	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN	REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	38
TRITURADO 1/3	M3	14
MBR	LT	3400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA SEREO B-400, SE INICIA MEZCLA DE SUB-BASE Y FRESADO PARA MBR PRIMERA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
4	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	3
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	0
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	14
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	14
B-400	M3	38
TRITURADO 1/3	M3	14
MBR	LT	3400
EMULSION	-	-
	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -

POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	QWU	14	MATERIAL COMUN
	FGH	14	MAETRIAL COMUN
	QUR	14	MAETRIAL COMUN
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA MEZCLA Y SEREO MBR PRIMERA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
8	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA MEZCLA Y SEREO MBR PRIMERA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
9	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SARDINEL. SE HACEN TOMA DE DENSIDADES MBR PRIMERA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
10	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	DESDE	cra 61	HASTA	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLO
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
11	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SARDINEL.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE SARDINEL CURVAS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	DESDE	cra 61	HASTA	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE FUNDEN HOMBROS SARDINELES.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
15	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACION
	MAÑANA				
	TARDE			x	
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	1	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE INICIAN CORTES Y DEMOLICIÓN CONCRETO ANDÉN PARA CINTA DE AJUSTE ANDÉN COSTADO IZQUIERDO.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
16	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚAN CORTES Y DEMOLICIÓN CONCRETO ANDÉN COSTADO IZQUIERDO, CINTA DE AJUSTE.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
17	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

		SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA					
	TARDE					
ACCIDENTES		SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚAN CORTES Y DEMOLICIÓN CONCRETO ANDÉN COSTADO DERECHO CINTA DE AJUSTE.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
18	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

		SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA					
	TARDE					
ACCIDENTES		SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE INICIA MEZCLA Y SEREO MBR SEGUNDA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 INSPECTOR TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
19	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINUA MEZCLA Y SEREO MBR SEGUNDA CAPA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 INSPECTOR TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
20	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACIÓN
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINUA MEZCLA Y SEREO MBR SEGUNDA CAPA, SE CONTINÚA CORTE, DEMOLICIÓN CONCRETO Y SE INICIA FUNDIDA CINTA DE AJUSTE ANDENES CONCRETO 3000 PSI.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 INSPECTOR TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
23	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

		SI		NO	X	DURACIÓN
LLUVIA	MAÑANA					
	TARDE					
ACCIDENTES		SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
ARENA DE RIO	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE HACEN CORTES Y DEMUELE CONCRETO ANDÉN CONSTADO IZQUIERDO PARA CONTA DE AJUSTE. SE FUNDEN CINTAS AJUSTE CONCRETO 3000 PSI.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 INSPECTOR TOPOGRAFÍA, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
24	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA	TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINUAN CORTES, DEMOLICIÓN CONCRETO Y FUNDIDA CINTAS AJUSTE ANDENES.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
25	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE HACE ASEO EN VÍA
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
26	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV	12000853
NOMENCLATURA	cll 75	DESDE cra 61	HASTA	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

	SI		NO	X	DURACION
LLUVIA	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE FUNDEN CINTAS DE AJUSTE ANDENES
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
27	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE FUNDEN CABEZOTES SUMIDEROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
29	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	SAN FERNANDO	CIV	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	DESDE	cra 61	HASTA	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA DEMOLICIÓN Y FUNDIDA CINTAS DE AJUSTE ANDENES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
MAQUINARIA EN OBRA: 1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA
CLIMA: DÍA NUBLADO, LLUVIAS LEVES DURANTE EL DÍA

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
30	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA DEMOLICIÓN Y FUNDIDA CINTAS DE AJUSTE ANDENES, SE REALIZA LIMPIEZA VÍA.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
1	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la compactacion del material granular y se da inicio a la excavacion manual para la construccion de cajas de inspeccion. Actividades realizadas dentro de las abscisas ko+04 a k0+50 costado norte.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
3	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
cajilla	un	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion de la cajilla para contador y se hace excavacion manual para la localizacion de la tuberia en el predio 34-10 y 34 30 donde no se encontro tuberia. Se hace la construccion de la matera sobre la abscisa k0+15

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
3	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion de 3 cajillas para contador, se hace la excavacion para la construccion de las cajas de inspeccion 3.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
4	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
cajas de insoeccion	un	3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza construccion de las cajas de inspeccion 3 y se hace excavacion para la construccion de las materas. Estas acticidades se llean a cabo en las abscisas k0+03 a k0+49.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
5	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construccion de las materas, y se funden las tapas para las cajas de inspeccion. Actividades en las abscisas k0+03 a k0+49 costado norte.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
6	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	3
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	qwe343	15	maquinas amarillas
	eet349	15	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista hace limpieza producto del material que sale de la intervencion del anden. Se le hace acabados a las materas y se pañetan las cajas de inspeccion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
8	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza prueba de densidades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
9	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000psi	m3	7,5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	ddh978	7,5	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza fundida del anden desde la abscisa k0+03 a k0+34

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
10	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
concreto 3000psi	m3	7.5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	jhe354	7,5	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la fundida del anden costado norte desde la abscisa k0+35 a k0+49 terminando esta este anden.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
11	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	alcazeres	CIV	13003344
NOMENCLATURA	calle 70	DESDE: carrera 34	HASTA:	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la demolicion del concreto existente en el anden costado norte actividad que se encuentra en las abscisas k0+54 a ko+115

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	alcazeres	CIV	13003344
NOMENCLATURA	calle 70	DESDE carrera 34	HASTA	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN	
-	-	-	
-	-	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	ddw675	15	maquinas amarillas
	hhq301	15	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sbg reciclado	ddw675	15	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza excavacion manual para estructura del anden costado norte desde la abscisa k0+54 a k0+70. tambien se hace limpiza de escombro producto de estas actividades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
13	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la excavacion manual para el mejoramiento del anden, desde la abscisa k0+70 a k0+90 costado norte y se da inicio a la conformacion con material granular para la estructura k0+54 a k0+80 se hace compactacion. Durante esta actividad se ah generado fuertes lluviasinpidiendo un buen avance.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

33

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
15	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	alcazeres	CIV	13003344
NOMENCLATURA	calle 70	DESDE carrera 34	HASTA	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza compactacion de material granular instalado el cual se evidencia con exceso de humedad k0+54 a k0+80. adicional da inicio a la construccion de la matera

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
16	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000	m3	7
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	ddu389	7.5	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contrstista hace instalacion del concreto en las abscisas k0+454 a k0+80

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
17	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	gfh657	30	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sbg peatonal	gfh757	15	plabnta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la actividad de excavacion manual k0+90 a k0+115, y se hace limpieza de escombro

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
18	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con la conformacion de la estructura con material sbg reciclado, actividad encontrada en las abscisas k0+80 a k0+100

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
19	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO		TIPO:
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se hace excavacion manual para la construccion de materas y cajas de inspeccion. Se funden cañuelas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
30	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construccion de una caja de inspeccion y la instalacion de una caja para contador de agua.actividad encontradas en las abscisas k0+97. se extiende y se compacta material granular para la ea estructura del anden k0+100 a k0+115

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
33	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realizan densidades. Durante el dia se generaron lluvias fuertes, impidiendo el avance de la obra.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
34	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000 psi	m3	11
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto	wsy	5.5	planta
concreto	fwy645	5,5	planta
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza fundida del anden, se instala geomalla para los accesos vehiculares actividades realizadas en las abscisas k0+80 a k0+115

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
35	3	2021	
35	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	alcazeres	CIV	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	DESDE carrera 34	HASTA	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	8
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	3
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	hfg644	30	maquinas amarillas
	wed343	30	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza demolicion del anden costado sur, desde la abscisa k0+00 a k0+49 y se hace excavacion manual para la estructura desde la abscisa k0+00 a k0+37

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019	
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019	
36	3	2021		
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continuan con las activiidades de excavacion manual y se da inicion a la conformacion con material sbg peatonal. Esto se dentro de las abscisas k0+00 a k0+49 costado sur.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
37	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE** carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
cajillas contador de agua	un	6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se hace la instalacion de las cajillas para los contadores y se realiza construccion de materas y cajas de inspeccion dentro de las abscisas k0+00 a k0+49 costado sur. Se hacen pruebas de densidades.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

16

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
30	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	alcazeres	**CIV**	13003344	
NOMENCLATURA	calle 70	**DESDE**	carrera 34	**HASTA**	carrera 35 y carrera 36

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	3
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	3
Brigadistas	-
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
compresor	
volquetas	
imprimador	
Compactadoras	1
mini Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
canguro	1

MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000psi	m3	10
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	4	CAMARAS	4
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI	x	NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la instalacion de concreto sobre el anden costado sur desde las abscisas k0+00 a k0+30.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ROBINXON ALBEIRO GONZALEZ MENDEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 343 de 3019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 341 de 3019
31	3	2021	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL
DD	MM	AA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	**BARRIO**	SAN FERNANDO	**CIV**	12000853	
NOMENCLATURA	cll 75	**DESDE**	cra 61	**HASTA**	cra 62

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACION
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

BOSQUEJO DEL TRAMO



PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	3
Operarios	-
Topografía	-
Brigadistas	-
Transito	-
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	x
Retroescavadoras	x
Compactadoras	x
Cargadores	x
Finisher	-
Cortadora	-
Canguro	x

MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 3/4"	M3	-
RELLENO B-300	M3	-
RAJON	M3	-
B-400	M3	-
TRITURADO 1/3	M3	-
MBR	LT	-
EMULSION	m3	-
ARENA DE PEÑA	m3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	10	CÁRCAMOS	-
POZOS	4	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

SE CONTINÚA DEMOLICIÓN Y FUNDIDA CINTAS DE AJUSTE ANDENES, LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS.
PERSONAL EN OBRA: 1 INSPECTOR OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 BOAL, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
CLIMA: DÍA NUBLADO.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALEJANDRA HERRAN AVILA

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
1	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

9

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza actividad levantamiento de adoquin, desde las abscisas k0-06 a k0+30.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
2	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MODELO NORTE	CIV	
NOMENCLATURA	calle 71b	DESDE: CARRERA 26	HASTA:	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. MANUEL RUIZ

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se termina de levantar el adoquin de la abscisas k0+30 a k0+59.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALBEIRO GONZALEZ

9

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
3	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
volquetas	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
b-400	m3	5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	**CANT**	**UBICACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza escarificacion del material exiteste en el anden costado sur, se renivela y se le da compactacion.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
4	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
arena amagilla	m3	5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se da inicio a la instalacion del adoquin, actividad realizada descde la abscisa k0-06 a k0+20.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
5	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista continua con las actividades de instalacion de adoquin desde la abscisa k0+20 a k0+40.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
6	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

9

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

el contratista adelanta actividades de instalacion de adoquin, desde la abscisa k0+40 a k0+59.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
8	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza corte e instalacion del adoquin para los extremos y hacer el confinamiento, actividad que se realizo desde las abscisas k0+00 a k0+59.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
9	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el levantamiento e instalacion del adoquin sobre las abscisas k0+59 entrada del parque, se funden cintas de ajuste cada 2 m desde la abscisa k0-6 a k0+59 mas la que se realizo en la entrada del parque.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
10	3	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se da inicio a la demolicion del concreto existente en el anden costrado norte desden la abscisa k0+00n a k0+53.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALBEIRO GONZALEZ

9

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
11	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	gwe224	30	maquinas amarillas
	hsg354	30	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza limpieza de escombro, y se da inicio a la excavacion manual para la estructura de la via que constara de 20cm , 10cm en concreto y 10cm en material granular actividad realizada desde la abscisa k0+00 a ko+25.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
12	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	hdd534	30	maquinas amarillas
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se continua con las actividades de excavacion manual para estructura de la via desde la abscisa k0+25 a k0+53.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
13	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
sub base granular reciclado para espacio p	m3	15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
sbg para espacio publico	gwc243	15	construtriturar
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza el extendido del material granular, se hace el seriado y se compacta. Actividad realizada desde las abscisas k0+00 a k0+53.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
15	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la construccion de las materas k0+45, k0+28 y k0+05.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
16	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se hace la instalacion de bordillo para refurzo en la mitad de las rampas de acceso vehiculas en las abscisas k0+35,k0+23,k0+10.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
17	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
cajas plasticas contador	un	5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se hace la instalacion de las cajas de contadores haciendo las respectivas reparaciones, producto de las actividades realizadas.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

9

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
18	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO TIPO:

PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
densidades	1	k0+16
densidades	1	k0+36
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza jornada de aseo y limpieza del frente de obra y se hacen las pruebas de densidades en el anden costado norte

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

262

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS
19	3	2021	Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**		
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	1
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000psi	m3	7.5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto 3000	mer779	7,45	planta
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza la primer fundida en el anden costado norte donde se hace el extendido del concreto de 10cm de espesor reforzando con malla electro soldada doble en los accesos vehiculares a los preduios.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

9

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
20	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	123002104	
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	6
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
camion del concreto	1
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
concreto 3000	m3	7.5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
concreto 3000	mer779	7.5	planta
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se finaliza con la extendida del concreto para el anden, adicional se funde la rampa peatonal de acceso al parque.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ

FORMATO DIARIO			FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
FECHA			INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No. 242 de 2019
			CONSORCIO BARRIOS UNIDOS Contrato de Obra Pública No. 241 de 2019
30	3	2021	
DD	MM	AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	**BARRIO**	MODELO NORTE	**CIV**	123002104	
NOMENCLATURA	calle 71b	**DESDE**	CARRERA 26	**HASTA**	carrera 27

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	**Ing. JUAN PABLO LEMUS**
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	**Ing. MANUEL RUIZ**

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL

	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	2
Obreros	3
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	-
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
camion del concreto	
Volquetas dobletroques	2
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
fresadora	
Canguro	1

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES

	UND	CANT
md12	m3	75,16
imprimacion x1	m2	426,9
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	**LLEGADA**	**COMPACTACIÓN**
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS	2	CÁRCAMOS	-
POZOS	2	DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X

RAZONES	

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
md12	tdl680	15.09	planta
md12	ufe717	15.48	planta
md12	soa769	15.28	planta
md12	uqd480	14.3	planta
md12	slj996	15.01	planta
-		-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

se realiza imprimacion y continuo a esto se hace la instalacion de la mezcla asfaltica, desde la abscisa k0-6 a k0+59.15 en dos capas teniendo en cuenta que la carpeta asfaltica es de 12cm.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA



ALBEIRO GONZALEZ
