



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



1 de 14

CONTRATO No. PV 12-2018 DE 2018.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guarinó (Cruce Ruta 45) - 5201-T1 EN EL TRAMO Marquetalia – Manzanares.

ALCANCE: Mejoramiento, mantenimiento y conservación del tramo Marquetalia - Manzanares en el sector comprendido entre el K0+000 al K5+000.

VALOR: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOCE (\$6.467.223.412,00) PESOS MONEDA CORRIENTE incluido AIU e IMPUESTOS, Correspondiente a 8.278,13 SMMLV.

PLAZO: NUEVE (09) MESES.

CONTRATISTA: SONACOL S.A.S., identificado con NIT. 830.129.289-8 con domicilio en la carrera 86 # 51-66 oficina 204 en Bogotá D.C., representado legalmente por el ingeniero LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.385.979 expedida en Pasto.

Entre el **INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI-CALDAS**, con NIT número 890.806.006-3 Representada legalmente por su Gerente General, **LUZ STELLA CARDONA MEZA**, identificada con cédula de ciudadanía número 30.297.945, designada para ejercer el cargo mediante resolución número 2633-1 del 04 de abril de 2017, cargo para el cual tomó posesión el día 07 de abril de 2017, según consta en Acta número 034 del 07 de abril de 2017 de la Gobernación de Caldas, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ordenanza 234 de 1998 modificada por la Ordenanza 805 de 2017, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, el ingeniero LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía número 98.385.979 expedida en Pasto, obrando en nombre y representación del **SONACOL S.A.S.**, en su calidad de representante, según carta de presentación de la propuesta (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no, se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución número 119-2018 del 17 de mayo de 2018, previa Licitación Pública Número INFICALDAS LP 03-2018, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias, y las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cruce Ruta 39 (Manzanares) - Guarinó (Cruce Ruta 45) - 5201-T1 EN EL TRAMO Marquetalia – Manzanares**, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.** - El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOCE (\$6.467.223.412,00) PESOS MONEDA CORRIENTE incluido AIU e IMPUESTOS**, equivalente a 8.278,13 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año 2018, **INCLUIDO AIU e IMPUESTOS**, suma que incluye el IVA. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El CONTRATISTA presentó en su propuesta un



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



2 de 14

1 AIU del TREINTA Y UNO 19/100 por ciento (31,19%) discriminado así: Administración del VEINTISEIS
2 19/100 por ciento (26,19%), Imprevistos del CERO por ciento (0%) y Utilidad del CINCO por ciento
3 (5%). **PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.** - El presente contrato está sujeto a la
4 contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de
5 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010, el cual será pagado acorde con lo dispuesto en la
6 ORDENANZA No. 816 del 2017. **PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.** - El contrato de obra se
7 encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la
8 Licitación Pública. **CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - SEIS MIL
9 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
10 CUATROCIENTOS DOCE (\$6.467.223.412,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a)
11 **Costo básico de las obras:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
12 CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS (\$4.811.751.396,00) PESOS MONEDA
13 CORRIENTE como valor básico para obras, b) **Valor de Administración (A) (\$1.260.197.690,00),**
14 **Imprevistos (I) (\$0,00) y de Utilidad (U) (\$240.587.570,00), para un total de (AIU) de**
15 **(\$1.500.785.260,00) c) Valor provisión para AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O**
16 **ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) en básico:** CIENTO DOS MILLONES
17 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$102.572.476,00) PESOS
18 MONEDA CORRIENTE, d) **Valor básico de la caracterización vial:** DOCE MILLONES DOSCIENTOS
19 NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE (\$12.293.512,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, e)
20 **Impuesto al valor agregado IVA de la caracterización vial:** DOS MILLONES TRESCIENTOS
21 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO (\$2.335.768,00) PESOS MONEDA
22 CORRIENTE, f) **Valor básico de la REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O**
23 **AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:** TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL
24 (\$31.500.000,00) PESOS MONEDA CORRIENTE, g) **Impuesto al valor agregado IVA de la**
25 **REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:**
26 CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL (\$5.985.000,00) PESOS MONEDA
27 CORRIENTE. **PARÁGRAFO PRIMERO:** - Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO
28 cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 146 del 06 de marzo de 2018 rubro
29 23010109 - "CONVENIO N° 1237-2017 - INVIAS" expedido por la Profesional Universitaria de
30 Presupuesto del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS
31 VEINTIÚN MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN (\$ 4.721.073.091,00) PESOS
32 MONEDA CORRIENTE y de la vigencia futura 2019 aprobada según Ordenanza No. 814 Referencia
33 Vigencias Futuras de fecha 20 de diciembre de 2017, la suma de UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
34 Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN (\$ 1.746.150.321,00)
35 PESOS MONEDA CORRIENTE para un total comprometido de SEIS MIL CUATROCIENTOS
36 SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DOCE
37 (\$6.467.223.412,00) PESOS MONEDA CORRIENTE. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.** - El plazo para
38 la ejecución del presente contrato será de NUEVE (09) meses, a partir de la Orden de Inicio que
39 impartirá el Supervisor del contrato de obra del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
40 perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información para el
41 control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido
42 con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. **CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.** - El
43 INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas
44 mensuales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al
45 Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período
46 correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente
47 con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago
48 derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las
49 cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad
50 exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de
51 obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
52 participantes. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.** - Para el pago de las Actas mensuales

[Handwritten signature]



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 15 de marzo de 2018 expedida por el Banco BBVA con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 493-004444 en la cual la Tesorería del INSTITUTO abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.** - Las actas de Obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. Del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** De conformidad con lo establecido en la "Cláusula Novena: Multas y Cláusula Penal Pecuniaria", si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará la sanción establecida en la Cláusula citada. **CLÁUSULA SEXTA: ANTICIPO.** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.** - Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas - INFICALDAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo al Supervisor del contrato de obra designado por INFICALDAS, manifestando de manera expresa su aprobación. **PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.** - Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 084169991472 a nombre de INFICALDAS que para el efecto ha definido la Entidad. Copia de la consignación debe ser remitida a la Tesorería de INFICALDAS, al correo electrónico tesorero@inficaldas.com y al correo apoyoeconomicoplanvial2@inficaldas.com definido por el supervisor del contrato, indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número y año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. **PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.** - Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 084169991472 a nombre de INFICALDAS que para el efecto ha definido la Entidad, informando el número y año del



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



1 contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor
2 por rendimientos y el valor por saldos de capital. **PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.** - El
3 anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá
4 ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la
5 respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
6 embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total
7 deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y
8 cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por
9 la interventoría. **PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.** - El CONTRATISTA
10 presentará al Supervisor del Contrato, una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la
11 información necesaria sobre el patrimonio autónomo para proceder con los trámites del giro del
12 anticipo. **PARÁGRAFO SEXTO:** La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
13 obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor
14 revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual
15 de Interventoría. **PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN**
16 **DEL ANTICIPO.** - Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las
17 siguientes reglas: **1)** El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
18 autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. **2)** El plazo del
19 contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del
20 recurso entregado a título de anticipo. **3)** Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
21 autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS,
22 mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. **4)**
23 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los
24 excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma
25 prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el
26 Interventor. **5)** El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por
27 INFICALDAS, previo concepto de la Interventoría. **6)** INFICALDAS remitirá a la entidad fiduciaria el plan
28 de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como
29 Interventor. Así mismo, INFICALDAS informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
30 en la ejecución del contrato. **7)** En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o
31 anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la
32 cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Tesorería de la Entidad, una vez esta
33 comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. **8)** La entidad fiduciaria debe
34 remitir mensualmente a INFICALDAS, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince
35 (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio
36 autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de
37 obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos
38 con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. **CLÁUSULA SEPTIMA:**
39 **GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.** - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento,
40 EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo
41 siguiente: **a)** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria
42 que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
43 su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un
44 millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores
45 estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, **b)** El buen manejo y correcta
46 inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del
47 monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su
48 vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, **c)** El pago de salarios, prestaciones sociales
49 legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio
50 nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
51 contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, **d)** La estabilidad y calidad de
52 las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor

PLA



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



5 de 14

1 final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta
2 de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.
3 e) Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños, por una
4 cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a
5 partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, actualización y/o
6 modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá
7 presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del
8 Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la
9 diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio,
10 EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil
11 Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
12 de los amparos. **PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.** - EL CONTRATISTA se obliga a mantener
13 indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa
14 las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. **PARÁGRAFO CUARTO:**
15 **MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.** - EL CONTRATISTA está obligado a
16 restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que
17 efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del
18 contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga,
19 según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos
20 sancionatorios a que haya lugar. **CLÁUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL**
21 **EXTRA CONTRACTUAL.** - EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la
22 Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u
23 omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato,
24 por el equivalente a Quinientos (500) SMMLV, en el cual el tomador o afianzado será EL
25 CONTRATISTA, el asegurado será INFICALDAS y/o INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS y los
26 beneficiarios los terceros afectados INFICALDAS y/o INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS.
27 **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores
28 estipulados en el numeral quinto del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO**
29 **SEGUNDO:** En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por
30 ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2.000 salarios
31 mínimos mensuales legales vigentes. **PARÁGRAFO TERCERO:** Este seguro deberá constituirse y
32 presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía
33 única. **PARÁGRAFO CUARTO:** Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de
34 estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán
35 admisibles. **PARÁGRAFO QUINTO:** El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
36 como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
37 2015. **CLÁUSULA NOVENA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** - En caso de
38 incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO
39 aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Ley 1474 de 2011. Para el caso de
40 incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una
41 cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al
42 avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará
43 como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
44 consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser
45 indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial
46 o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente
47 al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
48 facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA,
49 EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
50 garantía de cumplimiento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la imposición de las multas establecidas en
51 este **CONTRATO** o en la ley, LA ENTIDAD y sus contratistas, respetarán y actuarán de conformidad
52 con el principio constitucional del debido proceso, para el cual, en desarrollo de la Ley 1150, se expresa



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



6 de 14

el siguiente procedimiento interno y se determinan los elementos mínimos del derecho de defensa a continuación:

a. Tanto la Interventoría como el Supervisor del Contrato deben realizar el control y seguimiento de la ejecución del mismo.

b. Los encargados de la vigilancia y ejecución del Contrato deben identificar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, tanto del **CONTRATISTA** como de la Interventoría.

a. Si el incumplimiento es conocido por la Interventoría del Contrato, esta debe informar dentro de tres (3) días hábiles a **LA ENTIDAD**, señalando sus causas y adjuntando el soporte de carácter técnico y/o fáctico, según sea el caso, que lo pruebe. El Supervisor del Contrato deberá rendir su concepto en el término de 5 días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación.

b. Si el incumplimiento es conocido por parte del Supervisor del Contrato, este debe ponerlo en conocimiento de la Interventoría del Contrato, solicitando su concepto y demandando los motivos por los cuales la Interventoría no había informado del incumplimiento. La Interventoría tiene que rendir su concepto y remitir la información que estime pertinente en el término de 5 días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación.

c. Con base en la información aportada por la Interventoría y/o el Supervisor del Contrato, **LA ENTIDAD** citará al **CONTRATISTA** a la audiencia de decisión sobre la multa:

El requerimiento en virtud del cual **LA ENTIDAD** iniciará un proceso sancionatorio contra el **CONTRATISTA** debido al incumplimiento de obligaciones contractuales, deberá cumplir con los siguientes elementos:

- Motivación detallada en la que se expongan los hechos constitutivos y la causal del incumplimiento del **CONTRATISTA**.

- Enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se inicia el proceso sancionatorio.

- El requerimiento previo de INFICALDAS deberá ser notificado personalmente o subsidiariamente por edicto, de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo VII, artículos 196 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. **LA ENTIDAD** podrá efectuar las notificaciones a través de medios electrónicos en los términos y condiciones señalados en la ley 1437 de 2011.

LA ENTIDAD podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de Interventoría o de Supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **CONTRATISTA** en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b. En desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **CONTRATISTA** en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del **CONTRATISTA** o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



- c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, INFICALDAS procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
- d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Gerente de INFICALDAS o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

Las causales de imposición de multas por parte de **LA ENTIDAD** y el valor de las mismas, son:

1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de Cumplimiento o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso.
2. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso.
3. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras del Contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras impartida por INFICALDAS, el 0.15% del valor del Contrato por cada día de retraso.
4. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del Contrato o de la señalización temporal de las obras o el control del tránsito, el 0.10% del valor del Contrato por cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.
5. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo entregado, el 5% del valor del Contrato, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
6. Por el incumplimiento del Programa de inversión, el 10% del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente.
7. Por el incumplimiento del Programa de Generación de Empleo, un 10% del valor total de la nómina dejada de contratar en el mes respectivo.
8. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto del Contrato, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de ausencia.
9. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la interventoría del Contrato o por INFICALDAS, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso.
10. Por no ubicar en el sitio de las obras del Contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en la Propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso.
11. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del Contrato, sin autorización previa, expresa y escrita de parte de INFICALDAS, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.
12. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la interventoría respecto de la ejecución de las obras objeto del Contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del Contrato, el 5.0% del valor del Contrato, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



8 de 14

13. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale la interventoría del Contrato, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de corregirlos en nuevo plazo que para el efecto señale la interventoría.
14. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado del Contrato, el 1.0% del valor del Contrato por cada día de retraso injustificado.
15. Por incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los numerales anterior, se impondrá una multa equivalente al 0.10% del valor del Contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de la respectiva obligación.
16. Por el incumplimiento de no presentar la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato (Parágrafo segundo de la Cláusula Quinta), se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS. - El valor de las multas señaladas anteriormente se actualizará de acuerdo con el IPC desde el Día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta que la misma sea pagada en su totalidad por el **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. **PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.** - En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION.** - El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo

establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

PARÁGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.** - Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Supervisor del contrato de obra

designado por INFICALDAS expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.** - El CONTRATISTA se



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



9 de 14

1 obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para
2 aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor
3 Agregado (IVA). **CLÁUSULA DECIMA CUARTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.** -
4 Las disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL
5 CONTRATO del Pliego de condiciones de la Licitación Pública, hacen parte integrante del presente
6 documento. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** - El presente
7 contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la
8 expedición del respectivo registro presupuestal por la Profesional Universitaria de Presupuesto del
9 INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas
10 correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Manizales, a los 13 días del mes
11 de junio de 2018.
12
13

14 **POR EL INSTITUTO:**

15
16 **LUZ STELLA CARDONA MEZA**

17
18
19
20
21
22
23

Gerente General

24 **POR EL CONTRATISTA:**

25
26 **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Representante Legal
SONACOL S.A.S.

37 Elaboró: Ricardo Emilio Londoño Botero, Subgerente de Proyectos Energéticos e Infraestructura
38 Vo.Bo. Minuta: Sandra Milena Ramírez Vasco, Abogada Externa
39 Vo.Bo. Minuta: Jorge Eduard Ocampo Suárez, Jefe oficina Jurídica
40 Vo.Bo. Minuta: Andrés Mauricio Gaitán Guzmán, Secretario General
41

PR



g



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



- 1 CÉDULA DE CIUDADANÍA
- 2

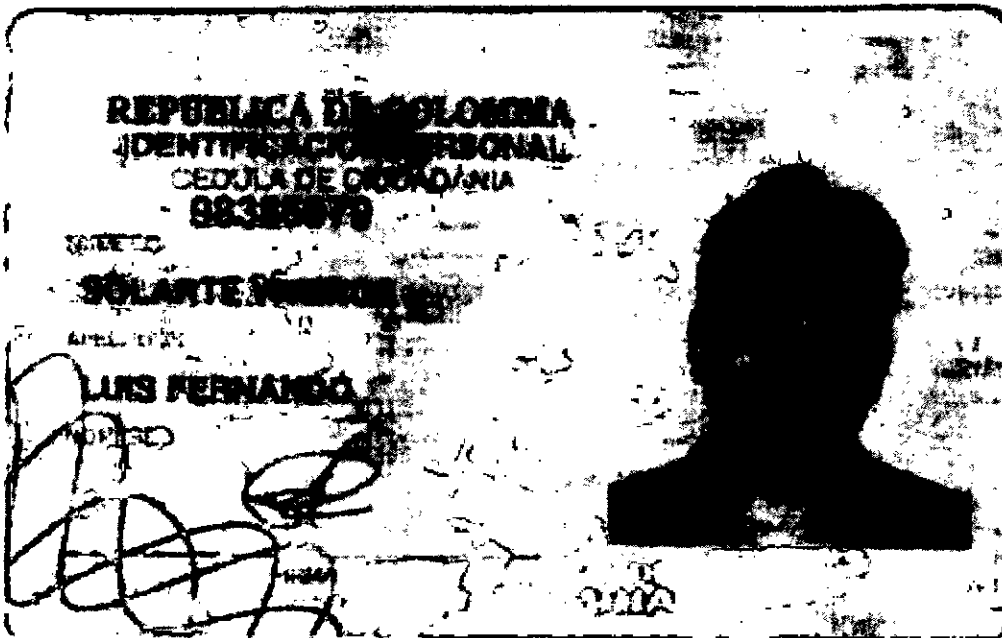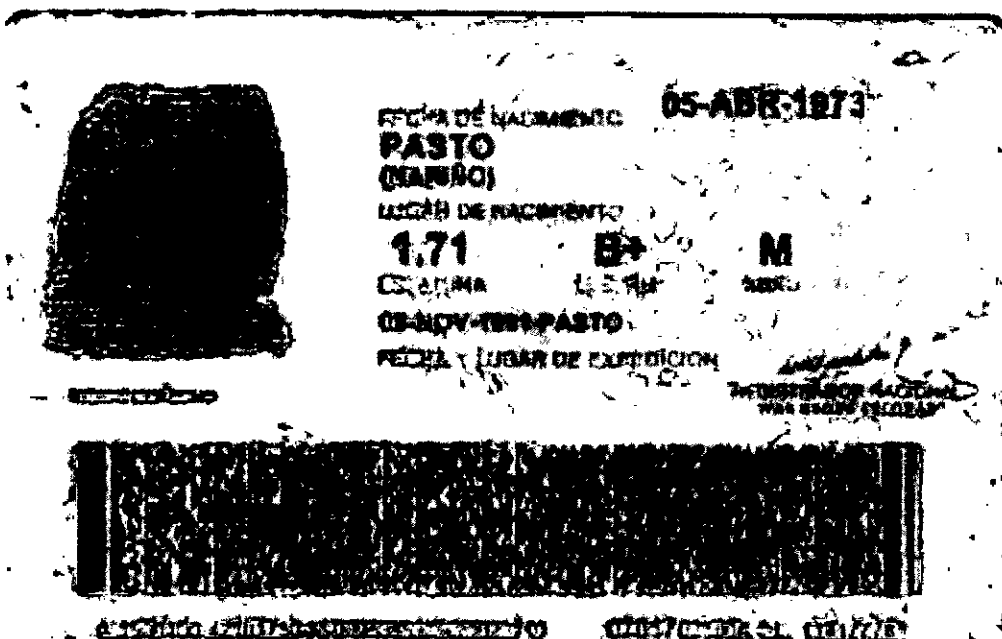

[Handwritten signature]

- 3
- 4



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



11 de 14

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, abril 6 de 2018

Señores

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS

Calle 21 No. 23-22

Edificio Atlas, Piso 4

Manizales

Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Módulos: 1,2,3,5,6,7,8,9,10 y 11

REFERENCIA: Proceso de Selección No. INFICALDAS LP 03-2018

Nosotros los suscritos: SONACOL SAS de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS y, en caso que nos sea aceptada por el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que:

- **Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.**
- **Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.**
- **Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de Condiciones del presente proceso y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.**
- **Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.**
- **Que asumimos el reconocimiento y asunción, de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato, incluidos los riesgos ambientales.**
- **Que la información contenida en el formulario de experiencia y los contratos, acta de terminación y/o el acta de recibo final de obra y/o liquidación, relativas a su experiencia son veraces.**
- **Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.**

Handwritten signature



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



12 de 14

- Que asumimos la obligación en caso de resultar adjudicatario de la licitación pública, vincular laboralmente para el desarrollo del presente contrato mínimo el diez por ciento (10%) de la nómina requerida, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.
- Que ni yo, ni los integrantes del consorcio o unión temporal (persona jurídicas o naturales), ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
- Que ni yo, ni los integrantes del consorcio o unión temporal estamos incurso en la situación descrita del artículo 38 de la ley 1116 de 2008.
- Que conocemos el anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.
- Que los recursos destinados al proyecto propuesto son de origen lícito y que no he (mos) participado en actividades delictivas, así como no he (mos) recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
- Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del presente proceso de selección adenda 1 del 23/03/18, adenda 2 del 2/04/18 y que aceptamos su contenido.
- Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Atentamente,

Nombre del proponente: **SONACOL SAS**

No. del NIT 830.129.289-8

Nombre del Representante Legal: **LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS**

C.C.98.385.979 Expedida en Pasto

Matrícula Profesional No. 25202087833 CND

Dirección de correo (físico): CRA 86 #51-88 oficina 204

Ciudad: **BOGOTA D.C**

Correo electrónico: **diana.patino@grupolhs.com , grupolhs@grupolhs.com**

Teléfono fijo: **3456777 ext. 174**

Celular: **3208654596**

Fax: **3456777**

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS

C.C.98.385.979 de Pasto

Matrícula Profesional No. 25202087833 CND

INGENIERO CIVIL



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



13 de 14

AIU:

26.19%	
0.00%	
5.0%	

VALORES DE LA PROPUESTA

\$ 4,811,751,396.00
\$ 1,260,197,691.00
\$ 0.00
\$ 240,587,570.00
\$ 6,312,536,657.00

\$ 102,572,476.00
\$ 12,293,512.00
\$ 2,335,768.00
\$ 31,500,000.00
\$ 5,985,000.00

\$ 6,467,223,413.00

21



MINUTA PARA LA CONTRATACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO No. INFICALDAS LP-03-2018
CONTRATO No. PV 12-2018



14 de 14

1 CERTIFICACIÓN BANCARIA

BBVA Creando
Oportunidades



CERTIFICA

Que la empresa **SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT JURÍDICO 830.129.289-8, es cliente de nuestra sucursal desde 25 de Julio de 2005 vinculado a través de la CUENTA CORRIENTE No 493-004444, la cual se encuentra vigente y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.

Bogotá, Marzo 15 de 2018.

FIRMA AUTOGRÁFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVA COLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
