

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-CO-FO – 01	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:15-03-2022	
	OFICINA: TESORERIA	VERSION: 02	
	TIPO DOCUMENTO: ACTA PARCIAL	Página 1 de 2	

ACTA PARCIAL		
ACTA PARCIAL N°.	003	
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATO <u>X</u> CONVENIO	AMS-CD-05-2025	DE FECHA: 14 DE ENERO DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ.	
CONTRATISTA	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA	C.C. 1.002.725.831 DE TIPACOQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	YIME YOANA HUÉRFANO CORREA TESORERA MUNICIPAL	

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO:	VALOR INICIAL:	\$20.000.000
	APORTE MUNICIPIO:	\$20.000.000
ADICIONAL N°	VALOR	\$ 0.00
ADICIONAL N°	VALOR	
VALOR TOTAL	VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) M/CTE	
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES	
ADICIONAL EN TIEMPO N°	TIEMPO:	DIAS DE FECHA:
ADICIONAL EN TIEMPO N°	TIEMPO:	
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE ENERO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	DE FECHA:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	DE FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	37,5%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO 85,5%

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 Celular : 3108003789 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-CO-FO – 01	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA: 15-03-2022	
	OFICINA: TESORERIA	VERSION: 02	
	TIPO DOCUMENTO: ACTA PARCIAL	Página 2 de 2	

En las oficinas de Alcaldía Municipal se reunieron los señores, YIME YOANA HUERFANO CORREA en calidad de Supervisora y LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA como contratista, con el fin de suscribir la presente acta.


Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoría, por tanto, el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta.


CONTROL ANTICIPOS		
Valor Anticipo		\$ 0.00
Sumatoria Amortizaciones		\$ 0.00
Saldo por Amortizar		\$ 0.00

BALANCE DE PAGO		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$20.000.000,00	
valor adicional contrato	\$ 0,00	
Valor para pagar de la presente acta		\$7.500.000,00
Valor Total actas pagadas	-	\$8.750.000,00
Saldo por ejecutar o cancelar a contratista		\$3.750.000,00
Sumas iguales	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00

Valor por pagar presente acta: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.500.000,00)

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: YIME YOANA HUÉRFANO CORREA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: LAURA JIMENA
PIRACHICAN PEDRAZA
CONTRATISTA

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024	
		Página 1 de 16	

**INFORME DE SUPERVISION N° 003
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMS-CD-05-2025**

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025
---	--

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YIME YOANA HUERFANO CORREA
DEPENDENCIA	TESORERIA
CARGO	TESORERA

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	AMS-CD-05-2025
FECHA DE CONTRATO	14 de Enero de 2025
CONTRATISTA	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.002.725.831 DE TIPACOQUE
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO.A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ.
VALOR	\$20.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	2025000013
REGISTRO PRESUPESTAL	2025000012
PLAZO	OCHO (08) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 2 de 16	

OBSERVACIONES: NINGUNA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

N° planilla	ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
87109488	SALUD	2025-05	2025-06-12	\$178.300,00
87109488	PENSION	2025-05	2025-06-12	\$228.100,00
87109488	RIEGOS LABORALES	2025-05	2025-06-12	\$7.600,00
87109500	SALUD	2025-06	2025-07-14	\$178.700,00
87109500	PENSION	2025-06	2025-07-14	\$228.700,00
87109500	RIEGOS LABORALES	2025-06	2025-07-14	\$7.600,00
88984628	SALUD	2025-07	2025-03-05	\$178.300,00
88984628	PENSION	2025-07	2025-03-05	\$228.100,00
88984628	RIEGOS LABORALES	2025-07	2025-03-05	\$7.600,00

2. GARANTIAS Y/O POLIZAS CONTRACTUALES

N° PÓLIZA Y FECHA DE EXPEDICIÓN	TIPO DE POLIZA	AMPARO S	VIGENCIA POLIZA DESDE - HASTA		PORCENTAJE ASEGURADO	VALOR ASEGURADO
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACION		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X		X		X

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880
E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co
www.susacon-boyaca.gov.co

Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa
Tesorera

Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa
Tesorera

Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón
Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 3 de 16	

4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

Actividad Contratada		Acciones Realizadas
1	Brindar acompañamiento en la formulación de proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), aplicando la metodología general ajustada (MGA) de acuerdo con las necesidades del municipio, conforme a lo establecido en el decreto único reglamentario.	- De acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo 2024 – 2027, lo establecido en el capítulo independiente de regalías y los documentos de lineamientos ambientes emitidos por la CORPORAACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) la contratista ha venido dando revisión a iniciativas propuestas que se contemplan para dar ejecución a los recursos SGR MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENNIBLE. - La contratista asistió a las capacitaciones propuestas por la gobernación de Boyacá y CORPOBOYACA, para revisión de proyectos e iniciativas a ejecutar en el municipio.
2	Proporcionar apoyo en la elaboración del documento técnico que respalde la metodología general ajustada (MGA) para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).	Durante este periodo no se requirió el apoyo de la contratista para esta actividad.

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 4 de 16	

3	Colaborar en la elaboración de certificaciones y documentos administrativos requeridos para la formulación de proyectos, siguiendo lo dispuesto en la guía de orientaciones transitorias y otros documentos orientadores que guían la formulación y/o estructuración de proyectos para cumplir con los requisitos del capítulo independiente de regalías.	Durante este periodo no se requirió el apoyo de la contratista para esta actividad.
4	Brindar apoyo y acompañamiento al municipio en la elaboración de informes y el llenado de formatos de información para el Sistema General de Regalías, conforme a lo requerido en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) y/o en entidades del orden nacional, departamental y de control.	- La contratista elabora informe y solicitud al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP de corrección y ajuste del aplicativo GESPROY en lo relacionado con el proyecto identificado con código BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, dicha solicitud ha sido reiterada en dos ocasiones al DNP y se está a la espera de respuesta. - La contratista proyecto respuesta derecha de petición referente a contrato de obra MSB-OB-02-2019, con objeto, PAVIMENTACIÓN EN ADOQUIN DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 3 A LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ.

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 5 de 16	

5	Apoyar en el seguimiento, monitoreo y carga de información de los proyectos del Sistema General de Regalías (SGR) en los aplicativos correspondientes (Gesproy, Cuentas, SUIFP SGR y otros que se requieran)	De acuerdo con las iniciativas y proyectos aprobados para dar cumplimiento al capítulo independiente de regalías, durante el periodo se cuenta con dos proyectos que cumplen con lo establecido por el DNP para realizar seguimiento. - BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ La contratista realizó el proceso de aprobación y envió correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2025 dentro de los plazos establecidos por el DNP. - Realizó el cargue de la información correspondiente los documentos que hacen parte del expediente contractual de los contratos derivados de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR.

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024	
		Página 6 de 16	

		- Pólizas de cumplimiento - Póliza de responsabilidad civil extracontractual - Contratos - Registros presupuestales - Actas de inicio Y demás documentos expedidos dentro del proceso. • De acuerdo con la información entregada por parte de la secretaria de planeación la contratista realiza el reporte de avance en la ejecución de los proyectos.
6	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la gestión y manejo de la plataforma del SPGR, específicamente en el rol de la Secretaría de Planeación, en las actividades y reportes que sean necesarios en dicho aplicativo.	• La contratista apoyo a la secretaria de Planeación y Obras públicas, en validación de cronogramas de flujo de fondos establecidos para la ejecución de los contratos de obra e interventoría resultantes de la ejecución del proyecto con código BPIN BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. • La contratista apoyo a la secretaria de planeación en la validación y aprobación del cronograma de flujo de fondos para la ejecución del contrato resultante del proyecto identificado con código BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 7 de 16	

		ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. La contratista brinda apoyo a la secretaria de planeación en la validación y verificación de los recursos asignados por partes del Ministerio de Hacienda para el funcionamiento de la secretaria de planeación en lo relacionado a formulación y seguimiento de la ejecución de los recursos del SGR.
7	Prestar apoyo integral a la Tesorería Municipal en el manejo de la plataforma del SPGR, especialmente en los perfiles de gestión presupuestaria, gestión contable y como pagador central.	- La contratista apoyo a la Tesorería municipal en la solicitud y expedición de RP como garante del compromiso presupuestal para los contratos de obra e interventoría resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. - La contratista apoyo a la Tesorería municipal en la solicitud y expedición de RP como garante del compromiso presupuestal para los contratos resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 8 de 16	

		ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
8	Proporcionar asesoría en la elaboración de los informes relacionados con los recursos del SGR, ya sea para el desarrollo de procesos internos dentro de la entidad o para los reportes que se requieran por parte de los entes de control.	- La contratista apoyo a la Tesorería Municipal en el reporte de información y/o ejecución de recursos de SGR durante la vigencia 2024 y que conlleven a dar respuesta a los requerimientos realizados por entes de control en procesos de auditoría que se adelanta. - La contratista apoyo a la secretaria de planeación en la verificación de las plataformas GESPROY Y SPGR que permitan mediante la información reportada en estas, dar controversia a auditoría realizada a proyectos aprobados durante la vigencia 2023 y que fueron financiados con recursos de SGR.
9	Brindar apoyo a la Tesorería Municipal en la verificación de la inversión de los recursos durante el bienio 2023-2024, asegurando que los informes sean precisos y cumplan con los lineamientos establecidos.	De acuerdo con el proceso de cierre del bienio de la entidad adelantado en el periodo del informe de actividades N° 1, se dio verificación a los actos administrativos emitidos por la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Hacienda y en los cuales se evidencia el cierre realizado.
10	Apoyar a la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la proyección y/o elaboración del decreto de cierre del bienio 2023-2024 y en la determinación	Durante el periodo comprendido a este informe no se realizó diligenciamiento de formatos y/o informes que guarden relación con esta actividad.

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal


	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 9 de 16	

	de los saldos iniciales de ejecución para el bienio 2025-2026.	Lo anterior dado que el proceso de cierre se realizó durante el periodo comprendido en el informe de actividades N° 1
11	Presentar informes de actividades al supervisor sobre la ejecución del respectivo contrato.	Se dio recibido al informe de actividades correspondientes al periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de julio, que conllevaran a la correcta ejecución del contrato.
12	Realizar las demás actividades que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del contratado y las que designe el alcalde.	De acuerdo con el objeto contractual se dio cumplimiento a las orientaciones dadas por el alcalde
13	.En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 6 de la Ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra en al día en el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y/o Laborales), así como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato, respetando lo establecido por el Ministerio del Trabajo frente a los IBC por ingresos.	como cumplimiento de esta obligación contractual se valida que la contratista realizó aporte al sistema de seguridad social de acuerdo con lo establecido en la normatividad nacional, y para lo cual se anexaron las planillas de soporte de las contribuciones realizadas.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOPORTE A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024 Página 11 de 16	

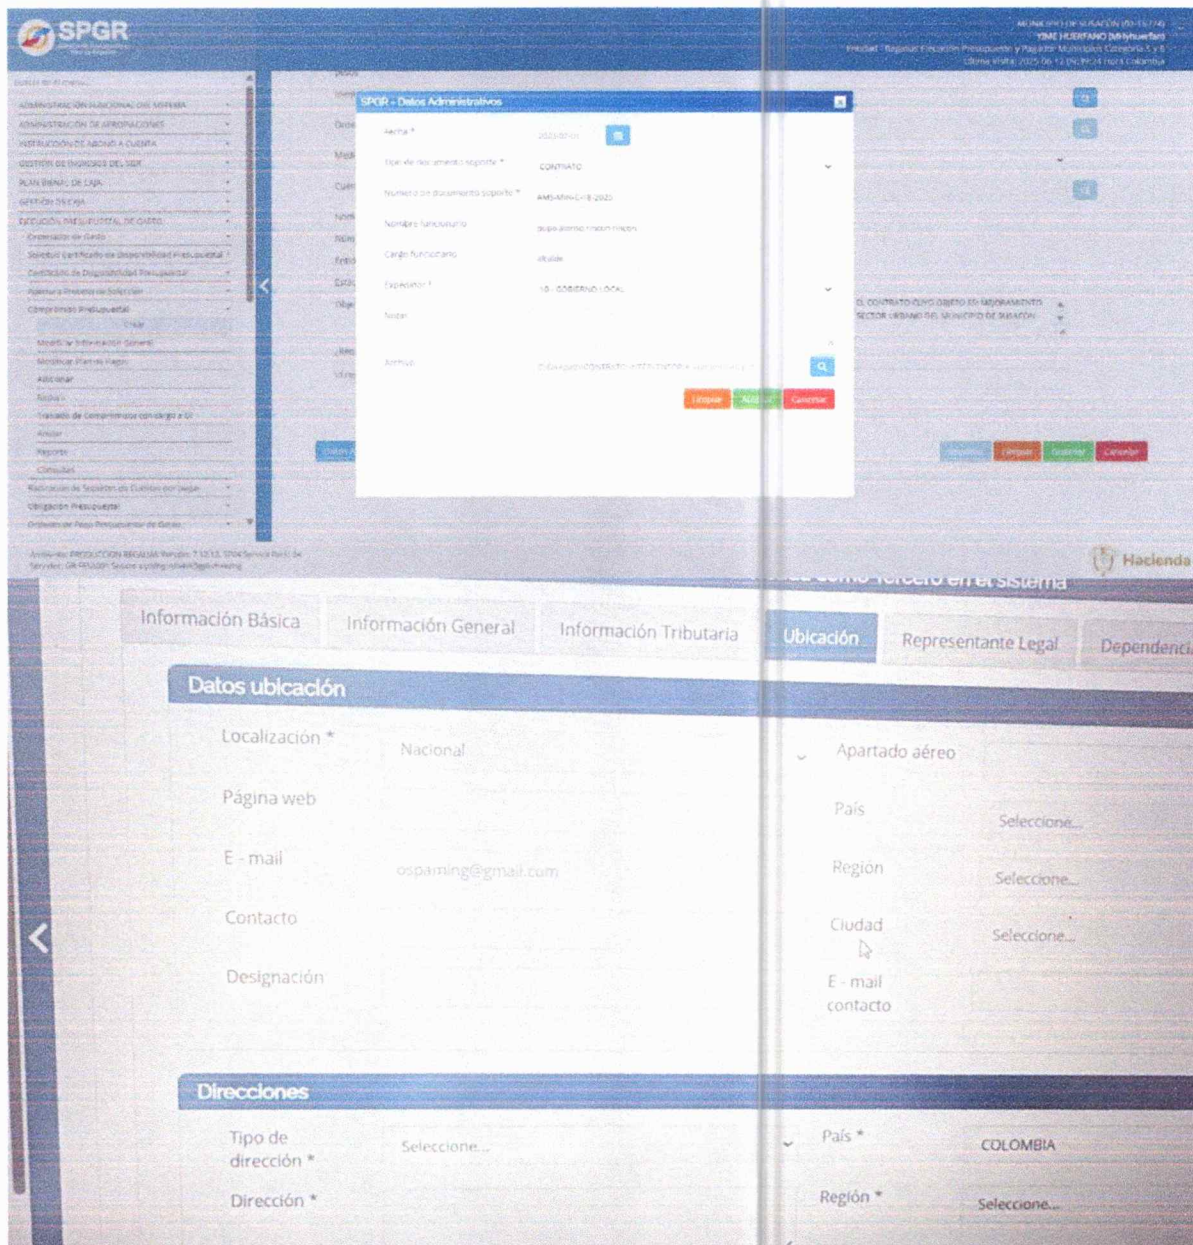

SPGR - Datos Administrativos

Activa * 2024-01-01

Tipo de documento soporte * CONTRATO

Número de documento soporte * AMS-MECI-18-2023

Nombre funcionario * Pupo Alonso Rincón Rincón

Cargo funcionario * alcalde

Explicación * 10 - OMBUDSMAN LOCAL

Fecha *

Aprobado * Pupo Alonso Rincón Rincón

Datos ubicación

Localización * Nacional

Página web *

E - mail * ospaming@gmail.com

Contacto *

Designación *

Direcciones

Tipo de dirección * Seleccione...

Dirección *

País * COLOMBIA

Región * Seleccione...

Ciudad *

E - mail contacto *

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACÓN ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02 FECHA:	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02	
	OFICINA: TESORERA	MSB-CD-44-2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 12 de 16	



MUNICIPIO DE SUSACÓN 00-15749
YIME HUÉRFANO (Mihyherfano)
Entidad - Regalias Ejecución Presupuesto y Pagador: Municipal Categoría 5 y 6
Última Visita: 2025-07-11 09:46:34 Hora Colombia

ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
ADMINISTRACIÓN DE APROPRIACIONES
INSTRUCCIÓN DE XISNO A CUENTA
GESTIÓN DE ANEXOS DEL SCR
PLAN DE SAL DE CAJA
GESTIÓN DE CAJA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
REGISTRO DE PROYECTOS
COMPROBANTES CONTABLES
TERCEROS
DIARIO DE VIGENCIA PRESUPUESTAL
CUENTAS BANCARIAS
Tercero
Reporte
Reporte Cuentas No Vinculadas
Reporte
Reporte Salidas por Imputar de Documentos de recibos por clasificar
CONSTRUCCIÓN DE TRANSFERENCIAS
ADMINISTRAR ORDENES DE PAGO

Entidad financiera *
Tipo cuenta bancaria
Nombre de cuenta
Estado
Fecha vigencia *
Número *
Tipo moneda

Sucursales

Código	Descripción

Se vinculó exitosamente la PCI con la cuenta bancaria del tercero.

Botones: Datos Administrativos, Guardar, Cancelar

Se vinculo exitosamente la PCI con la cuenta bancaria del tercero.

Botones: Datos Administrativos, Guardar, Cancelar

Alcaldía Municipal

Documento

N. Amparo

Fecha

18-07-2025

Crear Documento

Tipos Cobramiento	Valor	porcentaje	Fecha inicial	Fecha Final	Observación
Quin mensual del contrato	20.000.000,00	40,00	01/01/2025	31/03/2025	
Cuentas	10.000.000,00	20,00	01/01/2025	31/03/2025	
Guarantías	10.000.000,00	20,00	01/01/2025	31/03/2025	
Declaración y presupuesto	5.000.000,00	10,00	01/01/2025	31/03/2025	

Actividad y Modificaciones Amparo: 20-44-1944/2025

Crear Modificación del Presupuesto del Contrato

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA:	
	OFICINA: TESORERA	VERSION: 02	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	MSB-CD-44-2024	
		Página 15 de 16	

FECHA DEL ACTA (DD/MM/AAAA)	CONCEPTO (ANTICIPO O ACTAS)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
14/01/2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.000.000,00	SGP
N/A	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 20.000.000,00	
13/03/2025	VALOR ACTA PARCIAL 1	\$5.000.000,00	SGP
30/04/2025	VALOR ACTA PARCIAL 2	\$3.750.000,00	
13/08/2025	VALOR ACTA PARCIAL 3	\$7.500.000,00	
VALOR PAGADO		\$ 0,00	
SALDO SIN EJECUTAR O CANCELAR AL CONTRATISTA		\$3.750.000,00	

8. FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nº FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA	VALOR
CUENTA COBRO	13/08/2025	\$7.500.000,00

9. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

10. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

11. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: PRESENTÓ INFORMES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.			

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

	DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE SUSACON ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 891856472-1	CODIGO: A-MECI- GA-IS-FO – 02 FECHA:	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 02	
	OFICINA: TESORERA	MSB-CD-44-2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 16 de 16	

12. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA PRESENTE INFORME	PRESUPUESTAL PRESENTE INFORME
	37,50%	37,50%
	FÍSICA ACUMULADA	PRESUPUESTAL ACUMULADA
	81,25%%	81,25%

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISION DE ACUERDO CON INFORME ENTREGADO PARA EL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2025 Y EL 30 DE JULIO DE 2025

14. FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DE 2025


YIME YOANA HUÉRFANO CORREA
Tesorera

Carrera 4 No 6-29 Parque Principal Palacio Municipal – Código Postal 150880 E-mail: alcaldia@susacon-boyaca.gov.co www.susacon-boyaca.gov.co	Elaboró: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Revisó: Yime Yoana Huérfano Correa Tesorera
	Aprobó: Pupo Alonso Rincón Rincón Alcalde Municipal

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003
AMS-CD-05-2025

FECHA: AGOSTO 2025
NOMBRE CONTRATISTA: LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA
DOC IDENTIDAD: 1.002.725.831 DE TIPACOQUE
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN ELMUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ.

A continuación, relaciono las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 Julio de 2025 con sus respectivos anexos en el desarrollo del contrato **AMS-CD-05-2025**

Actividad Contratada		Acciones Realizadas
1	Brindar acompañamiento en la formulación de proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), aplicando la metodología general ajustada (MGA) de acuerdo con las necesidades del municipio, conforme a lo establecido en el decreto único reglamentario.	- De acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo 2024 – 2027, lo establecido en el capítulo independiente de regalías y los documentos de lineamientos ambientes emitidos por la CORPORAACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) se ha dado revisión a iniciativas propuestas que se contemplan para dar ejecución a los recursos SGR MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENNIBLE. - Se asistió a las capacitaciones propuestas por la gobernación de Boyacá y CORPOBOYACA, para revisión de proyectos e iniciativas a ejecutar en el municipio.
2	Proporcionar apoyo en la elaboración del documento técnico que respalde la metodología general ajustada (MGA) para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).	Durante el periodo comprendido a este informe no se realizó diligenciamiento de formatos y/o informes que guarden relación con esta actividad.

3	Colaborar en la elaboración de certificaciones y documentos administrativos requeridos para la formulación de proyectos, siguiendo lo dispuesto en la guía de orientaciones transitorias y otros documentos orientadores que guían la formulación y/o estructuración de proyectos para cumplir con los requisitos del capítulo independiente de regalías.	Durante el periodo comprendido a este informe no se realizó diligenciamiento de formatos y/o informes que guarden relación con esta actividad.
4	Brindar apoyo y acompañamiento al municipio en la elaboración de informes y el llenado de formatos de información para el Sistema General de Regalías, conforme a lo requerido en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) y/o en entidades del orden nacional, departamental y de control.	• Se elabora informe y solicitud al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP de corrección y ajuste del aplicativo GESPROY en lo relacionado con el proyecto identificado con código BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, dicha solicitud ha sido reiterada en dos ocasiones al DNP y se está a la espera de respuesta. • Se proyecto respuesta derecha de petición referente a contrato de obra MSB-OB-02-2019, con objeto, PAVIMENTACIÓN EN ADOQUIN DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 3 A LA SALIDA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN BOYACÁ.
5	Apoyar en el seguimiento, monitoreo y carga de información de los proyectos del Sistema General de Regalías (SGR) en los aplicativos correspondientes (Gesproy, Cuentas, SUIFP SGR y otros que se requieran)	De acuerdo con las iniciativas y proyectos aprobados para dar cumplimiento al capítulo independiente de regalías, durante el periodo se cuenta con dos proyectos que cumplen con lo establecido por el DNP para realizar seguimiento. • BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

		• BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Proyectos a los cuales se les realizó el proceso de aprobación y envió correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2025 dentro de los plazos establecidos por el DNP. • Se realizó el cargue de la información correspondiente los documentos que hacen parte del expediente contractual de los contratos derivados de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del srg. - Pólizas de cumplimiento - Póliza de responsabilidad civil extracontractual - Contratos - Registros presupuestales - Actas de inicio Y demás documentos expedidos dentro del proceso. • De acuerdo con la información entregada por parte de la secretaria de planeación se realiza el reporte de avance en la ejecución de los proyectos.
6	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la gestión y manejo de la plataforma del SPGR, específicamente en el rol de la Secretaría de Planeación, en las actividades y reportes que sean necesarios en dicho aplicativo.	• Apoyo a la secretaria de Planeación y Obras públicas, en validación de cronogramas de flujo de fondos establecidos para la ejecución de los contratos de obra e interventoría resultantes de la ejecución del proyecto con código BPIN BPIN: 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN

		- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. • se apoya a la secretaria de planeación en la validación y aprobación del cronograma de flujo de fondos para la ejecución del contrato resultante del proyecto identificado con código BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. • Se brinda apoyo a la secretaria de planeación en la validación y verificación de los recursos asignados por partes del Ministerio de Hacienda para el funcionamiento de la secretaria de planeación en lo relacionado a formulación y seguimiento de la ejecución de los recursos del SGR.
7	Prestar apoyo integral a la Tesorería Municipal en el manejo de la plataforma del SPGR, especialmente en los perfiles de gestión presupuestaria, gestión contable y como pagador central.	• Apoyo a la Tesorería municipal en la solicitud y expedición de RP como garante del compromiso presupuestal para los contratos de obra e interventoría resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2025157740001 cuyo objetivo es; MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOCATIVOS EN VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. • Apoyo a la Tesorería municipal en la solicitud y expedición de RP como garante del compromiso presupuestal para los contratos resultantes del proyecto identificado con código BPIN 2025157740003 cuyo objetivo es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE ADOQUINAMIENTO DE LAS VÍAS CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9; CALLE 8

		ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4; CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
8	Proporcionar asesoría en la elaboración de los informes relacionados con los recursos del SGR, ya sea para el desarrollo de procesos internos dentro de la entidad o para los reportes que se requieran por parte de los entes de control.	- Se brindo apoyo a la Tesorería Municipal en el reporte de información y/o ejecución de recursos de SGR durante la vigencia 2024 y que conlleven a dar respuesta a los requerimientos realizados por entes de control en procesos de auditoría que se adelanta. - Se apoyo a la secretaria de planeación en la verificación de las plataformas GESPROY Y SPGR que permitan mediante la información reportada en estas, dar controversia a auditoria realizada a proyectos aprobados durante la vigencia 2023 y que fueron financiados con recursos de SGR.
9	Brindar apoyo a la Tesorería Municipal en la verificación de la inversión de los recursos durante el bienio 2023-2024, asegurando que los informes sean precisos y cumplan con los lineamientos establecidos.	De acuerdo con el proceso de cierre del bienio de la entidad adelantado en el periodo del informe de actividades N° 1, se dio verificación a los actos administrativos emitidos por la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Hacienda y en los cuales se evidencia el cierre realizado.
10	Apoyar a la Tesorería Municipal y a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la proyección y/o elaboración del decreto de cierre del bienio 2023-2024 y en la determinación de los saldos iniciales de ejecución para el bienio 2025-2026.	Durante el periodo comprendido a este informe no se realizó diligenciamiento de formatos y/o informes que guarden relación con esta actividad. Lo anterior dado que el proceso de cierre se realizo durante el periodo comprendido en el informe de actividades N° 1.
11	Presentar informes de actividades al supervisor sobre la ejecución del respectivo contrato.	Se acataron todas las orientaciones dadas por la supervisión que conllevaran a la correcta ejecución del contrato.
12	Realizar las demás actividades que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del	como cumplimiento de esta obligación se presenta este informe en donde se enuncian las demás acciones adelantadas durante el periodo

	contratado y las que designe el alcalde.	comprendido entre el 01 de Mayo de 2025 y el 31 de Julio de 2025.
13	. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes. especialmente el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 6 de la Ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra en al día en el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y/o Laborales), así como los parafiscales propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para hacer los cobros del contrato, respetando lo establecido por el Ministerio del Trabajo frente a los IBC por ingresos.	como cumplimiento de esta obligación contractual se realizó el respectivo aporte al sistema de seguridad social de acuerdo con lo establecido en la normatividad nacional, y para lo cual se anexan las planillas de soporte de las contribuciones realizadas.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA

[illegible]


Programación de Actividades

ID	Código	Descripción	Tiempo (en días)			Unidad de medida	Cantidad total	Valor total	Aporte en especie	Predecible
			Optimista	Probable	Pesimista					
1	1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO								
1.1.1	1.1.1	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 755 000	No
2	1.2	DISEÑO DE PAVIMENTO								
1.2.1	1.2.1	DISEÑO DE PAVIMENTO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 350 000	No
3	1.3	DISEÑO GEOMÉTRICO								
1.3.1	1.3.1	DISEÑO GEOMÉTRICO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
4	1.4	ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y EL COSTO								
1.4.1	1.4.1	ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y EL COSTO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 275 000	No
5	1.5	ESTUDIO HIDROLÓGICO								
1.5.1	1.5.1	ESTUDIO HIDROLÓGICO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
6	1.6	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
1.6.1	1.6.1	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 550 000	No
7	1.7	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA								
1.7.1	1.7.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 795 000	No
8	1.8	ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES								
1.8.1	1.8.1	ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
9	1.9	COMPONENTE FINANCIERO								
1.9.1	1.9.1	COMPONENTE FINANCIERO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 3 330 750	No
10	1.10	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES								
1.10.1	1.10.1	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 197 250	No
11	1.11	ESTUDIO HIDROLÓGICO								
1.11.1	1.11.1	ESTUDIO HIDROLÓGICO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
12	1.12	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								
1.12.1	1.12.1	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 550 000	No
13	1.13	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA								
1.13.1	1.13.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 795 000	No
14	1.14	ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES								
1.14.1	1.14.1	ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
15	1.15	COMPONENTE FINANCIERO								
1.15.1	1.15.1	COMPONENTE FINANCIERO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 595 750	No
16	1.16	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES								
1.16.1	1.16.1	DISEÑO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIORES	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 197 250	No
17	1.17	DISEÑO DE URBANISMO								
1.17.1	1.17.1	DISEÑO DE URBANISMO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 155 000	No
18	1.18	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL								
1.18.1	1.18.1	ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 575 000	No
19	1.19	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
1.19.1	1.19.1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 190 000	No
20	1.20	ESTUDIO DE TRÁNSITO								
1.20.1	1.20.1	ESTUDIO DE TRÁNSITO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No
21	1.21	PROCESO CONSTRUCTIVO								
1.21.1	1.21.1	PROCESO CONSTRUCTIVO	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 1 190 000	No
22	1.22	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y FUENTES DE MATERIALES								
1.22.1	1.22.1	ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y FUENTES DE MATERIALES	30	30	30	30	und	Programado 1	Programado 2 975 000	No

Información de Actualización de las Actividades

Actividad creada exitosamente

Actualización de códigos para las actividades del subproyecto realizada exitosamente

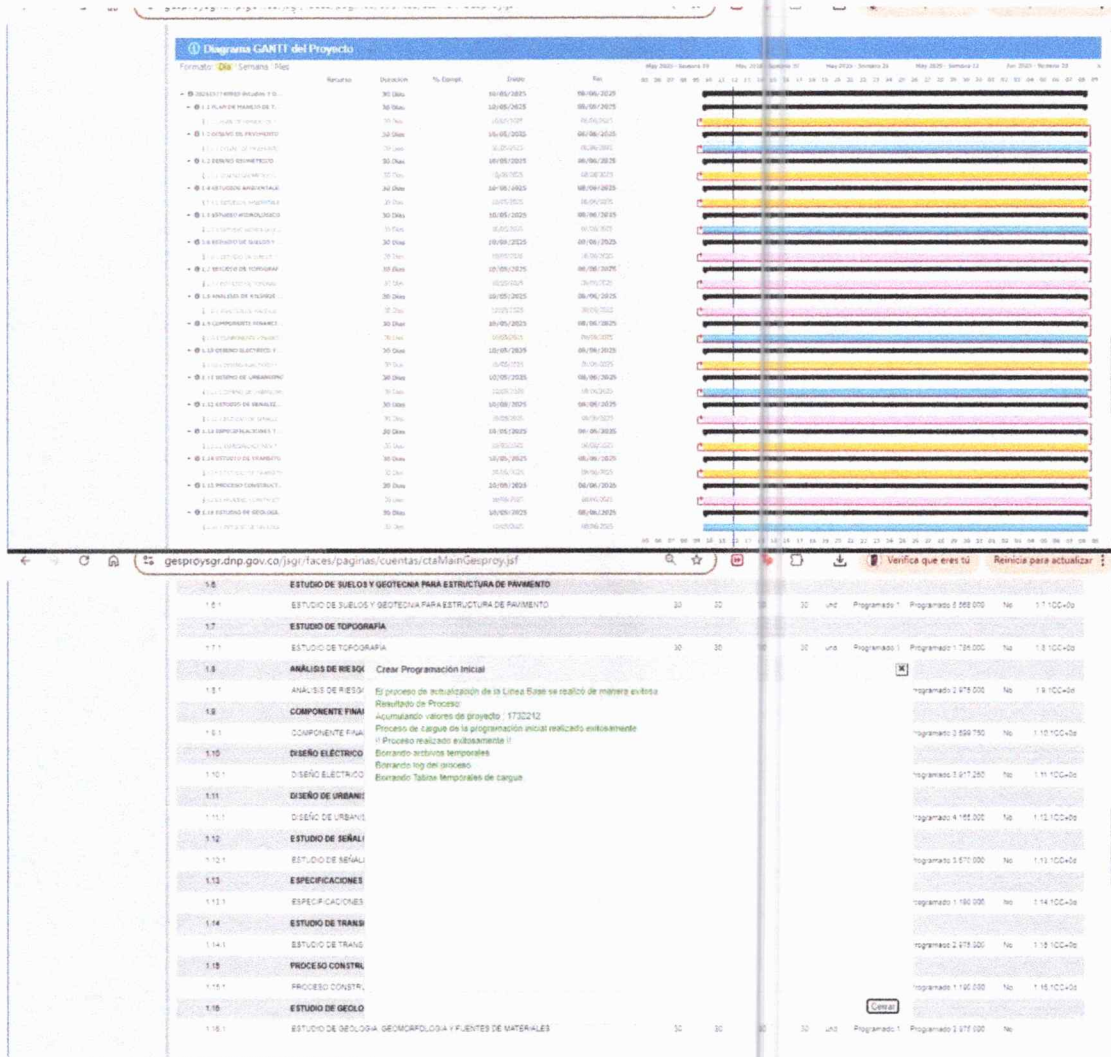

Diagnóstico de Necesidades sobre el uso del Aplicativo SUIFP – SGR.

Se registró tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios

SPGR - Datos Administrativos

Verificar * 2023-04-01

Tipos de documentos soporte * CONTRATO

Numero de documento soporte * 805-MUN-18-2023

Numero Funcionario * 00000000000000000000

Cargos Funcionario * Jefe de

Expediente * 18-00000000000000000000

Forma * 18-00000000000000000000

Activos * 18-00000000000000000000

Comprobar **Cancelar** **Guardar** **Eliminar**

SPGR - Datos Administrativos

Identificación del proveedor * 18-00000000000000000000

Ordenador del pago * 18-00000000000000000000

Monto de pago * 18-00000000000000000000

Cuenta bancaria * 18-00000000000000000000

Nombre * 18-00000000000000000000

Apellido * 18-00000000000000000000

Código de identificación * 18-00000000000000000000

Estado * 18-00000000000000000000

Código de identificación * 18-00000000000000000000

Verificar * 18-00000000000000000000

Comprobar **Cancelar** **Guardar** **Eliminar**

SPGR - Datos Administrativos

Identificación del proveedor * 18-00000000000000000000

Ordenador del pago * 18-00000000000000000000

Monto de pago * 18-00000000000000000000

Cuenta bancaria * 18-00000000000000000000

Nombre * 18-00000000000000000000

Apellido * 18-00000000000000000000

Código de identificación * 18-00000000000000000000

Estado * 18-00000000000000000000

Código de identificación * 18-00000000000000000000

Verificar * 18-00000000000000000000

Comprobar **Cancelar** **Guardar** **Eliminar**

 Hacienda

LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA
C.C. 1002725831 DE TIPACOQUE

CUMPLIMIENTO ART. 17 LEY 1819 DE 2016

Ciudad y Fecha: Susacón, 13 de Agosto de 2025

Señores:

Alcaldía Municipio De Susacón– Boyacá

REF: Certificación art.17 ley 1819 de 2016, Retenciones practicadas a pagos o abonos en cuenta por ingreso de Honorarios y compensación por servicios personales.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA identificada con cédula de ciudadanía N° 1.002.725.831 expedida en Tipacoque, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 17 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

- Que soy persona natural y presto los servicios de apoyo a la gestión para la asistencia técnica para el reporte de la información a las plataformas de fortalecimiento formulación, estructuración y seguimiento a proyectos de inversión a ser financiados con recursos del sistema general de regalías, en el municipio de Susacón - Boyacá
- Que tengo vinculados (0) empleados o contratistas al objeto contractual.

En el momento que cambie alguna de las condiciones anteriores certificadas, me comprometo a notificarlas oportunamente a la Tesorería Municipal, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Laura Pirachican P.

LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA

C.C. 1.002.725.831 expedida en Tipacoque



Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>

Solicitud 4192259 Notificación manual

1 mensaje

Notifica Soporte Pruebas <notifica_soporte@dnf.gov.co>

24 de junio de 2025, 6:34 p.m.

Responder a: servicereply@mycompany.com

Para: laurapedraza0501@gmail.com

Solicitud 4192259 Notificación manual.

Cliente: BOYACA, SUSACÓN

Estimado usuario,

Le informamos que el caso con número de solicitud No. 4192259, fue escalado al área de ingeniería.

Le daremos respuesta en un plazo de 1 a 5 días hábiles, según la complejidad del caso reportado y el tiempo requerido para implementar la solución.

Agradecemos su comprensión

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.



Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>

Apertura de Ticket 4193779 Solicitud

1 mensaje

Notifica Soporte <notifica_soporte@dnf.gov.co>

1 de julio de 2025, 10:05 a.m.

Para: "laurapedraza0501@gmail.com" <laurapedraza0501@gmail.com>

Le informamos que su solicitud ha sido registrada en nuestra base de datos, a continuación, encontrará los detalles del caso registrado:

Fecha: 01/07/2025 10:5**Caso:** 4193779 Solicitud**Solicitante:** System_Anonymous**Descripción de la solicitud:** -[[Segunda Reiteración solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001]]--- No suele recibir correo electrónico de laurapedraza0501@gmail.com. Por qué es esto importante

-- -- Buenos días Me. Permiso realizar la segunda Reiteración de solicitud de colaboración para la solución de problemática

----- Forwarded message -----

De: Laura Jimena Pirachican Pedraza >

Date: mar, 24 jun 2025, 7:50 a. m.

Subject: Reiteración solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001

To: >

Buenos días De acuerdo con caso registrado con número 4190239 el cual aun se está a la espera de solución y es de importancia para la entidad

Dada la proximidad en la fecha de corte para medición de segundo trimestre de 2025

----- Forwarded message -----

De: Laura Jimena Pirachican Pedraza >

Date: jue, 12 jun 2025, 5:14 p. m.

Subject: Re: solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001

To: >

El mié, 11 jun 2025 a la(s) 6:14 p.m., Laura Jimena Pirachican Pedraza (laurapedraza0501@gmail.com) escribió:

buenas tardes adjunto solicitud de revisión y ajuste de programación de proyecto de inversión 2025157740001

Categoría: SGR.Usuario Final.Automatización Correo

Nota: No olvide hacer referencia a este número de caso si tiene alguna inquietud acerca de este servicio y con mucho gusto lo atenderemos en:

Para consultas de:

- **Mesa de Apoyo PIIP:** Para atender sus casos favor remita email a soportepiip@dn.gov.co
- **Mesa de Ayuda Funcional y Técnica de SGR:** Para atender sus casos favor remita email a infosgr@dn.gov.co
- **Mesa de Apoyo Banco de Proyectos Territorio (Suifp-Territorio - SPI):** Para atender sus casos favor remita email a suifpterritorio@dn.gov.co
- **Canales de denuncia oficiales del Departamento Nacional de Planeación DNP:** Correo electrónico servicioalciudadano@dn.gov.co, Página web: [formulario web PQRS](#), Telefónico: Línea anticorrupción: 018000121221 opción 2

Por favor no responda a este correo electrónico, los mismos no son monitoreados y no podremos brindarle una respuesta

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.



Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>

Segunda Reiteración solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001

2 mensajes

Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>
Para: infosgr@dnpp.gov.co

1 de julio de 2025, 9:07 a.m.

Buenos días

Me. Permiso realizar la segunda Reiteración de solicitud de colaboración para la solución de problemática

----- Forwarded message -----

De: **Laura Jimena Pirachican Pedraza** <laurapedraza0501@gmail.com>

Date: mar, 24 jun 2025, 7:50 a. m.

Subject: Reiteración solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001

To: <infosgr@dnpp.gov.co>

Buenos días

De acuerdo con caso registrado con número 4190239 el cual aun se está a la espera de solución y es de importancia para la entidad

Dada la proximidad en la fecha de corte para medición de segundo trimestre de 2025

----- Forwarded message -----

De: **Laura Jimena Pirachican Pedraza** <laurapedraza0501@gmail.com>

Date: jue, 12 jun 2025, 5:14 p. m.

Subject: Re: solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001

To: <infosgr@dnpp.gov.co>

El mié, 11 jun 2025 a la(s) 6:14 p.m., Laura Jimena Pirachican Pedraza (laurapedraza0501@gmail.com) escribió:
buenas tardes
adjunto solicitud de revisión y ajuste de programación de proyecto de inversión 2025157740001



plantilla caso.xlsx
611K

Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>
Para: infosgr@dnpp.gov.co

29 de julio de 2025, 10:08 p.m.

REITERACION SOLICITUD

[Texto citado oculto]



plantilla caso.xlsx
611K

Bogotá D.C,

30 de julio de 2025

Estimado usuario,

Atendiendo a su solicitud registrada con el ticket **N° 4201137**, en el cual indica **"Segunda Reiteración solicitud de verificación de programación de proyecto 2025157740001"** la mesa de ayuda del Sistema General de Regalías da respuesta con la siguiente indicación:

Tras realizar la revisión del caso, le informamos que este ha sido escalado y actualmente se encuentra en la bandeja del grupo técnico de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, bajo el número de seguimiento **4190239**, con fecha del 12 de junio de 2025.

Una vez se reciba la notificación con la solución, procederemos a informarle oportunamente.

Esperamos haber resuelto su solicitud, de no ser así, comuníquese de nuevo con nosotros relacionando el número de caso de esta solicitud.

Mesa de Ayuda SGR

infosgr@dnpp.gov.co



Laura Jimena Pirachican Pedraza <laurapedraza0501@gmail.com>

Solicitud 4201137 Notificación manual

1 mensaje

Notifica Soporte Pruebas <notifica_soporte@dnf.gov.co>

30 de julio de 2025, 5:18 p.m.

Responder a: servicereply@mycompany.com

Para: laurapedraza0501@gmail.com

Solicitud 4201137 Notificación manual.

Cliente: BOYACA, SUSACÓN

Estimado usuario,

Hemos dado respuesta a su solicitud No. 4201137, por medio de una notificación manual para su revisión.

Atentamente

Esta notificación se ha enviado con los archivos adjuntos siguientes: Plantilla Solución Caso 4201137.pdf

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente, así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender, also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

**Plantilla Solución Caso 4201137.pdf**

134K

 Departamento Nacional de Planeación	PLANTILLA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS MESA DE AYUDA SGR		Fecha: Marzo 2025 Versión: 7.0 Contacto: infosgr@dnpp.gov.co	
INSTRUCCIONES Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES				
⚠️ Lea cuidadosamente antes de diligenciar este formulario. - Para cualquier tipo de solicitante, si la información está incompleta o no incluye imágenes del error, no se dará trámite a la solicitud. La(s) imágenes de error deberán incluir el registro de fecha y hora de captura, esto, para validar posibles cambios posteriores a la recepción del caso. - Para solicitudes de creación/activación de usuarios, indicar la fecha exacta de vigencia del permiso de acceso en el campo "Descripción detallada de la solicitud". - La información registrada debe corresponder solo al usuario que presenta el inconveniente. - Este formato permite registrar información de hasta cinco (05) proyectos. Actualmente, las celdas están ocultas desde la fila 25 hasta la fila 64. Para reportar más de un proyecto, haga clic en "Mostrar" para habilitar las celdas según la cantidad de proyectos a registrar. - Si el incidente o requerimiento a reportar corresponde a la misma situación, se podrá reportar en el mismo formato; de lo contrario, se deberá diligenciar un formato por cada situación distinta a registrar. - Se pueden colocar varios números de BPIN, separados por comas, para reportar múltiples proyectos que presenten la misma situación. - El presente formato se usa exclusivamente para reportar inconvenientes técnicos en los aplicativos SUIFP SGR, MGA y GESPROY. No aplica para asistencia en usabilidad. - Este trámite NO es una PQRSD y no está sujeto a los términos de la ley. - La recepción de las solicitudes de mesa de ayuda y su respectiva respuesta se dará en el ambiente informático de la herramienta CA Service Desk Manager, exclusivamente desde los correos registrados en el aplicativo GESPROY SGR. - Tenga presente que esta solicitud ingresará a la Mesa de ayuda para su asignación al responsable de la solución. - Este formato se usa exclusivamente para remitir al correo infosgr@dnpp.gov.co, asociado a los casos con SUIFP SGR, MGA y GESPROY. Su envío o copia a otros correos institucionales del DNP, no significará de forma alguna que se cambie la naturaleza de la solicitud, la cual será gestionada únicamente a través del precitado correo y su respuesta se dará en el ambiente informático de la herramienta CA Service Desk Manager.				
DATOS DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA SOLICITUD				
Fecha de la solicitud:	11/06/2025	Nombre de la Entidad:	alcaldía susacon	
Teléfono de contacto:		3138229407	Departamento:	boyaca
Nombre y Apellido del solicitante:	Laura Jimena Pirachican Pedraz		Correo electrónico (institucional):	tesoreria@susacon-boyaca.gov.co
DATOS DE LA SOLICITUD				
Este formato permite registrar información de hasta cinco proyectos.				
PROYECTO 1				
BPIN 1	2025157740001			
Aplicativo afectado:	gesproy			
Usuario de ingreso al aplicativo (Obligatorio):	purinconri.r			
Categoría general:	GESPROY SGR - PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS			
Subcategoría:	Error al reprogramar			

Descripción detallada de la solicitud

se realizo el ajuste de la programación en el aplicativo gesproy, en donde se realizo el cambio del valor de las actividades sin variar el valor del proyecto y se ajusto la linea de tiempo en la cual se realizara la ejecucion del proyecto. Pero al darle guardar a la informacion en la seccion de reporte avance de la ejecucion nos aparecen las actividades repetidas y los valores de las actividades las tomomo como el doble del valor programado. solicitamos su colaboracion en la verificacion del aplicativo para la eliminacion de la programacion que no posee programacion durante los periodos

Imágenes del caso (Obligatorio)

Detalle de Información de Planeación

Valor Total a Programar del Proyecto:
Valor Planificado:
Valor Pendiente por Planear:

Programación de Actividades

Código	Descripción	Tiempo (en días)				Unidad de medida	Cantidad total
		Estimado	Probable	Realizado	Estimado		
1.1	APOYO A LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO 4 AÑOS EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMO 4 AÑOS)						
1.1.1	APOYO SUPERVISIÓN	200	200	200	200	mes	Programado: 10
1.2	PISOS						
1.2.1	PISOS	140	140	140	140	Grutas	Programado: 1
1.2.1.1	MUROS						
1.2.1.1.1	MUROS	140	140	140	140	Grutas	Programado: 1
1.3	CUBIERTA						
1.3.1	CUBIERTA	100	100	100	100	Grutas	Programado: 1
1.4	INTERVENTORIA						
1.4.1	INTERVENTORIA	100	100	100	100	Grutas	Programado: 1

Información de Actualización de las Actividades

Programación de Cantidades por Período


Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	Pendiente por asignar	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
202507140001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ARREGLOS LOC...														
1.1	APOYO A LA SUPERVISIÓN PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (EXPERIENCIA P	mes	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.2	PISOS	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
1.2.1	PISOS	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
1.2.1.1	MUROS	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
1.3	CUBIERTA	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20
1.3.1	CUBIERTA	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20
1.4	INTERVENTORIA	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10
1.4.1	INTERVENTORIA	Grutas	1.00	0.00					0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar
Valor Actividades Programadas
Valor Actividades Ejecutadas

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	1 mar-25	2 abr-25	3 may-25	4 jun-25	5 jul-25	6 ago-25	7 sep-25
* Valor Planeado (PV) ①	69	127	206	274	409	587	730
* Valor Ganado (EV) ②	4	8	12				
* Costo Actual (AC) ③	4	8	12				
Cumplimiento en la programación (SPI) ④	0.05	0.06	0.06				
Cumplimiento del costo (CPI) ⑤	1	1	1				
Retraso SV(S) Meses ⑥							

* Valores en millones de pesos

Cargue de Ejecución del Proyecto

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar

Valor Actividades Programadas

Valor Actividades Ejecutadas

[Descargar archivo de programación actual ...](#)

[Descargar archivo de ejecución actual.](#)

Producto MGA: Vivienda de Interés Prioritario mejoradas (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: APOYO A LA SUPERVISIÓN - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMO 6 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMO 4 AÑOS)

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2025 03	2025 04
1	1.1.1 APOYO SUPERVISIÓN	mes	5.04	29.0	No					
						Initial			1	1
						Prag	4.000.000	40.000.000	1	1
						Eje	3.994.599.25	15.704.000	0.93	1

Actividad MGA: CUBIERTA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2025 03	2025 04
1	1.5.1 CUBIERTA	Global	33.53	0	No					
						Initial				
						Prag	229.714.835.75	229.714.835.75		

PLANTILLA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS MESA DE AYUDA SGR

Fecha: Marzo 2025

Versión: 7.0

Contacto:

infosgr@dnpp.gov.co

2	1.5.1 CUBIERTA	Global	34	0	No		Eje	0	0			
							Inicial					
							Prog	1	232 020 630.70	232 020 630.70		
							Eje	0	0			
Actividad MGA INTERVENTORIA												
No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2025 03	2025 04
1	1.5.1 INTERVENTORIA	Global	5.52	0	No		Inicial					
							Prog	1	34 856.000	34 856.000		
							Eje		0	0		
2	1.5.1 INTERVENTORIA	Global	5.62	0	No		Inicial					
							Prog	1	34 856.000	34 856.000		
							Eje		0	0		

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario, manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP, de lo mencionado en el enlace: <https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx>

CUENTA DE COBRO N° 003

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4°. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS QUE PERTENECEN AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

Susacón, 13 de Agosto de 2025

Yo **LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA,** Identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.002.725.831 de Tipacoque. Manifiesto que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUSACON, identificada con Nit: 891.856.472-1

Me adeuda la suma de:

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.500.000,00)

Por concepto de:

PAGO ACTA PARCIAL N° 003 CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO CUYO OBJETO ES: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMAS RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO, FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ.**

PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JULIO DE 2025

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y Art. 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

Nombres y apellidos:
Identificación:


LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA
C.C. No. 1.002.725.831 de Tipacoque

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1002725831	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA	calle 8c 87b 15	31382264	laurapodrazo0501@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
	2025-05	1	12/05/2025	871039488	1
PERIODO SALUD	2025-05				TOTAL A PAGAR
					\$414.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Total a Pagar
					0	0	2	300	178.300
									No. Afiliados
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800228739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SIJRA	890803790-5	7.500	No. Autorización	Valor	7.500	2	100	7.600		75		7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	2	0	0	0
0	2	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.300
Pensión	1	227.800	228.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	414.000

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	2025-05	PERIODO PENSIONES				1	0
						TOTAL A PAGAR	
			I	12/06/2025	87109488	\$414.000	

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
CC	100275531	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA	calle 8c 87b 15	31382294	laurapodraza0501@gmail.com									UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			EMPLADOS
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.					2025-06	2025-06	1	14/07/2025	87109500
													TOTAL A PAGAR	\$415.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900150264-2	178,000	0		0		0	6	700	0	178,700	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	227.800	0	0	0	0	6	900	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500	No. Autorización	Valor	Sistemas	7.500	6	7.500	75	75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	6	0	0	0
0	6	0	0	0
0	6	0	0	0
0	6	0	0	0
0	6	0	0	0
0	6	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	415.000

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-06	2025-06	1	14/07/2025	87109500	TOTAL A PAGAR \$415.000	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No. de identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	Cédula	Estatuto	Columna estatutaria	NO	SÍ	MET	TAP	TAP	TAP	VST	GEM	LSE	VAC	VCT	RE	Cód. AFP	Cotización	Voluntario Aportante o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Céd. ARL	IBC ARL	Cobro de riesgo	Código CCF	IRC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte MSP	Aporte SNA	Aporte MIN	Aporte EDPW	
1902728531	PIRACHIAN PEDRAZA LAURA JIMENA	59	01	Z													230201	1.423.500	227.800	0	0	0	EP9307	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	0	0	0	0	0	0	0

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tipo	No. de identificación											Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo principal o subsidiado	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Código CCF	Asaporte CCF	IBC c/c/a parafiscales	Asaporte SENA	Asaporte ICBF	Asaporte ESAP	Asaporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Colaborador	Excluido	Colaborador	Excluido	Colaborador	Excluido	Colaborador	Excluido	Colaborador	Excluido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		MR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1002725831	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA	calle 8c 87b 15	31382294	laurapodrazo601@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-07	2025-07	88984528 \$414.000				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Total a Pagar
					0	0	2	300	0
									178.300
									1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	900228739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	880903790-5	7.500	No. Autorización	Valor	7.500	2	100	75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	2	0	0	0
0	2	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.300
Pensión	1	227.800	228.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	414.000

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	1002725831	LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA	calle 8c 87b 15	313822294
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				NO
CORREO				laurapedraza0501@gmail.com
CIUDAD / MUNICIPIO				BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2025-07	PERIODO PENSIONES	2025-07	89994628
TOTAL A PAGAR				\$414.000

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
pro	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	COTIZANTE										Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBS EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBS ARL	Cotización	Código CCF	IBS CCF	Aporte CCF	IBS cose parafiscales	Aporte SEMA	Aporte KCBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP	IBS AFP	Cotización	Código AFP

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SUSACON
DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATISTA : LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA
CC O NIT: 1002725831 DE TIPACQUE
CONTRATO No: AMS-CD-05-2025

PERIODO A PAGAR : 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

Depuración salarios y obtención Retención en la fuente durante 2025

SMMLV 1.423.500,00

VALORES	
Detalle de los Pagos y depuraciones aplicables	Totales
Pagos brutos laborales efectuados al trabajador durante el respectivo mes :	
1. Salarios	\$ 7.500.000,00
Honorarios, comisiones y servicios (Ingreso del mes)	\$ 7.500.000,00
2. Menos: "deducciones" (art.387 del ET, y decreto 2271 de 2009)	
Aporte mensual obligatorio a salud (Ver concepto DIAN 81294 oct.09; y Dec. 2271 de junio de 2009)	\$ 534.000,00
Aportes ARL Riesgos Laborales 2,435%	
3. Menos: Renta exentas (art. 126-1, 128-4 y art.206 numerales 1 a 9 del ET)	
Aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC	\$ 683.400,00
	\$ 22.600,00
Subtotal 1	\$ 6.260.100,00
- El 25% del subtotal 1, sin que exceda de 240 UVTs (es decir, 240 x \$48.799 = \$11.951.760) Renta exenta	
	\$ 1.565.025,00
Subtotal 2	\$ 4.695.075,00
Valor de la Retención con procedimiento 1 (el subtotal 2 se busca en la tabla del art.383 del ET)	\$ 0,00
CALCULO DE LA RETENCION MINIMA	
Total pagos laborales año parcial	\$ 7.500.000,00
Menos: aportes obligatorios a seguridad social pagados por el contratista en el periodo	\$ 1.239.900,00
Base gravable	\$ 6.260.100,00
	\$ 0,00
Valor de la Retención final (el mayor entre los dos anteriores)	\$ 0,00

ATENTAMENTE,


CONTRATISTA : LAURA JIMENA PIRACHICAN PEDRAZA

La Obtención del valor de la retención en la fuente con esta nueva tabla implica manejar las siguientes variables

Valor de la UVT durante el 2025 \$ 48.799
Valor del salario gravable del mes en términos de UVT 94,28
Valor de la retención en pesos -

144000

Rangos en UVT	Tarifa Marginal		Instrucción para calcular la retención ("Impuesto") en \$	Calculo en \$ del valor de la retención
	desde	Hasta		
0	0	95	0	-
>95	150	150	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) * 19%	-
>150	360	360	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 145 UVT) * 28% mas 10 UVT	-
>360	640	640	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 395 UVT) * 33% mas 10 UVT	-
>640	945	945	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT) * 35% mas 162 UVT	-
>945	2300	2300	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT) * 37% mas 268 UVT	-
>2300	En adelante		(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT) * 39% mas 770 UVT	-
