

## **Informe de Justificación del Incumplimiento de la Meta de Caracterización – Departamento de Nariño**

**Dupla:** Maria Yuliana Bohorquez Zapata y Cesar Augusto Rubio Jiménez

### **1. Introducción**

El presente informe expone de manera clara, detallada y fundamentada las razones por las cuales no fue posible cumplir la meta establecida de 2.500 caracterizaciones en el departamento de Nariño, durante el periodo comprendido entre julio y octubre del año 2025. Si bien el equipo asignado logró avances significativos en ocho municipios priorizados, alcanzando un total de 1.630 registros válidos, diversos factores metodológicos, operativos, institucionales y territoriales influyeron directamente en el desarrollo del proceso. Este documento recoge el trabajo realizado, las estrategias empleadas, las limitaciones enfrentadas y la distribución real de la caracterización en el departamento, con el fin de ofrecer una explicación completa, transparente y acorde a la experiencia en campo.

### **2. Metodología implementada (creada por la dupla)**

La metodología aplicada en el departamento de Nariño fue diseñada por la dupla profesional y se encuentra detallada en el documento 'Metodología V1'. Esta estructura metodológica se fundamentó en un enfoque participativo y de construcción de confianza con las comunidades, priorizando el respeto por las dinámicas locales y la claridad en los objetivos del proceso. Un componente importante fue la realización del taller pedagógico 'Diálogos de Frontera – Mi vida, mi futuro', el cual, aunque no era obligatorio, permitió generar confianza, explicar el propósito del proceso y facilitar la participación. Posterior al taller se aplicaba la caracterización mediante Google Forms, quedando disponible para las instituciones locales.

### **3. Tiempos reales de caracterización**

El proyecto contempló cuatro meses, pero solo tres fueron efectivos para el levantamiento de información (agosto, septiembre y octubre). Julio se destinó al alistamiento y

noviembre a la depuración de la información, reduciendo el tiempo operativo para alcanzar la meta propuesta.

#### 4. Restricción operativa: solo una comisión por mes

La coordinación nacional autorizó únicamente una comisión presencial por mes, limitando la cobertura territorial y el número de talleres y caracterizaciones por jornada. Las comisiones realizadas fueron: agosto (San Pablo, La Cruz, La Unión), septiembre (Cumbal, Aldana) y octubre (Puerres, Contadero).

#### 5. Limitaciones institucionales y de convocatoria

La continuidad y captación de la población dependieron de las alcaldías. Algunas administraciones tuvieron buena disposición, pero otras, no realizaron convocatorias consistentes, no difundieron el formulario o no priorizaron la actividad, generando diferencias significativas entre municipios.

#### 6. Factores sociales y territoriales

La participación de la comunidad estuvo influenciada por la desconfianza inicial, la sensibilidad del tema de la venta informal de combustibles en zonas de frontera y la falta de información previa. Además, Nariño presenta alta ruralidad (76%) y una alta dispersión territorial, lo que dificultó el acceso a veredas y limitó el volumen de personas por jornada.

#### 7. Depuración y consistencia de la base final

Durante la depuración se eliminaron más de 100 registros repetidos o incompletos. En el caso de Contadero, aunque la alcaldía entregó una base de más de 300 personas identificadas, esta no cumplía los criterios metodológicos y no pudo ser integrada a la matriz final, aunque se deja constancia de su existencia y se entregará como anexos.


#### 8. Seguimiento constante de la dupla

La dupla realizó acompañamiento permanente mediante correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, creación de piezas gráficas, código QR y reportes diarios, garantizando el fortalecimiento del proceso en cada municipio.

Imágenes 1, 2 y 3 Piezas gráficas convocatorias comisión 1 agosto (San Pablo, La Cruz, La Unión),



Imágenes 4 y 5 Piezas gráficas convocatorias comisión 2 septiembre (Cumbal, Aldana).

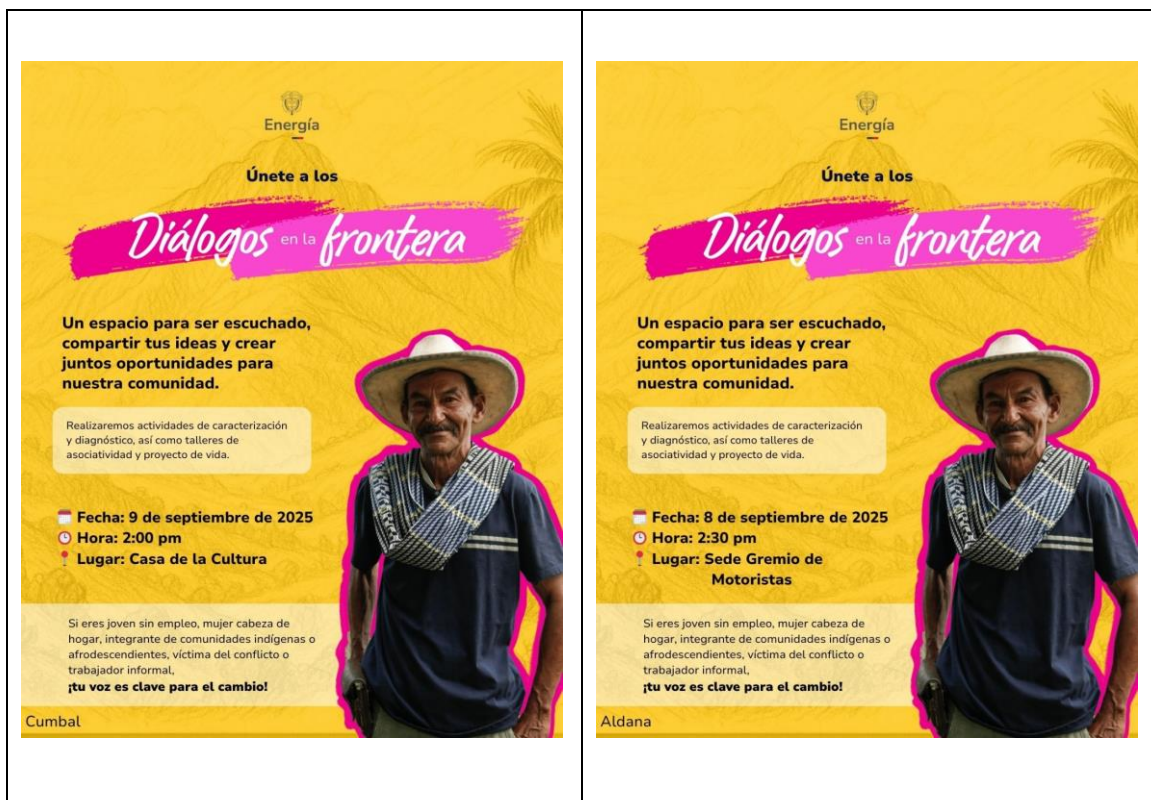

Imágenes 6 y 7 Piezas gráficas convocatorias comisión 3 octubre (Puerres, Contadero).



Imágenes 8 y 9 Piezas gráficas código QR con link para la encuesta de caracterización Nariño, Dupla, Maria Yuliana Bohorquez Zapata y Cesar Augusto Rubio Jiménez





## 9. Informe final por municipio

Municipio	N° de caracterizados
Aldana	566
Puerres	317
San Pablo	207
Cumbal	181
Gualmatán	175
La Unión	108
La Cruz	63
Contadero	8
Buesaco (espontáneos)	5
Total general:	1.630

## 10. Conclusión

El incumplimiento de la meta no se debió a falta de gestión de la dupla a cargo de estos municipios, sino a una combinación de factores metodológicos, institucionales, territoriales, logísticos y operativos. A pesar de ello, se logró una cobertura amplia y una base final de 1.630 registros completos y válidos, demostrando compromiso y capacidad técnica del equipo.
