


Hospital Departamental  
**María Inmaculada** E.S.E.

NIT. 891.180.098-5  
127-200



## MEMORANDO

Florencia, 20 de enero de 2026.



PARA: CINDY TATIANA VARGAS TORO – Gerente.

DE: SHIRLEY STELLA VERDOOREN AVILA – Jefe mantenimiento hospitalario

ASUNTO: Solicitud de Modificación No 01 al Contrato de Obra No 02325 de 2025, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**

Cordial saludo,

El día 19 de enero de 2025, se recibió al correo de mantenimiento hospitalario, Viabilidad de adición presupuestal y prórroga para el contrato 02325, donde la interventoría manifiesta el siguiente concepto técnico, administrativo y contractual, con fundamento en las visitas de obra, revisión documental y análisis presupuestal efectuado por la interventoría.

El contrato tiene por objeto la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento del Puesto de Salud Agua Caliente, municipio de Morelia – Caquetá. Durante la ejecución contractual se evidenciaron condiciones físicas, funcionales y normativas no previstas en el alcance inicial, las cuales inciden directamente en la correcta prestación del servicio de salud y en la durabilidad de la infraestructura.


### 2. Análisis técnico de la solicitud

De las visitas técnicas conjuntas realizadas por la Entidad Contratante y la Interventoría, así como de la documentación aportada por el contratista, se verificó lo siguiente:

La necesidad real y justificada de ejecutar actividades no previstas inicialmente, relacionadas son:

- Construcción de estructura para soporte de tanque de almacenamiento de agua.

*Cindy Tatiana Vargas Toro*  
Gerente



- Rediseño y adecuación de batería sanitaria conforme a requerimientos del sector salud.
- Elevación de cubierta para garantizar condiciones adecuadas de ventilación, confort térmico y operación.
- Manejo técnico de aguas lluvias y escorrentías mediante cunetas y drenajes.
- Construcción de rampa de acceso para garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad.
- Las actividades adicionales se encuentran directamente asociadas a la funcionalidad, seguridad, accesibilidad y cumplimiento normativo del puesto de salud, por lo cual su no ejecución comprometería el correcto uso de la infraestructura.

### 3. Análisis presupuestal

Esta Interventoría revisó el balance de mayores y menores cantidades, los ítems no previstos, los APU y la memoria de cantidades, verificando que:

- Los ítems adicionales cuentan con justificación técnica clara.
- Los precios unitarios se encuentran acordes con valores de mercado y condiciones locales.
- El valor total de la adición asciende a TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS INCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$38.752.234,00).
- La adición se encuentra debidamente soportada y no corresponde a mayores cantidades injustificadas ni a errores de planeación atribuibles al contratista.

### 4. Análisis de la prórroga solicitada

En relación con la solicitud de prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario, la Interventoría constató que:


La ejecución de las actividades adicionales autorizadas implica una reprogramación de la secuencia constructiva.

Durante el mes de diciembre se presentaron afectaciones objetivas en el rendimiento, propias del sector de la construcción (disponibilidad de mano de obra, proveedores y suministro de materiales). Las condiciones de localización rural del proyecto inciden en los tiempos de ejecución y logística.

En consecuencia, el plazo adicional solicitado resulta técnicamente necesario y proporcional, y permitirá culminar la obra sin afectar la calidad ni la seguridad de la infraestructura.

### 5. Concepto de la Interventoría


*Cindy Tatiana Vargas Toro*  
Gerente



Con fundamento en lo anterior, la Interventoría EMITE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para:

- La aprobación de la adición presupuestal por valor de \$38.752.234,00, destinada a la ejecución de los ítems no previstos debidamente justificados; considerando el nuevo alcance:

| ITEM     | DESCRIPCION                                                                                  | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES |               |                      | CANTIDADES |         |         | VALORES             |                       | CANTIDAD ACTUALIZADA |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|---------|---------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                              |        | CANT                      | V/UNITARIO    | V/TOTAL              | +/-        | MAY (+) | MEN (-) | MAY (+)             | MEN (-)               | CANTIDAD             | SUBTOTAL             |
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                          |        |                           |               | <b>14.307.588,00</b> |            |         |         | <b>206.583,00</b>   | <b>- 1.496.191,00</b> |                      | <b>13.017.980,00</b> |
| 1,01     | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE                                                      | M2     | 85,62                     | \$ 71.271,00  | \$ 6.102.223,00      | -          | -       | 12,07   | -                   | 860.241,00            | 73,55                | 5.241.982,00         |
| 1,02     | DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO | M2     | 77,59                     | \$ 28.500,00  | \$ 2.211.315,00      | -          | -       | 9,50    | -                   | 270.750,00            | 68,09                | 1.940.565,00         |
| 1,03     | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO.           | M2     | 79,43                     | \$ 30.000,00  | \$ 2.382.900,00      | -          | -       | 11,34   | -                   | 340.200,00            | 68,09                | 2.042.700,00         |
| 1,04     | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS                                                                | UND    | 10,00                     | \$ 25.000,00  | \$ 250.000,00        | -          | -       | 1,00    | -                   | 25.000,00             | 9,00                 | 225.000,00           |
| 1,05     | DESMONTE APARATOS SANITARIOS                                                                 | UND    | 2,00                      | \$ 35.000,00  | \$ 70.000,00         | +          | 1,00    | -       | 35.000,00           | -                     | 3,00                 | 105.000,00           |
| 1,06     | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO                                           | M2     | 10,50                     | \$ 33.540,00  | \$ 352.170,00        | +          | 4,08    | -       | 136.843,00          | -                     | 14,58                | 489.013,00           |
| 1,07     | DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO                                            | ML     | 1,44                      | \$ 38.500,00  | \$ 55.440,00         | -          | -       | -       | -                   | -                     | 1,44                 | 55.440,00            |
| 1,08     | DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO                                                    | M2     | 45,20                     | \$ 28.950,00  | \$ 1.308.540,00      | +          | 1,20    | -       | 34.740,00           | -                     | 46,40                | 1.343.280,00         |
| 1,09     | DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.               | M2     | 90,00                     | \$ 17.500,00  | \$ 1.575.000,00      | -          | -       | -       | -                   | -                     | 90,00                | 1.575.000,00         |
| <b>2</b> | <b>CONCRETOS</b>                                                                             |        |                           |               | <b>15.156.261,00</b> |            |         |         | <b>4.475.048,00</b> | <b>- 159.575,00</b>   |                      | <b>19.471.733,00</b> |
| 2,01     | PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm                          | M2     | 56,73                     | \$ 157.850,00 | \$ 8.954.831,00      | +          | 28,35   | -       | 4.475.048,00        | -                     | 85,08                | 13.429.878,00        |




# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|      |                                                                                                                          |    |        |               |                      |   |       |       |                     |                        |        |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|----------------------|---|-------|-------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|
| 2,02 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI,<br>MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm,<br>Espesor 8 cm. Escobado y Ratoneado                          | M2 | 45,08  | \$ 137.565,00 | 6.201.430,00         | - | -     | 1,16  | -                   | 159.575,00             | 43,92  | 6.041.855,00         |
| 3    | <b>MAMPOSTERÍA Y ACABADOS<br/>DE MUROS</b>                                                                               |    |        |               | <b>23.528.655,00</b> |   |       |       | <b>3.823.169,00</b> | <b>- 1.024.259,00</b>  |        | <b>26.327.565,00</b> |
| 3,01 | MURO EN BLOQUE No 4                                                                                                      | M2 | 25,69  | \$ 71.565,00  | 1.838.505,00         | + | 25,16 | -     | 1.800.575,00        | -                      | 50,85  | 3.639.080,00         |
| 3,02 | PAÑETE EN MOTERO 1:4                                                                                                     | M2 | 124,23 | \$ 45.000,00  | 5.590.350,00         | + | 29,25 | -     | 1.316.250,00        | -                      | 153,48 | 6.906.600,00         |
| 3,03 | ENCHAPE MURO FORMATO<br>MÍNIMO .25X.30                                                                                   | M2 | 25,95  | \$ 105.245,00 | 2.731.108,00         | + | 0,80  | -     | 84.196,00           | -                      | 26,75  | 2.815.304,00         |
| 3,04 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS<br>EN MUROS TIPO I                                                                            | M2 | 135,62 | \$ 27.850,00  | 3.777.017,00         | - | -     | 31,34 | -                   | 872.819,00             | 104,28 | 2.904.198,00         |
| 3,05 | ESTUCO Y PINTURA DE ALTA<br>ASEPSIA 3 MANOS                                                                              | M2 | 98,01  | \$ 38.000,00  | 3.724.380,00         | - | -     | 3,28  | -                   | 124.640,00             | 94,73  | 3.599.740,00         |
| 3,06 | ESTUCO Y PINTURA TIPO<br>ESMALTE SOBRE MUROS<br>(ZOCALOS) 3 MANOS                                                        | M2 | 20,52  | \$ 33.500,00  | 687.420,00           | - | -     | 0,80  | -                   | 26.800,00              | 19,72  | 660.620,00           |
| 3,07 | ESTUCO EXTERIOR Y PINTURA<br>TIPO KORAZA 3 MANOS                                                                         | M2 | 88,49  | \$ 34.520,00  | 3.054.675,00         |   | 2,76  | -     | 95.275,00           | -                      | 91,25  | 3.149.950,00         |
| 3,08 | IMPERMEABILIZACIÓN<br>FACHADAS LATERALES,<br>HIDROFUGO O SIMILAR                                                         | M2 | 52,80  | \$ 40.250,00  | 2.125.200,00         |   | 13,09 | -     | 526.873,00          | -                      | 65,89  | 2.652.073,00         |
| 4    | <b>CUBIERTAS Y CIELO RASOS</b>                                                                                           |    |        |               | <b>53.534.657,00</b> |   |       |       | <b>5.961.404,00</b> | <b>- 12.563.935,00</b> |        | <b>46.932.126,00</b> |
| 4,01 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA<br>EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO<br>CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. | ML | 185,40 | \$ 142.650,00 | 26.447.310,00        | - | -     | 83,13 | -                   | 11.858.495,00          | 102,27 | 14.588.816,00        |
| 4,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE<br>CUBIERTA EN LAMINA MASTER<br>1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.                                   | M2 | 113,30 | \$ 137.565,00 | 15.586.115,00        | - | -     | 4,39  | -                   | 603.910,00             | 108,91 | 14.982.204,00        |
| 4,03 | CABALLETE EN LAMINA<br>METALICA PINTADA                                                                                  | ML | 10,30  | \$ 82.500,00  | 849.750,00           | - | -     | 0,22  | -                   | 18.150,00              | 10,08  | 831.600,00           |






# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|      |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                      |   |       |      |                     |                       |       |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|---|-------|------|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 4,04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE                 | ML | 20,60 | \$ 189.500,00   | 3.903.700,00         | - | -     | 0,44 | -                   | 83.380,00             | 20,16 | 3.820.320,00         |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"                                                                                                                               | ML | 8,70  | \$ 44.710,00    | 388.977,00           | + | 0,90  | -    | 40.239,00           | -                     | 9,60  | 429.216,00           |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN).                                                                             | M2 | 48,82 | \$ 130.250,00   | 6.358.805,00         |   | 45,46 | -    | 5.921.165,00        | -                     | 94,28 | 12.279.970,00        |
| 5    | <b>PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                                                                                   |    |       |                 | <b>21.814.603,00</b> |   |       |      | <b>1.569.855,00</b> | - <b>110.530,00</b>   |       | <b>23.273.928,00</b> |
| 5,01 | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M                                                                                                                                                  | M2 | 79,47 | \$ 94.500,00    | 7.509.915,00         | + | 1,63  | -    | 154.035,00          | -                     | 81,10 | 7.663.950,00         |
| 5,02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO MINIMO 40X40                                                                                                                                          | M2 | 68,78 | \$ 117.985,00   | 8.115.008,00         | + | 12,00 | -    | 1.415.820,00        | -                     | 80,78 | 9.530.828,00         |
| 5,03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                                                                                                                                  | ML | 78,40 | \$ 78.950,00    | 6.189.680,00         | - | -     | 1,40 | -                   | 110.530,00            | 77,00 | 6.079.150,00         |
| 6    | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                               |    |       |                 | <b>29.170.915,00</b> |   |       |      | <b>2.180.800,00</b> | - <b>7.920.315,00</b> |       | <b>23.431.400,00</b> |
| 6,01 | PUERTA METALICA ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM                                          | M2 | 6,10  | \$ 1.160.000,00 | 7.076.000,00         | + | 1,88  | -    | 2.180.800,00        | -                     | 7,98  | 9.256.800,00         |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING. | M2 | 10,64 | \$ 1.150.000,00 | 12.236.000,00        | - | -     | 3,51 | -                   | 4.036.500,00          | 7,13  | 8.199.500,00         |




# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|      |                                                                                                                                                 |     |       |                 |                      |   |      |      |                     |                       |       |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|---|------|------|---------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| 6,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MARCO DE ALUMINIO CON TABLERO EN VIDRIO 4 MM, CON PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.            | M2  | 9,90  | \$ 995.850,00   | 9.858.915,00         | - | -    | 3,90 | -                   | 3.883.815,00          | 6,00  | 5.975.100,00         |
| 7    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                 |     |       |                 | <b>15.528.435,00</b> |   |      |      | <b>1.170.000,00</b> | <b>- 1.601.000,00</b> |       | <b>15.097.435,00</b> |
| 7,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M. | UND | 1,00  | \$ 1.400.000,00 | 1.400.000,00         | - | -    | -    | -                   | -                     | 1,00  | 1.400.000,00         |
| 7,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)                           | UND | 1,00  | \$ 1.200.000,00 | 1.200.000,00         | - | -    | -    | -                   | -                     | 1,00  | 1.200.000,00         |
| 7,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.                         | UND | 18,00 | \$ 195.000,00   | 3.510.000,00         | + | 6,00 | -    | 1.170.000,00        | -                     | 24,00 | 4.680.000,00         |
| 7,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)                          | UND | 22,00 | \$ 142.000,00   | 3.124.000,00         | - | -    | 8,00 | -                   | 1.136.000,00          | 14,00 | 1.988.000,00         |
| 7,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)                           | UND | 5,00  | \$ 155.000,00   | 775.000,00           | - | -    | 3,00 | -                   | 465.000,00            | 2,00  | 310.000,00           |
| 7,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.                                                                         | UND | 1,00  | \$ 895.000,00   | 895.000,00           | - | -    | -    | -                   | -                     | 1,00  | 895.000,00           |




# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|      |                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                      |   |   |      |   |                         |       |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|---|---|------|---|-------------------------|-------|---------------------|
| 7,07 | ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS. | ML  | 67,51 | \$ 68.500,00    | 4.624.435,00         | - | - | -    | - | -                       | 67,51 | 4.624.435,00        |
| 8    | <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                |     |       |                 | <b>10.388.700,00</b> |   |   |      |   | <b>- - 3.532.350,00</b> |       | <b>6.856.350,00</b> |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.                                                                                   | ML  | 1,50  | \$ 1.325.000,00 | 1.987.500,00         | - | - | -    | - | -                       | 1,50  | 1.987.500,00        |
| 8,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA                                                                                                                                      | UND | 2,00  | \$ 895.000,00   | 1.790.000,00         | - | - | 1,00 | - | 895.000,00              | 1,00  | 895.000,00          |
| 8,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                                                             | UND | 3,00  | \$ 425.000,00   | 1.275.000,00         | - | - | -    | - | -                       | 3,00  | 1.275.000,00        |
| 8,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).                                                                                                              | UND | 2,00  | \$ 150.000,00   | 300.000,00           | - | - | 1,00 | - | 150.000,00              | 1,00  | 150.000,00          |
| 8,05 | POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDIN.                                                                                                                                                           | UND | 1,00  | \$ 450.000,00   | 450.000,00           | - | - | 1,00 | - | 450.000,00              | 0,00  | -                   |
| 8,06 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"                                                                                                                                                                                  | UND | 11,00 | \$ 60.250,00    | 662.750,00           | - | - | 4,00 | - | 241.000,00              | 7,00  | 421.750,00          |
| 8,07 | PUNTO SANITARIO DE 2"                                                                                                                                                                                     | UND | 8,00  | \$ 87.500,00    | 700.000,00           | - | - | 1,00 | - | 87.500,00               | 7,00  | 612.500,00          |
| 8,08 | PUNTO SANITARIO DE 4"                                                                                                                                                                                     | UND | 2,00  | \$ 138.850,00   | 277.700,00           | - | - | 1,00 | - | 138.850,00              | 1,00  | 138.850,00          |
| 8,09 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.                                                                                                                                              | UND | 2,00  | \$ 785.000,00   | 1.570.000,00         | - | - | 2,00 | - | 1.570.000,00            | 0,00  | -                   |




# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



**CAQUETÁ**

|       |                                                                                                                            |     |        |               |                      |   |   |   |   |   |        |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|--------|----------------------|
| 8,10  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.                                                 | UND | 1,00   | \$ 675.250,00 | 675.250,00           | - | - | - | - | - | 1,00   | 675.250,00           |
| 8,11  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO                                                                          | UND | 1,00   | \$ 700.500,00 | 700.500,00           | - | - | - | - | - | 1,00   | 700.500,00           |
| 9     | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                            |     |        |               | <b>888.510,00</b>    |   |   |   | - | - |        | <b>888.510,00</b>    |
| 9,01  | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE                                                                              | M2  | 84,62  | \$ 10.500,00  | 888.510,00           | - | - | - | - | - | 84,62  | 888.510,00           |
|       | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                                                                                  |     |        |               | <b>36.900.600,00</b> |   |   |   | - | - |        | <b>36.900.600,00</b> |
| NP-01 | COLUMNA DE 0,20X0,10 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.      | ML  | 4,60   | 169.383,00    | 779.161,80           | - | - | - | - | - | 4,60   | 779.161,80           |
| NP-02 | LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                        | M2  | 6,30   | 280.384,00    | 1.766.419,20         | - | - | - | - | - | 6,30   | 1.766.419,20         |
| NP-03 | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS. | KG  | 427,53 | 24.549,00     | 10.495.433,97        | - | - | - | - | - | 427,53 | 10.495.433,97        |
| NP-04 | VIGA AEREA DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                 | ML  | 10,12  | 222.452,00    | 2.251.214,24         | - | - | - | - | - | 10,12  | 2.251.214,24         |
| NP-05 | ZAPATA DE 0,50X0,50m EN CONCRETO DE 3000 psi, NO incluye acero de refuerzo                                                 | ML  | 1,00   | 398.456,00    | 398.456,00           | - | - | - | - | - | 1,00   | 398.456,00           |
| NP-06 | VIGA CIMENTACIÓN DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                           | ML  | 5,21   | 222.452,00    | 1.158.974,92         | - | - | - | - | - | 5,21   | 1.158.974,92         |




# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|       |                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |              |   |   |   |   |   |       |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|--------------|---|---|---|---|---|-------|--------------|
| NP-07 | PERFIL METALICO 100X100X2,80 mm PARA COLUMNA DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                              | ML | 10,77 | 143.461,00 | 1.545.074,97 | - | - | - | - | - | 10,77 | 1.545.074,97 |
| NP-08 | PERFIL METALICO 100X100X2,50 mm PARA TEMPLETE DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                             | ML | 3,00  | 141.650,00 | 424.950,00   | - | - | - | - | - | 3,00  | 424.950,00   |
| NP-09 | ESTRUCTURA PARA LUCETA DE VENTILACIÓN METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.0 X 0.3 ) M                                                         | M2 | 0,60  | 933.045,00 | 559.827,00   | - | - | - | - | - | 0,60  | 559.827,00   |
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4"                                                                                                                                                           | ML | 12,00 | 73.739,00  | 884.868,00   | - | - | - | - | - | 12,00 | 884.868,00   |
| NP-11 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.41 DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN.                                                | ML | 38,00 | 180.780,00 | 6.869.640,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | 6.869.640,00 |
| NP-12 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.51 DE ANCHO, JUNTO CON REJILLA DE 0.35 EN ANGULO DE 1" /4 , INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN. | ML | 10,08 | 687.916,00 | 6.934.193,28 | - | - | - | - | - | 10,08 | 6.934.193,28 |
| NP-13 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.                                                                                                                                               | M3 | 4,32  | 93.704,00  | 404.801,28   | - | - | - | - | - | 4,32  | 404.801,28   |



# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5



|                       |                                                                                                                                                                       |        |       |               |                |   |   |              |                |                 |            |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|----------------|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| NP-14                 | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2     | 10,50 | 137.373,00    | 1.442.416,50   | - | - | -            | -              | -               | 10,50      | 1.442.416,50   |
| NP-15                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRÍLICO CUYAS DIMENSIONES DEBEN TENER UNA RELACIÓN DE 1,00 DE ANCHO POR 1,50 DE ALTO.                            | M2     | 3,38  | 291.470,00    | 985.168,60     | - | - | -            | -              | -               | 3,38       | 985.168,60     |
|                       |                                                                                                                                                                       |        |       |               |                |   |   |              | -              |                 |            |                |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                                                       |        |       |               | 184.318.324,00 |   |   |              | 19.386.858,00  | - 28.408.155,00 | % EJE      | 212.197.627,00 |
|                       | ADMINISTRACION                                                                                                                                                        | 33,00% |       | 60.825.047,00 |                |   |   | 6.397.663,00 | - 9.374.691,00 |                 |            | 70.025.220,00  |
|                       | IMPREVISTOS                                                                                                                                                           | 1,00%  |       | 1.843.183,00  |                |   |   | 193.869,00   | - 284.082,00   |                 |            | 2.121.976,00   |
|                       | UTILIDAD                                                                                                                                                              | 5,00%  |       | 9.215.916,00  |                |   |   | 969.343,00   | - 1.420.408,00 |                 |            | 10.609.881,00  |
| TOTAL OBRA            |                                                                                                                                                                       |        |       |               | 256.202.470,00 |   |   |              | 26.947.733,00  | - 39.487.336,00 | 115,13%    | 294.954.704,00 |
|                       |                                                                                                                                                                       |        |       |               |                |   |   |              |                |                 | DIFERENCIA | 38.752.234,00  |





- La aprobación de la prórroga del plazo contractual por treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.
- Lo anterior, por cuanto se evidencia que la adición y la prórroga son necesarias, técnicas, razonables y coherentes con el objeto contractual, garantizando la entrega de una obra funcional, segura y conforme a los requerimientos del sector salud.

## 6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Para dar viabilidad a la respectiva modificación solicitada y conceptuada como favorable se requiere autorizar adición de presupuesto; ya que el presupuesto de las menores cantidades de obras no es suficiente para cubrir el presupuesto requerido por las mayores cantidades de obra y las actividades no previstas solicitadas.

Conforme a lo anterior, se requiere la adición de presupuesto por el valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (**\$38.752.234**), de acuerdo al siguiente balance financiero:

| DESCRIPTION                | ESTADO FINANCIERO   |
|----------------------------|---------------------|
| VALOR CONTRACTUAL          | \$256.202.470       |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO   | \$294.954.704       |
| VALOR REQUERIDO DE ADICIÓN | <b>\$38.752.234</b> |

## MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El Contrato de Obra No 02325 de 2025 fue pactado con un plazo de ejecución inicial de dos meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Sin embargo, conforme a lo estipulado en el Estatuto de contratación de la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada en **CAPITULO V- FASE DE EJECUCION**, de su artículo 38; Acuerdo No. 004 del 10 de enero de 2025, el contrato podrá ser adicionado en tiempo y valor hasta el 100% de la duración y cuantía inicial, cuando las circunstancias así lo requieran. La decisión de prorrogar el termino de duración y/o adicionar el valor del contrato, será potestativa del Gerente, para lo cual, tendrá en cuenta la necesidad del servicio. Así las cosas, como jefe de mantenimiento hospitalario y basado en los hechos sustentados por el contratista de obra, me permito solicitar se conceda una prórroga por 30 días calendarios al Contrato de Obra No 02325 de 2025.

Lo anterior con el fin que el contratista de cabal cumplimiento al objeto contractual, ejecutando las mayores cantidades y las actividades no previstas autorizadas para el proyecto mediante la presente solicitud.

Hacen parte del presente memorando 101 folios, que comprende los siguientes documentos:

*Cindy Tatiana Vargas Toro*  
Gerente



# Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

NIT. 891.180.098-5

- ✓ Anexo 1. Solicitud del contratista.
- ✓ Anexo 2. Viabilidad de adición presupuestal y prórroga para los contratos 02325 y 02326
- ✓ Anexo 3. Balance de Obra.
- ✓ Anexo 4. Memoria de cantidades
- ✓ Anexo 5. A.P.U. de Ítems No Previstos.



**CAQUETÁ**

Lo anterior para su conocimiento y visto bueno.

Atentamente,

**SHIRLEY STELLA VERDOOREN AVILA**  
Jefe oficina mantenimiento hospitalario

Anexos: 101 folios (Solicitud del contratista, viabilidad interventoría, presupuesto definitivo, memoria de cantidades y APU no previstos).

Proyecto: Carlos Eduardo Castro Bustos/Ing apoyo hospital departamental

Reviso: Paulino Murcia Herrera/Profesional Universitario Mantenimiento Hospitalario

*Cindy Tatiana Vargas Toro*  
Gerente

Florencia Caquetá, 19 de enero del 2025

**HMI-INT-003-19012026**

Señores

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.**

Entidad Contratante

Florencia, Caquetá

**Referencia:** Contrato de interventoría N° 02326-2025, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”.

**Asunto:** Viabilidad de adición presupuestal y prórroga para los contratos 02325 y 02326

Cordial saludo.

En mi calidad de Interventor del Contrato de Obra No. 2325 de 2025, y en atención a la solicitud formal de prórroga y adición presupuestal presentada por el contratista CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S., mediante oficio CTM26-005 allegado por correo electrónico el 18 de enero de 2026, me permito emitir el siguiente concepto técnico, administrativo y contractual, con fundamento en las visitas de obra, revisión documental y análisis presupuestal efectuado por esta Interventoría.

El contrato tiene por objeto la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento del Puesto de Salud Agua Caliente, municipio de Morelia – Caquetá. Durante la ejecución contractual se evidenciaron condiciones físicas, funcionales y normativas no previstas en el alcance inicial, las cuales inciden directamente en la correcta prestación del servicio de salud y en la durabilidad de la infraestructura.

## 2. Análisis técnico de la solicitud

De las visitas técnicas conjuntas realizadas por la Entidad Contratante y la Interventoría, así como de la documentación aportada por el contratista, se verificó lo siguiente:

La necesidad real y justificada de ejecutar actividades no previstas inicialmente, relacionadas con:

- Construcción de estructura para soporte de tanque de almacenamiento de agua.
- Rediseño y adecuación de batería sanitaria conforme a requerimientos del sector salud.
- Elevación de cubierta para garantizar condiciones adecuadas de ventilación, confort térmico y operación.
- Manejo técnico de aguas lluvias y escorrentías mediante cunetas y drenajes.
- Construcción de rampa de acceso para garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad.
- Las actividades adicionales se encuentran directamente asociadas a la funcionalidad, seguridad, accesibilidad y cumplimiento normativo del puesto de salud, por lo cual su no ejecución comprometería el correcto uso de la infraestructura.

### **3. Análisis presupuestal**

Esta Interventoría revisó el balance de mayores y menores cantidades, los ítems no previstos, los APU y la memoria de cantidades, verificando que:

- Los ítems adicionales cuentan con justificación técnica clara.
- Los precios unitarios se encuentran acordes con valores de mercado y condiciones locales.
- El valor total de la adición asciende a TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$38.752.234,00).
- La adición se encuentra debidamente soportada y no corresponde a mayores cantidades injustificadas ni a errores de planeación atribuibles al contratista.

### **4. Análisis de la prórroga solicitada**

En relación con la solicitud de prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario, la Interventoría constató que:

La ejecución de las actividades adicionales autorizadas implica una reprogramación de la secuencia constructiva.

Durante el mes de diciembre se presentaron afectaciones objetivas en el rendimiento, propias del sector de la construcción (disponibilidad de mano de obra, proveedores y suministro de materiales).

Las condiciones de localización rural del proyecto inciden en los tiempos de ejecución y logística.

En consecuencia, el plazo adicional solicitado resulta técnicamente necesario y proporcional, y permitirá culminar la obra sin afectar la calidad ni la seguridad de la infraestructura.

### **5. Concepto de la Interventoría**

Con fundamento en lo anterior, esta Interventoría EMITE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para:

La aprobación de la adición presupuestal por valor de \$38.752.234,00, destinada a la ejecución de los ítems no previstos debidamente justificados.

La aprobación de la prórroga del plazo contractual por treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.

Lo anterior, por cuanto se evidencia que la adición y la prórroga son necesarias, técnicas, razonables y coherentes con el objeto contractual, garantizando la entrega de una obra funcional, segura y conforme a los requerimientos del sector salud.

### **6. Recomendación**

Se recomienda a la Entidad Contratante adelantar los trámites administrativos correspondientes para la suscripción del otrosí de adición y prórroga, conforme a la normatividad contractual vigente.

### **SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 02326-2025**

En mi calidad de Interventora del Contrato de Obra No. 2325 de 2025, y en atención a la solicitud de prórroga y adición presupuestal del contrato de obra, presentada por el contratista y conceptuada favorablemente por esta Interventoría, me permito solicitar formalmente la adición de plazo y presupuesto

del contrato de interventoría, con fundamento en las consideraciones técnicas, contractuales y administrativas que se exponen a continuación:

### **1. Naturaleza del contrato de interventoría**

El contrato de interventoría se ejecuta bajo la modalidad de dedicación de profesionales, cuyo objeto consiste en realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual permanente durante toda la ejecución del contrato de obra.

En este sentido, la interventoría no constituye una actividad independiente, sino que se desarrolla de manera simultánea, continua y directamente asociada al plazo y alcance del contrato de obra.

### **2. Relación directa entre el contrato de obra y la interventoría**

Como resultado del balance técnico y presupuestal del proyecto, la Entidad Contratante autorizó la ejecución de actividades adicionales y se encuentra en trámite la prórroga del plazo contractual del contrato de obra por treinta (30) días calendario.

Dicha ampliación del plazo y alcance del contrato de obra implica, de manera directa e inevitable, que:

- La interventoría deba extender su presencia en obra durante el mismo período adicional.
- Se requiera la continuidad en la dedicación de los profesionales asignados al contrato (interventor, apoyo técnico y administrativo).
- Se mantengan las obligaciones de seguimiento, control de calidad, revisión de actas, informes, comités y recibo de actividades adicionales.
- Por lo anterior, resulta técnica y contractualmente improcedente que el contrato de interventoría finalice antes o en condiciones distintas al contrato de obra intervenido.

Para supervisar y llevar el control como interventoría de la obra, se tienen en cuenta los siguientes ítems y actividades necesarias para garantizar la entrega de una estructura funcional:

- La construcción de una estructura adecuada para el tanque de almacenamiento de agua, indispensable para garantizar el abastecimiento del puesto de salud.
- La elevación de la cubierta, debido a que la altura existente no permitía condiciones óptimas de operación, ventilación y confort.
- -La construcción de una unidad sanitaria apta para personas con movilidad reducida, como lo requiere las edificaciones que prestan servicios de salud.
- Instalación de cielos rasos.
- Acabados asociados a la cubierta.
- Estas actividades quedaron condicionadas a la definición del balance presupuestal y a la posterior autorización para su ejecución, afectando la programación inicial del contrato.

### **Visitas de obra y nuevas necesidades identificadas**

En visitas técnicas realizadas por la Entidad Contratante y la Interventoría, se verificó:

La necesidad real de las actividades inicialmente no contempladas.

La existencia de problemáticas asociadas al manejo inadecuado de aguas lluvias y escorrentías, que podrían generar inundaciones y afectaciones a la infraestructura del puesto de salud durante temporadas de lluvia.

La necesidad de construir una rampa de acceso que garantice condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad para los usuarios y el personal del centro de salud.

Como resultado, se concluyó la necesidad de ejecutar actividades adicionales de drenaje y manejo de aguas, y la construcción de una rampa o andén de acceso, indispensables para garantizar la funcionalidad, durabilidad y seguridad de la obra.

### 3. Impacto en el recurso humano de la interventoría

El tiempo adicional requerido para la ejecución del contrato de obra conlleva un mayor número de días de dedicación profesional, lo cual genera costos adicionales asociados a:

- Honorarios del personal profesional asignado.
- Seguimiento técnico de ítems no previstos.
- Revisión y validación de balances presupuestales, actas de modificación, informes adicionales y recibo final de obra.
- Estos costos no se encuentran cubiertos dentro del valor inicial del contrato de interventoría, dado que corresponden a una ampliación real del plazo y alcance del proyecto.

### 4. Solicitud de adición

Con fundamento en lo expuesto, de manera respetuosa se solicita a la Entidad Contratante:

La adición del plazo del contrato de interventoría, en un término igual al aprobado para el contrato de obra, es decir, treinta (30) días calendario.

La adición presupuestal correspondiente, calculada con base en la dedicación efectiva de los profesionales de la interventoría durante el plazo adicional, conforme a las condiciones contractuales vigentes. Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, la continuidad del control técnico y administrativo, y el cumplimiento de los principios de planeación, equilibrio económico del contrato y responsabilidad contractual.

Presupuesto adición interventoría:

| 1. PERSONAL (Valores Unitarios Incluye Prestaciones) |                         |            |          |             |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| ID                                                   | DESCRIPCIÓN             | UND MEDIDA | CANTIDAD | DEDICATORIA | VR UNITARIO     | SUBTOTAL        |
| 1.01                                                 | RESIDENTE INTERVENTORIA | MES        | 1.00     | 0.40        | \$ 5 419 545.44 | \$ 2 167 818.00 |
| 1.02                                                 | INGENIERO ELECTRICISTA  | MES        | 1.00     | 0.20        | \$ 3 000 000.00 | \$ 600 000.00   |
| 1.04                                                 | PROFESIONAL SISO        | MES        | 1.00     | 0.20        | \$ 3 387 379.80 | \$ 677 476.00   |
| TOTAL                                                |                         |            |          |             |                 | \$ 3 445 294.00 |
| 2. OTROS COSTOS DIRECTOS                             |                         |            |          |             |                 |                 |
| 2.01                                                 | PAPELERIA, IMPRESIONES  | MES        | 1.00     | 1.00        | \$ 478 355.89   | \$ 478 356.31   |
| 2.02                                                 | INTERNET- PLAN DATOS    | MES        | 1.00     | 1.00        | \$ 75 000.00    | \$ 75 000.00    |
| TOTAL                                                |                         |            |          |             |                 | \$ 553 356.31   |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS                             |                         |            |          |             |                 | \$ 3 998 650.31 |
| 3. POLIZAS                                           |                         |            |          |             |                 |                 |



|                                                           |                                     |   |        |   |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|---|-----------------|------------------------|
| 3.01                                                      | GARANTÍAS DEL CONTRATO (POLIZAS)    | % | 1.00%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ <b>64 511.00</b>    |
| <b>4. IMPUESTOS NACIONALES Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES</b> |                                     |   |        |   |                 |                        |
| 4.01                                                      | ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR         | % | 4.00%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 258 046.00          |
| 4.02                                                      | ESTAMPILLA PRO-CULTURA              | % | 0.75%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 48 384.00           |
| 4.03                                                      | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD          | % | 0.50%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 32 256.00           |
| 4.04                                                      | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO           | % | 1.00%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 64 511.00           |
| 4.05                                                      | ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN      | % | 3.00%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 193 534.00          |
| 4.06                                                      | RETENCIÓN EN LA FUENTE X HONORARIOS | % | 11.00% | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 709 626.00          |
| 4.07                                                      | RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA          | % | 0.80%  | 1 | \$ 6 451 141.50 | \$ 51 609.00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           |                                     |   |        |   |                 | \$ <b>1 357 966.00</b> |
| <b>COSTO BÁSICO</b>                                       |                                     |   |        |   |                 | \$ <b>5 421 127.31</b> |
| IVA 19%                                                   |                                     |   |        |   |                 | \$ 1 030 014.19        |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                        |                                     |   |        |   |                 | \$ <b>6 451 141.00</b> |

Se solicita a la Entidad Contratante adelantar los trámites administrativos correspondientes para la suscripción del otrosí de adición y prórroga, conforme a la normatividad contractual vigente, para los contratos de obra e interventoría de la referencia.

Cordialmente,

  
**ROSÁ COTAMO VALERO**  
Representante Legal  
ALTING INGENIERÍA SAS  
Contrato de interventoría N° 02326-2025

Anexo: Oficio de Solicitud Prórroga Contrato de Obra No 2325-2025.



**CONSTRUMATERIALES  
E INGENIEROS** ZOMAC S.A.S  
NIT. 901.876.342-1

Florencia, 16 Enero de 2026

**OFICIO N. CTM26-005**

Señora:  
ROSA COTAMO VALERO  
R.L. ALTING INGENIERIA SAS  
Interventor Contrato de Obra No 2325 del 01 de Octubre de 2025  
Correo: [altingsas2@gmail.com](mailto:altingsas2@gmail.com)

**Referencia:** Solicitud Prorroga Contrato de Obra No 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025

Cordial Saludo,

En calidad de contratista del Contrato de Obra No. 2325 de 2025, suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA y CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS, muy respetuosamente solicitamos la prórroga del plazo de ejecución por cuarenta y cinco (45) días calendario junto con una adición de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 38,752,234.00), de conformidad con las razones técnicas y logísticas que se exponen a continuación.

**1. Antecedentes técnicos y balance presupuestal**

Durante la ejecución del contrato fue necesario adelantar un balance técnico y presupuestal, mediante el cual se evidenció que el alcance inicialmente contratado no contemplaba actividades indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento del puesto de salud, conforme a las condiciones reales de la edificación y a los requerimientos técnicos del servicio.

Dentro de dichas actividades necesarias se identificaron, entre otras:

- La construcción de una estructura adecuada para el tanque de almacenamiento de agua, indispensable para garantizar el abastecimiento del puesto de salud.
- La elevación de la cubierta, debido a que la altura existente no permitía condiciones óptimas de operación, ventilación y confort.
- La construcción de una unidad sanitaria apta para personas con movilidad reducida, como lo requiere las edificaciones que prestan servicios de salud.





## 2. Impacto en la ejecución de actividades contractuales

La incorporación de estas actividades no previstas inicialmente generó la necesidad de priorizar recursos, lo cual tuvo como consecuencia que no se ejecutaran simultáneamente otras actividades contractuales relevantes, tales como:

- Instalación de cielos rasos.
- Acabados asociados a la cubierta.

Estas actividades quedaron condicionadas a la definición del balance presupuestal y a la posterior autorización para su ejecución, afectando la programación inicial del contrato.

## 3. Visitas de obra y nuevas necesidades identificadas

En visitas técnicas realizadas por la Entidad Contratante y la Interventoría, se verificó:

- La necesidad real de las actividades inicialmente no contempladas.
- La existencia de problemáticas asociadas al manejo inadecuado de aguas lluvias y escorrentías, que podrían generar inundaciones y afectaciones a la infraestructura del puesto de salud durante temporadas de lluvia.
- La necesidad de construir una rampa de acceso que garantice condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad para los usuarios y el personal del centro de salud.

Como resultado, se concluyó la necesidad de ejecutar actividades adicionales de drenaje y manejo de aguas, y la construcción de una rampa o andén de acceso, indispensables para garantizar la funcionalidad, durabilidad y seguridad de la obra.

## 4. Autorización de actividades adicionales y necesidad de adición presupuestal

Producto del análisis técnico conjunto:

La Entidad Contratante autorizó la ejecución de las actividades adicionales identificadas.

Se definió la necesidad de contar con un recurso presupuestal adicional, el cual permitirá ejecutar de manera completa dichas actividades y culminar la obra en condiciones técnicas adecuadas, como se relacionan en el balance presupuestal en este documento junto con la justificación técnica de cada uno de los ítems no previstos incorporados al balance.

El listado detallado de actividades adicionales y el valor de la adición requerida se anexan al presente oficio en cuadro independiente para su evaluación y trámite correspondiente.

## 5. Afectaciones en el rendimiento durante el mes de diciembre

Adicionalmente, es importante señalar que durante el mes de diciembre se presentó una disminución significativa del rendimiento de ejecución, derivada de circunstancias propias de la temporada de fin



## CONSTRUMATERIALES

E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

de año y la transición al nuevo año, tales como:

- Reducción de la disponibilidad efectiva de mano de obra por vacaciones y festividades.
- Proveedores operando con capacidad reducida o suspensión temporal de actividades.
- Dificultades en la fabricación, despacho y suministro oportuno de materiales.

Estas condiciones, ampliamente conocidas en el sector de la construcción, afectaron el ritmo normal de ejecución y limitaron la posibilidad de avanzar conforme a la programación inicial.


### 6. Necesidad de ampliación del plazo contractual

La ejecución de las actividades adicionales autorizadas, sumada a:

- La reprogramación derivada del balance presupuestal.
- La disminución de rendimientos durante el mes de diciembre.
- La secuencia constructiva requerida para cubierta, drenajes, cielos rasos y acabados.
- Las condiciones propias de una obra ubicada en zona rural.

hacen necesario contar con un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días calendario, que permita ejecutar las actividades pendientes y adicionales sin comprometer la calidad, seguridad y funcionalidad de la infraestructura.

### • REGISTRO FOTOGRAFICO AGUA CALIENTE – MORELIA

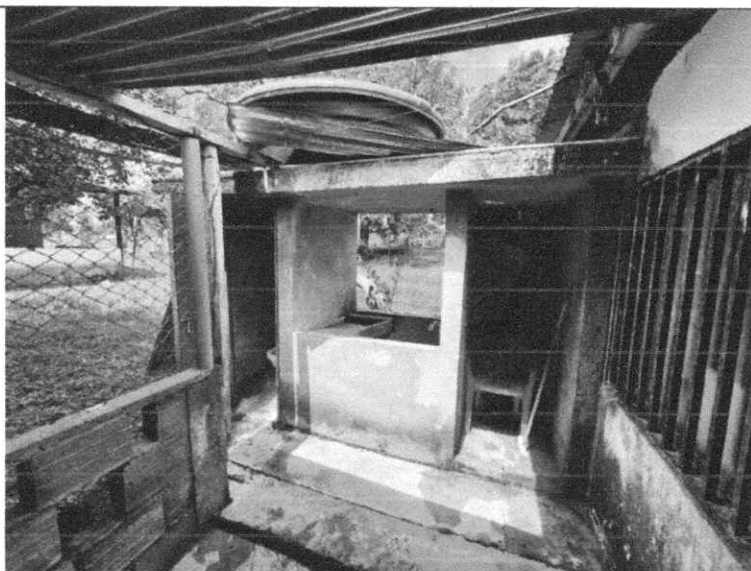


BATERÍA SANITARIA EXISTENTE



**CONSTRUMATERIALES  
E INGENIEROS** ZOMAC S.A.S


NIT. 901.876.342-1

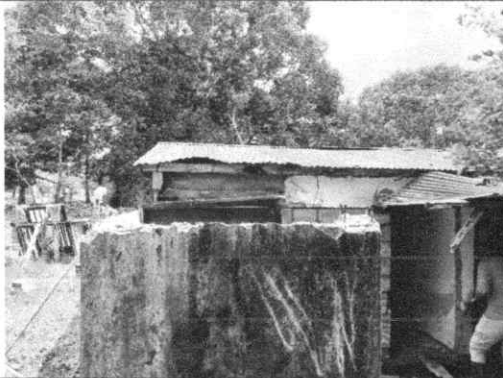


**DESMONTE BATERIA SANITARIA EXISTENTE**



**DESMONTE BATERIA SANITARIA EXISTENTE**

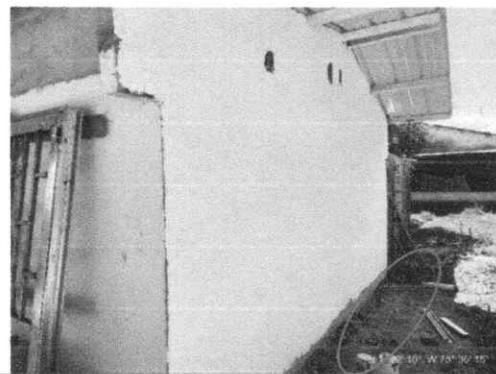


**MANEJO DE AGUA POR ESCORRENTIA  
-CUNETAS-**

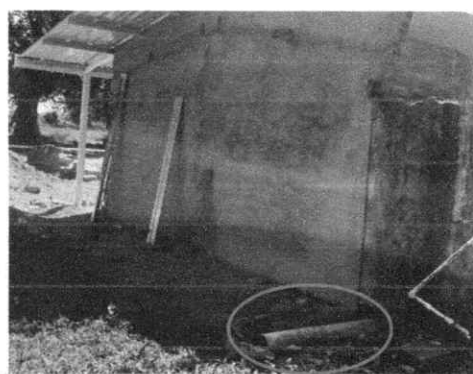

**MANEJO DE AGUA POR ESCORRENTIA  
-CUNETAS-**



**MANEJO DE AGUA POR ESCORRENTIA  
-CUNETAS-**

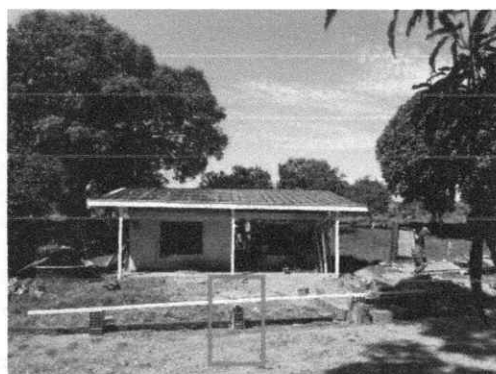

**RAMPA DE ACCESO**



• Justificación de Ítems No Previstos

| ITEM  | DESCRIPCIÓN ITEMS NO PREVISTOS                                                                                             | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP-01 | COLUMNA DE 0,20X0,10 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.      | La ejecución de la columna o columneta resulta necesaria para garantizar el soporte estructural vertical de la placa aérea proyectada sobre la batería sanitaria la cual se rediseño de acuerdo con los requerimientos del ministerio de salud, la cual servirá como base para la instalación de un tanque de almacenamiento de agua. Adicionalmente, este elemento permite el confinamiento adecuado de los muros de mampostería del nuevo baño, contribuyendo a su estabilidad estructural. |
| NP-02 | LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                        | Este ítem se requiere para la construcción de la placa aérea correspondiente para la batería sanitaria la cual se rediseño de acuerdo con los requerimientos del ministerio de salud, la cual funcionará como plataforma estructural de soporte del tanque de almacenamiento de agua, garantizando la correcta transmisión de cargas.                                                                                                                                                         |
| NP-03 | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS. | En razón a la construcción de la batería sanitaria la cual se rediseño de acuerdo con los requerimientos del ministerio de salud, se hace necesaria la ejecución de elementos estructurales en concreto reforzado, tales como vigas de amarre, vigas de cimentación y columnas, los cuales aseguran la adecuada conformación y estabilidad del sistema estructural propuesto.                                                                                                                 |
| NP-04 | VIGA AEREA DE 0,20X0,10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                 | La viga aérea cumple la función de elemento de amarre estructural entre las columnas y la losa aérea, permitiendo una correcta distribución de las cargas generadas por el tanque de almacenamiento, evitando deformaciones y proporcionando confinamiento a los muros de mampostería.                                                                                                                                                                                                        |
| NP-05 | ZAPATA DE 0,50X0,50m EN CONCRETO DE 3000 psi, NO incluye acero de refuerzo                                                 | La zapata se requiere como elemento de cimentación del área donde se construirá la batería sanitaria la cual se rediseño de acuerdo con los requerimientos del ministerio de salud, ya que sobre ella se transmiten las cargas provenientes de las columnetas y la losa aérea. Este elemento garantiza la estabilidad, nivelación y capacidad resistente del conjunto estructural.                                                                                                            |
| NP-06 | VIGA CIMENTACIÓN DE 0,20X0,10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                           | Actividad solicitada por la Interventoría para elevar la cota de la cubierta, mejorando la altura libre y el confort térmico dentro del recinto, de esta manera fue necesario incluir el perfil metálico para el óptimo manejo de las cargas ejercidas por la cubierta proyectada                                                                                                                                                                                                             |
| NP-07 | PERFIL METALICO 100X100X2,80 mm PARA COLUMNA DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                     | Instalado como elemento de arriostramiento estructural necesario para dar estabilidad a los perfiles metálicos tras el incremento de altura de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NP-08 | PERFIL METALICO 100X100X2,50 mm PARA TEMPLETE DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                    | Incorporado para garantizar la ventilación cruzada y salida de aire caliente, evitando la concentración de olores y humedad en el área sanitaria y cuarto de residuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP-09 | ESTRUCTURA PARA LUCETA DE VENTILACIÓN METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.0 X 0.3 ) M                                                         | Instalación necesaria para el manejo de aguas lluvias, dirigiendo el vertimiento y evitando encharcamientos en la zona baja del puesto de salud                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4"                                                                                                                                                           | Instalación necesaria para el manejo de aguas lluvias, dirigiendo el vertimiento y evitando encharcamientos en la zona lateral del puesto de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NP-11 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.41 DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN.                                                | Manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía superficial, con el fin de evitar la acumulación de agua en las zonas intervenidas, prevenir procesos de erosión y deterioro del terreno, y proteger los elementos estructurales                                                                                                                                                                                     |
| NP-12 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.51 DE ANCHO, JUNTO CON REJILLA DE 0.35 EN ANGULO DE 1" /4 , INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN. | Manejo adecuado de las aguas lluvias y de escorrentía superficial, con el fin de evitar la acumulación de agua en las zonas intervenidas, prevenir procesos de erosión y deterioro del terreno, y proteger los elementos estructurales                                                                                                                                                                                     |
| NP-13 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.                                                                                                                                               | Adecuar el terreno a las cotas y niveles requeridos para la correcta ejecución de las obras proyectadas. Estas labores permiten la conformación del área de intervención, garantizan la estabilidad del suelo y facilitan la construcción de los elementos de infraestructura previstos, así como la correcta instalación de sistemas complementarios como drenajes y cunetas que están siendo requeridos en este proyecto |
| NP-14 | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.                               | Se evidenció la necesidad de construir una rampa de acceso que permita garantizar condiciones adecuadas de circulación y accesibilidad al Puesto de Salud, facilitando el tránsito seguro. La inexistencia de un acceso adecuado genera riesgos de accidentes, dificulta la operación y limita el uso funcional de la infraestructura y así optimizar las condiciones de ingreso y salida.                                 |
| NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRÍLICO CUYAS DIMENSIONES DEBEN TENER UNA RELACIÓN DE 1,00 DE ANCHO POR 1,50 DE ALTO.                                                          | De acuerdo a comité realizado el día 14 de enero de 2026, se realizó el requerimiento por parte de la supervisión en cuanto al suministro e instalación de aviso de Misión Médica.                                                                                                                                                                                                                                         |



# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

## • Balance Presupuestal

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                  | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES |            |                 | CANTIDAD ACTUALIZADA |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|
|      |                                                                                              |        | CANT                      | V/UNITARIO | V/TOTAL         | CANTIDAD             | SUBTOTAL      |
| 1    | PRELIMINARES                                                                                 |        |                           |            | 14,307,588.00   |                      | 13,017,980.00 |
| 1.01 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE                                                      | M2     | 85.62                     | 71,271.00  | \$ 6,102,223.00 | 73.55                | 5,241,982.00  |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO | M2     | 77.59                     | 28,500.00  | \$ 2,211,315.00 | 68.09                | 1,940,565.00  |
| 1.03 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO.           | M2     | 79.43                     | 30,000.00  | \$ 2,382,900.00 | 68.09                | 2,042,700.00  |
| 1.04 | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS                                                                | UND    | 10.00                     | 25,000.00  | \$ 250,000.00   | 9.00                 | 225,000.00    |
| 1.05 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS                                                                 | UND    | 2.00                      | 35,000.00  | \$ 70,000.00    | 3.00                 | 105,000.00    |
| 1.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO                                           | M2     | 10.50                     | 33,540.00  | \$ 352,170.00   | 14.58                | 489,013.00    |
| 1.07 | DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO                                            | ML     | 1.44                      | 38,500.00  | \$ 55,440.00    | 1.44                 | 55,440.00     |
| 1.08 | DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO                                                    | M2     | 45.20                     | 28,950.00  | \$ 1,308,540.00 | 46.40                | 1,343,280.00  |
| 1.09 | DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.               | M2     | 90.00                     | 17,500.00  | \$ 1,575,000.00 | 90.00                | 1,575,000.00  |
| 2    | CONCRETOS                                                                                    |        |                           |            | 15,156,261.00   |                      | 19,471,733.00 |
| 2.01 | PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm                          | M2     | 56.73                     | 157,850.00 | 8,954,831.00    | 85.08                | 13,429,878.00 |
| 2.02 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 8 cm. Escobado y Ratoneado    | M2     | 45.08                     | 137,565.00 | 6,201,430.00    | 43.92                | 6,041,855.00  |
| 3    | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS                                                              |        |                           |            | 23,528,655.00   |                      | 26,327,565.00 |
| 3.01 | MURO EN BLOQUE No 4                                                                          | M2     | 25.69                     | 71,565.00  | 1,838,505.00    | 50.85                | 3,639,080.00  |
| 3.02 | PAÑETE EN MOTERO 1:4                                                                         | M2     | 124.23                    | 45,000.00  | 5,590,350.00    | 153.48               | 6,906,600.00  |
| 3.03 | ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30                                                          | M2     | 25.95                     | 105,245.00 | 2,731,108.00    | 26.75                | 2,815,304.00  |





# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|      |                                                                                                                                                                           |    |        |            |                      |        |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 3.04 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I                                                                                                                                | M2 | 135.62 | 27,850.00  | 3,777,017.00         | 104.28 | 2,904,198.00         |
| 3.05 | ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS                                                                                                                                  | M2 | 98.01  | 38,000.00  | 3,724,380.00         | 94.73  | 3,599,740.00         |
| 3.06 | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS) 3 MANOS                                                                                                               | M2 | 20.52  | 33,500.00  | 687,420.00           | 19.72  | 660,620.00           |
| 3.07 | ESTUCO EXTERIOR Y PINTURA TIPO KORAZA 3 MANOS                                                                                                                             | M2 | 88.49  | 34,520.00  | 3,054,675.00         | 91.25  | 3,149,950.00         |
| 3.08 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS LATERALES, HIDROFUGO O SIMILAR                                                                                                                | M2 | 52.80  | 40,250.00  | 2,125,200.00         | 65.89  | 2,652,073.00         |
| 4    | <b>CUBIERTAS Y CIELO RASOS</b>                                                                                                                                            |    |        |            | <b>53,534,657.00</b> |        | <b>46,932,126.00</b> |
| 4.01 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.                                                        | ML | 185.40 | 142,650.00 | 26,447,310.00        | 102.27 | 14,588,816.00        |
| 4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.                                                                                          | M2 | 113.30 | 137,565.00 | 15,586,115.00        | 108.91 | 14,982,204.00        |
| 4.03 | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA                                                                                                                                      | ML | 10.30  | 82,500.00  | 849,750.00           | 10.08  | 831,600.00           |
| 4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | ML | 20.60  | 189,500.00 | 3,903,700.00         | 20.16  | 3,820,320.00         |
| 4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"                                                                                                               | ML | 8.70   | 44,710.00  | 388,977.00           | 9.60   | 429,216.00           |
| 4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN).                                                             | M2 | 48.82  | 130,250.00 | 6,358,805.00         | 94.28  | 12,279,970.00        |
| 5    | <b>PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                                                                   |    |        |            | <b>21,814,603.00</b> |        | <b>23,273,928.00</b> |
| 5.01 | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M                                                                                                                                  | M2 | 79.47  | 94,500.00  | 7,509,915.00         | 81.10  | 7,663,950.00         |
| 5.02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO MINIMO 40X40                                                                                                                          | M2 | 68.78  | 117,985.00 | 8,115,008.00         | 80.78  | 9,530,828.00         |





# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|      |                                                                                                                                                                                           |     |       |              |                      |       |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------|-------|----------------------|
| 5.03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                                                                                                                                  | ML  | 78.40 | 78,950.00    | 6,189,680.00         | 77.00 | 6,079,150.00         |
| 6    | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                               |     |       |              | <b>29,170,915.00</b> |       | <b>23,431,400.00</b> |
| 6.01 | PUERTA METALICA ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM                                          | M2  | 6.10  | 1,160,000.00 | 7,076,000.00         | 7.98  | 9,256,800.00         |
| 6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING. | M2  | 10.64 | 1,150,000.00 | 12,236,000.00        | 7.13  | 8,199,500.00         |
| 6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MARCO DE ALUMINIO CON TABLERO EN VIDRIO 4 MM, CON PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.                                                      | M2  | 9.90  | 995,850.00   | 9,858,915.00         | 6.00  | 5,975,100.00         |
| 7    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                           |     |       |              | <b>15,528,435.00</b> |       | <b>15,097,435.00</b> |
| 7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2.40M.                                           | UND | 1.00  | 1,400,000.00 | 1,400,000.00         | 1.00  | 1,400,000.00         |
| 7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)                                                                     | UND | 1.00  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00         | 1.00  | 1,200,000.00         |
| 7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.                                                                   | UND | 18.00 | 195,000.00   | 3,510,000.00         | 24.00 | 4,680,000.00         |



# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|      |                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |              |                      |       |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------|-------|---------------------|
| 7.04 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE PUNTO<br>ELECTRICO DE TOMA<br>CORRIENTE DOBLES DE<br>110 V (INCLUYE<br>ACCESORIOS,<br>CABLEADO Y TUBERIA)                                                                                                   | UND | 22.00 | 142,000.00   | 3,124,000.00         | 14.00 | 1,988,000.00        |
| 7.05 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE PUNTO<br>ELECTRICO DE TOMA<br>CORRIENTE DOBLES DE<br>220V (INCLUYE<br>ACCESORIOS,<br>CABLEADO Y TUBERIA)                                                                                                    | UND | 5.00  | 155,000.00   | 775,000.00           | 2.00  | 310,000.00          |
| 7.06 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>TRANSFERENCIA<br>MANUAL PARA PLANTA<br>ELECTRICA.                                                                                                                                                        | UND | 1.00  | 895,000.00   | 895,000.00           | 1.00  | 895,000.00          |
| 7.07 | ACOMETIDA DE<br>DISTRIBUCION INTERNA<br>DE TABLERO DE<br>DISTRIBUCION A USO<br>FINAL PARA TOMA<br>CORRIENTES Y<br>LUMINARIAS. INCLUYE<br>TUBERIA PVC, ALAMBRE<br>AWG No 12 POR 2<br>LINEAS Y ALAMBRE No<br>14 POR 1 LINEA Y<br>ACCESORIOS. | ML  | 67.51 | 68,500.00    | 4,624,435.00         | 67.51 | 4,624,435.00        |
| 8    | <b>INSTALACIONES<br/>HIDROSANITARIAS Y<br/>APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                                         |     |       |              | <b>10,388,700.00</b> |       | <b>6,856,350.00</b> |
| 8.01 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE MESON<br>DE EMPOTRAR, EN<br>ACERO INOXIDABLE<br>INCLUYE POCETAS Y<br>ACCESORIOS DE<br>GRIFERIA Y DESAGUES.                                                                                                  | ML  | 1.50  | 1,325,000.00 | 1,987,500.00         | 1.50  | 1,987,500.00        |
| 8.02 | SUMINISTRO Y<br>COLOCACION DE<br>SANITARIO BLANCO DE<br>PUSH INCLUYE<br>GRIFERIA                                                                                                                                                           | UND | 2.00  | 895,000.00   | 1,790,000.00         | 1.00  | 895,000.00          |
| 8.03 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>LAVAMANOS DE<br>COLGAR INCLUYE<br>GRIFERIA Y<br>ACCESORIOS DE<br>INSTALACION Y<br>FUNCIONAMIENTO                                                                                                         | UND | 3.00  | 425,000.00   | 1,275,000.00         | 3.00  | 1,275,000.00        |
| 8.04 | SUMINISTRO E<br>INSTALACION DE<br>ACCESORIOS DE BAÑO<br>EN PORCELANA<br>(TOALLERO, JABONERA<br>Y PAPELERA).                                                                                                                                | UND | 2.00  | 150,000.00   | 300,000.00           | 1.00  | 150,000.00          |

Dirección: Calle 10B N 2D - 04 301 Florencia - Caquetá

Contacto: 302 832 0309

Correo: Construmaterialesing@hotmail.com



# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|       |                                                                                                                            |     |       |            |                      |        |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 8.05  | POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDIN.                                                                            | UND | 1.00  | 450,000.00 | 450,000.00           | 0.00   | -                    |
| 8.06  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"                                                                                                   | UND | 11.00 | 60,250.00  | 662,750.00           | 7.00   | 421,750.00           |
| 8.07  | PUNTO SANITARIO DE 2"                                                                                                      | UND | 8.00  | 87,500.00  | 700,000.00           | 7.00   | 612,500.00           |
| 8.08  | PUNTO SANITARIO DE 4"                                                                                                      | UND | 2.00  | 138,850.00 | 277,700.00           | 1.00   | 138,850.00           |
| 8.09  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.                                                               | UND | 2.00  | 785,000.00 | 1,570,000.00         | 0.00   | -                    |
| 8.10  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.                                                 | UND | 1.00  | 675,250.00 | 675,250.00           | 1.00   | 675,250.00           |
| 8.11  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO                                                                          | UND | 1.00  | 700,500.00 | 700,500.00           | 1.00   | 700,500.00           |
| 9     | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                            |     |       |            | <b>888,510.00</b>    |        | <b>888,510.00</b>    |
| 9.01  | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE                                                                              | M2  | 84.62 | 10,500.00  | 888,510.00           | 84.62  | 888,510.00           |
|       | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                                                                                  |     |       |            | <b>36,900,600.00</b> |        | <b>36,900,600.00</b> |
| NP-01 | COLUMNA DE 0,20X0,10 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.      | ML  |       | 169,383.00 |                      | 4.60   | 779,161.80           |
| NP-02 | LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO . INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                       | M2  |       | 280,384.00 |                      | 6.30   | 1,766,419.20         |
| NP-03 | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS. | KG  |       | 24,549.00  |                      | 427.53 | 10,495,433.97        |
| NP-04 | VIGA AEREA DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                 | ML  |       | 222,452.00 |                      | 10.12  | 2,251,214.24         |
| NP-05 | ZAPATA DE 0,50X0,50m EN CONCRETO DE 3000 psi, NO incluye acero de refuerzo                                                 | ML  |       | 398,456.00 |                      | 1.00   | 398,456.00           |



# CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S

NIT. 901.876.342-1

|       |                                                                                                                                                                                                     |    |  |            |  |       |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------|--|-------|--------------|
| NP-06 | VIGA CIMENTACIÓN DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                                                                                    | ML |  | 222,452.00 |  | 5.21  | 1,158,974.92 |
| NP-07 | PERFIL METALICO 100X100X2,80 mm PARA COLUMNA DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                              | ML |  | 143,461.00 |  | 10.77 | 1,545,074.97 |
| NP-08 | PERFIL METALICO 100X100X2,50 mm PARA TEMPLETE DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                             | ML |  | 141,650.00 |  | 3.00  | 424,950.00   |
| NP-09 | ESTRUCTURA PARA LUCETA DE VENTILACIÓN METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.0 X 0.3) M                                                          | M2 |  | 933,045.00 |  | 0.60  | 559,827.00   |
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4"                                                                                                                                                           | ML |  | 73,739.00  |  | 12.00 | 884,868.00   |
| NP-11 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.41 DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN.                                                | ML |  | 180,780.00 |  | 38.00 | 6,869,640.00 |
| NP-12 | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.51 DE ANCHO, JUNTO CON REJILLA DE 0.35 EN ANGULO DE 1" /4 , INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN. | ML |  | 687,916.00 |  | 10.08 | 6,934,193.28 |
| NP-13 | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.                                                                                                                                               | M3 |  | 93,704.00  |  | 4.32  | 404,801.28   |
| NP-14 | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.                               | M2 |  | 137,373.00 |  | 10.50 | 1,442,416.50 |

Dirección: Calle 10B N 2D - 04 301 Florencia - Caquetá

Contacto: 302 832 0309

Correo: Construmaterialesing@hotmail.com



**CONSTRUMATERIALES  
E INGENIEROS ZOMAC S.A.S**

NIT. 901.876.342-1

|                       |                                                                                                                                            |    |  |                |                |                |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NP-15                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRÍLICO CUYAS DIMENSIONES DEBEN TENER UNA RELACIÓN DE 1,00 DE ANCHO POR 1,50 DE ALTO. | M2 |  | 291,470.00     |                | 3.38           | 985,168.60     |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                            |    |  | 184,318,324.00 | % EJE          | 212,197,627.00 |                |
| ADMINISTRACION        |                                                                                                                                            |    |  | 33.00%         | 60,825,047.00  | 70,025,220.00  |                |
| IMPREVISTOS           |                                                                                                                                            |    |  | 1.00%          | 1,843,183.00   | 2,121,976.00   |                |
| UTILIDAD              |                                                                                                                                            |    |  | 5.00%          | 9,215,916.00   | 10,609,881.00  |                |
| TOTAL OBRA            |                                                                                                                                            |    |  |                | 256,202,470.00 | 115.13%        | 294,954,704.00 |
|                       |                                                                                                                                            |    |  |                |                | DIFERENCIA     | 38,752,234.00  |

con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga del plazo de ejecución por cuarenta y cinco (45) días calendario, así como la aprobación de una adición presupuestal por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 38,752,234.00), la cual se encuentra debidamente soportada mediante los anexos correspondientes, consistentes en el Balance de Mayores y Menores, los APU y la Memoria de Cantidades.

La aprobación conjunta de la prórroga y la adición permitirá entregar una obra completa, funcional, segura y conforme a los requerimientos técnicos del sector salud.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones y concepto que esa Interventoría considere pertinente emitir.

Cordialmente,

**JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ**  
Representante Legal  
CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS  
Contrato de Obra No 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025

BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

|                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    |                 |                                                                                                          |         |                                |              |                                |                      |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| CONTRATO DE OBRA No.: |                                                                                                                                                                           | 2325 DEL 2025                                                                                                                                                                                                                           |                           | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: |                 |                                                                                                          |         | 01 DE OCTUBRE DE 2025          |              |                                |                      |               |
| OBJETO:               |                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                           |                                    |                 |                                                                                                          |         |                                |              |                                |                      |               |
| CONTRATISTA:          |                                                                                                                                                                           | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                                |                           | NIT:                               |                 | 901.876.342-1                                                                                            |         |                                |              |                                |                      |               |
| RL:                   |                                                                                                                                                                           | JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ                                                                                                                                                                                                           |                           | C.C.:                              |                 | 1.006.501.403                                                                                            |         |                                |              |                                |                      |               |
| PLAZO:                |                                                                                                                                                                           | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                                                                           |                           | VALOR DEL CONTRATO:                |                 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$256.202.470) |         |                                |              |                                |                      |               |
| INTERVENTOR           |                                                                                                                                                                           | ALTING INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                   |                           | NIT:                               |                 | 900.815.455-0                                                                                            |         | CONTRATO DE INTERVENTOR IA N.: |              | 2326 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 |                      |               |
| FECHA DE INICIO:      |                                                                                                                                                                           | 21 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                 |                           | FECHA DE TERMINACIÓN:              |                 | 21 DE ENERO DE 2026                                                                                      |         |                                |              |                                |                      |               |
| FRETE DE TRABAJO:     |                                                                                                                                                                           | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           |                           | MUNICIPIO:                         |                 | MORELIA                                                                                                  |         |                                |              |                                |                      |               |
| ITEM                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | UNIDA D                                                                                                                                                                                                                                 | CONDICIONES CONTRACTUALES |                                    |                 | CANTIDADES                                                                                               |         |                                | VALORES      |                                | CANTIDAD ACTUALIZADA |               |
|                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | CANT                      | V/UNITARIO                         | V/TOTAL         | +/-                                                                                                      | MAY (+) | MEN (-)                        | MAY (+)      | MEN (-)                        | CANTIDAD             | SUBTOTAL      |
| 1                     | PRELIMINARES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    | 14,307,588.00   |                                                                                                          |         |                                | 206,583.00   | - 1,496,191.00                 |                      | 13,017,980.00 |
| 1.01                  | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE                                                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 85.62                     | \$ 71,271.00                       | \$ 6,102,223.00 | -                                                                                                        | -       | 12.07                          | -            | - 860,241.00                   | 73.55                | 5,241,982.00  |
| 1.02                  | DEMOLICION DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACION. INCLUYE RETIRO                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 77.59                     | \$ 28,500.00                       | \$ 2,211,315.00 | -                                                                                                        | -       | 9.50                           | -            | - 270,750.00                   | 68.09                | 1,940,565.00  |
| 1.03                  | DEMOLICION Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO.                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 79.43                     | \$ 30,000.00                       | \$ 2,382,900.00 | -                                                                                                        | -       | 11.34                          | -            | - 340,200.00                   | 68.09                | 2,042,700.00  |
| 1.04                  | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS                                                                                                                                             | UND                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00                     | \$ 25,000.00                       | \$ 250,000.00   | -                                                                                                        | -       | 1.00                           | -            | - 25,000.00                    | 9.00                 | 225,000.00    |
| 1.05                  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                              | UND                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00                      | \$ 35,000.00                       | \$ 70,000.00    | +                                                                                                        | 1.00    | -                              | 35,000.00    | -                              | 3.00                 | 105,000.00    |
| 1.06                  | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA. INCLUYE RETIRO                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 10.50                     | \$ 33,540.00                       | \$ 352,170.00   | +                                                                                                        | 4.08    | -                              | 136,843.00   | -                              | 14.58                | 489,013.00    |
| 1.07                  | DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO                                                                                                                         | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 1.44                      | \$ 38,500.00                       | \$ 55,440.00    | -                                                                                                        | -       | -                              | -            | -                              | 1.44                 | 55,440.00     |
| 1.08                  | DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 45.20                     | \$ 28,950.00                       | \$ 1,308,540.00 | +                                                                                                        | 1.20    | -                              | 34,740.00    | -                              | 46.40                | 1,343,280.00  |
| 1.09                  | DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERNA EXISTENTE                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 90.00                     | \$ 17,500.00                       | \$ 1,575,000.00 | -                                                                                                        | -       | -                              | -            | -                              | 90.00                | 1,575,000.00  |
| 2                     | CONCRETOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    | 15,156,261.00   |                                                                                                          |         |                                | 4,475,048.00 | - 159,575.00                   |                      | 19,471,733.00 |
| 2.01                  | PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm, ESPESOR 10 cm.                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 56.73                     | \$ 157,850.00                      | 8,954,831.00    | +                                                                                                        | 28.35   | -                              | 4,475,048.00 | -                              | 85.08                | 13,429,878.00 |
| 2.02                  | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 8 cm. Escobado y Ratoneado                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 45.08                     | \$ 137,565.00                      | 6,201,430.00    | -                                                                                                        | -       | 1.16                           | -            | - 159,575.00                   | 43.92                | 6,041,855.00  |
| 3                     | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    | 23,528,655.00   |                                                                                                          |         |                                | 3,823,169.00 | - 1,024,259.00                 |                      | 26,327,565.00 |
| 3.01                  | MURO EN BLOQUE No 4                                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 25.69                     | \$ 71,565.00                       | 1,838,505.00    | +                                                                                                        | 25.16   | -                              | 1,800,575.00 | -                              | 50.85                | 3,639,080.00  |
| 3.02                  | PAÑETE EN MOTERO 1:4                                                                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 124.23                    | \$ 45,000.00                       | 5,590,350.00    | +                                                                                                        | 29.25   | -                              | 1,316,250.00 | -                              | 153.48               | 6,906,600.00  |
| 3.03                  | ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO 25X30                                                                                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 25.95                     | \$ 105,245.00                      | 2,731,108.00    | +                                                                                                        | 0.80    | -                              | 84,196.00    | -                              | 26.75                | 2,815,304.00  |
| 3.04                  | ESTUCCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I                                                                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 135.82                    | \$ 27,850.00                       | 3,777,017.00    | -                                                                                                        | -       | 31.34                          | -            | - 872,819.00                   | 104.28               | 2,904,198.00  |
| 3.05                  | FRITICO Y PINTURA DE ALTA ADEPSIA 3 MANOS                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 98.01                     | \$ 38,000.00                       | 3,724,380.00    | -                                                                                                        | -       | 3.28                           | -            | - 124,640.00                   | 94.73                | 3,599,740.00  |
| 3.06                  | ESTUCCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS) 3 MANOS                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 20.52                     | \$ 33,500.00                       | 687,420.00      | -                                                                                                        | -       | 0.80                           | -            | - 26,800.00                    | 19.72                | 660,620.00    |
| 3.07                  | ESTUCCO EXTERIOR Y PINTURA TIPO KORAZA 3 MANOS                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 88.49                     | \$ 34,520.00                       | 3,054,675.00    | -                                                                                                        | 2.76    | -                              | 95,275.00    | -                              | 91.25                | 3,149,950.00  |
| 3.08                  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS LATERALES, HIDROFUGO O SIMILAR                                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 52.80                     | \$ 40,250.00                       | 2,125,200.00    | -                                                                                                        | 13.09   | -                              | 526,873.00   | -                              | 65.89                | 2,652,073.00  |
| 4                     | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    | 53,534,657.00   |                                                                                                          |         |                                | 5,961,404.00 | - 12,563,935.00                |                      | 46,932,126.00 |
| 4.01                  | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF. (PAG. C 120X60_ 1.9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER                                                       | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 185.40                    | \$ 142,850.00                      | 26,447,310.00   | -                                                                                                        | -       | 83.13                          | -            | - 11,858,495.00                | 102.27               | 14,588,816.00 |
| 4.02                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 113.30                    | \$ 137,565.00                      | 15,586,115.00   | -                                                                                                        | -       | 4.39                           | -            | - 603,910.00                   | 108.91               | 14,982,204.00 |
| 4.03                  | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA                                                                                                                                      | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 10.30                     | \$ 82,500.00                       | 849,750.00      | -                                                                                                        | -       | 0.22                           | -            | - 18,150.00                    | 10.08                | 831,600.00    |
| 4.04                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 20.60                     | \$ 189,500.00                      | 3,903,700.00    | -                                                                                                        | -       | 0.44                           | -            | - 83,380.00                    | 20.16                | 3,820,320.00  |
| 4.05                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"                                                                                                               | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 8.70                      | \$ 44,710.00                       | 388,977.00      | +                                                                                                        | 0.90    | -                              | 40,239.00    | -                              | 9.60                 | 429,216.00    |
| 4.06                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION)                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 48.82                     | \$ 130,250.00                      | 6,358,805.00    | -                                                                                                        | 45.46   | -                              | 5,921,165.00 | -                              | 94.28                | 12,279,970.00 |
| 5                     | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                    | 21,814,603.00   |                                                                                                          |         |                                | 1,569,855.00 | - 110,530.00                   |                      | 23,273,928.00 |
| 5.01                  | MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0.05 M                                                                                                                                  | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 79.47                     | \$ 94,500.00                       | 7,509,915.00    | +                                                                                                        | 1.63    | -                              | 154,035.00   | -                              | 81.10                | 7,663,950.00  |
| 5.02                  | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO MÍNIMO 40X40                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                      | 68.78                     | \$ 117,985.00                      | 8,115,008.00    | +                                                                                                        | 12.00   | -                              | 1,415,820.00 | -                              | 80.78                | 9,530,828.00  |
| 5.03                  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA                                                                                                                                                  | ML                                                                                                                                                                                                                                      | 78.40                     | \$ 78,950.00                       | 6,189,680.00    | -                                                                                                        | -       | 1.40                           | -            | - 110,530.00                   | 77.00                | 6,079,150.00  |



|       |                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |               |   |        |                |                |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------|---|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 6     | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                 | 29,170,915.00 |   |        | 2,180,800.00   | - 7,920,315.00 |        | 23,431,400.00 |
| 6.01  | PUERTA METALICA ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM.                                                         | M2  | 6.10   | \$ 1,160,000.00 | 7,076,000.00  | + | 1.88   | - 2,180,800.00 | -              | 7.98   | 9,256,800.00  |
| 6.02  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.                 | M2  | 10.64  | \$ 1,150,000.00 | 12,236,000.00 | - | - 3.51 | - 4,036,500.00 | -              | 7.13   | 8,199,500.00  |
| 6.03  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MARCO DE ALUMINIO CON TABLERO EN VIDRIO 4 MM, CON PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.                                                                      | M2  | 9.90   | \$ 995,850.00   | 9,858,915.00  | - | - 3.90 | - 3,883,815.00 | -              | 6.00   | 5,975,100.00  |
| 7     | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 | 15,528,435.00 |   |        | 1,170,000.00   | - 1,601,000.00 |        | 15,097,435.00 |
| 7.01  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP. INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2.40M.                                                           | UND | 1.00   | \$ 1,400,000.00 | 1,400,000.00  | - | -      | -              | -              | 1.00   | 1,400,000.00  |
| 7.02  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)                                                                                     | UND | 1.00   | \$ 1,200,000.00 | 1,200,000.00  | - | -      | -              | -              | 1.00   | 1,200,000.00  |
| 7.03  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.                                                                                   | UND | 18.00  | \$ 195,000.00   | 3,510,000.00  | + | 6.00   | - 1,170,000.00 | -              | 24.00  | 4,680,000.00  |
| 7.04  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)                                                                                    | UND | 22.00  | \$ 142,000.00   | 3,124,000.00  | - | - 8.00 | - 1,136,000.00 | -              | 14.00  | 1,988,000.00  |
| 7.05  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)                                                                                     | UND | 5.00   | \$ 155,000.00   | 775,000.00    | - | - 3.00 | - 465,000.00   | -              | 2.00   | 310,000.00    |
| 7.06  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.                                                                                                                                   | UND | 1.00   | \$ 895,000.00   | 895,000.00    | - | -      | -              | -              | 1.00   | 895,000.00    |
| 7.07  | ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERIA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS. | ML  | 67.51  | \$ 68,500.00    | 4,624,435.00  | - | -      | -              | -              | 67.51  | 4,624,435.00  |
| 8     | <b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS</b>                                                                                                                                                |     |        |                 | 10,388,700.00 |   |        | - 3,532,350.00 |                |        | 6,856,350.00  |
| 8.01  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.                                                                                   | ML  | 1.50   | \$ 1,325,000.00 | 1,987,500.00  | - | -      | -              | -              | 1.50   | 1,987,500.00  |
| 8.02  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA                                                                                                                                      | UND | 2.00   | \$ 895,000.00   | 1,790,000.00  | - | - 1.00 | - 895,000.00   | -              | 1.00   | 895,000.00    |
| 8.03  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                                                                             | UND | 3.00   | \$ 425,000.00   | 1,275,000.00  | - | -      | -              | -              | 3.00   | 1,275,000.00  |
| 8.04  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).                                                                                                              | UND | 2.00   | \$ 150,000.00   | 300,000.00    | - | - 1.00 | - 150,000.00   | -              | 1.00   | 150,000.00    |
| 8.05  | POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDIN.                                                                                                                                                           | UND | 1.00   | \$ 450,000.00   | 450,000.00    | - | - 1.00 | - 450,000.00   | -              | 0.00   | -             |
| 8.06  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"                                                                                                                                                                                  | UND | 11.00  | \$ 60,250.00    | 662,750.00    | - | - 4.00 | - 241,000.00   | -              | 7.00   | 421,750.00    |
| 8.07  | PUNTO SANITARIO DE 2"                                                                                                                                                                                     | UND | 8.00   | \$ 87,500.00    | 700,000.00    | - | - 1.00 | - 87,500.00    | -              | 7.00   | 612,500.00    |
| 8.08  | PUNTO SANITARIO DE 4"                                                                                                                                                                                     | UND | 2.00   | \$ 138,850.00   | 277,700.00    | - | - 1.00 | - 138,850.00   | -              | 1.00   | 138,850.00    |
| 8.09  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80 EN CONCRETO                                                                                                                                               | UND | 2.00   | \$ 785,000.00   | 1,570,000.00  | - | - 2.00 | - 1,570,000.00 | -              | 0.00   | -             |
| 8.10  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE                                                                                                                                 | UND | 1.00   | \$ 675,250.00   | 675,250.00    | - | -      | -              | -              | 1.00   | 675,250.00    |
| 8.11  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO                                                                                                                                                         | UND | 1.00   | \$ 700,500.00   | 700,500.00    | - | -      | -              | -              | 1.00   | 700,500.00    |
| 9     | <b>LIMPIEZA</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                 | 888,510.00    |   |        | -              | -              |        | 888,510.00    |
| 9.01  | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE                                                                                                                                                            | M2  | 84.62  | \$ 10,500.00    | 888,510.00    | - | -      | -              | -              | 84.62  | 888,510.00    |
|       | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | 36,900,600.00 |   |        | -              | -              |        | 36,900,600.00 |
| NP-01 | COLUMNA DE 0.20X0.10 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                     | ML  | 4.60   | 169,383.00      | 779,161.80    | - | -      | -              | -              | 4.60   | 779,161.80    |
| NP-02 | LOSA AEREA DE 0.10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                                       | M2  | 6.30   | 280,384.00      | 1,766,419.20  | - | -      | -              | -              | 6.30   | 1,766,419.20  |
| NP-03 | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.                                                                                | KG  | 427.53 | 24,549.00       | 10,495,433.97 | - | -      | -              | -              | 427.53 | 10,495,433.97 |
| NP-04 | VIGA AEREA DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                                                                                                | ML  | 10.12  | 222,452.00      | 2,251,214.24  | - | -      | -              | -              | 10.12  | 2,251,214.24  |
| NP-05 | ZAPATA DE 0.50X0.50m EN CONCRETO DE 3000 psi. NO incluye acero de refuerzo                                                                                                                                | UND | 1.00   | 398,456.00      | 398,456.00    | - | -      | -              | -              | 1.00   | 398,456.00    |



|                              |                                                                                                                                                                                                    |    |        |            |                       |   |   |   |               |                 |                   |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------------------|---|---|---|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| NP-06                        | VIGA CIMENTACIÓN DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO.                                                                                                   | ML | 5.21   | 222,452.00 | 1,158,974.92          | - | - | - | -             | -               | 5.21              | 1,158,974.92         |
| NP-07                        | PERFIL METALICO 100X100X2.80 mm PARA COLUMNA DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                             | ML | 10.77  | 143,461.00 | 1,545,074.97          | - | - | - | -             | -               | 10.77             | 1,545,074.97         |
| NP-08                        | PERFIL METALICO 100X100X2.50 mm PARA TEMPLETE DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                            | ML | 3.00   | 141,650.00 | 424,950.00            | - | - | - | -             | -               | 3.00              | 424,950.00           |
| NP-09                        | ESTRUCTURA PARA LUCETA DE VENTILACIÓN METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.0 X 0.3 ) M                                                        | M2 | 0.60   | 933,045.00 | 559,827.00            | - | - | - | -             | -               | 0.60              | 559,827.00           |
| NP-10                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4"                                                                                                                                                          | ML | 12.00  | 73,739.00  | 884,868.00            | - | - | - | -             | -               | 12.00             | 884,868.00           |
| NP-11                        | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.41 DE ANCHO, INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN.                                               | ML | 38.00  | 180,780.00 | 6,869,640.00          | - | - | - | -             | -               | 38.00             | 6,869,640.00         |
| NP-12                        | CUNETA RECTANGULAR DE CONCRETO DE 0.25 DE PROFUNDIDAD X 0.51 DE ANCHO, JUNTO CON REJILLA DE 0.35 EN ANGULO DE 1" /4. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 3.000PSI, ACABADO LISO Y JUNTA DE DILATACIÓN. | ML | 10.08  | 687,916.00 | 6,934,193.28          | - | - | - | -             | -               | 10.08             | 6,934,193.28         |
| NP-13                        | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1.00 m.                                                                                                                                              | M3 | 4.32   | 93,704.00  | 404,801.28            | - | - | - | -             | -               | 4.32              | 404,801.28           |
| NP-14                        | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.                              | M2 | 10.50  | 137,373.00 | 1,442,416.50          | - | - | - | -             | -               | 10.50             | 1,442,416.50         |
| NP-15                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRÍLICO CUYAS DIMENSIONES DEBEN TENER UNA RELACIÓN DE 1.00 DE ANCHO POR 1.50 DE ALTO.                                                         | M2 | 3.38   | 291,470.00 | 985,168.60            | - | - | - | -             | -               | 3.38              | 985,168.60           |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |                                                                                                                                                                                                    |    |        |            | <b>184,318,324.00</b> |   |   |   |               |                 |                   |                      |
|                              | <b>ADMINISTRACION</b>                                                                                                                                                                              |    | 33.00% |            | 60,825,047.00         |   |   |   | 19,386,858.00 | - 28,408,155.00 | % EJE             | 212,197,627.00       |
|                              | <b>IMPREVISTOS</b>                                                                                                                                                                                 |    | 1.00%  |            | 1,843,183.00          |   |   |   | 6,397,663.00  | - 9,374,691.00  |                   | 70,025,220.00        |
|                              | <b>UTILIDAD</b>                                                                                                                                                                                    |    | 5.00%  |            | 9,215,916.00          |   |   |   | 193,869.00    | - 284,082.00    |                   | 2,121,976.00         |
| <b>TOTAL OBRA</b>            |                                                                                                                                                                                                    |    |        |            | <b>256,202,470.00</b> |   |   |   | 26,947,733.00 | - 39,487,336.00 | 115.13%           | 294,954,704.00       |
|                              |                                                                                                                                                                                                    |    |        |            |                       |   |   |   |               |                 | <b>DIFERENCIA</b> | <b>38,752,234.00</b> |

La presente se firma por los que en ella intervienen, en el municipio de Florencia, a los QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2026.

CONTRATISTA:

JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ

1.006.501.403

Representante Legal

CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORIA

ROSA COTAMO VALERO


C.C.1.049.602.099

R.L. ALTING INGENIERIA SAS

Contrato Interventoria No 2326 del 01 de Octubre de 2025



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----|------|----|-----|------|-----------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NP1                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha:            | 15/1/2026 |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| COLUMNA DE 0,20X0,10 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :          | ML        |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 79,153.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 7,915.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.12</td> <td>\$ 7,800.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 19,715.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 79,153.00  | 10%   | \$ 7,915.30  | 3   | Vibrador de concreto       | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.12  | \$ 7,800.00  | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00  |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      | \$ 19,715.00 |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 79,153.00      | 10%       | \$ 7,915.30          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.12      | \$ 7,800.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00      | 0.05      | \$ 4,000.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 19,715.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>7.88</td> <td>\$ 5,906.25</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1 1/3</td> <td>\$ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.01</td> <td>\$ 1,270.50</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>3.40</td> <td>\$ 510.00</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.02</td> <td>\$ 3,528.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.25</td> <td>\$ 800.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>1.00</td> <td>\$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 54,014.75</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 92  | Cemento gris                               | KG     | 750           | 7.88  | \$ 5,906.25  | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und           | 24,000       | 1 1/3 | \$ 32,000.00 | 93 | Arena Gruesa/Fina      | M3            | 110,000      | 0.01 | \$ 1,270.50  | 94 | Agua | LT | 150 | 3.40 | \$ 510.00 | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.02 | \$ 3,528.00  | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.00 | \$ 10,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 54,014.75 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750               | 7.88      | \$ 5,906.25          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000            | 1 1/3     | \$ 32,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000           | 0.01      | \$ 1,270.50          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150               | 3.40      | \$ 510.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000           | 0.02      | \$ 3,528.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200             | 0.25      | \$ 800.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000            | 1.00      | \$ 10,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 54,014.75         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>0.170</td> <td>\$ 79,153.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 79,153.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)        | Dia    | \$ 465,960.60 | 0.170 | \$ 79,153.28 |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      | \$ 79,153.00 |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60     | 0.170     | \$ 79,153.28         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 79,153.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00 |     |                            |               |              |       | \$ -         |    |                        |               |              |      | \$ 16,500.00 |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.110     | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | <b>\$ 169,383.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |

| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|----------|--|--|--|--|--|----|-------------|------|-------------|-------|------------|----|-------------------|--------|---------------|-----|--------------|---|----------------------|---------------|--------------|------|-------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|-------------|---|---------------------------|---------------|-------------|------|-------------|----|----------------------------|---------------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|------------|-------|------------|----|--------------|----|-----|-------|--------------|-----|----------------------------|-----|--------|-------|--------------|----|-------------------|----|---------|------|-------------|----|------|----|-----|-------|-------------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---------------|------------------|--|--|--|--|--|----|-----------|--------|------------|-------|------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------|-------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|--|----|------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NP2                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha: 15/1/2026  |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO . INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad : M2       |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">I EQUIPO</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Tipo</th> <th>Tarifa/hora</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 121,150.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 12,115.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.10</td> <td>\$ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Andamio tubular 1,50x1,50</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 4,500.00</td> <td>2.00</td> <td>\$ 9,000.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Formaleta Madera- Camillas</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 5,000.00</td> <td>1.80</td> <td>\$ 9,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 40,615.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">II MATERIALES EN OBRA</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Unidad</th> <th>Prec.Unit.</th> <th>Cant.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>39.38</td> <td>\$ 29,531.25</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1 1/3</td> <td>\$ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.06</td> <td>\$ 6,352.50</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>15.30</td> <td>\$ 2,295.00</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.09</td> <td>\$ 17,640.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.25</td> <td>\$ 800.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>1.50</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 103,618.75</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">III MANO DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Cuadrilla</th> <th>Unidad</th> <th>Jorn.Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>0.260</td> <td>\$ 121,149.76</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 121,150.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">IV Transportes</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Tipo</th> <th>Unidad</th> <th>Viaje Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.100</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      | I EQUIPO |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14 | Herramienta menor | Manual | \$ 121,150.00 | 10% | \$ 12,115.00 | 3 | Vibrador de concreto | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10 | \$ 6,500.00 | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00 | 2 | Andamio tubular 1,50x1,50 | Alquiler- Dia | \$ 4,500.00 | 2.00 | \$ 9,000.00 | 10 | Formaleta Madera- Camillas | Alquiler- Dia | \$ 5,000.00 | 1.80 | \$ 9,000.00 |  |  |  |  |  | \$ 40,615.00 | II MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit. | Cant. | V.Unitario | 92 | Cemento gris | KG | 750 | 39.38 | \$ 29,531.25 | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und | 24,000 | 1 1/3 | \$ 32,000.00 | 93 | Arena Gruesa/Fina | M3 | 110,000 | 0.06 | \$ 6,352.50 | 94 | Agua | LT | 150 | 15.30 | \$ 2,295.00 | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.09 | \$ 17,640.00 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.50 | \$ 15,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 103,618.75 | III MANO DE OBRA |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla | Unidad | Jorn.Total | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería) | Dia | \$ 465,960.60 | 0.260 | \$ 121,149.76 |  |  |  |  |  | \$ 121,150.00 | IV Transportes |  |  |  |  |  | id | Tipo | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00 | 0.100 | \$ 15,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 15,000.00 |
| I EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend. | V.Unitario           |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 121,150.00     | 10%   | \$ 12,115.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.10  | \$ 6,500.00          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00      | 0.05  | \$ 4,000.00          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andamio tubular 1,50x1,50                                                                                                                                                                                                              | Alquiler- Dia | \$ 4,500.00       | 2.00  | \$ 9,000.00          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formaleta Madera- Camillas                                                                                                                                                                                                             | Alquiler- Dia | \$ 5,000.00       | 1.80  | \$ 9,000.00          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ 40,615.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| II MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant. | V.Unitario           |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750               | 39.38 | \$ 29,531.25         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000            | 1 1/3 | \$ 32,000.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000           | 0.06  | \$ 6,352.50          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150               | 15.30 | \$ 2,295.00          |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000           | 0.09  | \$ 17,640.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200             | 0.25  | \$ 800.00            |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000            | 1.50  | \$ 15,000.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ -                 |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ -                 |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ 103,618.75        |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend. | V.Unitario           |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60     | 0.260 | \$ 121,149.76        |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ 121,150.00        |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend. | V.Unitario           |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.100 | \$ 15,000.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ -                 |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | \$ 15,000.00         |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       | <b>\$ 280,384.00</b> |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL/CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |       |                      |          |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |                  |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------------|-----|---------------|----|-------|------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |          | NIT.901.876.342-1 |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NP3                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha:   | 15/1/2026         |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad : | KG                |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>I EQUIPO</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 9,000.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 900.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 900.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     | <b>I EQUIPO</b>              |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                                | Manual | \$ 9,000.00   | 10%   | \$ 900.00   |     |               |    |       |      | \$ -        |  |  |  |  |  | \$ -        |  |  |  |  |  | \$ 900.00 |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>I EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo     | Tarifa/hora       | Rend. | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual   | \$ 9,000.00       | 10%   | \$ 900.00           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ 900.00           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>II MATERIALES EN OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>138</td> <td>Varilla Corrugada</td> <td>kg</td> <td>8,925</td> <td>1.00</td> <td>\$ 8,925.00</td> </tr> <tr> <td>139</td> <td>Alambre Negro</td> <td>kg</td> <td>9,600</td> <td>0.15</td> <td>\$ 1,440.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 10,365.00</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     | <b>II MATERIALES EN OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 138 | Varilla Corrugada                                | kg     | 8,925         | 1.00  | \$ 8,925.00 | 139 | Alambre Negro | kg | 9,600 | 0.15 | \$ 1,440.00 |  |  |  |  |  | \$ -        |  |  |  |  |  | \$ -      |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 10,365.00 |
| <b>II MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad   | Prec.Unit.        | Cant. | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Varilla Corrugada                                                                                                                                                                                                                      | kg       | 8,925             | 1.00  | \$ 8,925.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alambre Negro                                                                                                                                                                                                                          | kg       | 9,600             | 0.15  | \$ 1,440.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ 10,365.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>III MANO DE OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>Cuadrilla BB (Albañilería)<br/>1 Of y 1 Ay</td> <td>Dia</td> <td>\$ 329,520.60</td> <td>0.013</td> <td>\$ 4,283.77</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 4,284.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     | <b>III MANO DE OBRA</b>      |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 007 | Cuadrilla BB (Albañilería)<br>1 Of y 1 Ay        | Dia    | \$ 329,520.60 | 0.013 | \$ 4,283.77 |     |               |    |       |      | \$ 4,284.00 |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>III MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad   | Jorn.Total        | Rend. | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla BB (Albañilería)<br>1 Of y 1 Ay                                                                                                                                                                                              | Dia      | \$ 329,520.60     | 0.013 | \$ 4,283.77         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ 4,284.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>IV Transportes</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE<br/>FLORENCIA - VEREDA<br/>AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.060</td> <td>\$ 9,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 9,000.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     | <b>IV Transportes</b>        |  |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE<br>FLORENCIA - VEREDA<br>AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.060 | \$ 9,000.00 |     |               |    |       |      | \$ -        |  |  |  |  |  | \$ 9,000.00 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>IV Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad   | Viaje Total       | Rend. | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TERRESTRE<br>FLORENCIA - VEREDA<br>AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                       | VJ/TON   | 150,000.00        | 0.060 | \$ 9,000.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | \$ 9,000.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       | <b>\$ 24,549.00</b> |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <p style="text-align: center;"> <br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1 </p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |       |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                                  |        |               |       |             |     |               |    |       |      |             |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----|---------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|----------------------------|---------------|-------------|------|-------------|---|------------------------|----|-------|------|--------------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP4                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha:            | 15/1/2026 |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| VIGA AEREA DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI.<br>INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :          | ML        |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td><td colspan="5">EQUIPO</td></tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Tipo</td><td>Tarifa/hora</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Herramienta menor</td><td>Manual</td><td>\$ 116,420.00</td><td>10%</td><td>\$ 11,642.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vibrador de concreto</td><td>Alquiler- Dia</td><td>\$ 65,000.00</td><td>0.10</td><td>\$ 6,500.00</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Mezcladora de concreto</td><td>Alquiler- Dia</td><td>\$ 80,000.00</td><td>0.05</td><td>\$ 4,000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Andamio tubular 1.50x1.50</td><td>Alquiler- Dia</td><td>\$ 4,500.00</td><td>0.75</td><td>\$ 3,375.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Formaleta Madera- Camillas</td><td>Alquiler- Dia</td><td>\$ 5,000.00</td><td>1.00</td><td>\$ 5,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ 30,517.00</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 116,420.00 | 10%   | \$ 11,642.00  | 3   | Vibrador de concreto       | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10  | \$ 6,500.00   | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00  | 2  | Andamio tubular 1.50x1.50 | Alquiler- Dia | \$ 4,500.00 | 0.75 | \$ 3,375.00 | 10  | Formaleta Madera- Camillas | Alquiler- Dia | \$ 5,000.00 | 1.00 | \$ 5,000.00 |   |                        |    |       |      | \$ 30,517.00 |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 116,420.00     | 10%       | \$ 11,642.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.10      | \$ 6,500.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00      | 0.05      | \$ 4,000.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Andamio tubular 1.50x1.50                                                                                                                                                                                                              | Alquiler- Dia | \$ 4,500.00       | 0.75      | \$ 3,375.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formaleta Madera- Camillas                                                                                                                                                                                                             | Alquiler- Dia | \$ 5,000.00       | 1.00      | \$ 5,000.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 30,517.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td><td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td></tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Unidad</td><td>Prec.Unit.</td><td>Cant.</td><td>V.Unitario</td></tr> <tr> <td>92</td><td>Cemento gris</td><td>KG</td><td>750</td><td>7.88</td><td>\$ 5,906.25</td></tr> <tr> <td>140</td><td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td><td>und</td><td>24,000</td><td>1 1/3</td><td>\$ 32,000.00</td></tr> <tr> <td>93</td><td>Arena Gruesa/Fina</td><td>M3</td><td>110,000</td><td>0.01</td><td>\$ 1,270.50</td></tr> <tr> <td>94</td><td>Agua</td><td>LT</td><td>150</td><td>3.40</td><td>\$ 510.00</td></tr> <tr> <td>137</td><td>Gravilla 3/4"</td><td>m3</td><td>200,000</td><td>0.02</td><td>\$ 3,528.00</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Puntilla con cabeza 2"</td><td>Lb</td><td>3,200</td><td>0.25</td><td>\$ 800.00</td></tr> <tr> <td>135</td><td>VARILLON MADERA 5.0</td><td>UND</td><td>10,000</td><td>1.50</td><td>\$ 15,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ -</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ -</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ 59,014.75</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 92  | Cemento gris                               | KG     | 750           | 7.88  | \$ 5,906.25   | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und           | 24,000       | 1 1/3 | \$ 32,000.00  | 93 | Arena Gruesa/Fina      | M3            | 110,000      | 0.01 | \$ 1,270.50  | 94 | Agua                      | LT            | 150         | 3.40 | \$ 510.00   | 137 | Gravilla 3/4"              | m3            | 200,000     | 0.02 | \$ 3,528.00 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00    | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.50 | \$ 15,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 59,014.75 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750               | 7.88      | \$ 5,906.25          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000            | 1 1/3     | \$ 32,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000           | 0.01      | \$ 1,270.50          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150               | 3.40      | \$ 510.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000           | 0.02      | \$ 3,528.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200             | 0.25      | \$ 800.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000            | 1.50      | \$ 15,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 59,014.75         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td><td colspan="5">MANO DE OBRA</td></tr> <tr> <td>id</td><td>Cuadrilla</td><td>Unidad</td><td>Jorn.Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td></tr> <tr> <td>005</td><td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td><td>Dia</td><td>\$ 465,960.60</td><td>0.250</td><td>\$ 116,420.13</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ 116,420.00</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)        | Dia    | \$ 465,960.60 | 0.250 | \$ 116,420.13 |     |                            |               |              |       | \$ 116,420.00 |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60     | 0.250     | \$ 116,420.13        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 116,420.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td><td colspan="5">Transportes</td></tr> <tr> <td>id</td><td>Tipo</td><td>Unidad</td><td>Viaje Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td></tr> <tr> <td>TR5</td><td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td><td>VJ/TON</td><td>150,000.00</td><td>0.110</td><td>\$ 16,500.00</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ -</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>\$ 16,500.00</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00  |     |                            |               |              |       | \$ -          |    |                        |               |              |      | \$ 16,500.00 |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.110     | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | <b>\$ 222,452.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <p style="text-align: center;"> <br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1 </p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |                           |               |             |      |             |     |                            |               |             |      |             |   |                        |    |       |      |              |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|------|---------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----|------|----|-----|-------|--------------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|-------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NP5                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha:            | 15/1/2026 |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| ZAPATA DE 0,50X0,50m EN CONCRETO DE 3000 psi, NO incluye acero de refuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :          | ML        | UND               |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 232,980.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 23,298.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.10</td> <td>\$ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 33,798.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 232,980.00 | 10%   | \$ 23,298.00  | 3   | Vibrador de concreto       | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10 | \$ 6,500.00   | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00  |    |      |    |     |       | \$ 33,798.00 |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 232,980.00     | 10%       | \$ 23,298.00      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.10      | \$ 6,500.00       |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00      | 0.05      | \$ 4,000.00       |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 33,798.00      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>49.22</td> <td>\$ 36,914.06</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1.67</td> <td>\$ 40,080.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.07</td> <td>\$ 7,940.63</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>21.25</td> <td>\$ 3,187.50</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.11</td> <td>\$ 22,050.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.15</td> <td>\$ 480.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>0.50</td> <td>\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 115,652.19</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 92  | Cemento gris                               | KG     | 750           | 49.22 | \$ 36,914.06  | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und           | 24,000       | 1.67 | \$ 40,080.00  | 93 | Arena Gruesa/Fina      | M3            | 110,000      | 0.07 | \$ 7,940.63  | 94 | Agua | LT | 150 | 21.25 | \$ 3,187.50  | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.11 | \$ 22,050.00 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.15 | \$ 480.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 0.50 | \$ 5,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 115,652.19 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750               | 49.22     | \$ 36,914.06      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000            | 1.67      | \$ 40,080.00      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000           | 0.07      | \$ 7,940.63       |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150               | 21.25     | \$ 3,187.50       |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000           | 0.11      | \$ 22,050.00      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200             | 0.15      | \$ 480.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000            | 0.50      | \$ 5,000.00       |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -              |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -              |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 115,652.19     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>0.500</td> <td>\$ 232,980.30</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 232,980.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)        | Dia    | \$ 465,960.60 | 0.500 | \$ 232,980.30 |     |                            |               |              |      | \$ 232,980.00 |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60     | 0.500     | \$ 232,980.30     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 232,980.00     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.107</td> <td>\$ 16,025.46</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,025.46</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.107 | \$ 16,025.46  |     |                            |               |              |      | \$ -          |    |                        |               |              |      | \$ 16,025.46 |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.107     | \$ 16,025.46      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -              |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 16,025.46      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | <b>\$ 398,456</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <p><br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1</p> <p><br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |      |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|----|-------------|------|-------------|-------|------------|----|-------------------|--------|---------------|-----|--------------|---|----------------------|---------------|--------------|------|-------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|-------------|---|---------------------------|---------------|-------------|------|-------------|----|----------------------------|---------------|-------------|------|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|------------|-------|------------|----|--------------|----|-----|------|-------------|-----|----------------------------|-----|--------|-------|--------------|----|-------------------|----|---------|------|-------------|----|------|----|-----|------|-----------|-----|---------------|----|---------|------|-------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------|--|--|--|--|--|----|-----------|--------|------------|-------|------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------|-------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | NP6                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha: 15/1/2026  |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| VIGA CIMENTACIÓN DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Unidad :                                                                                                                                                                                                                               |               | ML                |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>I EQUIPO</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 116,420.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 11,642.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.10</td> <td>\$ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Andamio tubular 1.50x1.50</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 4,500.00</td> <td>0.75</td> <td>\$ 3,375.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Formaleta Madera- Camillas</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 5,000.00</td> <td>1.00</td> <td>\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 30,517.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>II MATERIALES EN OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>7.88</td> <td>\$ 5,906.25</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1 1/3</td> <td>\$ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.01</td> <td>\$ 1,270.50</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>3.40</td> <td>\$ 510.00</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.02</td> <td>\$ 3,528.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.25</td> <td>\$ 800.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>1.50</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 59,014.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>III MANO DE OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>0.250</td> <td>\$ 116,420.13</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 116,420.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>IV Transportes</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b></td> <td><b>\$ 222,452.00</b></td> </tr> </table> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      | <b>I EQUIPO</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14 | Herramienta menor | Manual | \$ 116,420.00 | 10% | \$ 11,642.00 | 3 | Vibrador de concreto | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10 | \$ 6,500.00 | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00 | 2 | Andamio tubular 1.50x1.50 | Alquiler- Dia | \$ 4,500.00 | 0.75 | \$ 3,375.00 | 10 | Formaleta Madera- Camillas | Alquiler- Dia | \$ 5,000.00 | 1.00 | \$ 5,000.00 |  |  |  |  |  | \$ 30,517.00 | <b>II MATERIALES EN OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit. | Cant. | V.Unitario | 92 | Cemento gris | KG | 750 | 7.88 | \$ 5,906.25 | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und | 24,000 | 1 1/3 | \$ 32,000.00 | 93 | Arena Gruesa/Fina | M3 | 110,000 | 0.01 | \$ 1,270.50 | 94 | Agua | LT | 150 | 3.40 | \$ 510.00 | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.02 | \$ 3,528.00 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.50 | \$ 15,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 59,014.75 | <b>III MANO DE OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla | Unidad | Jorn.Total | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería) | Dia | \$ 465,960.60 | 0.250 | \$ 116,420.13 |  |  |  |  |  | \$ 116,420.00 | <b>IV Transportes</b> |  |  |  |  |  | id | Tipo | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00 | 0.110 | \$ 16,500.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 16,500.00 | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |  |  |  |  | <b>\$ 222,452.00</b> |
| <b>I EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Tarifa/hora   | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herramienta menor                          | Manual                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 116,420.00 | 10%               | \$ 11,642.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vibrador de concreto                       | Alquiler- Dia                                                                                                                                                                                                                          | \$ 65,000.00  | 0.10              | \$ 6,500.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mezcladora de concreto                     | Alquiler- Dia                                                                                                                                                                                                                          | \$ 80,000.00  | 0.05              | \$ 4,000.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Andamio tubular 1.50x1.50                  | Alquiler- Dia                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4,500.00   | 0.75              | \$ 3,375.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formaleta Madera- Camillas                 | Alquiler- Dia                                                                                                                                                                                                                          | \$ 5,000.00   | 1.00              | \$ 5,000.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ 30,517.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>II MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                | Unidad                                                                                                                                                                                                                                 | Prec.Unit.    | Cant.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cemento gris                               | KG                                                                                                                                                                                                                                     | 750           | 7.88              | \$ 5,906.25          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                 | und                                                                                                                                                                                                                                    | 24,000        | 1 1/3             | \$ 32,000.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arena Gruesa/Fina                          | M3                                                                                                                                                                                                                                     | 110,000       | 0.01              | \$ 1,270.50          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agua                                       | LT                                                                                                                                                                                                                                     | 150           | 3.40              | \$ 510.00            |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gravilla 3/4"                              | m3                                                                                                                                                                                                                                     | 200,000       | 0.02              | \$ 3,528.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puntilla con cabeza 2"                     | Lb                                                                                                                                                                                                                                     | 3,200         | 0.25              | \$ 800.00            |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VARILLON MADERA 5.0                        | UND                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000        | 1.50              | \$ 15,000.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ 59,014.75         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>III MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuadrilla                                  | Unidad                                                                                                                                                                                                                                 | Jorn.Total    | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)        | Dia                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 465,960.60 | 0.250             | \$ 116,420.13        |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ 116,420.00        |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>IV Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                       | Unidad                                                                                                                                                                                                                                 | Viaje Total   | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON                                                                                                                                                                                                                                 | 150,000.00    | 0.110             | \$ 16,500.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | \$ 16,500.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | <b>\$ 222,452.00</b> |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <p><br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/>         RL CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/>         NIT. 901.876.342-1</p> <p><br/> <b>ROSA CEBALLOS V.</b><br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/>         ALING INGENIERIA SAS<br/>         NIT. 900.815.455-0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |               |     |              |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |   |                           |               |             |      |             |    |                            |               |             |      |             |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |      |             |     |                            |     |        |       |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |      |           |     |               |    |         |      |             |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                     |     |               |       |               |  |  |  |  |  |               |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |




| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|-----|---------------------|---------------|--------------|------|--------------|-----|---------------------------|----------------|-------------|------|--------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|-----|-----------------|-------|---------|------|--------------|-----|---------|-------|--------|------|-------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |                | NIT.901.876.342-1 |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No. NP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Fecha: 15/1/2026  |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| PERFIL METALICO 100X100X2,80 mm PARA COLUMNA DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Unidad : ML       |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>I</th> <th colspan="5">EQUIPO</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Tipo</th> <th>Tarifa/hora</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 39,542.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 3,954.20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Equipo de Soldadura</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.07</td> <td>\$ 4,550.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Andamio tubular 1,50x1,50</td> <td>Alquiler - Día</td> <td>\$ 4,500.00</td> <td>0.25</td> <td>\$ 1,125.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Compresor- Pistola Pintura</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 45,000.00</td> <td>0.065</td> <td>\$ 2,925.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 12,554.00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 39,542.00  | 10%   | \$ 3,954.20  | 6   | Equipo de Soldadura | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.07 | \$ 4,550.00  | 2   | Andamio tubular 1,50x1,50 | Alquiler - Día | \$ 4,500.00 | 0.25 | \$ 1,125.00  | 12  | Compresor- Pistola Pintura | Alquiler- Dia | \$ 45,000.00 | 0.065 | \$ 2,925.00  |     |                 |       |         |      | \$ 12,554.00 |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo           | Tarifa/hora       | Rend. | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual         | \$ 39,542.00      | 10%   | \$ 3,954.20          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Equipo de Soldadura                                                                                                                                                                                                                    | Alquiler- Dia  | \$ 65,000.00      | 0.07  | \$ 4,550.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andamio tubular 1,50x1,50                                                                                                                                                                                                              | Alquiler - Día | \$ 4,500.00       | 0.25  | \$ 1,125.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compresor- Pistola Pintura                                                                                                                                                                                                             | Alquiler- Dia  | \$ 45,000.00      | 0.065 | \$ 2,925.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 12,554.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>II</th> <th colspan="5">MATERIALES EN OBRA</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Unidad</th> <th>Prec.Unit.</th> <th>Cant.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151</td> <td>Soldadura</td> <td>kg</td> <td>37,125</td> <td>0.15</td> <td>\$ 5,568.75</td> </tr> <tr> <td>147</td> <td>Lija</td> <td>und</td> <td>3,500</td> <td>1.50</td> <td>\$ 5,250.00</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>Pintura Esmalte</td> <td>galon</td> <td>84,000</td> <td>0.10</td> <td>\$ 8,400.00</td> </tr> <tr> <td>229</td> <td>PERFIL CUADRADO</td> <td>ml</td> <td>48,570</td> <td>1.00</td> <td>\$ 48,570.00</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>Cromato de Zinc</td> <td>galon</td> <td>139,400</td> <td>0.04</td> <td>\$ 5,576.00</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>Thinner</td> <td>Galon</td> <td>30,000</td> <td>0.05</td> <td>\$ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 74,864.75</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 151 | Soldadura                                  | kg     | 37,125        | 0.15  | \$ 5,568.75  | 147 | Lija                | und           | 3,500        | 1.50 | \$ 5,250.00  | 152 | Pintura Esmalte           | galon          | 84,000      | 0.10 | \$ 8,400.00  | 229 | PERFIL CUADRADO            | ml            | 48,570       | 1.00  | \$ 48,570.00 | 153 | Cromato de Zinc | galon | 139,400 | 0.04 | \$ 5,576.00  | 176 | Thinner | Galon | 30,000 | 0.05 | \$ 1,500.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 74,864.75 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad         | Prec.Unit.        | Cant. | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soldadura                                                                                                                                                                                                                              | kg             | 37,125            | 0.15  | \$ 5,568.75          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lija                                                                                                                                                                                                                                   | und            | 3,500             | 1.50  | \$ 5,250.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pintura Esmalte                                                                                                                                                                                                                        | galon          | 84,000            | 0.10  | \$ 8,400.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERFIL CUADRADO                                                                                                                                                                                                                        | ml             | 48,570            | 1.00  | \$ 48,570.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cromato de Zinc                                                                                                                                                                                                                        | galon          | 139,400           | 0.04  | \$ 5,576.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thinner                                                                                                                                                                                                                                | Galon          | 30,000            | 0.05  | \$ 1,500.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 74,864.75         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>III</th> <th colspan="5">MANO DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Cuadrilla</th> <th>Unidad</th> <th>Jorn.Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>Cuadrilla Instalación</td> <td>Dia</td> <td>\$ 329,520.60</td> <td>0.120</td> <td>\$ 39,542.47</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 39,542.00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 12  | Cuadrilla Instalación                      | Dia    | \$ 329,520.60 | 0.120 | \$ 39,542.47 |     |                     |               |              |      | \$ 39,542.00 |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad         | Jorn.Total        | Rend. | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cuadrilla Instalación                                                                                                                                                                                                                  | Dia            | \$ 329,520.60     | 0.120 | \$ 39,542.47         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 39,542.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>IV</th> <th colspan="5">Transportes</th> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Tipo</th> <th>Unidad</th> <th>Viaje Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00 |     |                     |               |              |      | \$ -         |     |                           |                |             |      | \$ 16,500.00 |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad         | Viaje Total       | Rend. | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON         | 150,000.00        | 0.110 | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | <b>\$ 143,461.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <p> <br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1 </p> <p> <br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORÍA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                     |               |              |      |              |     |                           |                |             |      |              |     |                            |               |              |       |              |     |                 |       |         |      |              |     |         |       |        |      |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |


|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                        | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |                |                   |       |                      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                |                   |       |                      |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |                | NIT.901.876.342-1 |       |                      |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |
| ITEM No. NP8                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Fecha: 15/1/2026  |       |                      |
| PERFIL METALICO 100X100X2,80 mm PARA TEMPLETE DE CUBIERTAS. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Unidad : ML       |       |                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |
| I                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |       |                      |
| id                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo           | Tarifa/hora       | Rend. | V.Unitario           |
| 14                                                                                                                                                                                                | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual         | \$ 37,895.00      | 10%   | \$ 3,789.50          |
| 6                                                                                                                                                                                                 | Equipo de Soldadura                                                                                                                                                                                                                    | Alquiler- Dia  | \$ 65,000.00      | 0.07  | \$ 4,550.00          |
| 2                                                                                                                                                                                                 | Andamio tubular 1,50x1,50                                                                                                                                                                                                              | Alquiler - Dia | \$ 4,500.00       | 0.25  | \$ 1,125.00          |
| 12                                                                                                                                                                                                | Compresor- Pistola Pintura                                                                                                                                                                                                             | Alquiler- Dia  | \$ 45,000.00      | 0.065 | \$ 2,925.00          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 12,390.00         |
| II                                                                                                                                                                                                | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |       |                      |
| id                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad         | Prec.Unit.        | Cant. | V.Unitario           |
| 151                                                                                                                                                                                               | Soldadura                                                                                                                                                                                                                              | kg             | 37,125            | 0.15  | \$ 5,568.75          |
| 147                                                                                                                                                                                               | Lija                                                                                                                                                                                                                                   | und            | 3,500             | 1.50  | \$ 5,250.00          |
| 152                                                                                                                                                                                               | Pintura Esmalte                                                                                                                                                                                                                        | galon          | 84,000            | 0.10  | \$ 8,400.00          |
| 229                                                                                                                                                                                               | PERFIL CUADRADO                                                                                                                                                                                                                        | ml             | 48,570            | 1.00  | \$ 48,570.00         |
| 153                                                                                                                                                                                               | Cromato de Zinc                                                                                                                                                                                                                        | galon          | 139,400           | 0.04  | \$ 5,576.00          |
| 176                                                                                                                                                                                               | Thinner                                                                                                                                                                                                                                | Galon          | 30,000            | 0.05  | \$ 1,500.00          |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 74,864.75         |
| III                                                                                                                                                                                               | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |       |                      |
| id                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad         | Jorn.Total        | Rend. | V.Unitario           |
| 12                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla Instalación                                                                                                                                                                                                                  | Dia            | \$ 329,520.60     | 0.115 | \$ 37,894.87         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 37,895.00         |
| IV                                                                                                                                                                                                | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |       |                      |
| id                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad         | Viaje Total       | Rend. | V.Unitario           |
| TR5                                                                                                                                                                                               | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON         | 150,000.00        | 0.110 | \$ 16,500.00         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ -                 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | \$ 16,500.00         |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       | <b>\$ 141,650.00</b> |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1 |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |
| <br><b>ROSA CATHERINE V.</b><br><b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0  |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |       |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|------|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-----|---------------------|---------------|--------------|------|---------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|------|--------------|-----|---------|-------|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NP9                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha:            | 15/1/2026 |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| ESTRUCTURA PARA LUCETA DE VENTILACIÓN METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. (1.0 X 0.3 ) M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :          | M2        |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 172,561.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 17,256.10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Equipo de Soldadura</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.15</td> <td>\$ 9,750.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Compresor- Pistola Pintura</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 45,000.00</td> <td>0.35</td> <td>\$ 15,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 42,756.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14   | Herramienta menor                          | Manual | \$ 172,561.00 | 10%   | \$ 17,256.10  | 6   | Equipo de Soldadura | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.15 | \$ 9,750.00   | 12  | Compresor- Pistola Pintura | Alquiler- Dia | \$ 45,000.00 | 0.35 | \$ 15,750.00 |     |         |       |        |      | \$ 42,756.00 |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 172,561.00     | 10%       | \$ 17,256.10         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Equipo de Soldadura                                                                                                                                                                                                                    | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.15      | \$ 9,750.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compresor- Pistola Pintura                                                                                                                                                                                                             | Alquiler- Dia | \$ 45,000.00      | 0.35      | \$ 15,750.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 42,756.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>196</td> <td>Ventana en Lamina Galvani</td> <td>m2</td> <td>650,000</td> <td>1.00</td> <td>\$ 650,000.00</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>Pintura Esmalte</td> <td>galon</td> <td>84,000</td> <td>0.35</td> <td>\$ 29,400.00</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>Cromato de Zinc</td> <td>galon</td> <td>139,400</td> <td>0.12</td> <td>\$ 16,728.00</td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>Thinner</td> <td>Galon</td> <td>30,000</td> <td>0.12</td> <td>\$ 3,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 699,728.00</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 196  | Ventana en Lamina Galvani                  | m2     | 650,000       | 1.00  | \$ 650,000.00 | 152 | Pintura Esmalte     | galon         | 84,000       | 0.35 | \$ 29,400.00  | 153 | Cromato de Zinc            | galon         | 139,400      | 0.12 | \$ 16,728.00 | 176 | Thinner | Galon | 30,000 | 0.12 | \$ 3,600.00  |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 699,728.00 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ventana en Lamina Galvani                                                                                                                                                                                                              | m2            | 650,000           | 1.00      | \$ 650,000.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pintura Esmalte                                                                                                                                                                                                                        | galon         | 84,000            | 0.35      | \$ 29,400.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cromato de Zinc                                                                                                                                                                                                                        | galon         | 139,400           | 0.12      | \$ 16,728.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thinner                                                                                                                                                                                                                                | Galon         | 30,000            | 0.12      | \$ 3,600.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 699,728.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>0.13</td> <td>Cuadrilla Instalación 1 Of y 1 Ay</td> <td>Dia</td> <td>\$ 345,121.20</td> <td>0.500</td> <td>\$ 172,560.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 172,561.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 0.13 | Cuadrilla Instalación 1 Of y 1 Ay          | Dia    | \$ 345,121.20 | 0.500 | \$ 172,560.60 |     |                     |               |              |      | \$ 172,561.00 |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla Instalación 1 Of y 1 Ay                                                                                                                                                                                                      | Dia           | \$ 345,121.20     | 0.500     | \$ 172,560.60        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 172,561.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.120</td> <td>\$ 18,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 18,000.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5  | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.120 | \$ 18,000.00  |     |                     |               |              |      | \$ -          |     |                            |               |              |      | \$ 18,000.00 |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.120     | \$ 18,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 18,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | <b>\$ 933,045.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <p><br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1</p> <p><br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |      |                                            |        |               |       |               |     |                     |               |              |      |               |     |                            |               |              |      |              |     |         |       |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|---|-----------------------|-----|--------|------|-------------|----|----------------------------|-----|---------|------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |        | NIT.901.876.342-1 |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP10                                                                                                                                                                                                                                   |        | Fecha:            | 15/1/2026 |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| Suministro e instalación de tubería de 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        | Unidad :          | ML        |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 14,915.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 1,491.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 1,492.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 14,915.00  | 10%   | \$ 1,491.50  |   |                       |     |        |      | \$ -        |    |                            |     |         |      | \$ -         |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 1,492.00 |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo   | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual | \$ 14,915.00      | 10%       | \$ 1,491.50         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 1,492.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pegante para PVC (1/4 Galon)</td> <td>UND</td> <td>95,000</td> <td>0.09</td> <td>\$ 8,550.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Limpiador PVC 28 grms</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>0.60</td> <td>\$ 6,000.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Tubo Sanitario 4" Pesado x</td> <td>UND</td> <td>163,422</td> <td>0.17</td> <td>\$ 27,781.74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 42,331.74</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 6   | Pegante para PVC (1/4 Galon)               | UND    | 95,000        | 0.09  | \$ 8,550.00  | 7 | Limpiador PVC 28 grms | UND | 10,000 | 0.60 | \$ 6,000.00 | 14 | Tubo Sanitario 4" Pesado x | UND | 163,422 | 0.17 | \$ 27,781.74 |  |  |  |  |  | \$ -         |  |  |  |  |  | \$ -        |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 42,331.74 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pegante para PVC (1/4 Galon)                                                                                                                                                                                                           | UND    | 95,000            | 0.09      | \$ 8,550.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Limpiador PVC 28 grms                                                                                                                                                                                                                  | UND    | 10,000            | 0.60      | \$ 6,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tubo Sanitario 4" Pesado x                                                                                                                                                                                                             | UND    | 163,422           | 0.17      | \$ 27,781.74        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 42,331.74        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>Cuadrilla A7 (Albañileria) 1Of</td> <td>Día</td> <td>\$ 165,720.60</td> <td>0.09</td> <td>\$ 14,914.85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 14,915.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 011 | Cuadrilla A7 (Albañileria) 1Of             | Día    | \$ 165,720.60 | 0.09  | \$ 14,914.85 |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  | \$ 14,915.00 |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuadrilla A7 (Albañileria) 1Of                                                                                                                                                                                                         | Día    | \$ 165,720.60     | 0.09      | \$ 14,914.85        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 14,915.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.100</td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 15,000.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.100 | \$ 15,000.00 |   |                       |     |        |      | \$ -        |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  | \$ 15,000.00 |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON | 150,000.00        | 0.100     | \$ 15,000.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 15,000.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | <b>\$ 73,739.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <p> <br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1 </p> <p> <br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORÍA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |   |                       |     |        |      |             |    |                            |     |         |      |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|-------|--------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----|------|----|-----|-------|--------------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               | NIT.901.876.342-1 |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NP11                                                                                                                                                                                                                                   |               | Fecha:            | 15/1/2026 |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| Cuneta rectangular de concreto de 0.25 de profundidad x 0.41 de ancho, incluye excavación, concreto de 3.000psi, acabado liso y junta de dilatación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :          | ML        |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 67,564.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 6,756.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.10</td> <td>\$ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 17,256.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 67,564.00  | 10%   | \$ 6,756.40  | 3   | Vibrador de concreto       | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10  | \$ 6,500.00  | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00  |    |      |    |     |       | \$ 17,256.00 |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 67,564.00      | 10%       | \$ 6,756.40          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00      | 0.10      | \$ 6,500.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00      | 0.05      | \$ 4,000.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 17,256.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>28.67</td> <td>\$ 21,498.75</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1 1/3</td> <td>\$ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.00</td> <td>\$ 462.46</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>12.38</td> <td>\$ 1,856.40</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.06</td> <td>\$ 12,841.92</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.25</td> <td>\$ 800.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>1.00</td> <td>\$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 79,459.53</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 92  | Cemento gris                               | KG     | 750           | 28.67 | \$ 21,498.75 | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und           | 24,000       | 1 1/3 | \$ 32,000.00 | 93 | Arena Gruesa/Fina      | M3            | 110,000      | 0.00 | \$ 462.46    | 94 | Agua | LT | 150 | 12.38 | \$ 1,856.40  | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.06 | \$ 12,841.92 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.00 | \$ 10,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 79,459.53 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750               | 28.67     | \$ 21,498.75         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000            | 1 1/3     | \$ 32,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000           | 0.00      | \$ 462.46            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150               | 12.38     | \$ 1,856.40          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000           | 0.06      | \$ 12,841.92         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200             | 0.25      | \$ 800.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000            | 1.00      | \$ 10,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 79,459.53         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañileria)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>0.145</td> <td>\$ 67,564.29</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 67,564.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañileria)        | Dia    | \$ 465,960.60 | 0.145 | \$ 67,564.29 |     |                            |               |              |       | \$ 67,564.00 |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañileria)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60     | 0.145     | \$ 67,564.29         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 67,564.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00 |     |                            |               |              |       | \$ -         |    |                        |               |              |      | \$ 16,500.00 |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00        | 0.110     | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           | <b>\$ 180,780.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |
| <br><b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |           |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |     |                            |               |              |       |              |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |              | NIT.901.876.342-1 |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NP15                                                                                                                                                                                                                                   |              | Fecha:            | 16/1/2025 |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRÍLICO CUYAS DIMENSIONES DEBEN TENER UNA RELACIÓN DE 1,00 DE ANCHO POR 1,50 DE ALTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |              | Unidad :          | M2        |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>I EQUIPO</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Tipo</td><td>Tarifa/hora</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td><td>Herramienta menor</td><td>Manual</td><td>\$ 46,791.00</td><td>10%</td><td>\$ 4,679.10</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 4,679.00</td> </tr> </table>                              |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      | <b>I EQUIPO</b>              |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual       | \$ 46,791.00  | 10%   | \$ 4,679.10   |  |  |  |  | - | \$ - |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 4,679.00   |
| <b>I EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo         | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual       | \$ 46,791.00      | 10%       | \$ 4,679.10          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   | -         | \$ -                 |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | \$ 4,679.00          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>II MATERIALES EN OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Unidad</td><td>Prec.Unit.</td><td>Cant.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td></td><td>Aviso en Poliestileno de 2,5 mm, laminado.</td><td>m2</td><td>215,000</td><td>1.000</td><td>\$ 215,000.00</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 215,000.00</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      | <b>II MATERIALES EN OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario |     | Aviso en Poliestileno de 2,5 mm, laminado. | m2           | 215,000       | 1.000 | \$ 215,000.00 |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 215,000.00 |
| <b>II MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad       | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aviso en Poliestileno de 2,5 mm, laminado.                                                                                                                                                                                             | m2           | 215,000           | 1.000     | \$ 215,000.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | \$ 215,000.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>III MANO DE OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>Cuadrilla</td><td>Unidad</td><td>Jorn.Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>001</td><td>Cuadrilla AA (Albañilería) 10f y 1 Ay</td><td>Día</td><td>\$ 311,940.00</td><td>0.150</td><td>\$ 46,791.00</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 46,791.00</td> </tr> </table>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      | <b>III MANO DE OBRA</b>      |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 001 | Cuadrilla AA (Albañilería) 10f y 1 Ay      | Día          | \$ 311,940.00 | 0.150 | \$ 46,791.00  |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 46,791.00 |  |  |  |  |  |               |
| <b>III MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad       | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuadrilla AA (Albañilería) 10f y 1 Ay                                                                                                                                                                                                  | Día          | \$ 311,940.00     | 0.150     | \$ 46,791.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | \$ 46,791.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>IV Transportes</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>Tipo</td><td>Unidad</td><td>Viaje Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td><td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td><td>Viaje/Unidad</td><td>25,000.00</td><td>1.000</td><td>\$ 25,000.00</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 25,000.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      | <b>IV Transportes</b>        |  |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | Viaje/Unidad | 25,000.00     | 1.000 | \$ 25,000.00  |  |  |  |  |   | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 25,000.00 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>IV Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad       | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario           |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | Viaje/Unidad | 25,000.00         | 1.000     | \$ 25,000.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | \$ -                 |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | \$ 25,000.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           | <b>\$ 291,470.00</b> |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |
| <br><b>APROBACIÓN INTERVENTORÍA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |           |                      |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |              |               |       |               |  |  |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|-----|----------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|--------------|----|------|----|-----|-------|--------------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|---|------------------------|----|-------|------|-----------|-----|---------------------|-----|--------|------|--------------|--|------------------------------|----|--------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS  NIT.901.876.342-1                                                                                                                                                                            |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NP12                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |          | Fecha: 15/1/2026     |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| Cuneta rectangular de concreto de 0.25 de profundidad x 0.51 de ancho, junto con Rejilla de 0.35 en angulo de 1" /4 , incluye excavación, concreto de 3.000psi, acabado liso y junta de dilatación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | Unidad : | ML                   |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">EQUIPO</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Tipo</td> <td>Tarifa/hora</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 475,280.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 47,528.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.10</td> <td>\$ 6,500.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.05</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 58,028.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      | I   | EQUIPO             |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 475,280.00 | 10%   | \$ 47,528.00  | 3   | Vibrador de concreto       | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.10  | \$ 6,500.00   | 11 | Mezcladora de concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.05 | \$ 4,000.00  |    |      |    |     |       | \$ 58,028.00 |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora   | Rend.    | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 475,280.00 | 10%      | \$ 47,528.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00  | 0.10     | \$ 6,500.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mezcladora de concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00  | 0.05     | \$ 4,000.00          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ 58,028.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">MATERIALES EN OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>DESCRIPCION</td> <td>Unidad</td> <td>Prec.Unit.</td> <td>Cant.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>31.82</td> <td>\$ 23,861.25</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Tabla Ordinaria 25x2cm x 3</td> <td>und</td> <td>24,000</td> <td>1 1/3</td> <td>\$ 32,000.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.05</td> <td>\$ 5,132.82</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>13.74</td> <td>\$ 2,060.40</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.07</td> <td>\$ 14,253.12</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Puntilla con cabeza 2"</td> <td>Lb</td> <td>3,200</td> <td>0.25</td> <td>\$ 800.00</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>VARILLON MADERA 5.0</td> <td>UND</td> <td>10,000</td> <td>1.00</td> <td>\$ 10,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rejilla de 0.35 en angulo de</td> <td>ML</td> <td>50,000</td> <td>1.00</td> <td>\$ 50,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 138,107.59</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      | II  | MATERIALES EN OBRA |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario | 92  | Cemento gris                               | KG     | 750           | 31.82 | \$ 23,861.25  | 140 | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3 | und           | 24,000       | 1 1/3 | \$ 32,000.00  | 93 | Arena Gruesa/Fina      | M3            | 110,000      | 0.05 | \$ 5,132.82  | 94 | Agua | LT | 150 | 13.74 | \$ 2,060.40  | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.07 | \$ 14,253.12 | 1 | Puntilla con cabeza 2" | Lb | 3,200 | 0.25 | \$ 800.00 | 135 | VARILLON MADERA 5.0 | UND | 10,000 | 1.00 | \$ 10,000.00 |  | Rejilla de 0.35 en angulo de | ML | 50,000 | 1.00 | \$ 50,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 138,107.59 |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                     |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.    | Cant.    | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750           | 31.82    | \$ 23,861.25         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tabla Ordinaria 25x2cm x 3                                                                                                                                                                                                             | und           | 24,000        | 1 1/3    | \$ 32,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000       | 0.05     | \$ 5,132.82          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150           | 13.74    | \$ 2,060.40          |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000       | 0.07     | \$ 14,253.12         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puntilla con cabeza 2"                                                                                                                                                                                                                 | Lb            | 3,200         | 0.25     | \$ 800.00            |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VARILLON MADERA 5.0                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 10,000        | 1.00     | \$ 10,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rejilla de 0.35 en angulo de                                                                                                                                                                                                           | ML            | 50,000        | 1.00     | \$ 50,000.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ 138,107.59        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>III</td> <td colspan="5">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Cuadrilla</td> <td>Unidad</td> <td>Jorn.Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)</td> <td>Dia</td> <td>\$ 465,960.60</td> <td>1.020</td> <td>\$ 475,279.81</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 475,280.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      | III | MANO DE OBRA       |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 005 | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)        | Dia    | \$ 465,960.60 | 1.020 | \$ 475,279.81 |     |                            |               |              |       | \$ 475,280.00 |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total    | Rend.    | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cuadrilla ABB 1Of+2Ay (Albañilería)                                                                                                                                                                                                    | Dia           | \$ 465,960.60 | 1.020    | \$ 475,279.81        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ 475,280.00        |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td colspan="5">Transportes</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>Tipo</td> <td>Unidad</td> <td>Viaje Total</td> <td>Rend.</td> <td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      | IV  | Transportes        |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00  |     |                            |               |              |       | \$ -          |    |                        |               |              |      | \$ 16,500.00 |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transportes                                                                                                                                                                                                                            |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total   | Rend.    | V.Unitario           |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00    | 0.110    | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ -                 |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | \$ 16,500.00         |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          | <b>\$ 687,916.00</b> |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <br><b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br>RL CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br>NIT. 901.876.342-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |
| <br><b>ROSA COTRUVO</b><br><b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br>ALING INGENIERIA SAS<br>NIT. 900.815.455-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |                      |     |                    |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |               |     |                            |               |              |       |               |    |                        |               |              |      |              |    |      |    |     |       |              |     |               |    |         |      |              |   |                        |    |       |      |           |     |                     |     |        |      |              |  |                              |    |        |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |               |



| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|----|-------------|------|-------------|-------|------------|----|-------------------|--------|--------------|-----|-------------|---|----------------------|---------------|--------------|------|-------------|----|------------------------|---------------|--------------|------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|------------|-------|------------|----|--------------|----|-----|-------|--------------|-----|---------------------------|-----|--------|------|--------------|----|-------------------|----|---------|------|-------------|----|------|----|-----|-------|-------------|-----|---------------|----|---------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------|--|--|--|--|--|----|-----------|--------|------------|-------|------------|-----|-----------------------------------------|-----|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |               |               | NIT.901.876.342-1 |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ÍTEMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NP13                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | Fecha:            | 15/1/2026            |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |               | Unidad :      | M2                |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="6"><b>I EQUIPO</b></td> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Tipo</th> <th>Tarifa/hora</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Herramienta menor</td> <td>Manual</td> <td>\$ 42,266.00</td> <td>10%</td> <td>\$ 4,226.60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Vibrador de concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 65,000.00</td> <td>0.03</td> <td>\$ 1,950.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Mezcladora de Concreto</td> <td>Alquiler- Dia</td> <td>\$ 80,000.00</td> <td>0.03</td> <td>\$ 2,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 8,577.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>II MATERIALES EN OBRA</b></td> </tr> <tr> <th>id</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>Unidad</th> <th>Prec.Unit.</th> <th>Cant.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> <tr> <td>92</td> <td>Cemento gris</td> <td>KG</td> <td>750</td> <td>37.50</td> <td>\$ 28,125.00</td> </tr> <tr> <td>182</td> <td>Malla Electrosoldada 4 mm</td> <td>und</td> <td>12,500</td> <td>1.00</td> <td>\$ 12,500.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Arena Gruesa/Fina</td> <td>M3</td> <td>110,000</td> <td>0.06</td> <td>\$ 6,600.00</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Agua</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>18.70</td> <td>\$ 2,805.00</td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>Gravilla 3/4"</td> <td>m3</td> <td>200,000</td> <td>0.10</td> <td>\$ 20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 70,030.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>III MANO DE OBRA</b></td> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Cuadrilla</th> <th>Unidad</th> <th>Jorn.Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> <tr> <td>006</td> <td>Cuadrilla AAAAA (Albañilería) 10f y 3Ay</td> <td>Día</td> <td>\$ 604,378.80</td> <td>0.070</td> <td>\$ 42,265.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 42,266.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>IV Transportes</b></td> </tr> <tr> <th>id</th> <th>Tipo</th> <th>Unidad</th> <th>Viaje Total</th> <th>Rend.</th> <th>V.Unitario</th> </tr> <tr> <td>TR5</td> <td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td> <td>VJ/TON</td> <td>150,000.00</td> <td>0.110</td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b></td> <td><b>\$ 137,373.00</b></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      | <b>I EQUIPO</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14 | Herramienta menor | Manual | \$ 42,266.00 | 10% | \$ 4,226.60 | 3 | Vibrador de concreto | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00 | 0.03 | \$ 1,950.00 | 11 | Mezcladora de Concreto | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00 | 0.03 | \$ 2,400.00 |  |  |  |  |  | \$ 8,577.00 | <b>II MATERIALES EN OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit. | Cant. | V.Unitario | 92 | Cemento gris | KG | 750 | 37.50 | \$ 28,125.00 | 182 | Malla Electrosoldada 4 mm | und | 12,500 | 1.00 | \$ 12,500.00 | 93 | Arena Gruesa/Fina | M3 | 110,000 | 0.06 | \$ 6,600.00 | 94 | Agua | LT | 150 | 18.70 | \$ 2,805.00 | 137 | Gravilla 3/4" | m3 | 200,000 | 0.10 | \$ 20,000.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 70,030.00 | <b>III MANO DE OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla | Unidad | Jorn.Total | Rend. | V.Unitario | 006 | Cuadrilla AAAAA (Albañilería) 10f y 3Ay | Día | \$ 604,378.80 | 0.070 | \$ 42,265.75 |  |  |  |  |  | \$ 42,266.00 | <b>IV Transportes</b> |  |  |  |  |  | id | Tipo | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00 | 0.110 | \$ 16,500.00 |  |  |  |  |  | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 16,500.00 | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |  |  |  |  | <b>\$ 137,373.00</b> |
| <b>I EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Tarifa/hora   | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual        | \$ 42,266.00  | 10%               | \$ 4,226.60          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vibrador de concreto                                                                                                                                                                                                                   | Alquiler- Dia | \$ 65,000.00  | 0.03              | \$ 1,950.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mezcladora de Concreto                                                                                                                                                                                                                 | Alquiler- Dia | \$ 80,000.00  | 0.03              | \$ 2,400.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ 8,577.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>II MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad        | Prec.Unit.    | Cant.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cemento gris                                                                                                                                                                                                                           | KG            | 750           | 37.50             | \$ 28,125.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malla Electrosoldada 4 mm                                                                                                                                                                                                              | und           | 12,500        | 1.00              | \$ 12,500.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arena Gruesa/Fina                                                                                                                                                                                                                      | M3            | 110,000       | 0.06              | \$ 6,600.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agua                                                                                                                                                                                                                                   | LT            | 150           | 18.70             | \$ 2,805.00          |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gravilla 3/4"                                                                                                                                                                                                                          | m3            | 200,000       | 0.10              | \$ 20,000.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ 70,030.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>III MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        | Jorn.Total    | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cuadrilla AAAAA (Albañilería) 10f y 3Ay                                                                                                                                                                                                | Día           | \$ 604,378.80 | 0.070             | \$ 42,265.75         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ 42,266.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>IV Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad        | Viaje Total   | Rend.             | V.Unitario           |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON        | 150,000.00    | 0.110             | \$ 16,500.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ -                 |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | \$ 16,500.00         |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   | <b>\$ 137,373.00</b> |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |
| <p><br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1</p> <p><br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                   |                      |                 |  |  |  |  |  |    |             |      |             |       |            |    |                   |        |              |     |             |   |                      |               |              |      |             |    |                        |               |              |      |             |  |  |  |  |  |             |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |            |       |            |    |              |    |     |       |              |     |                           |     |        |      |              |    |                   |    |         |      |             |    |      |    |     |       |             |     |               |    |         |      |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |    |           |        |            |       |            |     |                                         |     |               |       |              |  |  |  |  |  |              |                       |  |  |  |  |  |    |      |        |             |       |            |     |                                            |        |            |       |              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |              |                              |  |  |  |  |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|----|-------------|--------|-------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------------|--|------|--|--|---|------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2325 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                         |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS                                                                                                                                                                                               |        | NIT.901.876.342-1 |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NP13                                                                                                                                                                                                                                   |        | Fecha:            | 15/1/2026 |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        | Unidad :          | M3        |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>I EQUIPO</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Tipo</td><td>Tarifa/hora</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>14</td><td>Herramienta menor</td><td>Manual</td><td>\$ 70,185.00</td><td>10%</td><td>\$ 7,018.50</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 7,019.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | <b>I EQUIPO</b>              |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Tipo   | Tarifa/hora | Rend. | V.Unitario | 14  | Herramienta menor                          | Manual | \$ 70,185.00  | 10%   | \$ 7,018.50  |  |      |  |  | - | \$ - |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 7,019.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>I EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Tipo   | Tarifa/hora       | Rend.     | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                      | Manual | \$ 70,185.00      | 10%       | \$ 7,018.50         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   | -         | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 7,019.00         |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>II MATERIALES EN OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>DESCRIPCION</td><td>Unidad</td><td>Prec.Unit.</td><td>Cant.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | <b>II MATERIALES EN OBRA</b> |  |  |  |  |  | id | DESCRIPCION | Unidad | Prec.Unit.  | Cant. | V.Unitario |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ - |
| <b>II MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Prec.Unit.        | Cant.     | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>III MANO DE OBRA</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>Cuadrilla</td><td>Unidad</td><td>Jorn.Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>004</td><td>Cuadrilla aa (Albañilería)</td><td>Día</td><td>\$ 292,438.80</td><td>0.24</td><td>\$ 70,185.31</td> </tr> <tr> <td></td><td>2 Ay</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 70,185.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | <b>III MANO DE OBRA</b>      |  |  |  |  |  | id | Cuadrilla   | Unidad | Jorn.Total  | Rend. | V.Unitario | 004 | Cuadrilla aa (Albañilería)                 | Día    | \$ 292,438.80 | 0.24  | \$ 70,185.31 |  | 2 Ay |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  | \$ 70,185.00 |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>III MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuadrilla                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Jorn.Total        | Rend.     | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuadrilla aa (Albañilería)                                                                                                                                                                                                             | Día    | \$ 292,438.80     | 0.24      | \$ 70,185.31        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Ay                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 70,185.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>IV Transportes</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>id</td><td>Tipo</td><td>Unidad</td><td>Viaje Total</td><td>Rend.</td><td>V.Unitario</td> </tr> <tr> <td>TR5</td><td>TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE</td><td>VJ/TON</td><td>150,000.00</td><td>0.110</td><td>\$ 16,500.00</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td><td style="text-align: right;">\$ 16,500.00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     | <b>IV Transportes</b>        |  |  |  |  |  | id | Tipo        | Unidad | Viaje Total | Rend. | V.Unitario | TR5 | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE | VJ/TON | 150,000.00    | 0.110 | \$ 16,500.00 |  |      |  |  |   | \$ - |  |  |  |  |  | \$ 16,500.00 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>IV Transportes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Viaje Total       | Rend.     | V.Unitario          |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| TR5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRESTRE FLORENCIA - VEREDA AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                             | VJ/TON | 150,000.00        | 0.110     | \$ 16,500.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ -                |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | \$ 16,500.00        |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           | <b>\$ 93,704.00</b> |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>JOAN SEBASTIAN FORERO MARQUEZ</b><br/> RL. CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS<br/> NIT. 901.876.342-1 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>APROBACIÓN INTERVENTORIA</b><br/> ALING INGENIERIA SAS<br/> NIT. 900.815.455-0 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |           |                     |                              |  |  |  |  |  |    |             |        |             |       |            |     |                                            |        |               |       |              |  |      |  |  |   |      |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |




# MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                              |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                           | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                           | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                             | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 1.02                                                                                                                                                                                                                                    | DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO | <b>Unidad Medida</b>                        | m2        |

| Localización        | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|---------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                     | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Consultorio 1       | 2.80        |      | 3.85  | 1.00 | 10.78        |
| Recepción           | 2.30        |      | 3.85  | 1.00 | 8.86         |
| Vacunación          | 3.83        |      | 2.89  | 1.00 | 11.07        |
| Consultorio 2       | 3.85        |      | 2.40  | 1    | 9.24         |
| Toma de Muestras    | 2.00        |      | 2.70  | 1.00 | 5.40         |
| Área Baños          | 2.00        |      | 2.17  | 1.00 | 4.34         |
| Anden Ingreso baños | 1.00        |      | 3.25  | 1.00 | 3.25         |
| Baños               | 1.03        |      | 1.18  | 1.00 | 1.22         |
| Ducha               | 0.72        |      | 1.18  | 1.00 | 0.85         |
| Anden Ingreso       | 8.13        |      | 1.50  | 1.00 | 12.20        |
| Bocapueras          | 1.00        |      | 0.15  | 6.00 | 0.90         |
|                     |             |      |       |      | 0.00         |
|                     |             |      |       |      | 0.00         |
|                     |             |      |       |      | 0.00         |
|                     |             |      |       |      | 0.00         |
|                     |             |      |       |      | 0.00         |


|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> | <b>68.09</b> |
|                |                        |              |
|                |                        |              |
|                |                        |              |

Elaboró  
  
**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló  
  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR


## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                    |                                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                 | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                   | MORELIA                                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            | <b>FECHA</b>                                                                       | 15-ene-26                                   |
| <b>ÍTEM</b>                      | 1.03                                                                                                                                                                                                                                    | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO. | Unidad Medida m2                            |

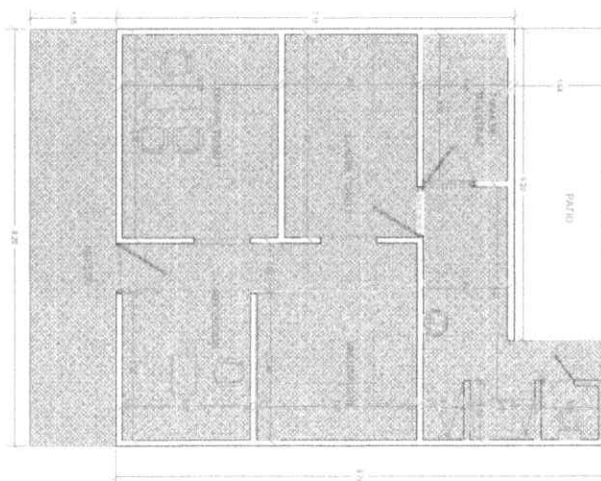

| Localización        | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|---------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                     | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Consultorio 1       | 2.80        |      | 3.85  | 1.00 | 10.78        |
| Recepción           | 2.30        |      | 3.85  | 1.00 | 8.86         |
| Vacunación          | 3.83        |      | 2.89  | 1.00 | 11.07        |
| Consultorio 2       | 3.85        |      | 2.40  | 1    | 9.24         |
| Toma de Muestras    | 2.00        |      | 2.70  | 1.00 | 5.40         |
| Área Baños          | 2.00        |      | 2.17  | 1.00 | 4.34         |
| Anden Ingreso baños | 1.00        |      | 3.25  | 1.00 | 3.25         |
| Baños               | 1.03        |      | 1.18  | 1.00 | 1.22         |
| Ducha               | 0.72        |      | 1.18  | 1.00 | 0.85         |
| Anden Ingreso       | 8.13        |      | 1.50  | 1.00 | 12.20        |
| Bocapueras          | 1.00        |      | 0.15  | 6.00 | 0.90         |
|                     |             |      |       |      |              |
|                     |             |      |       |      |              |
|                     |             |      |       |      |              |
|                     |             |      |       |      |              |
|                     |             |      |       |      |              |
|                     |             |      |       |      |              |

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> | <b>68.09</b> |
|                |                        |              |
|                |                        |              |
|                |                        |              |

Elaboró  
  
**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló  
  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                               |                                             |                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>            | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                             |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>            | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                             |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>              | MORELIA                                     |                             |
| <b>CAPITULO</b>                  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            |                               | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26                   |
| <b>ÍTEM</b>                      | 1.04                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS |                                             | <b>Unidad Medida</b><br>und |

[illegible]

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                 |                                             |                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>              | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                             |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>              | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                             |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                | MORELIA                                     |                             |
| <b>CAPITULO</b>                  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26                   |
| <b>ÍTEM</b>                      | 1.05                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS |                                             | <b>Unidad Medida</b><br>UND |

[illegible]

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                    |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                 | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                   | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 1.06                                                                                                                                                                                                                                    | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO | <b>Unidad Medida</b>                        | m2        |

[illegible]

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo V.*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Avaló |  |
|       | <b>ROSA COTAMO VALERO</b><br>INTERVENTOR                                              |


**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                             |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                     |                                             |    |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                  | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |    |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                  | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |    |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                    | MORELIA                                     |    |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA</b>                                                        | 15-ene-26                                   |    |
| <b>ÍTEM</b>                      | 2.01                                                                                                                                                                                                                                    | PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm | <b>Unidad Medida</b>                        | M2 |

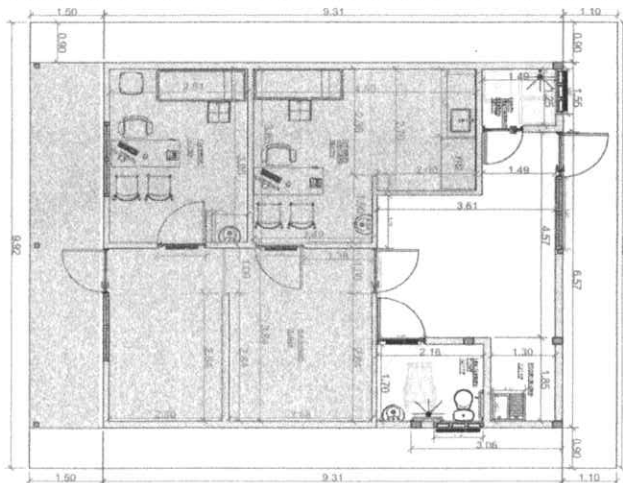

| Localización           | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                        | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Consultorio 1          | 2.80        |      | 3.85  | 1.00 | 10.78        |
| Recepción              | 2.30        |      | 3.84  | 1.00 | 8.83         |
| Consultorio Vacunación | 3.85        |      | 2.40  | 1.00 | 9.24         |
|                        | 2.00        |      | 2.70  | 1.00 | 5.40         |
| Sala espera            | 3.84        |      | 2.88  | 1.00 | 11.06        |
| Área Baños             | 2.00        |      | 2.35  | 1.00 | 4.70         |
| Anden Ingreso baños    | 1.00        |      | 3.25  | 1.00 | 3.25         |
| Poceta aseo            | 2.00        |      | 1.40  | 1.00 | 2.80         |
| Residuos               | 1.55        |      | 1.44  | 1.00 | 2.23         |
| Anden Ingreso          | 8.13        |      | 1.50  | 1.00 | 12.20        |
| Bocapueras             | 1.00        |      | 0.15  | 8.00 | 1.20         |
| Patio                  | 2.12        |      | 3.21  | 1.00 | 6.81         |
|                        | 1.49        |      | 4.42  | 1.00 | 6.59         |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> | <b>85.08</b> |
|                |                        |              |
|                |                        |              |
|                |                        |              |

Elaboró  
  
**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló  
  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Avaló | <i>Rosa Cotamo V.</i>                    |
|       | <b>ROSA COTAMO VALERO</b><br>INTERVENTOR |



## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                     |                                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>  | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>  | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>    | MORELIA                                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA</b>        | 15-ene-26                                   |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.01                                                                                                                                                                                                                                    | MURO EN BLOQUE No 4 | Unidad Medida M2                            |

| Localización            | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|-------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                         | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Baño y Cuarto Aseo      | 1.17        | 2.30 |       | 1.00 | 2.69         |
|                         | 1.70        | 2.30 |       | 1.00 | 3.91         |
|                         | 1.30        | 0.70 |       | 1.00 | 0.91         |
|                         | 3.35        | 0.20 |       | 1.00 | 0.67         |
| Cuarto Residuos         | 1.40        | 2.30 |       | 1.00 | 3.22         |
|                         | 1.50        | 2.30 |       | 1.00 | 3.45         |
|                         | 0.82        | 2.30 |       | 1.00 | 1.89         |
| Consultorio Vacunación  | 1.00        | 2.10 |       | 2.00 | 4.20         |
|                         | 0.96        | 0.90 |       | 1.00 | 0.86         |
| Consultorio 1 muro      | 0.29        | 2.10 |       | 1.00 | 0.61         |
| puerta                  | 1.00        | 0.26 |       | 1.00 | 0.26         |
| Fachada lateral         | 5.50        | 0.50 |       | 1.00 | 2.75         |
|                         | 7.67        | 0.50 |       | 1.00 | 3.84         |
| Fachada frontal         | 8.12        | 0.50 |       | 1.00 | 4.06         |
| Recepción - Sala espera | 2.84        | 0.50 |       | 2.00 | 2.84         |
| Consultorio 1           | 2.81        | 0.50 |       | 1.00 | 1.41         |
|                         | 3.98        | 0.50 |       | 1.00 | 1.99         |
| Consultorio Vacunación  | 2.40        | 0.50 |       | 1.00 | 1.20         |
|                         | 1.50        | 0.50 |       | 1.00 | 0.75         |
|                         | 2.00        | 0.50 |       | 1.00 | 1.00         |
|                         | 2.95        | 0.50 |       | 1.00 | 1.48         |
| Muro cerramiento        | 4.42        | 2.37 |       | 1.00 | 6.88         |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>  |             |      |       |      | <b>50.85</b> |

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                             |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                      |                                             |                     |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>   | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                     |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>   | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                     |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>     | MORELIA                                     |                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26           |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.02                                                                                                                                                                                                                                    | PAÑETE EN MOTERO 1:4 |                                             | Unidad Medida<br>M2 |



| Localización                 | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|------------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                              | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Baño y Cuarto Aseo           | 1.37        | 2.30 |       | 2.00 | 6.30         |
|                              | 1.70        | 2.30 |       | 4.00 | 15.64        |
|                              | 1.30        | 0.70 |       | 2.00 | 1.82         |
|                              | 3.35        | 0.20 |       | 2.00 | 1.34         |
| Cuarto Residuos              | 1.40        | 2.30 |       | 2.00 | 6.44         |
|                              | 1.50        | 2.30 |       | 2.00 | 6.90         |
|                              | 0.82        | 2.30 |       | 2.00 | 3.77         |
| Consultorio 1 muro<br>puerta | 0.29        | 2.10 |       | 2.00 | 1.22         |
|                              | 1.00        | 0.26 |       | 2.00 | 0.52         |
| Fachada lateral              | 5.50        | 3.20 |       | 1.00 | 17.60        |
|                              | 7.67        | 3.20 |       | 1.00 | 24.54        |
| Fachada frontal              | 8.12        | 0.50 |       | 2.00 | 8.12         |
| Recepción - Sala espera      | 2.84        | 0.50 |       | 4.00 | 5.68         |
| Consultorio 1                | 2.81        | 0.50 |       | 2.00 | 2.81         |
|                              | 3.98        | 0.50 |       | 2.00 | 3.98         |
| Consultorio Vacunación       | 2.40        | 0.50 |       | 2.00 | 2.40         |
|                              | 1.50        | 0.50 |       | 1.00 | 0.75         |
|                              | 2.10        | 2.30 |       | 3.00 | 14.49        |
|                              | 2.70        | 2.30 |       | 2.00 | 12.42        |
|                              |             |      |       |      | -            |
| Muro cerramiento             | 4.42        | 2.30 |       | 2.00 | 16.73        |

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

153.48

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                             |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                     |                                             |                            |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                  | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                            |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                  | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                            |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                    | MORELIA                                     |                            |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                     | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26                  |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.03                                                                                                                                                                                                                                    | ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30 |                                             | <b>Unidad Medida</b><br>M2 |

[illegible]

|                |                 |       |
|----------------|-----------------|-------|
| OBSERVACIONES: | TOTAL ACTIVIDAD | 26.75 |
|                |                 |       |
|                |                 |       |
|                |                 |       |

Elaboró


**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                            |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                         | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                         | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                           | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                            | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.04                                                                                                                                                                                                                                    | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

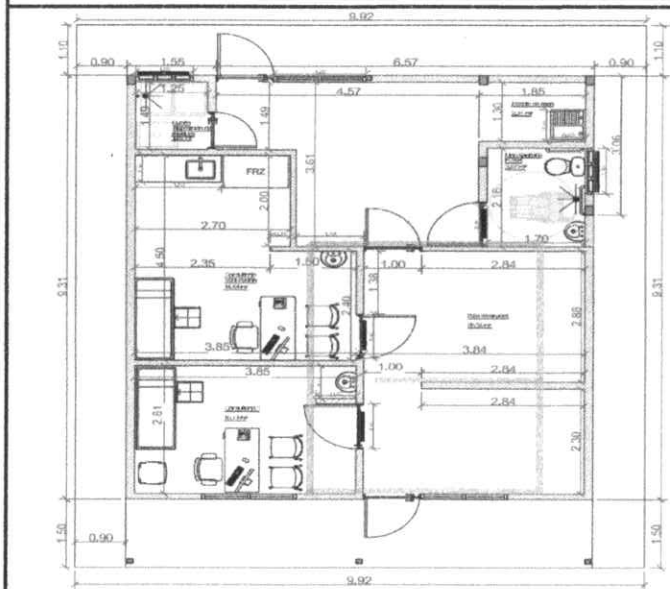

| Localización       | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|--------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                    | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Recepción          | 3.84        | 3.20 |       | 2.00 | 20.23        |
|                    | 2.30        | 3.20 |       | 2.00 | 12.62        |
| Sala espera        | 2.88        | 3.00 |       | 2.00 | 15.18        |
|                    | 3.84        | 3.20 |       | 2.00 | 22.48        |
| Cuarto Residuos    | 1.40        | 2.30 |       | 2.00 | 6.14         |
|                    | 1.50        | 2.30 |       | 2.00 | 4.80         |
| Patio              | 1.25        | 2.30 |       | 1.00 | 2.88         |
|                    | 2.12        | 2.30 |       | 1.00 | 4.88         |
|                    | 1.18        | 2.30 |       | 1.00 | 2.71         |
|                    | 2.00        | 2.30 |       | 1.00 | 2.50         |
|                    | 2.35        | 2.30 |       | 1.00 | 3.31         |
|                    | 1.50        | 2.30 |       | 1.00 | 1.35         |
|                    | 4.42        | 2.30 |       | 1.00 | 5.22         |
| Muro recerramiento |             |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

**TOTAL ACTIVIDAD**

**104.28**


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                           |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                        | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                          | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.05                                                                                                                                                                                                                                    | ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

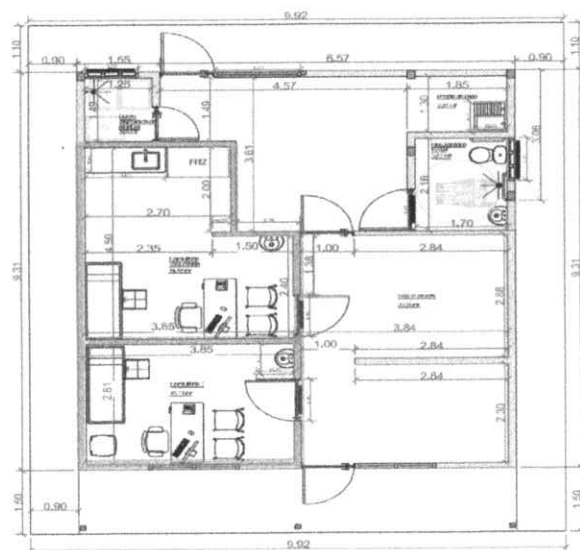[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

94.73

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                     |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                  | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                  | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                    | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.06                                                                                                                                                                                                                                    | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS) | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

[illegible]

OBSERVACIONES: Se plantea zocalo en esmalte en los muros internos.

TOTAL ACTIVIDAD

19.72


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                       |                                             |                            |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                            |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                            |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                      | MORELIA                                     |                            |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                       | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26                  |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.07                                                                                                                                                                                                                                    | ESTUCO EXTERIOR Y PINTURA TIPO KORAZA |                                             | <b>Unidad Medida</b><br>M2 |

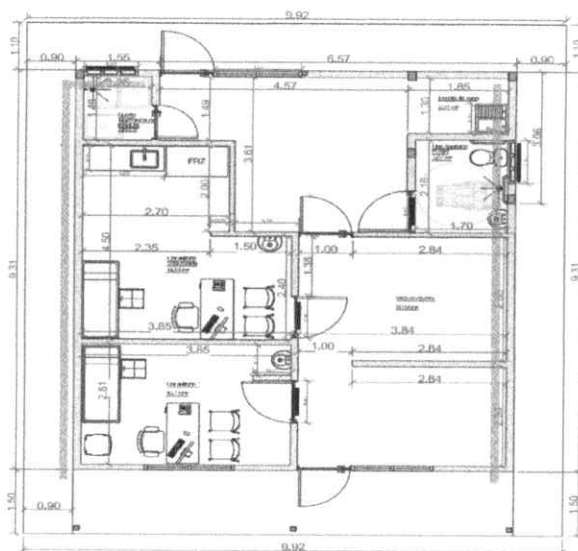[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

---

91.25


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                             |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                          | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                          | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                            | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 3.08                                                                                                                                                                                                                                    | Impermeabilización Fachadas Laterales, hidrofugo o similar. | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

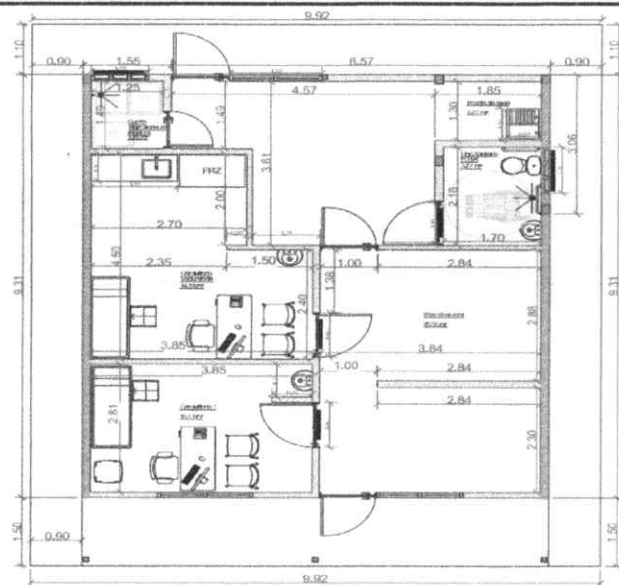

| Localización       | Dimensiones            |      |       | CANT | Medida Total |
|--------------------|------------------------|------|-------|------|--------------|
|                    | LONGITUD               | ALTO | ANCHO |      |              |
|                    |                        |      |       |      | -            |
| Fachadas Laterales | 9.31                   | 3.20 |       | 2.00 | 59.58        |
| Placa              | 1.97                   | 3.20 |       | 1.00 | 6.30         |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    |                        |      |       |      | -            |
|                    | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |      |       |      | <b>65.89</b> |
|                    |                        |      |       |      |              |
|                    |                        |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                    |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                 | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                   | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.01                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER | <b>Unidad Medida</b>                        | ml        |

[illegible]

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra


Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



**CONSTRUMATERIALES  
E INGENIEROS ZOMAC S.A.S**  
NIT. 801.878.342-1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                  |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                               | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                               | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                 | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.02                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA. | <b>Unidad Medida</b>                        | m2        |

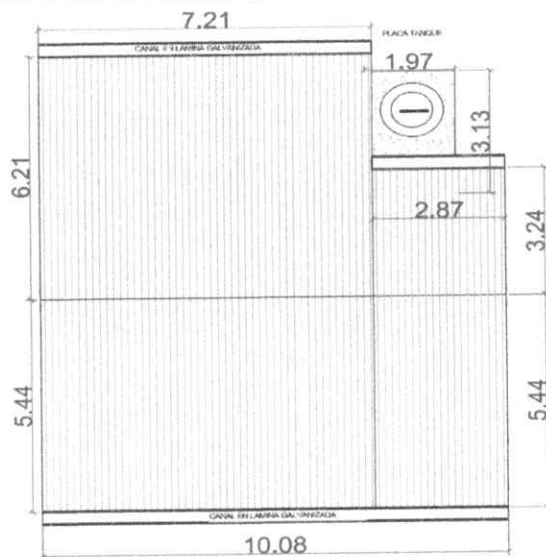[illegible]

OBSERVACIONES:

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDAD |
|--|--|--|--|-----------------|

108.91

Elaboró

LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ

Residente de Obra

Avaló

ROSA COTAMO VALERO

INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                             |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                      |                                             |                     |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                   | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                     |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                   | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                     |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                     | MORELIA                                     |                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26           |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.03                                                                                                                                                                                                                                    | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA |                                             | Unidad Medida<br>ml |

[illegible]

OBSERVACIONES: Se plantean las Correas en pacha.

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                                                                           |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                        | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                                          | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.04                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | <b>Unidad Medida</b>                        | ml        |

The technical drawing illustrates the elevation of a building facade. The overall width is 7.21 units. The main section has a height of 6.21 units, while the lower section is 5.44 units high. A horizontal channel at the top is labeled 'CANAL EN LA PARTE DE VENTANAS'. To the right, there is a circular feature labeled 'PLACA TANGUE' with a diameter of 1.97 units. Below it, a vertical dimension of 3.13 units is shown. The base of the structure is 10.08 units wide. Other dimensions include 2.87 units for a central section and 3.24 units for a side section. The drawing includes various structural lines representing walls, windows, and foundations.


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                             |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                          | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                          | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                            | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.05                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" | <b>Unidad Medida</b>                        | ml        |

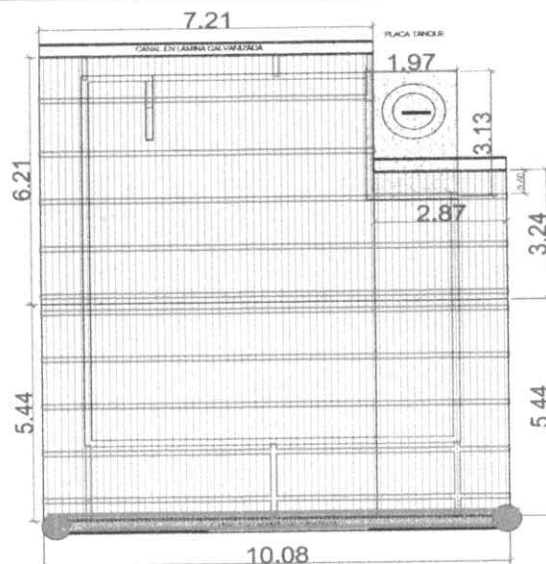

| Localización    | Dimensiones            |      |       | CANT | Medida Total |
|-----------------|------------------------|------|-------|------|--------------|
|                 | LONGITUD               | ALTO | ANCHO |      |              |
| bajantes canal  | 2.60                   |      |       | 2.00 | 5.20         |
| Muñeco bajantes | 1.00                   |      |       | 2.00 | 2.00         |
| Bajante en piso | 1.20                   |      |       | 2.00 | 2.40         |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 |                        |      |       |      | -            |
|                 | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |      |       |      | <b>9.60</b>  |
|                 |                        |      |       |      |              |
|                 |                        |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                               |                                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                            | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                            | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                              | MORELIA                                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS                                                                                                                                                                                                                 |                                               | <b>FECHA</b> 15-ene-26                      |
| <b>ÍTEM</b>                      | 4.06                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | <b>Unidad Medida</b> m2                     |

|                        | Localización              | Dimensiones |      |       | CANT         | Medida Total |
|------------------------|---------------------------|-------------|------|-------|--------------|--------------|
|                        |                           | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |              |              |
|                        | CONSULTORIO 1             | 3.85        |      | 2.81  | 1.00         | 10.82        |
|                        | RECEPCION                 | 3.84        |      | 2.30  | 1.00         | 8.83         |
|                        | SALA DE ESPERA            | 3.84        |      | 2.88  | 1.00         | 11.06        |
|                        | CONSULTORIO DE VACUNACIÓN | 3.85        |      | 2.40  | 1.00         | 9.24         |
|                        |                           | 2.70        |      | 2.00  | 1.00         | 5.40         |
|                        | PATIO                     | 3.61        |      | 3.68  | 1.00         | 13.28        |
|                        |                           | 1.49        |      | 1.40  | 1.00         | 2.09         |
|                        | CUARTO RESIDUOS           | 1.25        |      | 1.49  | 1.00         | 1.86         |
|                        |                           |             |      |       |              |              |
|                        | ANDEN ACCESO              | 10.08       |      | 1.50  | 1.00         | 15.12        |
|                        | ANDEN LATERAL             | 10.20       |      | 0.90  | 1.00         | 9.18         |
|                        |                           | 7.40        |      | 1.00  | 1.00         | 7.40         |
|                        |                           |             |      |       |              | 0.00         |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
| OBSERVACIONES:         |                           |             |      |       |              | -            |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
|                        |                           |             |      |       |              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |                           |             |      |       | <b>94.28</b> |              |


Elaboró  
  
**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló  
  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                             |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                               |                                             |                     |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>            | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                     |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>            | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                     |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>              | MORELIA                                     |                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26           |
| <b>ÍTEM</b>                      | 5.01                                                                                                                                                                                                                                    | NIVELACION PARA PISO E=0,05 M |                                             | Unidad Medida<br>m2 |

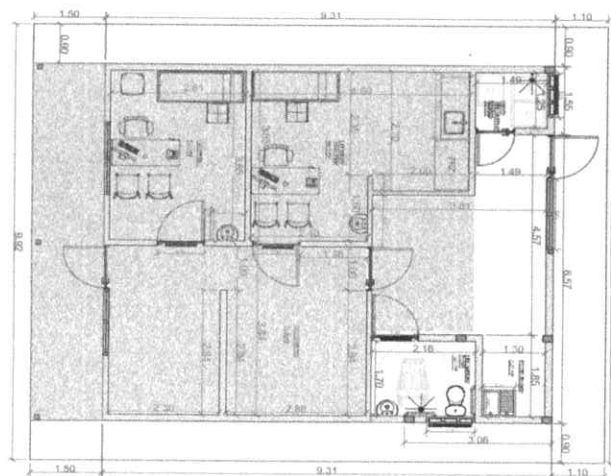

| Localización  | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|---------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|               | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Consultorio 1 | 2.80        |      | 3.85  | 1.00 | 10.78        |
| Recepción     | 2.30        |      | 3.84  | 1.00 | 8.83         |
| Consultorio   | 3.85        |      | 2.40  | 1.00 | 9.24         |
| Vacunación    | 2.00        |      | 2.70  | 1.00 | 5.40         |
| Sala espera   | 3.84        |      | 2.88  | 1.00 | 11.06        |
| Área Baños    | 2.00        |      | 2.20  | 1.00 | 4.40         |
| Poceta aseo   | 2.00        |      | 1.26  | 1.00 | 2.52         |
| Residuos      | 1.40        |      | 1.49  | 1.00 | 2.09         |
| Anden Ingreso | 8.13        |      | 1.50  | 1.00 | 12.20        |
| Bocapuestas   | 1.00        |      | 0.15  | 8.00 | 1.20         |
| Patio         | 1.49        |      | 4.42  | 1.00 | 6.59         |
|               | 2.12        |      | 3.21  | 1.00 | 6.81         |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |

OBSERVACIONES:

**TOTAL ACTIVIDAD**

**81.10**

Elaboró

*Laura Isabel Basto Gutierrez*  
**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo Valero*  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                             |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>          | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>          | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>            | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                                        |                             | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 5.02                                                                                                                                                                                                                                    | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS | <b>Unidad Medida</b>                        | m2        |

| Localización  | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|---------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|               | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Consultorio 1 | 2.80        |      | 3.85  | 1.00 | 10.78        |
| Recepción     | 2.30        |      | 3.84  | 1.00 | 8.83         |
| Consultorio   | 3.85        |      | 2.40  | 1.00 | 9.24         |
| Vacunación    | 2.00        |      | 2.70  | 1.00 | 5.40         |
| Sala espera   | 3.84        |      | 2.88  | 1.00 | 11.06        |
| Área Baños    | 2.00        |      | 2.35  | 1.00 | 4.70         |
| Poceta aseo   | 2.00        |      | 1.40  | 1.00 | 2.80         |
| Residuos      | 1.55        |      | 1.44  | 1.00 | 2.23         |
| Anden Ingreso | 8.13        |      | 1.50  | 1.00 | 12.20        |
| Bocapuertas   | 1.00        |      | 0.15  | 1.00 | 0.15         |
| Patio         | 1.49        |      | 4.42  | 1.00 | 6.59         |
|               | 2.12        |      | 3.21  | 1.00 | 6.81         |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |
|               |             |      |       |      | -            |

OBSERVACIONES:

**TOTAL ACTIVIDAD**

**80.78**

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

## MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                             |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                          |                                             |                     |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>       | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                     |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>       | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                     |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>         | MORELIA                                     |                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26           |
| <b>ÍTEM</b>                      | 5.03                                                                                                                                                                                                                                    | GUARDAESCOBA EN CERAMICA |                                             | Unidad Medida<br>ml |



| Localización     | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                  | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Pisos Internos   | 3.85        |      |       | 3.00 | 11.55        |
|                  | 2.31        |      |       | 1.00 | 2.31         |
|                  | 2.84        |      |       | 4.00 | 11.36        |
|                  | 2.30        |      |       | 1.00 | 2.30         |
|                  | 2.88        |      |       | 1.00 | 2.88         |
|                  | 1.38        |      |       | 2.00 | 2.76         |
|                  | 5.00        |      |       | 1.00 | 5.00         |
|                  | 1.50        |      |       | 2.00 | 3.00         |
|                  | 4.50        |      |       | 1.00 | 4.50         |
|                  | 2.70        |      |       | 2.00 | 5.40         |
|                  | 2.00        |      |       | 2.00 | 4.00         |
|                  | 1.44        |      |       | 2.00 | 2.88         |
|                  | 0.82        |      |       | 2.00 | 1.64         |
|                  | 1.37        |      |       | 2.00 | 2.74         |
|                  | 1.70        |      |       | 4.00 | 6.80         |
|                  | 2.20        |      |       | 1.00 | 2.20         |
|                  | 1.26        |      |       | 1.00 | 1.26         |
| muro cerramiento | 4.42        |      |       | 1.00 | 4.42         |

OBSERVACIONES:

**TOTAL ACTIVIDAD**

**77.00**

Elaboró


*[Signature]*

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*[Signature]*  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                                                |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                             | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                             | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FREÑTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                               | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CARPINTERÍA METALICA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 6.01                                                                                                                                                                                                                                    | Puerta Metalica entablado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

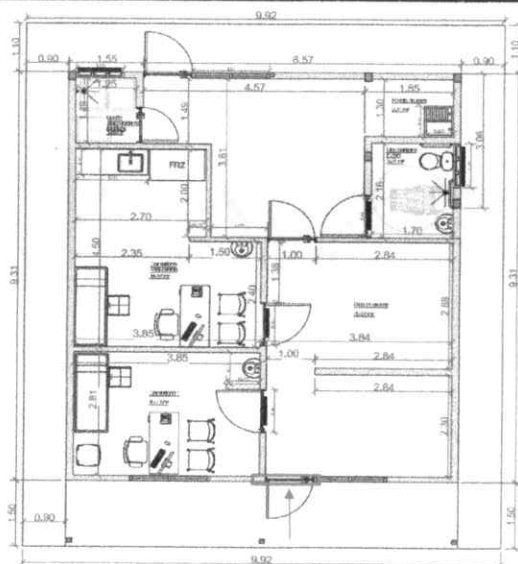[illegible]

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

7.98

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló


**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]

7.13

*Rosa Cotamo V.*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                                      |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                   | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                   | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                     | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 6.03                                                                                                                                                                                                                                    | Suministro e instalación de Puertas en Marco de Aluminio con Tablero en Vidrio 4 mm, con película de seguridad acabado sandblasting. | <b>Unidad Medida</b>                        | M2        |

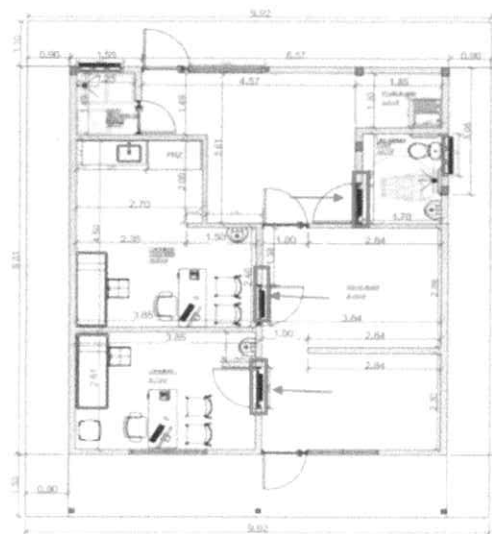

| Localización | Dimensiones            |      |       | CANT | Medida Total |
|--------------|------------------------|------|-------|------|--------------|
|              | LONGITUD               | ALTO | ANCHO |      |              |
| CONSULTORIOS | 1.00                   | 2.10 |       | 2.00 | 4.20         |
| BAÑOS        | 1.00                   | 1.80 |       | 1.00 | 1.80         |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |      |       |      | <b>6.00</b>  |
|              |                        |      |       |      |              |
|              |                        |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                                                 |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                              | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                              | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 7.01                                                                                                                                                                                                                                    | Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m. | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

[illegible]

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]

|                 |      |
|-----------------|------|
| TOTAL ACTIVIDAD | 1.00 |
|-----------------|------|

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                         |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                      | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                      | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                        | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 7.03                                                                                                                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar. | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

[illegible]


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                        |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                     | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                     | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                       | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 7.04                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA) | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

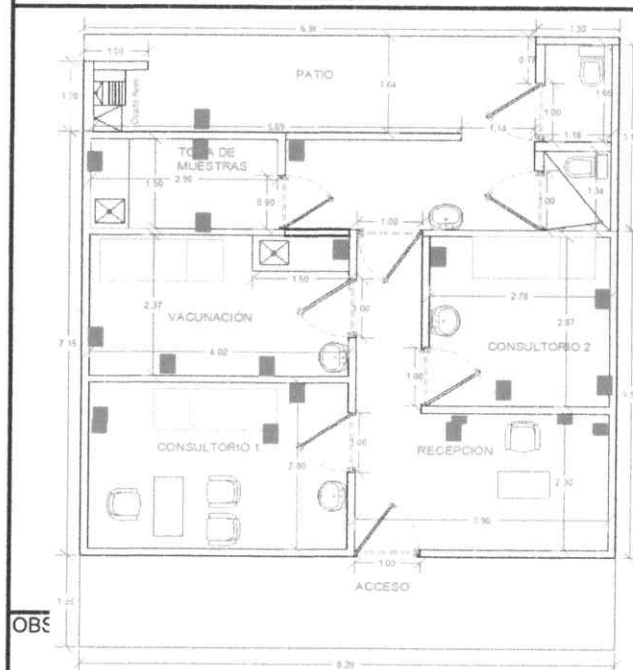

| Localización           | Dimensiones |      |       | CANT  | Medida Total |
|------------------------|-------------|------|-------|-------|--------------|
|                        | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |       |              |
| PUESTO SALUD           |             |      |       | 14.00 | 14.00        |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
|                        |             |      |       |       | --           |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |             |      |       |       | <b>14.00</b> |
|                        |             |      |       |       |              |
|                        |             |      |       |       |              |

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo V.*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |                                                                                                                       |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                      | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 7.05                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA) | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

[illegible]


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                         |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                      | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                      | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                        | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 7.06                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA. | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

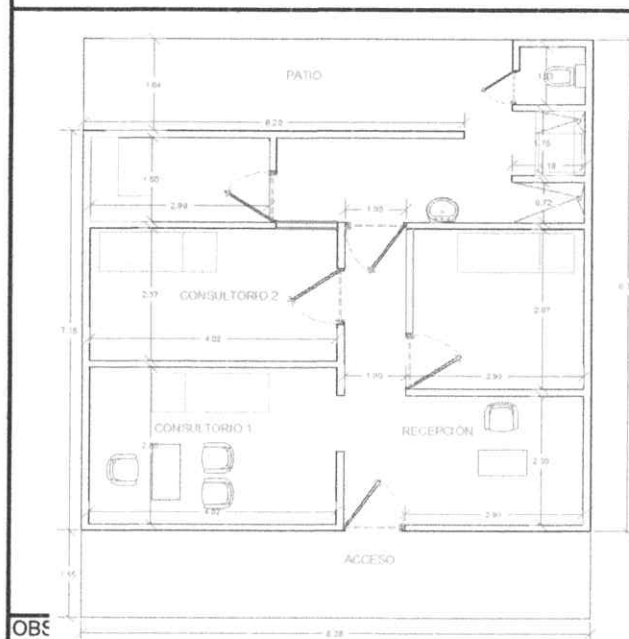

| Localización      | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|-------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                   | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| CONSULTORIOS A.A. |             |      |       | 1.00 | 1.00         |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
|                   |             |      |       |      | -            |
| TOTAL ACTIVIDAD   |             |      |       |      | 1.00         |
|                   |             |      |       |      |              |
|                   |             |      |       |      |              |

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR




[illegible]

1.50

*Rosa Cotamo Valero*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                      |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                   | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                   | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                     | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                                      | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 8.02                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

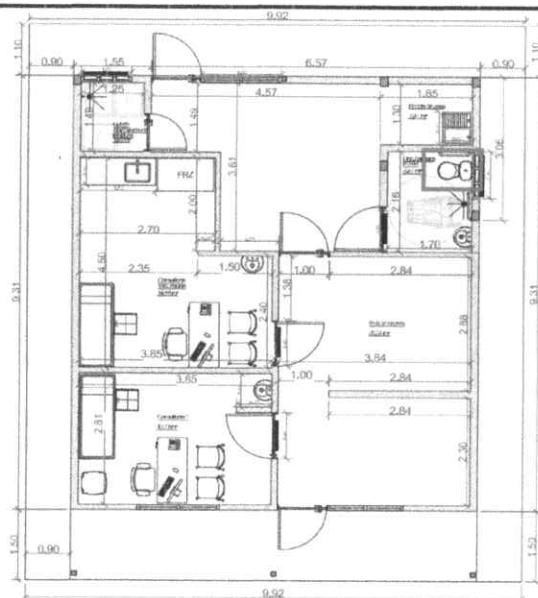

| Localización | Dimensiones            |      |       | CANT | Medida Total |
|--------------|------------------------|------|-------|------|--------------|
|              | LONGITUD               | ALTO | ANCHO |      |              |
| BAÑOS        |                        |      |       | 1.00 | 1.00         |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              |                        |      |       |      | -            |
|              | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |      |       |      | <b>1.00</b>  |
|              |                        |      |       |      |              |
|              |                        |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

Elaboró


**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo V.*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                               |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                            | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                            | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                              | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 8.03                                                                                                                                                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

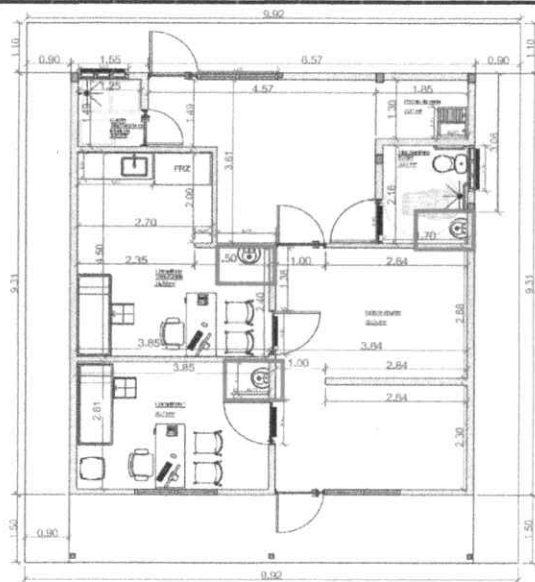

| Localización    | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|-----------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                 | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| BAÑO            |             |      |       | 1.00 | 1.00         |
| CONSULTORIOS    |             |      |       | 2.00 | 2.00         |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
|                 |             |      |       |      | -            |
| TOTAL ACTIVIDAD |             |      |       |      | 3.00         |

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

3.00

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



[illegible]

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> | <b>7.00</b> |
|------------------------|-------------|

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                       |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>      | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                       | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 8.07                                                                                                                                                                                                                                    | Punto Sanitario de 2" | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

[illegible]

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

[illegible]


OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra


Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| OBJETO CONTRACTUAL                                                                  |  | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
| CONTRATO OBRA No                                                                    |  | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             |                                                              | CONTRATISTA                                                                           |             | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |                 |              |
| CONTRATO INTERVENTORIA No                                                           |  | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             |                                                              | INTERVENTOR                                                                           |             | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |                 |              |
| FRENTE TRABAJO                                                                      |  | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           |                                                              | MUNICIPIO                                                                             |             | MORELIA                                     |           |                 |              |
| CAPITULO                                                                            |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                       | FECHA       |                                             | 15-ene-26 |                 |              |
| ÍTEM                                                                                |  | 8.09                                                                                                                                                                                                                                    | Construcción de Caja de Inspección de 0,80x0,80 en concreto. |                                                                                       |             | Unidad Medida                               | UND       |                 |              |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Localización                                                                          | Dimensiones |                                             |           | CANT            | Medida Total |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       | LONGITUD    | ALTO                                        | ANCHO     |                 |              |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Red Sanitaria                                                                         |             |                                             |           | 0.00            | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 | -            |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           | TOTAL ACTIVIDAD |              |
| OBSERVACIONES:                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                       |             |                                             |           |                 |              |
| Elaboró                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Avaló                                                                                 |             |                                             |           |                 |              |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |  |             |                                             |           |                 |              |
| LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | ROSA COTAMO VALERO                                                                    |             |                                             |           |                 |              |
| Residente de Obra                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | INTERVENTOR                                                                           |             |                                             |           |                 |              |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |                                                                           |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                        | ALTING INGENIERIA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                          | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                                           | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | 8.10                                                                                                                                                                                                                                    | Suministro e instalación de Ducha tip regadera y teleducha independiente. | <b>Unidad Medida</b>                        | UND       |

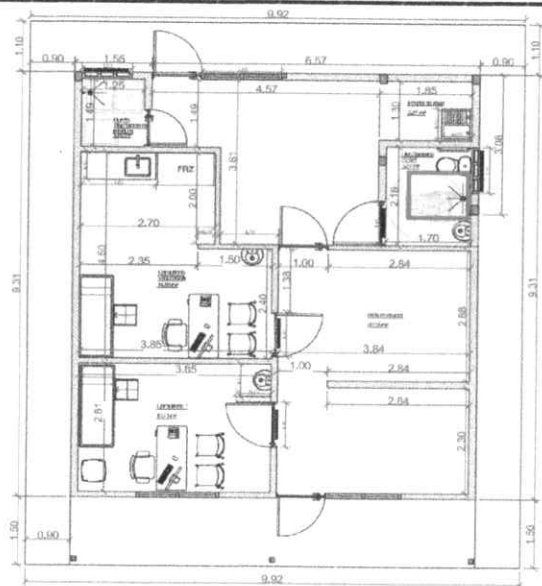

| Localización           | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                        | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
| Ducha                  |             |      |       | 1.00 | 1.00         |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
|                        |             |      |       |      | -            |
| <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |             |      |       |      | <b>1.00</b>  |
|                        |             |      |       |      |              |
|                        |             |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:


Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                   |                                             |                             |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |                             |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |                             |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                  | MORELIA                                     |                             |
| <b>CAPITULO</b>                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26                   |
| <b>ÍTEM</b>                      | 8.11                                                                                                                                                                                                                                    | Suministro e Instalación de Lavadero prefabricado |                                             | <b>Unidad Medida</b><br>UND |

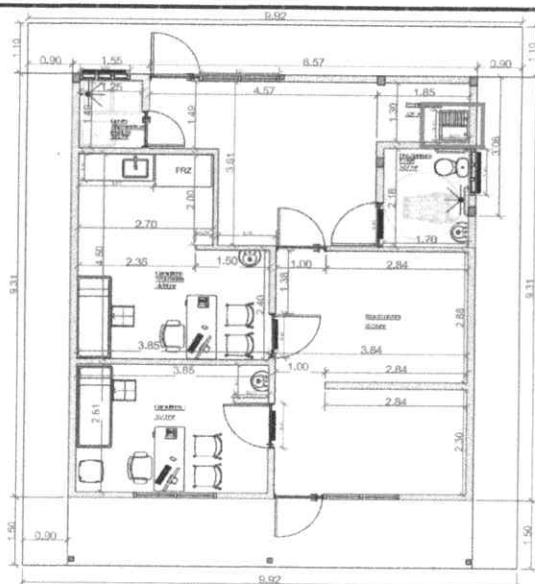

| Localización | Dimensiones     |      |       | CANT | Medida Total |
|--------------|-----------------|------|-------|------|--------------|
|              | LONGITUD        | ALTO | ANCHO |      |              |
| Lavadero     |                 |      |       | 1.00 | 1.00         |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              |                 |      |       |      | -            |
|              | TOTAL ACTIVIDAD |      |       |      | 1.00         |
|              |                 |      |       |      |              |
|              |                 |      |       |      |              |

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR





# MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                             |               |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA |                                                                                                    |                                             |               |    |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |               |    |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                 | ALTING INGENIERIA S.A.S.                    |               |    |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                   | MORELIA                                     |               |    |
| <b>CAPITULO</b>                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26     |    |
| <b>ITEM</b>                      | NP-02                                                                                                                                                                                                                                   | LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. |                                             | <b>Unidad</b> | M2 |

[illegible]

OBSERVACIONES:

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo V.*  
**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

# MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES



CONSTRUMATERIALES  
E INGENIEROS ZOMAC S.A.S  
NIT. 901.876.342-1

|                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                             |               |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|
| OBJETO CONTRACTUAL        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                            |                                             |               |    |
| CONTRATO OBRA No          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | CONTRATISTA                                                                                                                | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |               |    |
| CONTRATO INTERVENTORIA No | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | INTERVENTOR                                                                                                                | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |               |    |
| FRENTE TRABAJO            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPIO                                                                                                                  | MORELIA                                     |               |    |
| CAPITULO                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | FECHA                                       | 15-ene-26     |    |
| ÍTEM                      | NP-03                                                                                                                                                                                                                                   | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS. |                                             | Unidad Medida | KG |

| Localización                  | Dimensiones |      |       | CANT   | medida total | peso Kg/m |
|-------------------------------|-------------|------|-------|--------|--------------|-----------|
|                               | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |        |              |           |
| Viga aerea #4                 | 3.43        |      |       | 8.00   | 27.44        | 27.28     |
|                               | 1.80        |      |       | 8.00   | 14.40        | 14.31     |
| Estribos viga # 2             | 0.47        |      |       | 30.00  | 14.10        | 3.53      |
| Columna #4                    | 2.80        |      |       | 8.00   | 22.40        | 22.27     |
| Estribos columna # 2          | 0.47        |      |       | 36.00  | 16.92        | 4.23      |
| Losa aerea # 4                | 3.20        |      |       | 11.00  | 35.20        | 34.99     |
|                               | 1.97        |      |       | 18.00  | 35.46        | 35.25     |
| Zapata # 4                    | 0.45        |      |       | 12.00  | 5.40         | 5.37      |
| Viga de Cimentación #4        | 1.97        |      |       | 4.00   | 7.88         | 7.83      |
|                               | 3.24        |      |       | 8.00   | 25.92        | 25.76     |
| Estribos viga cimentación # 2 | 0.47        |      |       | 30.00  | 14.10        | 3.53      |
| Cuneta tipo 1 # 3             | 38.00       |      |       | 5.00   | 190.00       | 47.50     |
| Estribos cuneta Tipo 1 # 2    | 0.97        |      |       | 253.00 | 245.41       | 137.43    |
| Cuneta tipo 2 # 3             | 10.08       |      |       | 6.00   | 60.48        | 15.12     |
| Estribos cuneta Tipo 2 # 2    | 1.07        |      |       | 72.00  | 77.04        | 43.14     |
|                               |             |      |       |        |              |           |
|                               |             |      |       |        |              |           |

OBSERVACIONES:

TOTAL ACTIVIDAD

427.53

Elaboró


LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ  
Residente de Obra

Avaló

ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

%



| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------|------|--------------|----------|--------------|-------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>CONTRATO OBRA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                    |              | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                    |              | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                                                      |              | MORELIA                                     |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>FECHA</b> |                                             | 15-ene-26   |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÍTEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NP-05                                                                                                                                                                                                                                   | ZAPATA DE 0,50X0,50m EN CONCRETO DE 3000 psi, NO incluye acero de refuerzo |                                                                                                                                                                                       |              | <b>Unidad Medida</b>                        | und         |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div></div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localización</th> <th colspan="3">Dimensiones</th> <th rowspan="2">CANT</th> <th rowspan="2">Medida Total</th> </tr> <tr> <th>LONGITUD</th> <th>ALTO</th> <th>ANCHO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             | Localización | Dimensiones  |             |       | CANT | Medida Total | LONGITUD | ALTO         | ANCHO |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              | Localización | Dimensiones |       |      |              | CANT     | Medida Total |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             | LONGITUD     |              | ALTO        | ANCHO |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       | 1.00 | 1.00         |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                |              |                                             | <b>1.00</b> |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                       |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div> <div>Elaboró</div> <div>  </div> <div>LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ</div> <div>Residente de Obra</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | <div> <div>Avaló</div> <div>  </div> <div>ROSA COTAMO VALERO</div> <div>INTERVENTOR</div> </div> |              |                                             |             |              |              |             |       |      |              |          |              |       |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                  |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                                                               | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                                                               | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                 | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | NP-06                                                                                                                                                                                                                                   | VIGA CIMENTACIÓN DE 0.20X0.10 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO. | <b>Unidad Medida</b>                        | ML        |

|                | Localización           | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|----------------|------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                |                        | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
|                |                        | 3.24        |      |       | 1.00 | 3.24         |
|                |                        | 1.97        |      |       | 1.00 | 1.97         |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
| OBSERVACIONES: | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |             |      |       |      | <b>5.21</b>  |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

*Rosa Cotamo V.*  
ROSA COTAMO VALERO  
INTERVENTOR

93

94



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                           |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                        | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                        | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                          | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | NP-10                                                                                                                                                                                                                                   | Suministro e instalación de tubería de 4" | <b>Unidad Medida</b>                        | ML        |

[illegible]

|                |                 |       |
|----------------|-----------------|-------|
| OBSERVACIONES: | TOTAL ACTIVIDAD | 12.00 |
|                |                 |       |
|                |                 |       |
|                |                 |       |

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR





|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE<br>DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.<br>LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                  |                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |              |             |                     |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                   | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                                                  |                    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |              |             |                     |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                                 | <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                                                                    |                    | MORELIA                                     |              |             |                     |
| <b>CAPITULO</b>                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>FECHA</b>       | 15-ene-26                                   |              |             |                     |
| <b>ÍTEM</b>                      | NP-12                                                                                                                                                                                                                                         | Cuneta rectangular de concreto de 0.25 de profundidad x 0.51 de ancho, junto con Rejilla de 0.35 en angulo de 1" /4 , incluye excavación, concreto de 3.000psi, acabado liso y junta de dilatación. |                    | <b>Unidad Medida</b>                        | ML           |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Localización</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Dimensiones</b> |                                             |              | <b>CANT</b> | <b>Medida Total</b> |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | <b>LONGITUD</b>    | <b>ALTO</b>                                 | <b>ANCHO</b> |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | 10.08              |                                             |              |             | 10.08               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                               |                    | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b>                      |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                    |                                             |              |             |                     |

Elaboró 

---

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló 

---

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>        | ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |                                                       |                                             |           |
| <b>CONTRATO OBRA No</b>          | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>CONTRATISTA</b>                                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |           |
| <b>CONTRATO INTERVENTORIA No</b> | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                             | <b>INTERVENTOR</b>                                    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |           |
| <b>FRENTE TRABAJO</b>            | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE                                                                                                                                                                                                           | <b>MUNICIPIO</b>                                      | MORELIA                                     |           |
| <b>CAPITULO</b>                  | ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | <b>FECHA</b>                                | 15-ene-26 |
| <b>ÍTEM</b>                      | NP-13                                                                                                                                                                                                                                   | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m. | <b>Unidad Medida</b>                        | M3        |

|                | Localización           | Dimensiones |      |       | CANT | Medida Total |
|----------------|------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|
|                |                        | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |      |              |
|                |                        | 48.00       | 0.30 | 0.30  | 1.00 | 4.32         |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |
| OBSERVACIONES: | <b>TOTAL ACTIVIDAD</b> |             |      |       |      | <b>4.32</b>  |
|                |                        |             |      |       |      |              |
|                |                        |             |      |       |      |              |

Elaboró

**LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ**  
Residente de Obra

Avaló

**ROSA COTAMO VALERO**  
INTERVENTOR



|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|--|----------------|--|-------------|------|-------|-----------------|--------------|
| OBJETO CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                            |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE<br>DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.<br>LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| CONTRATO OBRA No                                                                                                                                                                                                                              |  | 2325 DEL 01 OCTUBRE DE 2025   |  | CONTRATISTA                                                                    |                    | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| CONTRATO INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                     |  | 2326 DEL 01 OCTUBRE DE 2025   |  | INTERVENITOR                                                                   |                    | ALTING INGENIERÍA S.A.S.                    |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| FRETE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                 |  | PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE |  | MUNICIPIO                                                                      |                    | MORELIA                                     |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| CAPITULO                                                                                                                                                                                                                                      |  | ITEMS NO PREVISTOS            |  |                                                                                | FECHA              |                                             | 15-ene-26     |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                          |  | NP-15                         |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO MISIÓN MÉDICA. EN ACRILICO DE 1.00 X 1.50 M. |                    |                                             | Unidad Medida |  | M2             |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  | Localización   |  | Dimensiones |      |       | CANT            | Medida Total |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  | LONGITUD    | ALTO | ANCHO |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             | 1.50 | 1.00  | 2.00            | 3.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             | 0.75 | 0.50  | 1.00            | 0.38         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  | OBSERVACIONES: |  |             |      |       | TOTAL ACTIVIDAD |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| Elaboró                                                                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |                                                                                | Avaló              |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |  |                                                                                |                    |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| LAURA ISABEL BASTO GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                  |  |                               |  |                                                                                | ROSA COTAMO VALERO |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
| Residente de Obra                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |  |                                                                                | INTERVENTOR        |                                             |               |  |                |  |             |      |       |                 |              |
