

Informe de avance de ejecución del Plan Ambiental 2025-2027



PDA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
AMAZONAS

GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

*PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y SANEAMIENTO – PDA*

PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANTECEDENTES	4
3. OBJETIVOS:.....	5
3.1. Objetivo General:.....	5
3.2. Objetivos Específicos	5
4. DESARROLLO DEL PLAN AMBIENTAL 2025 – 2027	5
4.1. MARCO ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN AMBIENTAL.....	6
5. AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS:	9
Los proyectos en seguimiento al Plan Ambiental 2025-2027, se evalúan frente a los que corresponden en ejecución para el periodo entre el mes de julio y diciembre de 2025, así:	
5.1. COMPONENTE DE PLANEACIÓN AMBIENTAL	9
5.2. COMPONENTE DE CONSERVACIÓN	10
5.3. COMPONENTE DE SANEAMIENTO BÁSICO	12
6. CONCLUSIONES.....	18

LISTADO DE TABLAS

Tabla 3 . Compromisos financieros Plan Ambiental 2025-2027	6
Tabla 4 .Proyectos aprobados en el Plan Ambiental 2025-2027	7
Tabla 5 . Proyectos de Planeación ambiental - Plan Ambiental 2025-2027	10
Tabla 6 . Proyectos de conservación ambiental - Plan Ambiental 2025-2027	11
Tabla 7 . Proyectos de Saneamiento Básico - Plan Ambiental 2025-2027	12
Tabla 8 . Proyectos de Saneamiento Básico - Plan Ambiental 2025-2027	14

1. INTRODUCCIÓN

Este informe de gestión tiene como finalidad presentar el estado actual de los proyectos priorizados en el Plan Ambiental del Plan Departamental de Aguas (PDA) del Departamento del Amazonas y la acciones de seguimiento y cumplimiento, frente a las metas proyectadas, así como del estado actual de los mínimos ambientales, en consideración a los que ya se han venido adelantando ante la Autoridad Ambiental Competente, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente.

Dicho plan fue aprobado por el Comité Directivo No. 39 del PDA de mayo de 2025, con previo concepto favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del día 15 de abril de 2025, quedando en firme un conjunto de proyectos estratégicos para la mitigación de riesgos asociados al recurso hídrico, la prestación de los servicios públicos de acueducto y la atención de emergencias derivadas del desabastecimiento.

2. ANTECEDENTES

El documento Plan Ambiental del PDA Amazonas, fue diseñado para el periodo 2025-2027 presentando una serie de proyectos para ejecutar con inversiones de los actores vinculados.

A partir del año 2025, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de Amazonas, fue designada mediante Decreto Departamental No. 016 de 2025, como Gestora del Plan Departamental de Aguas de Amazonas PDA, por consiguiente, le corresponde y es competente para atender los programas relacionados con el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, así como las disposiciones del Decreto 1077 de 2015, en lo que refiere a la implementación y ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA.

No obstante, los programas y proyectos concertados entre el Gestor del PDA Amazonas, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial y CORPOAMAZONIA con acta de reunión del mes de marzo de 2025, se replantearon para el proceso de ejecución en el marco del Plan Ambiental – PDA en el Departamento de Amazonas, durante el periodo comprendido (2025-2027).

Que a través de comunicación externa con número de radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), 2025ER0035515 del 27 de marzo de 2025, la Secretaria de Planeación Departamental Territorial de la Gobernación de Amazonas, solicitó concepto de viabilidad de aprobación del Plan Ambiental 2025-2027 del PDA Amazonas.

Mediante comunicado 2025EE0018292 del 15 de abril de 2025, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó el CONCEPTO DE VIABILIDAD DE APROBACIÓN del Plan Ambiental 2025-2027 del Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y saneamiento (PDA) del Departamento de Amazonas, otorgada en aplicación del parágrafo 5 del artículo 2.3.4.1.2.6 del decreto 1425 de 2019 del MVCT.

3. OBJETIVOS:

3.1. Objetivo General:

Desarrollar el Componente Ambiental del Programa Departamental de Aguas para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1425 de 2019, orientando la gestión a suplir las necesidades ambientales del sector de agua y saneamiento básico en el departamento de Amazonas, logrando definir las líneas de inversión a ser articuladas entre las partes para dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

3.2. Objetivos Específicos

- Formular y hacer seguimiento al Plan Ambiental 2025-2027 de acuerdo con los lineamientos del MVCT.
- Realizar las acciones necesarias para apoyar el cumplimiento a los mínimos ambientales sectoriales, de obligación de las entidades territoriales y/o prestadores (Autorizaciones, permisos, concesiones, PUEAA, PSMV o PGIRS)
- Elaborar, ajustar, actualizar y/o revisar los proyectos de competencia del PDA Amazonas en los municipios, y las ANM del Departamento, para prestación al mecanismo viabilizador correspondiente.

4. DESARROLLO DEL PLAN AMBIENTAL 2025 – 2027

Dentro de la identificación para priorizar estos logros, se plantearon las de caracterización ambiental con acciones de conservación, de ordenamiento, manejo y restauración de cuencas, fuentes abastecedoras y receptoras, y de los sistemas hídricos urbanos, y por otra parte, el estado de mínimos ambientales, instrumentos de planeación y ordenamiento, con inversiones estratégicas en tres líneas: Planeación (Ambiental Territorial y Ambiental Sectorial), Conservación y Saneamiento Básico.


A continuación se plasma el resumen de compromisos financieros en el marco del Plan Ambiental:

Tabla 1. Compromisos financieros Plan Ambiental 2025-2027

ENTIDAD	VALOR
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación del Amazonas, Gestor del PDA Amazonas.	\$7.919.855.586
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.	\$4.655.000.000
Gobernación del Amazonas - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD.	\$1.600.000.000
Recursos Nación (Por Gestión).	\$2.100.000.000
TOTAL	\$16.274.855.586

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

Ilustración 1. Distribución de las fuentes de financiación

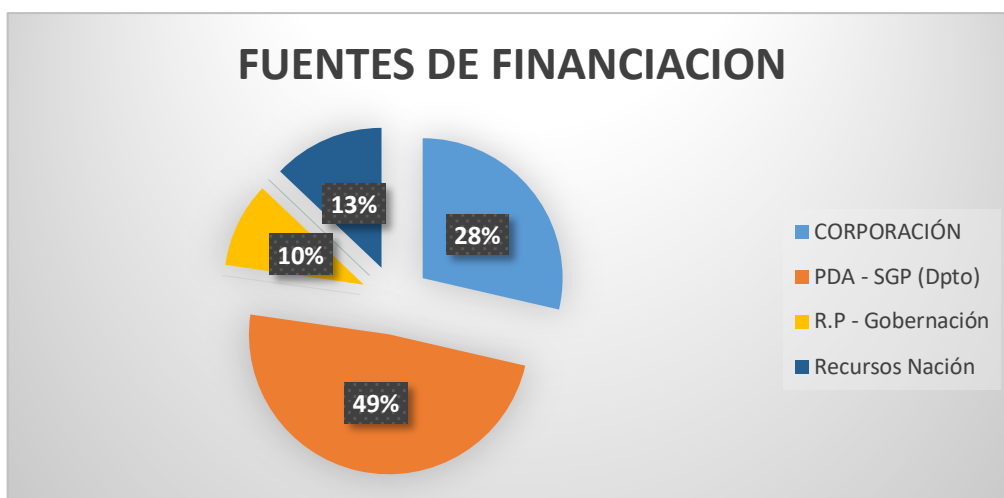

Fuente: Fuente: PA. PDA Amazonas 2025-2027

4.1. MARCO ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN AMBIENTAL

A continuación se presenta la identificación de las líneas estratégicas y fuentes de financiación de los proyectos priorizados y aprobados para el Plan Ambiental 2025-2027:

Tabla 2. Inversiones por línea estratégica

LINEA	VALOR APROBADO
Planeación	\$ 3.060.000.000
Conservación	\$ 1.300.000.000
Saneamiento	\$ 11.914.855.586
TOTAL	\$ 16.274.855.586

Fuente: PA. PDA Amazonas 2025-2027

Tabla 3. Proyectos aprobados en el Plan Ambiental 2025-2027

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	2024	2025	2026	2027
PLANEACION AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación del POMCA del río Loretoyacu (Puerto Nariño)	CORPOAMAZONIA	\$700.000.000			
	Implementación del POMCA del río Loretoyacu (Puerto Nariño)	CORPOAMAZONIA			\$ 2.000.000.000	
PLANEACION AMBIENTAL SECTORIAL	Estudio soporte para el trámite de 04 concesiones de aguas en las ANM de: Pedrera, Tarapacá, La Chorrera y El Encanto	SPDT – GESTOR PDA		\$ 360.000.000		
CONSERVACION	Implementación de un proyecto de pago por servicios ambientales (PSA) en las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro de	Secretaría de Agricultura Medio Ambiente y Productividad, Gobernación de Amazonas.		\$500.000.000	\$400.000.000	\$400.000.000

	los Lagos y San Juan de los Parentes, para la conservación del sistema hídrico Yahuaraca en el municipio de Leticia, Amazonas					
SANEAMIENTO BASICO	Apoyo a entes territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico	CORPOAMAZONI A		\$ 255.000.000		
	Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el casco urbano de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, la Pedrera y la Chorrera	SPDT – GESTOR PDA				\$2.159.855.586
	Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el área rural del municipio de Leticia - Sector Rio Amazonas - Santa Sofia, Macedonia y Mocagua	RECURSOS NACION			\$ 2.100.000.000	
	Mitigación de impactos en áreas de vertimientos puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de los sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simon Bolivar, Yahuaraca y Urumutú)	CORPOAMAZONI A: \$1.700.000.000 GOBERNACION PDA – FIA SGP APSB \$300.000.000			\$ 2.000.000.000	

	Protección de la fuente de abastecimiento del acueducto del centro poblado de la ANM la Chorrera y Puerto Santander mediante la construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa	PDA – SGP ANM			\$ 5.400.000.000	
			\$ 700.000.000	\$ 1.115.000.000	\$ 11.900.000.000	\$ 2.559.855.586
TOTAL PLAN AMBIENTAL 2025-2027					\$ 16.274.855.586	

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

5. AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

Los proyectos en seguimiento al Plan Ambiental 2025-2027, se evalúan frente a los que corresponden en ejecución para el periodo entre el mes de julio y diciembre de 2025, así:

5.1. COMPONENTE DE PLANEACIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presenta el avance de ejecución de los proyectos del sector de Planeación Ambiental Territorial y Sectorial ejecutados en la vigencia 2025, entre los cuales fue presentado como ejecutado y cumplido el proyecto de la Línea Estratégica de Planeación Ambiental Territorial, a cargo de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.14 del decreto 1076 de 2015 del MADS, la cual aprobó mediante la resolución 2091 del 22 de diciembre de 2023 el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LORETOYACU (Código 480-06), ubicada en la jurisdicción de la corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, Departamento de Amazonas, ejecutado mediante contrato No 254 del 11 de junio de 2020, por el valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$3.365.446.320).

Tabla 4. Proyectos de Planeación ambiental - Plan Ambiental 2025-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	Valor	ESTADO
PLANEACION AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación del POMCA del río Loretoyacu (Puerto Nariño)	CORPOAMAZONIA	\$ 700.000.000	EJECUTADO Y CUMPLIDO
	Implementación del POMCA del río Loretoyacu (municipio de Puerto Nariño)	CORPOAMAZONIA	\$ 2.000.000.000	Proyectado para la vigencia 2026
PLANEACION AMBIENTAL SECTORIAL	Estudio soporte para el trámite de 04 concesiones de aguas en las ANM de: Pedrera, Tarapacá, La Chorrera y El Encanto	SPDT – GESTOR PDA	\$ 360.000.000	Formulado técnicamente, en proceso de formulación y viabilización para contratación

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

5.2. COMPONENTE DE CONSERVACIÓN

El proyecto de CONSERVACIÓN a cargo de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad de la Gobernación de Amazonas, fue formulado, viabilizado y ejecutado durante la vigencia actual, en protección a la microcuenca Yahuaraca en la zona de las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro y San Juan de los Parentes, proyecto que fue articulado con la Autoridad Ambiental Territorial Amazonas, CORPOAMAZONIA, que para la vigencia 2025 tiene un valor de inversión de \$500.000.000, sin embargo, este fue contratado por un valor mayor que correspondió a \$878.603.900, así:

Tabla 5. Proyectos de conservación ambiental - Plan Ambiental 2025-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	Valor	ESTADO
CONSERVACION	Implementación de un proyecto de pago por servicios ambientales (PSA) en las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro de los Lagos y San Juan de los Parentes, para la conservación del sistema hídrico Yahuaraca en el municipio de Leticia, Amazonas	Secretaría de Agricultura Medio Ambiente y Productividad, Gobernación de Amazonas.	2025: \$500.000.000	EJECUTADO Y CUMPLIDO
			2026: \$400.000.000	En Formulación
			2027: \$400.000.000	Proyectado para 2027

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

La ejecución de este proyecto para la vigencia 2025, se llevó a cabo mediante el siguiente contrato:

- Contrato de compraventa No 2706 de diciembre de 2025, con objeto:

“COMPRAVENTA DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE DOS PROYECTOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA - EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS TICUNA Y COCAMA DE LA PLAYA Y COCAMA ISLA DE RONDA, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD, LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LA LET 2320 DE 2023”, por el valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 878.603.900).

5.3. COMPONENTE DE SANEAMIENTO BÁSICO

Para el componente de saneamiento básico, en la vigencia 2025 la Autoridad Ambiental Territorial Amazonas, CORPOAMAZONIA, en apoyo con la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad de la Gobernación de Amazonas, realizó la formulación y viabilización técnica del proyecto “Desarrollo de acciones de restauración del sistema hídrico Simón Bolívar, del Municipio de Leticia, en su fase 1, de Limpieza, descolmatación, disposición de residuos sólidos y lodos”, como parte del proyecto del Plan Ambiental: “Apoyo a entes territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico”.

Para la ejecución de este proyecto se realizó el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2440-2025, ENTRE LA GOBERNACION DE AMAZONAS, LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SU DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, Y LA ALCALDIA DE LETICIA, PARA LA RECUPERACION DE LOS SISTEMAS HIDRICOS URBANOS DE SAN ANTONIO Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE LETICIA, por un valor total de \$ 1.059.575.000, de los cuales CORPOAMAZONIA realizó una inversión de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES M/CTE (\$280.000.000).

Tabla 6. Proyectos de Saneamiento Básico - Plan Ambiental 2025-2027

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	VALOR	ESTADO
SANEAMIENTO BÁSICO	Apoyo a entes territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico	CAR	\$255.000.000	Contratado y en ejecución mediante convenio Interadministrativo 2440-2025 entre Gobernación de Amazonas – Alcaldía de Leticia – CAR.

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

A través de este mismo convenio, la GOBERNACIÓN DE AMAZONAS mediante la Secretaría de Agricultura, medio ambiente y productividad, y con alcance técnico al mismo proyecto de “Desarrollo de acciones de restauración del sistema hídrico Simón Bolívar, del Municipio de Leticia, en su fase 1, de Limpieza, descolmatación, disposición de residuos sólidos y lodos”, llevó a cabo la inversión económica por CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$450.000.000), recurso que también fue contratado durante la vigencia 2025, para el proyecto: Mitigación de impactos en áreas de vertimientos puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de los sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simón Bolívar, Yahuaraca y Urumutú), actividad inicialmente programada para la vigencia 2026, no obstante, se llevó cabo la contratación por parte de la Gobernación de Amazonas en la vigencia 2025.

Tabla 7. Proyectos de Saneamiento Básico - Plan Ambiental 2025-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	VALOR	ESTADO
SANEAMIENTO BÁSICO	Mitigación de impactos en áreas de vertimiento puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simón Bolívar, Yahuaraca y Urumutú)	CAR - GOBERNACIÓN	CORPOAMAZONIA \$ 1.700.000.000	Pendiente de formulación y ejecución
			GOBERNACION PDA – FIA SGP APSB \$ 300.000.000	Contratado y en ejecución mediante convenio interadministrativo 2440-2025 entre Gobernación de Amazonas – Alcaldía de Leticia – CAR.

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

Para el caso de los demás proyectos que hacen parte de esta línea estratégica, se encuentran en proceso de análisis técnico, a razón que están proyectados para la formulación y ejecución en las próximas vigencias, así:

Tabla 8. Proyectos de Saneamiento Básico - Plan Ambiental 2025-2027

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	VALOR	ESTADO
SANEAMIENTO BÁSICO	Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el casco urbano de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, la Pedrera y la Chorrera	PDA	\$ 2.159.855.586	Proyectado para la vigencia 2027
	Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el área rural del municipio de Leticia - Sector Río Amazonas - Santa Sofía, Macedonia y Mocagua	RECURSOS NACION	\$ 2.100.000.000	Proyectado para la vigencia 2026
	Protección de la fuente de abastecimiento del acueducto de los centros poblados y comunidades indígenas de las ANM mediante la construcción de unidades sanitarias con	PDA	\$ 5.400.000.000	Proyectado para la vigencia 2026

LINEA ESTRATEGICA	PROYECTO/ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	VALOR	ESTADO
	saneamiento básico para vivienda rural dispersa			

Fuente: Plan Ambiental 2025-2027

5.4. ANÁLISIS DE INVERSIONES

A continuación se muestra el resumen de las inversiones proyectadas y ejecutadas del Plan Ambiental del PDA Amazonas, hasta la vigencia 2025:

Tabla 9. Estado de proyectos 2025

Estado	# proyectos	%
En ejecución	0	0%
Terminado	4	40%
No ejecutado	6	60%
En contratación	0	0%
Sin información	0	0%
Suspendido	0	0%
TOTAL	9	100%

Fuente: PDA Amazonas. 2025-2027

De los anteriores, los proyectos a los que se refiere como “Terminados”, obedecen a los proyectos reportados en este informe como cumplidos y ejecutados durante la vigencia 2025, tal como fueron reportados anteriormente:

- Formulación del POMCA del río Loretoyacu (Municipio de Puerto Nariño); de la línea estratégica de PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL, a cargo de CORPOAMAZONIA.
- Implementación de un proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro de los Lagos y San Juan de los Parentes, para la conservación del sistema hídrico Yahuaraca en el municipio de Leticia, Amazonas; de la línea estratégica de CONSERVACIÓN, a cargo de la GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

- Apoyo a entres territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico; de la línea estratégica de SANEAMIENTO BÁSICO, a cargo de CORPOAMAZONIA.
- Mitigación de impactos en áreas de vertimiento puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simón Bolívar, Yahuaraca y urumutu); de la línea estratégica de SANEAMIENTO BÁSICO, a cargo de la GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

Conforme a lo informado anteriormente, se presenta el estado de la inversión realizada por línea estratégica:

Tabla 10. Inversión y ejecución por línea estratégica

LINEA	VALOR APROBADO	VALOR COMPROMETIDO	PORCENTAJE EJECUTADO
Planeación	\$ 3.060.000.000	\$ 700.000.000	23%
Conservación	\$ 1.300.000.000	\$ 878.603.900	68%
Saneamiento	\$ 11.914.855.586	\$ 705.000.000	6%

Fuente: PDA Amazonas. 2025-2027

A continuación se deja trazabilidad de la ejecución del Plan Ambiental 2025-2027 hasta diciembre de 2025, soportado a través de las evidencias que se reportan en el documento adjunto “matriz de seguimiento del Plan Ambiental Amazonas. Sem. 2-2025.

Tabla 11. Estado ejecución Plan Ambiental 2025 y soporte de evidencias

Item	LINEA ESTRATÉGICA	PROYECTOS	FONDOS	VALOR PLANIFICADO 2025	VALOR EJECUTADO	NOMBRE DE LA EVIDENCIA
1	PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación del POMCA del río Loretoyacu (Municipio de Puerto Nariño)	CAR	\$ 700.000.000	\$ 700.000.000	Res_2091_22-12-2023 Adopción POMCA Loretoyacu.pdf
2		Implementación del POMCA del río Loretoyacu (Municipio de Puerto Nariño)	CAR	N/A	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025
3	PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Estudios soporte para el trámite de 4 concesiones de aguas en las áreas no municipalizadas de:	PDA SGP ANM	\$ 360.000.000	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025

Item	LINEA ESTRATÉGICA	PROYECTOS	FONDOS	VALOR PLANIFICADO 2025	VALOR EJECUTADO	NOMBRE DE LA EVIDENCIA
		(Pedrera, Tarapacá, La Chorrera, El Encanto)				
4	CONSERVACIÓN	Implementación de un proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro de los Lagos y San Juan de los Parentes, para la conservación del sistema hídrico Yahuaraca en el municipio de Leticia, Amazonas.	GOBERNACIÓN	\$ 500.000.000	\$ 878.603.900	PSA - CONTRATO 2706-2025
5	SANEAMIENTO BÁSICO	Apoyo a entres territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico	CAR	\$ 255.000.000	\$ 280.000.000	Convenio interadministrativo 2440-2025. Dpto-Mpio-CAR
6		Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el casco urbano de las áreas no municipalizadas de Tarapacá, la Pedrera y la Chorrera	PDA SGP ANM	N/A	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025
7		Establecimiento de soluciones para tratamiento de residuos orgánicos y reciclables en el área rural del municipio de Leticia - Sector Río Amazonas - Santa Sofía, Macedonia y Mocagua	RECURSOS NACIÓN	N/A	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025
8		Mitigación de impactos en áreas de vertimiento puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simón Bolívar, Yahuaraca y urumutu)	CAR	N/A	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025
			GOBERNACIÓN	\$ 300.000.000	\$ 450.000.000	Convenio interadministrativo 2440-2025. Dpto-Mpio-CAR
9		Protección de la fuente de abastecimiento del acueducto de los centros poblados y comunidades indígenas de las ANM mediante la construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa	PDA SGP ANM	N/A	N/A	Informe de seguimiento al PA. Sem 2-2025

Fuente: Plan Ambiental. PDA Amazonas 2025

6. CONCLUSIONES

Durante el segundo semestre de 2025, en seguimiento al Plan Ambiental 2025-2027 se adelantó la contratación y ejecución del proyecto denominado: Apoyo a entes territoriales para la conservación, descontaminación y/o monitoreo del recurso hídrico, perteneciente a la línea estratégica de Saneamiento Básico, a cargo de CORPOAMAZONIA proyectado inicialmente por \$255.000.000, sin embargo, fue contratado por \$280.000.000 mediante convenio interadministrativo No 2440 de 2025.

Así mismo, mediante este mismo convenio No 2440-2025 entre CORPOAMAZONIA, ALCALDIA DE LETICIA y GOBERNACIÓN DE AMAZONAS, se dio cumplimiento en contratación y ejecución al proyecto denominado Mitigación de impactos en áreas de vertimientos puntuales en el marco de la implementación de los planes de manejo de los sistemas hídricos urbanos del Municipio de Leticia (San Antonio, Simón Bolívar, Yahuaraca y Urumutú), a cargo de la Gobernación de Amazonas, el cual fue proyectado para inversión para la vigencia 2026, no obstante, este fue ejecutado en la vigencia 2025 por un valor de \$450.000.000.

Por último, la GOBERNACION DE AMAZONAS a través de la Secretaría de Agricultura Medio Ambiente y Productividad, realizó la contratación y ejecución del proyecto denominado “Implementación de un proyecto de pago por servicios ambientales (PSA) en las comunidades indígenas de San Antonio de los Lagos, San Pedro de los Lagos y San Juan de los Parentes, para la conservación del sistema hídrico Yahuaraca en el municipio de Leticia, Amazonas” de la línea estratégica de Conservación, el cual fue ejecutado y cumplido mediante el contrato de compraventa No 2706 de diciembre de 2025 por un valor de \$878.603.900; valor que superó el valor inicialmente propuesto por \$500.000.000 para la vigencia 2025.

Por otra parte, en análisis sobre los proyectos aprobados del PEI 2025 del PDA Amazonas y tras formulación técnica en los proyectos aprobados en el componente de infraestructura, se determinó que los proyectos del Plan Ambiental correspondientes a: 1. Estudios soporte para el trámite de 4 concesiones de aguas en las áreas no municipalizadas de: (Pedrera, Tarapacá, La Chorrera, El Encanto), y 2. Protección de la fuente de abastecimiento del acueducto de los centros poblados y

comunidades indígenas de las ANM mediante la construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa, serán reestructurados para su modificación en nombre, alcance y/o valor de inversión, a razón que el proyecto número 1, que corresponde a la línea estratégica de planeación sectorial, será incluido para las ANM de inversión en los proyectos LLAVE EN MANO de mejoramiento de los acueductos, y que tras analizar la formulación técnica y presupuesto del proyecto 2, que corresponde a la línea de saneamiento básico con la construcción de unidades sanitarias para viviendas rurales dispersas, se presentan costos muy elevados de inversión dadas las condiciones de acceso a las comunidades, y que entre otras, la mayoría se encuentran muy dispersas y/o distantes a los puntos de captación de las fuentes abastecedoras de los acueductos.


Dado lo anterior, se contempla la necesidad de modificar la inversión proyectada y aprobada en el Plan Ambiental 2025-2027, para los proyectos que se encuentran pendientes de ejecución.

Sin otro en particular, cordialmente,



JHONNY FERNEY PINTO SERAFÍN
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Gestor PDA

Adjunto: 1. Matriz Seguimiento PA Amazonas. Sem 2-2025; 2. Res_2091_22-12-2023 Adopción POMCA Loretoyacu; 3. Convenio interadministrativo 2440-2025. Dpto-Mpio-CAR; 4. PSA - CONTRATO 2706-2025.

Proyectó:	Francy Pérez	Cargo: P.E. SPDT - PDA	Firma: 
Proyectó:	Kevin Gamez	Cargo: P.U. SPDT - PDA	Firma: 
Revisó:	Javier Bejarano	Cargo: P.E. SPDT - PDA	Firma: 
Revisó:	Reimer Cordero	Cargo: PE SPDT-PDA	Firma: 
Revisó:	Claudia Juliana Dulcey C.	Cargo: Asesora Despacho Gobernador	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			
