



ACTA DE REUNIÓN No.		4	
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Subdirección Técnica Operativa			

Página 1 de 3

FECHA			Preside la reunión: Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.								
DD	MM	AAAA	Secretario: Catalina Camacho								
27	08	2025	Lugar: Virtual								
Hora de Inicio: 11:00			a.m.	X	p.m.	Hora de Cierre: 12:00			a.m.	X	p.m.
Tema de reunión:			Comité Técnico de Seguimiento Convenio Interadministrativo JBB – UAESP 008 de 2025.								
Grupo que se reúne:			Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP/Jardín Botánico de Bogotá - JBB								
ASISTENTES CON COMPROMISOS EN EL ACTA											
NOMBRE			CARGO			FIRMA					
Yon Plazas Gómez			Profesional Universitario UAESP								
Maria Elena Díaz Arias			Profesional Universitario UAESP								
Liseth Paola Piñeros Urrego			Coordinadora Restauración Ecológica JBB - STO								
Catalina Camacho Fandino			Coordinadora Convenios JBB - STO								
NOTA: Para los asistentes que no tienen compromisos en la presenta acta se adjunta lista de asistencia											
ORDEN DEL DÍA (Describe brevemente los temas a tratar)											
<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento al Convenio Varios 											
DESARROLLO DE LA REUNIÓN											
<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento al Convenio <p>Se revisó el estado de la cuenta de cobro, concluyendo que la documentación está completa, salvo la expedición del oficio de Hacienda para viabilizar el pago, el cual debe ir firmado por ambas entidades y proyectado por la UAESP.</p> <p>Yon Alexander Plazas informó que, en caso de su ausencia durante septiembre, la ingeniera Maria Elena Díaz apoyará el seguimiento del convenio y el proceso contractual del cerramiento.</p> <p>Liseth Paola Piñeros presentó los avances en el predio San Isidro, destacando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Preparación del terreno y control del cardo, especie invasora. Solicitud de apoyo para la recolección del material vegetal retirado, actualmente apilado en el predio. 											

ACTA DE REUNIÓN No.		4	
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Subdirección Técnica Operativa			

Página 2 de 3

- Plantaciones en polígonos 1 a 5 y mantenimiento a individuos previamente establecidos. Pendiente la plantación en los polígonos 6,7 y 8 los cuales requieren el cerramiento. Se registró que hasta la fecha se han plantado cerca de 6.000 individuos en julio y 3.000 individuos en agosto.
- Limitantes en la plantación por la falta de cerramiento, dado el ingreso recurrente de ganado.

Se discutió la planificación de actividades para septiembre, enfocándose en el control de invasoras y el cerramiento de polígonos. La profesional Paola mencionó que si se finalizan las actividades antes de lo planeado, el equipo podría trasladarse a otros proyectos, lo que podría afectar la disponibilidad operativa en el área. También se evaluó la viabilidad de realizar actividades de plantación en paralelo con el cerramiento.

Se informó que el cerramiento tiene un tiempo estimado de ejecución de 45 días a partir de la firma del acta de inicio contractual, previsto para la siguiente semana. Asimismo, se revisaron las coordenadas de los broches de acceso (dos broches), acordando ajustar la ubicación en coordinación con el contratista.


2. Varios.

- Se mencionó la necesidad de garantizar vehículos para las jornadas de plantación y coordinar la logística de ingreso de material vegetal.
- Se ratificó la importancia de mantener el control de especies invasoras y continuar con actividades de mantenimiento en septiembre.

Evidencias de la reunión:

ACTA DE REUNIÓN No.		4	
INTERNA		EXTERNA	X
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN			
Subdirección Técnica Operativa			

Página 3 de 3

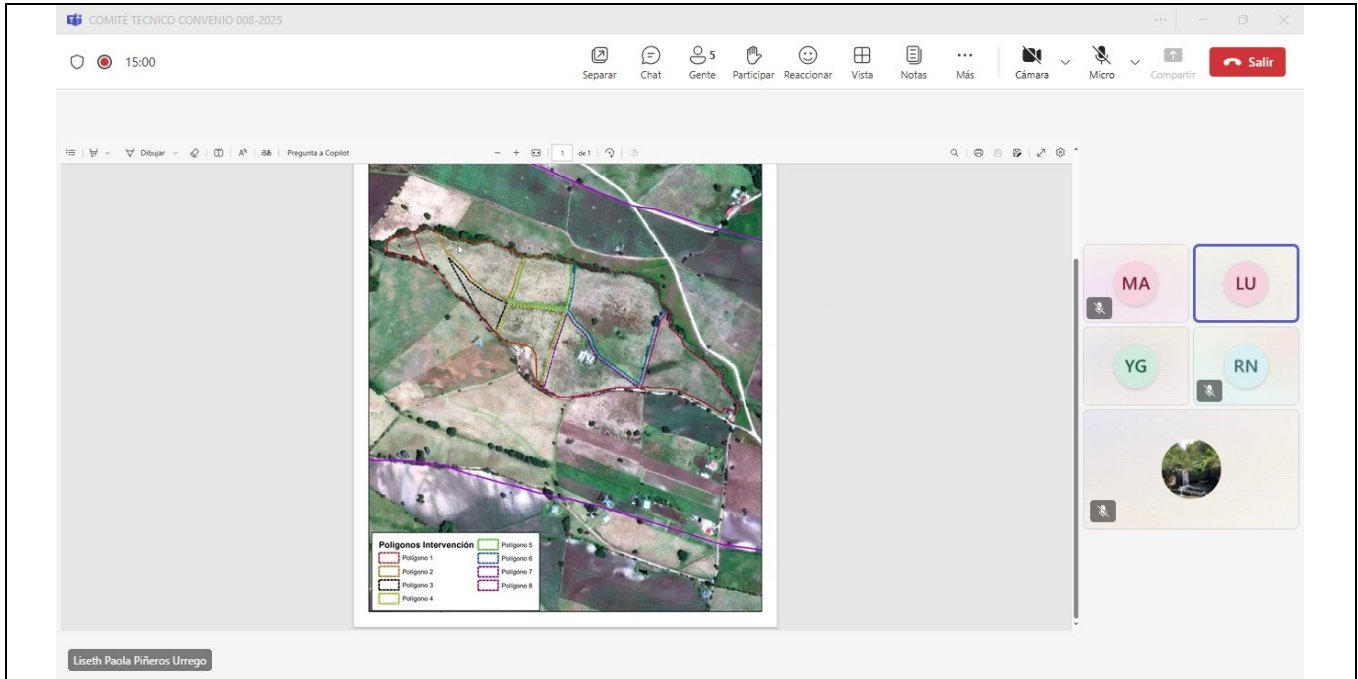

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Consultar con la Subdirección de Recolección sobre la recolección del material vegetal en el predio San Isidro.	UAESP	Septiembre 2025
Enviar coordenadas de los broches para el cerramiento al equipo operativo.	UAESP	Septiembre 2025
Radicar oficio a Secretaría de Hacienda para aprobación de recursos.	UAESP-JBB	Septiembre 2025

ELABORÓ: Catalina Camacho
