1	Analizar qué proyectos podrán ser apoyados por el Plan Fronteras.	15/06/2024	Giovanna Vásquez

4. RELACIÓN DE ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ANEXO
	Ninguno

5. LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA O ENTIDAD*	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE CONTACTO	FIRMA**
MIGUEL FELIPE ARAGÓN GONZALEZ	Alcalde	Alcaldía de Maicao	desarrolloeconomico@maicao-laguajira.gov.co	-	VIRTUAL
EDWIN YECITH SOLANO GARCÍA	Secretario de Desarrollo Económico Municipal	Alcaldía de Maicao	desarrolloeconomico@maicao-laguajira.gov.co	-	VIRTUAL
YENNIFER IGUARÁN LÓPEZ	Dirección de Desarrollo Fronterizo	Alcaldía de Maicao	desarrolloeconomico@maicao-laguajira.gov.co	-	VIRTUAL
MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO	Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza	DIDIF	mariadelpilar.gonzalez@cancilleria.gov.co	-	VIRTUAL
GIOVANNA ANDREA VÁSQUEZ RIVERA	Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo	DIDIF	giovanna.vasquez@cancilleria.gov.co	-	VIRTUAL
YENNY ZULEIMA CARREÑO CONTRERAS	Asesora	DIDIF	yenny.carreno@cancilleria.gov.co	-	VIRTUAL

*** Remitirse al literal c del numeral 5 en el instructivo del formato.**

**** Remitirse al literal f del numeral 5 en el instructivo del formato.**

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", es el responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó, informarle sobre los asuntos relacionados con las Gestión de la Entidad en desarrollo de nuestras funciones; y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

El Titular de los Datos Personales autoriza el tratamiento de su información aquí registrada y puede ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.


Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales

Alcaldía de
MAICAO


DIRECCION DE
DESARROLLO FRONTERIZO

PASO FONTERIZO MUNICIPIO DE MAICAO
LA RAYA – PARAGUACHON


Alcaldía de
MAICAO
CENTRO CULTURAL BINACIONAL

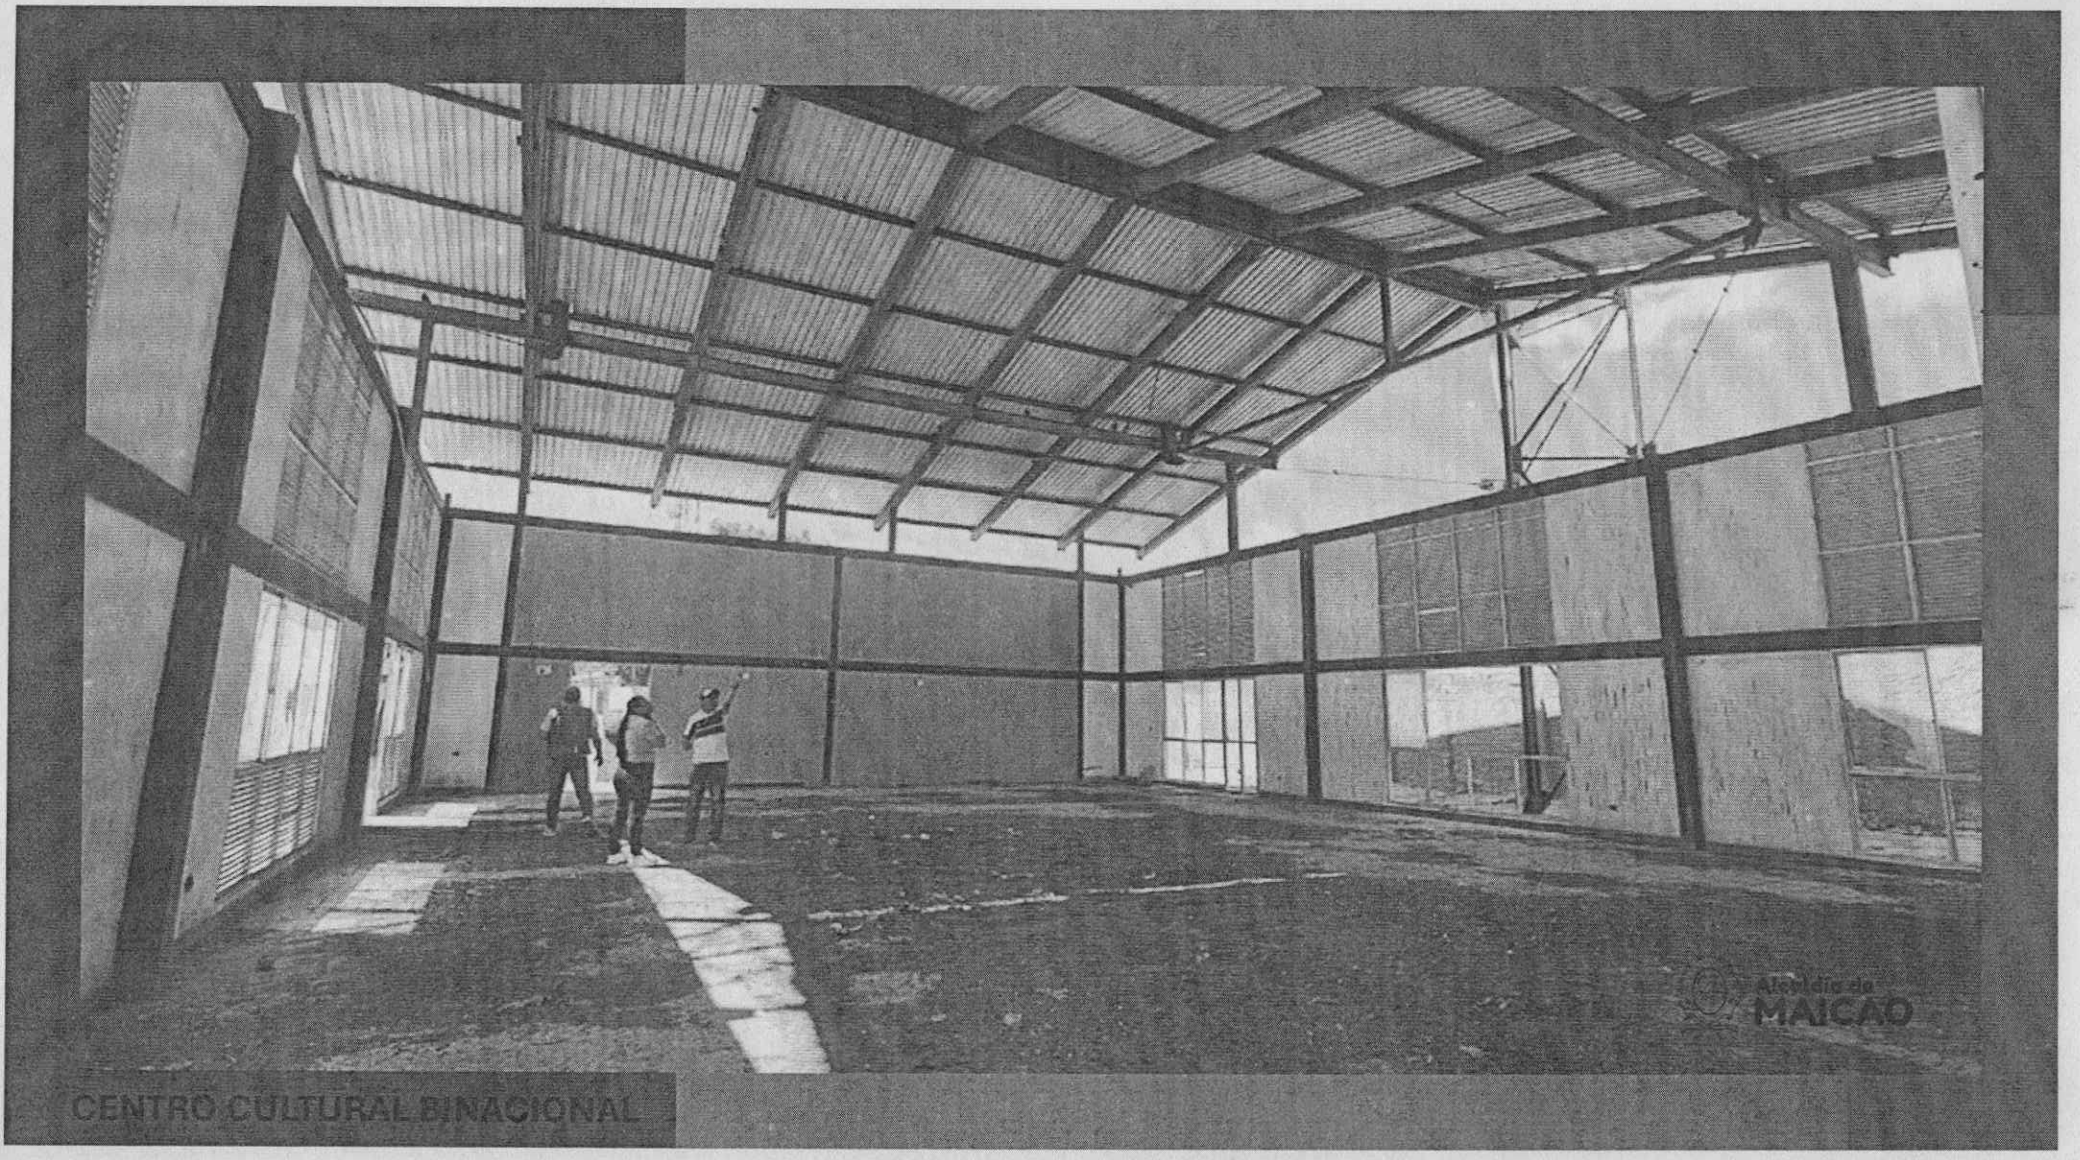



CENTRO CULTURAL BINACIONAL

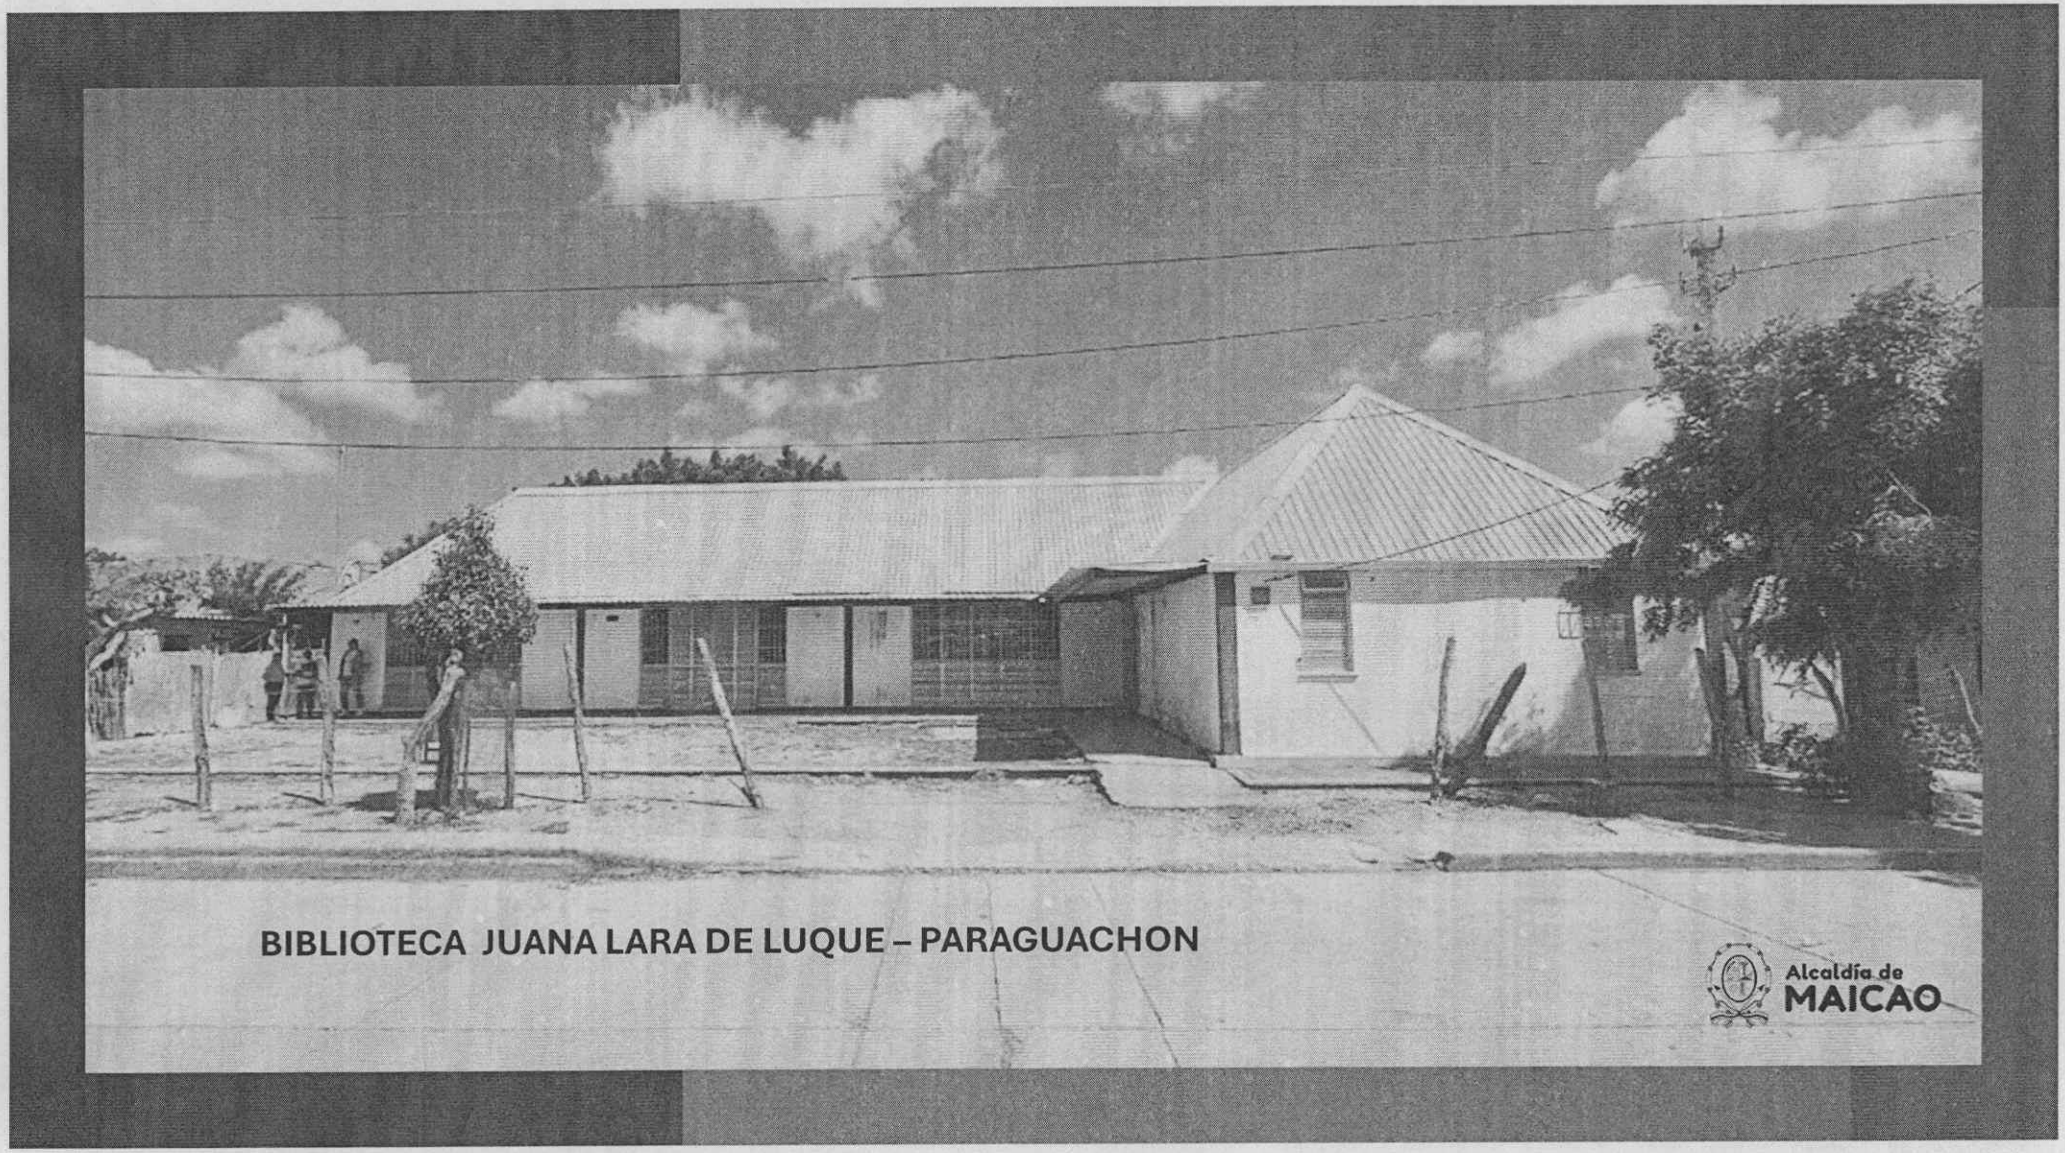


BIBLIOTECA JUANA LARA DE LUQUE – PARAGUACHON

Alcaldía de
MAICAO

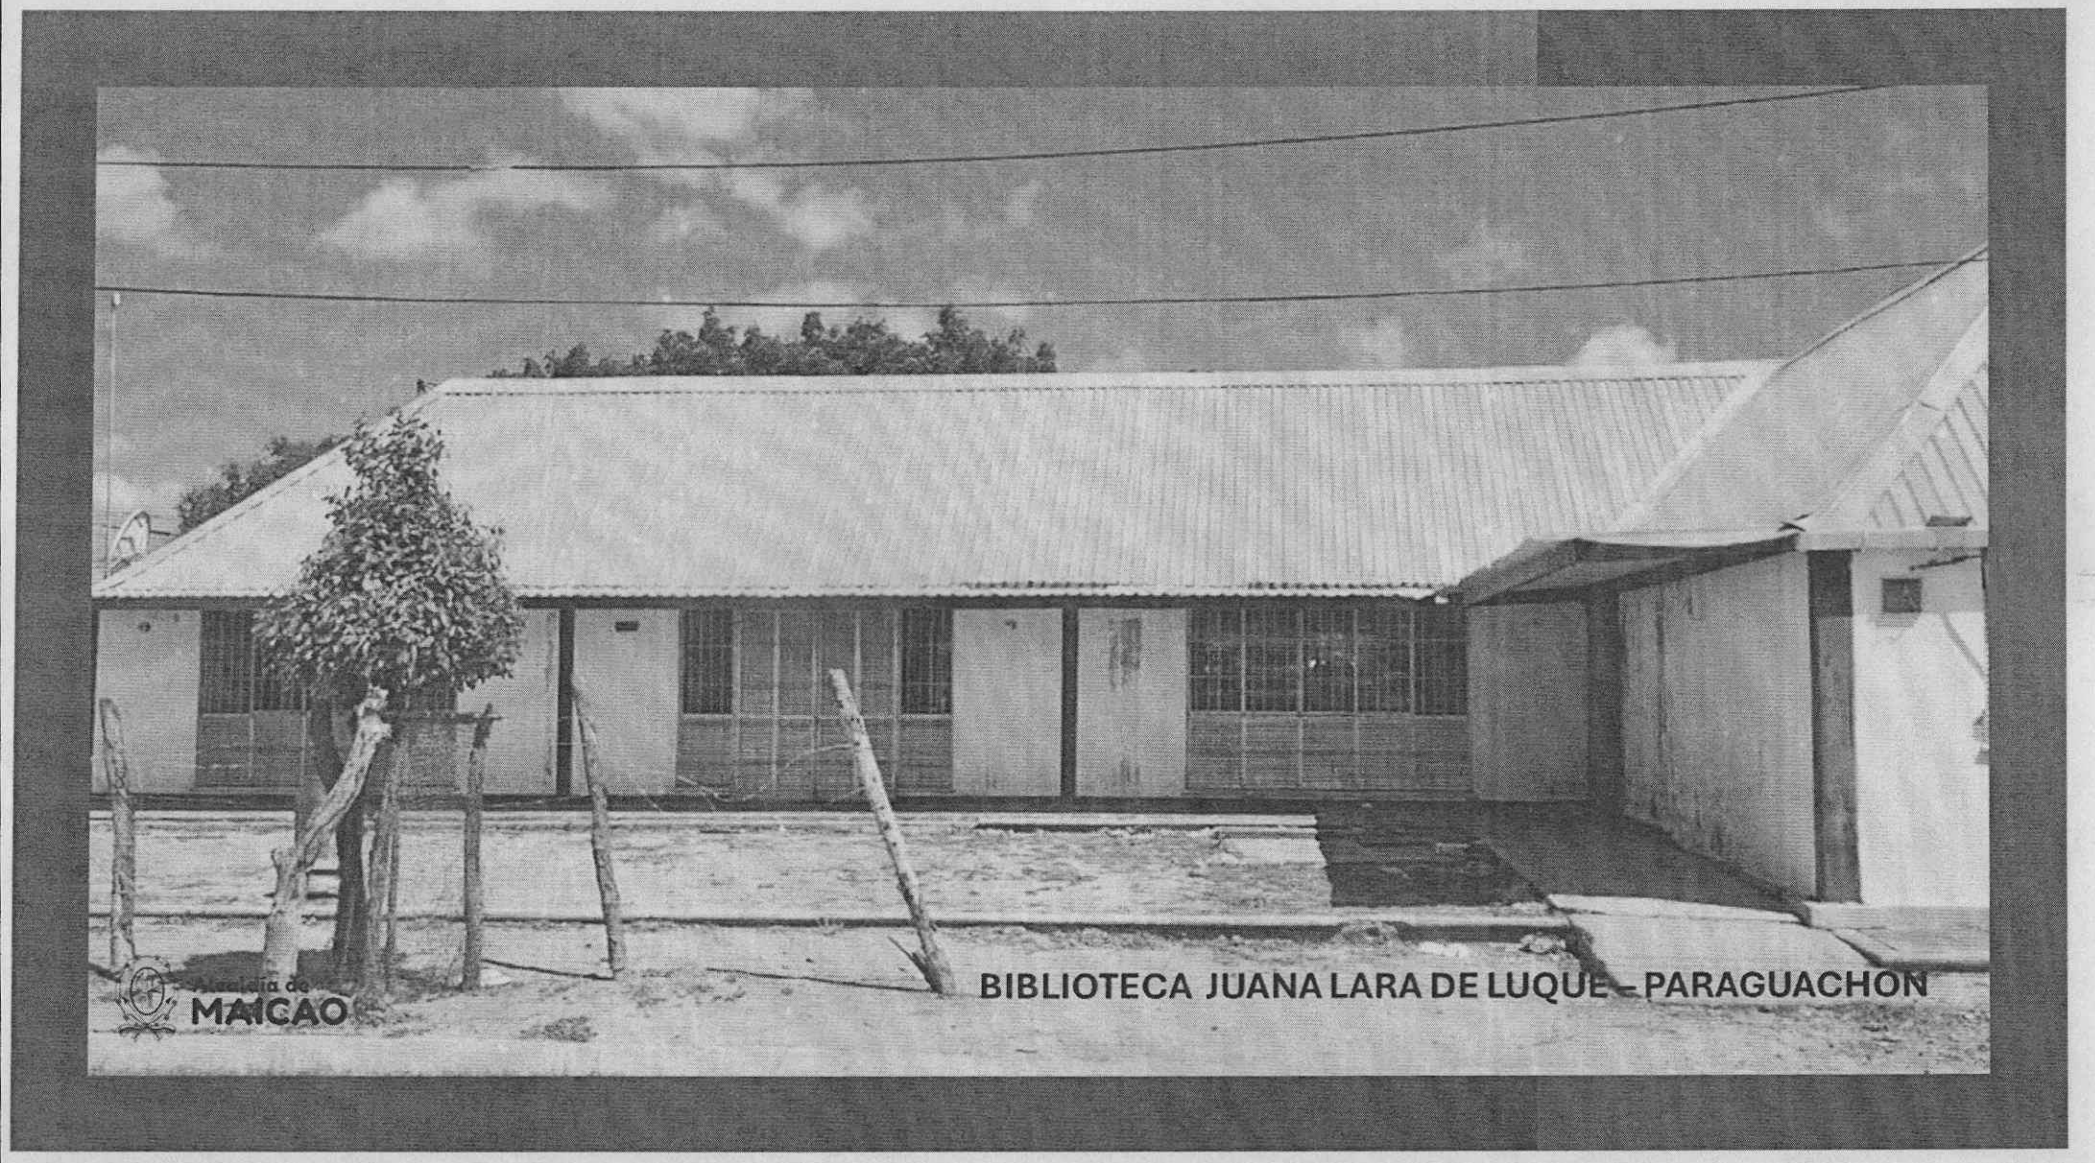
Alcaldía de
MAICAO
BIBLIOTECA JUANA LARA DE LUQUE – PARAGUACHON

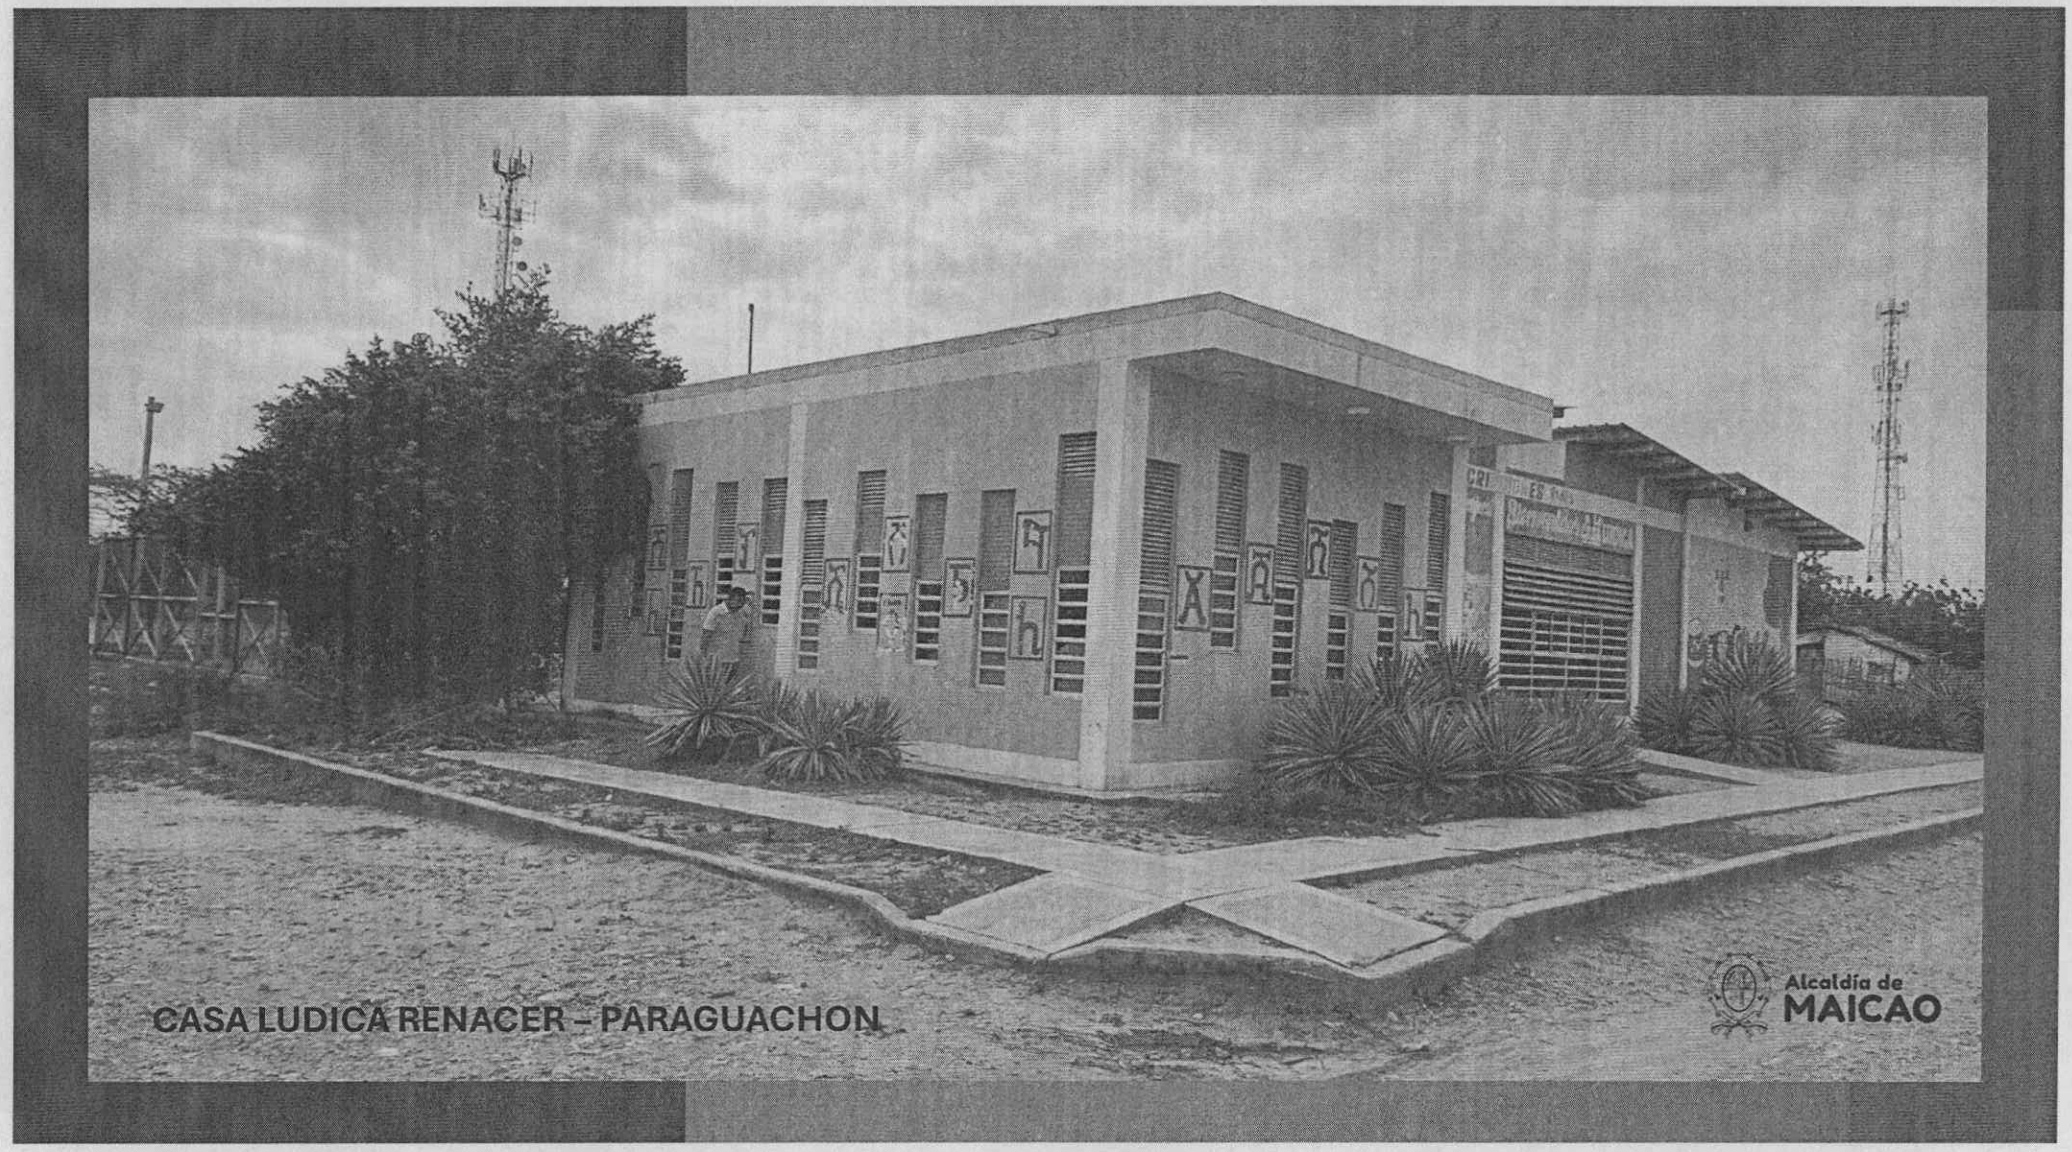
CASA LUDICA RENACER – PARAGUACHON
Alcaldía de
MAICAO



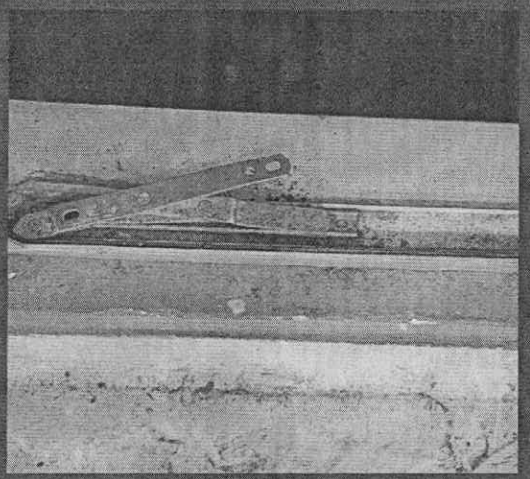





CASA LUDICA RENACER – PARAGUACHON


Alcaldía de
MAICAO




POLIDEPORTIVO RENACER – PARAGUACHON



POLIDEPORTIVO RENACER – PARAGUACHON
Alcaldía de
MAICAO


POLIDEPORTIVO RENACER – PARAGUACHON
Alcaldía de
MAICAO

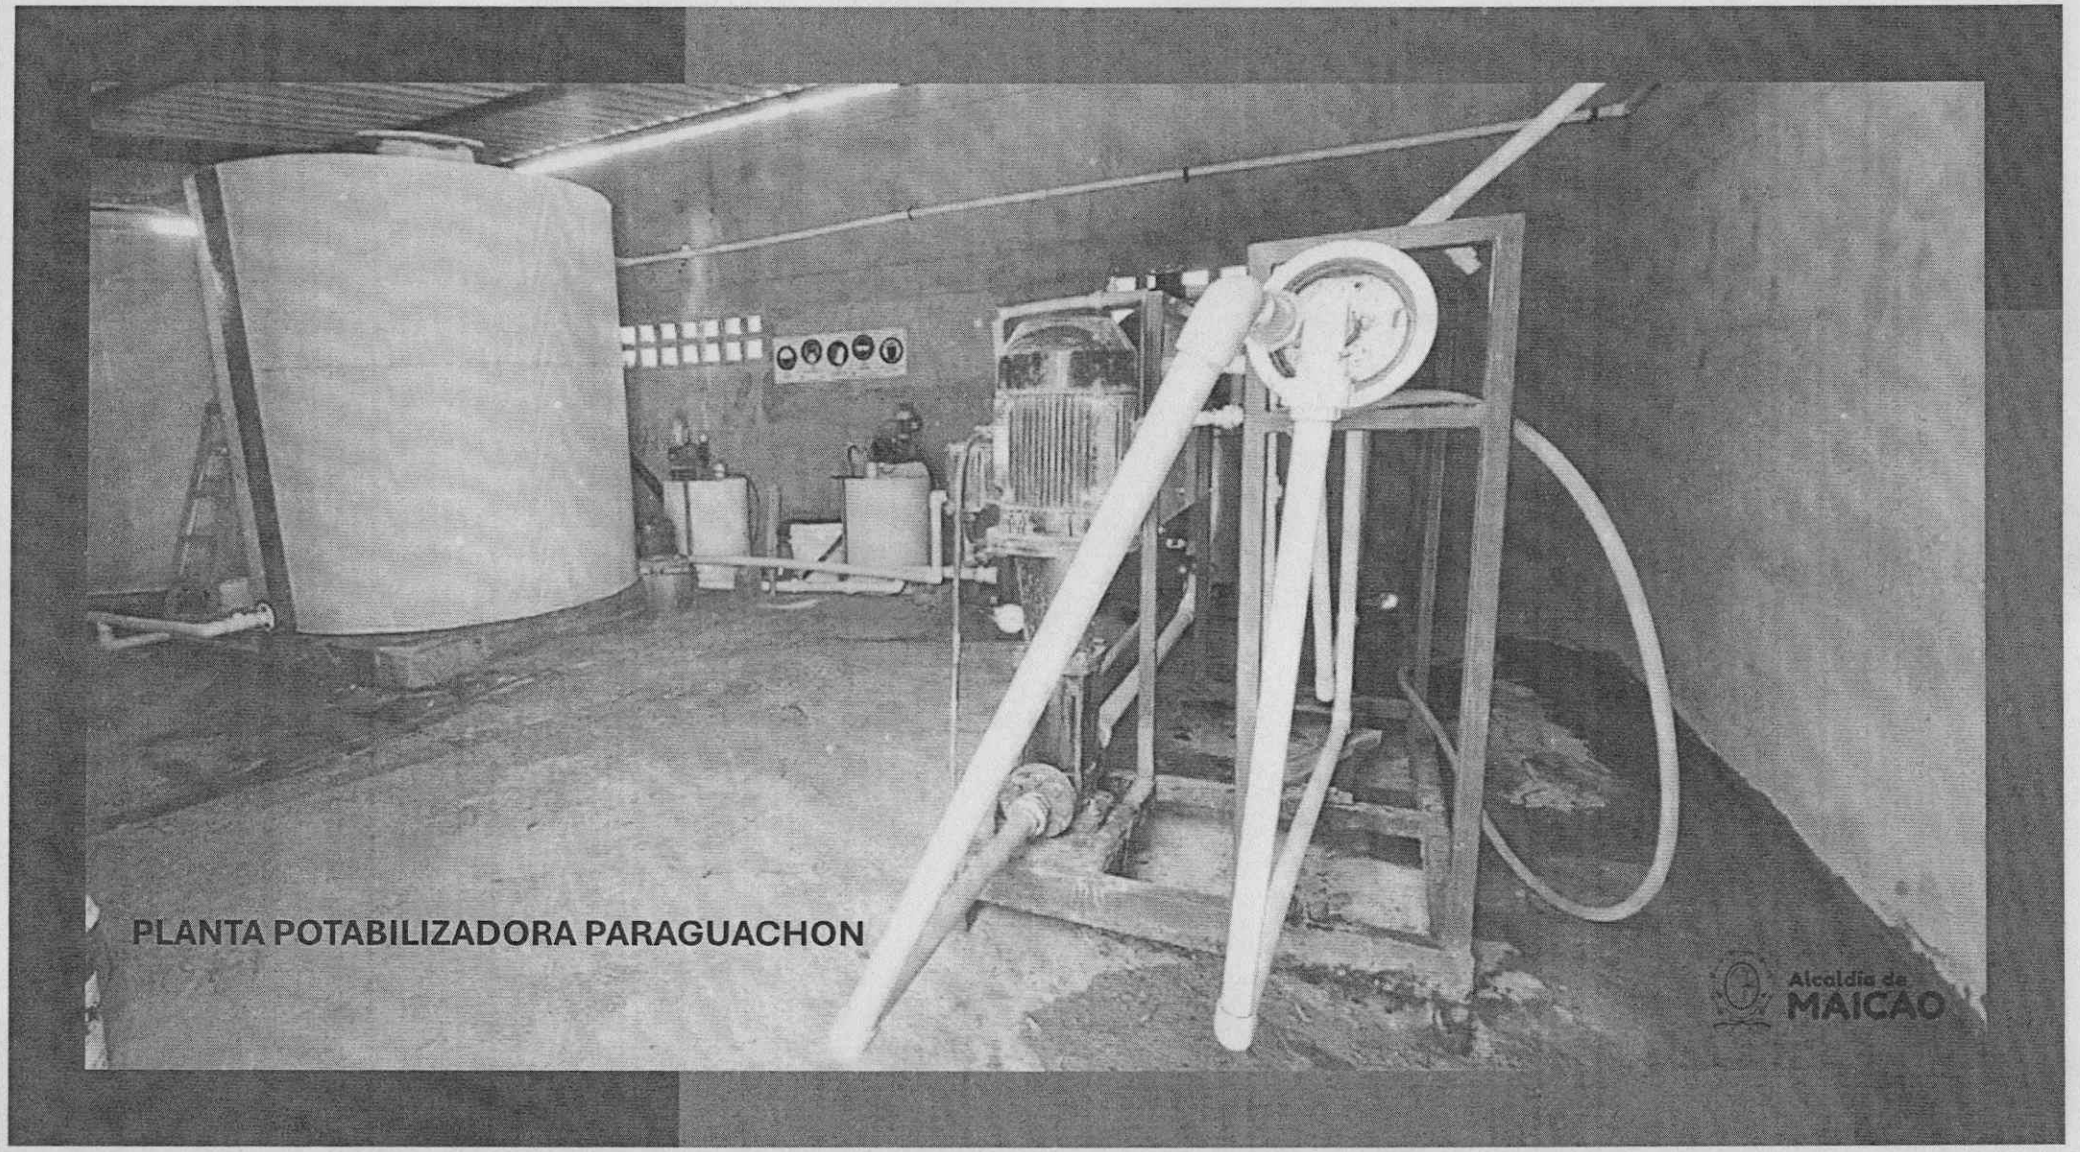
PLANTA POTABILIZADORA PARAGUACHON
Alcaldía de
MAICAO


PLANTA POTABILIZADORA PARAGUACHON
Alcaldía de
MAICAO

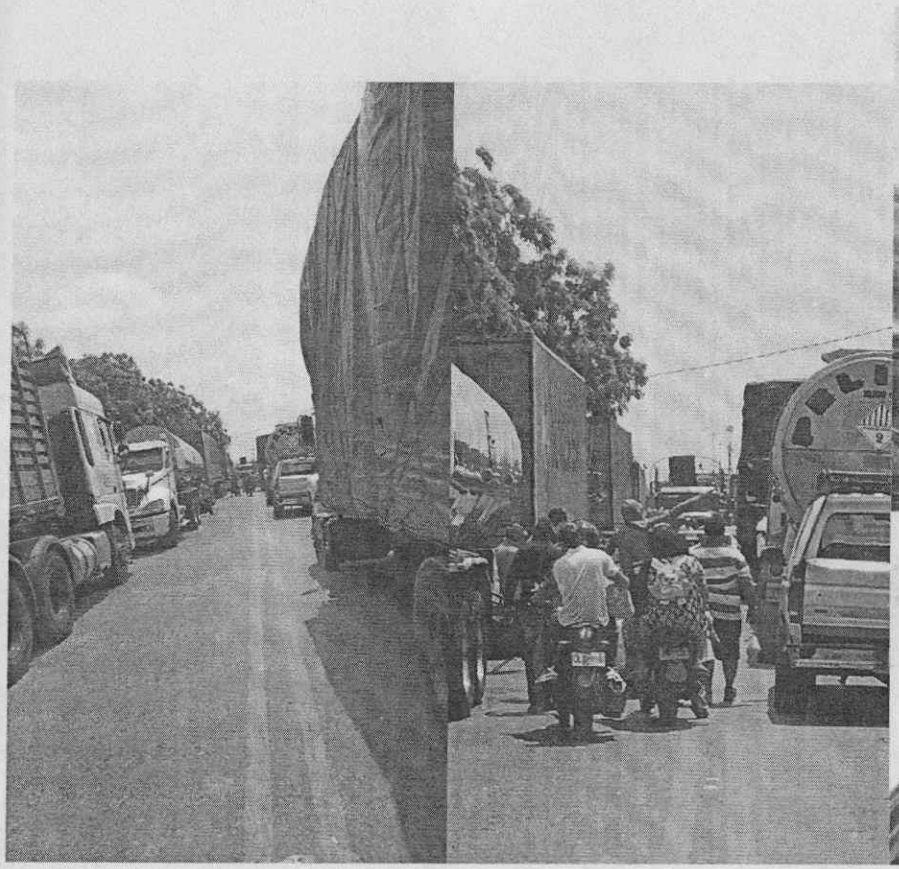

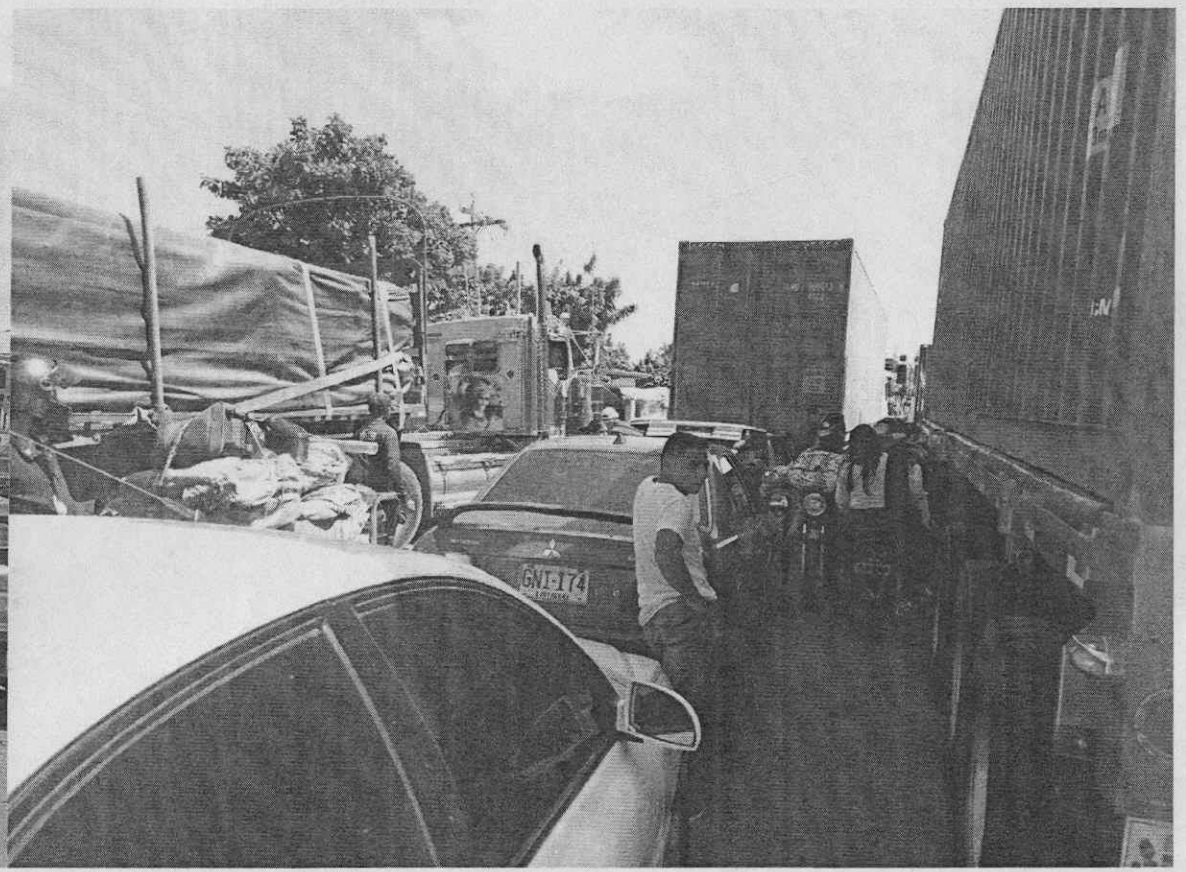

PASO FRONTERIZO – LA RAYA FRONTERA COLOMBOVENEZOLANA

Alcaldía de
MAICAO

NOMBRE DEL PROYECTO: Adecuación de la infraestructura y dotación de la Casa Lúdica y el Centro Binacional Francisca Sierra, en el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao.			
Proponente	Municipio de Maicao	**Nit.**	89212002009
Nombre del Representante Legal	MIGUEL FELIPE ARAGÓN GONZALEZ	**Cédula Representante Legal**	1.124.006.200
Naturaleza Jurídica del proponente	Entidad Pública	**Sector Plan Fronteras**	Cultura

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Maicao es un municipio ubicado en zona de fronteriza constituido con una población aproximada de 203.769 según proyección del DANE. Además, tiene seis (6) comunas; cinco (5) urbanas y una (1) rural. El corregimiento de Paraguachón hace parte de la comuna síes (6) zona rural, donde está el Centro Binacional Francisca Sierra y la Casa Lúdica.

El Centro Binacional Francisca Sierra, fue creado en el año 2006 por gestión realizada por Nubia Verdugo, Inés Santos y Salin Torregrosa, ante la Alcaldía liderada en ese entonces por la señora Dayssi Hernández Sierra. La gestión consistió en satisfacer la necesidad de un espacio donde niños, niñas, jóvenes y adolescentes pudieran tener un espacio para sus quehaceres escolares y además poder tener un lugar de reuniones y eventos que requiere toda comunidad. La alcaldesa gestionó ante la Embajada de Japón un recurso a través de un proyecto que se socializó con comunidad, el cual consistió en un salón de eventos y una biblioteca pública. A inicio del 2008 se entregó la obra del Centro Binacional Francisca Sierra con una biblioteca dotada de elementos y material tecnológico, bibliográficos, mobiliarios para su funcionamiento. Se creó un grupo de la población para administración y sostenibilidad. Luego, a la biblioteca se le dio el nombre de Juan Lara de Luque en honor al escritor. Desde hace cuatro años el funcionamiento del Centro Binacional Francisca Sierra decayó, perdiendo su capacidad logística para beneficiar a los pobladores. En estos momentos la biblioteca Juan Lara de Luque presta servicios de biblioteca como lectura en voz alta, préstamo de libros, sala de consulta, servicios de extensión de biblioteca en UCAS, cine cultural. Además, se presta la sala de lectura para el programa alfabetización adulto mayor y a la fundación culturizarte que dicta cursos.

La Casa Lúdica está ubicada en el barrio Renacer habitado por un número aproximado de 384 personas que viven en 96 casas. En este espacio se realizan prácticas artísticas de taller de danza, acordeón, guitarra, piano, cine cultura, juegos motrices, actividades de fortalecimiento de participación comunitaria (Comité de Participación de Casa Lúdica), actividades lúdicas y recreativas gestionadas ante el ejército y otras instituciones, apoyo a instituciones para la realización de jornadas de salud, acciones de ACNUR (Proceso de PTEP, atención a migrantes, diagnóstico participativo), Programa Sonidos de Esperanza de Fundación Batuta, FUPAD y Pastoral Social, Diagnostico Participativo, World Visión, Save de The Childrens. También hay presencia de la Escuela

Powered by CamScanner

Municipal de formación deportiva, grupo de teatro, iglesia, Parroquia de Paraguachón, Renacer del Folclor, grupo de danza y la Fundación Culturizarte.

A pesar de ello, es insuficientes el acceso a la oferta de bienes y servicios culturales, y de atención de la biblioteca, debido a las precarias condiciones logísticas, de mobiliario, vestuarios y de instrumentos; así como el deficiente estado de la infraestructura por falta de mantenimiento preventivo, los daños, robos, las acciones trópicas y la antrópicas, obsolescencia de los recursos tecnológicos, deterioro de instrumentos, material bibliográfico y didácticos por uso.

Como consecuencia, han disminuido las prácticas artísticas y culturales, lo que pone en riesgo los valores y principios culturales, la pérdida de identidad cultural y el aumento del ocio. Esto deja en claro que no hay garantías para el goce de los derechos culturales para atención de los niños, niñas, adolescentes y adultos que demandan la programación de actividades que les permita participar de la vida cultural. Lo anterior, evidencia la necesidad de invertir en la infraestructura y los equipamientos a través de dotación, adecuación, reforzamiento, ampliación y mantenimiento de los inmuebles culturales existentes en el corregimiento de Paraguachón.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica desde el marco legal, en consonancia a los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce que la cultura es fundamento de la nacionalidad y parte integral de los llamados derechos económicos, sociales y culturales debe promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los (las) colombianos en igualdad de oportunidades en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística.

En el artículo 17 de la Ley 397 de 1.997 dispone que *"El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica"*.

El artículo 26 de la citada ley estipula *"El Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las gobernaciones, las alcaldías municipales y distritales y a los cabildos indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales sin ánimo de lucro que fomenten el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte con énfasis en el público infantil y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad"*.

En lo que respecta a la atención institucional, este proyecto se plantea la solución a la problemática que ha venido afectando de forma negativa por las condiciones que presenta el Centro Binacional Francisca Sierra y la Casa Lúdica, pues al no estar en capacidad de prestar un servicio eficiente a la

Powered by CamScanner

comunidad, desfavorece el desarrollo libre de las capacidades estéticas, culturales, intelectuales y productivas de los habitantes del corregimiento de Paraguachón del Municipio de Maicao. Esta acción obedece a las apuestas del Gobierno Nacional en su Plan de Desarrollo de intervenir en las diferentes infraestructuras culturales como espacios de vida y proporciona las posibilidades de aprovechar las capacidades estéticas y creativas de los habitantes de Paraguachón, las cuales están truncadas por la baja capacidad de servicio del Centro Binacional Francisca Sierra y la Casa Lúdica.

En las dos infraestructuras a intervenir en el corregimiento de Paraguachón, también se requiere ofertar diferentes talleres de formación artístico y cultural, pero, los vestuarios y los instrumentos están en mal estado y son insuficientes para el número de asistentes a los talleres. Además, no se cuenta con equipos y amplificación sonido, los computadores y demás equipos tecnológicos están en obsoletos y fuera de servicios, limitando el acceso a la información y el conocimiento de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Los nuevos elementos y equipos tecnológicos, vestuarios, instrumentos y mobiliario, permitirán el mejoramiento acceso a la oferta cultural y artística, las prácticas en formación y en la realización de eventos que promuevan espacios y lugares seguros donde se puedan desarrollar capacidades y potenciales. También, permitirá el acceso a plataformas educativas, convocatorias y formación virtual que mejora el nivel académico de los estudiantes, jóvenes y en adultos, su cualificación, su capacidad laboral y productiva.

En consecuencia, se pretende mejorar las condiciones físicas y de dotación del Centro Binacional Francisca Sierra y la Casa Lúdica que permita la consolidación de su oferta institucional constituida por la programación permanente de actividades de promoción de lectura, escritura, eventos académicos, talleres de formación y muestras artísticas, el uso de las tecnologías y medios audiovisuales (TIC), que permita a la población participar de esta manera, en el desarrollo cultural y social, construyendo el ejercicio de la ciudadanía, la construcción de significados, la apropiación y desarrollo autónomo del conocimiento. Así mismo, es la posibilidad de reducir los riesgos a los que esta expuestos los niños, niñas y adolescentes.

Además, se considera viable la puesta en marcha de alianzas de instituciones públicas entre la Cancillería y el Municipio de Maicao para hacer un municipio que cuente con espacios de vida y para cultivar las artes y los saberes impactando positivamente en la población compuesta por 2.393 habitantes del corregimiento según base de datos de SISBEN.

ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, EL PLAN DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS

Powered by CamScanner

La presente iniciativa lleva concordancia con el **Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) "Colombia Potencia Mundial de la Vida".**

Transformación 2. Seguridad humana y justicia social.
Pilar 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida.
Catalizador 02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz.
Componente. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes.

Plan de Desarrollo Departamental (2024-2027) "Cumpliendo la Palabra".
Línea estratégica: desarrollo y justicia social.
Sector Cultura.
Apuesta: Infraestructura cultural para la paz
Producto: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural.
Meta: 1 Infraestructura cultural intervenida
Producto: Infraestructuras culturales dotadas.
Meta: 2 Infraestructuras culturales dotadas con accesibilidad física e inclusiva.

Plan de Desarrollo Municipal (2024-2027) "Maicao es Tiempo de Avanzar
Línea estratégica 1: Orden social.
Sector cultura
Programa 9. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
Producto: Realizar un mantenimiento anual a una infraestructura cultural rural del municipio de Maicao.
Meta: 1 Infraestructura cultural intervenida
Producto: Realizar un reforzamiento estructural a dos bibliotecas del municipio de Maicao.
Meta: 2 Bibliotecas con reforzamiento estructural.

ODS 4: Educación de calidad;
ODS 10. Reducción de la Desigualdades.
ODS 11: Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Powered by CamScanner

OBJETIVO GENERAL		
Adecuar la infraestructura y dotar la Casa Lúdica y el Centro Binacional Francisca Sierra, en el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		
1	Adecuar la infraestructura de la Casa Lúdica.	
2	Adecuar la infraestructura del Centro Binacional Francisca Sierra.	
3	Dotar de elementos tecnológicos, vestuarios, instrumentos y mobiliario a la Casa Lúdica y al Centro Binacional Francisca Sierra.	
PRODUCTOS ESPERADOS		
1	Una (1) Casa Lúdica adecuada.	
2	Un (1) Centro Binacional adecuado.	
3	Casa lúdica y centro cultural binacional dotadas de elementos tecnológicos, vestuarios, instrumentos y mobiliario.	
ACTIVIDADES		
Objetivo específico 1	1.1	Realizar los procesos de contratación de obra e interventoría correspondientes
	1.2	Preliminares (demolición de pañete muros, demolición pañete de losa, desmonte de cubierta, remoción de impermeabilización, desmonte de ventanas, desmonte de puertas metálicas, desmonte de malla eslabonada, remoción de piso en adoquín)

Powered by CamScanner

	1.3	Pisos (relleno y compactado manualmente, y reposición piso en cerámica)
	1.4	Pañete y acabados (pañete allanado, resane de muros, resane de losas, pañete de losas, estuco sobre muros, estuco bajo losa, pintura sobre muros en vinilo tipo 1, pintura en vinilo tipo 1 bajo losa en las aulas a adecuar)
	1.5	Cubierta (instalación de cubierta con láminas termoacústicas e impermeabilización de losa)
	1.6	Instalaciones hidrosanitarias (instalación de tanque plástico de 2000 Lts. que incluye motobomba y accesorios, así como el mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias)
	1.7	Carpintería metálica
	1.8	Instalaciones eléctricas (mantenimiento de instalaciones eléctricas existentes)
	1.9	Limpieza general
Objetivo específico 2	2.1	Preliminares (cerramiento en tela verde, excavación en terreno natural para viga de cerramiento)
	2.2	Adecuaciones, desmonte y demoliciones
	2.3	Estructura de concreto
	2.4	Mampostería, acabados y carpintería
	2.5	Cubierta (suministro e instalación de cubierta en la lámina termoacústica)
	2.6	Estructura metálica
	2.7	Instalaciones eléctricas y luminarias
	2.8	Acabados de pisos (mantenimiento y pulida del piso existente)
	2.9	Carpintería metálica y de aluminio
Objetivo específico 3	3.1	Adelantar los procesos contractuales para la adquisición de elementos tecnológicos, vestuarios, instrumentos y mobillario
	3.2	Adquisición de elementos tecnológicos
	3.3	Adquisición de vestuarios
	3.4	Adquisición de instrumentos
	3.5	Adquisición de mobiliario
	3.6	Entrega y registro en inventario de elementos tecnológicos, vestuarios, instrumentos y mobiliario

Powered by CamScanner

Lugar de ejecución	**Departamento**	La Guajira	**Municipio(s)**	Maicao
Corregimiento o comunidad (Si aplica)	Paraguachón		**Total de beneficiarios directos (número de personas)**	693 personas

PRESUPUESTO

OBJETIVO	ACT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTIDAD 1 CANCILLERÍA	ENTIDAD 2 MUNICIPIO DE MAICAO	ENTIDAD 3
Objetivo específico 1	1.1	Global	-	-	-	-	-
	1.2	Global	10.964.860	10.964.860	6.964.860	4.000.000	-
	1.3	Global	2.596.960	2.596.960	2.596.960	-	-
	1.4	Global	15.016.938	15.016.938	10.016.938	5.000.000	-
	1.5	Global	14.017.680	14.017.680	10.017.680	4.000.000	-
	1.6	Global	1.260.314	1.260.314	1.260.314	-	-
	1.7	Global	228.057.300	228.057.300	178.057.300	50.000.000	-
	1.8	Global	1.104.345	1.104.345	1.104.345	-	-
	1.9	Global	562.575	562.575	562.575	-	-
Objetivo específico 2	2.1	Global	5.118.512	5.118.512	4.118.512	1.000.000	-
	2.2	Global	14.999.676	14.999.676	11.774.035	3.225.641	-
	2.3	Global	10.615.208	10.615.208	8.615.208	2.000.000	-
	2.4	Global	20.509.460	20.509.460	15.509.460	5.000.000	-
	2.5	Global	53.179.040	53.179.040	40.179.040	13.000.000	-
	2.6	Global	191.789.360	191.789.360	141.789.360	50.000.000	-
	2.7	Global	11.220.480	11.220.480	8.220.480	3.000.000	-

Powered by CamScanner

	2.8	Global	4.065.225	4.065.225	3.065.225	1.000.000	-
	2.9	Global	70.863.919	70.863.919	50.863.919	20.000.000	-
Objetivo específico 3	3.1	Global	-	-	-	-	-
	3.2	Global	85.584.461	85.584.461	55.584.461	30.000.000	-
	3.3	Global	16.560.000	16.560.000	10.560.000	6.000.000	-
	3.4	Global	120.437.500	120.437.500	90.437.500	30.000.000	-
	3.5	Global	23.225.600	23.225.600	17.225.600	6.000.000	-
	3.6	Global	-	-	-	-	-
A.I.U		24%		157.426.044	93.458.352	63.967.692	-
		1%		6.559.419	6.559.419	-	-
		5%		32.797.093	32.797.093	-	-
Interventoría		7%		59.690.708	-	59.690.708	-
TOTALES				1.158.222.677	801.338.636	356.884.041	-

CRONOGRAMA

OBJETIVO	ACT.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Objetivo específico 1	1.1												
	1.2												
	1.3												
	1.4												
	1.5												

Powered by CamScanner

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DP-FO-287
NOMBRE:	PROPUESTA PROYECTOS PLAN FRONTERAS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLAN FRONTERAS	Página 9 de 10

	1.6												
	1.7												
	1.8												
	1.9												
Objetivo específico 2	2.1												
	2.2												
	2.3												
	2.4												
	2.5												
	2.6												
	2.7												
	2.8												
	2.9												
Objetivo específico 3	3.1												
	3.2												
	3.3												
	3.4												
	3.5												
	3.6												

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

Powered by CamScanner

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DP-FO-287
NOMBRE:	PROPUESTA PROYECTOS PLAN FRONTERAS	VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLAN FRONTERAS	Página 10 de 10

OBSERVACIONES ADICIONALES

Licencias o permisos

Para la intervención de la Casa Lùdica se requiere concepto de reparación locativa, el cual se debe gestionar ante la Secretaría Planeación y es otorgada por la Dependencia de Ordenamiento Territorial.

Para el Centro Cultural Binacional se requiere concepto de reparación locativa y licencia de construcción en la modalidad de cerramiento, los cuales se deben gestionar ante la Secretaria Planeación y son otorgados por la Dependencia de Ordenamiento Territorial.

Los trámites deberán ser realizados por el contratista de obra, una vez se perfeccione el contrato.

Titularidad de los predios

Se anexan Certificados de Tradición y Libertad que demuestra titularidad de los predios por parte del Municipio.

Firma del Representante Legal
Nombre: MIGUEL FELIPE ARAGÓN GONZALEZ – Alcalde de Maicao

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad dejar evidencia de la reunión en la que usted participó.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Más información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co

Elaboró	Giovanna Vásquez

FV: XX/XX/XXXX

Powered by CamScanner

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL BINACIONAL DEL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1	Preliminares				$ 5.118.512
1.1	Cerramiento en tela verde	ML	80	51.109	4.088.720
1.2	Excavacion en terreno natural para viga de cerramiento	Ml	68	15.144	1.029.792
2	ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES				$ 14.999.676
2.1	Desmonte de cubierta y estructura de cubierta	M2	365	31.224	11.396.760
2.2	Desmonte de puertas de aluminio	Und	5	75.455	377.275
2.3	Desmonte de ventanas de aluminio (2,20 x3,0 m)	Und	13	45.273	588.549
2.4	Demolicion en muro en altura de 2,60 m	M2	89,28	16.885	1.507.493
2.5	Desmonte de viga metalica de 0.22x0.16 m	ML	64,2	17.595	1.129.599
3	Estructura de concreto				$ 10.615.208
3.1	Concreto para la viga de cimentacion de cerramiento 0.40 x 0.40 m	ML	68	156.106	10.615.208
4	MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA				$ 20.509.460
4.1	Mamposteria bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	53.004	4.732.197
4.2	Pañete allanado 1:4	M2	179,56	30.248	5.431.331
4.3	Estuco plastico sobre muros interior	M2	89,28	17.373	1.551.061
4.4	Estuco acrilico para muro exterior	M2	89,28	17.373	1.551.061
4.5	Pintura color blanco VINILO TIPO 1	M2	359,12	20.171	7.243.810
5	Cubierta				$ 53.179.040
5.1	Suministro E Instalacion De Cubierta En Lamina Termoacustica	M2	365	145.696	53.179.040
6	Estructura metalica				$ 191.789.360
6.1	Estructura Metálica para cubierta en Acero A36 ó similar, Incluye Suministro, fabricación, soldadura, Pintura Epoxica y Acabado, Incluye Transporte Y Montaje.	Kg	1.868	40.070	74.850.760
6.2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metalicas)	ML	34	1.093.525	37.179.850
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura metálica existente	ML	390	30.042	11.716.380
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificada incluye tubos y ángulos	M2	132	292.845	38.655.540
6.5	Suministro e instalación de portón 2,0 x 1,0 m en cerramiento de malla eslabonada	Und	1	1.033.966	1.033.966
6.6	Suministro e instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	88.604	5.847.864
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	Und	2	11.252.500	22.505.000
7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS				$ 11.220.480
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	Und	10	139.385	1.393.850
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	28.879	1.732.740
7.3	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	Und	1	800.938	800.938
7.4	Acometida principal en cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	20.260	607.800
7.5	Acometida interna 110 v cable # 10	ML	100	24.327	2.432.700
7.8	Suministro e instalacion de varilla polo a tierra	Und	1	498.235	498.235
7.9	Suministro e instalacion de reflectores led 40 w	Und	3	334.469	1.003.407
7.10	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	Und	10	275.081	2.750.810
8	Acabados de pisos				$ 4.065.225
8.1	Mantenimiento y pulida del piso existente	M2	263,36	15.436	4.065.225
9	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO				$ 70.863.919
9.1	Suministro e instalacion puertas en aluminio incluye cerradura y marcos	Und	5	4.116.876	20.584.380
9.2	Sumintro e intatalación de ventanas en aluminio (2.2x3m)	Und	13	1.935.469	25.161.097
9.3	Suministro e intalacion de protectores de puertas y ventanas	Und	18	1.395.469	25.118.442

TOTAL COSTO DIRECTO:		$ 382.360.880
ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 91.766.611
IMPREVISTOS:	1%	$ 3.823.609
UTILIDAD:	5%	$ 19.118.044
VALOR TOTAL DE LAS ADECUACIONES:		$ 497.069.144
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA 7%:		$ 34.794.840
VALOR TOTAL PROYECTO:		$ 531.863.984

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JACOBO ARAGÓN AMAYA Profesional Universitario IV - Interventor Municipal	ORLANDO MEJIA MARULANDA Secretario de Obras Municipal

Powered by CamScanner

Republica de Colombia
Departamento de La Guajira
Municipio de Maicao
Secretaria de Obras Municipal

Codigo	
Fecha	
Versión	

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: ADECUACIOPNES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CASA LUDICA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	$ 16.560	$ 1.076.400
1.2	Demolicion pañete de Losa	M2	15	$ 26.495	$ 397.425
1.3	Desmonte de cubierta	M2	515	$ 10.165	$ 5.234.975
1.4	Remocion de Impermeabilizacion	M2	44	$ 6.099	$ 268.356
1.5	Desmonte de ventanas	Un	10	$ 44.995	$ 449.950
1.6	Desmonte de puertas metalicas	Un	7	$ 74.992	$ 524.944
1.7	Desmonte de malla eslabonada	M2	203	$ 13.610	$ 2.762.830
1.8	Remocion de Piso en adoquin	M2	20	$ 12.499	$ 249.980
2.	**PISOS**				
2.1	Relleno selecc. y compactado manualmente	M3	8	$ 170.285	$ 1.362.280
2.1	Reposicion piso en ceramica	M2	10	$ 123.468	$ 1.234.680
3.	**PAÑETE Y ACABADOS**				
3.1	Pañete allanado	M2	65	$ 30.129	$ 1.958.385
3.2	Resane de muros	M2	20	$ 18.420	$ 368.400
3.3	Resane de losas	M2	15	$ 27.058	$ 405.870
3.3	Pañete de losas	M2	20	$ 36.781	$ 735.620
3.4	Estuco sobre muros	M2	65	$ 17.373	$ 1.129.245
3.5	Estuco bajo losa	M2	20	$ 27.071	$ 541.420
3.6	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1	M2	438	$ 20.171	$ 8.834.898
3.7	Pintura en vinilo tipo 1 bajo losa	M2	45	$ 23.180	$ 1.043.100
4.	**CUBIERTA**				
4.1	Instalacion de cubierta laminas termoacusticas	M2	515	$ 23.172	$ 11.933.580
4.2	Impermeabilizacion de Losa	M2	50	$ 41.682	$ 2.084.100
5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
5.1	Instalacion de tanque Plastico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios	Un	1	$ 423.438	$ 423.438
5.2	Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias	Un	1	$ 836.876	$ 836.876
6.	**CARPINTERIA METALICA**				
6.1	Suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	Un	1	$ 4.286.850	$ 4.286.850
6.2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zocalo de aluminio	Un	2	$ 5.124.376	$ 10.248.752
6.3	Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm	M2	32	$ 1.127.969	$ 36.095.008
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37	M2	120	$ 1.090.469	$ 130.856.280
6.5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalacion	Ml	480	$ 74.262	$ 35.645.760
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14	Ml	75	$ 145.662	$ 10.924.650
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.1	Mantenimiento de instalaciones electricas existentes	GBL	1	$ 1.104.345	$ 1.104.345
8.	**LIMPIEZA GENERAL**				
8.1	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	$ 562.575	$ 562.575
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 273.580.972**

ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 65.659.433
IMPREVISTOS:	1%	$ 2.735.810
UTILIDAD:	5%	$ 13.679.049
VALOR TOTAL DEL OBRAS:		**$ 355.655.264**
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA 7%:		**$ 24.895.868**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		**$ 380.551.132**

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JACOBO ARAGÓN AMAYA	**ORLANDO MEJIA MARULANDA**
Profesional Universitario IV - Interventor Municipal	Secretario de Obras Municipal

Powered by CamScanner

Cancillería

ANÁLISIS DEL SECTOR

OBJETO CONTRACTUAL

Adecuación de la infraestructura y dotación de la Casa Lúdica y el Centro Binacional Francisca Sierra en el Corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira.

TÉCNICO - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

El convenio es un negocio jurídico cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir competencias en la realización de funciones administrativas de interés común y, por tanto, tienen intereses convergentes o coincidentes, sin que se reciba por alguna de ellas el pago de un precio o contraprestación.

El convenio interadministrativo surgió con la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015 lo califica como aquella contratación entre entidades estatales. Este se puede definir como el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades estatales.

En los convenios interadministrativos las entidades partes se encuentran en pie de igualdad, tienen intereses comunes para lograr una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la ley a las mismas, sin que tengan un interés puramente económico (es decir, destinados a obtener una ganancia)".[1]

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que "(...) los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP

[1] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 26 de julio de 2016. Exp. 2.257. C.P. Álvaro Namén Vargas.

(moralidad, economía, celeridad, entre otros), en virtud del carácter vinculante de los mismos, dentro del contexto de un ánimo de cooperación que se refleja en el plano de igualdad o equivalencia en que se celebran y ejecutan, lo que significa ausencia de prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra."[2]

El Consejo de Estado ha indicado, frente al convenio interadministrativo y sus características, que: "(...) se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales"[3]

En conclusión, convenios administrativos tienen una finalidad asociativa perseguida por las partes suscriptoras cuyos intereses se encaminan en la misma dirección y persiguen los mismos objetivos, de conformidad con el ejercicio de las funciones y competencias que les son propias y propendiendo por la cooperación interinstitucional.

En el caso particular del convenio a suscribir, se identifica que los dos extremos de la relación contractual serán entidades estatales. Por un lado, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad del

[2] CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 26 de julio de 2016. Exp. 2.257. C.P. Álvaro Namén Vargas.

[3] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Radicación No. 66001-23-31-000-1998-00261- 01(17.860). Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

orden nacional; y el por el otro el Municipio de Maicao, entidad del orden municipal.

Así mismo, concurre la voluntad de ambas partes, puesto que por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores fue identificada la necesidad de apoyar al municipio en la adecuación de la infraestructura y dotación de la Casa Lúdica y el Centro Binacional Francisca Sierra en el Corregimiento de Paraguachón, Municipio de Maicao, La Guajira, en el marco del programa Plan Fronteras – Proyecto de Inversión *"Implementación de proyectos de desarrollo social y económico en las zonas de frontera"*, y por parte del municipio fue presentada la propuesta suscrita por el Alcalde.

Finalmente, el objeto se enmarca en los objetivos misionales y competencias tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como del Municipio de Maicao. Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la ejecución del convenio se contribuirá al cumplimiento del objetivo estratégico 1 *"Posicionar a Colombia como potencia mundial de la vida a través de una proyección plural y estratégica hacia el mundo e impulsar una nueva inserción en las diferentes dinámicas globales, regionales y fronterizas"*, a través de la estrategia 1.4 *"Integración y desarrollo de las Fronteras para la convivencia pacífica, armónica, cooperativa y respetuosa de la vida"*. Por su parte, el municipio requiere contar con instalaciones adecuadas y dotadas, que permitan a los ciudadanos acceder a servicios culturales, y al no contar con recursos suficientes, debe gestionarlos para lograrlo.

MARCO REGULATORIO

- Artículos 113 y 209 de la Constitución Política
- Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
- Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

- Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.

ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES

Se procedió a adelantar consultas en el portal de Colombia Compra Eficiente -SECOP II-, para seleccionar aquellos procesos relacionados o similares al que se pretende contratar.

Si bien no se encontraron objetos que coincidieran en el tipo de infraestructura a adecuar y los montos, si se pudo establecer que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, adelanta el tipo de contratación que se pretende adelantar. Las similitudes se encuentran en el *Código UNSPSC*, la modalidad de contratación y que el objeto hace referencia a infraestructura.

CÓDIGO UNSPSC	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR	PARTES	PROCESO SECOP II
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal de San Antonio de Palmito Sucre	2.420.140.264	Ministerio del Interior Municipio de San Antonio de Palmito - Sucre	2300 de 2022
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes a la construcción de un Centro Administrativo Municipal, por parte del ente territorial Tangua - Nariño, para lo cual obtendrá aportes financieros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON y las condiciones técnicas mínimas que deberá contener la obra, por parte del Ministerio del Interior.	3.755.834.581	Ministerio del Interior Municipio de Tangua	1645 de 2023
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para desarrollar los estudios, diseños y construcción del centro administrativo municipal del municipio de Mallama - Nariño	4.625.034.081	Ministerio del Interior Municipio de Mallama	1407 de 2024

ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD

Se verificó la modalidad de contratación y características principales de los procesos adelantados con lineamientos similares al del objeto que se pretende contratar y que han sido ejecutados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores:

CÓDIGO UNSPSC	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	VALOR	PARTES	PROCESO SECOP II
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación y mejoramiento de la infraestructura educativa en la institución educativa CAMPO ALICIA del municipio de Cubará, Boyacá.	694.115.822,75	Municipio de Cubará	CV 003-2021
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Coadyuvar para el mejoramiento de la cancha polifuncional de la Institución Educativa Agropecuaria de Urumita, La Guajira, sede "Catorce de junio"	227.696.846	Municipio de Urumita	CV-001-2023
80101600 - Gerencia de proyectos	Contratación directa	Coadyuvar para el mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa Departamental IEDETA del municipio de Taraira, departamento del Vaupés.	558.607.199	Municipio de Taraira	CV-016-2023

Con los procesos antes relacionados, se evidencia que entidades del orden nacional suscriben Convenios Interadministrativos con entidades del orden territorial, para la ejecución de proyectos de adecuación de infraestructura en el marco de sus *Proyectos de Inversión*.

ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

No aplica por cuanto el convenio a suscribir no tiene como finalidad la adquisición de bienes o servicios.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A continuación, se detalla el Análisis de Precios Unitarios desarrollado para el cálculo del presupuesto del proyecto.

Adecuación Centro Binacional Francisca Sierra

OBRA:

ITEM: Cerramiento provisional en tela plástica, H = 2,0 m

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tela plástica	ML	1,00	5.880	5.880
	Puntales	UND.	1,00	10.000	10.000
	Listones 2" x 3"	ML	2,00	7.000	14.000
	Clavos	Kg	0,10	9.000	900

SUB-TOTAL MATERIALES: 30.780

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DIA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	12	1.250

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.250

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Obreros	50.000	100.000	185	185.000	12	15.417
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	12	3.662

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 19.079

COSTO DIRECTO: 51.109

OBRA:

ITEM: Excavación en terreno natural para viga de cerramiento

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	10	1.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	10	9.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	10	4.394

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 13.644

COSTO DIRECTO: 15.144

OBRA:

ITEM: Desmonte de cubierta y estructura de cubierta

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Andamios (2)	20.000	15	1.333
	Equipo menor	15.000	15	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.333

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
3	Ayudantes	50.000	150.000	185	277.500	15	18.500
1	Oficial	70.000	70.000	185	129.500	15	8.633
0,15	Maestro	95.000	14.250	185	26.363	15	1.758

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 28.891

COSTO DIRECTO: 31.224

OBRA:

ITEM: Desmonte de puertas de aluminio

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	3	5.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	3	61.667
0,15	Maestro	95.000	14.250	185	26.363	3	8.788

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 70.455

	COSTO DIRECTO:	75.455

OBRA:

ITEM: Desmonte de ventanas

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	5	3.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 3.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	5	37.000
0,15	Maestro	95.000	14.250	185	26.363	5	5.273

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 42.273

COSTO DIRECTO: 45.273

OBRA:

ITEM: Demolición en muro en altura de 2,60 m, no incluye retiro

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	8	1.875
	Andamio	10.000	8	1.250

SUB-TOTAL EQUIPOS: 3.125

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Obrero	día	50.000	185	92.500	8	11.563
0,1	Maestro	95.000	9.500	185	17.575	8	2.197

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 13.760

COSTO DIRECTO: 16.885

OBRA:

ITEM: Desmonte de viga metálica de 0.22x0.16 m

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN			TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor			15.000	15	1.000
	Andamios	2	10.000	20.000	15	1.333

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.333

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	15	12.333
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 15.262

COSTO DIRECTO: 17.595

OBRA:

ITEM: Viga de concreto de cimentación 0,40 x 0,40 m

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Concreto de 3000 PSI	M3	0,126	652.922	82.268

SUB-TOTAL MATERIALES: 82.268

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	13	1.154
	Vibrador de concreto	80.000	13	6.154

SUB-TOTAL EQUIPOS: 7.308

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	13	9.962
7	Ayudantes 7	50.000	350.000	185	647.500	13	49.808
0,50	Maestro	95.000	47.500	185	87.875	13	6.760

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 66.530

COSTO DIRECTO: 156.106

OBRA:

ITEM: Levante de muros en bloques de cemento e = 0,09 m, huecos.

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Bloques de cemento	UND.	13	1.600	20.800
	Arena para mortero	M3	0,055	90.000	4.950
	Cemento gris	Kg	9	765	6.885
	Agua	Lt	12	50	600
	Transporte de bloques 5 %	%	1	1.040	1.040

SUB-TOTAL MATERIALES: 34.275

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	15	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	15	8.633
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	15	6.167
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 17.729

COSTO DIRECTO: 53.004

OBRA:

ITEM: Relleno en material seleccionado

UND.: M3 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Relleno seleccionado	M3	1,3	55.000	71.500
	Agua	Litros	80,00	35	2.800

SUB-TOTAL MATERIALES: 74.300

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Rana vibrocompactadora	140.000	4	35.000
	Equipo menor	15.000	4	3.750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 38.750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Obreros (2)	50.000	100.000	185	185.000	4	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	4	10.985

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 57.235

COSTO DIRECTO: 170.285

OBRA:

ITEM: Piso en cerámica, tráfico 5

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Enchape de piso	M2	1,10	70.000	77.000
	Pegacor	Kg	3	3.000	9.000
	Cemento blanco	Kg	0,05	2.000	100
	Sellajuntas	Kg	0,25	9.000	2.250

SUB-TOTAL MATERIALES: 88.350

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	8	1.875

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.875

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	8	16.188
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	8	11.563
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	8	5.492

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 33.243

COSTO DIRECTO: 123.468

OBRA:

ITEM: Pañete allanado

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cemento gris	Kg	9,00	765	6.885
	Arena	M3	0,03	90.000	2.700
	Agua	Lt	8,00	35	280
	transporte	%	10		987

SUB-TOTAL MATERIALES: 10.852

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	15	1.000
	Andamio	10.000	15	667

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.667

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	15	8.633
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	15	6.167
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 17.729

COSTO DIRECTO: 30.248

OBRA:

ITEM: Estuco sobre muros

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Estuco profesional	Kg	0,25	30.000	7.500
	Agua	Lt	3,00	35	105
	Agua	Lt	2,00	35	70

SUB-TOTAL MATERIALES: 7.675

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	30	500
	Andamio	10.000	30	333

SUB-TOTAL EQUIPOS: 833

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	30	4.317
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	30	3.083

0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	30	1.465

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 8.865

COSTO DIRECTO: 17.373

OBRA:

ITEM: Pintura de vinilo Tipo 1 sobre muros

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Pintura	Gal	0,067	110.000	7.333
	Mezcla de resane	Gbl	1	800	800

SUB-TOTAL MATERIALES: 8.133

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor		15.000	25	600
2	Andamios (2)	10.000	20.000	25	800

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.400

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Pintor	día	70.000	185	129.500	25	5.180
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	25	3.700
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	25	1.758

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 10.638

COSTO DIRECTO: 20.171

OBRA:

ITEM: Cubierta en láminas termoacústicas

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Ganchos	UND.	3,00	4.000	12.000
	Lámina termoacústica	M2	1,10	75.000	82.500

SUB-TOTAL MATERIALES: 94.500

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
8	Andamios	10.000	80.000	15	5.333
	Equipo menor		15.000	15	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 6.333

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Herrero	70.000	140.000	185	259.000	15	17.267
4	Ayudantes (2)	50.000	200.000	185	370.000	15	24.667
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 44.863

COSTO DIRECTO: 145.696

OBRA:

ITEM: Estructura en perfiles de acero A36 ó similar

UND.: Kg CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Acero estructural	Kg	1,05	12.500	13.125
	Soldadura	Kg	0,08	17.000	1.360
	Pintura esmalte	Gal	0,01	110.000	1.100

	Fondo anticorrosivo	Gal	0,01	70.000	700

SUB-TOTAL MATERIALES: 16.285

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	80.000	50	1.600
6	Andamios 10.000	60.000	50	1.200
	Grúa	500.000	250	2.000
	Equipo menor	15.000	50	300

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.100

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Soldador	70.000	140.000	185	259.000	50	5.180
4	Ayudantes	50.000	200.000	185	370.000	50	7.400
1	Maestro	95.000	95.000	185	175.750	50	3.515
1	Pintor	70.000	70.000	185	129.500	50	2.590

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 18.685

COSTO DIRECTO: 40.070

OBRA:

ITEM: Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metálicas)

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Acero estructural	Kg	47,82	12.500	597.750
	Soldadura	Kg	0,20	17.000	3.400
	Pintura esmalte	Gal	0,04	110.000	4.400
	Fondo anticorrosivo	Gal	0,04	70.000	2.800
	Lámina de asiento	Kg	7	15.000	105.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 713.350

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	60.000	2	30.000
	Equipo de oxicorte	80.000	2	40.000
	Equipo menor	15.000	50	300

SUB-TOTAL EQUIPOS: 70.300

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Soldador	70.000	70.000	185	129.500	2	64.750
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	2	92.500
1	Maestro	95.000	95.000	185	175.750	2	87.875
1	Pintor	70.000	70.000	185	129.500	2	64.750

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 309.875

COSTO DIRECTO: 1.093.525

OBRA:

ITEM: Mantenimiento y pintura de estructura metálica existente

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Pintura esmalte	Gal	0,04	110.000	4.400
	Fondo anticorrosivo	Gal	0,04	70.000	2.800
	Lijas	UND.	1	2.000	2.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 9.200

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL

	Equipo de pintura		60.000	30	2.000
6	Andamios	10.000	60.000	30	2.000
	Equipo menor		15.000	30	500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 4.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Pintor	70.000	70.000	185	129.500	30	4.317
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	30	6.167
1	Maestro	95.000	95.000	185	175.750	30	5.858

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 16.342

COSTO DIRECTO: 30.042

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de malla eslabonada metal plastificada incluye tubos y ángulos

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Malla eslabonada plastificada	M2	1,05	39.300	41.265
	Tubos galvanizados Ø 2"	ML	1,50	24.000	36.000
	Angulo 1,5" x 1/4"	ML	2,20	12.600	27.720
	Accesorios	GBL	1	40.000	40.000
	Soldadura	Kg	0,05	17.000	850
	Fondo anticorrosivo	Gal	0,07	60.000	4.200
	Pintura esmalte	Gal	0,07	110.000	7.700

SUB-TOTAL MATERIALES: 157.735

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	4	3.750
	Andamio	10.000	4	2.500

	Equipo de soldadura	60.000	4	15.000
	Equipo de pintura	60.000	4	15.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 36.250

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Soldador	día	70.000	185	129.500	4	32.375
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	4	23.125
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	4	10.985
	Pintor		70.000	185	129.500	4	32.375

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 98.860

COSTO DIRECTO: 292.845

OBRA:

ITEM: Sum e inst de portón metálico en tubos y malla galvanizada dim. 1,0 x 2,50 m

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubos 2"	ML	6	24.000	144.000
	Malla galvanizada	M2	2,50	39.300	98.250
	Ángulos 1 1/2" x 1 1/2"	ML	8,40	12.600	105.840
	Soldadura	Kg	1	17.000	17.000
	Pintura	Gal	0,1	110.000	11.000
	Fondo anticorrosivo	Gal	0,1	60.000	6.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 382.090

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	60.000	0,50	120.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 120.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Soldador	día	70.000	185	129.500	0,50	259.000
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	0,50	185.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,50	87.876

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 531.876

COSTO DIRECTO: 1.033.966

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Concertina	ML	1,05	30.000	31.500
	Tubo galvanizado Ø 3/4"	ML	1,05	14.000	14.700
	Alambre galvanizado	Kg	0,09	9.000	810
	Tensor galvanizado	ML	1	1.000	1.000
	Pernos de anclaje 3/8" x 3"	UND.	2	4.000	8.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 56.010

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	60.000	10	6.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 6.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	10	12.950
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	10	9.250

0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	10	4.394

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 26.594

COSTO DIRECTO: 88.604

OBRA:

ITEM: Mantenimiento de las torres metálicas de arriostramiento existentes

UND.: Und CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubos faltantes	ML	30,00	24.000	720.000
	Pintura esmalte	Gal	20,00	110.000	2.200.000
	Fondo anticorrosivo	Gal	20,00	70.000	1.400.000
	Lijas	UND.	40	2.000	80.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 4.400.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de pintura		60.000	0,10	600.000
6	Andamios	10.000	60.000	0,10	600.000
2	Equipo de pretales	30.000	60.000	0,10	600.000
	Equipo menor		15.000	0,10	150.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.950.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Pintor	70.000	70.000	185	129.500	0,10	1.295.000
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	0,10	1.850.000
1	Maestro	95.000	95.000	185	175.750	0,10	1.757.500

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 4.902.500

	COSTO DIRECTO:	11.252.500

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de tomacorrientes, 110 V., incluye acometida parcial

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tomacorriente	UND.	1,00	13.000	13.000
	Cable Nº 12	ML	6	2.900	17.400
	Tubo conduit 1/2"	ML	3	4.650	13.950
	Cable Nº 14, desnudo	ML	3	1.900	5.700
	Cinta, chazos, conectores, etc.	GBL	1	2.477	2.477
	Caja 2" x 4"	UND.	1	2.000	2.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 54.527

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	3	5.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	3	43.167
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	3	30.833
0,10	Maestro	95.000	9.500	185	17.575	3	5.858

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 79.858

	COSTO DIRECTO:	139.385

OBRA:

ITEM: Ducto EMT 3/4"

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubería EMT Ø 3/4"	ML	1,10	7.000	7.700
	Conector ó unión	UND.	0,30	3.500	1.050

SUB-TOTAL MATERIALES: 8.750

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	20,00	750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
4	Ayudantes	50.000	200.000	185	370.000	20,00	18.500
0,10	Maestro	95.000	9.500	185	17.575	20,00	879

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 19.379

COSTO DIRECTO: 28.879

OBRA:

ITEM: TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Caja con barraje	UND.	1,00	150.000	150.000
	Breakers	UND.	12	30.000	360.000
	Cinta, chazos, conectores, etc.	GBL	1	10.000	10.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 520.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	1,00	15.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 15.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	1	129.500
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	1	92.500
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	1	43.938

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 265.938

COSTO DIRECTO: 800.938

OBRA:

ITEM: Acometida principal en cable 2 # 8 + 1 # 10

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cable # 8	ML	2	6.500	13.000
	Cable # 10	UND.	1	3.900	3.900
	Tubo conduit Ø 3/4"	ML	1,05	3.200	3.360

SUB-TOTAL MATERIALES: 20.260

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	40	375

SUB-TOTAL EQUIPOS: 375

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	40	3.238
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	40	2.313
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	40	1.098

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 6.649

COSTO DIRECTO: 20.260

OBRA:

ITEM: Acometida interna 2 # 10 + 1 # 12

UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cable # 12	ML	1,10	1.900	2.090
	Cable # 10	ML	2,10	3.900	8.190

SUB-TOTAL MATERIALES: 10.280

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	20	750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	20	6.475
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	20	4.625
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	20	2.197

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 13.297

COSTO DIRECTO: 24.327

OBRA:

ITEM: Puesta a tierra simple, incluye cable de cobre 1/0 desnudo a varilla cooperweld

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cable de cobre 1/0 desnudo	ML	15	12.000	180.000
	Abrazadera	UND.	1,00	8.000	8.000
	Varilla 5/8" x 2,40 m	UND.	1,00	240.000	240.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 428.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	4	3.750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 3.750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	4	32.375
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	4	23.125
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	4	10.985

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 66.485

COSTO DIRECTO: 498.235

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de reflectores

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL

	Reflectores	UND.	1,00	140.000	140.000
	Tornillos, chazos, etc.	GBL	1,00	5.000	5.000
	Cable Nº 10	ML	10,00	3.900	39.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 184.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
2	Andamios 10000	20.000	2	10.000
	Equipo menor	15.000	2	7.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 17.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	2	64.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	2	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	2	21.969

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 132.969

COSTO DIRECTO: 334.469

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de luminarias LED 40 W

UND.: und. CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Lámpara led 40 W	UND.	1,00	120.000	120.000
	Cable Nº 12	ML	6,50	2.900	18.850
	Tornillos	UND.	2	3.000	6.000
	Abrazaderas	UND.	2,00	5.500	11.000
	Transporte 10 %	GBL	1	15.585	15.585

SUB-TOTAL MATERIALES: 171.435

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor		15.000	3	5.000
3	Andamios	10000	30.000	3	10.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 15.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Electricista	día	70.000	185	129.500	3,0	43.167
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	3,0	30.833
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	3,0	14.646

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 88.646

COSTO DIRECTO: 275.081

OBRA:

ITEM: Mantenimiento y pulida del piso existente

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Agregado para pulir piso	Kg	1,00	2.500	2.500
	Agua	Lt	8,00	50	400

SUB-TOTAL MATERIALES: 2.900

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	40	375
	Máquina pulidora	350.000	40	8.750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 9.125

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	40	2.313
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	40	1.098

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 3.411

COSTO DIRECTO: 15.436

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 1.0 x 2.0 m

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Puerta en aluminio y vidrio	UND.	1,00	3.370.000	3.370.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 3.370.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	0,50	30.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 30.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Herrero	70.000	70.000	185	129.500	0,50	259.000
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	0,50	370.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,50	87.876

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 716.876

COSTO DIRECTO: 4.116.876

OBRA:

ITEM: Suministro e intitulación de ventanas en aluminio (2.2x3m)

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Vidrio 5 mm	M2	6,60	180.000	1.188.000
	Perfiles	ML	12,60	45.000	567.000
	Accesorios	GBL	1	40.000	40.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 1.795.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	2	7.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 7.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	2	64.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	2	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	2	21.969

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 132.969

COSTO DIRECTO: 1.935.469

OBRA:

ITEM: Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL

	Tubos en aluminio 1" x 1"	ML	81,00	15.000	1.215.000
	Accesorios	GBL	1	40.000	40.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 1.255.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	2	7.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 7.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	2	64.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	2	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	2	21.969

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 132.969

COSTO DIRECTO: 1.395.469

Adecuación Casa Lúdica

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

ITEM: Demolición de Pañete muros

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL

	Equipo menor	15.000	8	1.875	

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.875

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Ayudantes	50.000	50.000	185	92.500	8	11.563
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	8	3.122

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 14.685

COSTO DIRECTO: 16.560

OBRA:

ITEM: Demolición pañete de Losa

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	5	3.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 3.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Ayudantes	50.000	50.000	185	92.500	5	18.500
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	5	4.995

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 23.495

COSTO DIRECTO: 26.495

OBRA:

ITEM: Desmonte de cubierta

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Andamios (2)	20.000	15	1.333
	Equipo menor	15.000	15	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.333

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Ayudantes	50.000	50.000	185	92.500	15	6.167
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	15	1.665

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 7.832

COSTO DIRECTO: 10.165

OBRA:

ITEM: Remoción de Impermeabilización

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Andamios (2)	20.000	25	800
	Equipo menor	15.000	25	600

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.400

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
1	Ayudantes	50.000	50.000	185	92.500	25	3.700
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	25	999

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 4.699

COSTO DIRECTO: 6.099

OBRA:

ITEM: Desmonte de ventanas

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	5	3.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 3.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	5	37.000
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	5	4.995

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 41.995

COSTO DIRECTO: 44.995

OBRA:

ITEM: Desmonte de puertas metálicas

UND.: UND CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	3	5.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	3	61.667
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	3	8.325

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 69.992

COSTO DIRECTO: 74.992

OBRA:

ITEM: Desmonte de malla eslabonada

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Andamios (2)	20.000	18	1.111
	Equipo menor	15.000	18	833

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.944

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	18	10.278

0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	18	1.388

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 11.666

COSTO DIRECTO: 13.610

OBRA:

ITEM: Remoción de Piso en adoquín

UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	18	833

SUB-TOTAL EQUIPOS: 833

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	18	10.278
0,15	Maestro	90.000	13.500	185	24.975	18	1.388

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 11.666

COSTO DIRECTO: 12.499

OBRA:

ITEM: Relleno en material seleccionado

UND.: M3 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Relleno seleccionado	M3	1,3	55.000	71.500
	Agua	Litros	80,00	35	2.800

SUB-TOTAL MATERIALES: 74.300

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Rana vibrocompactadora	140.000	4	35.000
	Equipo menor	15.000	4	3.750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 38.750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Obreros (2)	50.000	100.000	185	185.000	4	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	4	10.985

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 57.235

COSTO DIRECTO: 170.285

OBRA:
ITEM: Piso en cerámica, tráfico 5
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Enchape de piso	M2	1,10	70.000	77.000
	Pegacor	Kg	3	3.000	9.000
	Cemento blanco	Kg	0,05	2.000	100
	Sellajuntas	Kg	0,25	9.000	2.250

SUB-TOTAL MATERIALES: 88.350

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	8	1.875

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.875

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	8	16.188
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	8	11.563

0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	8	5.492

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 33.243

COSTO DIRECTO: 123.468

OBRA:
ITEM: Pañete allanado
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cemento gris	Kg	9,00	753	6.777
	Arena	M3	0,03	90.000	2.700
	Agua	Lt	8,00	35	280
	transporte	%	10		976

SUB-TOTAL MATERIALES: 10.733

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	15	1.000
	Andamio	10.000	15	667

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.667

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	15	8.633
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	15	6.167
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 17.729

COSTO DIRECTO: 30.129

OBRA:
ITEM: Resane de muros
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cemento gris	Kg	2,50	723	1.808
	Agua	Lt	3,00	35	105
	Arena	M3	0,01	90.000	900

SUB-TOTAL MATERIALES: 2.813

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	18	833

SUB-TOTAL EQUIPOS: 833

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	18	7.194
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	18	5.139
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	18	2.441

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 14.774

COSTO DIRECTO: 18.420

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:
ITEM: Resane de losas
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cemento gris	Kg	2,50	723	1.808
	Agua	Lt	3,00	35	105
	Arena	M3	0,01	90.000	900

SUB-TOTAL MATERIALES: 2.813

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	12	1.250
	Andamio	10.000	12	833

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.083

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	12	10.792
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	12	7.708
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	12	3.662

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 22.162

COSTO DIRECTO: 27.058

OBRA:
ITEM: Pañete de losas
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cemento gris	Kg	9,00	723	6.507
	Agua	Lt	8,00	35	280
	Arena	M3	0,01	90.000	900

SUB-TOTAL MATERIALES: 7.687

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	10	1.500
	Andamio	10.000	10	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	10	12.950
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	10	9.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	10	4.394

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 26.594

COSTO DIRECTO: 36.781

OBRA:
ITEM: Estuco sobre muros
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Estuco profesional	Kg	0,25	30.000	7.500
	Agua	Lt	3,00	35	105
	Agua	Lt	2,00	35	70

SUB-TOTAL MATERIALES: 7.675

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	30	500
	Andamio	10.000	30	333

SUB-TOTAL EQUIPOS: 833

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	30	4.317
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	30	3.083
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	30	1.465

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 8.865

COSTO DIRECTO: 17.373

OBRA:
ITEM: Estuco bajo losas
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Estuco profesional	Kg	0,25	30.000	7.500
	Agua	Lt	3,00	35	105
	Agua	Lt	2,00	35	70

SUB-TOTAL MATERIALES: 7.675

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	15	1.000
	Andamio	10.000	15	667

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.667

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Albañil	día	70.000	185	129.500	15	8.633
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	15	6.167
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	15	2.929

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 17.729

COSTO DIRECTO: 27.071

OBRA:
ITEM: Pintura de vinilo Tipo 1 sobre muros
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Pintura	Gal	0,067	110.000	7.333
	Mezcla de resane	Gbl	1	800	800

SUB-TOTAL MATERIALES: 8.133

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor		15.000	25	600
2	Andamios (2)	10.000	20.000	25	800

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.400

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Pintor	día	70.000	185	129.500	25	5.180
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	25	3.700
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	25	1.758

SUB-TOTAL MANO DE OBRA:		10.638
COSTO DIRECTO:		20.171

OBRA:
ITEM: Pintura de vinilo Tipo 1, en cielo raso
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Pintura de vinilo	Gal	0,067	110.000	7.333
	Pasta de resane	Gbl	1	800	800

SUB-TOTAL MATERIALES:		8.133

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor		15.000	20	750
2	Andamios (2)	10.000	20.000	20	1.000

SUB-TOTAL EQUIPOS:		1.750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Pintor	día	70.000	185	129.500	20	6.475
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	20	4.625
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	20	2.197

SUB-TOTAL MANO DE OBRA:		13.297
COSTO DIRECTO:		23.180

OBRA:
ITEM: Cubierta en láminas termoacústicas
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Ganchos	UND.	1,00	2.500	2.500

SUB-TOTAL MATERIALES: 2.500

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
4	Andamios (4)	10.000	40.000	20	2.000
	Equipo menor		15.000	20	750

SUB-TOTAL EQUIPOS: 2.750

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	20	6.475
2	Ayudantes (2)	50.000	100.000	185	185.000	20	9.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	20	2.197

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 17.922

COSTO DIRECTO: 23.172

OBRA:
ITEM: Impermeabilización de cubierta con manto asfáltico
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Manto asfáltico	M2	1,20	15.000	18.000
	Imprimante	Gal	0,07	35.000	2.450
	Pintura de aluminio	Gal	0,07	160.000	11.200

SUB-TOTAL MATERIALES: 31.650

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor		15.000	30	500
	Andamios 2	10.000	20.000	30	667

SUB-TOTAL EQUIPOS: 1.167

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Oficial	día	70.000	185	129.500	30	4.317
	Ayudante	día	50.000	185	92.500	30	3.083
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	30	1.465

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 8.865

COSTO DIRECTO: 41.682

OBRA:
ITEM: Instalación de tanque elevado, capacidad = 2.000 lts
UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Accesorios	GBL	1,00	30.000	30.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 30.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
2	Andamios (2)	10.000	20.000	1	20.000
	Equipo menor		15.000	1	15.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 35.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Oficial	día	70.000	185	129.500	1	129.500
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	1	185.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	1	43.938

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 358.438

COSTO DIRECTO: 423.438

OBRA:
ITEM: Instalación de tanque Plástico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios
UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Accesorios	GBL	1,00	30.000	30.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 30.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
2	Andamios (2)	10.000	20.000	1	20.000
	Equipo menor		15.000	1	15.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 35.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Oficial	día	70.000	185	129.500	1	129.500
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	1	185.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	1	43.938

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 358.438

COSTO DIRECTO: 423.438

OBRA:
ITEM: Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias
UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Accesorios	GBL	1,00	50.000	50.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 50.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN		TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
2	Andamios (2)	10.000	20.000	0,50	40.000
	Equipo menor		15.000	0,50	30.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 70.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Oficial	día	70.000	185	129.500	0,50	259.000
2	Ayudantes	50.000	100.000	185	185.000	0,50	370.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,50	87.876

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 716.876

COSTO DIRECTO: 836.876

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Puerta en aluminio y vidrio	UND.	3,20	1.053.000	3.369.600

SUB-TOTAL MATERIALES: 3.369.600

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	0,75	20.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 20.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Herrero	70.000	140.000	185	259.000	0,75	345.333
4	Ayudantes	50.000	200.000	185	370.000	0,75	493.333
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,75	58.584

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 897.250

COSTO DIRECTO: 4.286.850

OBRA:

ITEM: Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidráulica y zócalo de aluminio

UND.: UN CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Puerta en vidrio templado	UND.	2,10	1.785.000	3.748.500

SUB-TOTAL MATERIALES: 3.748.500

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	0,50	30.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 30.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
2	Herrero	70.000	140.000	185	259.000	0,50	518.000
4	Ayudantes	50.000	200.000	185	370.000	0,50	740.000
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,50	87.876

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 1.345.876

COSTO DIRECTO: 5.124.376

OBRA:
ITEM: Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Vidrio 5 mm	M2	1,00	360.000	360.000
	Perfiles 70-38	ML	7,50	65.000	487.500
	Accesorios	GBL	1	140.000	140.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 987.500

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	2	7.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 7.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	2	64.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	2	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	2	21.969

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 132.969

COSTO DIRECTO: 1.127.969

OBRA:
ITEM: Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37
UND.: M2 CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubos en aluminio P 2.37	ML	14,00	65.000	910.000
	Accesorios	GBL	1	40.000	40.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 950.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	2	7.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 7.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	2	64.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	2	46.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	2	21.969

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 132.969

COSTO DIRECTO: 1.090.469

OBRA:
ITEM: Correa metálica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalación
UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubos 4" x 2" x 2 mm	ML	1,05	42.000	44.100
	Accesorios y soldadura	GBL	1	3.000	3.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 47.100

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	60.000	12	5.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	12	10.792
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	12	7.708
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	12	3.662

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 22.162

COSTO DIRECTO: 74.262

OBRA:
ITEM: Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14
UND.: ML CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Tubos 4" Cal. 14	ML	1,05	110.000	115.500
	Accesorios y soldadura	GBL	1	3.000	3.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 118.500

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo de soldadura	60.000	12	5.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 5.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	12	10.792
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	12	7.708
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	12	3.662

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 22.162

COSTO DIRECTO: 145.662

OBRA:
ITEM: Mantenimiento de instalaciones eléctricas existentes
UND.: GBL CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
	Cable No.12	ML	60,00	2.900	174.000
	Cable No.10	ML	60,00	3.800	228.000

SUB-TOTAL MATERIALES: 402.000

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	0,40	37.500

SUB-TOTAL EQUIPOS: 37.500

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
	Herrero	día	70.000	185	129.500	0,40	323.750
	Ayudantes	día	50.000	185	92.500	0,40	231.250
0,25	Maestro	95.000	23.750	185	43.938	0,40	109.845

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 664.845

COSTO DIRECTO: 1.104.345

OBRA:
ITEM: Limpieza y retiro de material sobrante
UND.: GBL CANT.:

1.- MATERIALES EN OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT/UND	COSTO	VR. PARCIAL
					0

SUB-TOTAL MATERIALES: 0

2.- EQUIPOS:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	TARIFA/DÍA U HORA	RENDIM.	VR. PARCIAL
	Equipo menor	15.000	1,00	15.000
	Camión volteo (viaje)	160.000	1	160.000

SUB-TOTAL EQUIPOS: 175.000

3.- MANO DE OBRA:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UND.	JORNAL	% PREST.	JORNAL TOT.	RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
4	Ayudantes	50.000	200.000	185	370.000	1,00	370.000
0,10	Maestro	95.000	9.500	185	17.575	1,00	17.575

SUB-TOTAL MANO DE OBRA: 387.575

COSTO DIRECTO: 562.575

Dotación

Cotizaciones TECNOLOGIA									
Descripción	Cant	Infosis		JM Soluciones Integrales		Mediatics		OfiES	
		Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total
Portátil Dell 3520 Corporativo, Procesador: Intel Core i5 1235U, Memoria:8 GB DDR4 2,666, Disco Duro: 512 GB SSD, Pantalla 15,6 FHD, S.O WIN 11 PRO	20	3.290.000	65.800.000	2.645.271	52.905.420	2.143.271	42.865.420	4.544.313	90.886.260
UPS CDP 500vs/360w	5	280.000	1.400.000	193.456	967.280	167.805	839.025	203.707	1.018.535
Impresora Epson Mutifuncional L5590	2	1.680.000	3.360.000	1.776.466	3.552.932	1.696.466	3.392.932	2.150.468	4.300.936
Sistema de Camaras de Seguridad: 1Grabador NVR 8CH @1080, 3 Cámaras IP Bala Semimetalica 2mp, 3 Cámaras IP tipo domo semimetalica 2mp, 1 Disco duro de un Tera	1	2.650.000	2.650.000	-	-	-	-	-	-

para almacenar la información.									
sistema de cámaras de seguridad (6camaras 2mp, grabador 8 canales, disco duro. 1tb, accesorios conectividad, cableado, canaletizacion + servicios de ingeniería)	1	-	-	3.253.677	3.253.677	3.253.677	3.253.677	2.336.750	2.336.750
Video proyector Epson PowerLite w52+ tecnologia:3LCD de 3 chips(4,000 lumenes en Blanco y color - Resolución WXGA 1.280 px x 800px)x3)	2	-	-	6.282.576	12.565.152	4.792.511	9.585.022	6.013.963	12.027.926
Sonido vertical Rockville 1600W altavoces activos de PA/DJ + MEZC	2	-	-	6.170.000	12.340.000	5.955.326	11.910.652	-	-
		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA	13.650.878	IVA	31.008.377

Cotizaciones VESTUARIOS							
Descripción	Cant	Creaciones Viruma S.A.S ZOMAC		Diseños Sofia Ramos		Diseños y Creaciones GEYMAR	
		Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total
Vestuario de baile típico Cumbia faldas elaboradas en dacrón o poliéster de cuadros o flores, con arandelas y encajes, Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla 10,12,14 y 16.	12	360.000	4.320.000	220.000	2.640.000	292.000	3.504.000
Vestuario de baile típico Cumbia Hombre (pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, mochila, pañoleta en dacrón rojo y sombrero) Talla 10,12,14 y 16.	12	288.000	3.456.000	240.000	2.880.000	220.000	2.640.000
Vestuario para baile típico de joropo. Falda amplia con vuelo, encajes y arandelas Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla 10,12,14 y 16.	12	360.000	4.320.000	350.000	4.200.000	290.000	3.480.000
Vestuario para baile típico de joropo. Hombre. (Pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, pañoleta en dacrón rojo y sombrero) Talla 10,12,14 y 16.	12	288.000	3.456.000	200.000	2.400.000	220.000	2.640.000
Vestuario para baile típico puya Mujer falda blusa, pañoleta en satín o dacrón. Talla 10,12,14 y 16.	12	192.000	2.304.000	100.000	1.200.000	145.000	1.740.000
Vestuario para baile típico puya Hombre pantalón, camisa, pañoleta en satín o dacrón. Talla 10,12,14 y 16.	12	168.000	2.016.000	100.000	1.200.000	145.000	1.740.000

Cotizaciones mobiliario							
Descripción	Cant	MEDIATICS		JM Soluciones Integrales		OfiES	
		Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total	Valor unitario	Valor total
Estantería metal/Madera Galvanizado+ tornillos 192x100x50 cm 5 niveles gris	4	433.355	1.733.420	499.900	1.999.600	-	-
Mesa de Lectura (0,73 m de lato x 120 de ancho x 0,90 largo)	2	646.360	1.292.720	696.250	1.392.500	479.375	958.750
Tablero metálico móvil, tubo cuadrado 2x1 Cal 18, rodachines metálicos de 2 (alto 1,80 x ancho 1,50mts)	2	631.670	1.263.340	689.250	1.378.500	-	-
Set de mesa infantil+ 6 sillas hexakids	4	1.431.936	5.727.744	1.550.000	6.200.000	2.275.000	9.100.000
Atril 042, superficie acrilica 12 MM tubería rolado pintura aluminio, base acero inox, niveladores, inox, soporte central acrílico 12.MM , altura 120 cm	2	2.359.144	4.718.288	2.994.000	5.988.000	-	-
Sillas interlocutora isósceles negra	30	185.094	5.552.820	208.900	6.267.000	159.250	4.777.500
		IVA	3.854.783	IVA INCLUIDO		IVA	2.818.888

Cotizaciones INSTRUMENTOS MUSICALES				
	Descripción	Cant	Valor unitario	Valor total
Distribuidora Olimpiada	Timbal LP Prestige GIO 13" 14" LP1314	1	2.400.000	2.400.000
	Batería Ludwig c. Maple 5 piezas	1	9.800.000	9.800.000
	Güiras tropicales con trince y estuche personalizado	1	45.000	45.000
	Cajas vallenatas, con estuche personalizado	1	130.000	130.000
	Forro duro millenum cuatro llaneros	1	49.000	49.000
	Enconrado nylon para guitarra acústica	1	15.000	15.000
	Encordado guitarra eléctrica	1	15.000	15.000
	Enconrdado para bajo 5 cuerdas	1	68.000	68.000
	Encordado para bajo 4 cuerdas	1	68.000	68.000
	pares de banquetas para bateria Boss	1	20.000	20.000
	banquetas para timbal Vater	1	20.000	20.000
	piano 373+ cargador	1	1.480.000	1.480.000
	Base para piano	1	120.000	120.000
	Acord hohner rey vallenato adg negro	1	3.600.000	3.600.000
	guacharaca en madera	1	20.000	20.000
	guitarra ac Yamaha C40	1	510.000	510.000
	Flauta genérica	1	20.000	20.000

	Flauta dulce Hohner soprano 9508	1	50.000	50.000
	Planta bajo Fender RUMBLE 15V3	1	660.000	660.000
	Planta bajo Fender RUMBLE 25V3	1	700.000	700.000
	Planta bajo Fender RUMBLE 40V3	1	1.200.000	1.200.000
	Planta bajo Fender RUMBLE LT25	1	930.000	930.000
Casa musical	Timbal 13 y 14 t platillo Jb.	5	2.400.000	12.000.000
	Batería Boss Completa-	5	2.200.000	11.000.000
	Guitarra tropical con estuche	10	130.000	1.300.000
	cajas vallenatas con estuche	10	260.000	2.600.000
	Estuche semiduro	10	120.000	1.200.000
	Encordados neglon	15	75.000	1.125.000
	Encordados eléctrica	10	75.000	750.000
	Encordados bajo 5 cdas	10	130.000	1.300.000
	Encordados bajo 4 cdas	10	120.000	1.200.000
	baquetas batería Boss	20	30.000	600.000
	baquetas timbal	20	40.000	800.000
	Teclado Yamaha PSRE373base	15	1.600.000	24.000.000
	Acordeón Hobner rey vallenato	10	4.100.000	41.000.000
	Guacharaca madera	10	40.000	400.000
	Guitarra Yamaha c-40	15	650.000	9.750.000
	Flauta Yamaha YS 23	30	35.000	1.050.000
	Planta bajo Fender	5	1.200.000	6.000.000
MILENIUM	Timbal latinoamericano medida 13"14 con paral, platillo sabian B8 de 16 cencerro y jamblock lp	5	1.200.000	6.000.000
	Batería acústica Boss completa, incluye bombo, tones aereos, ton de piso, redoblante, platillos, parales de platillo, silla, parales de redoblante, pedal de bombo y baquetas.	5	1.300.000	6.500.000
	Güira con trinche y estuche personalizado	10	120.000	1.200.000
	Cajas vallenatas en fibra con estuche personalizado	10	250.000	2.500.000
	estuche semiduro para caja vallenata personalizado	10	65.000	650.000
	Encordado Nylo para guitarra acústica la bella 900b	15	60.000	900.000
	Encordado guitarra eléctrica d addario XÑ	10	30.000	300.000
	Encordado para bajo 5 cuerdas ozeki	10	45.000	450.000
	Encordado para bajo 4 cuerdas ozeki	10	28.000	280.000
	Pares de baquetas punta nylon	20	20.000	400.000
	Baquetas para timbal vic firth	20	40.000	800.000
	Teclados ymaha psr - 373+ Adaptador+ base +pedal+ estuche semiduro	15	1.450.000	21.750.000

	Acordeón Hohner rey vallenato con estuche	10	4.280.000	42.800.000
	guacharaca en madera	10	35.000	350.000
	Guitarra clásica Yamaha C40 diestros natural palo de rosa brillante	15	620.000	9.300.000
	Flauta ducle Yamaha YRS-22	30	32.000	960.000
	Planta bajo fender RUMBLE 25 V3	5	900.000	4.500.000

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO
Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza

CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA MODERNA S.A.S
NIT: 900972870-6

MAICAO LA GUAJIRA

SEÑORES
ALCALDIA MUNICPAL DE MAICAO
LA CIUDAD

REF.: COTIZACION

ADECUACIOPNES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CASA LUDICA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	$ 16.229	$ 1.054.872
1.2	Demolicion pañete de Losa	M2	15	$ 25.965	$ 389.477
1.3	Desmonte de cubierta	M2	515	$ 9.962	$ 5.130.276
1.4	Remocion de Impermeabilizacion	M2	44	$ 5.977	$ 262.989
1.5	Desmonte de ventanas	Un	10	$ 44.095	$ 440.951
1.6	Desmonte de puertas metalicas	Un	7	$ 73.492	$ 514.445
1.7	Desmonte de malla eslabonada	M2	203	$ 13.338	$ 2.707.573
1.8	Remocion de Piso en adoquin	M2	20	$ 12.249	$ 244.980
				-	
2.	**PISOS**			-	
2.1	Relleno selecc. y compactado manualmente	M3	8	$ 166.879	$ 1.335.034
2.1	Reposicion piso en ceramica	M2	10	$ 120.999	$ 1.209.986
				-	
3.	**PAÑETE Y ACABADOS**			-	
3.1	Pañete allanado	M2	65	$ 29.526	$ 1.919.217
3.2	Resane de muros	M2	20	$ 18.052	$ 361.032
3.3	Resane de losas	M2	15	$ 26.517	$ 397.753
3.3	Pañete de losas	M2	20	$ 36.045	$ 720.908

arquitecturamodernasas1@gmail.com
Carrera 12 N° 19 - 20
Maicao - La Guajira
+57 301 7916880
+57 300 8536710
+57 320 7993882
arquitecturamoderna_1

3.4	Estuco sobre muros	M2	65	$ 17.026	$ 1.106.660
3.5	Estuco bajo losa	M2	20	$ 26.530	$ 530.592
3.6	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1	M2	438	$ 19.768	$ 8.658.200
3.7	Pintura en vinilo tipo 1 bajo losa	M2	45	$ 22.716	$ 1.022.238
				-	
4.	**CUBIERTA**			-	
4.1	Instalacion de cubierta laminas termoacusticas	M2	515	$ 22.709	$ 11.694.908
4.2	Impermeabilizacion de Losa	M2	50	$ 40.848	$ 2.042.418
				-	
5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			-	
5.1	Instalacion de tanque Plastico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios	Un	1	$ 414.969	$ 414.969
5.2	Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias	Un	1	$ 820.138	$ 820.138
				-	
6.	**CARPINTERIA METALICA**			-	
6.1	Suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	Un	1	$ 4.201.113	$ 4.201.113
6.2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zocalo de aluminio	Un	2	$ 5.021.888	$ 10.043.777
6.3	Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm	M2	32	$ 1.105.410	$ 35.373.108
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37	M2	120	$ 1.068.660	$ 128.239.154
6.5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalacion	Ml	480	$ 72.777	$ 34.932.845
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14	Ml	75	$ 142.749	$ 10.706.157
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	

CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA MODERNA S.A.S
NIT: 900972870-6

7.1	Mantenimiento de instalaciones electricas existentes	GBL	1	$ 1.082.258	$ 1.082.258
8.	**LIMPIEZA GENERAL**			-	
8.1	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	$ 551.324	$ 551.324
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 268.109.352**

ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 64.346.244
IMPREVISTOS:	1%	$ 2.681.094
UTILIDAD:	5%	$ 13.405.468
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		**$ 348.542.158**

ARQ. JORGE LUIS ILLIDGE ISAZA
C.C. 84.074.529
R/L CAM SAS
NIT: 900972870-6

arquitecturamodernasas1@gmail.com
Carrera 12 N° 19 - 20
Maicao - La Guajira
+57 301 7916880
+57 300 8536710
+57 320 7993882
arquitecturamoderna_1

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

REF.: COTIZACION

De nuestra consideración:

Nos es muy grato dirigirnos a Ustedes para hacerle llegar nuestros saludos y presentarles nuestro cotizacion para ADECUACIOPNES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CASA LUDICA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO. Ofrecemos disponibilidad total para dar inicio a los trabajos.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	$ 16.891	$ 1.097.928
1.2	Demolicion pañete de Losa	M2	15	$ 27.025	$ 405.374
1.3	Desmonte de cubierta	M2	515	$ 10.368	$ 5.339.675
1.4	Remocion de Impermeabilizacion	M2	44	$ 6.221	$ 273.723
1.5	Desmonte de ventanas	Un	10	$ 45.895	$ 458.949
1.6	Desmonte de puertas metalicas	Un	7	$ 76.492	$ 535.443
1.7	Desmonte de malla eslabonada	M2	203	$ 13.882	$ 2.818.087
1.8	Remocion de Piso en adoquin	M2	20	$ 12.749	$ 254.980
				-	
2.	**PISOS**			-	
2.1	Relleno selecc. y compactado manualmente	M3	8	$ 173.691	$ 1.389.526
2.1	Reposicion piso en ceramica	M2	10	$ 125.937	$ 1.259.374
				-	
3.	**PAÑETE Y ACABADOS**			-	
3.1	Pañete allanado	M2	65	$ 30.732	$ 1.997.553
3.2	Resane de muros	M2	20	$ 18.788	$ 375.768
3.3	Resane de losas	M2	15	$ 27.599	$ 413.987
3.3	Pañete de losas	M2	20	$ 37.517	$ 750.332
3.4	Estuco sobre muros	M2	65	$ 17.720	$ 1.151.830

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

3.5	Estuco bajo losa	M2	20	$ 27.612	$ 552.248
3.6	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1	M2	438	$ 20.574	$ 9.011.596
3.7	Pintura en vinilo tipo 1 bajo losa	M2	45	$ 23.644	$ 1.063.962
				-	
4.	**CUBIERTA**			-	
4.1	Instalacion de cubierta laminas termoacusticas	M2	515	$ 23.635	$ 12.172.252
4.2	Impermeabilizacion de Losa	M2	50	$ 42.516	$ 2.125.782
				-	
5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			-	
5.1	Instalacion de tanque Plastico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios	Un	1	$ 431.907	$ 431.907
5.2	Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias	Un	1	$ 853.614	$ 853.614
				-	
6.	**CARPINTERIA METALICA**			-	
6.1	Suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	Un	1	$ 4.372.587	$ 4.372.587
6.2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zocalo de aluminio	Un	2	$ 5.226.864	$ 10.453.727
6.3	Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm	M2	32	$ 1.150.528	$ 36.816.908
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37	M2	120	$ 1.112.278	$ 133.473.406
6.5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalacion	Ml	480	$ 75.747	$ 36.358.675
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14	Ml	75	$ 148.575	$ 11.143.143
				$ 0	
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

7.1	Mantenimiento de instalaciones electricas existentes	GBL	1	$ 1.126.432	$ 1.126.432
				$ 0	
8.	**LIMPIEZA GENERAL**			-	
8.1	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	$ 573.827	$ 573.827
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 279.052.595**

ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 66.972.623
IMPREVISTOS:	1%	$ 2.790.526
UTILIDAD:	5%	$ 13.952.630
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		**$ 362.768.374**

ING. ALVARO JOSE PAJARO ALVAREZ
C.C. No. 1065605571 expedida en Valledupar
M.P. 54202261022 NTS

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

INGTOPARQ LTDA
CONSTRUCTORES
Ingeniería · Topografía · Arquitectura
Nit: 900055441 - 6
Calle 10A Nº 3-64 Telefax: 7263400

MAICAO LA GUAJIRA

Señores
ALCALDIA DE MAICAO
Ciudad

REFERENCIA: **COTIZACION DE OBRAS**

OBJETO: ADECUACIOPNES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA CASA LUDICA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion de Pañete muros	M2	65	$ 16.726	$ 1.087.164
1.2	Demolicion pañete de Losa	M2	15	$ 26.760	$ 401.399
1.3	Desmonte de cubierta	M2	515	$ 10.267	$ 5.287.325
1.4	Remocion de Impermeabilizacion	M2	44	$ 6.160	$ 271.040
1.5	Desmonte de ventanas	Un	10	$ 45.445	$ 454.450
1.6	Desmonte de puertas metalicas	Un	7	$ 75.742	$ 530.193
1.7	Desmonte de malla eslabonada	M2	203	$ 13.746	$ 2.790.458
1.8	Remocion de Piso en adoquin	M2	20	$ 12.624	$ 252.480
				-	
2.	**PISOS**			-	
2.1	Relleno selecc. y compactado manualmente	M3	8	$ 171.988	$ 1.375.903
2.1	Reposicion piso en ceramica	M2	10	$ 124.703	$ 1.247.027
				-	
3.	**PAÑETE Y ACABADOS**			-	
3.1	Pañete allanado	M2	65	$ 30.430	$ 1.977.969
3.2	Resane de muros	M2	20	$ 18.604	$ 372.084
3.3	Resane de losas	M2	15	$ 27.329	$ 409.929
3.3	Pañete de losas	M2	20	$ 37.149	$ 742.976
3.4	Estuco sobre muros	M2	65	$ 17.547	$ 1.140.537
3.5	Estuco bajo losa	M2	20	$ 27.342	$ 546.834
3.6	Pintura sobre muros en vinilo tipo 1	M2	438	$ 20.373	$ 8.923.247
3.7	Pintura en vinilo tipo 1 bajo losa	M2	45	$ 23.412	$ 1.053.531
				-	
4.	**CUBIERTA**			-	
4.1	Instalacion de cubierta laminas termoacusticas	M2	515	$ 23.404	$ 12.052.916
4.2	Impermeabilizacion de Losa	M2	50	$ 42.099	$ 2.104.941
				-	

INGTOPARQ LTDA
CONSTRUCTORES
Ingeniería - Topografía - Arquitectura
NIT: 900055441 - 6
Calle 10A Nº 3-64 Telefax: 7263400

5.	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**			-	
5.1	Instalacion de tanque Plastico de 2000 lts incluye motobomba y accesorios	Un	1	$ 427.672	$ 427.672
5.2	Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias	Un	1	$ 845.245	$ 845.245
				-	
6.	**CARPINTERIA METALICA**			-	
6.1	Suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio 2.00x 1.60 m doble hoja con pisavidrios curvos vidrio de 5 mm incoloro	Un	1	$ 4.329.719	$ 4.329.719
6.2	Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado 10 mm incoloro con cierra puerta hidraulica y zocalo de aluminio	Un	2	$ 5.175.620	$ 10.351.240
6.3	Ventana en aluminio ref. 70-38 vidrio de 5 mm	M2	32	$ 1.139.249	$ 36.455.958
6.4	Protectores en tubo persiana de aluminio p.2.37	M2	120	$ 1.101.374	$ 132.164.843
6.5	Correa metalica en tubo rectangular de 4"x2" calibre 14 incluye pintura e instalacion	Ml	480	$ 75.005	$ 36.002.218
6.6	Columnas en tubo galvanizado de 4" Cal. 14	Ml	75	$ 147.119	$ 11.033.897
				$ 0	
7.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			-	
7.1	Mantenimiento de instalaciones electricas existentes	GBL	1	$ 1.115.388	$ 1.115.388
				$ 0	
8.	**LIMPIEZA GENERAL**			-	
8.1	Limpieza y retiro de material sobrante	GBL	1	$ 568.201	$ 568.201
	TOTAL COSTO DIRECTO:				**$ 276.316.784**
	ADMINISTRACIÓN:			24%	$ 66.316.028
	IMPREVISTOS:			1%	$ 2.763.168
	UTILIDAD:			5%	$ 13.815.839
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:				**$ 359.211.819**

Atentamente,

ARNOLDIS GARCIA FERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 19.705.511 DE BOSCONIA CESAR

CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA MODERNA S.A.S
NIT: 900972870-6

MAICAO LA GUAJIRA

SEÑORES
ALCALDIA MUNICPAL DE MAICAO
LA CIUDAD

REF.: COTIZACION

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL BINACIONAL DEL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. PARCIAL
1	**Preliminares**				**5.118.512**
1.1	Cerramiento en tela verde	ML	80	51.109	4.088.720
1.2	Excavacion en terreno natural para viga de cerramiento	Ml	68	15.144	1.029.792
2	**ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES**				**11.774.035**
2.1	Desmonte de cubierta y estructura de cubierta	M2	365	31.224	11.396.760
2.2	Desmonte de puertas de aluminio	Und	5	75.455	377.275
2.3	Desmonte de ventanas de aluminio (2,20 x3,0 m)	Und	13	45.273	588.549
2.4	Demolicion en muro en altura de 2,60 m	M2	89,28	16.885	1.507.493
2.5	Desmonte de viga metalica de 0.22x0.16 m	ML	64,2	17.595	1.129.599

arquitecturamodernasas1@gmail.com
Carrera 12 N° 19 - 20
Maicao - La Guajira
+57 301 7916880
+57 300 8536710
+57 320 7993882
arquitecturamoderna_1

3	**Estructura de concreto**				10.615.208
3.1	Concreto para la viga de cimentacion de cerramiento 0.40 x 0.40 m	ML	68	156.106	10.615.208
4	**MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA**				**20.509.460**
4.1	Mamposteria bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	53.004	4.732.197
4.2	Pañete allanado 1:4	M2	179,56	30.248	5.431.331
4.3	Estuco plastico sobre muros interior	M2	89,28	17.373	1.551.061
4.4	Estuco acrilico para muro exterior	M2	89,28	17.373	1.551.061
4.5	Pintura color blanco VINILO TIPO 1	M2	359,12	20.171	7.243.810
5	**Cubierta**				**53.179.040**
5.1	Suministro E Instalacion De Cubierta En Lamina Termoacustica	M2	365	145.696	53.179.040
6	**Estructura metalica**				**191.789.360**
6.1	Estructura Metálica para cubierta en Acero A36 ó similar, incluye Suministro, fabricación, soldadura, Pintura Epoxica y Acabado, Incluye Transporte Y Montaje.	Kg	1.868	40.070	74.850.760
6.2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metalicas)	ML	34	1.093.525	37.179.850
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura metálica existente	ML	390	30.042	11.716.380
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificada incluye tubos y ángulos	M2	132	292.845	38.655.540

6.5	Suministro e instalación de portón 2,0 x 1,0 m en cerramiento de malla eslabonada	Und	1	1.033.966	1.033.966
6.6	Suministro e instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	88.604	5.847.864
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	Und	2	11.252.500	22.505.000
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**				**11.220.480**
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	Und	10	139.385	1.393.850
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	28.879	1.732.740
7.3	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	Und	1	800.938	800.938
7.4	Acometida principal en cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	20.260	607.800
7.5	Acometida interna 110 v cable # 10	ML	100	24.327	2.432.700
7.8	Suministro e instalacion de varilla polo a tierra	Und	1	498.235	498.235
7.9	Suministro e instalacion de reflectores led 40 w	Und	3	334.469	1.003.407
7.10	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	Und	10	275.081	2.750.810
8	**Acabados de pisos**				**4.065.225**
8.1	Mantenimiento y pulida del piso existente	M2	263,36	15.436	4.065.225
9	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**				**65.835.962**
9.1	Suministro e instalacion puertas en aluminio incluye cerradura y marcos	Und	5	4.116.876	20.584.380
9.2	Sumintro e intatalación de ventanas en aluminio (2.2x3m)	Und	13	1.741.922	22.644.986

CONSTRUCTORA
ARQUITECTURA MODERNA S.A.S
NIT: 900972870-6

9.3	Suministro e intalacion de protectores de puertas y ventanas	Und	18	1.255.922	22.606.596
TOTAL COSTO DIRECTO:					**374.107.282**
ADMINISTRACIÓN:				24%	$ 89.785.748
IMPREVISTOS:				1%	$ 3.741.073
UTILIDAD:				5%	$ 18.705.364
VALOR TOTAL DE LAS ADECUACIONES:					**486.339.467**

ARQ. JORGE LUIS ILLIDGE ISAZA
C.C. 84.074.529
R/L CAM SAS
NIT: 900972870-6

arquitecturamodernasas1@gmail.com
Carrera 12 N° 19 - 20
Maicao - La Guajira
+57 301 7916880
+57 300 8536710
+57 320 7993882
arquitecturamoderna_1

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

REF.: COTIZACION

De nuestra consideración:

Nos es muy grato dirigirnos a Ustedes para hacerle llegar nuestros saludos y presentarles nuestro cotizacion para **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL BINACIONAL DEL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**. Ofrecemos disponibilidad total para dar inicio a los trabajos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1	**Preliminares**				**$ 5.220.882**
1.1	Cerramiento en tela verde	ML	80	52.131	4.170.494
1.2	Excavacion en terreno natural para viga de cerramiento	Ml	68	15.447	1.050.388
2	**ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES**				**$ 12.009.516**
2.1	Desmonte de cubierta y estructura de cubierta	M2	365	31.848	11.624.695
2.2	Desmonte de puertas de aluminio	Und	5	76.964	384.821
2.3	Desmonte de ventanas de aluminio (2,20 x3,0 m)	Und	13	46.178	600.320
2.4	Demolicion en muro en altura de 2,60 m	M2	89,28	17.223	1.537.643
2.5	Desmonte de viga metalica de 0.22x0.16 m	ML	64,2	17.947	1.152.191
3	**Estructura de concreto**				**$ 10.827.512**
3.1	Concreto para la viga de cimentacion de cerramiento 0.40 x 0.40 m	ML	68	159.228	10.827.512
4	**MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA**				**$ 20.919.650**
4.1	Mamposteria bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	54.064	4.826.841
4.2	Pañete allanado 1:4	M2	179,56	30.853	5.539.957
4.3	Estuco plastico sobre muros interior	M2	89,28	17.720	1.582.083
4.4	Estuco acrilico para muro exterior	M2	89,28	17.720	1.582.083
4.5	Pintura color blanco VINILO TIPO 1	M2	359,12	20.574	7.388.686

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

5	**Cubierta**				**$ 54.242.621**
5.1	Suministro E Instalacion De Cubierta En Lamina Termoacustica	M2	365	148.610	54.242.621
6	**Estructura metalica**				**$ 195.625.147**
6.1	Estructura Metálica para cubierta en Acero A36 ó similar, incluye Suministro, fabricación, soldadura, Pintura Epoxica y Acabado, Incluye Transporte Y Montaje.	Kg	1.868	40.871	76.347.775
6.2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metalicas)	ML	34	1.115.396	37.923.447
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura metálica existente	ML	390	30.643	11.950.708
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificada incluye tubos y ángulos	M2	132	298.702	39.428.651
6.5	Suministro e instalación de portón 2,0 x 1,0 m en cerramiento de malla eslabonada	Und	1	1.054.645	1.054.645
6.6	Suministro e instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	90.376	5.964.821
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	Und	2	11.477.550	22.955.100
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**				**$ 11.444.890**
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	Und	10	142.173	1.421.727
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	29.457	1.767.395
7.3	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	Und	1	816.957	816.957
7.4	Acometida principal en cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	20.665	619.956
7.5	Acometida interna 110 v cable # 10	ML	100	24.814	2.481.354
7.8	Suministro e instalacion de varilla polo a tierra	Und	1	508.200	508.200
7.9	Suministro e instalacion de reflectores led 40 w	Und	3	341.158	1.023.475
7.10	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	Und	10	280.583	2.805.826
8	**Acabados de pisos**				**$ 4.146.529**
8.1	Mantenimiento y pulida del piso existente	M2	263,36	15.745	4.146.529
9	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**				**$ 72.281.198**

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

MUNIVICH
CONSTRUCCIONES

9.1	Suministro e instalacion puertas en aluminio incluye cerradura y marcos	Und	5	4.199.214	20.996.068
9.2	Sumintro e intatalación de ventanas en aluminio (2.2x3m)	Und	13	1.974.178	25.664.319
9.3	Suministro e intalacion de protectores de puertas y ventanas	Und	18	1.423.378	25.620.811

TOTAL COSTO DIRECTO:		**$ 386.717.945**
ADMINISTRACIÓN:	24%	$ 92.812.307
IMPREVISTOS:	1%	$ 3.867.179
UTILIDAD:	5%	$ 19.335.897
VALOR TOTAL DE LAS ADECUACIONES:		**$ 502.733.329**

ING. ALVARO JOSE PAJARO ALVAREZ
C.C. No. 1065605571 expedida en Valledupar
M.P. 54202261022 NTS

Dirección: Carrera 4B # 39 – 40 Valledupar
Teléfono: 3145920024
Correo: munivichconstrucciones@gmail.com

INGTOPARQ LTDA
CONSULTORES
Ingeniería - Topografía - Arquitectura
NIT 900055441 - 6
Calle 10A Nº 3-64 Telefax: 7263400

MAICAO LA GUAJIRA

Señores
ALCALDIA DE MAICAO
Ciudad

REFERENCIA: **COTIZACION DE OBRAS**

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL BINACIONAL DEL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL
1	**Preliminares**				**$ 5.169.697**
1.1	Cerramiento en tela verde	ML	80	51.620	4.129.607
1.2	Excavacion en terreno natural para viga de cerramiento	Ml	68	15.295	1.040.090
2	**ADECUACIONES - DESMONTE Y DEMOLICIONES**			0	**$ 11.891.776**
2.1	Desmonte de cubierta y estructura de cubierta	M2	365	31.536	11.510.728
2.2	Desmonte de puertas de aluminio	Und	5	76.210	381.048
2.3	Desmonte de ventanas de aluminio (2,20 x3,0 m)	Und	13	45.726	594.434
2.4	Demolicion en muro en altura de 2,60 m	M2	89,28	17.054	1.522.568
2.5	Desmonte de viga metalica de 0.22x0.16 m	ML	64,2	17.771	1.140.895
3	**Estructura de concreto**			0	**$ 10.721.360**
3.1	Concreto para la viga de cimentacion de cerramiento 0.40 x 0.40 m	ML	68	157.667	10.721.360
4	**MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA**			0	**$ 20.714.555**

4.1	Mamposteria bloque cemento e=0,10 m	M2	89,28	53.534	4.779.519
4.2	Pañete allanado 1:4	M2	179,56	30.550	5.485.644
4.3	Estuco plastico sobre muros interior	M2	89,28	17.547	1.566.572
4.4	Estuco acrilico para muro exterior	M2	89,28	17.547	1.566.572
4.5	Pintura color blanco VINILO TIPO 1	M2	359,12	20.373	7.316.248
5	**Cubierta**			0	**$ 53.710.830**
5.1	Suministro E Instalacion De Cubierta En Lamina Termoacustica	M2	365	147.153	53.710.830
6	**Estructura metalica**			0	**$ 193.707.255**
6.1	Estructura Metálica para cubierta en Acero A36 ó similar, incluye Suministro, fabricación, soldadura, Pintura Epoxica y Acabado, Incluye Transporte Y Montaje.	Kg	1.868	40.471	75.599.268
6.2	Reposición parcial de elementos estructurales (columnas y vigas metalicas)	ML	34	1.104.460	37.551.649
6.3	Mantenimiento y pintura de estructura metálica existente	ML	390	30.342	11.833.544
6.4	Suministro e instalacion de malla eslabonada metal plastificada incluye tubos y ángulos	M2	132	295.773	39.042.095

6.5	Suministro e instalación de portón 2,0 x 1,0 m en cerramiento de malla eslabonada	Und	1	1.044.306	1.044.306
6.6	Suministro e instalación de concertina en cerramiento de malla eslabonada	ML	66	89.490	5.906.343
6.7	Mantenimiento de torres laterales de arriostramiento	Und	2	11.365.025	22.730.050
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**			0	**$ 11.332.684**
7.1	Salida tomacorriente doble 110 V con polo a tierra	Und	10	140.779	1.407.789
7.2	Ducto EMT 3/4"	ML	60	29.168	1.750.067
7.3	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	Und	1	808.947	808.947
7.4	Acometida principal en cable 2 # 8 + 1 # 10	ML	30	20.463	613.878
7.5	Acometida interna 110 v cable # 10	ML	100	24.570	2.457.027
7.8	Suministro e instalacion de varilla polo a tierra	Und	1	503.217	503.217
7.9	Suministro e instalacion de reflectores led 40 w	Und	3	337.814	1.013.441
7.10	Suministro e instalacion de luminarias LED 40 W	Und	10	277.832	2.778.318
8	**Acabados de pisos**			0	**$ 4.105.877**
8.1	Mantenimiento y pulida del piso existente	M2	263,36	15.590	4.105.877

9	**CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO**			0	**$ 71.572.558**
9.1	Suministro e instalacion puertas en aluminio incluye cerradura y marcos	Und	5	4.158.045	20.790.224
9.2	Sumintro e intatalación de ventanas en aluminio (2.2x3m)	Und	13	1.954.824	25.412.708
9.3	Suministro e intalacion de protectores de puertas y ventanas	Und	18	1.409.424	25.369.626

	TOTAL COSTO DIRECTO:	**$**	**382.926.592**
ADMINISTRACIÓN:	24%	$	91.902.382
IMPREVISTOS:	1%	$	3.829.266
UTILIDAD:	5%	$	19.146.330
	VALOR TOTAL DE LAS ADECUACIONES:	**$**	**497.804.570**

Atentamente,

ARNOLDIS GARCIA HERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 19.705.511 DE BOSCONIA CESAR

JM SOLUCIONES INTEGRALES

JULIO MORENO OSORIO
CARRERA 5 NO. 16 - 68 TELEFONO 3017731354 E-MAIL jmsolucionesmaicao@hotmail.com
NIT Nº 72.168.771-4

INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CONTROLES DE ACCESOS DIGITALES, ALARMAS, ACCESORIA EN TODO LO RELACIONADO CON SISTEMAS Y TEGNOLOGIA

Señor(res)
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO
MAICAO - LA GUAJIRA

FECHA DE EXPEDICION
05/07/2024

COTIZACION

FECHA DE VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNI	TOTAL
20	Dell Inspiron 15" 3520, Intel Core i5-1235U, Ram 8 GB; DDR4 2666 MT/s, 512GB M.2 SSD, Pantalla 15.6", FHD 1920x1080, Win 11 pro. Garantia 1 Year	$ 2.645.271	$ 52.905.420
2	Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L5590 COLOR	$ 1.776.466	$ 3.552.932
2	Video Proyector Epson PowerLite W52+/Tecnologia: 3LCD de 3 chips/(4.000 lúmenes en Blanco y Color - Resolución.WXGA 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3	$ 6.282.576	$ 12.565.152
5	UPS POWEST 500W	$ 193.456	$ 967.280
1	Sistema de cámaras de seguridad (6 cámaras 2mp, grabador 8 canales, disco duro 1tb, accesorios conectividad, cableado, canaletizacion + servicios de ingeniería).	$ 3.253.677	$ 3.253.677
2	SONIDO VERTICAL ROCKVILLE 1600W ALTAVOCES ACTIVOS DE PA/DJ + MEZC	$ 6.170.000	$ 12.340.000

SUB TOTAL		$ 85.584.461
IVA	19%	$ -
TOTAL		$ 85.584.461

JULIO MORENO O.
ING DE SISTEMAS

PENSAMOS EN SU SEGURIDAD

MEDIATICS

Servicios & Soluciones

NIT. 901314782-8

Maicao, La Guajira 18 de Junio 2024

Sr.
Alcaldia Municipal de Maicao

Maicao La Guajira.

Cordial Saludo.

Nos permitimos enviar propuesta comercial segun sugerido via email.

ITEM	DETALLE	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Dell Inspiron 15" 3520, Intel Core i5-1235U, Ram 8 GB; DDR4 2666 MT/s, 512GB M.2 SSD, Pantalla 15.6", FHD 1920x1080, Win 11 pro. Garantía 1 Year Carry-in Service SNS-LA	20	$ 2.143.271,00	$ 42.865.420
2	Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L5590 COLOR	2	$ 1.696.466	$ 3.392.932
3	Video Proyector Epson PowerLite W52+/Tecnología: 3LCD de 3 chips/(4.000 lúmenes en Blanco y Color - Resolución WXGA 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3	2	$ 4.792.511	$ 9.585.022
4	UPS POWEST 500W	5	$ 167.805	$ 839.025
5	Sistema de cámaras de seguridad (6 cámaras 2mp, grabador 8 canales, disco duro 1tb, accesorios conectividad, cableado, canaletizacion + servicios de ingeniería).	1	$ 3.253.677	$ 3.253.677
6	SONIDO VERTICAL ROCKVILLE 1600W ALTAVOCES ACTIVOS DE PA/DJ + MEZC	2	$ 5.955.326	$ 11.910.652
Nota: La compra incluye flete a destino cliente. Esta cotización puede variar según TRM.			**SUBTOTAL**	**$ 71.846.727**
			IVA	**$ 13.650.878**
			TOTAL	**$ 85.497.605**

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO
Contado, para hacer efectiva la propuesta.

TIEMPO DE ENTREGA
• (4 a 8) días calendario una vez verificado el pago.

GARANTÍAS

- Los equipos se entregan probados y verificados sin embargo las marcas de los equipos cumplen con garantias hasta 1 año calendario por daños de fabrica en el buen funcionamiento de los equipos.

- No ce cumple la garantia por daños de picos de voltajes, mala manipulacion y/o daños oacsionados por derrame de liquidos, deterioro entre otros.

Los valores ofertados incluyen impuestos.

Bancolombia
Cuenta de ahorros
09600000746

Ing Julio Ramos Santiago.
Gerente.
Mediatisc Integrales sas zomac.
Nit. 901314782-8

Infosis

SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES

Maicao, Jul 5/24

Señores:
CASA DE LA CULTURA MAICAO
Ciudad

REF.: cotizacion

Cordial Saludo.
En atención a su solicitud le presento cotización de lo siguiente:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
20	PORTATIL DELL 3520 CORPORATIVO Procesador: Intel Core i5 1235U Memoria: 8GB DDR4 2,666 Disco Duro: 512 Gb SSD Pantalla: 15,6" FHD S.O. Win 11 Pro	$3.290.000	$65.800.000 Iva Incluido
5	UPS CDP 500va/360w	$ 280.000	$ 1,400.000 Iva incluido
2	Impresora Epson Multifuncional L5590	$ 1.680.000	$ 3.360.000 iva incluido
1	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD 1Gravador NVR 8CH @1080 3 Cámaras IP Bala semimetálica 2mp 3 Cámaras IP tipo domo semimetálica 2 mp. 1 Disco duro de un Tera para almacenar la información	$ 2.650.000	$ 2.650.000 iva incluido

Nota: Cotizacion valida por 5 dias. Los precios anteriores se cotizaron con iva ya incluido.
Forma de Pago: 50% anticipado,
una vez entregado los productos 50% final.

Esperamos ser su mejor opcion costo beneficio.

Calle 12 No 9-03 Maicao – La Guajira TelFax: 57 – 5 7267056

Infosis

SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES

Atentamente

Ing. ZULEIMA NAVARRO DIAZ

Calle 12 No 9-03 Maicao – La Guajira TelFax: 57 – 5 7267056

DISEÑOS SOFIA RAMOS

Nit: 45.760.767-4

Confección para damas. Caballeros y Niños

Especialidad en Ropa Deportiva y Escolar

COTIZACION

VESTUARIO	CANT	VLRUNIT	VLR TOTAL
Típico de cumbia dama, falda con arandelas, blusa bandeja tallas 12,14,16	12	$220.000	$2.640.000
Típico cumbia hombre pantalones, camisa, mochila, pañoleta y sombrero tallas 10,12,14,16	12	$240.000	$2.880.000
Típico del joropo dama falda amplia con encajes, blusa bandeja tallas 12,14,16	12	$350.000	$4.200.000
Típico del joropo hombre pantalón, camisa, pañoleta y sombrero tallas 12,14,16	12	$200.000	2.400.000
Típico de la puya dama falda, blusa, pantaloneta tallas 12,14,16	12	$100.000	1.200.000
Típico de la puya hombre pantalón, camisa, pañoleta tallas 12,14,16	12	$100.000	1.200.000
TOTAL			$14.520.000

NOTA: estos precios son libres de retención.

SOFIA RAMOS DISEÑOS

Carrera 13 N 13-52

Celular: 311-4256146-3126043439

Maicao la Guajira Colombia

Powered by CamScanner

Maicao, La Guajira, 21 Junio 2024

Sr
Alcalde de Maicao
E.S.D
Cordial saludo

REFERENCIA: Cotización de vestuario típico.

La empresa **Creaciones Viruma sas zomac** con **Nit. 901383411-5**, por medio del presente escrito, muy respetuosamente acude a ustedes para hacerles llegar la siguiente cotización para la confección de uniformes de bailes típicos colombianos.

	VESTUARIOS			
	Vestuario de Baile típico Cumbia faldas elaboradoras en dacrón o poliéster de cuadros o flores, con arandelas y encajes. Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla 10, 12, 14 y 16	12	$ 360.000	$ 4.320.000
	Vestuario de baile típico Cumbia Hombre (pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, mochila, pañoleta en dacrón rojo y sombrero). Tallas 10, 12, 14 y 16	12	$ 288.000	$ 3.456.000
	Vestuario para Baile típico del joropo. Falda amplia con vuelo, encajes y arandelas, Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla 10, 12, 14 y 16.	12	$ 360.000	$ 4.320.000
	Vestuario para Baile típico del joropo Hombre. (pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, pañoleta en dacrón rojo y sombrero) Tallas 10, 12, 14 y 16.	12	$ 288.000	$ 3.456.000
	Vestuario para baile típico puya Mujer falda, blusa, pañoleta en satín o dacrón. Tallas 10, 12, 14 y 16	12	$ 192.000	$ 2.304.000
	Vestuario para baile típico puya Hombre pantalón, camisa, pañoleta en satín o dacrón. Talla 10, 12, 14 y 16	12	$ 168.000	$ 2.016.000
	TOTAL			**$ 19.872.000**

Cordialmente,

Victor Ernesto Rutto Martinez
Representante legal
Creaciones Viruma sas zomac
Cel. 3012980047

DISEÑOS Y CREACIONES GEYMAR

RUT: 14743758781

REFERENCIA: COTIZACIÓN DE VESTUARIOS DE DANZAS

VESTUARIOS			
Vestuario de Baile típico Cumbia faldas elaboradoras en dacrón o poliéster de cuadros o flores, con arandelas y encajes. Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla 10,12, 14 y 16.	12	$ 292.000	$ 3.504.000
Vestuario de baile típico Cumbia Hombre (pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, mochila, pañoleta en dacrón rojo y sombrero). Tallas 10,12, 14 y 16.	12	$ 220.000	$ 2.640.000
Vestuario para Baile típico del joropo. Falda amplia con vuelo, encajes y arandelas, Blusa cuello bandeja con arandelas y pasa cintas de un solo color. Talla10, 12, 14 y 16.	12	$ 290.000	$ 3.480.000
Vestuario para Baile típico del joropo Hombre. (pantalón en dacrón blanco, camisa en dacrón blanco, pañoleta en dacrón rojo y sombrero) Tallas: 10,12, 14 y 16.	12	$ 220.000	$ 2.640.000
Vestuario para baile típico puya Mujer falda, blusa, pañoleta en satín o dacrón. Tallas 10,12, 14 y 16.	12	$ 145.000	$ 1.740.000
Vestuario para baile típico puya Hombre pantalón, camisa, pañoleta en satín o dacrón. Talla 10,12, 14 y 16.	12	$ 145.000	$ 1.740.000
TOTAL			**$ 15.744.000**

OLGA MARTINEZ
Tecnóloga en Diseño de moda
3011592663

Powered by CamScanner

MILENIUM

FABRICA DE INSTRUMENTOS DE CUERDA

VLADIMIR MERCADO

18 DE JUNIO DEL 2024

COTIZACION

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
5	Timbal latinoamericano medida 13" - 14" con paral, platillo sabian B8x de 16" cencerro y jamblock lp	$ 1.200.000	$ 6.000.000
5	Batería acústica boss Completa. Incluye. Bombo, tones aereos, ton de piso, redoblante, platillos, parales de platillo, silla, parales de redoblante, pedal de bombo y baquetas	$ 1.300.000	$ 6.500.000
10	Güira Con Trinche y Estuche Personalizado	$ 120.000	$ 1.200.000
10	Cajas vallenata en fibra con estuche Personalizado	$ 250.000	$ 2.500.000
10	Estuche Semiduro Para Caja Vallenata Personalizado	$ 65.000	$ 650.000
15	Encordado Nylon Para Guitarra Acústica la bella 900B	$ 60.000	$ 900.000
10	Encordado Guitarra Eléctrica d'Addario XL	$ 30.000	$ 300.000
10	Encordado para bajo 5 cuerdas ozeki	$ 45.000	$ 450.000
10	Encordado para bajo 4 cuerdas ozeki	$ 28.000	$ 280.000
20	Pares de Baquetas punta nylon	$ 20.000	$ 400.000
20	Baquetas Para Timbal vic firth	$ 40.000	$ 800.000
15	Teclado Yamaha Psr-e373 + Adaptador+base+pedal+estuche semiduro	$ 1.450.000	$ 21.750.000
10	Acordeón Hohner Rey Vallenato con estuche	$ 4.280.000	$ 42.800.000
10	Guacharaca en Madera	$ 35.000	$ 350.000
15	Guitarra clásica Yamaha C40 para diestros natural palo de rosa brillante	$ 620.000	$ 9.300.000
30	Flauta Dulce Yamaha YRS-23	$ 32.000	$ 960.000
5	Planta bajo Fender RUMBLE 25 V3	$ 900.000	$ 4.500.000

TOTAL	**$**	**99.640.000**

Calle 28 N° 29 b - 33 sur
Barrio Santander
Bogotá D.C
Tel: 320-448-3288 | 320-899-3891
Email: milleniumgerenciageneral@gmail.com

@_fabricamilenium_
@Milenium
@guitarrasmilenium

Distribuidora Olimpiada

Jugetes - Musica - Hogar - Ferreteria

Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización - Cotización -

Fecha: 14 de junio
Nombre: Cliente

Requerimiento	Producto Disponible	Cantidad Un	Imagen	Precio cliente
Timbal latinoamericano medida 13" - 14" con paral, platillo sabian B8x de 16" cencerro y jamblock lp	TIMBAL LP PRESTIGE GIO 13"14" LP1314	1		2.400.000
Incluye. Bombo, tones aereos, ton de piso, redoblante, platillos, parales de platillo, silla, parales de redoblante, pedal de bombo y	BATERIA LUDWIG C. MAPLE 5 PIEZAS	1		9.800.000
Güiras Tropical Con Trinche y Estuche Personalizado	Güiras Tropical Con Trinche y Estuche Personalizado	1		45.000
Cajas vallenata, con estuche F	Cajas vallenata, con estuche Personalizado	1		130.000
Estuche Semiduro Para Caja Vallenata Personalizado	FORRO DURO MILLENIUM CUATRO LLANERO	1		49.000
Encordado Nylon Para Guitarr	Encordado Nylon Para Guitarra Acústica	1		15.000
Encordado Guitarra Eléctrica.	Encordado Guitarra Eléctrica.	1		15.000
Encordado para bajo 5 cuerda	Encordado para bajo 5 cuerdas.	1		68.000
Encordado para bajo 4 cuerda	Encordado para bajo 4 cuerdas.	1		68.000
Pares de Baquetas Para Bater	Pares de Baquetas Para Batería Boss.	1		20.000
Baquetas Para Timbal vater	Baquetas Para Timbal vater	1		20.000
Nuevot Adaptador+base+ pedal+forro	Piano 373 + Cargador	1		1.480.000
Base para piano	Base para piano			120.000
Acordeón Hohner Rey Vallena	ACORD HOHNER REY VALLENATO ADG NEGRO	1		3.600.000
Guacharaca en Madera	Guacharaca en Madera	1		20.000
Guitarra clasica Yamaha C40 para diestros natural palo de	GUITARRA AC YAMAHA C40	1		510.000
Flauta Generica	Flauta Generica	1		20.000
Flauta Dulce Yamaha YRS-23	FLAUTA DULCE HOHNER SOPRANO 9508	1		50.000
PLANTA BAJO FENDER	PLANTA BAJO FENDER RUMBLE 15 V3	1		660.000
PLANTA BAJO FENDER	PLANTA BAJO FENDER RUMBLE 25 V3	1		700.000
PLANTA BAJO FENDER	PLANTA BAJO FENDER RUMBLE 40 V3	1		1.200.000
PLANTA BAJO FENDER	PLANTA BAJO FENDER RUMBLE LT25	1		930.000
Total con PLANTA BAJO FENDER RUMBLE 15 V3 y seleccionando la flauta Yamaha productos subrayados no suman el total			TOTAL:	19.070.000

CASA MUSICAL

Mi Guajira

Nit. 40.915.214-2 Reg. Simplificado

VENTA, DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE TODAS LAS MARCAS

Fender Gibraltar Gretsch Ibanez SABIAN REMO YAMAHA

Calle 4 No. 8-05 / RIOHACHA, LA GUAJIRA- Celular: 300 8057654

E-mail: casamusicalmiguajira@hotmail.com

Cotización

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	06	2024

FACTURA DE VENTA

Nº 4990

SEÑOR(ES): Alcaldia de Maicao C.C./NIT.

DIRECCION: TEL.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Timbal 13"y14"+plat.116; JB, Cenc	2.400.000	12.000.000
5	Bateria Boss completa	2.200.000	11.000.000
10	Guira Tropical con estuche	130.000	1.300.000
10	Cajas Vallenatas con estuche	260.000	2.600.000
10	Estuche Semiduro Cjn V/tro	120.000	1.200.000
15	Encordados Naylon	75.000	1.125.000
10	Encordados Electrica	75.000	750.000
10	Encordados bajo 5cdas	130.000	1.300.000
10	Encordados bajo 4cdas	120.000	1.200.000
20	Baquetas boleria boss	30.000	600.000
20	Baqueta Timbal.	40.000	800.000
15	Teclado Yamaha PSRE373 bateria	1.600.000	24'000.000
10	Acordeon Hohner Rey Vallenato	4100.000	41.000.000
10	Cuacharaca Madera	40.000	400.000
15	Guitarra Yamaha C-40	650.000	9.750.000

Sub-Total $	109.025.000
P.A.S.A.I	109.025.000
TOTAL $	— o —

CLIENTE

C.C No

VENDEDOR

C.C No

Esta factura por su sola aceptación efectos de Título Valor en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 del 2008 Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas

Alvaro Pacheco. Rut 92.533.154-9 - Cel. 313 5621400 Sjo.

Powered by CamScanner

CASA MUSICAL

Nit. 40.915.214-2 Reg. Simplificado

VENTA, DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE TODAS LAS MARCAS

Fender Gibraltar Ibanez REMO YAMAHA SABIAN

Calle 4 No. 8-05 / RIOHACHA, LA GUAJIRA- Celular: 300 8057654

E-mail: casamusicalmiguajira@hotmail.com

Cotización

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	06	2024

[redacted]

Nº 4991

SEÑOR(ES): Alcaldia de Maicao C.C./NIT.

DIRECCION: TEL.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	Flauta Yamaha YRS 23	35.000	1.050.000
5	Planta bajo Fender	1.200.000	6.000.000
			7.050.000
Son:	Ciento Diesiseis Millones Setenta y Cinco pesos (116.075.000) M/cte.		

Cotización

CLIENTE

C.C. No

VENDEDOR

C.C. No

Esta factura por la suma de Titulo Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 del 2008. Estatuto Tributario. Código de Comercio y demás normas

Sub-Total $	7.050.000
Vienen	109025.000
TOTAL $	116.075.000

Alvaro Pacheco, Rut. 92.533.654-9 - Cel. 313 5621400 Sjo.

Powered by CamScanner

Maicao, 10 de julio 2024

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO

Cordial saludos.

Mediante este oficio le presentamos cotización de dotación de elementos tecnológicos y mobiliario.

DOTACIÓN ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNIT MAYOR	VALOR TOTAL MAYOR
Dell inspiron 15" 3520, Intel core i5-1235U, Ram 8GB; DDR4 2666 MT/s, 512 GB M.2 SSD, Pantalla 15.6", FHD 1920x1080, Win 11 pro. Garantia 1 year carry-in service SNS-LA	20	4.544.313	90.886.250
Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L5590 COLOR	2	2.150.468	4.300.936
Video Proyector Epson PowerLite W52+Tecnología: 3LCD de 3 chip/(4.000 lúmenes en blanco y color - resolución.WXGA 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3	2	6.013.963	12.027.925
UPS POWEST 500W	5	203.707	1.018.534
Sistema de cámaras de seguridad (6 cámaras 2mp, grabador 8 canales, disco duro 1tb, accesorios conectibidad, cableado, canaletización + servicios de ingeniería).	1	2.336.750	2.336.750
Sonido vertical ROCKVILLE 1600W altavoces activos de PA/DJ + MEZC	2	0	0
		0	0
		0	0
MOVILIARIO		0	0
Estantería Metal/Madera 180x120x50 cm 5 nieles galvanizado 1500 kg	4	0	0
Mesa de lectura (adultos) 0.73m alto x 1.20 de ancho x 0.90 largo	2	479.375	958.750
Tablero metálico móvil. Tubo cuadrado 2x1" cal. 18. Rodachines metálicos de 2" alto 1.80 ancho 1.50 mts	2	0	0
Set de mesa infaltil + 6 sillas hexakids agregar a favoritos	4	2.275.000	9.100.000
Atril 042. superficie acrílica 12mm. Tubería rolado pintura aluminio. Base acero Inox niveladores Inox. Soporte central acrílico 12mm altura: 120 cms	2	0	0
silla interlocutora isósceles negra	30	159.250	4.777.500
VALOR TOTAL			**105.383.735**
IVA			**20.022.910**
TOTAL			**125.406.645**

JM SOLUCIONES INTEGRALES

JULIO MORENO OSORIO
CARRERA 5 NO. 16 - 68 TELEFONO 3017731354 E-MAIL jmsolucionesmaicao@hotmail.com
NIT Nº 72.168.771-4

Señor(res)
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO
MAICAO - LA GUAJIRA

FECHA DE EXPEDICION
05/07/2024

COTIZACION

FECHA DE VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNI	TOTAL
4	Estantería Metal/Madera 180x120x50 cm 5 Niveles Galvanizado 1500Kg	$ 499.900	$ 1.999.600
2	Mesa de lectura (adultos) 0.73 m alto x 1.20 de ancho x 0.90 largo	$ 696.250	$ 1.392.500
2	Tablero metálico móvil.Tubo cuadrado 2x1" cal.18.Rodachines metálicos de 2". Alto 1,80 Ancho 1,50 mts	$ 689.250	$ 1.378.500
4	Set De Mesa Infantil + 6 Sillas Hexakids Agregar a favoritos	$ 1.550.000	$ 6.200.000
2	Atril 042. Superficie Acrílica 12mm. Tubería Rolado pintura aluminio. Base Acero Inox Niveladores Inox. Soporte central acrílico 12mm. Altura: 120 cms	$ 2.994.000	$ 5.988.000
30	Silla interlocutora isósceles negra	$ 208.900	$ 6.267.000

SUB TOTAL		$ 23.225.600
IVA	19%	$ -
TOTAL		$ 23.225.600

JULIO MORENO O
ING DE SISTEMAS

PENSAMOS EN SU SEGURIDAD

MEDIATICS

Servicios & Soluciones

NIT. 901314782-8

Maicao, La Guajira 18 de Junio 2024

Sr.
Alcaldia Municipal de Maicao

Maicao La Guajira.

Cordial Saludo.

Nos permitimos enviar propuesta comercial segun sugerido via email.

ITEM	DETALLE	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Estantería Metal/Madera Galvanizado + Tornillos 192x100x50 cm 5 Niveles Gris	4	$ 433.355	$ 1.733.420,00
2	MESA DE LECTURA (0,73 M ALTO X 120 ANCHO X 0,90 LARGO)	2	$ 646.360	$ 1.292.720
3	TABLERO METALICO MOVIL, TUBO CUADRADO 2X1" CAL 18, RODACHINES METALICOS DE 2" (ALTO 1,80, ANCHO 1,50 MTS)	2	$ 631.670	$ 1.263.340
4	SET DE MESA INFANTIL + 6 SILLAS HEXAKIDS	4	$ 1.431.936	$ 5.727.744
5	ATRIL 042, SUPERFICIE ACRILICA 12MM, TUBERIA ROLADO PINTURA ALUMINIO, BASE ACERO INOX, NIVELADORES INOX, SOPORTE CENTRAL ACRILICO 12MM, ALTURA 120CM	2	$ 2.359.144	$ 4.718.289
6	SILLAS INTERLOCUTORA ISOCELES NEGRA	30	$ 185.094	$ 5.552.820
Nota: La compra incluye flete a destino cliente. Esta cotizacion puede variar según TRM.			**SUBTOTAL**	**$ 20.288.333**
			IVA	**$ 3.854.783**
			TOTAL	**$ 24.143.116**

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO
Contado, para hacer efectiva la propuesta.

TIEMPO DE ENTREGA
• (4 a 8) días calendario una vez verificado el pago.

GARANTÍAS

- Los equipos se entregan probados y verificados sin embargo las marcas de los equipos cumplen con garantias hasta 1 año calendario por daños de fabrica en el buen funcionamiento de los equipos.

- No ce cumple la garantia por daños de picos de voltajes, mala manipulacion y/o daños oacsionados por derrame de liquidos, deterioro entre otros.

Los valores ofertados incluyen impuestos.

Bancolombia
Cuenta de ahorros
09600000746

Ing Julio Ramos Santiago.
Gerente.
Mediatisc Integrales sas zomac.
Nit. 901314782-8

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MAICAO
MATRICULA INMOBILIARIA
IMPRESION DE FOLIO

Nro Matricula: 212-58202

Impreso el 02 de Agosto de 2024 a las 09:54:07 a.m

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

No es un certificado, solo sirve como consulta

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

CIRCULO REGISTRAL: 212 MAICAO DEPTO:GUAJIRA MUNICIPIO:MAICAO VEREDA:MAICAO
FECHA APERTURA: 30-11-2016 RADICACION: 2016-1559 CON: ESCRITURA DE: 30-11-2016
CODIGO CATASTRAL: COD. CATASTRAL ANT.:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
LOTE 2 CON AREA DE AREA:1.386M2 NORTE:44.00ML SUR:44.00ML ESTE:31.50ML OESTE:31.50ML CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.1095 DE FECHA 29-11-2016 EN NOTARIA UNICA DE MAICAO (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)
COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo Predio: RURAL

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integracion y otros)
58200

ANOTACION: Nro 1 Fecha: 30-11-2016 Radicacion: 2016-1559 VALOR ACTO: $
Documento: ESCRITURA 1095 del: 29-11-2016 NOTARIA UNICA de MAICAO
ESPECIFICACION: 0918 DIVISION MATERIAL (OTRO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: MUNICIPIO DE MAICAO 8921200209 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

FIN DE ESTE DOCUMENTO

USUARIO: EXENTO6 Impreso por:EXENTO6
TURNO: 2024-5999 FECHA: 02-08-2024



La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MAICAO

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 240723657097867150 **Nro Matrícula: 212-9698**

Impreso el 23 de Julio de 2024 a las 05:00:46 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 212 - MAICAO DEPTO: GUAJIRA MUNICIPIO: MAICAO VEREDA: PARAGUAYACHON
FECHA APERTURA: 10-05-1985 RADICACIÓN: 85-715 CON: RESOLUCION DE: 24-10-1984
CODIGO CATASTRAL: **44430020100000007000600000000**COD CATASTRAL ANT: 44430020100070006000

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
EXTENSION DE: 1.500 HECTAREAS. VER LINDEROS.- RESOLUCION N. 1005 DE FECHA OCTUBRE 24 DE 1.984.-INCORA-SANTA MARTA.---HOY EXTENSION SUPERFICIARIA 1.500MTS2.
COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: RURAL
1) SIN DIRECCION . EL ASADERO MAICAO

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 10-05-1985 Radicación: SN
Doc: RESOLUCION 1005 del 24-10-1984 INCORA de SANTA MARTA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: : 170 ADJUDICACION DE BALDIOS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: INCORA
A: CAMARGO DE PUERTA EMILIA X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 18-07-2024 Radicación: 2024-823
Doc: ESCRITURA 774 del 29-12-2007 NOTARIA UNICA de MAICAO VALOR ACTO: $25,000,000
ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)
DE: CAMARGO DE PUERTA EMILIA CC# 26740200
A: MUNICIPIO DE MAICAO **NIT# 8921200209 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2011-19 Fecha: 26-06-2011
SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: C2013-32 Fecha: 19-07-2013
SE CORRIGE LA EXTENSION SUPERFICIARIA LA CORRECTA ES 1.500MTS2, SEGUN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 1579 DE 2012.
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 3 Radicación: C2014-75 Fecha: 21-07-2014
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MAICAO
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 240723657097867150 Nro Matrícula: 212-9698

Impreso el 23 de Julio de 2024 a las 05:00:46 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

...

==========

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO. REXC

TURNO: 2024-5655 FECHA: 23-07-2024
EXPEDIDO AUTOMATICAMENTE PARA CERTIFICADOS ASOCIADOS

El Registrador: LUIS GUILLERMO VEGA SERRANO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

1. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Asunto o Tema	Situación del corregimiento de Paraguachón, Maicao.						
Acta de Reunión	X		**Listado de Asistencia**				
Fecha	20/05/2024		**Hora Inicio**	09:30		**Hora Final**	10:30
Presencial			**Virtual:**	X	TEAMS		
Responsable:	Giovanna Andrea Vásquez Rivera – Coordinadora GIT de Desarrollo Fronterizo						

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para iniciar la reunión, cada uno de los participantes se presenta. Por parte de la Alcaldía de Maicao están MIGUEL FELIPE ARAGÓN GONZALEZ, Alcalde; EDWIN YECITH SOLANO GARCÍA, Secretario de Desarrollo Económico Municipal; y YENNIFER IGUARÁN LÓPEZ, Dirección de Desarrollo Fronterizo.

Por parte de Cancillería, está la doctora MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MORENO, Directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza; GIOVANNA ANDREA VÁSQUEZ RIVERA, Coordinadora del GIT de Desarrollo Fronterizo; y YENNY ZULEIMA CARREÑO CONTRERAS, Asesora de la Dirección.

Toma la palabra el señor Alcalde para manifestar que la reunión fue solicitada por la Dirección de Fronteras del municipio, debido a la situación que se presenta en Paraguachón y a las múltiples necesidades que tienen el corregimiento. En este sentido, indica que se requiere apoyo del Gobierno Nacional para brindar soluciones a la población y que el municipio está en disposición de aportar para que, de manera conjunta, se puedan explorar alternativas.

La Directora de Fronteras inicia una presentación con las necesidades más latentes, entre las que se destacan: el Centro de Cultura Binacional, la Biblioteca Juana Lara de Luque, la Casa Lúdica, Polideportivo Renacer y la Planta Potabilizadora de Agua.

Respecto a la planta se aclara por parte de Cancillería que ya se había hecho una visita, pero no es posible intervenirla por cuanto es administrada por un particular.

Después se habla sobre el paso fronterizo La Raya y se acuerda realizar una visita.

3. COMPROMISOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE
