

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 019 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	3 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 021 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	3 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 023 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	3 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 025 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	3 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 029 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 1 al 2 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	3 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 031 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta las observaciones con respecto a la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, se considera pertinente ampliar dicho plazo, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
1	Inscripción	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
2	Presentación y Respuesta de Observaciones	Desde las 10:00 a.m. del día 03 de febrero de 2022 hasta las 5:00 p.m. del día 07 de febrero de 2022
3	Invitación a Contratar	08 de febrero de 2022
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 de marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 de marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	2 de marzo de 2022

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 016 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 016 de 2022 cuyo objeto corresponde a **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION VIAS URBANIZACIONES LA ESPERANZA, BOSQUES DE LA ACUARELA, VILLA DEL SOL, LA ERMITA, MIRADOR DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA"**, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 15 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	15 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 16 al 24 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	25 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 28 de febrero al 01 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 28 de febrero al 01 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	02 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 18 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 015 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 015 de 2022 cuyo objeto corresponde a **“CONSTRUCCION VIAS URBANIZACIONES LA ESPERANZA, BOSQUES DE LA ACUARELA, VILLA DEL SOL, LA ERMITA, MIRADOR DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA”**, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 15 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	15 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 16 al 24 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	25 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 28 de febrero al 01 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 28 de febrero al 01 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	02 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 18 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 020 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 014 de 2022 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CALDAS VIEJO VENADILLO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	03 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 008 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 008 de 2022 cuyo objeto corresponde a **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 23 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	23 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 24 al 28 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	01 de marzo de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	04 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 16 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 014 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 014 de 2022 cuyo objeto corresponde a **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO DE ALPUJARRA CONDUCE A LA VEREDA ARADITA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA”**, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	03 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 022 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 014 de 2022 cuyo objeto corresponde a "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CALDAS VIEJO VENADILLO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	03 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 024 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 014 de 2022 cuyo objeto corresponde a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CRA 2 ENTRE CLL 4 Y 6, CLL 5 ENTRE CRA 2 Y 4, CRA 4 ENTRE CLL 5 Y 4, CRA 5 ENTRE CLL 3 Y 4, CLL 3 ENTRE CRA 3 Y 5, CLL 2 ENTRE CRA 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA”

, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	03 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 003
INVITACION PRIVADA N° 026 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 014 de 2022 cuyo objeto corresponde a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA LA MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA”

, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 22 de febrero de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	22 de febrero de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 23 al 25 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	28 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 01 al 02 marzo de 2022
10	Adjudicación ò declaratoria de desierta	03 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 004
INVITACION PRIVADA N° 017 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 017 de 2022 cuyo objeto corresponde a " **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VARIOS TRAMOS UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DEL VINCULO MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA**", así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 02 de Marzo de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	02 de marzo de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 03 al 04 de marzo de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	07 de marzo de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 08 al 09 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 08 al 09 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	10 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDO NO. 004
INVITACION PRIVADA N° 018 de 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta procede a emitir la presente adenda modificatoria teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso de Invitación Privada N° 018 de 2022 cuyo objeto corresponde a **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VARIOS TRAMOS UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DEL VINCULO MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”**, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma de la citada invitación, así:

CRONOGRAMA

Actividad		Fecha y Hora
4	Presentación de Propuestas	Del 08 de febrero de 2022 hasta el 01 de Marzo de 2022 hasta las 10:00 a.m.
5	Cierre	01 de marzo de 2022 a las 10:15 a.m.
6	Evaluación de Propuestas	Del 02 al 04 de marzo de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	07 de marzo de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 08 al 09 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 08 al 09 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	10 de marzo de 2022

SEGUNDO: Las demás disposiciones de la invitación no son modificadas y continúan vigentes.

para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
Jaime Andrés Bejarano López, Profesional Técnico y Operativo

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 047 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que actualmente tiene la entidad, considera pertinente ampliar el plazo para evaluar las propuestas recibidas y así mismo el plazo para dar traslado del informe de evaluación preliminar a los proponentes, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
6	Evaluación de Propuestas	Del 22 al 28 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	01 de marzo de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	4 de marzo de 2022

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDA N° 001

INVITACION PRIVADA N° 048 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que actualmente tiene la entidad, considera pertinente ampliar el plazo para evaluar las propuestas recibidas y así mismo el plazo para dar traslado del informe de evaluación preliminar a los proponentes, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
6	Evaluación de Propuestas	Del 22 al 28 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	01 de marzo de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 02 al 03 marzo de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	4 de marzo de 2022

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Revisó: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDO N° 003 INVITACION PRIVADA N° 028 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que actualmente tiene la entidad, considera pertinente ampliar el plazo para evaluar las propuestas recibidas y así mismo el plazo para dar traslado del Informe de evaluación preliminar a los proponentes, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
6	Evaluación de Propuestas	Del 18 al 24 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	25 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierto	2 de marzo de 2022

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDO N° 003 INVITACION PRIVADA N° 030 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que actualmente tiene la entidad, considera pertinente ampliar el plazo para evaluar las propuestas recibidas y así mismo el plazo para dar traslado del informe de evaluación preliminar a los proponentes, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
6	Evaluación de Propuestas	Del 18 al 24 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	25 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	2 de marzo de 2022

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista

ADENDO N° 003


INVITACION PRIVADA N° 032 DE 2022

La Empresa Para el Desarrollo Territorial – Proyecta teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo que actualmente tiene la entidad, considera pertinente ampliar el plazo para evaluar las propuestas recibidas y así mismo el plazo para dar traslado del informe de evaluación preliminar a los proponentes, por lo tanto, el cronograma del proceso, quedará así:

Actividad		Fecha y Hora
6	Evaluación de Propuestas	Del 18 al 24 de febrero de 2022
7	Traslado del Informe de Evaluación	25 de febrero de 2022
8	Presentación de observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
9	Respuesta a observaciones	Del 25 al 28 febrero de 2022
10	Adjudicación o declaratoria de desierta	2 de marzo de 2022

Para constancia, se firma en Armenia, Quindío a los 22 días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

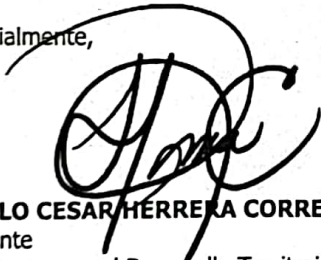

PABLO CESAR HERRERA CORREA
Gerente
Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboro: Diana Carolina Rincón Bermúdez, Profesional Jurídica y Contratación Contratista
