RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROPONENTE INNOVACIÓN DEL PROCESO No. 23001105 H4 DE 2023, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA DESCONTAMINACIÓN DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO, LETICIA."*.


RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL INTERESADO

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR GERARDO SEGURA PEREZ, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL AEROCIVIL – 2023

"La empresa INNOVACION COLOMBIA SAS, presenta para acreditar la experiencia el contrato No. 19000714-H4-2019, firmado por la UNION TEMPORAL BOGOTA 2018, donde la entidad contratante es la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, se adjunta acta de liquidación (5 Hojas), acta de recibo parcial No. 1 (4 Hojas) y Acta de Recibo Final (4 Hojas).

Con gran preocupación nos permitimos advertir las siguientes falencias presentadas en los documentos anteriormente mencionados.

1. *En el acta de liquidación no solo se puede evidenciar diferentes tipo de letras, sino que además se evidencia que la fecha de inicio fue el 18 de Junio de 2019, pero una vez se verifica el contrato en la plataforma del Secop II, dicha fecha de inicio fue el 10 de Junio de 2019."*

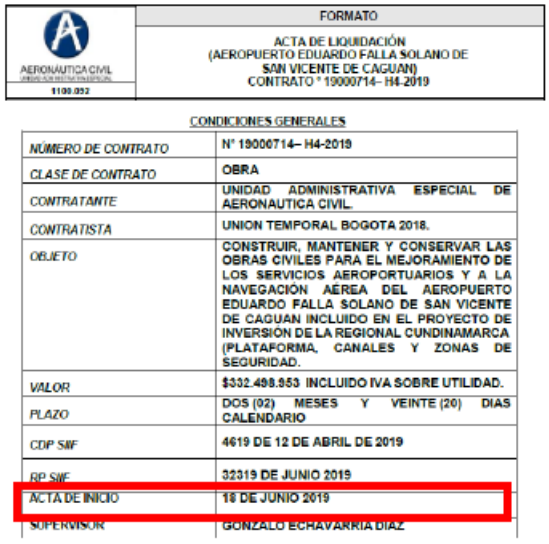

AERONAUTICA CIVIL 1100.052	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN (AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN) CONTRATO ° 19000714– H4-2019

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	N° 19000714– H4-2019
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018.
OBJETO	CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD.
VALOR	$332.498.953 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
CDP SIIF	4619 DE 12 DE ABRIL DE 2019
RP SIIF	32319 DE JUNIO 2019
ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO 2019
SUPERVISOR	GONZALO ECHAVARRIA DIAZ


Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución del Contrato | Modificaciones del Contrato | Incumplimientos

Contrato - Información general

Volver al princi

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.686731
Número del Contrato	18000714 HH
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	"CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD)"
Fecha de inicio del contrato:	10/09/2019 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	10/09/2019 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí / No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	Sí / No
Fecha de inicio de liquidación	10/09/2019 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de liquidación	10/01/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones ambientales	Sí / No
Obligaciones pos consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS, adicionalmente, se aclara que así se adjudique un contrato con una fecha en el secop, este no dará inicio hasta que se aprueben las pólizas y se firme el acta de inicio. A continuación, se presenta justificación de los archivos presentes en la entidad:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1100.092	ACTA DE INICIO

NÚMERO DE CONTRATO	**19000714– H4 DE 2019**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018
OBJETO	CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD
VALOR	$332.498.953 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
CDP SIIF	4619 DE 12 DE ABRIL DE 2019
RP SIIF	32319 DE JUNIO 18 DE 2019
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	18 DE JUNIO 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE APOYO	ARGEL CUTIVA FLOREZ

En la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes Junio de 2019, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **RUBEN FORERO MUÑOZ** Representante Legal de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 como contratista, y **ARGEL CUTIVA FLOREZ** designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato como supervisor y **MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO** ordenador del gasto.

UN ON TEMPORAL BOGOTA 2018
R/L RUBEN FORERO MUÑOZ
CONTRATISTA

ARGEL CUTIVA FLOREZ
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR (E) AEROPUERTO SAN VICENTE

VO.BO
MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO
DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMA(E)

Clave: GCON-1.0-12-03
Versión: 02

Fecha: 11/10/2015
Página: 1 de 1

2. *"El acta de liquidación menciona las garantías del proceso, se menciona que las aseguradora el LIBERTY SEGUROS S.A, y con vigencia desde el 18-06-2019, pero para sorpresa las polizas cargadas en la plataforma SECOP II, son de la compañía de Seguros Confianza, y con fecha de inicio de las garantías el 10-06-2019."*

GARANTIAS

COMPAÑÍA	RIESGOS	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
LIBERTY SEGUROS S.A.	Cumplimiento	GU050393	18-06-2019	18-01-2020	99.749.685,90
	Salarios y Prestaciones Sociales.	GU050393	18-06-2019	18-09-2022	47.932.862,25
	Estabilidad y Calidad de la Obra	GU050393	07-09-2019	07-09-2024	99.749.685,90
	Responsabilidad Civil Extracontractual	RE004363	18-06-2019	17-07-2019	156.248.400

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula garantías del contrato.

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Decreto 1082 de 2015

Página 1

PÓLIZA 17 GU050393
CERTIFICADO 17 GU091800
CÓDIGO REFERENCIA PAGO: 1760091800

SUCURSAL: 17. IBAGUE **USUARIO:** VALENCIO **TIP CERTIFICADO:** Nuevo **FECHA** DD 10 MM 06 AAAA 2019

TOMADOR/GARANTIZADO:	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018	**C.C. O NIT:**	901235271 7
DIRECCIÓN:	CR 102 B 156 C 34	**CIUDAD:**	BOGOTA
E-MAIL:	mtgingenieria1@gmail.com	**TELÉFONO:**	3164418845
ASEGURADO:	AERONAUTICA CIVIL	**C.C. O NIT:**	899999059 3
DIRECCIÓN:	AER INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	**CIUDAD:** RIONEGRO	**TEL.** 2874013
BENEFICIARIO:	AERONAUTICA CIVIL	**C.C. O NIT:**	899999059 3
DIRECCIÓN:	AER INTERNACIONAL JOSE MARIA CORDOVA	**CIUDAD:** RIONEGRO	**TEL.** 2874013

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 10 MM 06 AAAA 2019	HASTA DD 10 MM 09 AAAA 2024	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA 247,432,234.05

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM 3,274.72	MONEDA	VALORES
100.00	VALENCIA MERCHAN OLGA MAR					PRIMA	PESOS	1,423,680.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	7,000.00
						IVA	PESOS	271,829.00
						TOTAL		1,702,509.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	10-06-2019	10-01-2020	0.00	99,749,685.90	116,647.00	0.00	0.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIO	10-06-2019	10-09-2022	0.00	47,932,862.25	311,171.00	0.00	0.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-09-2019	10-09-2024	0.00	99,749,685.90	995,862.00	0.00	0.00

UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 NIT: 901.235.271-7
CONFORMADO POR:
INNOVACION COLOMBIA S.A.S NIT 900.693.735-2 50%
ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ C.C. 52.215.746 50%
REPRESENTANTE LEGAL:
RUBEN FORERO MUÑOZ C.C. 6.801.266

Activar Wir
Ve a Configura

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS.

3. *"En dicha acta también se puede evidenciar que tiene números con tachaduras o enmendaduras."*

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
1100.092

FORMATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN
(AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN)
CONTRATO ° 19000714– H4-2019

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 332.498.953		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$_____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$_____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 332.498.953	
VALOR NO EJECUTADO		$_____	
VALOR PAGADO VALOR			$ 164.995.511,12
DESCUENTOS			$_____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 164.995.511,12
TOTALES	$ 332.498.953	$ 332.498.953	$ [illegible]
			$ 89.251.617

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS. Adicionalmente, aunque en esta sección no se puedan leer algunos números con claridad no presenta ninguna modificación al presupuesto ni al valor. A continuación, se presenta justificación de los archivos presentes en la entidad:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$332.498.953**		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	N/A		
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$332.498.953**	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE PAGO			**$332.498.953**
TOTALES	**$332.498.953**	**$332.498.953**	**$332.498.953**

4. *"También se evidencia que no tienen fecha de elaboración, es decir cómo se puede saber ¿cuándo se liquidó el contrato?"*

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS. Adicionalmente, en el documento acta de liquidación se escribe claramente la fecha de elaboración. *"A los (01) UN días del mes de octubre del 2019…"*

5. *"En cuanto a las firmas, se puede evidenciar que la firma del Supervisor, GONZALO ECHAVARRIA DIAZ, fue cortada y pegada en las tres (3) actas adjuntas (liquidación, recibo Parcial y Recibo Final).".*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

RUBEN FORERO MUÑOZ
Contratista
Representante Legal
UNION TEMPORAL BOGOTA 2018

GONZALO ECHAVARRIA DIAZ
Supervisor del Contrato

Vo.Bo
DRA. MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO
DIRECTORA REGIONAL CUNDINAMARCA(E).

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur y mantener una reunión con el supervisor del contrato se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS.

6. *"En las actas aportadas por el oferente, el contrato tenia plazo de Dos (02) Meses y Veinte (20) Días, pero en la plataforma del Secop II, es de Tres meses del 10/06/2019 al 10/09/2019 "*

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018.
OBJETO	CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD.
VALOR	$332.498.953 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO	DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS. Adicionalmente, se aclara que así se adjudique un contrato con una fecha en el secop, este no dará inicio hasta que se aprueben las pólizas y se firme el acta de inicio, por lo tanto, aunque el contrato especifique 3 meses lo que la certificación aporta es el tiempo de ejecución real desde el acta de inicio. A continuación, se presenta justificación de los archivos presentes en la entidad:

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	Nº 19000714– H4-2019
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL BOGOTA 2018.
OBJETO	CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD.
VALOR	$332.498.953 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO	DOS(02) MESES Y VEINTE(20) DIAS CALENDARIO
CDP SIIF	4619 DE 12 DE ABRIL DE 2019
RP SIIF	32319 DE JUNIO 2019
ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO 2019
SUPERVISOR	GONZALO ECHAVARRIA DIAZ

7. *"En el acta de recibo parcial No. 1, se puede evidenciar que se hizo un primer pago del 50% el 14 de Agosto de 2019, por la suma de 166.249.477 del contrato asi:"*

El supervisor recibe a satisfacción los trabajos realizados por el contratista, hasta la fecha con base en el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas:

FORMATO 7

CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
6,1	Placa en concreto 12 cms de espesor de 3000 psi incluye pasadores en varilla lisa de 5/8" , alambre negro, distanciador, formaleta, vibrador, juntas y mano de obra	M3	177,549	$ 687.503,00	$ 122.065.322,33
7,1	Suministro e instalacion malla electrosoldada de 8 mm.	M2	1487,37	$ 6.410,00	$ 9.534.041,70
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 131.599.364
	ADMINISTRACION	13%			$ 17.107.917,32
	IMPREVISTO	5%			$ 6.579.968,20
	UTILIDAD	7%			$ 9.211.955,48
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.750.271,54
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO				$ 166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. 901235271-7 y por lo tanto se autoriza el pago de la Factura Nº 3 del 14 AGOSTO De 2019 por la suma de $ 166.249.477

"Y en acta de recido final, casualmente se ejecutaron y se recibieron las mismas cantidades que la primera parcial, sin mencionar las demás actividades contratadas."

El supervisor recibe a satisfacción los trabajos realizados por el contratista, hasta la fecha con base en el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas:

FORMATO 7

CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
6,1	Placa en concreto 12 cms de espesor de 3000 psi incluye pasadores en varilla lisa de 5/8" , alambre negro, distanciador, formaleta, vibrador, juntas y mano de obra.	M3	177,549	$ 687.503,00	$ 122.065.322,33
7,1	Suministro e instalacion malla electrosoldada de 8 mm.	M2	1487,37	$ 6.410,00	$ 9.534.041,70
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 131.599.364
	ADMINISTRACION	13%			$ 17.107.917,32
	IMPREVISTO	5%			$ 6.579.968,20
	UTILIDAD	7%			$ 9.211.955,48
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.750.271,54
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO				$ 166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. **901235271-7** y por lo tanto se autoriza el pagode la Factura N.º 4 del 7 septiembre De 2019 por la suma de $ 166.249.477.

¿Dónde quedaron las demás actividades contratadas?, ¿fue posible que el contrato solo ejecutara dos ítems de los siete inicialmente contratados?, ¿es posible que ejecute la placa en concreto sin antes realizar localización, la excavación, el relleno?

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS. Para dar mas claridad a continuación, se muestra evidencia del Acta de Recibo Parcial N.1 y Acta de Recibo Final, donde se discriminan las actividades ejecutadas:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1100.092	ACTA DE RECIBO PARCIAL N. 1 (AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN) CONTRATO N° 19000714– H4-2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El supervisor recibe a satisfacción los trabajos realizados por el contratista, hasta la fecha con base en el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas:

FORMATO 7

CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AERCPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.1	Localización, trazado y replanteo del proyecto. S e utilizará equipo de presición,personal experto. S e hará con la frecuencia que lo indique la interventoria y/o supervisoria. Incluye demarcación con pintura, linea de trazado, cortes de terreno, libretas y planos.	M2	2189,4	$ 1.233,00	$ 2.699.468,55
2.1	Demolicion asfalto existente a maquina espesor variable Incluye Cargue y retiro de material sobrante	M2	2189,4	$ 4.733,00	$ 10.362.193,55
3.1	Excavación en material común 18cm, conglomerado y nivelacion del terreno. Incluye cargue y retiro de escombros.	M3	394,08	$ 19.229,00	$ 7.577.764,32
4.1	relleno con Subase granular (NORMA INVIAS 320) espesor de	M3	394,08	$ 85.433,00	$ 33.667.436,64
5.1	suministro e instalacion de Geotextil no tejido 1800 o similar (1 capa).	M2	2189,4	$ 6.503,00	$ 14.237.343,05
6.1	Placa en concreto 12 cms de espesor de 3000 psi incluye pasadores en varilla lisa de 5/8" , alambre negro, distanciador, formaleta, vibrador, juntas y mano de obra.	M3	85,171	$ 687.503,00	$ 58.555.474,59
7.1	Sumministro e instalacion malla electrosoldada de 8 mm.	M2	701,98	$ 6.410,00	$ 4.499.683,66
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 131.599.364
	ADMINISTRACION	13%			$ 17.107.917,37
	IMPREVISTO	5%			$ 6.579.968,22
	UTILIDAD	7%			$ 9.211.955,51
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.750.271,55
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO				$ 166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. **901235271-7** y por lo tanto se autoriza el pago de la Factura Nº 3 del 14 AGOSTO De 2018 por la suma de $ 166.249.477

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1100.092	ACTA DE RECIBO FINAL (AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN) CONTRATO N° 19000714– H4-2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El supervisor recibe a satisfacción los trabajos realizados por el contratista, hasta la fecha con base en el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas:

FORMATO 7

CONSTRUIR, MANTENER Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA (PLATAFORMA, CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
6,1	Placa en concreto 12 cms de espesor de 3000 psi incluye pasadores en varilla lisa de 5/8", alambre negro, distanciador, formaleta, vibrador, juntas y mano de obra.	M3	177,549	$ 687.503,00	$ 122.065.322,33
7,1	Suministro e instalacion malla electrosoldada de 8 mm.	M2	1487,37	$ 6.410,00	$ 9.534.041,70
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 131.599.364
	ADMINISTRACION	13%			$ 17.107.917,32
	IMPREVISTO	5%			$ 6.579.968,20
	UTILIDAD	7%			$ 9.211.955,48
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.750.271,54
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO				$ 166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. **901235271-7** y por lo tanto se autoriza el pago de la Factura N.º 4 del 7 septiembre De 2019 por la suma de $ 166.249.477

8. "Si verificamos el acta de liquidación en el balance financiero podemos verificar que el valor del acta de recibo no corresponde al mencionado en las actas de recibo, ya que el mencionado en el acta de liquidación es por valor de $ 164.995.511,12 y el mencionado en las actas de Recibo y en el Secop II es por valor de $ 166.249.477."

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 332.498.953		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$_____		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$_____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 332.498.953	
VALOR NO EJECUTADO		$ _____	
VALOR PAGADO VALOR			$ 164.995.511,12
DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 164.995.511,12
TOTALES	$ 332.498.953	$ 332.498.953	$ [illegible]
			$ 89.251.617

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? SI

¿Pago de anticipos? No

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos:	1	50	166.249.476,50	-
	2	50	166.249.476,50	-

Total: 100,000000%

	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			$	166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. **901235271-7** y por lo tanto se autoriza el pagode la Factura N.º 4 del 7 septiembre De 2019 por la suma de $ 166.249.477.

	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			$	166.249.477

El supervisor certifica que se recibió a satisfacción el objeto de la contratación por parte de UNION TEMPORAL BOGOTA 2018 con NIT. 901235271-7 y por lo tanto se autoriza el pago de la Factura Nº 3 del 14 AGOSTO De 2019 por la suma de $ 166.249.477

"*Ante lo anteriormente expuesto nos permitimos solicitar a la entidad la revisión de nuestras observaciones, y así mismo proceda con el rechazo de la oferta presentada por INNOVACION COLOMBIA SAS, ya que se encuentra dentro de la causal de rechazo H. "Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia."."*

RESPUESTA

La Aeronáutica Civil se permite informar que su observación no procede teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos almacenados en el archivo de la Regional Centro Sur se puede evidenciar que están acordes a lo presentado por el proponente INNOVACION COLOMBIA SAS. Para dar mas claridad se presenta la pagina 3 de 6 del ACTA DE LIQUIDACIÖN:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1100.092	ACTA DE LIQUIDACION (AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO DE SAN VICENTE DE CAGUAN) CONTRATO ° 19000714– H4-2019

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$332.498.953 IVA INCLUIDO SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$332.498.953 IVA INCLUIDO SOBRE UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

El 50% del valor del contrato una vez se ejecute el 50% de la obra y el 50% restante una vez se lleve a cabo terminación y recibo de obra previa constancia de recibo a satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, conforme el Anexo Técnico No.2.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A.

ACTAS DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No.	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS
1	$ 166.249.477		$	$ -
2	$ 166.249.477			

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO:

$ **$ 166.249.477** IVA INCLUIDO SOBRE UTILIDAD.

Cordialmente;

HERNAN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

Proyectó: Hernán David González Rodríguez
Revisó:
