Alcaldía de Montería	FORMATO DE RADICACIÓN DE CUENTAS		CÓDIGO:
	RESPONSABLE:	DEPENDENCIA:	VERSIÓN: 1
			FECHA EMISIÓN: 27-11-2023

Fecha:		HORA:	
Nombre completo:	HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA		
Teléfono:	3012419552		
Correo electrónico: (Obligatorio)	HNARVAEZBALLESTA@GMAIL.COM		

NOTA: Favor acercarse a la oficina de tesorería general del municipio de Montería a los 2 días hábiles siguientes a la presentación de su cuenta, para verificar la documentación y poder continuar con el trámite legal para el pago de la cuenta.

FIRMA LEGIBLE CONTRATISTA

Fecha:		HORA:	
Nombre completo:			

FIRMA QUIEN RECIBE EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 23000193

RP No.	23000193
viernes 27 enero 2023	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 10940926 - HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA **NIT:** 10940926

No. del Certificado de disponibilidad 23000250 **Contrato No:** CD-SIM-099-2023

Tiempo de Ejecucion: ONCE (11) MESES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor R.P.
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 79.019.963,00
		Total Reserva..	$ 79.019.963,00

Total reserva en letras: SETENTA y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA y TRES Pesos

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA

Dairo Hoyos Bedoya
Jefe de Presupuesto

Solicito: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA
NIT 10.940.926-4
CARRERA 13 64-51
Tel: (034) 7816662
Montería - Colombia
hnarvaezballesta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 139

Señores	MUNICIPIO DE MONTERÍA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(034) 7924545
Dirección	CL 27 CR 3 ESQ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2023, 07:48
Expedición	27/11/2023, 07:48
Vencimiento	27/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ACTA DE EJECUCION PARCIAL N°10 DEL CD-SIM-099-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA	1.00	7,183,633.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-27 por $ 7,183,633.00

Total Bruto	6,036,666.39
IVA 19%	1,146,966.61
Total a Pagar	7,183,633.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N°09117238781

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050207088 aprobado en 20230608 prefijo FE desde el número 116 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 9b564b783759dfa8e491bff5931b6a4fafbdd62315a23ab7217013f17823e3732f5343282e8cab1efcd01d9596967bbc

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de noviembre de 2023

Señor(a)
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA identificado(a) con CC 10940926, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09117238781	2013/12/17	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Montería,27 de Noviembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Montería

Respetados señores:

Yo, **HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA.**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **10.940.926** de San Bernardo del Viento Córdoba , perteneciente al **Régimen Común**, certifico a ustedes bajo la gravedad de juramento, que a la fecha que se expide el presente certificado figuro como contratista en los siguientes contratos de prestación de servicios:

Nombre o Razón Social del Contratista	Nit del Contratante	Fecha iniciación del contrato	Fecha de Finalización del contrato	Contrato No.	Valor Total del Contrato	Valor del Pago Mensual.
Municipio de Montería	800.096.734-1	27 de Enero de 2023	27 de Diciembre de 2023	CD-SIM-099-2023	$79.019.963.00	$7.183.633.00

Además, certifico bajo la gravedad de juramento, que he realizado aportes mensuales al sistema de seguridad social y pensiones sobre la base de $2.873.453.2 mensuales del contrato No. **CD-SIM-099-2023**. Por lo tanto, he cumplido y me encuentro al día con mis obligaciones del sistema de salud, riesgos laborales y pensiones, detallado de la siguiente forma:

No. de planilla	Periodo cotizado	Valor total cancelado	Salud	Pensión	Riesgo
7903642471	OCTUBRE	$ 889.000	$ 359.200	459.800	$ 70.000

Cordialmente,

HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA.
C.C. No. 10.940.926 De San Bernardo Del Viento Córdoba
Contratista Alcaldía de Montería
Secretaria de Infraestructura.

Reviso: Khalil Petro Sakr-Contratista SIM

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10940926
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 32 NO. 15 52 CENTRO	TELÉFONO:	7816662
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7903642471	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264012783		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 459.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.800	$ 0	$ 459.800
SUBTOTALES:										**$ 459.800**	**$ 0**	**$ 459.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 359.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200	$ 0	$ 0	$ 359.200
SUBTOTALES:													**$ 359.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 359.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 70.000
SUBTOTALES:									**$ 70.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10940926	NARVAEZ BALLESTA HERNAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.873.454				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.873.454	$ 459.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.873.454	$ 359.200	$ 0	$ 359.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.873.454	$ 10940926	$ 70.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 889.000**

Planilla Pagada

Gmail **Hernan Dario Narvaez Ballesta <hnarvaezballesta@gmail.com>**

Confirmación Transacción PSE - CUS 264012783

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 7 de noviembre de 2023, 7:59 p.m.
Para: HNARVAEZBALLESTA@gmail.com



¡Hola, HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 264012783
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 889.000
Fecha de Transacción: 07/11/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.



ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	23000267
CDP No.	23000250
jueves 19 enero 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 79.019.963,00	$ 1.962.449.212,80
		Totales...	$ 79.019.963,00	$ 1.962.449.212,80

Total CDP en letras: **SETENTA y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA y TRES** Pesos

El certificado No. 23000250 se emite en Monteria el dia jueves 19 de enero de 2023 como requisito previo a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA

ALCALDIA DE MONTERIA OFICINA DE PRESUPUESTO

Dairo Hoyos Bedoya

Jefe de Presupuesto

Solicito : MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14863736409

(415)7707212489984(8020) 000001486373640 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 4 0 9 2 6	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 4 0 9 2 6	1 9 8 9 1 2 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	San Bernardo del Viento 6 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NARVAEZ	BALLESTA	HERNAN	DARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CR 13 64 51 AP 602 BRR LA CASTELLANA

42. Correo electrónico: hnarvaezballesta@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 1 6 6 6 2	3 0 1 2 4 1 9 5 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 9 1 1 1 5	4 1 1 2	1 9 9 9 1 1 1 5	4 2 1 0		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 29 / 14 : 09: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NARVAEZ BALLESTA HERNAN DARIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Alcaldía de Montería	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN: Página 1 de 1

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CD-SIM-099-2023

CERTIFICA:

Que **HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.940.926 de San Bernardo del Viento-Córdoba, cumplió a cabalidad con las siguientes obligaciones.

1.Asesorar y apoyar técnicamente a la Oficina Asesora Jurídica en la proyección de actos administrativos tales como **PLIEGOS DE CONDICIONES, RESOLUCIONES DE APERTURA, CONVOCATORIAS** que se deban realizar dentro de los procesos de obra, interventoría, consultorías y otro que adelanta la Secretaría de Infraestructura y todos aquellos que le sean asignados por el supervisor.

2. Asesorar y apoyar técnicamente a la Oficina Asesoría Jurídica en la elaboración de **ESTUDIOS PREVIOS** y demás documentos que hacen parte de la etapa pre- contractual de la Secretaria de Infraestructura en todo aquellos que sean solicitados por el Supervisor.

3.Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en, el **SEGUIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS** de los respectivos procesos.

6. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Las obligaciones descritas, se encuentran contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No CD-SIM-099-2023 , cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA,** ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de Octubre al de 26 Noviembre de 2023.

Para Constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los 27 días del mes de Noviembre de 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO .
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

Reviso. Marcela Ramirez -Secretaria Ejecutiva SIM
VoBo: Khalil Petro Sakr-Contratista SIM

ACTA PARCIAL DE EJECUCION N°10

27 de Noviembre 2023

CONTRATO:	CD-SIM-099-2023.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA.**
VALOR DEL CONTRATO:	**SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($79.019.963.00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	27 DE ENERO DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:	27 DE OCTUBRE DE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN TOTAL	27 DE ENERO DE 2023 HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	23000250
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23000193
FORMA DE PAGO:	Mediante ONCE (11) pagos mensuales, cada uno por valor de **SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.183.633.00 M/CTE)** pagos que se harán efectivos mes vencido, previo cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos del pago de cada una de las cuentas de cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige el manual de contratación, la Secretaria de Hacienda Municipal y demás dependencias responsables del asunto. Para tal efecto deberá presentar los siguientes documentos:1) Certificado de cumplimento , acta parcial de ejecución, previo informe de las actividades por el contratista 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL); 3) Recibo de Pago, debidamente pagado de los impuestos ó estampillas a que tenga lugar el presente contrato, si hay lugar a ello. **PARAGRAFO SEGUNDO**: Para efecto del último pago el contratista debe hacer entrega de los archivos y documentos a su cargo debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación.
VALOR A PAGAR:	**SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.183.633.00 M/CTE).**

En Montería, el veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año 2023, se reunieron en la Secretaría de infraestructura, **IRIS SPATH CAMAÑO,** en calidad de supervisor del contrato y **HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA**, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre 27 de Octubre hasta el 26 de Noviembre de 2023, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día 27 de Noviembre de 2023, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 27 días del mes de Noviembre del año 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO.
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA.
CC:10.940.926
Contratista SIM

VoBo. Marcela Ramirez -Secretaria Ejecutiva SIM
VoBo: Khalil Petro Sakr-Contratista SIM

INFORME DE EJECUCIÓN #10
CONTRATO CD-SIM-099-2023
HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
27 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO:	**CD-SIM-099-2023**
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	**HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PROPIAS DE SU COMPETENCIA.
VALOR DEL CONTRATO:	**SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($79.019.963.00)**
FORMA DE PAGO:	Mediante ONCE (11) pagos mensuales, cada uno por valor de **SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.183.633.00 M/CTE)** pagos que se harán efectivos mes vencido, previo cumplimiento del objeto contractual. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos del pago de cada una de las cuentas de cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige el manual de contratación, la Secretaria de Hacienda Municipal y demás dependencias responsables del asunto. Para tal efecto deberá presentar los siguientes documentos: 1) Certificado de cumplimento , acta parcial de ejecución, previo informe de las actividades por el contratista 2) Sus respectivos soportes de pago mensual al día, de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, conforme al 40% del IBC del valor del contrato de acuerdo con la norma vigente, Pensión y ARl.); 3) Recibo de Pago, debidamente pagado de los impuestos ó estampillas a que tenga lugar el presente contrato, si hay lugar a ello. **PARAGRAFO SEGUNDO**: Para efecto del último pago el contratista debe hacer entrega de los archivos y documentos a su cargo debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	27 de Enero 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN:	(27 de Octubre de 2023 al 26 de Noviembre de 2023)
VALOR A PAGAR:	**SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.183.633.00 M/CTE).**

#	FUNCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	REGISTRO FOTOGRÁFICO/ OTROS
1	Asesorar y apoyar técnicamente a la Oficina Asesora Jurídica en la proyección de actos administrativos tales como PLIEGOS DE CONDICIONES,	El día 31de Octubre de 2023 Se proyecta PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES proceso de contratación LP - SIM-025-2023 Cuyo objeto es	Ver ANEXO 1

	RESOLUCIONES DE APERTURA, CONVOCATORIAS que se deban realizar dentro de los procesos de obra, interventoría, consultorías y otro que adelanta la Secretaría de Infraestructura y todos aquellos que le sean asignados por el supervisor.	"**REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES EN MICROCUENCAS DE LA CIÉNAGA DE BETANCÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA**",adelantado por la Secretaria de Infraestructura.	
2.	Asesorar y apoyar técnicamente a la Oficina Asesoría Jurídica en la elaboración de ESTUDIOS PREVIOS y demás documentos que hacen parte de la etapa pre- contractual de la Secretaria de Infraestructura en todo aquellos que sean solicitados por el Supervisor.	El día 31 de Octubre de 2023 Se proyecta ESTUDIO PREVIOS proceso de contratación LP-SPM-025-2023 objeto es **REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES EN LAS MICROCUENCAS DE LA CIÉNAGA DE BETANCÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA** adelantado por la Secretaria de Planeación Municipal	Ver ANEXO 2
		El día 2 de Noviembre de 2023 Se proyecta ESTUDIO PREVIOS proceso de contratación CMC-SIM-065-2023 Cuyo objeto es **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN LA URBANIZACIÓN VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA** adelantado por la Secretaria de Infraestructura.	Ver ANEXO 3
		El día 8 de Noviembre de 2023 Se proyecta ESTUDIO PREVIOS proceso de contratación **SA-SIM-70-2023** objeto es **ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL**	Ver ANEXO 4

		JARAGUAY DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA adelantado por la Secretaria de Infraestructura.	
		El día 15 de Noviembre de 2023 Se proyecta ESTUDIO PREVIOS proceso de contratación CMC-SIM-073-2023Cuyo objeto es **ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y DRENAJE SOBRE CANAL COLECTOR DE LA CALLE 29, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA** adelantado por la Secretaria de Infraestructura.	Ver ANEXO 5
3	Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en, el SEGUIMIENTO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS de los respectivos procesos.	Se anexa cuadro de seguimiento de los proceso de contratación adelantado por la Secretaria de Infraestructura.	Ver ANEXO 6
4	Asesorar y apoyar técnicamente a la Secretaría de Infraestructura/en las diferentes **audiencias**, actos de cierre y demás actuaciones que se programen en los diferentes procesos de licitación y otros que le sean asignados, así corno en la proyección de estudios previos	(No se realizó esta actividad durante este periodo).	
5	Asesorar y apoyar desde el punto de vista técnico a la Secretaria de Infraestructura en la PROYECCIÓN DE RESPUESTAS a los requerimientos efectuados por l proponentes y entes de control, en el marco de los procesos de selección que le sean asignados	(No se realizó esta actividad durante este periodo).	

6	Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	El día 16 de Nov de 2023 Se envía por medio de correo electrónico a la Dra. MARIA GOMEZ Formularios, PRESPUESTO Y BORRADOR DEL ESTUDIO PREVIO del proceso de objeto: ""**ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y DRENAJE SOBRE CANAL COLECTOR DE LA CALLE 29, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍACONSULTORÍA**	Ver ANEXO 7
		El día 21 de Noviembre de 2023 Se envía por medio de correo electrónico a la **DRA MONICA CANTILLO** Borrador del ESTUDIO PREVIO del proceso : **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN LA URBANIZACIÓN VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	Ver ANEXO 8
		El día 24 de Noviembre de 2023 Se envía por medio de correo electrónico al DRA **MARIA ANDREA GOMEZ** envío borrador de estudios previsto del proceso cuyo objeto: **"OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANO EN EL TRAMO DE LA DIAGONAL 11 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y 1 A EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**	Ver ANEXO 9

INFORME DE EJECUCIÓN #10
CONTRATO CD-SIM-099-2023
HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
27 DE NOVIEMBRE DE 2023

		El día 24 de Noviembre de 2023 Se envía por medio de correo electrónico al DRA **MARIA ANDREA GOMEZ** envío borrador del ESTUDIO PREVIO del proceso cuyo objeto: **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL – SRPA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES CONTEMPLADAS PAR EL MUNICIPIO DE MONTERÍACONSULTORÍA.**	Ver ANEXO 10

El informe de ejecución se presenta a los 27 días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA.
Contratista

ANEXO 1

secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Index?id=365416152&inCommunity...

Volver

Descargar documento Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento D2423263CF4F9815F9DBCF45442D905B75E57477C9EA7A87B6BE54206B88307F

Ubicación Público

Información del documento

Descripción 19. PLIEGO DE CONDICIONES .pdf

Nombre 19. PLIEGO DE CONDICIONES .pdf

Tamaño 1307201

Estado No encriptado

Creado por MARIA ANDREA GOMEZ

Fecha de creación 26 días de tiempo transcurrido (31/10/2023 3:24:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Volver

Descargar documento Cerrar

INTRODUCCIÓN

Municipio de Montería, en adelante la "Entidad", pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones Definitivo para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para el "REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES EN MICROCUENCAS DE LA CIÉNAGA DE BETANCÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA", en adelante el "Contrato".

Los Documentos del Proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II.

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación No. LP-SPM-025-2023

La Entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y en la normativa aplicable.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

CAPITULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1. ANEXOS

1. Anexo 4 – Pacto de Transparencia
2. Anexo 5 – Minuta del Contrato

9.2. FORMATOS

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta
2. Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B-UT)
3. Formato 3 – Experiencia
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
5. Formato 5 – Capacidad residual
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales
7. Formato 7 – Factor de calidad
8. Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad
9. Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional.
10. Formato 10- Personal para la ejecución de la obra
11. Formato 11 – Equipo para la ejecución de la obra. (NO APLICA)
12. Formato 12 – Autorizacion para el tratamiento de datos personales

9.3. MATRICES

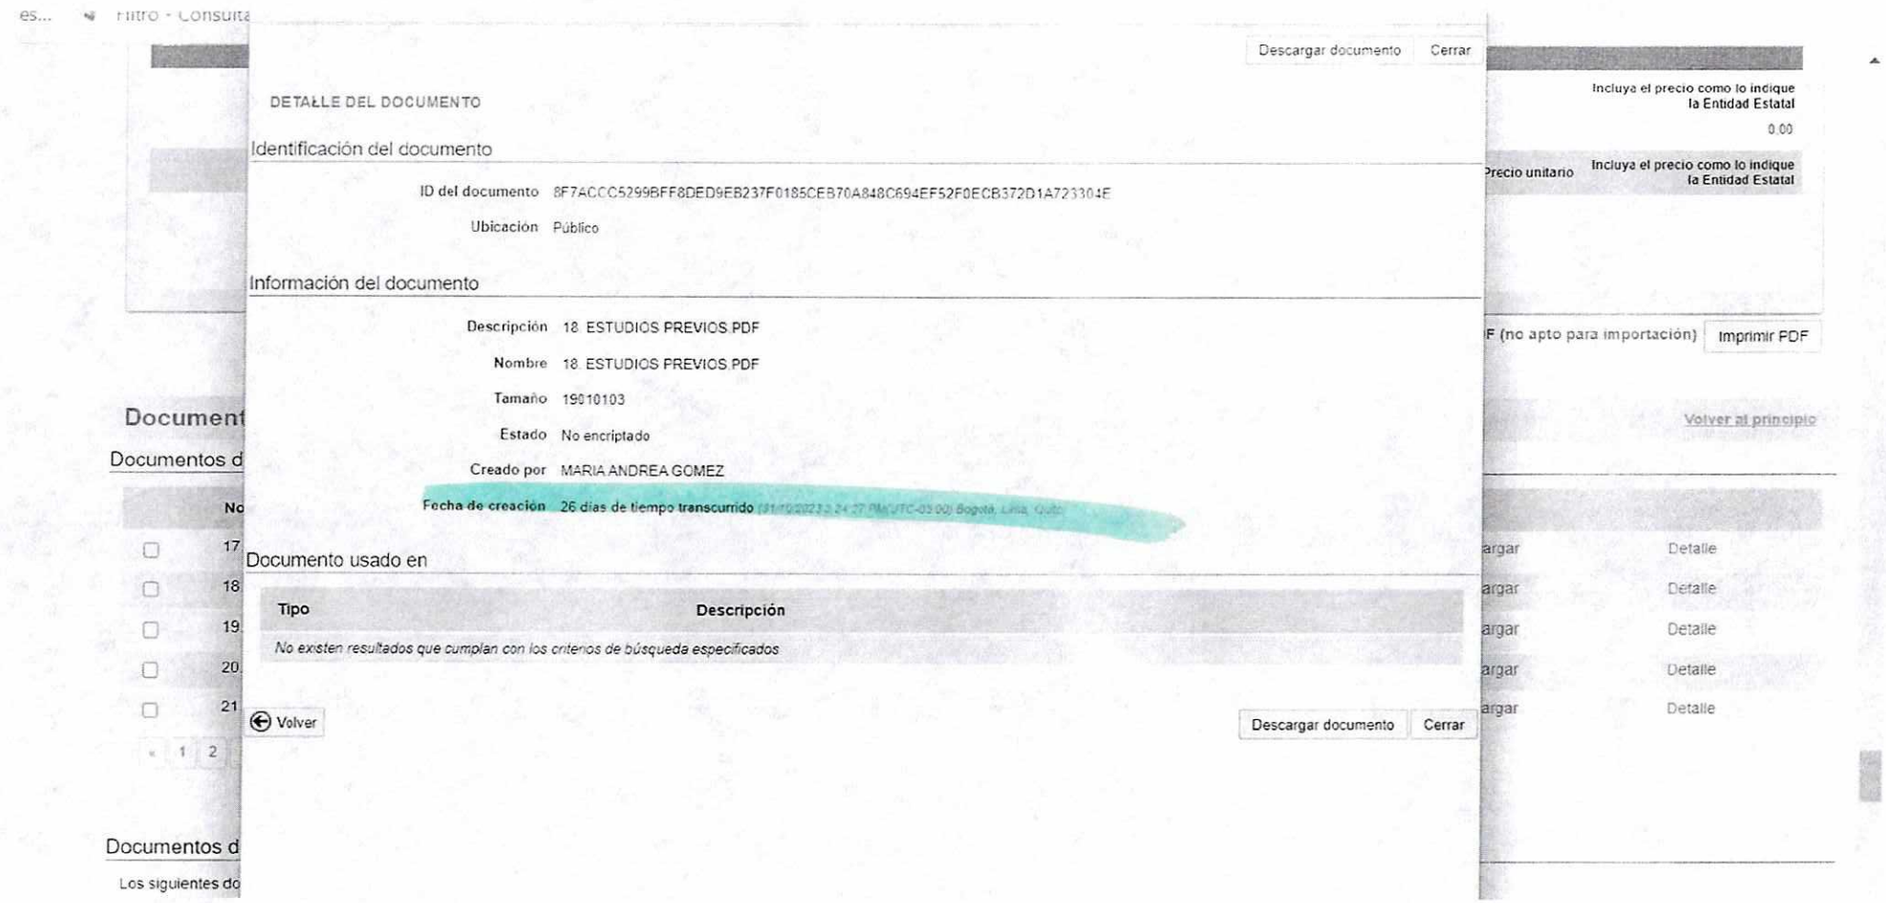
1. Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales
2. Matriz 3 – Riesgos

9.4. FORMULARIOS

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial
2. Formulario 2– Formulario de Análisis de precios unitarios
3. Formulario 3– Formulario de AIU
4. Formulario 4– Formulario de PGIO

Proyectó jurídicamente: María A. Gómez– Abogada Contratista
Proyectó técnicamente: Hernan Narvaez B. – Ingeniero Contratista
Revisó Juridicamente: Katia Cabrales B. – Asesora Externa OAJ

ANEXO 2


Descargar documento
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento 8F7ACCC5299BFF8DED9EB237F0185CEB70A848C694EF52F0ECB372D1A723304E
Ubicación Público
Información del documento
Descripción 18. ESTUDIOS PREVIOS.PDF
Nombre 18. ESTUDIOS PREVIOS.PDF
Tamaño 19010103
Estado No encriptado
Creado por MARIA ANDREA GOMEZ
Fecha de creación 26 días de tiempo transcurrido
Documento usado en
Tipo
Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Volver
Descargar documento
Cerrar
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Precio unitario
Imprimir PDF
Volver al principio
Detalle

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con lo previsto el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para iniciar el trámite de selección de contratista mediante Licitación Publica

ASUNTO: "REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES EN MICROCUENCAS DE LA CIÉNAGA DE BETANCÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA"

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia que textualmente señala: *"Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes."*, y concordante con las facultades dadas a los alcaldes a través de la Ley 1551 de 2012, particularmente en su artículo 29, literal d) numeral 5, que indica que a éstos, les corresponde: *"Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables"*, resulta a penas necesario desde la Administración Municipal, identificar las distintas necesidades que apremian en la población en aras de ser atendidas de la manera más adecuada.

En concordancia con lo expuesto, y a la luz de la obligación constitucional que tiene EL MUNICIPIO de satisfacer la necesidades de la población residente en su territorio, debe determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos; y definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo.

Las microcuencas de las rondas hídrica de la ciénaga de Betancí del municipio de Montería Córdoba presentan deterioro en su estructura ecosistémica. El bosque protector es el más afectado por la deforestación causada por la intervención antrópica (Incremento de la ganadería, cultivos agrícolas, incendios y tala ilegal). La deforestación de la zona contribuye para que las microcuencas arrastren grandes cantidades de sedimentos por la falta de protección de los suelos y la topografía de la parte alta. Esto afecta la calidad del agua y la sedimentación de los cauces, la contaminación por la aplicación de abonos y bióxidos es casi nula, debido a la poca área cultivada con tecnologías modernas.

Las quemas se dan en pequeña escala para limpiar áreas a cultivar como medio de sostenimiento de las familias. La ganadería es la actividad económica predominante y la que mayor aporta al valor agregado municipal. En ese mismo sentido, la ciénaga de Betancí, por la construcción del dique "la tapa" en el año 2001, produjo la disminución significativa en la estructura y función del humedal debido a que la interrupción en el flujo hídrico alteró las condiciones de saturación del suelo y la zona potencial de inundación. De acuerdo a la CVS & Fundación Herencia Ambiental Caribe (2014), indicaron que el cuerpo de agua en estado original ocupaba el 53% de la zona del humedal y después de la construcción del dique representa un 47% significando esto una reducción del espejo de agua en un 6%. No obstante y a diferencia de lo descrito por la CVS & fundación Herencia Ambiental Caribe (2014) en el plan de manejo, los balances hídricos analizados a partir de imágenes satelital de los años 2000, 2011, 2013 y 2015 permiten afirmar que no existe alteración significativa en los volúmenes totales multianuales, ya que el área calculada del espejo de agua tuvo incremento, pasó en el año 2000 de 1131 Ha a 2554 Ha en el 2015, sin embargo, sí se evidencia una alteración en la dinámica de flujos desde el rio Sinú hacia la ciénaga de Betancí y viceversa. De acuerdo a lo anterior, la política nacional de humedales interiores permite inferir que el grado de perturbación de la ciénaga se encuentra en el orden de magnitud 1, lo cual significa transformación total (CVS & FHAC, 2014).

La deforestación es uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el municipio de Montería en su zona rural como es el caso de los corregimientos de Morindó Central, Santa

extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, 54

b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

9. INTERVENTORÍA

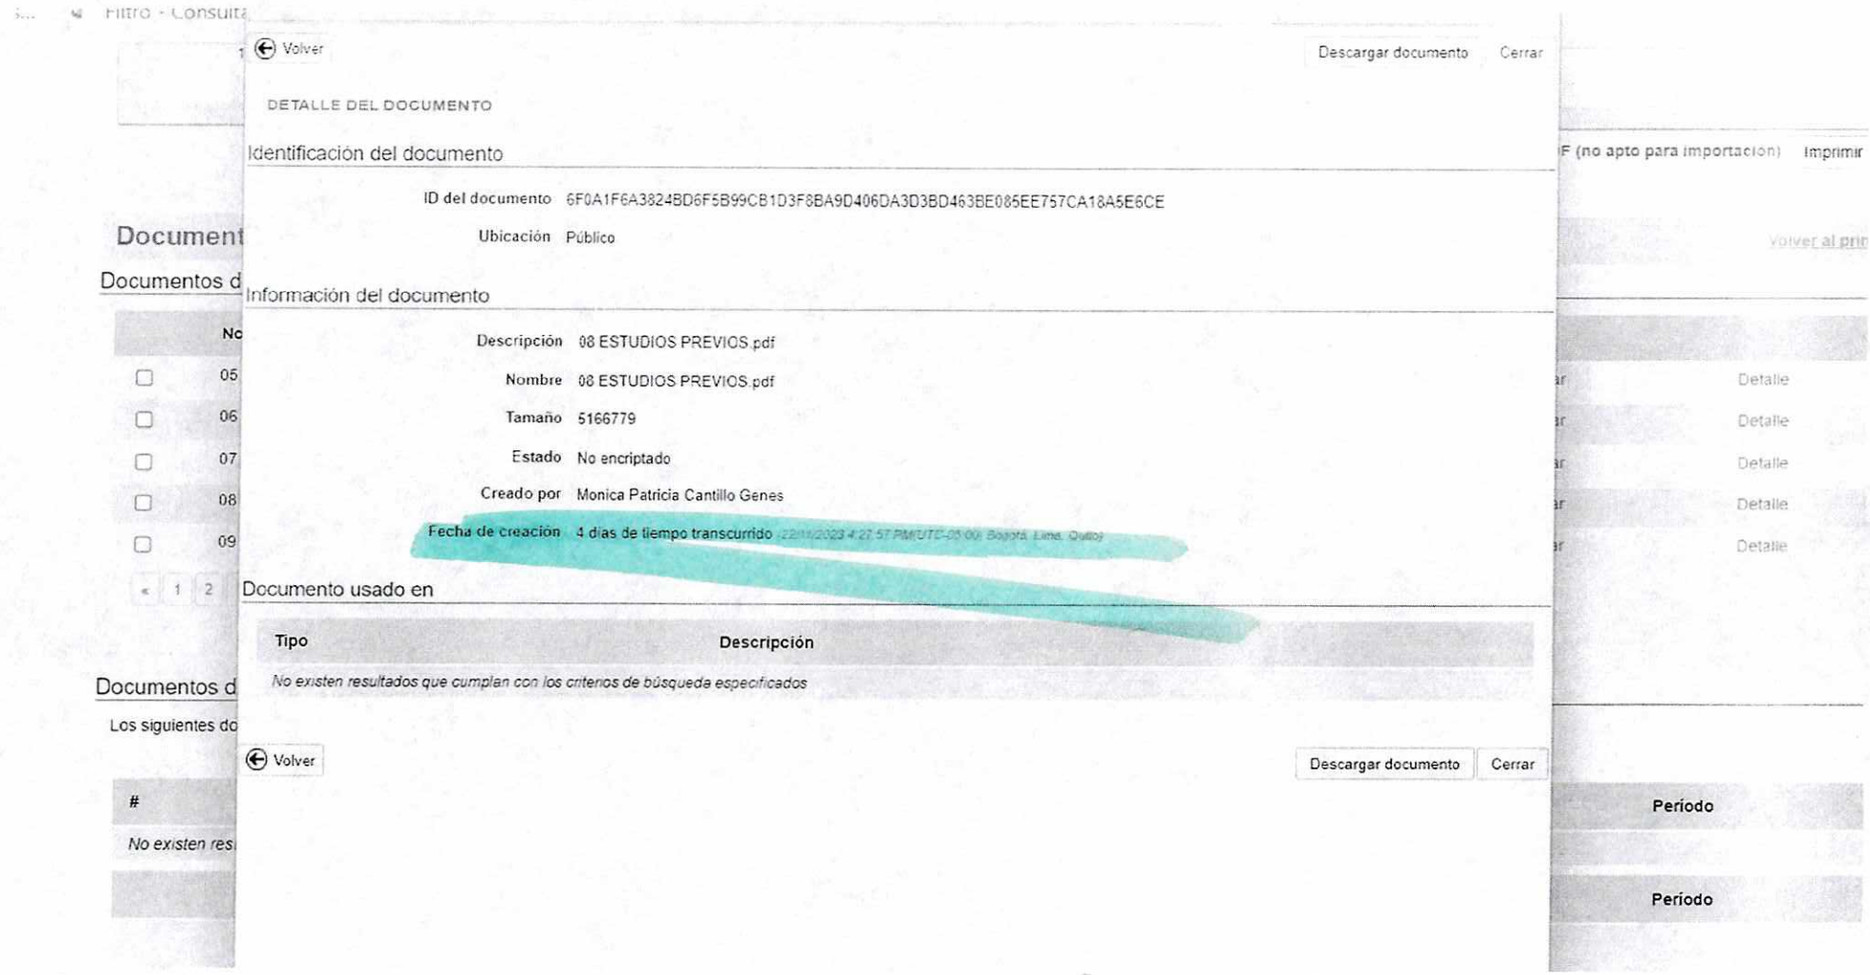
La Interventoría será contratada por una persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debido a la complejidad y valor de las obras.

Para constancia se firma en Montería a los doce (12) días del mes de julio de 2023.

JULIO ELIECER LORA HERNANDEZ
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó técnicamente: Carlos Aguas – Contratista – SPM
Revió técnicamente: HERNAN NARVAEZ – Contratista – SIM

ANEXO 3


Volver
Descargar documento
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento 6F0A1F6A3824BD6F5B99CB1D3F8BA9D406DA3D3BD463BE085EE757CA18A5E6CE
Ubicación Público
Información del documento
Descripción 08 ESTUDIOS PREVIOS.pdf
Nombre 08 ESTUDIOS PREVIOS.pdf
Tamaño 5166779
Estado No encriptado
Creado por Monica Patricia Cantillo Genes
Fecha de creación 4 días de tiempo transcurrido
Documento usado en
Tipo
Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Volver
Descargar documento
Cerrar

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS LEY 80 DE 1993 ARTICULO 25 N°7 Y 12, LEY 1150 ARTICULO 2° PARÁGRAFO 1 Y DECRETO 1082 DE 2015, SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 1 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1	
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN LA URBANIZACIÓN VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
FECHA	OCTUBRE DE 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En virtud de lo señalado en la ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, ley 1150 artículo 2° Parágrafo 1 y en desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 sección 2 subsección 1 artículo 2.2.1.1.2.1.1, se realiza el presente estudio previo para dar soporte al proceso de Contratación para adelantar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN LA URBANIZACIÓN VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

1.- LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 311 señala que los "*Municipios, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes*".

La urbanización Vallejo se encuentra localizada en la margen izquierda del Municipio de Montería, en las proximidades del humedal Berlín, por lo que los terrenos donde se ubica son considerados de pendientes bajas y depresiones en casi toda su área, por lo que permanecen inundados o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo.

Que por lo anterior, se generan estancamiento de aguas lluvias e inundaciones, que perjudican a los habitantes del sector, pues generan problemas de movilidad y afectaciones a las viviendas.

En este orden de ideas y según la normativa aplicable para Montería y según el POT vigente del Municipio, se tiene que para las zonas con amenazas de inundación se deben realizar los estudios y análisis de riesgos pertinentes según corresponda, sea un análisis detallado o medidas de mitigación de la inundación.

Que adicionalmente, con la ejecución del proyecto de la unidad recreo deportiva de la margen izquierda, se contempló la construcción de pompeyanos para cruces peatonales, obras que constituyen un mayor nivel con respecto a las vías aledañas y también un obstáculo hidráulico según la escorrentía natural presentada; frente a tal situación la unidad recreo deportiva de occidente ha contemplado la construcción de sumideros, canales, andenes y tuberías necesarias para conducir el drenaje hacia las vías y canales adyacentes.

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL:

Teniendo en cuenta la contratación a celebrarse mediante estos estudios previos, el Municipio NO está obligada a aplicar Acuerdo Comercial alguno por ser una causal de Contratación de mínima cuantía, tal como lo señala el Manual de manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido por la entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

9. GARANTÍAS:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Garantía</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE MONTERÍA Identificada con NIT 800096734-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Término</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Por la duración del contrato y seis (6) meses mas</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Plazo del contrato y seis (6) meses más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td>• Número y año del contrato
• Objeto del contrato
• Firma del representante legal del contratista
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</td></tr>
</table>

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

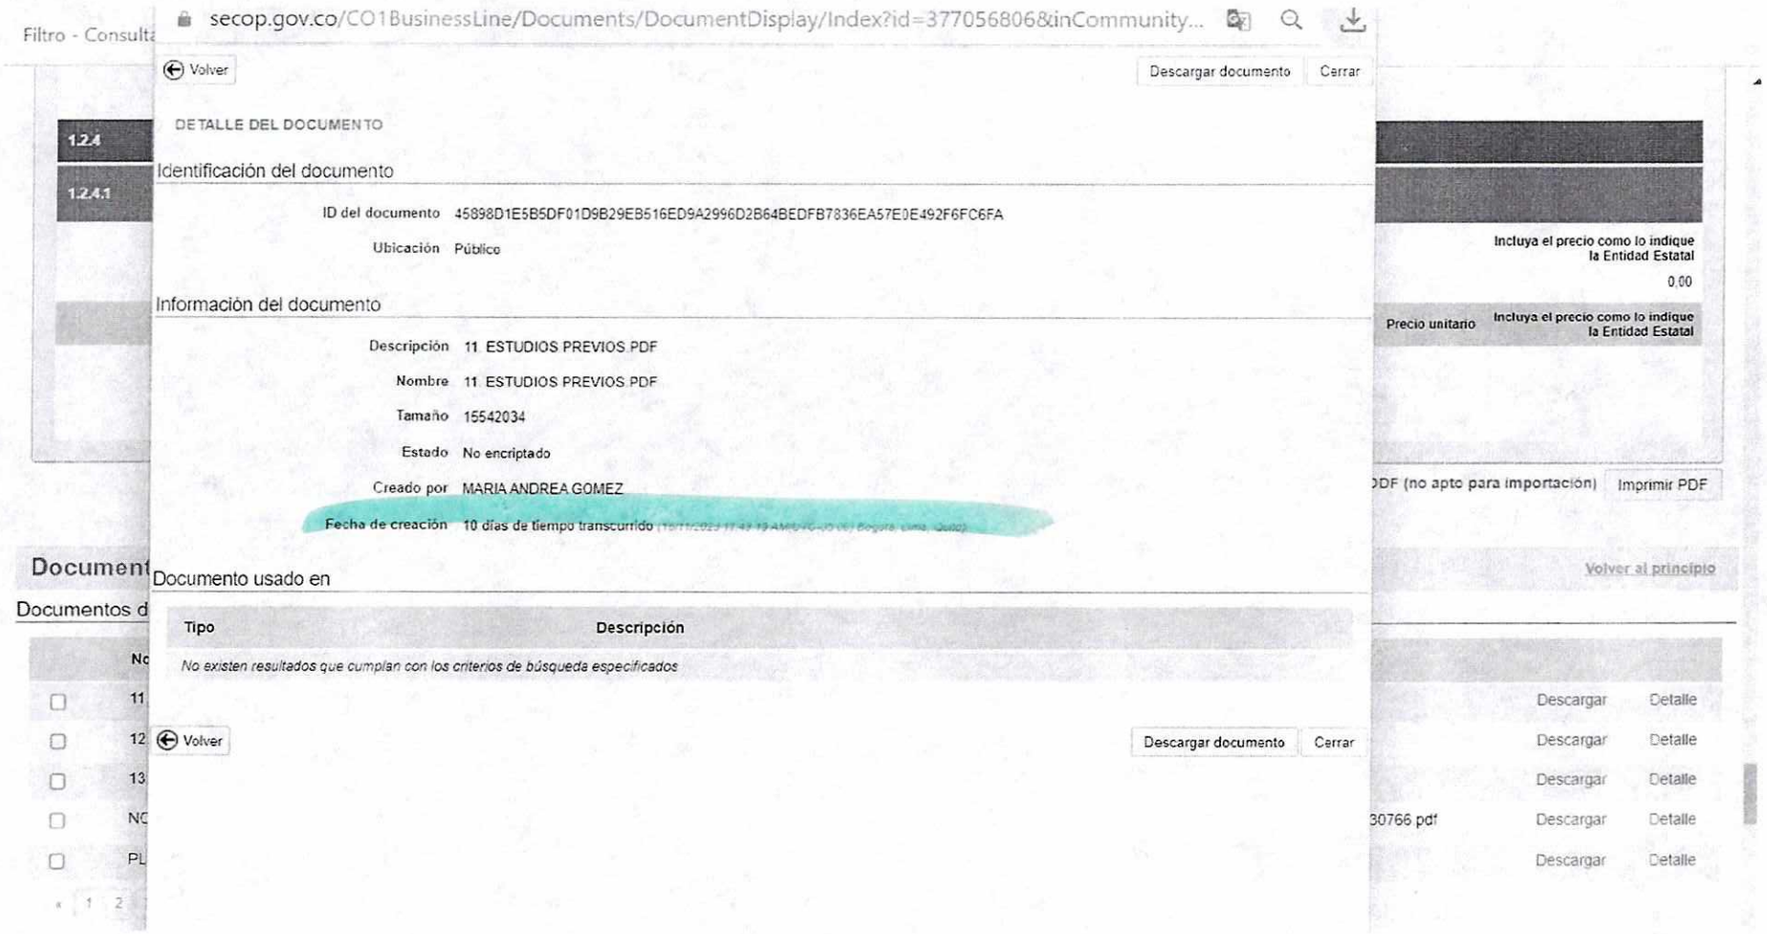
Para constancia se firma en Montería a los dos (2) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyecto técnicamente: Hernán Narváez – Contratista SIM.
Revisión jurídica. Marggy Noguera - Contratista SIM.

ANEXO 4


secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Index?id=377056806&inCommunity...
Volver
Descargar documento
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento 45898D1E5B5DF01D9B29EB516ED9A2996D2B64BEDFB7836EA57E0E492F6FC6FA
Ubicación Público
Información del documento
Descripción 11 ESTUDIOS PREVIOS.PDF
Nombre 11 ESTUDIOS PREVIOS.PDF
Tamaño 15542034
Estado No encriptado
Creado por MARIA ANDREA GOMEZ
Fecha de creación 10 días de tiempo transcurrido
Documento usado en
Tipo
Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Volver
Descargar documento
Cerrar
Filtro - Consulta
1.2.4
1.2.4.1
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0.00
Precio unitario
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
DF (no apto para importación)
Imprimir PDF
Documen
Documentos d
Volver al principio
Descargar
Detalle
30766.pdf

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con lo previsto el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para iniciar el trámite de selección de contratista mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.

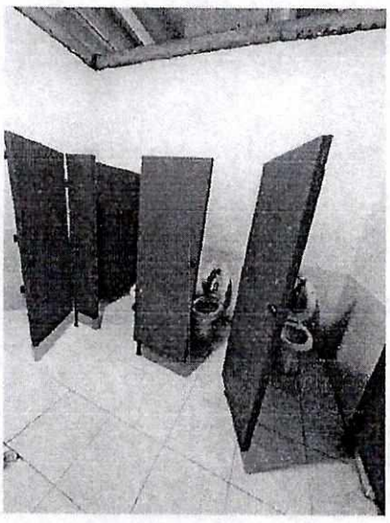
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia que textualmente señala: *"Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes"*, y concordante con las facultades dadas a los alcaldes a través de la ley 1551 de 2012, particularmente en su artículo 29, literal d) numeral 5, que indica que a éstos, les corresponde: *"Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables"*, resulta a penas necesario desde la Administración Municipal, identificar las distintas necesidades que apremian en la población en aras de ser atendidas de la manera más adecuada.

En concordancia con lo expuesto, y a la luz de la obligación constitucional que tiene el MUNICIPIO de satisfacer las necesidades de la población residente en su territorio, debe determinar con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento, entre otros, al principio de eficacia; así mismo, deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos; y definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo.

En la actualidad, el municipio de Montería cuanta con el estadio de futbol profesional "Jaraguay" el cual es sede del equipo de Futbol profesional de nombre Jaguares Futbol Club, el cual fue construido por la entidad en el año 2012.

Debido al uso frecuente de la infraestructura del estadio tanto para partidos de la liga nacional como para las prácticas deportivas del club Jaguares, la infraestructura se ha deteriorado. Igualmente, y con la inclusión del equipo de futbol en la primera división del futbol colombiano, las instalaciones requieren adecuaciones para ir cumpliendo con los requisitos que un escenario deportivo de esta envergadura demanda, evidenciándose deterioro en las puertas del cerramiento perimetral, cielo rasos, aparatos sanitarios, piso, carpintería metálica en general, instalaciones eléctricas, e instalaciones hidrosanitarias, lo anterior en gran medida por la falta de mantenimiento periódico.
A continuación, se describen mediante registro fotográfico el estado físico que el estadio Jaraguay:



De conformidad con lo previsto el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para iniciar el trámite de selección de contratista mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía.

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

9. SUPERVISIÓN.

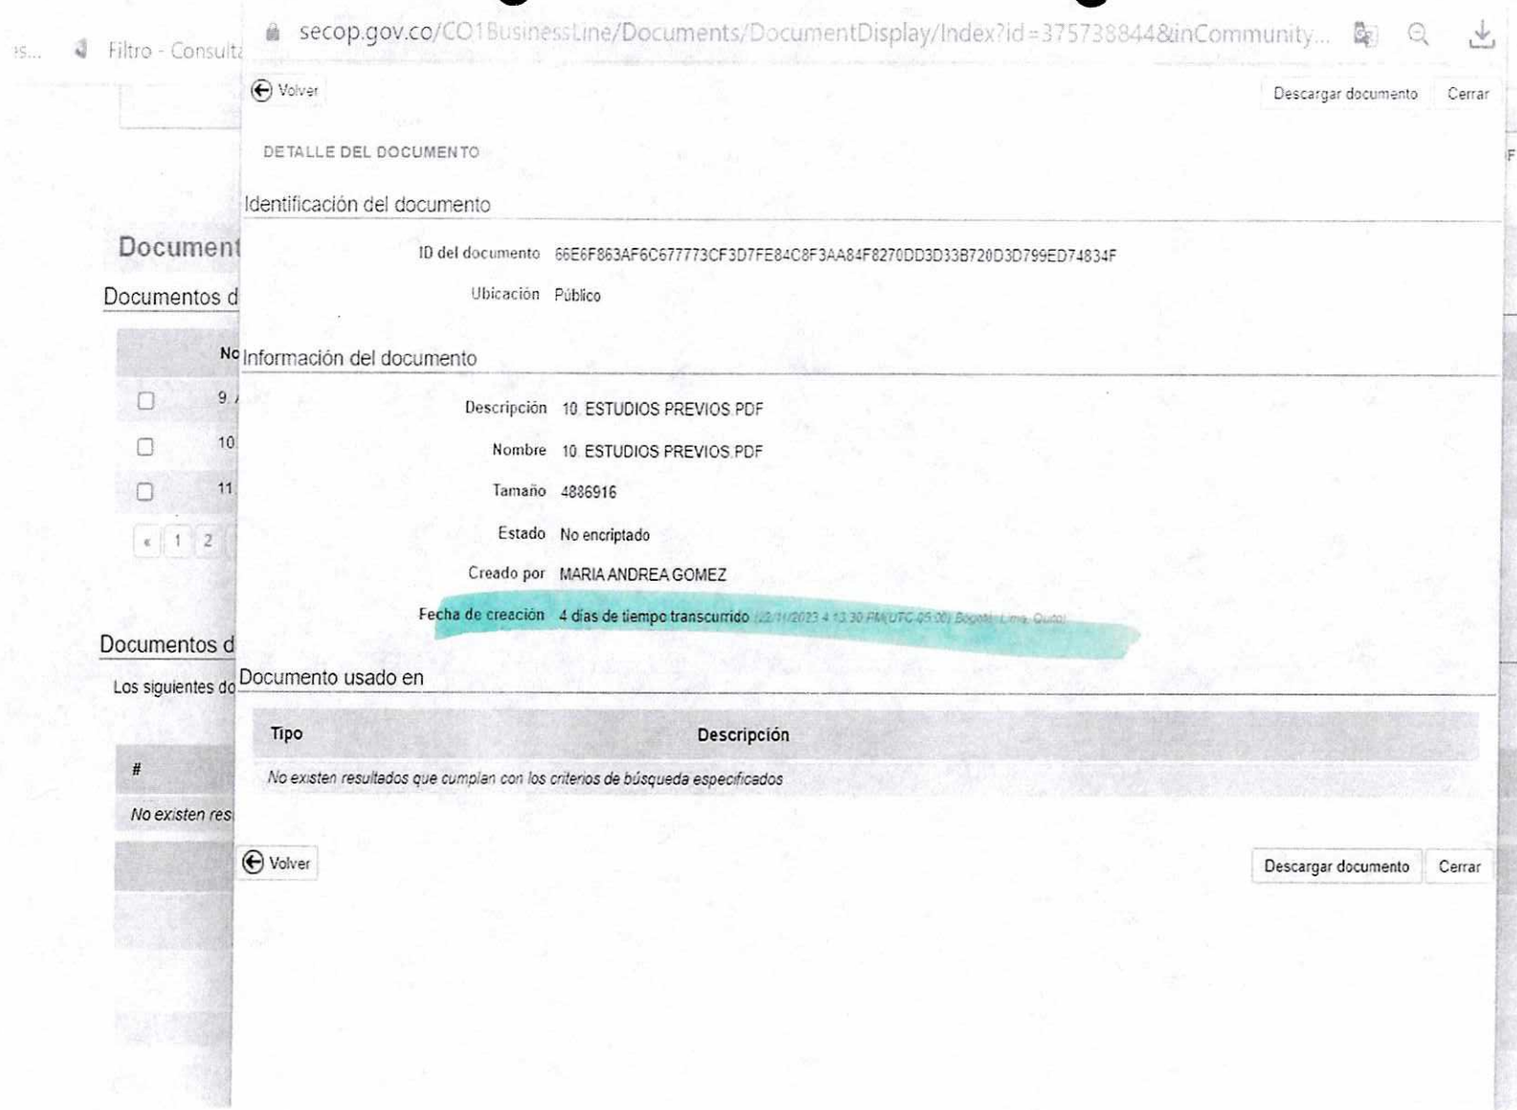
La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, o por el profesional que el ordenador del gasto designe.

Para constancia se firma en el Municipio de Montería Córdoba, a los ocho (8) días del mes de noviembre de 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó técnicamente: Hernán Narváez Contratista SIM
Proyectó Jurídicamente: Marggy Noguera – Contratista SIM

ANEXO 5


secop.gov.co/CO1BusinessLine/Documents/DocumentDisplay/Index?id=375738844&inCommunity...
Volver
Descargar documento
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento 66E6F863AF6C677773CF3D7FE84C8F3AA84F8270DD3D33B720D3D799ED74834F
Ubicación Público
Información del documento
Descripción 10 ESTUDIOS PREVIOS PDF
Nombre 10 ESTUDIOS PREVIOS PDF
Tamaño 4886916
Estado No encriptado
Creado por MARIA ANDREA GOMEZ
Fecha de creación 4 días de tiempo transcurrido
Documento usado en
Tipo
Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Volver
Descargar documento
Cerrar

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	
LEY 80 DE 1993 ARTICULO 25 N°7 Y 12, LEY 1150 ARTICULO 2° PARÁGRAFO 1 Y DECRETO 1082 DE 2015, SECCIÓN 2 SUBSECCIÓN 1 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1	
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y DRENAJE SOBRE CANAL COLECTOR DE LA CALLE 29, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
FECHA	NOVIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En virtud de lo señalado en la ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, ley 1150 artículo 2° Parágrafo 1 y en desarrollo de lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 sección 2 subsección 1 artículo 2.2.1.2.1.1, se realiza el presente estudio previo para dar soporte al proceso de Contratación para adelantar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y DRENAJE SOBRE CANAL COLECTOR DE LA CALLE 29, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

1.- LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 311 señala que los "*Municipios, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes*".

La zona urbana del municipio de Montería está ubicada sobre las planicies del valle del Río Sinú, caracterizadas por una topografía plana con pendientes mínimas en su terreno. Los drenajes pluviales se acomodan a esta topografía por medio de un sistema de canales que recepcionan las aguas por escorrentías provenientes de vías y andenes. El caso en estudio se localiza el barrio La Pradera, etapa 1, el cual pertenece a la comuna 4.

Las vías circundantes a la calle 29 con carrera 29 en el barrio La Pradera, son vías de vital importancia para cada sector, dado que comunican a las comunidades locales con las vías municipales, departamentales y nacionales, siendo el caso que estas vías conducen directamente a la vía concesionada por Ruta Al Mar – ANI, de igual manera comunican estos sectores con el resto de la ciudad. Las vías aledañas a los puntos mencionados se presenta un estancamiento de aguas lluvias debido a los diferentes niveles presentados, además que no cuenta con las pendientes requeridas para su desagüe por escorrentía y tampoco con un sistema de drenaje optimo que evacue estas aguas pluviales. Este represamiento, especialmente en época invernal, no desaparece por infiltración o capilaridad del terreno como tampoco por evaporación, debido a la gran cantidad de agua acumulada. Como consecuencia de lo anterior, esta difícil situación inhabilita todos los carriles vehiculares produciendo trastornos en la movilidad del sector y daños colaterales en la infraestructura vial; igualmente, produce proliferación de vectores y es foco de infección que afectan la salud de los pobladores del entorno inmediato, de igual forma afecta a los habitantes del sector dado que las aguas represadas terminan inundando las viviendas.

El Municipio de Montería actualmente no cuenta con el personal suficiente, para desarrollar las actividades que comprenden el objeto del presente estudio previo, tampoco los equipos ni logística suficiente en el área que supla la necesidad que tiene la administración para encontrar la alternativa de solución más viable.

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1.

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Por la duración del contrato y seis (6) meses mas</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Plazo del contrato y seis (6) meses más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td>• Número y año del contrato
• Objeto del contrato
• Firma del representante legal del contratista
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</td></tr>
</table>

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Para constancia se firma en Montería a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyecto técnico: Hernán Narváez – Contratista SIM.
Revisión jurídica: Marggy Noguera - Contratista SIM.

ANEXO 6

SEGUIMIENTO A CONTRATOS HASTA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

ITEM	PROCESO TIPO	1	No	2	OBJETO	CDP No.	CDP Valor	ENVIADA Fecha	ENVIADA HERNAN	ENVIADA INFRA	ENVIADA CONTRATACIÓ	Publicacion Prepliegos Fecha	Prepliegos Mes	APERTURA No.	APERTURA Fecha	ADJUDICACION No.	ADJUDICACION Fecha	DESIERTA No.	DESIERTA Fecha	Observacion	Subobservacion
					PROCESOS INICIADOS EN EL 2022																
1	SA	SIM	52	MG	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CONCRETO REFORZADO DE 12M DE LONGITUD SOBRE LA QUEBRADA EL CHISPERO UBICADA EN LA VEREDA ALTO ROSARIO, CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO, MUNICIPIO DE MONTERÍA	22001556	799.621.376	30/06/2022				21/12/2022	4	1078	29/12/2022	0088	24/02/2023					
2	SA	SIM	53	MC	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA TRES PIEDRAS, MUNICIPIO DE MONTERÍA	23002294	199.984.151	13/09/2022				29/12/2022								Desierto	
3	SA	SIM	55	MG	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E EL DORADO SEDE PRIMARIA, MUNICIPIO DE MONTERÍA	22002685 22002758	842.502.522	14/12/2022				29/12/2022	12	0086	23/02/2023	0127	16/03/2023			En Ejecucion	
4	SA	SIM	57	MC	DIAGNOSTICO, DISEÑO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		710.263.148					29/12/2022	12							Cancelado	
5	SA	SIM	58	MA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 150 PUNTOS CRITICOS DE LA VÍA HACIA LA VEREDA EL BARRIAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CLARA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	22002623 22002756	800.000.000	16/11/2022				29/12/2022	12	0159	28/03/2023	0232	25/04/2023			En Ejecucion	
6	SA	SIM	60	MC	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA ESTRUCTURA FISICA DONDE FUNCIONA LA SALA DE PASO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	22002706	700.000.000	01/12/2022				30/12/2022	12	0143	22/03/2023	0221	19/04/2023			Cancelado	
7	LCP	SIM	23	MG	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS EL DORADO, CAMPO ALEGRE, LA ESPERANZA Y MANUEL JIMENEZ QUE HACEN PARTE DE LA MARGEN OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA		8.059.904.408,00					20/12/2022	12	0097	02/03/2023	0175	31/03/2023			En Ejecucion	
8	LOP	SIM	25	KC	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA		1.461.444.579,00					29/12/2022	12							Cancelado	
9	LOP	STTM	27	KC	OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	22003078	1.650.000.000,00	18/04/2022				30/12/2022	12	0185	04/04/2023	0370	09/06/2023			Revocada	
10	LOP	SIM	28	KC	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA SIERRA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		5.993.792.392,00					30/12/2022	12							Cancelado	
11	LOP	SIM	29	JB	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA		2.847.134.380,00					30/12/2022	12							Cancelado	
12	CMC	SPM	98	MG	DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COLISEO MIGUEL HAPPY LORA DONDE FUNCIONÓ EL HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA CONTENER LA EXPANSIÓN Y LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	22002596	9.000.000,00	09/11/2022				02/12/2022	12			1011	12/12/2022			Desierto	
13	CMC	SIM	107	MA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA EN EL CORREGIMIENTO LA MANTA, MUNICIPIO DE MONTERIA	22002433	85.000.000,00	30/09/2022				29/12/2022	12							En Ejecucion	
14	CMC	SIM	108	MA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE EN EL CORREGIMIENTO DE LOMA VERDE, MUNICIPIO DE MONTERIA.	22002360	85.000.000	23/09/2022				29/12/2022	12			0049	31/01/2023			Desierto	
15	CMA	SIM	25	MG	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN TÉCNICA, JURIDICA Y SOCIAL PARA LA CESIÓN A TITULO GRATUITO DE PREDIOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE CON VIVIENDAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	22002018	1.200.000.000,00	08/08/2022				28/12/2022	12	0084	22/02/2023	0131	19/03/2023			En Ejecucion	
					PROCESOS INICIADOS EN EL 2023																
16	LOP	SIM	2	MA	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE POLICÍA MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23000579	9.901.073.384,00	24/02/2023		24/02/2023		03/03/2023	3	0146	23/03/2023	0233	27/04/2023			En Ejecucion	
17	CMA	SIM	1	MA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA MARGEN IZQUIERDA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	23000598	1.118.817.205,00	27/02/2023			02/03/2023	14/03/2023	3	0197	10/04/2023	0264	09/05/2023			En Ejecucion	
18	LOP	SPM	3	MC	SERVICIOS DE PODA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	23000829	3.471.125.168	12/04/2023			28/02/2023	24/04/2023	4	0293	18/05/2023	0383	15/06/2023			En Ejecucion	
19	SA	SIM	5	MC	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DESDE EL PUENTE LA VORAGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	23000596	985.774.532	27/02/2023			24/03/2023	03/04/2023	4	0205	13/04/2023	0260	08/05/2023			En Ejecucion	
20	SA	SIM	9	MG	MANTENIMIENTO DE LA CALZADA DEL PUENTE DE LA CALLE 41 – SEGUNDO CENTENARIO E INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 6 CON CALLE 68 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	23000827	984.664.800	28/03/2023			17/04/2023	27/04/2023	4	0266	10/05/2023	0353	05/06/2023			En Ejecucion	
21	SA	SIM	8	MC	MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL HASTA LA VEREDA MATAMOROS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000828	568.172.476	28/03/2023		11/04/2023	18/04/2023	28/04/2023	4	0271	11/05/2023	0347	02/06/2023			En Ejecucion	

ITEM	CONTRATO No.	CONTRATO FECHA	CONTRATO VALOR	PLAZO TIPO	PLAZO MES	CONTRATISTA NOMBRE	NIT	Direccion	Telefono	Correo electronico	RL	CC	DE	INTEGRANTE	%
1	SA-SIM-052-2022	27/02/2023	796.846.659,00	PN	4	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ						10.776.015	Monteria		
2															
3	SA-SIM-055-2022	17/07/2023	841.658.160,00	C	3	CONSORCIO JUGARO	901.695.875-8	CR 10 60 43 BRR LA CASTELLANA	##########	marioalmanzas@gmail.com	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO	10.784.507	Monteria	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO	10%
														JUGARO S.A.S	90%
4															
5															
6	SA-SIM-058-2022	15/05/2023	799.865.242,00	C	2	CONSORCIO SANTA CLARA 058	901709600-2	CR 11 A 59 49 OF 201 BRR LA CASTELLANA	6047860389	consorciosantaclara058@gmail.com	FERNANDO ENRIQUE FERNANDEZ TUIRAN	78.023.616	Cereté	ELESCO S.A.S	90%
														ITC INTERCONSULTING SAS	10%
7	SA-SIM-060-2022	24/04/2023	$ 698.797.847	C	4	CONSORCIO MEJORAMIENTO URI	901705236-6	Calle 44 18 B 47 BARRIO SANTA BARBARA	3007338435	tatiana.herazot@gmail.com	TATIANA HERAZO TORRES	1.102.868.994	Sincelejo	ANTONIO JUAN ACEVEDO PEINADO	90%
														DIABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	10%
8	LP-SPM-023-2022	21/04/2023	$ 7.727.887.637,00	C	6	CONSORCIO VIAL EL DORADO	901702222-1	CL 46 4 104 BRR CENTRO	##########	bunkerconstruccionessas@gmail.com	JOSE ALFREDO HERNANDEZ FURNIELES	78.029.562	Cereté	Bunker Construcciones s.a.s	45%
														Asfalto & Construcciones s.a.s	45%
														Construcciones hhc s.a.s	10%
9															
10															
11															
12															
13	CMC-SIM-007-2022	27/02/2023	84.663.529,00	PN	0,50	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS						78.038.056	Cienaga De Oro		
14															
15	CMA-SIM-025-2022	22/03/2023	$ 1.198.572.790,00	UT	8	UNIÓN TEMPORAL MONTERÍA TITULA 2023	901.695.476-2	Calle 31 2-27 OF 11	3008098854	monteriatitular2023@gmail.com	FRANCISCO TOMAS BOHORQUEZ	78.759.361	Sahagun	TECNOLOGIA - FUSATEC	
														FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, SALUD, AMBIENTE Y EQUIPAMENTO	70%
														ASOCIADOS - FUNDASEO	30%
16	LP-SIM-002-2023	16/05/2023	$ 9.901.071.485,00	C	24	CONSORCIO COMANDO 23	901710088-2	CL 42 7 40 LC 1	6047919612	consorciocomando23@gmail.com	José Gregorio Arroyo Fernández	73.567.264	Carmen de Bolivar	ARROYO & URZOLA LTDA	50%
														CUANTICO INGENIERIA S.A.S.	45%
														LOPECA S.A.S	5%
17	CMA-SIM-001-2023	18/05/2023	$ 1.118.817.010,00	C	22	CONSORCIO KALOR MONTERIA	901713314-6	CR 15 A 121 12 OF 314	6056203317	kalpaingenieriasas@gmail.com	KEVIN PATRICIA ALEAN MORELO	50.932.278	Monteria	BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC	90%
														ORIS INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC	10%
18	LP-SPM-003-2023	24/06/2023	$ 2.336.910.342,00	C	5	CONSORCIO ZONAS VERDES 2023	901726331-8	CR 53 70 112 AP 4 D	3215923122	rkconstruccionesrk@gmail.com	FERNANDO ANDRÉS MENDOZA GARCÍA	10.767.990	Monteria	TECNIVIAL CONSTRUCCIONES S.A.S	50%
														MAVICON CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A.S	40%
															10%
19	SA-SIM-005-2023	15/05/2023	$ 981.352.926	PJ	1,5	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	901514977-5	CR 53 70 112 AP 4 D	3232862727	ingenieriaconstructorescol@gmail.com	ERIK SAMIR CHADID VERGARA	1.128.053.556	Cartagena		
20	SA-SIM-009-2023	06/06/2023	$ 971.556.165	PJ	1	DUMAR INGENIEROS SAS	900.222.779-6	Calle 64A # 7-07 Montería - Córdoba	3135343931	INFO@DUMARINGENIEROS.COM Licitaciones1@dumaringenieros.com	JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ	79.939.920	Boeota D.C.		
21	SA-SIM-008-2023	09/06/2023	$ 565.366.391	C	1,5	CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS 23	901720712-3	CL 7 24 D 11 AP 201	3226513192	heidyp1794@gmail.com	DAVID ANDRÉS ÁLVAREZ REINO	78.761.596	Sahagun	HEIDIS PAOLA PÉREZ SERRA	10%
														KABOO EXECUTIVE GROUP SAS	90%

SEGUIMIENTO A CONTRATOS HASTA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

ITEM	PROCESO TIPO	1	No	1	OBJETO	CDP No.	CDP Valor	CDP Fecha	ENVIADO A HERNAN	ENVIADO A INFRA	ENVIADO A CONTRATACC	Publicacion Pliegos Fecha	Pliegos Mes	APERTURA No.	APERTURA Fecha	ADJUDICACION No.	ADJUDICACION Fecha	DESIERTA No.	DESIERTA Fecha	Observacion 1	Subobservacion	CONTRATO No.	CONTRATO FECHA	CONTRATO VALOR	CONTRATO TIPO	PLAZO MES	CONTRATISTA NOMBRE	CONTRATISTA NIT	CONTRATISTA Direccion	CONTRATISTA Telefono	CONTRATISTA Correo electronico	RL	CC	DE	INTEGRANTE	%
22	SA	SIM	13	MC	MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO BUJO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000876	982.254.774	03/04/2023			24/04/2023	24/04/2023	12/05/2023	5	0308	29/05/2023	0382	15/06/2023					SA-SIM-013-2023	20/06/2023	933.707.411	PJ	5	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA (FUNDESMUCOL	523001362-1	CL 1A 2 68	3215839697	asmabe0722@hotmail.com	OSCAR EDUARDO MARTINEZ BETANCOURT	78.323.744	Buenavista		
23	LOP	SPM	4	AA	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS DE MARZO, URB. EL DIAMANTE, EDMUNDO LOPEZ Y EL ALIVIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	23001102	4.733.743.700	26/05/2023			19/04/2023	10/05/2023	5	0329	30/05/2023	0469 a	13/07/2023					LP-SIM-004-2023		4.502.797.823,00	PJ		SILCONS SAS	900.058.258-8				EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO	79.691.193	Bogota D.C		
24	CMC	SIM	14	MA	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE EN EL CORREGIMIENTO DE LOMA VERDE, MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000894	98.385.938,00	12/04/2023			26/04/2023	08/05/2023	5								CMC-SIM-001-2023	24/05/2023	98.000.000,00	PJ		INGENIERIA AZUR S.A.S	901672953-5	CR 11 37 33	3116573173	mares_bolivar@gmail.com	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	25.775.982	Monteria		
25	CMA	SPM	2	MC	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES Y ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000893	171.337.501	12/05/2023			26/04/2023	09/05/2023	5	0287	17/05/2023	0375	13/06/2023					CMA-SIM-002-2023	23/06/2023	$ 171.337.501,00	C	5	CONSORCIO INTERJARDINES 2023	901725619-6	PALACIO MUNICIPAL BLOQUE 3 OF 2	**********	consultorialp2@gmail.com	LILIANA TERESA PEREZ POLO	50.908.008	Monteria	CONSULTORIA ZOMAC SAS BUSERICO S.A.S PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS	60% 25% 15%
26	LOP	SIM	6	MA	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS 14 DE JULIO, LA JULIA, OBRERO, LA VICTORIA, URB. LACHARME, CHAMBACU, PUEBLO NUEVO Y LA COQUERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	23000899	4.323.973.419,00	12/04/2023				25/05/2023	5	0387	20/06/2023	0548	09/08/2023					LP-SIM-006-2023	15/08/2023	$4.114.698.235)	UT	6	UNION TEMPORAL ECOMONTERIA 006					LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ	80.802.423	Bogota D.C		
27	LOP	SIM	9	MA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SIERRA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	23000972	5.999.792.392,00	27/04/2023				06/06/2023	6	0412	26/06/2023																	
28	CMA	SIM	3	MA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS 6 DE MARZO, URB. EL DIAMANTE, EDMUNDO LOPEZ Y EL ALIVIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	23001127	319.711.075,00	31/05/2023				13/06/2023	6	0411	27/06/2023	0495	25/07/2023					CMA-SIM-003-2023	27/07/2023	319.375.643,00	C		CONSORCIO INTERVIAL COMUNA 6	901739174-4				ANTONIO MARIA FERNANDEZ DE LEON	78.752.433	Monteria		
29	LOP	SIM	10	MA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	23000915	1.461.444.579,00					26/05/2023	5	0476	18/07/2023	0592	22/08/2023					LP-SIM-010-2023		$1.454.477.568,00,00	LP	5	CONSORCIO PERSONERIA 2023	NO DEJA VER EL CONTRATO				JESÚS DAVID PIZARRO FERNÁNDEZ	1.126.243.699	Consulado venezolano		
30	SA	SIM	26	MC	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL BARRIO VILLA ROCÍO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23000829	819.993.455	28/03/2023		11/04/2023		26/06/2023	6	0460	12/07/2023	0548	04/08/2023					SA-SIM-026-2023	08/08/2023	819.603.411,00	Ph	2	CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78695529				CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78.695.529	Monteria		
31	CMA	SIM	4	MA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA SIERRA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	23000973	467.257.608,00	27/04/2023				30/06/2023	6	0463	13/07/2023	0677	08/09/2023					CMA-SIM-004-2023	08/09/2023	467.131.400,00		5	Proyectistas Asociados SAS	900426155-7				OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN	74.082.238	Sogamoso		
32	SA	SIM	14	MC	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA TRES PIEDRAS, MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000890	286.026.581,00	12/04/2023				30/06/2023	6	0455	11/07/2023	542 D	04/08/2023					SA-SIM-014-2023	04/08/2023	199.184.367,00	PN	1	LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	73.148.910				LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	73.148.910	Cartagena		
33	SI	SIM	7	MA	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES COMO APOYO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23001026	873.000.000,00	11/05/2023				05/06/2023	6	0396	22/06/2023	0452	07/07/2023					N°SI-SIM-007-2023	07/07/2023	873.000.000,00			EMARCO SAS	90046944-6				ANA CECILIA MAUSSA DORIA	1.003.716.815	Sin Pelayo		
34	CMA	SIM	5	MA	JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS 14 DE JULIO, LA JULIA, OBRERO, LA VICTORIA, URB. LACHARME, CHAMBACU, PUEBLO NUEVO Y LA COQUERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	23000890	286.026.581,00	12/04/2023				04/07/2023	7	0486	21/07/2023	0647	05/09/2023					CMA-SIM-005-2023	11/09/2023	282.750.260,00		5	CONSORCIO HUPERNIKAO BARRIOS DE MONTERIA	901756855-3	CR 71 D 75 A 42 AP 302	3007711266	admonhupiksas@gmail.com	KEYWEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO	1.045.680.516	Barranquilla	CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S	10% 90%
35	CMC	SIM	30	GA	CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL COLISEO MIGUEL HAPPY LORA DONDE FUNCIONO EL HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA CONTENER LA EXPANSIÓN Y LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA, DENOMINADA "COVID-19" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23001170	9.000.000,00	07/06/2023				14/07/2023	7				26/07/2023					CMC-SIM-030-2023	26/07/2023	8.623.416,00		1	AGRO DISTRIBUCIONES MONTERIA LTDA	901222220-5				KELLY MACELAN TOBON CHAMORRO	1.144.025.065			
36	LOP	SIM	12	MC	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000977	2.847.134.381,00	27/04/2023				21/07/2023	7	0551	11/08/2023	682	08/09/2023					LP-SIM-012-2023	11/09/2023	2.847.134.379,00		4	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	901752045-6				DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS	72.236.745	Barranquilla	4 TOWERS S.A.S DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS	10% 90%
37	LOP	SIM	5	JB	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23001356	5.056.588.249,00	13/07/2023				25/07/2023	7	0549	10/08/2023	0731	21/09/2023					LP-SIM-005-2023	25/09/2023	4.792.806.278		3	UNION TEMPORAL ECO LAS PALOMAS	901757302-7	CL 18 1 33	3017607304	lucho276@gmail.com	LUIS ALBERTO PACHECO DIAZ	80.802.423	Bogota D.C	CONSTRUAPOYO LP S.A.S. CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S	25% 75%
38	LOP	SIM	14	MA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA BOCA DE LA CEIBA Y EL CORREGIMIENTO DE GUATEQUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		8.752.537.754,00	26/07/2023				26/07/2023	108	0578	16/08/2023	0705	15/09/2023					LP-SIM-014-202	19/09/2023	7.555.825.687,00		109	CONSORCIO ACUEDUCTO VEREDAS MONTERIA	901755852-7	CL 59 12 45	3016313805	acueductovereda@gmail.com	CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES	1.071.350.914	San Carlos Córdoba	LOPECA S.A.S CONSICIVIL SAS CUANTICO INGENIERI SAS	60% 20% 20%
39	CMA	SIM	6	MA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRIMERO Y SEGUNDO HSO DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SEDE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	23000916	128.422.990,00	17/04/2023				26/07/2023	4					0606	24/08/2023													
40	LOP	SIM	15	MA	MEJORAMIENTO DE UN PARQUE EN EL BARRIO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	923-1023	2195274737+1536692332	01/09/2023				02/08/2023	4	0674	07/09/2023																	
41	SA	SIM	50	MC	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE APARTADA ARROYON HASTA LA APARTADA VIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE NUEVA ESPERANZA Y NUEVA LUCIA EN EL MUNICIPIO	23001429	984.973.628	27/07/2023				29/08/2023	2	0662	06/09/2023	0744	27/09/2023					SA-SIM-050-2023		984.764.163		2	CONSORCIO PROGRESO RURAL									
42	CMA	SIM	7	MA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL A LA EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA BOCA DE LA CEIBA Y EL CORREGIMIENTO DE GUATEQUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	23001396	585.884.972	21/07/2023				26/07/2028	4	0579	16/08/2023	0708	15/09/2023					CMA-SIM-007-2023	18/09/2023	571.071.375		4	INTERRURAL MONTERIA 2023	901756666-8	CR 6 27 41 OF 401 FD RSK	3005871419	licitacionycontratacion403@gmail.com	ELIDA SOFIA GONZÁLEZ ALVAREZ	52.961.985	Bogota D.C	GONAL CONSULTING SAS GUTEMBERG GONZALEZ	10% 90%
43	CMA	SIM	8	MC	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23000976	247.576.883	27/04/2023				31/07/2023	4	0561	15/08/2023																	

SEGUIMIENTO A CONTRATOS HASTA 26 DE NOVIEMBRE DE 2023

ITEM	PROCESO TIPO		No		OBJETO	CDP No.	CDP Valor	CDP Fecha	ENVIADO A HERNAN	ENVIADO A INFRA	ENVIADO A CONTRATACIÓN	Publicacion Pregliegos Fecha	Mes	APERTURA No.	APERTURA Fecha	ADJUDICACION No.	ADJUDICACION Fecha	DESIERTA No.	DESIERTA Fecha	Observacion 1	Observacion 2	CONTRATO No.	CONTRATO FECHA	CONTRATO VALOR	CONTRATO TIPO	PLAZO MES	CONTRATISTA NOMBRE	CONTRATISTA NIT	CONTRATISTA Direccion	CONTRATISTA Telefono	CONTRATISTA Correo electronico	CONTRATISTA RL	CC	DE	INTEGRANTE	%
44	CMA	SIM	9	JB	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	230001357	353.960.502	13/07/2023				08/08/2023	3	0603	23/08/2023																							
45	SA	SIM	36	MA	DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	23000975	710.263.149	27/04/2023				01/08/2023	4	0552	11/08/2023																							
46	SA	SIM	42	JB	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	230001314	985.972.492	15/07/2023				11/08/2023	2	0595	22/08/2023																							
47	SA	SIM	44	MA	MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS A INSTALACIONES FISICAS DONDE FUNCIONAN UNIDADES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA	230001395	649.865.659	21/07/2023				14/08/2023	3	0605	24/08/2023																							
48	SA	SIM	57	MG	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CASA DE JUSTICIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	23001427	120.638.814	27/07/2023				19/09/2023	2																							
49	SA	SIM	58	MA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A TRAVÉS DE CUNETAS EN LA CARRERA 20 QUE CONECTA A LOS BARRIOS MOGAMBO Y ROBINSON PITALUA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	23001542	983.396.662					21/09/2023	2																							
50	CMA	SIM	10	MA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE UN PARQUE EN EL BARRIO LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	926 1023	153.966.232	01/09/2023				14/09/2023	3	0745	28/09/2023																							
51	CMC	SIM	73	MG	ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA CONTROL DE INUNDACIÓN Y DRENAJE SOBRE CANAL COLECTOR DE LA CALLE 29, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23001648	98.600.000	22/09/2023				22/11/2023	1																							
52	CMC	SIM	65	MC	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN LA URBANIZACIÓN VALLEJO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	23001649	96.159.124	22/09/2023				22/11/2023	1																							
53	CMC	SIM	75	JB	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	SGR230020	101.333.133	27/10/2023				24/11/2023	2																							
54	LOP	SIM	23	MG	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA (	1523	1.382.121.426	27/10/2023				27/10/2023	2	0841	31/10/2023																							
55	LOP	SPM	25	MG	REHABILITACIÓN DE BOSQUES PROTECTORES EN LAS MICROCUENCAS DE LA CIÉNAGA DE BETANCÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE MONTERÍA	523	5.753.151.507	31/07/2023					4																							
56	LOP	SIM	28	JB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN LOS BARRIOS LOS ANGELES, LAS VIÑAS Y LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1323	3.499.307.876	12/10/2023				31/10/2023	4	0891	17-112023																							
57	SA	SIM	70	MG	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL JARABUAY DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	23001743	499.665.183	19/10/2023				16/11/2023	1	932	24/11/2023																							

GA	
MC	
MA	
PL	
KC	
JB	
MG	

SIM	
SITM	
SPM	

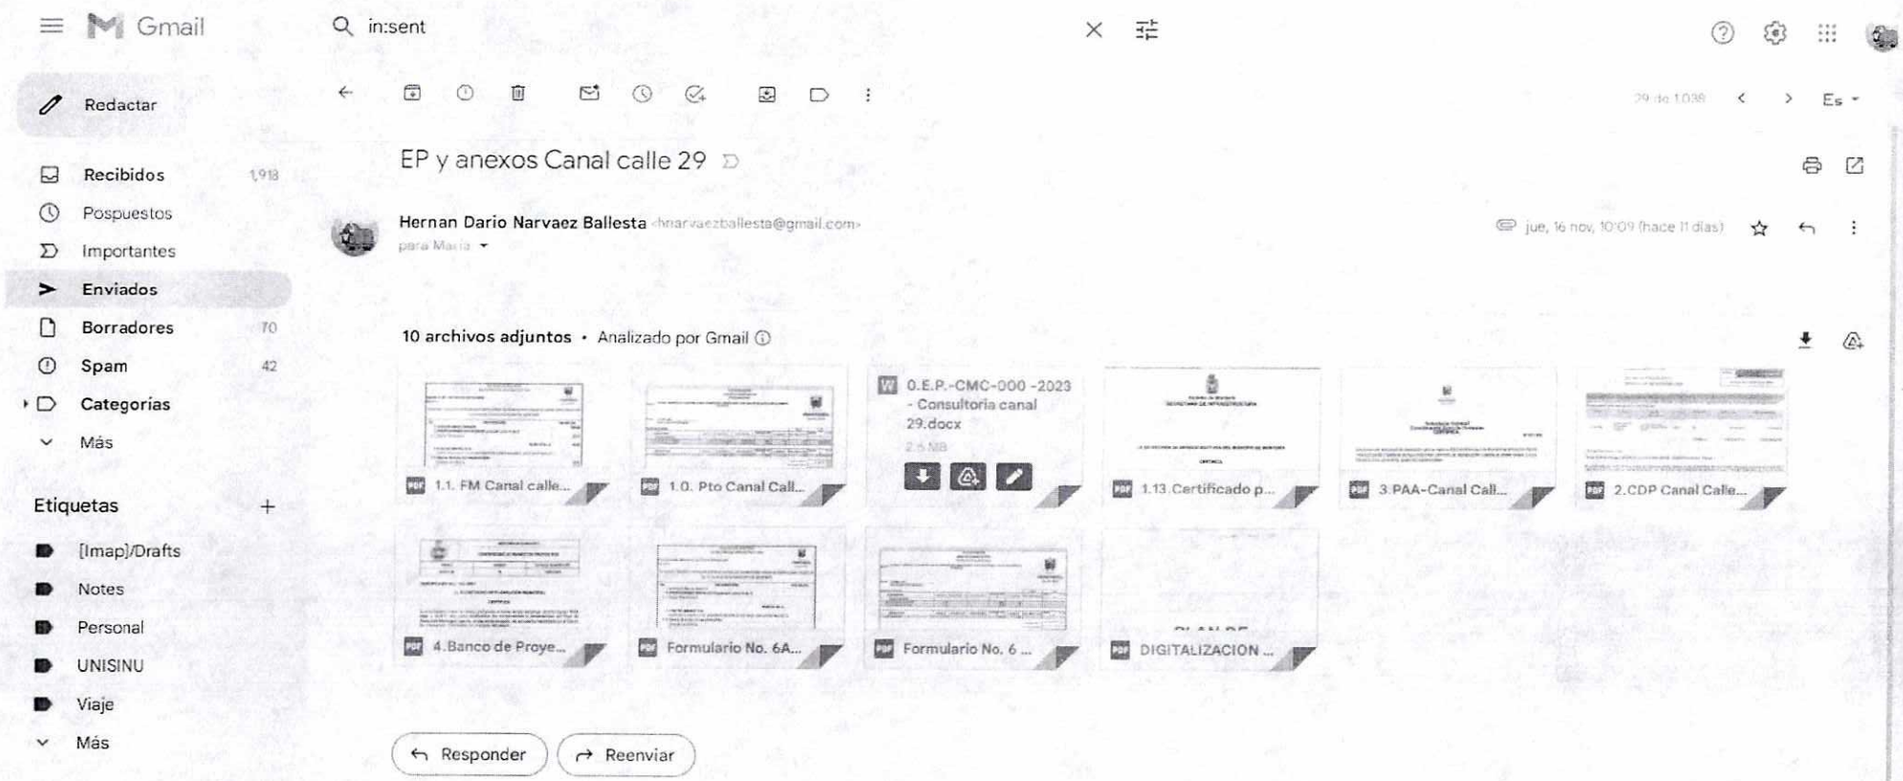
LOP	21
SA	19
CMA	23
CMC	8

Liquidado	47
Desierto	6
Terminado	3
Borrador	11
Desistido	2

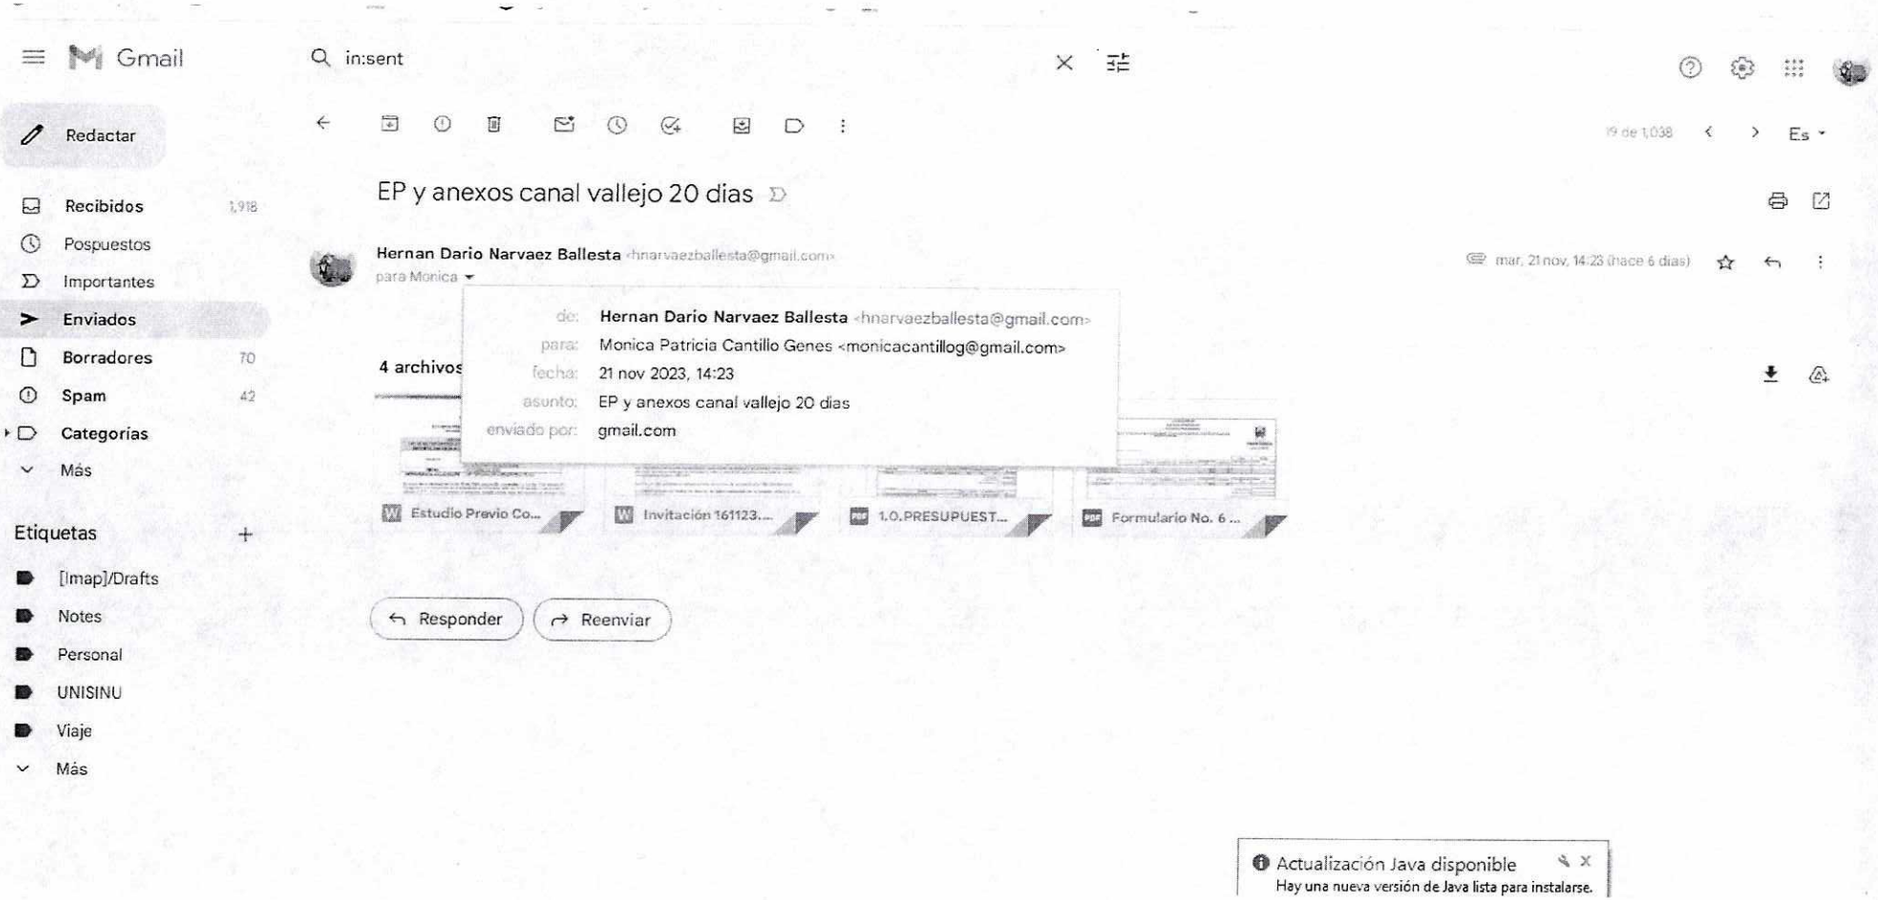
71

71

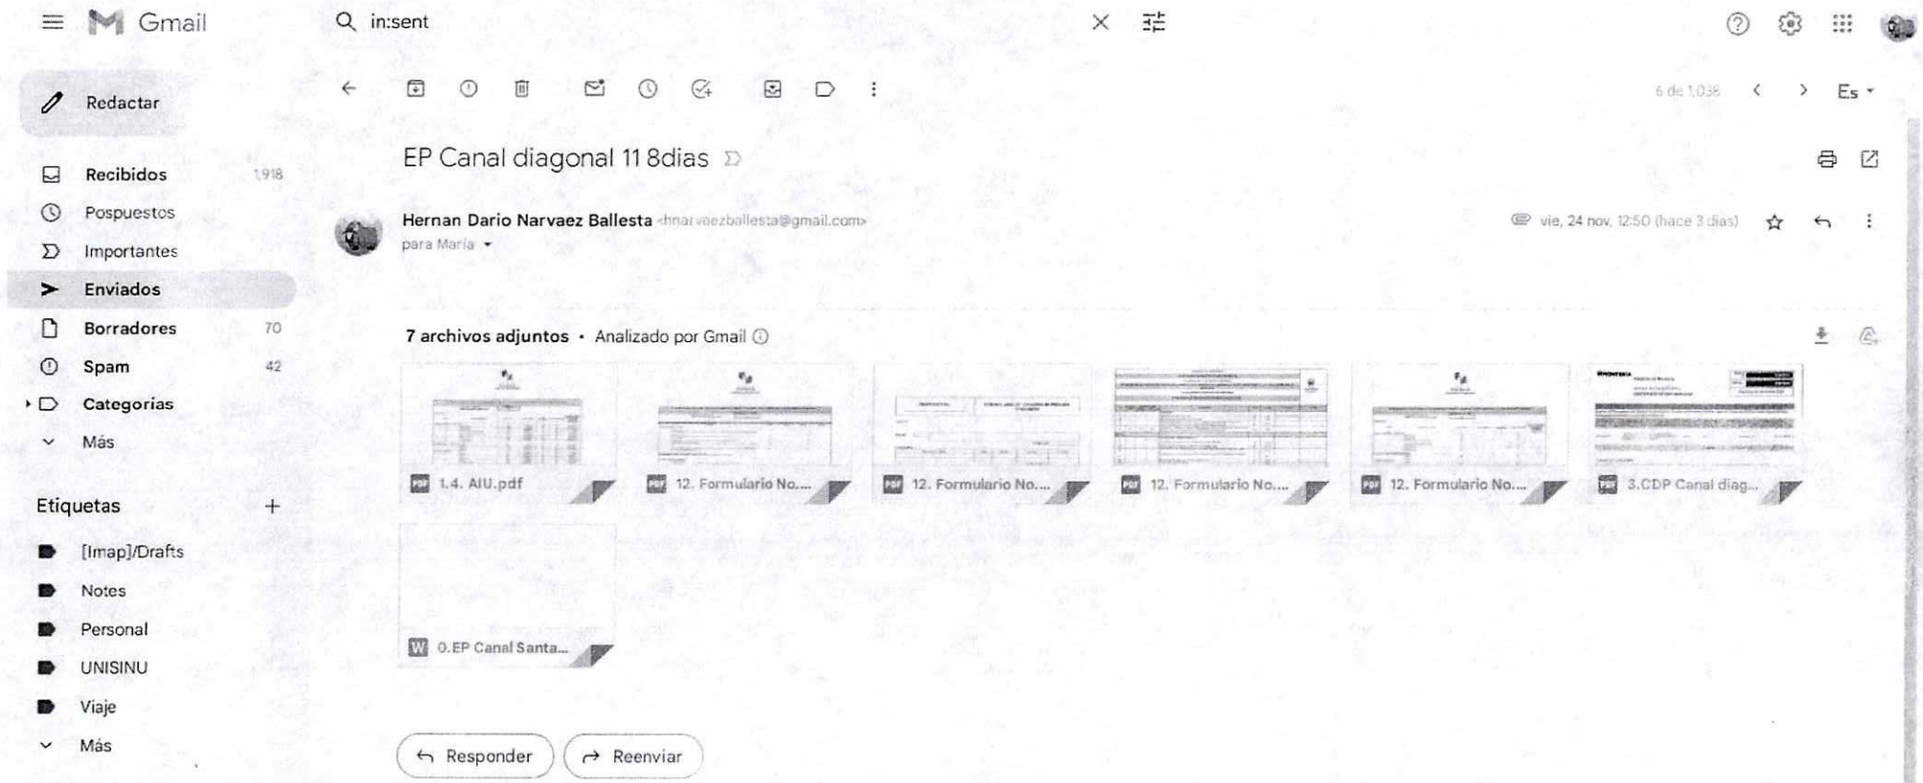
ANEXO 7


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 1,918
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 70
Spam 42
Categorías
Más
Etiquetas
[Imap]/Drafts
Notes
Personal
UNISINU
Viaje
Más
EP y anexos Canal calle 29
Hernan Dario Narvaez Ballesta
para María
jue, 16 nov, 10:09 (hace 11 días)
10 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
1.1. FM Canal calle...
1.0. Pto Canal Cali...
0.E.P.-CMC-000 -2023 - Consultoria canal 29.docx
1.13.Certificado p...
3.PAA-Canal Cali...
2.CDP Canal Calle...
4.Banco de Proye...
Formulario No. 6A...
Formulario No. 6 ...
DIGITALIZACION ...
Responder
Reenviar

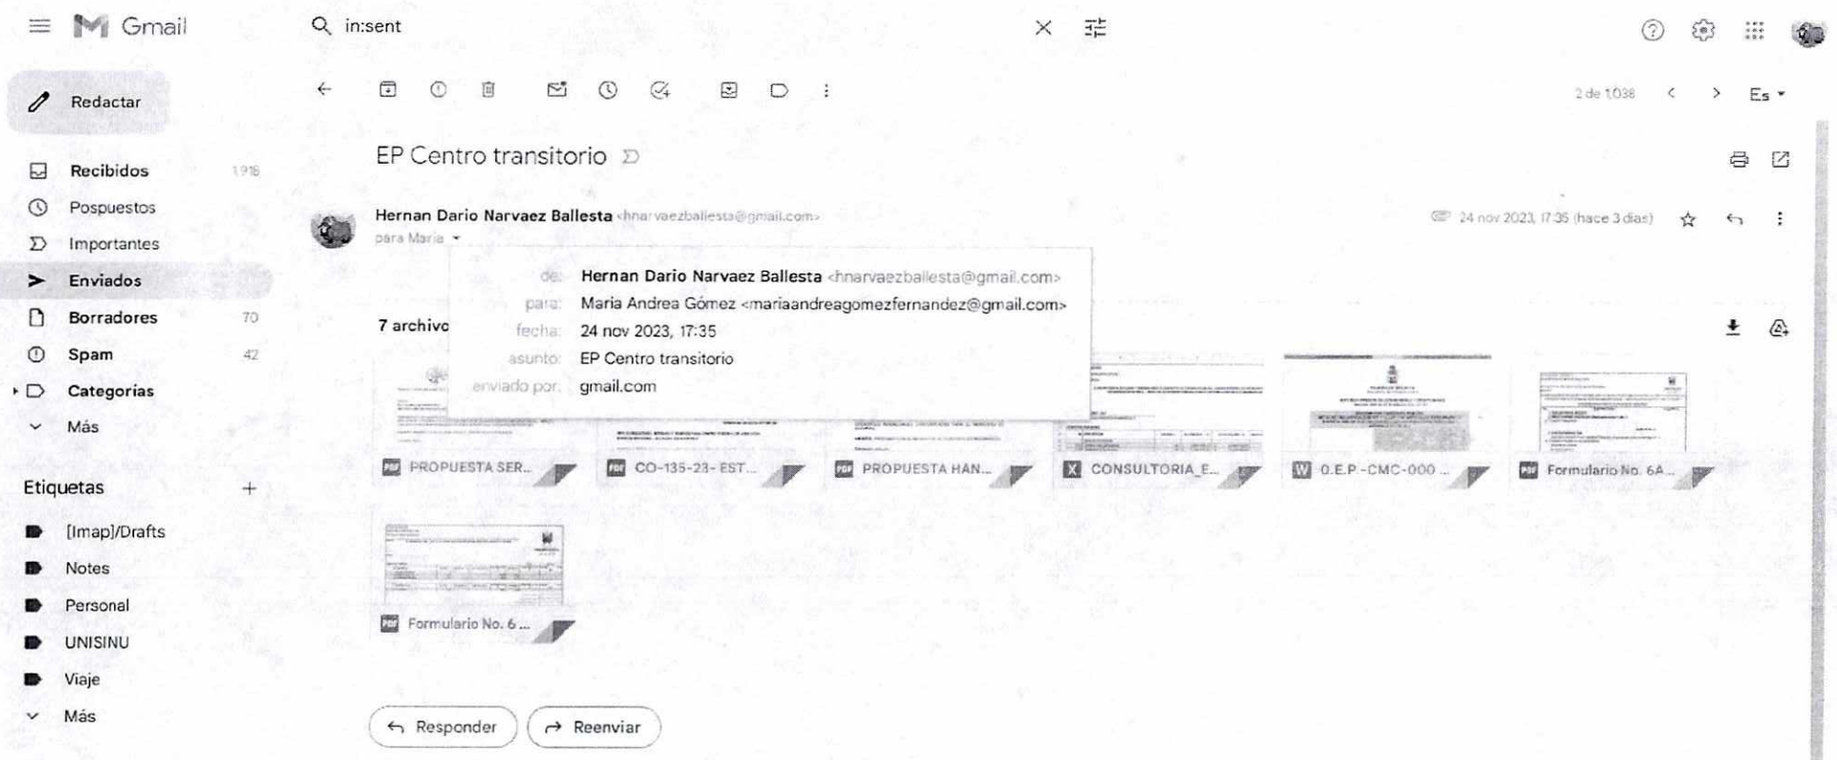
ANEXO 8


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 1,918
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 70
Spam 42
Categorías
Más
Etiquetas
[Imap]/Drafts
Notes
Personal
UNISINU
Viaje
Más
EP y anexos canal vallejo 20 dias
Hernan Dario Narvaez Ballesta <hnarvaezballesta@gmail.com>
para Monica
mar, 21 nov, 14:23 (hace 6 días)
de: Hernan Dario Narvaez Ballesta <hnarvaezballesta@gmail.com>
para: Monica Patricia Cantillo Genes <monicacantillog@gmail.com>
fecha: 21 nov 2023, 14:23
asunto: EP y anexos canal vallejo 20 dias
enviado por: gmail.com
4 archivos
Estudio Previo Co...
Invitación 161123....
1.0.PRESUPUEST...
Formulario No. 6 ...
Responder
Reenviar
Actualización Java disponible
Hay una nueva versión de Java lista para instalarse.

ANEXO 9


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 1.918
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 70
Spam 42
Categorías
Más
Etiquetas
[Imap]/Drafts
Notes
Personal
UNISINU
Viaje
Más
6 de 1.036
Es
EP Canal diagonal 11 8dias
Hernan Dario Narvaez Ballesta
para María
vie, 24 nov, 12:50 (hace 3 días)
7 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
1.4. AIU.pdf
12. Formulario No....
12. Formulario No....
12. Formulario No....
12. Formulario No....
3.CDP Canal diag...
0.EP Canal Santa...
Responder
Reenviar

ANEXO 10


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 1.918
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 70
Spam 42
Categorías
Más
Etiquetas
[Imap]/Drafts
Notes
Personal
UNISINU
Viaje
Más
2 de 1.038
EP Centro transitorio
Hernan Dario Narvaez Ballesta <hnarvaezballesta@gmail.com>
para María
24 nov 2023, 17:35 (hace 3 días)
de: Hernan Dario Narvaez Ballesta <hnarvaezballesta@gmail.com>
para: Maria Andrea Gómez <mariaandreagomezfernandez@gmail.com>
fecha: 24 nov 2023, 17:35
asunto: EP Centro transitorio
enviado por: gmail.com
7 archivo
PROPUESTA SER...
CO-135-23- EST...
PROPUESTA HAN...
CONSULTORIA_E...
0.E.P.-CMC-000 ...
Formulario No. 6A ...
Formulario No. 6 ...
Responder
Reenviar
