CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-34	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 4.044,06	1,000	$ 4.044,06
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 4.044,06

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$ 1.077.120,00	$ 1.077.120,00
			SUBTOTAL $	$ 1.077.120,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	12,0	$ 40.440,61
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 40.440,61
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.121.605,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 336.481,50
			TOTAL COSTO	$ 1.458.086,50

GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA
FECHA 27/06/2024
HORA 11:18 AM
RECIBIDO POR Linda Dominguez
NOTA: RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO APLICA ACEPTACION

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA **REP-1229-24**

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y angulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tuberia de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tuberia de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye. riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasis metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soportero y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL. SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE/

Y&G INGENIERIA

Ing. OSSER BARRIOS

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

Calle 98 No. 42G-61. Cel 3134916768 - email: ygingenieriagerencia@gmail.com - Colombia

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

GlobalFresh

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024				No.202406-162	
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE.	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control incluye: (Suministro, instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta

Firma Recibido Cliente

Elaborado

TECNICOLL

NIT: 7 631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 vía y cassettes 1 vía	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ductoria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	$ 154.656.594

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-35	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 12.132,18	1,000	$ 12.132,18
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 12.132,18

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UND	1,00	$ 584.100,00	$ 584.100,00
			SUBTOTAL $	$ 584.100,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	4,0	$ 121.321,83
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 121.321,83
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 717.554,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 215.266,20
			TOTAL COSTO	$ 932.820,20

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA **REP-1229-24**

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc..	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc..	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportrena anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasis metálicos.	UND	20,00	$385.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch. Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductería retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar .
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA, (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Ing. OLOSSENIS ARROYO

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

Calle 98 No. 42G-61. Cel 3134916768 - email: ygingenieriagerencia@gmail.com - Colombia

TECNICOLL

NIT: 7.631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	**$ 154.656.594**

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

GlobalFresh

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024				No.202406-162	
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herranientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolucion. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta.

Firma Recibido Cliente

Elaborado

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-36	PANEL DECORATIVO TIPO CASSETE 4 VIAS Y CASSETE 1 VIA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 16.176,24	1,000	$ 16.176,24
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 16.176,24

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL DECORATIVO TIPO CASSETE 4 VIAS Y CASSETE 1 VIA	UND	1,00	$ 877.500,00	$ 877.500,00
			SUBTOTAL $	$ 877.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	3,0	$ 161.762,44
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 161.762,44
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.055.439,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 316.631,70
			TOTAL COSTO	$ 1.372.070,70

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA REP-1229-24

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tuberia de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalacion, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc..	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubalox, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tuberia de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y angulos. consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalaciondde soportrena anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: rel Channel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch. Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductena retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soportena y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Sumenistro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA.	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

Ing. YOSSEF PAVA MOLINA

Y&G INGENIERIA

TECNICOLL

NIT 7.631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACIÓN
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento alres acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	**$ 154.656.594**

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

GlobalFresh

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024				No.202406-162	
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalacion, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta.

Firma Recibido Cliente

Elaborado

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-37	TERMOSTATO ALAMBRICO O INALAMBRICO	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 2.426,44	1,000	$ 2.426,44
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 2.426,44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TERMOSTATO ALAMBRICO O INALAMBRICO	UND	1,00	$ 603.720,00	$ 603.720,00
			SUBTOTAL $	$ 603.720,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	20,0	$ 24.264,37
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 24.264,37
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 630.411,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 189.123,30
			TOTAL COSTO	$ 819.534,30

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA **REP-1229-24**

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puestà en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalacion, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tuberia de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalacion, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc..	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalacion, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalaciones soportería anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico o inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductoria rotomo en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soportería y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO.
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Ing. OLOSSER PRADO M.O

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024		No.202406-162			
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tuberia de cobre 3/4" O.D Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc .	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta..

Firma Recibido Cliente

Elaborado

TECNICOLL

NIT: 7.631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tuberia de cobre 3/4" O D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	$ 154.656.594

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-38	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R410A DE TODO EL SISTEMA(SUMINISTRO Y CARGA TOTAL) Y NITROGENO	GLB	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 173.316,90	1,000	$ 173.316,90
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 173.316,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
REFRIGERANTE R410A DE TODO EL SISTEMA (SUMINISTRO Y CARGA TOTAL)	GLB	1,00	$ 7.076.000,00	$ 7.076.000,00
NITROGENO	GLB	1,00	$ 2.806.000,00	$ 2.806.000,00
			SUBTOTAL $	$ 9.882.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	0,28	$ 1.733.169,00
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 1.733.169,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11.788.486,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 3.536.545,80
			TOTAL COSTO	$ 15.325.031,80

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA REP-1229-24

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-25	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tuberia de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tuberia de cobre 1/2" O.D Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportrena anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductería retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento térmico en yumbolom, soportaria y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G-INGENIERIA

Ing. [illegible]

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

Calle 98 No. 42G-61, Cel 3134916768 - email: ygingenieriagerencia@gmail.com - Colombia

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

GlobalFresh

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024					No.202406-162
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc .	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O D Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y angulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta.

Firma Recibido Cliente

Elaborado

TECNICOLL

NIT: 7.631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No.051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Item	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluyo: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	$ 154.656.594

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA RETORNO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO EN YUMBOLON, SOPORTERIA Y ALCLAJES .	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 32.352,49	1,000	$ 32.352,49
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 32.352,49

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DUCTERIA RETORNO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO EN YUMBOLON, SOPORTERIA Y ALCLAJES	GL	1,00	$ 2.479.040,00	$ 2.479.040,00
	Z			
			SUBTOTAL $	$ 2.479.040,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	1,5	$ 323.524,88
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 323.524,88
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.834.917,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 850.475,10
			TOTAL COSTO	$ 3.685.392,10

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA **REP-1229-24**

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	Ml	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	Ml	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	Ml	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	Ml	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	Ml	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportrana anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: rel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductoria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumboloim, soporteria y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Ing. OLOSSENIA ARRIETA C.

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

GlobalFresh

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024			No.202406-162		
Datos Cliente:						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc .	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette. incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolucion Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta.

Firma Recibido Cliente

Elaborado

TECNICOLL

NIT: 7.631 222-1
Dir: carrera 19b # 11d 06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tuberia de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 vía y cassettes 1 vía	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	**$ 154.656.594**

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL INCLUYE CABLE 3X16, BLINDADO Y APANTALLADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 1.011,02	1,000	$ 1.011,02
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 1.011,02

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE 3X16, BLINDADO Y APANTALLADO	ML	1,00	$ 48.500,00	$ 48.500,00
TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION	GL	1,00	$ 3.960,00	$ 3.960,00
			SUBTOTAL $	$ 52.460,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	48,0	$ 10.110,15
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 10.110,15
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 63.581,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 19.074,30
			TOTAL COSTO	$ 82.655,30

Y&G INGENIERIA

Gestión Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA **REP-1229-24**

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportrena anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y crasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalación ductena retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soportena y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Ing. OLOSEGUI RAMIREZ

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

TECNICOLL

NIT· 7.631.222-1
Dir. carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura.barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura.barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metàlicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	$ 154.656.594

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

GlobalFresh

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024				No.202406-162	
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc...	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalacion, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del codigo de comercio. en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta

Firma Recibido Cliente

Elaborado

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-41	MANTENIMIENTO DE CONDENSADORAS SISTEMA VRF	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 2.426,44	1,000	$ 2.426,44
ANDAMIOS Y TABLONES		$ 4.500,00	1,750	$ 2.571,43
HIDROLAVADORA ELECTRICA 220V	DIA	$ 108.573,00	0,060	$ 6.514,38
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 11.512,25

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGENTE DE LIMPIEZA QUIMICO, REFRIGERANTE (% DE CARGA), AISLAMIENTO TERMICO, TERMINALES ELÉCTRICOS, ACEITE,FILTROS	GLB	1,00	$ 588.500,00	$ 588.500,00
			SUBTOTAL $	$ 588.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	20,0	$ 24.264,37
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 24.264,37
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 624.277,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 187.283,10
			TOTAL COSTO	$ 811.560,10

Y&G INGENIERIA

Gestion Inteligente

CONSORCIO SIERRA NEVADA REP-1229-24

Att. Ing. Alex Cotes M.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF

ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	Concepto	UNID	CANT	UNITARIO	TOTAL
NP-14-4	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1,00	$150.000	$150.000
NP-26	Tuberia de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.,	MI	20,00	$156.468	$3.129.360
NP-27	Tuberia de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.,	ML	60,00	$142.520	$8.551.224
NP-28	Tuberia de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	MI	50,00	$127.723	$6.386.160
NP-29	Tuberia de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.,	ML	110,00	$121.422	$13.356.420
NP-30	Tuberia de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.,	MI	30,00	$106.625	$3.198.744
NP-31	Tuberia de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrogeno etc.	MI	110,00	$92.436	$10.168.013
NP-32	Tuberia de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tuberia de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc.,	MI	10,00	$69.242	$692.424
NP-33	Suministro e instalacionde soportrena anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: rel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20,00	$365.040	$7.300.800
NP-34	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$702.720	$1.405.440
NP-35	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2,00	$468.480	$936.960
NP-36	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1,00	$1.077.120	$1.077.120
NP-37	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14,00	$700.920	$9.812.880
NP-38	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettas 1 via	UND	25,00	$1.053.000	$26.325.000
NP-39	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9,00	$603.720	$5.433.480
NP-40	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1,00	$11.858.400	$11.858.400
NP-41	Suministro e instalacion ductoria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soportena y anclaje	Und	5,00	$2.974.848	$14.874.240
NP-42	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300,00	$62.952	$18.885.600
NP-43	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6,00	$625.000	$3.750.000
	SUBTOTAL DE LA OFERTA				$147.292.265

CONDICIONES COMERCIALES Y ALCANCE COTIZACION

SOMOS REGIMEN SIMPLIFICADO

IMPORTANTE: VER ALCANCE DE LA PROPUESTA ANEXO

OBRAS CIVILES, MAMPOSTERIA, PINTURA Y ACABADO FINAL, SERA POR CUENTA DEL CLIENTE.

FORMA DE PAGO:	50% inicio
	30% según avance de obra, 20% al entregar
TIEMPO DE ENTREGA	SESENTA (60) DIAS HABILES DESPUES DE ANTICIPO
VALIDEZ DE LA OFERTA:	DIEZ DIAS (10) DIAS CALENDARIO.

CORDIALMENTE,

Y&G INGENIERIA

Ing. [illegible]

Y&G INGENIERIA

Santa Marta 22 mayo 2024

GLOBALFRESH - SANDRO TORRES DIAZ

COTIZACION

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 7.629.995-1
RESPONSABLE DE RENTA
DIRECCION CLL 12 NO 29 - 61 BARRIO SANTA LUCIA
SANTA MARTA - COLOMBIA
TELEFONO 3145920492

FECHA:	14 MARZO 2024			No.202406-162		
Datos Cliente						
EMPRESA / CLIENTE	CONSORCIO SIERRA NEVADA		NIT.			
Dirección		Ciudad:	Santa Marta		Teléfono:	
Contacto						
Correo Electrónico						

Productos y Servicios

ITEM	Descripción	UND	Cant.	Vr. Unidad	Total
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)				
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$154.500	$154.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	20	$161.162	$3.223.241
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$146.796	$8.807.761
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	50	$131.555	$6.577.745
5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$125.065	$13.757.113

6	Tubería de cobre 1/2" O.D. incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	30	$109.824	$3.294.706
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	110	$95.210	$10.473.053
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	Ml	10	$71.320	$713.197
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$375.991	$7.519.824
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$723.802	$1.447.603
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$482.534	$965.069
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$1.109.434	$1.109.434
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$721.948	$10.107.266
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$1.084.590	$27.114.750
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$621.832	$5.596.484
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$12.214.152	$12.214.152
17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$3.064.093	$15.320.467
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$64.841	$19.452.168
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$643.750	$3.862.500
				TOTAL	$ 151.711.033

Forma de Pago			
Valor Negociació	$ 151.711.033	FORMA DE PAGO	CONTADO

Este pedido es una venta en firme sin derecho a devolución Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio, en caso de mora se cobrara el interes mas alto autorizado por la ley a partir de la fecha de vencimiento de esta.

Firma Recibido Cliente

Elaborado

TECNICOLL

NIT: 7.631.222-1
Dir: carrera 19b # 11d -06
Telefonos: 3165087778

COTIZACION
No 051

ALCANCE: Acontinuacion se relaciona suministro e isntalacion de aire acondicionado

CLIENTE	IDENTIFICACION	Fecha	Ciudad
CONSORCIO SIERRA NEVADA		14/06/2024	SANTA MARTA

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento aires acondicionados tipo VRF ESTADIO DE FUTBOL SIERRA NEVADA (Santa Marta)

Ítem	Descripción	UND	CANT	Vr. Unitario	Vr Total
1	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	1	$ 157.500,00	$ 157.500
2	Tubería de cobre 1 1/8 O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	20	$ 164.291,00	$ 3.285.820
3	Tubería de cobre 7/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	60	$ 149.646,00	$ 8.978.760
4	Tubería de cobre 3/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	50	$ 134.109,00	$ 6.705.450

5	Tubería de cobre 5/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	ML	110	$ 127.493,00	$ 14.024.230
6	Tubería de cobre 1/2" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	30	$ 111.956,00	$ 3.358.680
7	Tubería de cobre 3/8" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	110	$ 97.058,00	$ 10.676.380
8	Tubería de cobre flexible 1/4" O.D. Incluye herramientas de instalación, accesorios de la tubería de cobre, aislamiento en Rubatex, mano de obra de instalación, soportes con pernos de anclaje, varillas roscadas y ángulos, consumibles de soldadura,barrido de nitrógeno etc..	MI	10	$ 72.704,00	$ 727.040
9	Suministro e instalacionde soportreria anclaje equipos evaporadores tipo cassette, incluye: riel Chanel, varilla 3/8 roscada, tuercas, arandelas y chasos metálicos.	UND	20	$ 383.292,00	$ 7.665.840
10	TAJETA PCB DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 737.856,00	$ 1.475.712
11	TAJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	2	$ 491.904,00	$ 983.808
12	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	1	$ 1.130.976,00	$ 1.130.976
13	Branch, Derivaciones para todo el sistema	UND	14	$ 735.966,00	$ 10.303.524
14	Panel decorativos tipos cassettes 4 via y cassettes 1 via	UND	25	$ 1.105.650,00	$ 27.641.250
15	Termostato alambrico e inalambrico	UND	9	$ 633.906,00	$ 5.705.154
16	Suministro y carga de refrigerante R410a de todo el sistema (suministro y carga total) y nitrogeno	GL	1	$ 12.451.320,00	$ 12.451.320

17	Suministro e instalación ducteria retorno en lamina galvanizada, incluye aislamiento termico en yumbolom, soporteria y anclaje	Und	5	$ 3.123.590,00	$ 15.617.950
18	Suministro e instalacion del cableado de control Incluye: (Suministro, Instalacion de Cable 3x16 Blindado y Apantallado ,tuberia y accesorio de instalacion)	Mts	300	$ 66.099,00	$ 19.829.700
19	Mantenimiento condensadora sistema VRF	UND	6	$ 656.250,00	$ 3.937.500
				Total	**$ 154.656.594**

1. GARANTIA DEL EQUIPO:

2. FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-42	SUMINISTRO SILLAS ZONA DE PRENSA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 2.426,44	1,000	$ 2.426,44
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 2.426,44

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES NEGRO O SIMILAR	UND	1,00	$ 156.260,00	$ 156.260,00
		-		
			SUBTOTAL $	$ 156.260,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	20,0	$ 24.264,37
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 24.264,37
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 182.951,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 54.885,30
			TOTAL COSTO	$ 237.836,30

ESC3NARIOS
ARQUITECTÓNICOS

Armenia, 14 de junio de 2024

Señores
CM Ingenieria y Construcción S.A.S.
Santa Marta

COTIZACION: EA-074-24

Referencia: Silla sala de prensa

Estimados señores,
Me permito presentarle la cotización de los siguientes elementos:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SILLAS TANDEM ZONA DE PERIODISTAS. Fabricadas en Polipropileno de alta densidad. Perfileria soporte de sillas en tuberia agua negra de 40 x 80 en 2.5mm acabado en pintuta electroestatica. Viene en filas de 5 puestos.	UND	$ 770.000	$ 770.000
SUBTOTAL					$ 770.000
IVA 19%					$ 146.300
TOTAL					$ 916.300

CONDICIONES COMERCIALES:

GARANTIA :
3 AÑOS APLICANDO EL MANUAL DE MANTENIMIENTO.
COLORES
A CONVENIR
PLANIMETRIA:
N/A
DISEÑOS:
N/A

K.m 3.5 vía la tebaida, Centro Empresarial Santana B-2. Armenia, Quindío.
escenario.arquitectonico@gmail.com - arquiescenarios20@gmail.com
+57 3115356865

ESC3NARIOS
ARQUITECTÓNICOS

INSTALACION:
N/A
VALIDEZ DE LA OFERTA:
30 DIAS CALENDARIO.
FORMA DE PAGO:
60% ANTICIPO, Y SALDO CONTRA ENTREGA.
TIEMPO DE ENTREGA
A CONVENIR
SITIO DE ENTREGA :
PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, ESTADIO SIERRA NEVADA.

GREIS DE LA ROSA I.
GERENTE.

K.m 3.5 vía la tebaida, Centro Empresarial Santana B-2. Armenia, Quindio.

escenario.arquitectonico@gmail.com - arquiescenarios20@gmail.com

+57 3115356865

MOBISPORT

Bogotá 15 de junio de 2024

Señores
CM Construcciones y equipos S.A.S
A/A Ingeniero Alberto Cotes
Santa Marta

COTIZACION: 02-GR-MS-2024

Estimado Ingeniero
De acuerdo a su amable solicitud, me permito presentarle la cotización solicitada

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE SILLAS TIPO TANDEM PARA SALA DE ESPERA Sillas fabricadas en polipropileno de alto impacto, de 5 unidades cada tandem. Soporte en estructura metalica con acabado en pintura electroestatica.	UN	$ 840.000	$ 840.000
			SUB TOTAL		$ 840.000
			IVA		$ 159.600
			TOTAL		$ 999.600

CONDICIONES COMERCIALES:

GARANTIA : 3 AÑOS DE GARANTIA
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO: ANTICIPADO
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR
SITIO DE ENTREGA :

MS MobiSport S.A.S

E MAIL: msmobisport@gmail.com – gerencia@msmobisport.com
DIRECCIÓN: K.m 1.5 vía Parcelas de Cota, Centro Empresarial Oikos B34, Siberia.
TELÉFONO: + 57 321 4536107.

MOBISPORT

ESTADIO SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

ARQ. MAURICIO CAMARGO
Gerente

msmobisport@gmail.com

EQUIVER

CONSTRUCCION CAMPOS DEPORTIVOS Y OBRAS CIVILES

SUMINISTRO SILLAS SALA DE PRENSA		CM INGENIERIA
TIEMPO ESTIMADO:	A CONVENIR	15 DE JUNIO/2024

COTIZACIÓN: EQ-ES-055-24

OBRAS CIVILES					AREA M2:	
DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	VALOR TOTAL	
JUEGO DE SILLAS TIPO TANDEM DE CINCO PUESTOS, FAFRICADAS EN POLIPROPILENO. ESTRUCTURA EN TUBO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA.	1	1	$ 820.000	$ 820.000	$ 820.000	
SUB TOTAL						$ 820.000
IVA			19%			$ 155.800
VALOR TOTAL						$ 975.800

OBSERVACIONES: 3 AÑOS DE GARANTIA APLICANDO EL MANUAL DE MANTENIMIENTO.

FORMA DE PAGO: 60% DE ANTICIPO Y SALDO CONTRA ENTREGA

LUGAR DE INSTALACIÓN: SANTA MARTA ESTADIO SIERRA NEVADA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días calendario.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-43	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 2.549,22	1,000	$ 2.549,22
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 2.549,22

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
THINNER	GAL	0,20	$ 27.899,55	$ 5.579,91
PINTURA ANTICORROSIVA	GAL	0,10	$ 62.899,83	$ 6.289,98
DISCO DE CORTE DE METAL	UND	0,50	$ 3.899,63	$ 1.949,82
GRATA	UND	0,20	$ 15.030,00	$ 3.006,00
LIJA #80	UND	0,10	$ 2.000,00	$ 200,00
LIJA # 120	UND	0,10	$ 2.000,00	$ 200,00
LACA GRIS	GLN	0,12	$ 108.385,00	$ 13.006,20
BASE SOPORTE TUBO 3 X 1 1/2 CON ADAPT.	UND	0,08	$ 173.000,00	$ 13.840,00
			SUBTOTAL $	$ 44.071,91

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	40,00	$ 12.132,18
CUADRILLA CARPINTERIA	JOR	$ 534.400,00	40,00	$ 13.360,00
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 25.492,18
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 72.113,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 21.633,90
			TOTAL COSTO	$ 93.746,90

ACE ORZUMA

Cotizacion de Ventas

Numero - 51926
Fecha: 17-jun.-2024
Vencimiento: 17-jun.-2024

Original

Pagina 1 de 1

CONSORCIO SIERRA NEVADA
Atencion: CONSORCIO SIERRA NEVADA

Bga	Codigo	Descripcion	Cantidad	C.Dev	Valor Und	% Iva	Valor Total	Peso
CED	10014333	ANTICORROSIVO PREMIUM GRIS 507 GALON	3.00		52,857	19	158,571	14.40
CED	21002	THINNER CORRIENTE X GALON	3.00		23,445	19	70,336	6.00
CED	ABDZA0046045	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 3/64 ABRACOL	1.00		3,277	19	3,277	0.05
CED	KANCT458	GRATA COPA TRENZADA 4X5/8 KANGAROO	1.00		41,513	19	41,513	0.30
CED	RPHLC0080000	LIJA DE AGUA DE 80	1.00		1,681	19	1,681	0.01
CED	RPHLC0120000	LIJA DE AGUA DE 120	1.00		1,681	19	1,681	0.01

TOTAL PESO. 20.77 KG

Notas:

Subtotal	$ 277.059
	$ 0
Valor Neto	$ 277.059
Iva	$ 52.641
Total a Pagar	**$329.700**

Son: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS Y 00 / 100

Impresa por computador

Credito 30 días

Autorizó

Nombre Legible

Cedula

Fecha

Sello

www.aceorzuma.com

SURTIFERRETERIAS S.A.S
Nit: 800255589-2
DIRECCION: CALLE 11 No 11 - 50
PBX : 4216883

COTIZACION N. ODA 2138816

CLIENTE: CONSORCIO SIERRA NEVADA	ASESOR: KEVIN JOSE SANCHEZ SOTO
CONTACTO:	TEL ASESOR: 310 4855465
NIT/C.C: 901784656-3	EMAIL ASESOR: ventas4@surtiferretenas.com
DIRECCIÓN: CL 24 3 99 OF 1310 ED BANCO DE BOGOTA SANTA MARTA	COND. DE PAGO: Contado
TELÉFONO: 6054252540 E-MAIL: 901784656@recepcionfacturas.co	FECHA DE ELABORACION: 17/6/24

CODIGO	ITEMS	CANT.	U.M	ALMACEN	PRECIO UNIT SIN IVA	IVA	PRECIO UNIT CON IVA	TOTAL CON IVA
2849	ITALSOLVEN L05 CORRIENTE	12	LIT	003	7.339	19 %	8.733	104.801
6328	LIJA No 120 ABRACOL	1	UND	003	1.734	19 %	2.063	2.063
6327	LIJA No 80 ABRACOL	1	UND	003	1.892	19 %	2.251	2.251
2016	ANTICORROSIVO GRIS 507 GALON	3	GAL	003	68.791	19 %	81.861	245.584
4767	GRATA COPA LISA 3 75MMX5/8 LEON 204-234	1	UND	003	12.630	19 %	15.030	15.030
583	DISCO FLAT 41/2X7/8 G-80 ABRACOL 2707	3	UND	003	10.857	19 %	12.920	38.760
4385	DISCO ABRASIVO 4X3/64 C/MET ABRAC 46045	1	UND	003	3.343	19 %	3.978	3.978

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Sujeto a cambio de precio

Observaciones:

-LOS PRECIOS INCLUIDOS EN ESTA COTIZACION PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS CANTIDADES COTIZADAS
-LA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS ESTARA SUJETA A LAS EXISTENCIAS EN ALMACEN AL MOMENTO DE LA VENTA

-AUTORRETENEDORES del ICA Acdo 014 del 14 Dic 2012 y AUTORETENEDORES RENTA Res 007712 del 14/06/12

Visitanos en nuestra pagina web www.surtiferretarias.com

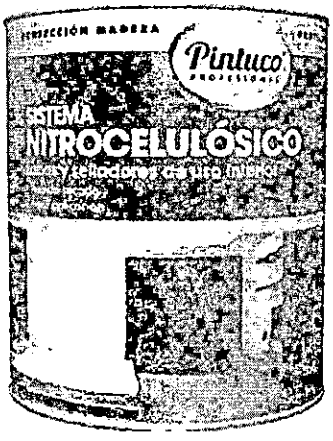
TOTAL BRUTO	$	346.612
DESCUENTOS	$	
SUB-TOTAL	$	346.612
VALOR IVA	$	65.856
TOTAL	$	412.468

mercado libre

Categorías Ofertas Historial Supermercado Moda Vender Ayuda POR

Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

Publicación pausada



Tipo Pintulaca Color Tranp. Brillante 1 Galón Pintuco H.c.

$ 108.385

en 48x $ 2.258


Publicación pausada

Vendido por DA UNCLIC

+500

HOMECENTER

Mi Cuenta



Pintulux Aluminio Brillante 1 Galón

$121.900und

Especificaciones principales

- Tipo: Esmaltes
- Garantía: 1 Año
- Acabado pintura: Brillante
- Aromático: Si
- Aplicación: Exterior

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	Esmaltes
Acabado pintura	Brillante
Aromático	Si
Aplicación	Exterior

Satisfacción Garantizada

Opciones de entrega

ALUMIX S.A.S
NIT 901.068.047-2
CALLE 18 No 13-02
Tel (5) 4363567 - Ext. 1
Santa Marta - Colombia

Cotización
No. C-1-1803

Para	CONSORCIO SIERRA NEVADA
Nit	901.784.656-3
Contacto	CONSORCIO SIERRA NEVADA
Dirección	CALLE 24 No 3-99 OF 1310 ED BANCO DE BOGOTA
Ciudad/Tel.	Santa Marta / (605) 6054252540 - Ext. 000 - (000) 0000000
Fecha	2024-06-20

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes productos :

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	E2102-01	TUBO 3 X 1 1/2 CON ADAPT NATURAL	4.00	123,997.60	19 %	590,228.58
				Total Bruto		495,990.40
				Subtotal		495,990.40
				IVA 19%		94,238.18
				Total a Pagar		590,228.58

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cuenta Corriente No. 77977986805 BANCOLOMBIA

Precios sujetos a cambios.

Cotización valida por 15 días a partir de su fecha de creación.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-44	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 1.617,62	1,000	$ 1.617,62
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 1.617,62

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO	KG	9,00	$ 950,00	$ 8.550,00
AGUA	LTS	5,00	$ 150,00	$ 750,00
ARENA	M3	0,040	$ 35.800,00	$ 1.432,00
			SUBTOTAL $	$ 10.732,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	30,00	$ 16.176,24
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 16.176,24
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.526,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 8.557,80
			TOTAL COSTO	$ 37.083,80

TRITUPISUAR LTDA.
NIT. 819.001.602 - 1

Santa Marta DTCH, 14 de junio de 2024

COTIZACIÓN

A:

CONSORCIO SIERRA NEVADA
NIT 901.784.656-3

En atención a su solicitud nos permitimos poner a su disposición nuestros servicios y productos:

CANTIDAD	MEDIDA	MATERIAL	VALOR M3	VALOR TOTAL
1	M3	TRITURADO	$86.000=	$86.000=
1	M3	BASE GRANULAR	$43.000=	$43.000=
1	M3	SUB BASE GRANULAR	$35.000=	$35.000=

Nota: Precios de venta en las instalaciones de la cantera Incluido IVA, No incluye transporte.

Atentamente,

DORIS P. VARGAS PINZÓN
Gerente

NIt. 901097181 - 1

TRANSPORTES DYLAM SAS
NIT: 901097181-1

14 de junio de 2024, Santa Marta DTCH

COTIZACIÓN

En atención a la solicitud realizada por CONSORCIO SIERRA NEVADA identificado con el NIT. 901.784.656-3, nos permitimos compartir la siguiente lista de precios.

MATERIAL	VALOR M3	UNIDAD
GRAVA	$ 92.000	M3
BASE GRANULAR	$ 45.000	M3

Atentamente,

VERONICA CORREA
Representante Legal

Cra. 26 A Nº 18-35
transportesdylamsa@outlook.com
celular 3153145471

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACUZZI PARA CUARTO HUMEDO EN CAMENIROS	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 74.659,59	1,000	$ 74.659,59
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 74.659,59

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HIDROAERO SPA GALAPAGO BLANCO-M15KW (MANTENEDOR DE 15)	UND	1,00	$ 49.479.612,14	$ 49.479.612,14
			SUBTOTAL $	$ 49.479.612,14

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	0,65	$ 746.595,88
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 746.595,88
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 50.300.868,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 15.090.260,40
			TOTAL COSTO	$ 65.391.128,40

NIT 890.327.494-6

FORMATO DE COTIZACIÓN Y/O PEDIDO BAÑOS, COCINAS Y ROPAS

F-V-29 | V.44 | 1/1 | Año: 2024

FECHA :	18/6/2024	RAZON SOCIAL :	CONSORCIO SIERRA NEVADA			
NIT/C.C.	901744858-3	CLIENTE FINAL				
DIREC. PRODUCTO	ESTADIO SIERRA NEVADA	CIUDAD PROD.	SANTA MARTA	TEL.	6054252540	
DIREC. FACTURA	CALLE 24 B 2 -99 OFC. 1319, EDIFICIO BANCO BOGOTA	CIUDAD FACT.	SANTA MARTA	TEL.	6054252540	
CONTACTOS DEL CLIENTE (POR FAVOR INGRESAR EL NOMBRE Y CELULAR DE CADA CARGO)						
VENTAS/COMPRAS	LCERIS MARIA QUINTERO MONTENEGRO	TEL / CEL:	6054252540			
LOGISTICO		TEL / CEL:				
TESORERIA		TEL / CEL:				
FACTURA ELECTR.	jefecomercial@construccion.com	E-MAIL				
EMAIL CONTACTO						
CIERRE FACTURACION?	N/A	Marco Si indique DD/MM/AA	30/6/2024	OC/COT		
ES UNA MUESTRA?	NO	LISTA DE PRECIOS		SUBGRUPO CLIENT	Distribuidores Nacionales	
DIRECCION PARA ENVIO DE FACTURA (marque con una X)		OFICINA			PVP Incl. IVA	
SERVICIO DE SUBIDA DE HIDROMASAJE (marque con una X)		SI		TIENDA	NO	
PISO	1	MEDIO (marque con una X)	ASCENSOR	No Aplica	ESCALERAS	No Aplica
VERIFICACION PREVIA POR PARTE DE PERSONAL FIRPLAK (marque con una X)		SI		No Aplica	NO	

REFERENCIA SAP	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DTO	VALOR TOTAL
					0
[illegible]	1	HIDROAERO SPA GALAPAGO BLANCO-M15KW (MANTENEDOR DE 15)	43,767,900	5.00%	83,159,010

FORMA DE PAGO	CONTADO ANTICIPADO	SUBTOTAL 83,159,010
Favor consignar en BANCOLOMBIA (Corriente) 00622740431 Recaudo 34368 o Banco Bogotá (Corriente) 406-007-252 cod Recaudo 008617 y dar aviso al fax (42817607 o al email cartera@firplak.com con copia a su asesor		IVA 19% 15,800,212
		GRAN TOTAL 98,959,222

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

PLANOS PARA HIDROMASAJES

REFERENCIA SAP	CANT	DESCRIPCION	POSICION DE FALDÓN

Fecha de entrega:	LO MAS PRONTO
Fecha mínima requerida por comercial/cliente	
Tipo de facturación	Espera cumplido total

NOTAS: GARANTIA DEL JACUZZI 5 AÑOS, PARTE ELECTRICA 1 AÑO,SE ENTREGA EN PRIMER PISO DE LA OBRA CON MADERA TECA, SPA ,CAPACIDAD 8 P
SISTEMA DE HIDROAEROMASAJE, CROMO 7 LUCES 8 COLORES, BASE AUTOPORTANTE,FILTRO DESNATADOR,SISTEMA DE OZONO, PANEL DIGITAL, 220 TRIFASICA, CIRCUITO INDEPENDIENTE MANTENEDOR CALENTADOR 15 KW .NO INCLUYE VIATICOS DE INSTALACION

Con la firma o aceptación de este documento (vía e-mail), usted nos autoriza para tratar sus datos personales de acuerdo con la *Ley Colombiana 1581 de 2012 "Protección de Datos Personales"* y con nuestra política de tratamiento de datos personales. Conozca esta política y los mecanismos para ejercer sus derechos en [illegible]

ACEPTADO :		ASESOR :	EDUARDO NARVAÉZ ARÍZA
CC./NIT No.		Contacto :	CEL. 3166945015

COTIZACIÓN

Fecha: 6/6/2024

Oficina de Ventas: 1420 - Santa Marta

DECORCERAMICA

GRUPO DECOR NIT: 800165377-1

DATOS DEL CLIENTE	C M CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS	9004847284	DATOS DEL LIDER COMERCIAL	ANA KARINA MEJIA FERRER
	Teléfono	3203489315	CELULAR	3107027604

Artículo	Descripción	Almacén	Cantidad	Und.Venta	Mts./Und.	Precio Lista	% Dcto.	Precio Neto	Total neto
VHPT05	HIDROAERO SPA GALAPAGO BLANCO-M15KW (MAN	Cedi Nacional VM	2	UN	2	$ 41,579,506	-	$ 41,579,506.00	$ 83,159,012
							-	$ -	$ -
							-	$ -	$ -
							-	$ -	$ -
							-	$ -	$ -
							-	$ -	$ -

Volumen Total: 1,608 KGR

Subtotal	$	83,159,012
Descuento	$	-
Flete	$	-
Total neto	$	83,159,012
Impuesto	$	15,800,212
TOTAL	$	98,959,224

OBSERVACIONES:

DESPUÉS DE RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA SE ENVÍA A FABRICAR PARA ENTREGA DE 25 A 30 DÍAS HÁBILES

FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES COMERCIALES

Los terminos de esta cotización se manejará según las condiciones descritas en el artículo 851 del código de comercio. Disponibilidad de productos puede variar hasta el momento de compra. Tiempos de entrega acordes a bodega de origen del producto y condiciones de distribución. Los productos calificados como calidad comercial o calidad segunda (2A) no tendrán lugar a cambios, devoluciones ni garantía. Productos en liquidación y/o promoción no se aceptan devoluciones.

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE A NOMBRE DE GRUPO DECOR S.A.S. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 7714 16 Dic. 1996. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 0121 DE AGOSTO DE 1995. AUTORETENEDORES IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO CALI - RESOLUCIÓN No. 1180 DE MAYO 30/2007.

*ALTERNATIVA DE PRODUCTO. NO SUMA AL VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN.

ROSA MATILDE GOMEZ
Directora CR Santa Marta
AV. FERROCARIL 26B-12
Cel: 3218086509

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-46	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 1.617,62	1,000	$ 1.617,62
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 1.617,62

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	30,00	$ 16.176,24
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 16.176,24
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.794,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 5.338,20
			TOTAL COSTO	$ 23.132,20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-47	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 1.617,62	1,000	$ 1.617,62
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 1.617,62

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS	KG	24,50	$ 950,00	$ 23.275,00
AGUA	LTS	25,50	$ 150,00	$ 3.825,00
ARENA	M3	0,03	$ 35.800,00	$ 1.002,40
GRAVA	M3	0,04	$ 86.000,00	$ 3.612,00
			SUBTOTAL $	$ 31.714,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	30,00	$ 16.176,24
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 16.176,24
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 49.508,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 14.852,40
			TOTAL COSTO	$ 64.360,40

TRITUPISVAR LTDA.
NIT. 819.001.602 - 1

Santa Marta DTCH, 14 de junio de 2024

COTIZACIÓN

A:

CONSORCIO SIERRA NEVADA
NIT 901.784.656-3

En atención a su solicitud nos permitimos poner a su disposición nuestros servicios y productos:

CANTIDAD	MEDIDA	MATERIAL	VALOR M3	VALOR TOTAL
1	M3	TRITURADO	$86.000=	$86.000=
1	M3	BASE GRANULAR	$43.000=	$43.000=
1	M3	SUB BASE GRANULAR	$35.000=	$35.000=

Nota: Precios de venta en las instalaciones de la cantera Incluido IVA, No incluye transporte.

Atentamente,

DORIS P. VARGAS PINZÓN
Gerente

Nit. 901097181 - 1

TRANSPORTES DYLAM SAS
NIT: 901097181-1

14 de junio de 2024, Santa Marta DTCH

COTIZACIÓN

En atención a la solicitud realizada por CONSORCIO SIERRA NEVADA identificado con el NIT. 901.784.656-3, nos permitimos compartir la siguiente lista de precios.

MATERIAL	VALOR M3	UNIDAD
GRAVA	$ 92.000	M3
BASE GRANULAR	$ 45.000	M3

Atentamente,

VERONICA CORREA
Representante Legal

Cra. 26 A Nº 18-35
transportesdylamsa@outlook.com
celular 3153145471

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-48	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 485,29	1,000	$ 485,29
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 485,29

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SELLASIL SOPORTE 1/4 6MM X ML	ML	1,20	$ 799,68	$ 959,62
VULKEM 45 GRIS SSL CARTUCHO X 890 CC	UND	0,02	$ 161.793,59	$ 3.235,87
DISCO CONTINUO DIAMANTADO 4 1/2	UND	0,02	$ 23.899,96	$ 478,00
			SUBTOTAL $	$ 4.673,49

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	100,00	$ 4.852,87
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 4.852,87
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.012,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 3.003,60
			TOTAL COSTO	$ 13.015,60

ACE ORZUMA

Cotizacion de Ventas

Número: 51982
Fecha: 20-jun.-2024
Vencimiento: 20-jun.-2024

Original

CONSORCIO SIERRA NEVADA

Remisión:

Bga	Código	Descripcion	Cantidad	C.Dev	Valor Und	% Iva	Valor Total	Peso
CED	1274	BROCHA CERDA CHINA MONA 3" GOYA LINEA PROFESIONAL	1.00		11,681	19	11,681	0.01
CED	2130424	BISTURI VIGOR METALICO	1.00		5,798	19	5,798	0.09
CED	445712A333	VULKEM 45 GRIS SSL CARTUCHO X 890 CC	1.00		135,961	19	135,961	1.00
CED	PCPTMK10613610	EUCOPLUS 1000 GRIS X 38KG	1.00		208,581	19	208,581	36.00
CED	SEDIDCH00047	DISCO CONTINUO DIAMANTADO 4 1/2 ABRACOL	1.00		20,084	19	20,084	0.20
CED	TLCPIPM106895	EUCOFELT PLUS ROLLO X 100ML	1.00		242,550	19	242,550	0.10
CED	TLCPJSM106924	SELLASIL SOPORTE 1/4 6MM X ML	1.00		672	19	672	0.00

TOTAL PESO. 37.40 KG

Notas:

Subtotal	$ 625,327
	$ 0
Valor Neto	$ 625,327
Iva	$ 118,812
Total a Pagar	**$744,139**

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100

Impresa por computador

Credito 30 días

Autorizó

Nombre Legible

Cedula

Fecha

Sello

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 808,81	1,000	$ 808,81
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 808,81

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
EUCOFELT PLUS ROLLO X 100ML	UND	0,010	$ 288.634,50	$ 2.886,35
EUCOPLUS 1000 GRIS X 36KG	UND	0,03	$ 248.211,39	$ 7.446,34
BROCHA 3"	UND	0,05	$ 13.900,39	$ 625,52
BISTURI	UND	0,03	$ 6.899,62	$ 206,99
			SUBTOTAL $	$ 11.165,19

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA OC 1:4	JOR	$ 485.287,32	60,00	$ 8.088,12
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 8.088,12
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 20.062,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 6.018,60
			TOTAL COSTO	$ 26.080,60

ACE ORZUMA

Cotizacion de Ventas

Número - 51982
Fecha 20-jun.-2024
Vencimiento 20-jun.-2024

Original

CONSORCIO SIERRA NEVADA
Atención: CONSORCIO SIERRA NEVADA

Bga	Código	Descripcion	Cantidad	C.Dev	Valor Und	% Iva	Valor Total	Peso
CED	1274	BROCHA CERDA CHINA MONA 3" GOYA LINEA PROFESIONAL	1.00		11,681	19	11,681	0.01
CED	2130424	BISTURI VIGOR METALICO	1.00		5,798	19	5,798	0.09
CED	445712A333	VULKEM 45 GRIS SSL CARTUCHO X 890 CC	1.00		135,961	19	135,961	1.00
CED	PCPTMK10613610	EUCOPLUS 1000 GRIS X 36KG	1.00		208,581	19	208,581	36.00
CED	SEDIDCH00047	DISCO CONTINUO DIAMANTADO 4 1/2 ABRACOL	1.00		20,084	19	20,084	0.20
CED	TLCPIPM106895	EUCOFELT PLUS ROLLO X 100ML	1.00		242,550	19	242,550	0.10
CED	TLCPJSM106924	SELLASIL SOPORTE 1/4 6MM X ML	1.00		672	19	672	0.00

TOTAL PESO: 37,40 KG

Notas:

Subtotal	$ 625,327
	$ 0
Valor Neto	$ 625,327
Iva	$ 118,812
Total a Pagar	**$744,139**

Autorizo

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100

Impresa por computador

Credito 30 días

Nombre Legible

Cedula

Fecha

Sello

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 001 DE 2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP-50	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLB	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES		$ 659.563,19	1,000	$ 659.563,19
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
			SUBTOTAL $	$ 659.563,19

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TABLERO CON DOS (2) VDF, MANIOBRA INOMAX.	UND	1,00	$ 16.300.000,00	$ 16.300.000,00
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN – INDUSTRIAL 0..16	UND	1,00	$ 1.070.000,00	$ 1.070.000,00
TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN – SCHD 10, CON ACCESORIOS, SOPORTES Y BRIDAS VAN STONE, PARA, CONEXIÓN A LA RED DE AGUA DEL ESTADIO.	UND	1,00	$ 2.240.000,00	$ 2.240.000,00
TANQUE HIDRO ACUMULADOR, CAPACIDAD 200 LITROS – VERTICAL., INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 4.519.000,00	$ 4.519.000,00
MANOMETRO CON GLICERINA	UND	1,00	$ 116.000,00	$ 116.000,00
RODAMIENTOS	UND	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000,00
TARROS DESPLAZANTE DE HUMEDAD	UND	4,00	$ 85.000,00	$ 340.000,00
EMPAQUES O ANILLOS "O"	UND	4,00	$ 31.000,00	$ 124.000,00
SELLOS MECÁNICOS	UND	4,00	$ 137.000,00	$ 548.000,00
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS 3EN1	UND	1,00	$ 122.000,00	$ 122.000,00
TUBERÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDA, DESDE, TABLERO A BORNERA DE MOTORES.	GLB	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00
LIMPIEZA DE TUBERIAS, TANQUE HIDRO ACUMULADOR, PINTURA CON ANTI CORROSIVO Y ACABADO FINAL EN VINILO	GLB	1,00	$ 810.000,00	$ 810.000,00
			SUBTOTAL $	$ 28.699.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	M3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PROFESIONALES	JOR	$ 485.287,32	0,125	$ 3.882.298,56
PROFESIONAL HIDRAULICO	JOR	$ 339.166,67	0,125	$ 2.713.333,33
			SUBTOTAL $	$ 6.595.631,89
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.954.195,00
			TOTAL A.I.U. (30%)	$ 10.786.258,50
			TOTAL COSTO	$ 46.740.453,50

Junio 06 de 2024.

De.- MAURICIO GARCIA SERRANO SAS.

Atn.- Sr. MAURICIO GARCIA SERRANO.

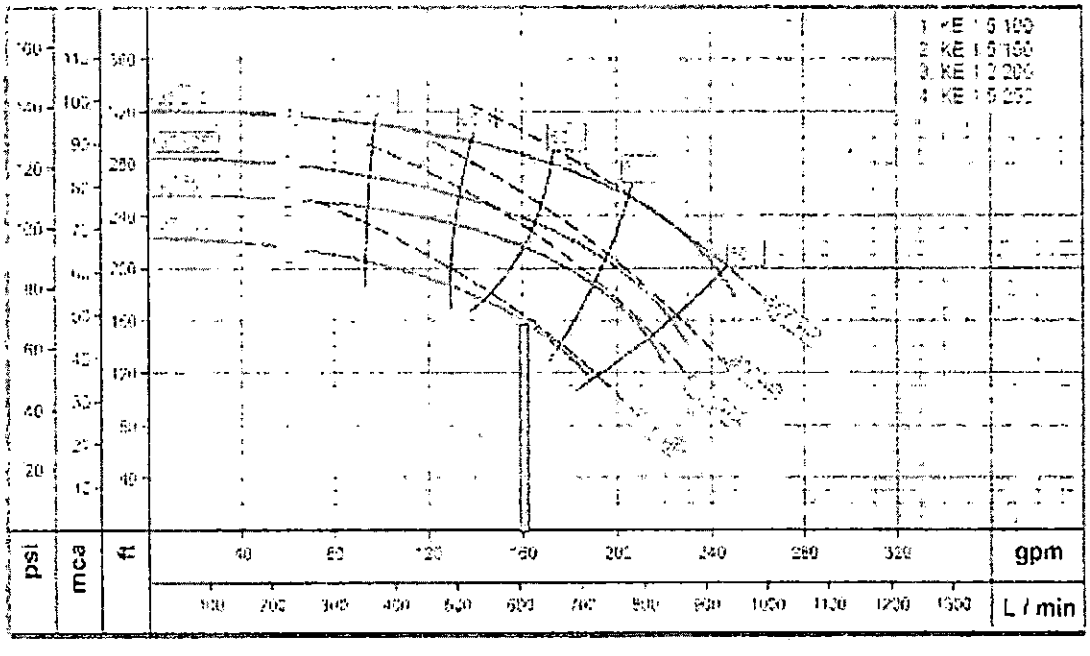
Para.- Ing. Juan H. Fernández.

Asunto: Informe técnico – Visita estadio SIERRA NEVADA.

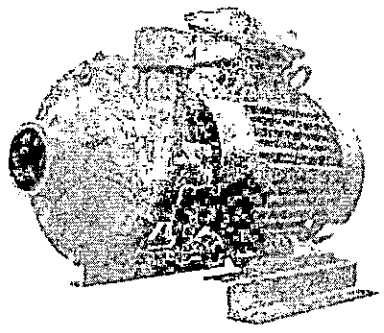
SISTEMA (S) DE PRESION:

Encontramos dos (2) equipos pre ensamblados, los dos (2) equipos con las mismas características:

Fabricante	BARNES DE COLOMBIA	Modelo bombas	HE 1.5 10
Potencia	10 hp	Velocidad nominal	3600 rpm



TDH	50 m.c.a.	Caudal	160 gpm



Tienen instalado un (1) solo tablero, compuesto, por:

- Uno (1). Cofre metalico.
- Uno (1). Breaker principal.
- Dos (2). Variadores de frecuencia.
- Lámparas de señalización.
- Conmutables.

Todo el sistema está armado con maniobre WEG de origen BRASIL.

No vemos por ningún lado el segundo tablero, "PARA" el segundo equipo de presión.

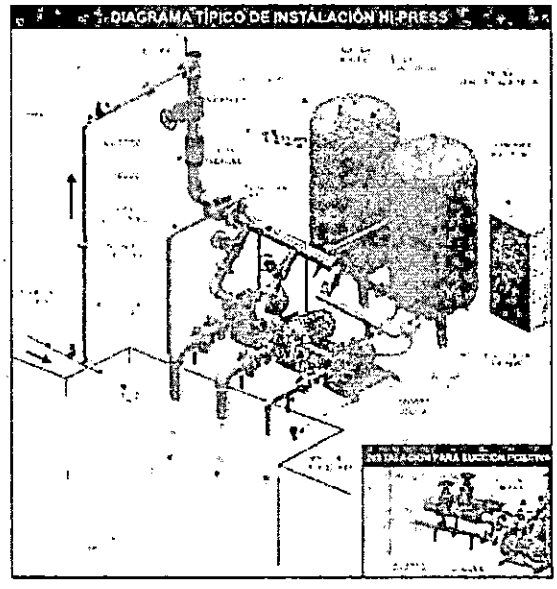
PARECIERA QUE LA IDEA ES UN SOLO TABLERO PARA LOS DOS EQUIPOS. Los dos (2) sistemas de presión se alternan de manera manual.

Técnicamente cada equipo debe llevar su tablero con VDF por bomba.

Los dos (2) sistemas de presión bombean a una misma tubería. Simplemente con la apertura de una válvula mariposa (que se encuentra instalada entre las tuberías de descarga de los dos sistemas), se puede operar el sistema de presión que uno desee.

Además, la instalación eléctrica que va desde el tablero hasta las borneras de conexión de los motores indican esto.

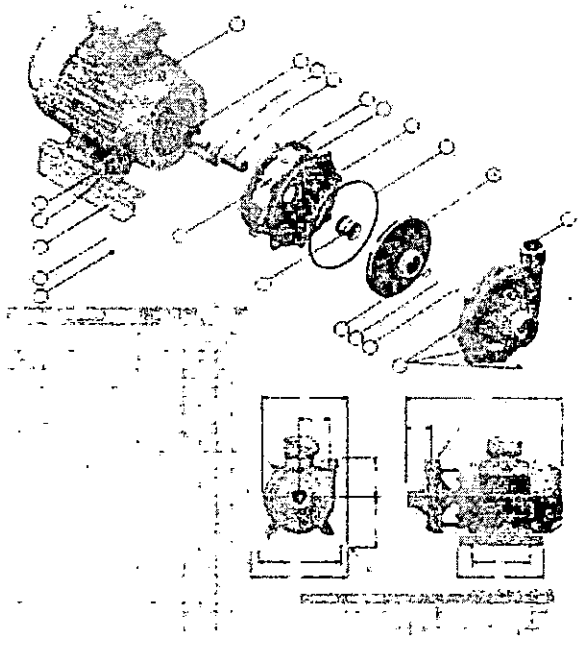
Encontramos un tanque hidro acumulador de 200 litros con membrana. Debería se un tanque por cada sistema de presión.



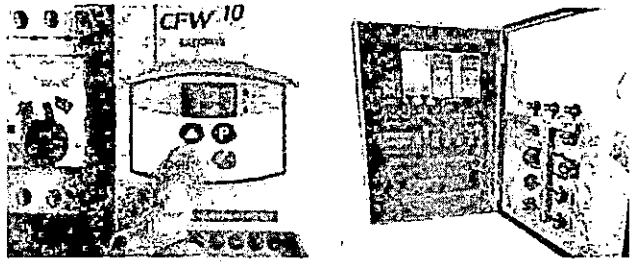
Pasando al tema que les interesa, para, dejar este sistema en estado operativo, se debe empezar, por:

BOMBAS. -

- Revision de los motores eléctricos. Pareciera por el estado de las cosas que el cuarto se inundó, las bombas (motores eléctricos) quedaron debajo del agua. Si al destapar los motores vemos que no están quemados, se realiza un procedimiento de limpieza, en lacado, humectación, con esto, logramos recuperar la rigidez dieléctrica de los motores.
- Suministro y cambio de rodamientos. Esto sí o sí se debe hacer.
- En caso que uno o más motores estén quemados se deben llevar a rebobinar o comprarlos nuevos.

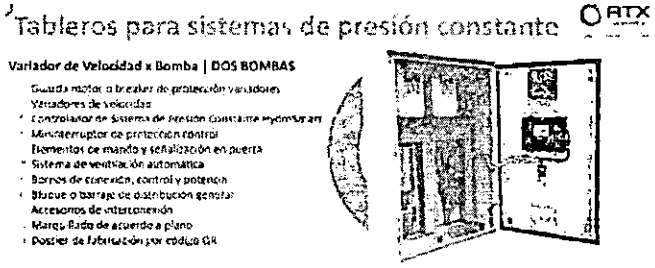


TABLERO. –



- Rogar que el agua no hubiera alcanzado los variadores de frecuencia o algún elemento electrónico del mismo.
- Revisar internamente para verificar que la (s) tarjeta (s).
- Limpiar con limpiador de partes electrónicas.
- Limpiar Breaker y contactos de los elementos mecánicos.
- Después de todo este proceso encender el sistema.
- No creo que existan problemas con la programación de los variadores. Esta programación no se cambia sola.

Recomendamos instalar un tablero por sistema de bombeo. Ya existe uno, se debe, adquirir otro.





Transductor de presión

Industrial, 0-16 Bar, 1/4 NPT

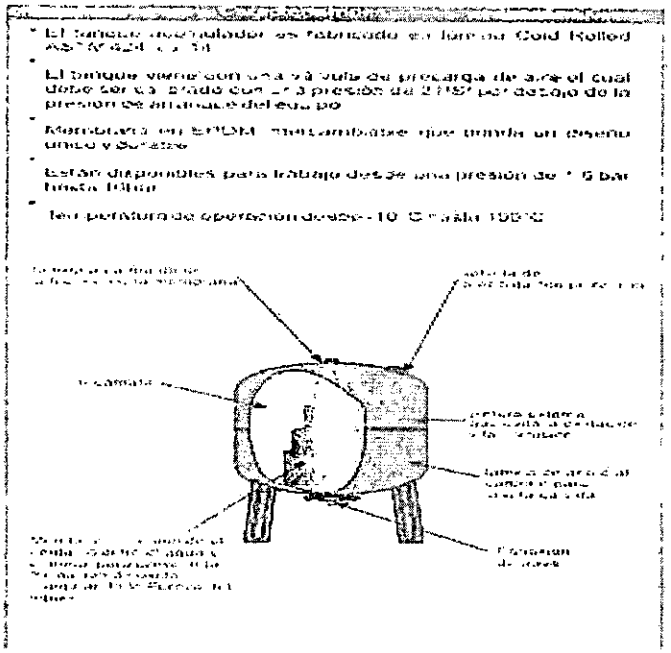
Qx	*Und*	*Descripcion*	*V. Unitario*	*V. Total*
1	Und	Tablero con dos (2) VDF, maniobra INOMAX.		$ 16.303.000.00
1	Unds	Transductor de presión – industrial 0..16 bares.		$ 1.071.000.00
1	Unds	Tubería en acero al carbón – SCHD 10, con accesorios, soportes y bridas VAN STONE, para, conexión a la red de agua del estadio.		$ 2.249.999.00
1	Unds	Servicio técnico		$ 2.874.999.00
TOTAL – INCLUIDO IVA				***$ 22.498.998.00***

La acometida eléctrica para energizar este tablero la coloca la empresa contratante.

TANQUE:

- Con una prueba sencilla confirmamos que tiene la pre carga de aire. Es solo calibra la pre carga como indican los diseñadores de estos sistemas.
- El tanque ya está en estado de deterioro. La pintura se está soplando por acción de la corrosión.
- Técnicamente el segundo equipo de presión debe llevar un tanque hidro acumulador.

Qx	*Und*	*Descripcion*	*V. Unitario*	*V. Total*
1	Und	Tanque hidro acumulador, capacidad 200 litros – vertical.		$ 3.671.249.00
1	Unds	Materiales para instalación		$ 849.999.00
1	Und	Manometro con glicerina .		$ 116.250.00
1	Unds	Servicio técnico		$ 724.999.00
TOTAL – INCLUIDO IVA				***$ 5.362.497.00***



TUBERIA DE DESCARGA A LA RED HIDRAULICA:

- Recomendamos cambiar (dentro del cuarto de bombas) a tubería metálica.

SUCCION BOMBAS:

- Debemos mirar dentro del tanque si tiene cada tubo de succion su respectiva válvula de pie.
- Verificar si tenemos un control de nivel para evitar el trabajo es seco de las bombas.

Al revisar dentro del tanque de almacenamiento de agua podemos encontrar situaciones como: Valvulas de pie dañadas o que no estén instaladas, control de nivel dañado o que no este instalado. En este informe no incluimos nada sobre este tema.

*IMPORTANTE:

Ver porque ese cuarto se está inundando para corregir el problema.

Limpieza general con grata metálica de toda las tuberías y partes metálicas.

Pintar con anti corrosivo y acabado final en vinilo.

Qx	*Und*	*Descripcion*	*V. Unitario*	*V. Total*
8	Und	Rodamientos	$ 95.000.00	$ 760.000.00
4	Unds	Tarros desplazante de humedad	$ 85.000.00	$ 340.000.00
4	Unds	Empaques o anillos "O"	$ 31.250.00	$ 125.000.00
4	Unds	Sellos mecánicos	$ 137.500.00	$ 550.000.00
8.511	Und	Limpiador de contactos electrónicos 3en1		$ 122.000.00
1	Und	Revision tablero con variadores		$ 938.000.00
1	Und	Cambio de tubería eléctrica y acometida, desde, tablero a bornera de motores.		$ 1.750.000.00
1	Und	Limpieza de tuberías, tanque hidro acumulador, pintura con anti corrosivo y acabado final en vinilo		$ 812.000.00
1	Und	Servicio técnico		$ 3.113.000.00
TOTAL – INCLUIDO IVA				$ 8.510.000.00

*Este valor no incluye:

Rebobinado de motores.

Cambio de variadores de frecuencia.

Suministro de cualquier elemento que después de la revisión determinemos que se debe cambiar en el tablero.

Condiciones comerciales:

Forma de pago. -

- A convenir.

Tiempo de ejecución. -

- Dos días.

Tiempo para consecución de materiales. –

- Tanque: Cinco días.

Los precios incluyen IVA y tienen una validez de treinta (30) días.

Atte.-

MAURICIO GARCIA SERRANO SAS.

MAURICIO GARCIA SERRANO.

Gerente.

MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
1.1		1.660,00			1.660,00
	SUBTOTAL				1.660,00

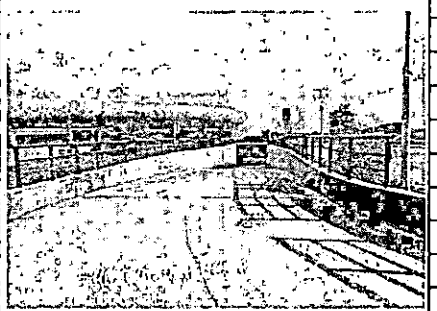
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
4.1	 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS Y DIVISIÓN DE GRADERÍA EN TUBO HR Ø3" MAS PLATINA METALICA DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE + ACCESORIOS DE ANCLAJE Y SOPORTES. (SUMINISTRO E INSTALACION)		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
855,83				855,83
		SUBTOTAL		855,83

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
5.1				20,00	20;00
SUBTOTAL					20,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS TIPO DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
5.2					30,00	30,00
		SUBTOTAL				30,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
5.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CON ABERTURA PARA ESTUFA Y LAVAPLATOS, CON DIMENSIONES INTERNAS DE 35 X 40 CMS.		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
40,00				40,00
SUBTOTAL				40,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

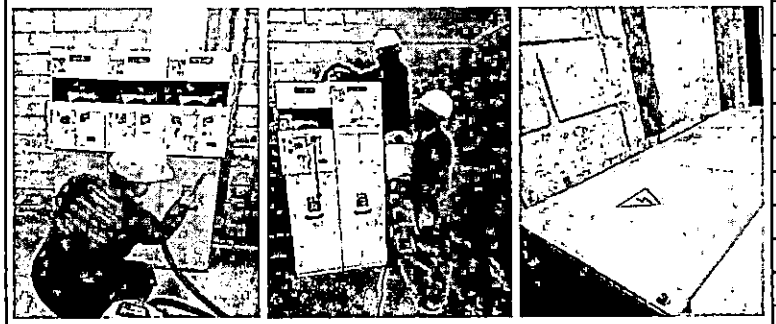
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SECCIONADOR BAJO CARGA	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.2					2,00	2,00
				SUBTOTAL		2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SUBESTACION 1, 800 KVA1322/480	UND	UN
6.3	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

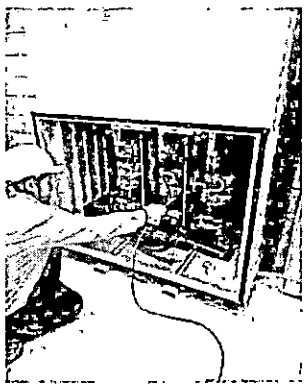
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO SUBESTACION 2, 225 KVA 13200/480	UND	UN
6.4	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

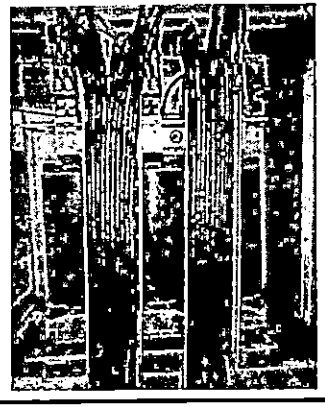
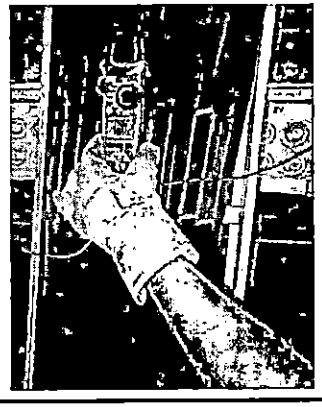
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra
Vo.Bo. Firma DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR BAJA BAJA 275 KVA 220/480 V	UND	UN
6.5	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PUESTA EN SERVICIO TRANSFORMADOR ELEVADOR BAJA BAJA 75 KVA 220/480 V	UND	UN
6.6				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.7		ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 800 KVA 13200/480		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

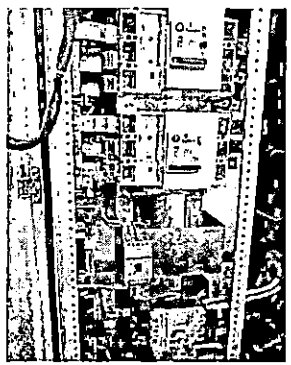
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR SUBESTACION 1	UND	UN
6.8	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

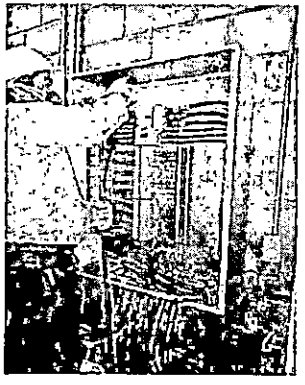
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN
6.9	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			2,00	2,00
		SUBTOTAL		2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

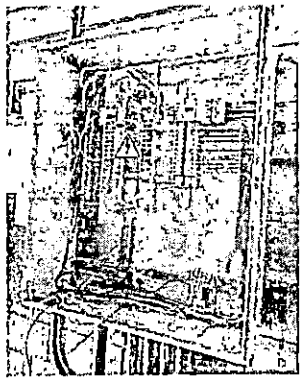
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

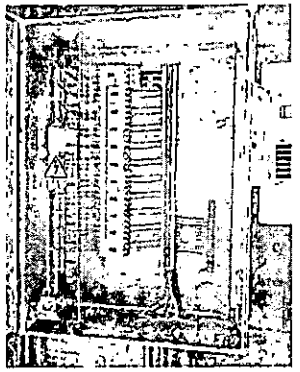
MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACIONES CANCHA TIC2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

6.10





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACIONES CANCHA TIC2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.11					2,00	2,00
		SUBTOTAL				2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

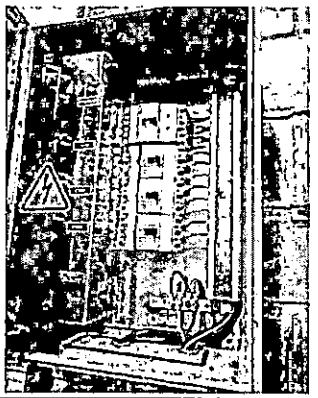
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.12		ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION RED REGULADA TIC R2 1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 480V		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.13					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 72 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.14					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 82 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.15				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 32 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

6.16	 	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 42 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.17				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

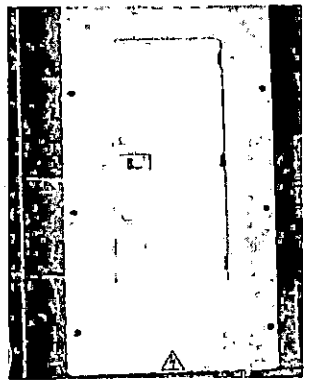
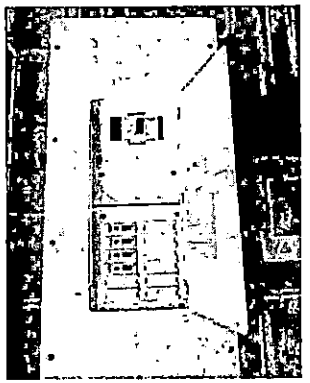
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 52 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN
6.18	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

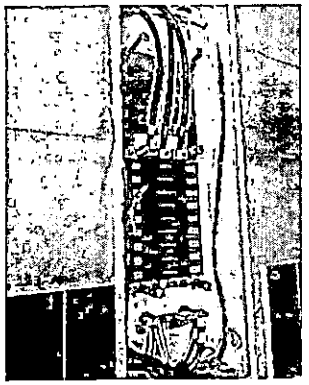
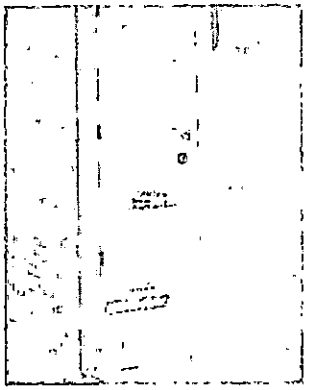
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.19	 	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION T 62 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.20					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR2			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.21					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR3	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.22				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR4	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.23				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR5	UND	ML
6.24				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR6	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.25				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

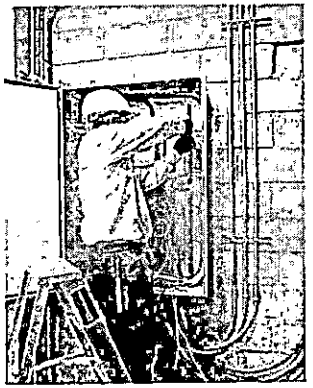
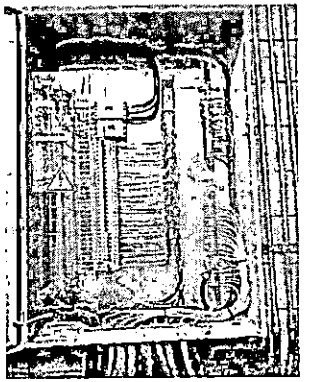
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.26	 	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 12 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 22 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.27				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

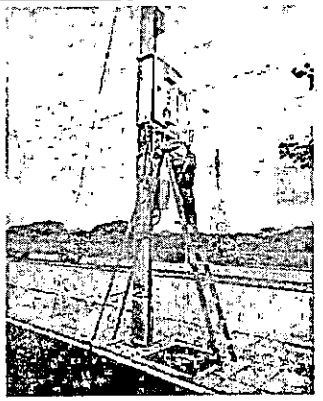
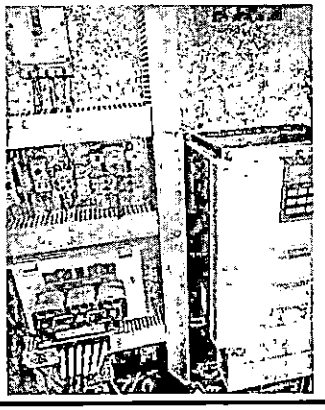
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUA POTABLE TBPAP	UND	UN
6.28	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

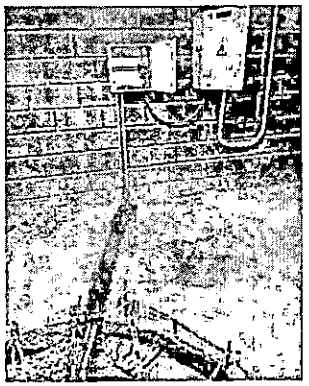
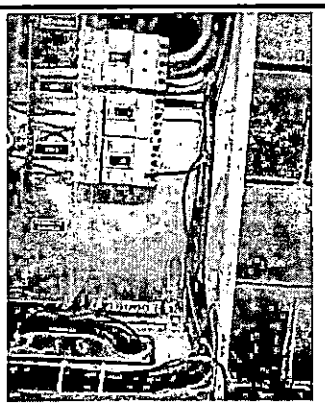
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.29	 	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE BOMBAS DE PRESION DE AGUAS NEGRAS TBPAP		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 1 TG1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN
6.30				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

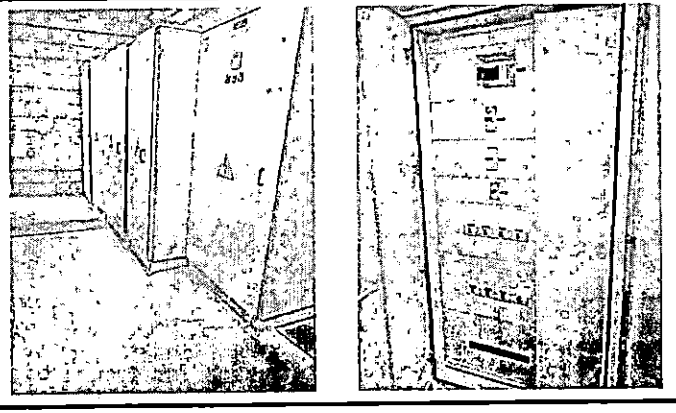
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL SUBESTACION 2 TG1 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN
6.31				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL TRANSFORMADOR ELEVADOR SUBESTACION 2	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.32				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION T 11 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.33				1,00	1,00
		SUBTOTAL			1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE SALIDAS ELECTRICAS TOMACORRIENTES E ILUMINACION TIC SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.34				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

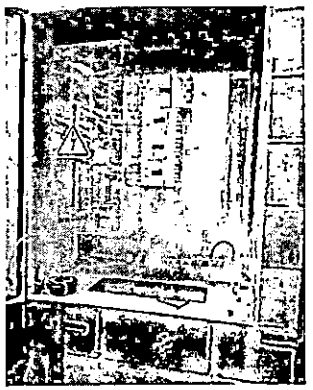
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION RED REGULADA TIC R1	UND	UN
6.35	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO TABLERO RED REGULADA TR1 LADO ORIENTAL	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.36				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
6.37	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA PARA TRAFO TRANSFERENCIA Y PLANTA TRANSFERENCIA 630A EN 2X3(500)+3/0)T AWG ALUMINIO CONTRAINCENDIO			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
12,00				12,00
SUBTOTAL				**12,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ALFAJOR 2,5*1*3 MTS	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.38	27,00				27,00
SUBTOTAL					**27,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO A SUBESTACION INCLUYE CERRADURA ANTIPANICO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.39				2,00	2,00
	SUBTOTAL				**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	INSTALACION DE SEÑALIZACION NORMATIVA SUBESTACIONES ELECTRICAS SEGÚN RETIE			UND	GLOBAL
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.40					2,00	2,00
		SUBTOTAL				2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
6.41		ADECUACIONES ELLECTRICAS EN ACOMETIDA ENTRADA Y SALIDA UPS3 15 KVA 3F 480 V 3X4+10T COBRE DUCTO EMT 1-1/4 COBRE		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
24,00				24,00
SUBTOTAL				**24,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T32 EN 3X1/0 + 1/0+6T EN DUCTO 1-1/2"" EMT COBRE	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.42	40,00				40,00
	SUBTOTAL				40,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

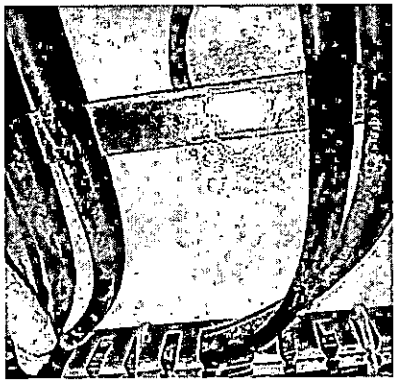
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T42 EN 3X1/0+1/0+6T EN DUCTO 1-1/2"" EMT COBRE	UND	ML

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.43		110,00				110,00
		SUBTOTAL				**110,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

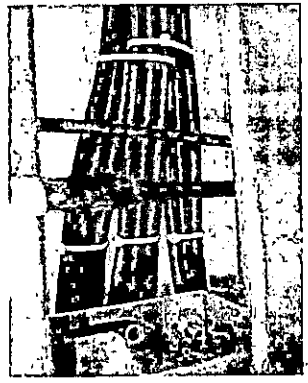
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	ML
6.44	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T62 EN 3X4+4+10T EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
45,00				45,00
SUBTOTAL				45,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T72 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.45	40,00				40,00
	SUBTOTAL				**40,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA T82 EN 3X8+8+10T EN DUCTO 1" EMT COBRE	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.46	50,00				50,00
	SUBTOTAL				50,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	ML
6.47	ADECUACIONES EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TE01 EN 3X250+250+6T EN DUCTO 2" EMT COBRE		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
28,00				28,00
SUBTOTAL				28,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

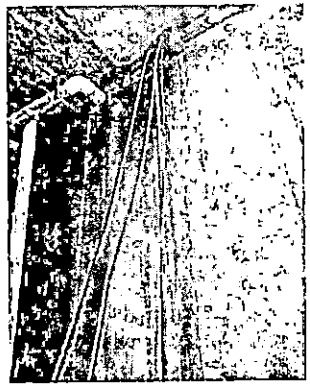
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
6.48	 	ADECUCIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TBAN BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN 3X1/0+10T EN DUCTO 1-1/4" EMT COBRE		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
16,00				16,00
SUBTOTAL				16,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	ML
6.49	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTA TBAP BOMBAS DE AGUAS POTABLE EN 3X250+6T EN DUCTO 2" EMT		



Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
130,00				130,00
SUBTOTAL				130,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TG2 HASTAASCENSOR 1 EN 3X1/0+1/0+10T EN 2" EMT	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.50	70,00				70,00
	SUBTOTAL				70,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
6.51		ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE TABLERO DE RED REGULADA TRG HASTA T. DE DISTRIBUCION RED REGULADA TR1-TR2, TR3, TR5, TR6 EN 2X8+10T EN 1" EMT		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
84,00				84,00
SUBTOTAL				84,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS EN ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 316 KVA HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN 3X(3X500+500)+4T	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.52	60,00				60,00
	SUBTOTAL				60,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.53	 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			405,00	405,00
		SUBTOTAL		405,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.54		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, INCLUYE: CABLE 1#12 + 1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONTECORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACION DE LA CANALIZACION, IDENFICACION Y ACCESORIOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			43,00	43,00
SUBTOTAL				43,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.55	 	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			95,00	95,00
		SUBTOTAL		95,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
6.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			210,00	210,00
		SUBTOTAL		210,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

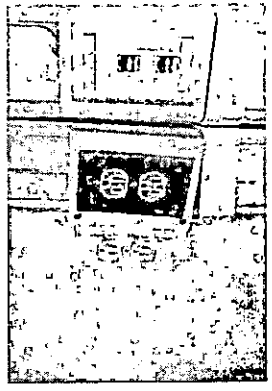
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
6.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED REGULADA; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA AISLADO, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			41,00	41,00
		SUBTOTAL		41,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ELECTRODO DE COBRE DIMENSIONES 2,4MX5/8"	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.59				28,00	28,00
	SUBTOTAL				28,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMENTO A ALAMBRÓN EN CALIBRE NO. 1/0 AWG, INCLUYE FIJACIÓN CON SOPORTES A LA ESTRUCTURA	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.60		2.400,00				2.400,00
		SUBTOTAL				2.400,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.61				50,00	50,00
	SUBTOTAL				**50,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN CRUZ PARA APANTALLAMIENTO	UND	UN

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.62					158,00	158,00
		SUBTOTAL				158,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A CONECTOR EN TEE PARA APANTALLAMIENTO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.63				56,00	56,00
SUBTOTAL					**56,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	EMPALMES BIMETÁLICOS PARA COBRE Y ALAMBRON	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.64					56,00	56,00
		SUBTOTAL				56,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

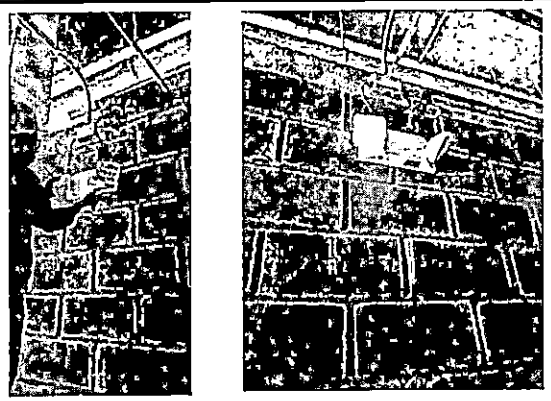
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA EMERGENCIA	UND	UN

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.65					43,00	43,00
		SUBTOTAL				43,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL P24346 LED 30X120 45 W	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.66				85,00	85,00
			SUBTOTAL		85,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION SYLPROOF LED 2X18W 1265MM	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.67				190,00	190,00
	SUBTOTAL				190,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA BALA LED 18 W SYLVANIA FEILO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.68				823,00	823,00
	SUBTOTAL				823,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 500W	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.69				80,00	80,00
	SUBTOTAL				**80,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA POWER PACK	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.72					14,00	14,00
		SUBTOTAL				**14,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	Vo.Bo. Firma
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.73		SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORÍA 6A, JACK CATEGORÍA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			8,00	8,00
		SUBTOTAL		8,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINSTRO E INSTALACION DE PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.74				60,00	60,00
		SUBTOTAL			60,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra
Vo.Bo. Firma DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINSTRO E INSTALACION PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.75					60,00	60,00
	SUBTOTAL					60,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES , MALLA 30X5,4CM; INCLUYE: DIVISIÓN Y TAPA, FIJACIÓN CADA 1,5ML	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.76	190,00				190,00
	SUBTOTAL				190,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO CERTIFICACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.78					200,00	200,00
		SUBTOTAL				200,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** RL - Contratista de Obra	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** Residente de Interventoría	**IGNACIO LARA HADECHNY** RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO SIRENA ESTROBOSCOPICA	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.85					2,00	2,00
		SUBTOTAL				2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DETECCION DE INCENDIO ANALOGO	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.86				1,00	1,00
			SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra.

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACIONES ELECTRICAS PARA CABLE TIPO FLPR SIN PANTALLA PARA SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 2*18 AWG 300 V	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.87	610,00				610,00
	SUBTOTAL				610,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.88		ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN DUCTO EMT 3/4" INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
610,00				610,00
		SUBTOTAL		**610,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ASCENSOR TIPO MONTACARGAS	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.89				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

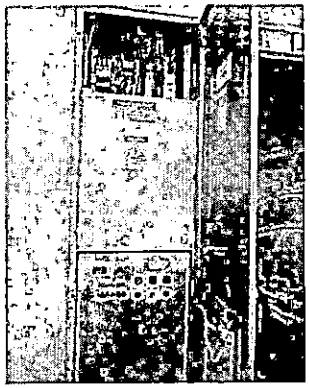
OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma **SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES** **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**
Vo.Bo. Firma **DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE 4 PARADAS SIMPLE	UND	UN
6.90				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO ASCENSOR DE 4 PARADAS DOBLE ACCESO (mantenimiento y pesta en funcionamiento)	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.91				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA STANDY CABINADA 963 KVA 770 KW 2527 AMPERIOS	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.92				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PUESTA EN SERVICIO PLANTA ELECTRICA CABINADA 316 KVA-253 KW 830 AMPERIOS	UND	UN

ITEM	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.93				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.94		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 7600 CFM @ 1,5 INWG		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN UNCIONAMIENTO VE-02 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 6700 CFM @ 1,5 INWG	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.95				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-03 UNIDADES EXTRACTORAS CENTRIFUGAS DOBLE OIDO EN GABINETE, 2000 CFM @ 1,5 INWG		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6,96				1,00	1,00
		SUBTOTAL			1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.97		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-04AYB Y 05AYB UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 350 CFM@0,5 INWG I		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.98		MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-06 al 09 unidad extractora tipo axial para baños 100 CFM @ 0,01 INWG		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.99	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO VE-10 AYB Y 11 AYB Y 12 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO 430CFM@0,5 INWG			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VE-13 al 14 unidad extractora tipo Helicocentrifugo 400 CFM @ 0,5 INWG	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.100					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VEJF-01 AL 04 UNIDAD VENTILADORA TIPO JET FAN CHASIS RECTANGULAR	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.101					1,00	1,00
	SUBTOTAL					1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
6.102		ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			3,00	3,00
SUBTOTAL				3,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	Vo.Bo. Firma
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

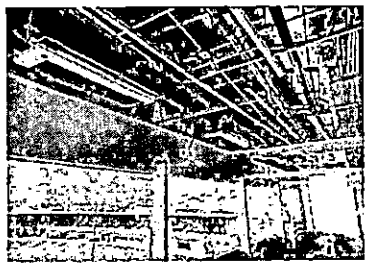
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
6.103	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE 1 VIA, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			14,00	14,00
		SUBTOTAL		14,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

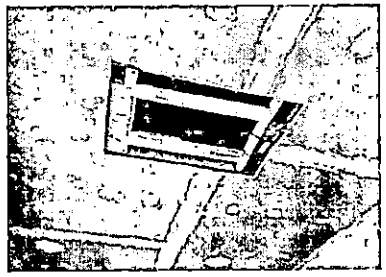
CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
6.104	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		





Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			16,00	16,00
		SUBTOTAL		16,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

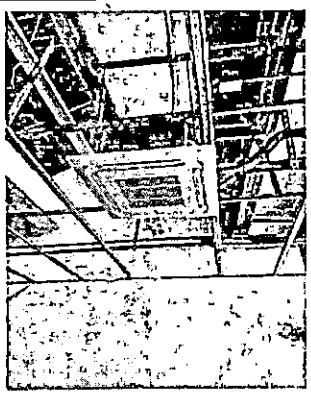
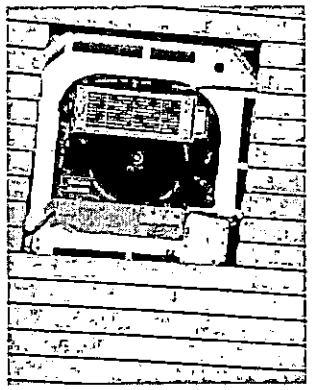
IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	UN
	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO UFCPV.XX UNIDAD, FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMOFABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 5000 BTU/HR, INCLUYE: (BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)		

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.105	 				3,00	3,00
		SUBTOTAL				3,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PRUEBAS E INGENIERIA Y SUPERVISION INCLUYE TAB PRUEBAS Y BALANCEO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
6.106				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE RIEGO DE CANCHA TUBERIA, CAMBIO DE ROCIADORES	UND	GLOBAL
7.10	 			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1,00	1,00
	SUBTOTAL			1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

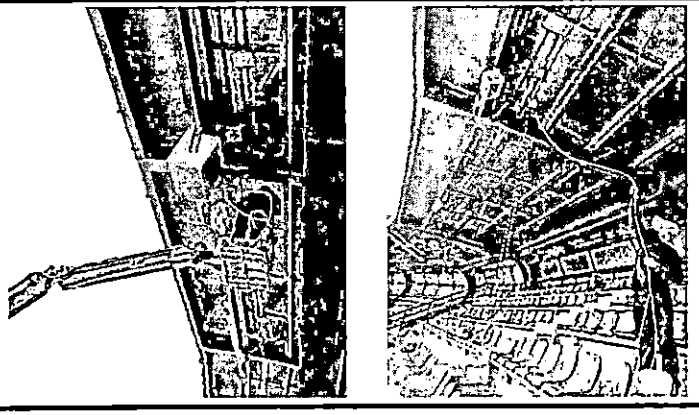
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUDIO Y SEGURIDAD	UND	GLOBAL
9,10				

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			1	1
		SUBTOTAL		1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-1		2.200,00			2.200,00
	SUBTOTAL				**2.200,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA 9CM	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-2	400,00				400,00
	SUBTOTAL				**400,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE CERAMICA EN MUROS Y PISOS (INCLUYE RETIRO)	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-3		750,00			750,00
	SUBTOTAL				**750,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA EN CERAMICA PISO INSTITUCIONAL 9CM		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-5	800,00				800,00
	SUBTOTAL				800,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO INSTITUCIONAL 45 X 45 (INCLUYE CORTE, PEGA Y EMBOQUILLE)	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-4		1.780,00			1.780,00
	SUBTOTAL				**1.780,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-6			3.400,00			3.400,00
		SUBTOTAL				3.400,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y PINTURA CIELO RASO EN ALUMINIO	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-7		200,00			200,00
SUBTOTAL					200,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra
Vo.Bo. Firma DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		MANTENIMIENTO DE BARANDAS, PORTONES Y DEMÁS ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-8	1.978,00				1.978,00
	SUBTOTAL				1.978,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR .	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DIVISION DE TRIBUNAS EN MALLA ESLABONADA H=2MTS, INCLUYE PUERTAS DE ACCESO A TRIBUNA	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-9		165,00			165,00
	SUBTOTAL				165,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	GRAMA SINTETICA ENTRE 20MM Y 30MM DE ESPESOR PARA ZONA DE CALENTAMIENTO Y TUNEL	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-10		500,00			500,00
SUBTOTAL					500,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA 30X60 (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACION)	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-11				300,00	300,00
		SUBTOTAL			300,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO DE SEGURIDAD CON MARCO EN LA PARTE SUPERIOR PARA LAS DIVISIONES PARA CABINAS PARA PERIODISTAS (ANCHO: 1,6MTS, ALTO: 0,47 MTS)	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-12-1					14,00	14,00
		SUBTOTAL				14,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-12-2		MÓDULO FIJO, PUERTA BATIENTE PISO Y TECHO EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO, BISAGRA PIVOTE Y CERRADURA TIPO BOLA PARA CABINAS PARA PERIODISTAS		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			14,00	14,00
		SUBTOTAL		14,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE ACCESO CORREDOR EN CABINAS PARA PERIODISTAS		

ITEM		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-12-3					4,00	4,00
			SUBTOTAL			4,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE PARA ACCESO A LIMPIEZA VIDRIOS PERIODISTA	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-12-4				2,00	2,00
		SUBTOTAL			2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE MUROS MAMPOSTERÍA EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-1		10,00			10,00
	SUBTOTAL				10,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN MUROS LIVIANOS EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-2		20,00			20,00
	SUBTOTAL				**20,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE PERFILERÍA Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-3		117,60			117,60
	SUBTOTAL				**117,60**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE DE EQUIPO DE AA Y OTROS EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-4				20,00	20,00
		SUBTOTAL			20,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE DE SILLAS PALCO EN ZONA PALCO VIP	UND	GLOBAL

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-5				1,00	1,00
SUBTOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-6		90,00			90,00
SUBTOTAL					90,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN ZONA PALCO VIP			UND	GLOBAL
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-7					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TRAZADO Y REPLANTEO EN ZONA PALCO VIP	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-8			362,30			362,30
		SUBTOTAL				362,30

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
NP-13-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO LIVIANO EN DRYWALL 1/2, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO, ACABADO EN MASILLA T1 EN ZONA PALCO VIP			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	103,60			103,60
	SUBTOTAL			103,60

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE CEMENTO No. 12, ACABADO EN PAÑETE, ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA T1 EN ZONA PALCO VIP		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-10		10,00			10,00
	SUBTOTAL				**10,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY.** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	M2
		INSTALACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN NUEVA ZONA DE PALCOS H=2,70 EN ZONA PALCO VIP		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-11		42,40			42,40
	SUBTOTAL				42,40

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0,90 X 2,20 acceso a ZONA PALCO VIP, EN MARCO DE ALUMINIO, VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM Y PAPEL OPALIZADO		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-12				6,00	6,00
		SUBTOTAL			6,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO BATIENTE DE 0,9 X 2,20 acceso gradas,en marco de alumino EN ZONA PALCO VIP, EN VIDRIO TEtemplado 10MM INCOLORO CON BISAGRA HIDRAULICA CERRADURA Y MANIJA		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-13				6,00	6,00
	SUBTOTAL				6,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH CON FLEXOMETRO EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-14				4,00	4,00
		SUBTOTAL			4,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PONER EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-15					4,00	4,00
		SUBTOTAL				4,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRANITO	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-16		4,50				4,50
		SUBTOTAL				4,50

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAL DISCAPACITADO EN ZONA PALCO VIP	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-17				2,00	2,00
		SUBTOTAL			2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL EN ZONA PALCO VIP INCLUYE AISLANTE ACUSTICO	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-18		105,00			105,00
	SUBTOTAL				**105,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO DE 8 HUELLAS EN ZONA PALCO VIP (0,4 M3/ ESCALERA)	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-19				4,00	4,00
SUBTOTAL					4,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-13-20		PALCOS BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON BASE FIJA EN ALUMINIO ALTURA 0.50 M		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
42,00				42,00
SUBTOTAL				**42,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	INTALACIÓN DE SILLAS EXISTENTE EN ZONA DE PALCOS EXTERNOS EN ZONA PALCO VIP	UND	GLOBAL

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-21				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		**Vo.Bo. Firma**	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	UN
NP-13-22	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS VIP ZONA PALCOS, EN POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE			

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
			24,00	24,00
	SUBTOTAL			24,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-13-23		700,00			700,00
	SUBTOTAL				**700,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DIVISIONES DE DUCHA, SANITARIO Y ORINALES EN VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO CON SAND BLASTING Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-14		233,00			233,00
	SUBTOTAL				233,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PERSIANA Z LAMINA GALV CAL 22 PINTURA AL HORNO	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-15		16,00			16,00
	SUBTOTAL				16,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	REVESTIMIENTO DE MUROS EN PERFIL GRAPADO EN LAMINA GALVANAIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-16		258,00			258,00
	SUBTOTAL				258,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	Vo.Bo. Firma
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** RL - Contratista de Obra
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	**IGNACIO LARA HADECHNY** RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ALFAJIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA AL HORNO	UND	ML

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-17		78,00				78,00
		SUBTOTAL				78,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ANGULO DE REMATE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 Y PINTURA ELECTROSTATICA	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-18		38,00			38,00
	SUBTOTAL				38,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	LAMINA DE ALUCOBOND PARA CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE FACHADA	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-19		102,00			102,00
SUBTOTAL					102,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ESTRUCTUTA METALICA DE SOPORTE PARA TECHO Y MUROS EN TUBO METALICO RECTANGULAR 76X38 SOLDADO	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-20		48,00			48,00
	SUBTOTAL				48,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS ZONA DE CAMERINOS, INCLUYE DESMONTE DE DUCHAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-21				40,00	40,00
		SUBTOTAL			40,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-22					250,00	250,00
		SUBTOTAL				250,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	CARLOS ALBERTO COTES MORA RL - Contratista de Obra	DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	IGNACIO LARA HADECHNY RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DESMONTE Y MONTAJE DE LAVAMANOS Y ORINALES, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA	UND	UND

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-23				100,00	100,00
	SUBTOTAL				100,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TUBERIA DE COBRE 1 1/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-24	20,00				20,00
	SUBTOTAL				20,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
		TUBERIA DE COBRE 7/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-25	60,00				60,00
	SUBTOTAL				**60,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma		Vo.Bo. Firma	
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**	**DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-26		TUBERIA DE COBRE 3/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
50,00				50,00
		SUBTOTAL		50,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	UND	ML
NP-27	TUBERIA DE COBRE 5/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
110,00				110,00
SUBTOTAL				110,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TUBERIA DE COBRE 1/2" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-28	30,00				30,00
		SUBTOTAL			30,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-29		TUBERIA DE COBRE 3/8" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
110,00				110,00
	SUBTOTAL			110,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-30		TUBERIA DE COBRE 1/4" O.D INCLUYE ACCESORIOS TUBERIA COBRE AISLAMIENTO EN RUBATEC, SOPORTE CON PERNO DE ANCLAJE, VARILLAS Y ANGULOS, SOLDADURA NITROGENO Y MANO DE OBRA		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
10,00				10,00
	SUBTOTAL			10,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES DE MANEJADORAS TIPO CASSETTE INCLUYE RIEL CHANEL, VARILLA 3/8" ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y CHAZOS	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-31				23,00	23,00
	SUBTOTAL				23,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PCB MANEJADORA TIPO CASSETTE			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-32					2,00	2,00
		SUBTOTAL				2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PCB SEÑAL DE MANEJADORA TIPO CASSETTE	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-33					2,00	2,00
		SUBTOTAL				2,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TARJETA PODER DE CONDENSADORA VRF	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-34					1,00	1,00
		SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	BRANCH DERIVACIONES PARA TODO EL SISTEMA	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-35				14,00	14,00
		SUBTOTAL			14,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PANEL DECORATIVO TIPO CASSETE 4 VIAS Y CASSETE 1 VIA			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-36					25,00	25,00
		SUBTOTAL				25,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	TERMOSTATO ALAMBRICO O INHALAMBRICO			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-37					15,00	15,00
			SUBTOTAL			15,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R410A DE TODO EL SISTEMA(SUMINISTRO Y CARGA TOTAL) Y NITROGENO	UND	GLOBAL

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-38				1,00	1,00
	SUBTOTAL				1,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma	Vo.Bo. Firma
SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES Residente de Obra	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** RL - Contratista de Obra
DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ Residente de Interventoría	**IGNACIO LARA HADECHNY** RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTERIA RETORNO EN LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO EN YUMBOLON, SOPORTERIA Y ALCLAJES	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-39				5,00	5,00
	SUBTOTAL				5,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-40		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL INCLUYE CABLE 3X16, BLINDADO Y APANTALLADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
300,00				300,00
	SUBTOTAL			**300,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIERREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTIN LOPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO DE CONDENSADORAS SISTEMA VRF			UND	UN
		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-41					6,00	6,00
		SUBTOTAL				6,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO SILLAS ZONA DE PRENSA	UND	UN

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-42					60,00	60,00
			SUBTOTAL			60,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:		UND	ML
NP-43		MANTENIMIENTO Y PINTURA DE DIVISIONES DE BAÑO, INCLUYE TRATAMIENTO CON GRATA PARA ZONAS AFECTADAS, ANTICORROSIVO, PINTURA, DESMONTE E INSTALACIÓN Y BASES SOPORTE		

Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
	1.600,00			1.600,00
SUBTOTAL				**1.600,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO 1:4	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-44		400,00			400,00
	SUBTOTAL				400,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACUZZI PARA CUARTO HUMEDO EN CAMENIROS	UND	UN

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-45				2,00	2,00
	SUBTOTAL				**2,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2

		Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-46			400,00			400,00
		SUBTOTAL				**400,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma **SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES** **Residente de Obra**	**CARLOS ALBERTO COTES MORA** **RL - Contratista de Obra**
Vo.Bo. Firma **DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ** **Residente de Interventoría**	**IGNACIO LARA HADECHNY** **RL - Interventoría**

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA E=5CM	UND	M2

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-47		400,00			400,00
	SUBTOTAL				**400,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	CORTE, INSTALACIÓN CORDÓN Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTÓMERO	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-48	2.600,00				2.600,00
SUBTOTAL					2.600,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TELA POLIÉSTER Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN BANCAS	UND	ML

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-49	2.000,00				2.000,00
	SUBTOTAL				2.000,00

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría

CONSORCIO
SIERRA NEVADA

MEMORIAS DE CANTIDADES BALANCE MODIFICATORIA No. 1

CONTRATO No.	001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FÚTBOL DE SANTA MARTA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE SANTA MARTA
CONTRATISTA	CONSORCIO SIERRA NEVADA
INTERVENTOR	CONSORCIO ESTADIO 01
SUPERVISOR	DISTRITO DE SANTA MARTA

ITEM	ACTIVIDAD:	ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UND	GLOBAL

	Largo (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Unidad	Medida total
NP-50				1,00	1,00
	SUBTOTAL				**1,00**

OBSERVACIONES

Vo.Bo. Firma

SAMUEL ALBERTO GUTIÉRREZ PAYARES
Residente de Obra

CARLOS ALBERTO COTES MORA
RL - Contratista de Obra

Vo.Bo. Firma

DIEGO ERNESTO MARTÍN LÓPEZ
Residente de Interventoría

IGNACIO LARA HADECHNY
RL - Interventoría
