ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 16 de diciembre de 2024

Ingeniera:
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de planeación, desarrollo e infraestructura
Supervisor: Contrato de Obra No. 007-2024

Referencia: Contrato de Obra No. 007-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA.".

Asunto: Entrega de Documentos

Cordial Saludo,

Comedidamente me permite adjuntar los siguientes documentos, requeridos para la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato:

1. Presupuesto detallado de la obra
2. Análisis de precios unitarios
3. AIU

Estos documentos han sido preparados para garantizar la transparencia y cumplimiento de los requerimientos técnicos y financieros del proyecto. Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
INGENIERO EN ENERGÍAS (UEAN)
REPRESÉNTATE LEGAL DE ENERGY GUILD S.A.S
Celular: 310 634 2494
energyguildsas@gmail.com

ENERGY GUILD S.A.S

CALIDAD transformada en ENERGÍA

PRESUPUESTO

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	m	45,00	32.767,00	1.474.515
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	Und	4,00	251.700,00	1.006.800
1,3	Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	Und	2,00	1.218.010,00	2.436.020
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	und	4,00	560.075,00	2.240.300
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	m	60,00	28.392,00	1.703.520
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	m	28,00	239.102,00	6.694.856
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	Und	1,00	2.303.095,00	2.303.095
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	m	20,00	156.525,00	3.130.500
1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	Und	1,00	527.002,00	527.002

SUBTOTAL CAP 1 INSTALACIONES ELECTRICAS :	**$ 21.516.608**

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$**	**21.516.608**
ADMINISTRACION	25%	$	5.381.337
IMPREVISTOS	1%	$	215.166
UTILIDAD	4%	$	860.664
TOTAL AIU	30%	$	6.457.168

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 27.973.776**

VALOR EN LETRAS

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	**30**

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO

ENERGY GUILD S.A.S

ANALISIS DEL A.I.U

COSTO DIRECTO			**FECHA:**		**FECHA:**	NOVIEMBRE DE 2024
TIEMPO ESTIMADO PARA EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)			**VERSION:**	1,00	**VERSION:**	V1
DESCRIPCION	**UND.**	**MESES**	**DEDICACION**	**V. UNITARIO**	**PORCENTAJE**	**V. TOTAL**
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO(Incl. Prestaciones Sociales)						
Director de obra (Ingeniero en energía y/o Ingeniero Electricista)	un	1,00	20,00%	$2.100.000,00	1,95%	$420.000,00
Residente electricista (Tecnólogo en supervisión de redes de distribución de energía eléctrica y /o técnico electricista con tarjeta CONTE.)	un	1,00	100,00%	$1.693.846,10	7,87%	$1.693.846,10
					Subtotal	**$ 2.113.846,10**
COSTOS ADMINISTRATIVO Y OTROS						
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS						
Costos dePapeleria, Fotocopias, ETC	un	1,00	100,00%	$40.000,00	0,19%	$40.000,00
					Subtotal	**$ 40.000,00**
DESCUENTO SOBRE EL CONTRATO						
Estampilla Pro Deporte 2.5%	un	2,50%		$21.516.608,00	2,50%	$ 537.915,20
Cultura 0,6%	un	0,60%		$21.516.608,00	0,60%	$ 129.099,65
S. Social 0,1%	un	0,10%		$21.516.608,00	0,10%	$ 21.516,61
Biblioteca 0,1%	un	0,10%		$21.516.608,00	0,10%	$ 21.516,61
Pasivo Pensional 0,2%	un	0,20%		$21.516.608,00	0,20%	$ 43.033,22
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	un	4,00%		$21.516.608,00	4,00%	$ 860.664,32
Estampilla Pro Universidad de la Amazonia 0,5%	un	0,50%		$21.516.608,00	0,50%	$ 107.583,04
Estampilla Justicia Familiar 2%	un	2,00%		$21.516.608,00	2,00%	$ 430.332,16
Ley 418/98-Fondo Seguridad C FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE VALPARAISO 5% - Contratos de Obra.	un	5,00%		$21.516.608,00	5,00%	$ 1.075.830,40
TOTAL ADMINISTRACIÓN						**$ 5.381.337,30**
TOTAL OBRA CIVIL COSTO DIRECTO						**$ 21.516.608**
PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN						**25%**

VALOR OBRA CIVIL COSTO DIRECTO			**$ 21.516.608,00**
ADMINISTRACIÓN	25%		$ 5.381.337,30
IMPREVISTOS	1%		$ 215.166,08
UTILIDAD	4%		$ 860.664,32
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	**30%**		**$ 6.457.167,70**

ING.CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Suministro e instalación de red trenzada					**m** **ITEM: 1,1**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Cable aluminio trenzado 2*2+2 aislado # 2 libre	Mts	1,000	3	20.000,00	20.600,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**20.600,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200,00	35,000	8.691,00
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	35,000	2.897,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**11.588,00**
EQUIPO					
					-
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		11.588,00	579,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**579,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO		**32.767,00**

Suministro y armado de estructura baja tensión de retención					**Unidad: und** **ITEM: 1,2**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Grapa de retención para red trenzada	UND	1	5	35.000,00	36.750,00
collarin doble salida 140mm	UND	1		23.000,00	23.000,00
Tuerca de ojo alargada	UND	1		15.000,00	15.000,00
esparrago de 5/8 *10	UND	2		9.500,00	19.000,00
Cinta bandit 5/8	Mts	4	3	9.000,00	37.080,00
Hebillas5/8	UND	4		1.600,00	6.400,00
Tornillo de 5/8 * 3	UND	1		8.000,00	8.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	145.230,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	4,000	25.350,00
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200	4,0000	76.050,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**101.400,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		101.400,00	5.070,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.070,00**
				COSTO DIRECTO	**251.700,00**

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios					**Unidad: und** **ITEM: 1,3**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
Caja de Derivacion en Policarica	UND	1		380.000,00	380.000,00
cable cobre aislado de 2*6+6	m	3	3	55.000,00	169.950,00
Conector de Tornillo de Perforacion de Chaqueta Aislada F	UND	3	3	11.000,00	33.990,00
Cinta bandit 5/8	m	4,000	0	10.000,00	40.000,00
Hebillas5/8	und	4,000	0	1.900,00	7.600,00
kit puesta a tierra baja tensión	und	1,000	0	480.000,00	480.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	1.111.540,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	4,0000	25.350,00
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200	4,0000	76.050,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**101.400,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		101.400,00	5.070,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.070,00**
				COSTO DIRECTO	**1.218.010,00**

Suministro e instalación de retenida en baja tensión					**Unidad: UND** **ITEM: 1,4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Vigueta de concreto	und	1		50.000,00	50.000,00
Varilla de anclaje	und	1		95.000,00	95.000,00
Templete cuerda guitarra	und	1		150.000,00	150.000,00
Cable acero para retenida 3/4	m	12	3	6.500,00	80.340,00
guardacabo 3/8	und	2		4.000,00	8.000,00
prensahilo 3/4	und	4		17.000,00	68.000,00
aislador tensor BT	und	1		42.000,00	42.000,00
arandela cuadrada de 10*10	und	1		13.500,00	13.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**506.840,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200,00	2,00	152.100,00
Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	2,00	50.700,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**50.700,00**
EQUIPO					
0	DIA				-
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		50.700	2.535,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.535,00**
				COSTO DIRECTO	**560.075,00**

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Retiro de red existente en baja tensión					**Unidad: m** **ITEM: 1,5**
DESCRIPCION	**UND**	**CANT.**	**DESP.%**	**PRECIO UNIT**	**VALOR TOTAL**
MATERIALES					
					-
					-
				SUBTOTAL MATERIALES	-
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200	15,0000	20.280,00
Auxiliar	60.000,00	169%	101.400	15,0000	6.760,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**27.040,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		27.040,00	1.352,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.352,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**28.392,00**

Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8					**Unidad: m** **ITEM: 1,6**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Cable cobre aislado de 2*8+8 antifraude	m	1	3	25.400,00	26.162,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**26.162,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200	2,0000	152.100,00
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	2,000	50.700,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**202.800,00**
EQUIPO					
					-
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		202.800,00	10.140,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**10.140,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
				COSTO DIRECTO	**239.102,00**

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Suministro e instalación de acometida bifásica					**Unidad: GLB** **ITEM: 1,7**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
tensor de acometida	und	2		8.000,00	16.000,00
Soporte en L para tensor de acometida	und	1		4.000,00	4.000,00
Soporte en L de 1" 1/2	und	1		4.000,00	4.000,00
tubo galvanizado de 1" 1/2	und	1		180.000,00	180.000,00
capacete de 1" 1/2	und	1		15.000,00	15.000,00
caja de medidor bifásico	und	1		230.000,00	230.000,00
Medidor bifásico	und	1		450.000,00	450.000,00
Breker de riel bipolar 2*63 amp	und	1		75.000,00	75.000,00
Boquilla de 1" 1/2	und	3		5.000,00	15.000,00
Cable cobre aislado # 8	m	12	3	8.500,00	105.060,00
tablero de circuito bifásico de 12 ventanas	und	1		490.000,00	490.000,00
Protecciones enchufables baja tensión	und	6		25.000,00	150.000,00
Varilla cobre cobre	und	1		225.000,00	225.000,00
Conector para varilla de cobre	und	1		40.000,00	40.000,00
cable cobre aislado #10	m	4	3	6.800,00	28.016,00
Tapa para sistema puesta a tierra	und	1		17.000,00	17.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**2.044.076,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200,00	1,637	185.789,00
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	1,637	61.929,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**247.718,00**
EQUIPO					
					-
HERRAMIENTA MENOR	%	5%		247.718,00	12.385,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**12.385,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO		**2.304.179,00**

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario					**Unidad: und**
					ITEM: 1,8
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
cable cobre aislado #10	m	3	3	6.200,00	19.158,00
tubo EMT 3/4	m	1		10.000,00	10.000,00
Terminal EMT 3/4	und	1		1.200,00	1.200,00
Curva EMT 3/4	und	1		4.500,00	4.500,00
Cajilla 2400 matalica	und	0,5		5.000,00	2.500,00
Tapa ciega para caja 2400	und	0,5		3.900,00	1.950,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**39.308,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200,00	3,500	86.914,00
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	3,500	28.971,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**115.885,00**
EQUIPO					
					-
HERRAMIENTA MENOR	%	2%		115.885,00	2.317,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.317,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO		**157.510,00**

APU

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA

Suministro e instalación de punto electrico electro bomba					**Unidad: und** **ITEM: 1,9**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
Toma corriente de 50 amp a 220v	und	1		68.000,00	68.000,00
caja metalica 2400	m	1		5.300,00	5.300,00
cable cobre # 10	und	18		6.800,00	122.400,00
conector bimetalico	und	2		5.500,00	11.000,00
Varilla cobre	und	1		225.000,00	225.000,00
Conector para varilla de cobre	und	1		55.000,00	55.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**486.700,00**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. Tecnico electricista	180.000,00	169%	304.200,00	10,000	30.420,00
M.O. Auxiliar	60.000,00	169%	101.400,00	10,000	10.140,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**40.560,00**
EQUIPO					
					-
HERRAMIENTA MENOR	%	2%		40.560,00	811,00
					-
				SUBTOTAL EQUIPO	**811,00**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO		**528.071,00**

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 13 de diciembre de 2024

Estimada:

Ingeniera

Yessika Adriana Jiménez Forero

Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Supervisor: Proceso Contrato No. 007-2024

Asunto: Reporte de Novedades del Contrato No. 007-2024

Cordial saludo,

De acuerdo con los requisitos para la contratación de personal, informamos que el técnico electricista Oswaldo Alirio Quiroga Bernal, identificado con cédula No. 3.246.251, no podrá participar en el proyecto No. 007-2024debido a una calamidad familiar.

En consecuencia, su puesto será sustituido por el técnico electricista Jainer Delgado Cipagauta, identificado con cédula No. 96.362.687, quien cumple con la misma experiencia y requisitos necesarios para su contratación.

Adjunto los documentos pertinentes del técnico Jainer Delgado Cipagauta, para la validación de este reporte.

1. Hoja de vida
2. Tarjeta CONTEC
3. Copia de cedula de ciudadanía
4. Certificado de experiencia laboral
5. Certificado Caja de compensación
6. Certificado EPS

Cordialmente,

Carlos Ferley Ramírez Usaquén
INGENIERO EN ENERGÍAS (UEAN)
Represéntate Legal de Energy Guild S.A.S
Celular: 310 634 2494
energyguildsas@gmail.com

minerva 10-03

www.formasminerva.com

HOJA DE VIDA ORIGINAL MINERVA LTDA.

HOJA DE VIDA
PARA SOLICITUD DE EMPLEO

Diligencie su Hoja de Vida en letra clara y legible

Fecha (D / M / A)	Empleo o cargo al que aspira

I. INFORMACION GENERAL

(*) Respuesta opcional Ley 13 de 1972 Art. 5 Convenio 111 OIT.



Apellido(s) del aspirante: Delgado cipagauta	Nombre(s) del aspirante: Jainer
Fecha de Nacimiento: D 31 M 03 A 1985	Lugar de Nacimiento: Florencia caqueta
Dirección domicilio / Barrio: Cll 11 N 34-12	Ciudad: Melgar Tolima
Teléfono:	No. Celular: 3214607936
Correo electrónico: Jainerdelgado0385 @gmail.com	Nacionalidad: colombiano
Profesión, ocupación u oficio: Tecnico electricista	(*) Estado civil: soltero
	Años de experiencia laboral: 9 AÑOS

DOCUMENTACION

(**) Respuesta opcional Art. 111, decreto 2150 de 1995

Cédula de ciudadanía: [X]	N° 96362687	(**) Libreta militar N° 96362687	Primera clase: [X]
Extranjería: [ ]	Expedida en: Morelia caqueta	Distrito N°	Segunda clase: [ ]
Tarjeta profesional N°	¿Tiene vehículo? Si [ ] No [X]	Licencia de conducción N°	Categoría

II. PERFIL LABORAL

Mencione brevemente estudios, experiencia y habilidades que lo caractericen en su vida laboral

Soy Tecnico Electricista me desempeño en construcción y remodelación Atención de emergencia y mantenimiento de Subestación y montaje de transformadores, lineas desenergisadas.

II. INFORMACION PERSONAL

¿Está trabajando actualmente? Si [X] No [ ]	¿En qué empresa? HESEGO - ingeniería	Empleado [X] Independiente [ ]	Tipo de contrato: obra labor
¿Trabajó antes en esta empresa? Si [ ] No [X]	¿Solicitó empleo antes en esta empresa? Si [ ] No [X]	Fecha (D / M / A)	¿Conoce a alguien de esta empresa? Si [ ] No [ ] Nombre / Dependencia
¿Tiene parientes que trabajan en esta empresa? Si [ ] No [ ]	Nombre / Dependencia	¿Como tuvo conocimiento de la existencia de la vacante? Anuncio [ ] Amigo [ ] Redes Sociales [ ] Por medio de agencia [ ] Otro [ ] ¿Cuál?	
¿Aceptaría trabajar en una ciudad o sitio distinto a inicialmente contratado? Si [X] No [ ]	Vive en casa: ¿Familiar? [ ] ¿Propia? [ ] ¿Alquilada? [X]	Nombre del arrendador: Lida Ruth Peña	Teléfono: 3216343201 — ¿Hace cuánto tiempo reside en este lugar? 1 AÑO
¿Actualmente tiene algún ingreso adicional? Si [ ] No [X]	Describalo e indique su valor mensual		¿Cuánto suman sus obligaciones económicas mensuales? $ 2.000.000
¿Por qué conceptos? Arriendo, Alimentacion, gastos personales			¿Cuánto es su aspiración salarial? Al convenir
¿Cuál es su principal afición? Futbol	¿Practica algún deporte? Si [X] No [ ]	¿Cuál(es)? Futbol	
¿Alguna vez ha obtenido distinciones o reconocimientos por su desempeño en actividades deportivas, culturales, sociales, entre otros? Si [ ] No [X] ¿Cuál(es)?			

5020321217

minerva © by Legis. Prohibida su reproducción. Se denunciarán penalmente las falsificaciones

IV. INFORMACION FAMILIAR

Nombre esposa(o) o compañero(o)	Profesion, ocupación u oficio	Empresa donde trabaja

Cargo actual	Dirección	Teléfono	Ciudad

N° de personas que dependen económicamente de usted	Parentesco	Edades
3	Madre E Hijos	74 - 14 - 12 Años

Nombre(s) padre(s)	Profesion, ocupación u oficio	Telefono(s)
Sagrario Cipagauta	Ama de casa	3143457919
.		

Nombre(s) hermanos(s)	Profesion, ocupación u oficio	Telefono(s)
Einer Delgado	Tecnico Electricista	3209218075
Clara Ines Delgado	Ama de casa.	3208957795

V. EDUCACIÓN Y APTITUDES

ESTUDIOS	AÑO DE FINALIZACION	AÑOS CURSADOS	TITULO OBTENIDO	NOMBRE DE LA INSTITUCION	CIUDAD
Primaria					
Bachillerato Académico X / Técnico / Comercial / Otro	17/08/12		Bachiller	SENDAS	Tolima
Educación Superior Técnico X			Tecnico Electricista	Concejo Nacional de electricista	bogotá
Tecnologico					
Profesional					
Postgrados					

	Intensidad horaria	Nombre del programa	Institucion
Otros: cursos, diplomados, seminarios			
Otros: cursos, diplomados, seminarios			

¿Cursa estudios actualmente?	¿Qué tipo de estudios?	Duración (años, semestres, meses)	Año / semestre que cursa
Si / No X			

Nombre de la institución

Horario: Diurno / Nocturno / Fin de semana / A distancia

OTROS CONOCIMIENTOS: Indique el grado de dominio: **R-Regular (50 a 60%) B- Bueno (61 a 80%) MB- Muy Bueno (81 a 100%)**

Sistemas Si / No	1.	R B MB	3.	R B MB				
¿Qué programas maneja?	2.	R B MB	4.	R B MB				
Idiomas		Escucha		Lectura		Escritura		Habla
Si / No	1.	R B MB		R B MB		R B MB		R B MB
¿Qué idioma(s) conoce?	2.	R B MB		R B MB		R B MB		R B MB

Nota: en caso de ser contratado (a) favor preparar toda la documentación.

VI. EXPERIENCIA LABORAL

FAVOR RELACIONAR LOS ÚLTIMOS TRES EMPLEOS QUE USTED HA DESEMPEÑADO, COMENZANDO POR EL ÚLTIMO O ACTUAL. SI NECESITA DAR MÁS DETALLES UTILICE LA ÚLTIMA PÁGINA DE NOTAS ADICIONALES. ESTOS DATOS SERÁN VERIFICADOS Y SU MANEJO SERÁ CONFIDENCIAL

Nombre de la última o actual empresa	Actividad Económica	Dirección	Telefono(s)
Hesego - Ingenieria		Espinal Tolima	3138730815

Cargo(s) desempeñado(s) por usted	Área del cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Sueldo Inicial	Sueldo Final
Tecnico Electricista	Liniero	D 05 M 09 A 2013	D M A	$ 2000.000	$

Funciones realizadas: Atencion de Daños y Emergencia y mantenimiento de Redes en linea de media y baja tension desenergisada

Nombre de su jefe inmediato: Alejandro Coy — Cargo: Supervisor

Logros obtenidos:

Tipo de contrato Indefinido X / Fijo — ¿Cuánto tiempo? — Contrato directo con la empresa X / Contrato por medio de agencia — Otro — ¿Cual?

Horario de trabajo: Tiempo completo X / 1/2 Tiempo / Por horas — **Jornada:** Diurna X / Nocturna / Otra jornada

Motivo del retiro

Nombre de la empresa	Actividad Económica	Dirección	Teléfono(s)
CODUESA		CII 41 N 4B-25 IBAGUE	3212046024

Cargo(s) desempeñado(s) por usted	Área del cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Sueldo Inicial	Sueldo Final
Tecnico Electricista	Liniero	D 13 M 11 A 2014	D 15 M 08 A 2015	$ 600.000	$ 600.000

Funciones realizadas
construccion y remodelacion de lineas dejenergisadas de media y baja tencion linea dejenergisada

Nombre de su jefe inmediato	Cargo
DIANA ACOSTA	Supervisora

Logros obtenidos

Tipo de contrato: Indefinido [ ] ¿Cuanto tiempo? Fijo [X] 11 meses — Contrato directo con la empresa [X] — Contrato por medio de agencia [ ] — Otro [ ] ¿Cual?

Horario de trabajo: Tiempo completo [X] 1/2 Tiempo [ ] Por horas [ ] Jornada: Diurna [X] Nocturna [ ] Otra jornada [ ]

Motivo del retiro
Termino de contrato

Nombre de la empresa	Actividad Economica	Dirección	Teléfono(s)
HESEGO - INGENIERIA		Espinal tolima	3138750815

Cargo(s) desempeñado(s) por usted	Área del cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Sueldo Inicial	Sueldo Final
Tecnico Electricista		D 05 M 09 2023		$ 2000.000	$ 2000.000

Funciones realizadas
construccion y Remodelacion de lineas dejenergisadas de media y baja tencion y Atencion de Emergencia linea dejenergisada

Nombre de su jefe inmediato	Cargo
Alejandro Coy	Supervisor

Logros obtenidos

Tipo de contrato: Indefinido [ ] ¿Cuanto tiempo? Fijo [X] 1 AÑO — Contrato directo con la empresa [X] — Contrato por medio de agencia [ ] — Otro [ ] ¿Cual?

Horario de trabajo: Tiempo completo [X] 1/2 Tiempo [ ] Por horas [ ] Jornada: Diurna [X] Nocturna [ ] Otra jornada [ ]

Motivo del retiro
Termino de contrato

VII. REFERENCIAS PERSONALES

Relacione dos nombres de personas distintas a familiares o empleadores

	Nombre	Ocupación	Dirección	Teléfono
1.	Camilo Rodriguez	Jefe de cuadrilla	Espinal tolima	3208918377
2.	Yorley Bermeo	Jefe de cuadrille	Melgar tolima	3107527261

Nombre de un familiar que podamos contactar en caso de no localizarlo a usted directamente

	Nombre	Ocupación	Dirección	Teléfono
1.	Einer Delgado	Tecnico electricista	Icononzo tolima	3209217075
2.	clara ines delgado	Amade casa	Murilla cagueta	3208957795

Autorizo pedir información de mi Hoja de Vida sin ninguna restricción. [ ] Marque con una X

Nota importante
Favor no llamar por telefono ni acudir a preguntar por el resultado de esta solicitud. Nosotros le avisaremos. gracias

Certificación
Para todos los efectos legales, certifico que todas las respuestas e informaciones anotadas por mi, en la presente hoja de vida, son veraces (C.S.T. Art. 62 Num. 1°) Régimen Laboral Colombiano § 1057 (Legis)

Firma del solicitante
JAINER DELGADO
c.c. 98 362 687

minerva

CONTE
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas

MINMINAS - MINEDUCACIÓN
ACIEM - FENALTEC

Ley 19 de 1990
Decreto Reglamentario 991 de 1991
Ley 1264 de 2008

República de Colombia



En uso de sus facultades legales y teniendo en cuenta que

Jainer Delgado Cipagauta

C.C. 96362687

Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos y conforme a la resolución M-C082416 de 22-01-2015

Otorga

Matricula Profesional de Técnico Electricista
MTE. 96362687-60845

De conformidad con la clasificación de actividades de qué trata el artículo 3º del decreto reglamentario 991 de 1991, en las siguientes clases:

TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lamparas, luminarias, interruptores, tableros de distribucion de circuitos, equipo de medida, protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos.

TE-5 TECNICO EN REDES ELECTRICAS
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado a la construcción y montaje de redes eléctricas aéreas, redes eléctricas subterráneas y subestaciones eléctricas de distribución.

TE-6 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES
Para adelantar actividades relacionadas con el estudio aplicado al montaje y conexión de alumbrado público.

Dada en Bogotá, D.C., 23 ENE 2015

Wilson Ochoa

WILSON OCHOA
Presidente CONTE

Nº 54574

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **96.362.687**

DELGADO CIPAGAUTA

APELLIDOS

JAINER

NOMBRES

JAINER DELGADO C.

FIRMA



Notaría Cuarenta y Cuatro de Bogotá
Como Notaría Cuarenta y Cuatro hago constar
que esta copia coincide con el documento original
presentado para su autenticación.
Bogotá República de Colombia
08 OCT 2024
JOHANA LILIANA BARRANTES CARDENAS
Notaría Cuarenta y Cuatro Encargado

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 44
CIRCULO DE BOGOTA
NO SIRVE COMO DOCUMENTO
DE IDENTIFICACION



FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1985**

MORELIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-NOV-2003 MORELIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

Notaría Cuarenta y Cuatro de Bogotá
Como Notaría Cuarenta y Cuatro hago constar
que esta copia coincide con el documento original
presentado para su autenticación.
Bogotá República de Colombia
08 OCT 2024
JOHANA LILIANA BARRANTES CARDENAS
Notaría Cuarenta y Cuatro Encargado

A-1505800-01048741-M-0096362687-20181206 0063449192A 1 49944455

HESEGO

No. 1403

LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

HACE CONSTAR:

Que el señor DELGADO CIPAGAUTA JAINER identificado con cédula de ciudadanía número 96,362,687 de Morelia (Caquetá), labora en esta empresa desde 05 septiembre 2023 hasta 04 de octubre 2024, desempeñando el cargo de TECNICO ELECTRICISTA LINIERO con un salario de DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2,111,742) M/Cte, con un contrato a Término Fijo.

Se expide la presente a solicitud del interesado, Jamundí (Valle) a los 05 días de octubre 2024.

JAINER DELGADO CIPAGAUTA
CC96 362 687

Atentamente,

HESEGO

María Fernanda Araque Ortiz
Directora Gestion Humana y Bienestar
NIT 900502031-8



NIT 900.502.031-8
Carrera 14 # 3 sur – 35 Barrio Riberas del Rosano
Jamundí (Valle del Cauca)
322 515 57 22
gerencia@hesegoingeniera.com
www.hesegoingeniera.com

Powered by CamScanner

CODUESA SAS

Nit. 830.019.047-0

CERTIFICADO LABORAL

Me permito certificar que el señor **JAINER DELGADO CIPAGAUTA** portador de la cédula de ciudadanía **No. 96.362.687** laboro en esta compañía.

Cargo:	LINIERO DE REDES
Fecha ingreso:	Noviembre 13 de 2014
Fecha retiro:	Agosto 15 de 2015
Eps:	Coomeva
Pensiones:	Porvenir
Cesantías:	porvenir

Se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente;

CODUESA
Nit. 830.019.047-0

Diana Katherine Acosta Contreras
Auxiliar Contable

OBRAS Y DISEÑOS S.A.

OBRAS Y DISEÑOS S.A.

NIT. 800.101.333-3

CERTIFICA

Que el señor (a)**DELDADO CAPAGAUTA JAINER,** identificado (a) con Cédula No. 9636268 7 de Morelia, labora en nuestra compañía con contrato por Obra y Labor desde el 16 de Mayo de 2017, desempeñando el cargo de **LINIERO DE REDES** con un ingreso básico mensual de **$ 737.717 (SETENCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE)**. Más un total en bonos de **$ 531.254 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE)**.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los Veintidós (22) días del mes de Agosto de 2017 a solicitud del interesado.

Atentamente,

CAROLINA HOSPITAL G.
Jefe de Gestión Humana

www.obrasydisenos.com.co

CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.

NIT. 830.058.272-8

CERTIFICA QUE:

El (a) señor (a) **DELGADO CIPAGAUTA JAINER**, con la cédula de ciudadanía número No. **96362687**, laboró para nuestra Compañía con un **CONTRATO DE OBRA Y/O LABOR** desde el **13 de marzo de 2020** hasta **05 de octubre de 2020**, desempeñando el cargo de **TECNICO DE LINEA DESENERGIZADA.**

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a solicitud del interesado, el día 26 de octubre de 2020.

Cordialmente.

CAROLINA GUERRA CABRERA
COORDINADORA DE NOMINA Y CONTRATACION
ELABORÓ KATHERINE ROJAS

MONTAJES J.M. S.A.

LA COORDINACIÓN DE GESTION HUMANA

DE

MONTAJES JM

1390-2018

CERTIFICA

Que el(la) Señor(a) DELGADO CIPAGAUTA JAINER identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 96.362.687, laboro en nuestra compañia de acuerdo a la(s) siguiente(s) caracteristica(s) de contrato(s).

- Contrato de trabajo Obra o Labor Contratada desde el dia 16 de Febrero de 2018 hasta el 31 de Julio de 2018, desempeñando el cargo de LINIERO LINIA DESENERGIZADA

Se expide la presente certificacion en la ciudad de Bogotá, a los 31 dias del mes de Julio de 2018.
Cordialmente.

VILLALOBOS TINOCO ZULMA XIMENA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

MONTAJES J.M. S.A.

Nit. 844.000.670-7
Via Villeta Cota Km. 1.5 Frente al cruce de Tenjo - Finca el Recreo Vereda Vuelta Grande
Yopal: Casanare | Carrera 27A No. 18-40 Int. 1
PBX: (1) 896 6768
(57) 634 0600
Correo Electronico: ingenieria@montajesjm.com
Web site: www.montajesjm.com

CERTIFICACIÓN LABORAL

Certificamos que la Señor (a), ***JAINER DELGADO CIPAGAUTA*** *identificado con la cédula de ciudadanía No. 96.362.687 expedida en Morelia (Caquetá), laboro en nuestra empresa desempeñando el cargo de* ***LINIERO****, desde el 05 de Octubre del 2020 hasta el 24 de Octubre del 2021.*

Durante este tiempo demostró responsabilidad y cumplimiento con las labores asignadas.

Para constancia se firma en Espinal (Tolima), a los Cinco (05) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

PROING S.A. NIT. 800.093.320-2

GESSLER ACOSTA OLIVEROS.
Administrador de obra.
*Celular 321-9208612**3186485400*
Cra 4 # 12-34 B/ Centro
Espinal Tolima

De conformidad con la obligación "declaración" del C.S.T.

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) JAINER DELGADO CIPAGAUTA identificado(a) con CC 96362687 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 05/12/2024

Estado de la Afiliación: Vigente

IPS: E.S.E. HOSPITAL SUMAPAZ

Categoría: SISBEN_1

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 12 días del mes 12 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

ARL | sura

Medellín, 16 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ENERGY GUILD S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 OPERATIVOS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C96362687	DELGADO CIPAGAUTA JAINER	17/12/2024		20913522	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/12/2024 22:28:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.33.47, 198.143.41.39, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

669481-96362687-6

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

El señor **JAINER DELGADO CIPAGAUTA** identificado con cedula de ciudadania No. **96.362.687** se encuentra afiliado a esta Entidad como **DEPENDIENTE** en la modalidad de SERVICIOS por intermedio de la empresa **ENERGY GUILD S.A.S** Nit No. **901.384.307** , con fecha de ingreso el 17 del mes de Diciembre de 2024.

Dicha certificación se expide a los 18 días del mes de Diciembre del año 2024.

Atentamente,

MARIA ISABEL DIAZ GARZON
JEFE DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y SUBSIDIO

Valparaíso Caquetá, 16 de diciembre de 2024.

Señores

ENERGY GUILD SAS
NIT: 901384307-1
Carlos Ferley Ramírez Usaquén
Representan Legal.

Asunto: Respuesta solicitud cambio de hoja de vida personal mínimo.

Actuando en calidad de supervisora dentro proceso de selección No. MC-044-2024, por intermedio del presente me permito pronunciarme sobre la solicitud de cambio de hoja de vida del personal Técnico Electricista, en los siguientes términos:

1. El proponente presento con su propuesta hoja de vía del Técnico Electricista **OSWALDO ALIRIO QUIROGA**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 3.246.251.

2. Mediante solicitud de fecha 13 de diciembre de 2024, el contratista **ENERGY GUILD SAS,** presentó solicitud de cambio de la hoja de vida, para lo cual presento nueva hoja de vida del Técnico Electricista **JAINER DELGADO CIPAGAUTA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.362.687.

3. El requisito establecido en la Invitación Publica indica:

#	Cargo	No. Cargos	Formación académica	Experiencia	Porcentaje de dedicación
1	DIRECTOR DE OBRA	1	Ingeniero en energía, tecnólogo en supervisión de redes de distribución de energía eléctrica y técnico electricista con tarjeta CONTE.	Un (01) año de experiencia general contados a partir de la fecha de vigencia de la matrícula profesional.	20%

2	Residente Electricista	1	Técnico Electricista con tarjeta CONTE.	Un (01) año de experiencia general contados a partir de la fecha de vigencia de la matrícula profesional.	100%

4. Se procedió a verificar la hoja de vida del señor **JAINER DELGADO CIPAGAUTA,** a fin de corroborar si el perfil cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Invitación Publica.

5. Una vez analizada la documentación presentada por el contratista de obra, se determinó que la hoja de vida del señor **JAINER DELGADO CIPAGAUTA**, cumple con los requisitos mínimos establecidos.

En mérito de lo expuesto, se da concepto favorable al cambio de la hoja de vida solicitada por el contratista de obra.

Cordialmente,

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

LISTA DE CHEQUEO / HOJA DE RUTA PAGOS

CONTRATISTA: **ENERGY GUILD SAS**

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 007-2024

PAGO No. UNICO PAGO

DOCUMENTOS REQUISITO DESDE EL PRIMER AL PENULTIMO PAGO			
SUPERVISION	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1. Informe y Certificado (Supervisor y/o Interventor)			
2. Informe de Actividades (Contratista)			
3. Planilla de SSS (Verificada SECOP II)			
4. Factura Electrónica o Documento Soporte			
5. Rut (Último Mes)			
6. Copia de Cámara de Comercio (Persona Jurídica)			
DOCUMENTOS REQUISITO ULTIMO PAGO			
ACTA DE CIERRE DE CONTRATO /SEGÚN APLIQUE) *			
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTRO O DE OBRA /SEGÚN APLIQUE)			
ACTA DE RECIBO DE ALMACEN si aplica *			
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES *			
ACTA DE LIQUIDACION DE ACUERDO AL TIPO DE CONTRATO *			

SECRETARIA DE HACIENDA	**Fecha / Hora de Recibo**	
Secretaria de Hacienda		
NOTA: En caso de devolución:		
Fecha / Hora Devolución:		
Nombre Quien Devuelve:		

Descripción	**Cumple**	**No Cumple**	**Fecha**
1. Aportó los documentos modificados			

OFICNA DE CONTRARACION	**Fecha / Hora de Recibo**	
Aprobación/Oficina de Contratación		
NOTA: En caso de devolución:		
Fecha / Hora Devolución:		
Nombre Quien Devuelve:		

Descripción	**Cumple**	**No Cumple**	**Fecha**

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**UNICO PAGO**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA ALGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	SI	
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?	SI	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO**
ÁREA	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
CARGO	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
MUNICIPIO	VALPARAISO

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

CONTRATO DE OBRA	007 de 2024
FECHA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE EL 2024
CONTRATISTA	ENERGY GUILD S.A.S NIT. 901384307-1
NIT:	901.384.307-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.117.503.6 80 de Florencia - Caquetá
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	CERO PESOS ($ 0.00) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE
PLAZO EJECUTADO	Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2024

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
POLIZA CUMPLIMIENTO	No. 560-47-994000185525, Diecisiete (17) de Diciembre del 2024
POLIZA RCE. EXTRACONTRACTUAL	No. 560-74-994000034040, Expedida el Diecisiete (17) de Diciembre del 2024.
FECHA DE APROBACION	17 de Diciembre de 2024
CDP No. 560 del Veintinueve (29) de Noviembre del 2024	**RP No.** 851 del Once (11) de diciembre del 2024
OBJETO: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA".	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

CONTRATO DE OBRA	007 de 2024
FECHA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE EL 2024
Duración Inicial	Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024
Periodo Ejecutado	Desde el 17 al 26 de Diciembre de 2024
Fecha de Terminación	26 de Diciembre de 2024
Porcentaje Ejecutado	100%
Valor Inicial Del Contrato	**$ 27.973.776,00 M/CTE**
Valor Adición Del Contrato	**$ 0.00 M/CTE**
Valor Total Del Contrato	**$ 27.973.776,00 M/CTE**
Valor Ejecutado	**$ 27.973.776,00 M/CTE**
Valor a Pagar Único Pago	**$ 27.973.776,00 M/CTE**
Saldo a Favor del Municipio	**$ 0.00 M/CTE**

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL Contratista **ENERGY GUILD S.A.S NIT. 901384307-1** representado por **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales por lo tanto se acepta el informe.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor

		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	Elaborar oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el interventor del mismo.	**100%**	BUENO	NINGUNA
2	Presentar los documentos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
3	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	**100%**	BUENO	NINGUNA
4	Realizar el pago por concepto de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y parafiscales según el caso	**100%**	BUENO	NINGUNA
5	Cumplir con el objeto del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
6	Cumplir con la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
7	Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por el interventor o supervisor de las obras que son objeto de la presente contratación.	**100%**	BUENO	NINGUNA
8	Atender de manera inmediata las observaciones que correspondan por el objeto contratado por parte del interventor o el supervisor.	**100%**	BUENO	NINGUNA
9	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o en trabamientos tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
10	Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	**100%**	BUENO	NINGUNA
11	Informar inmediatamente al Municipio, y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
12	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
13	Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
14	Presentar informe de las actividades desarrolladas en cumplimento del objeto contractual, con las respectivas evidencias fotográficas, planillas de atención, soporte de pago de estampillas y pago de seguridad social.	**100 %.**	BUENO	NINGUNA

15	Las demás que sean inherentes y necesarias a la ejecución de este contrato, es decir, con el objetivo de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato	**100 %.**	BUENO	NINGUNA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	NINGUNA

2.1 GRADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES			
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	m	45,00	$ 32.767,00	$ 1.474.515
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	Und	4,00	$ 251.700,00	$ 1.006.800
1,3	Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	Und	2,00	$ 1.218.010,00	$ 2.436.020
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	und	4,00	$ 560.075,00	$ 2.240.300
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	m	60,00	$ 28.392,00	$ 1.703.520
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	m	28,00	$ 239.102,00	$ 6.694.856
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	Und	1,00	$ 2.303.095,00	$ 2.303.095
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	m	20,00	$ 156.525,00	$ 3.130.500
1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	Und	1,00	$ 527.002,00	$ 527.002
	SUBTOTAL CAP 1 INSTALACIONES ELECTRICAS:				$ 21.516.608

COSTO DIRECTO		**$ 21.516.608**
ADMINISTRACION	25%	$ 5.381.337
IMPREVISTO	1%	$ 215.166
UTILIDAD	4%	$ 860.664
COSTO INDIRECTO		**$ 6.457.168**

COSTO TOTAL OBRA FISICA	**$ 27.973.776**

*Cuadro diligenciado por el contratista y por supervisor

3. PRODUCTOS

Producto a entregar	% de avance	Calificación	Observaciones
INFORME UNICO PAGO FINAL	**100 %.**	BUENA	NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- **NINGUNA**

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N.A.

*Cuadro diligenciado por el contratista

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE DICIEMBRE

ITEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	9479749611	**2025-01**	**2024 -12-30**	$437.600
PENSIÓN	9479749611	**2024-12**	**2024 -12-30**	$543.000
ARL	9479749611	**2024-12**	**2024 -12-30**	$342.800
CCF	9479749611	**2024-12**	**2024 -12-30**	$197.000
ICBF	9479749611	**2024-12**	**2024 -12-30**	$84.900
SENA	9479749611	**2024-12**	**2024 -12-30**	$56.600

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

BUENA 100% / 100%
Se observa buena disposición en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se proyecta que cumplirá con las mismas a la fecha de terminación del plazo de ejecución.

*Cuadro diligenciado por el supervisor

- **RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:**

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

CUENTA DE COBRO/FACTURA N.	**NO. FE 57 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2024**
PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	DICIEMBRE 9479749611
RP No.	851 del 11 de diciembre del 2024
INFORME DE ACTIVIDADES	**UNICO PAGO**
ANEXOS	**CUARENTA (40) FOLIOS**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Para constancia, se firma el día treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura	**ENERGY GUILD S.A.S - NIT. 901384307-1** **RL/ CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** C.C. **1.117.503.6 80** de Florencia - Caquetá

Proyectó: Ferney Camilo Pérez Morales Ing. Civil Apoyo a Supervisión de Obras	**Alcaldía Municipal** **Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro** **Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co** **Código Postal: 185050**
Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	
Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	

LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA - ALCALDIA DE VALPARAISO CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-2024

CERTIFICA:

Que, **ENERGY GUILD SAS,** identificada con Nit No. 901.384.307-1, representada legalmente por **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.503.608 de FLORENCIA-CAQUETA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales del CONTRATO DE OBRA No. 007-2024 que tiene objeto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA".

La presente certificación se expide para el desembolso del PAGO UNICO, por el periodo comprendido entre el 17 al 26 de diciembre de 2024, por un valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE** de conformidad con la cláusula **4.5** del contrato en referencia.

Dado en Valparaíso Caquetá, a los treinta **(30)** día del mes de diciembre de 2024.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Proyectó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.
Revisó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.
Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero-

ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

Valparaíso, 30 de diciembre de 2024

Ingeniera:
YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de planeación, desarrollo e infraestructura
Supervisor: Proceso mínima cuantía No. MC-044-2024
Contrato de obra #007-2024

Asunto: Informe final # 001 de 2024, ejecución de obra con contrato No. 007 -2024


Presento informe final de la ejecución de mínima cuantía No. MC-038-2024, cuyo objeto del contrato es: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO -CAQUETA.

Cordialmente,

Carlos Ferley Ramírez Usaquén
INGENIERO EN ENERGÍAS (UEAN)
Represéntate Legal de Energy Guild S.A.S
Celular: 310 634 2494
energyguildsas@gmail.com

CONTRATO DE OBRA NO. 007-2024 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024

"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO -CAQUETA."

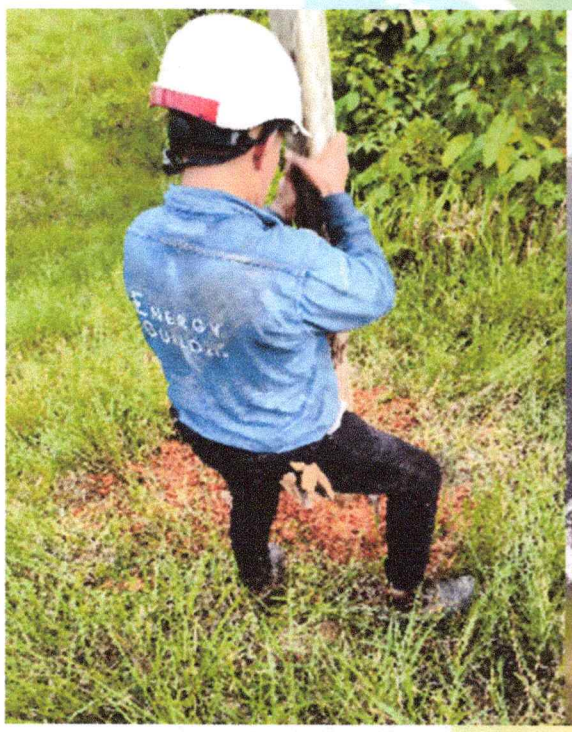



PERIDO
17 DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN.

En el mes de diciembre se llevó a cabo la planificación y ejecución del CONTRATO # 007-2024 la suma de VEINTE SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO -CAQUETA."**

Este informe presenta la información técnica y administrativa realizada en el periodo de intervención en cuanto a las actividades de obra relacionadas en el documento, actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre al 26 de diciembre del año de 2024, además de esta información que se ejecutó mediante el número del proceso: MC-044-2024

La ejecución de estas actividades tiene como Objetivos específicos:

1. Cambiar el conductor de la red baja tensión abierta por red trenzada aislada con la finalidad de brindar más seguridad a las personas, seres vivos y medio ambiente
2. Ampliar la capacidad de voltaje de la institución pasando de una acometida monofásica a una trifilar con la finalidad de conectar electro bomba
3. Facilitar las condiciones mininas para los estudiantes garantizando el agua en la institución
4. minimizar los riesgos eléctricos que presentaba la institución por el mal estado de la acometida eléctrica

2. Generalidades

Las adecuaciones y mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la escuela, tiene como finalidad mejorar las condiciones humanas para que los estudiantes puedan convivir en un ambiente con las mínimas condiciones para recibir sus clases, pues con las actividades ejecutadas se busca garantizar la llegada del agua a la escuela.

2.1 Localización del proyecto: las actividades estipuladas en contrato No. 007-2024 se realizaron en la institución educativa la RICO km 30 sede la Esmeralda del municipio de Valparaíso Caquetá



3. Información General del proyecto

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 17 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
Número de contrato de obra:	007-2024
OBJETO	Mantenimiento de instalaciones eléctricas de la infraestructura física de la institución educativa rural el rico km 30 sede la Esmeralda del Municipio de Valparaíso -Caquetá.
CONTRATISTA	Energy Guild S.A.S
NIT	901.384.307-1
REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Ferley Ramírez Usaquén
CONTRATANTE	municipio de Valparaíso, Caquetá

SUPERVISOR POR ALCALDÍA	Yessika Adriana Jiménez Forero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Ferney Camilo Pérez Morales
VALOR DEL PROCESO	VEINTE SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	sin anticipo
PLAZO	El plazo de ejecuci6n del contrato será de diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripci6n del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	17 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 de diciembre de 2024

4. Garantías

En el siguiente cuadro, se relacionan las Pólizas de Cumplimiento 560-47-994000185525 y Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual 560-74-994000034040 expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que amparan el Proceso mínima cuantía No. MC-044-2024

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO (CON CONVENIO)					
Descripción del Amparo	***Entidad***	***Vigencia desde***	***Vigencia Hasta***	***Suma Asegurada***	***No. de la Póliza***
Cumplimiento del contrato	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	11/12/2024	22/06/2025	$ 2.797.377,60	560-47-994000185525
Prestaciones sociales	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	11/12/2024	22/12/2027	$ 2.797.377,60	560-47-994000185525
Estabilidad de la obra	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	21/12/2024	21/12/2029	$ 2.797.377,60	560-47-994000185525
Extracontractual	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**	11/12/2024	21/12/2024	$ 260.000.000	560-74-994000034040

5. Personal mínimo de obra

Ítem	Cargo	Numero de cargo	Formación académica	Experiencia	Porcentaje de dedicación
1	Director de obra	1	Ingeniero en energías, Tecnólogo en supervisión de redes de distribución de energía eléctrica y técnico electricista con tarjeta CONTE	Un año de experiencia general contados a partir de la fecha de vigencia de la matricula profesional	20%
2	Residente electricista	1	Técnico electricista con tarjeta CONTE	Un año de experiencia general contados a partir de la fecha de vigencia de la matricula profesional	100%

- **Personal que participo en la ejecución del proyecto**

ITEM	NOMBRE	APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	AFILIACIÓN EPS	AFILIACIÓN PENSIÓN	AFILIACIÓN ARL
1	Carlos Ferley	Ramírez Usaquén	1.117.503.680	Director de obra	Sanitas	Porvenir	Sura
2	Jainer	Delgado Cipagauta	96.362.687	Residente electricista	Nueva EPS	Porvenir	Sura

6. Control de equipos

EQUIPOS EN OBRA	
EQUIPOS	**CANTIDAD**
Escaleras multifuncional	2
Escalera dieléctrica	1
HERRAMIENTA MENOR	6




Equipos eléctricos (pulidora, roto martillo, telurómetro, pistola de calor y pinzas de medición



Escalera multifuncional



Herramienta menor

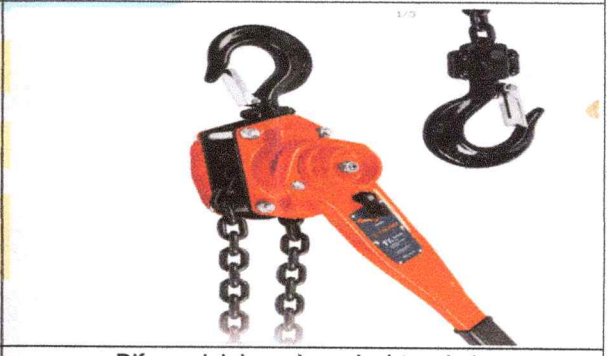

Diferencial de cadena de 1 tonelada

7. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS Y CANTIDADES INICIALES

El contrato de obra No. 007-2024 del 17 de diciembre del 2024 fue suscripto bajo las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	m	45	$ 32.767	$ 1.474.515
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	Und	4	$ 251.700	$ 1.006.800
1,3	Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	Und	2	$ 1.218.010	$ 2.436.020
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	und	4	$ 560.075	$ 2.240.300
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	m	60	$ 28.392	$ 1.703.520
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	m	28	$ 239.102	$ 6.694.856
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	Und	1	$ 2.303.095	$ 2.303.095
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	m	20	$ 156.525	$ 3.130.500
1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	Und	1	$ 527.002	$ 527.002
			VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 21.516.608
			ADMINISTRACION 25%		$ 5.381.337
			IMPREVISTOS 1%		$ 215.166
			UTILIDAD 4%		$ 860.664
			TOTAL AIU 30%		$ 6.457.168
			VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**$ 27.973.776**

8. Características técnicas del proyecto

El objeto del contrato 007-2024 es el "mantenimiento de instalaciones eléctricas de la infraestructura física de la institución educativa rural la rico km 30 sede la Esmeralda del Municipio de Valparaíso -Caquetá"

Para dar cumplimiento al proceso # MC-044-2024 se realizarán las siguientes actividades:

- **Suministro e instalación de red trenzada:** Se realiza el suministro y la instlación de 45 metros de red trenzada con dos fases y un (1) neutro con la finalidad de realizar ampliación de carga en la acometida de la escuela

- **Suministro e instalación de estructura retención baja tensión:** Se realizado el suministro y armando de estructuras de retención con la finalidad de retencionar el conductor sin que se afectara la estructura
- **Suministro e instalación Caja de Derivación en Policarbonato Trifásico 6 Usuarios - Monofásico 12 Usuarios:** Se realiza la instalación de cajas de derivación con la finalidad de realizar conexiones eléctricas seguras y técnicas en la parte superior del poste
- **Suministro e instalación de retenida en baja tensión:** Se realiza instalación de tenidas para dar estabilidad a la estructura en el momento de realizar fuerza mecánica para tensionar el conductor
- **Retiro de red existente en baja tensión:** Se realiza retiro de red baja tensión que se encuentra en mal estado
- **Suministro e instalación de cable cobre concéntrico de 2*8+8:** Se realiza la instalación de cable para la acometida de la escuela.
- **Suministro e instalación de acometida bifásica:** Se realiza instalación de acometida bifásica con la finalidad de garantizar nivel de tensión con 2 fases a 220V y se esa manera poder conectar la electro bomba.
- **Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario:** Se instala ductería EMT a la vista para construir circuitos dedicados para la alimentación de la electro bomba
- **Suministro e instalación de punto eléctrico electro bomba:** Se construye punto eléctrico a 220v para conexión de electro bomba

9. Cronograma de actividades

A continuación, se comparte el cronograma de actividades para el desarrollo del contrato de obra # 007-2024

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PORYECTO		
#SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2
DÍAS POR SEMANA	17/12/2024 AL 22/12/2024	23/12/2024 AL 27/12/2024
PLANIFIACIÓN	17 AL 20	
CONSECUCIÓN DE MATERIALES	17 AL 22	
EJECUCIÓN EN ZONA DE TRABAJO	17 AL 27	
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA	17/12/2024 AL 27/12/2024	

10. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL							
		CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES FINALES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA	
1	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	m	45,00	32.767,00	1.474.515			$ -	45,00	$ 1.474.515,00	45,00	$ 1.474.515,00
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	Und	4,00	251.700,00	1.006.800				4,00	$ 1.006.800,00	4,00	$ 1.006.800,00
1,3	Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	Und	2,00	1.218.010,00	2.436.020				2,00	$ 2.436.020,00	2,00	$ 2.436.020,00
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	und	4,00	560.075,00	2.240.300				4,00	$ 2.240.300,00	4,00	$ 2.240.300,00
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	m	60,00	28.392,00	1.703.520				60,00	$ 1.703.520,00	60,00	$ 1.703.520,00
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	m	28,00	239.102,00	6.694.856				28,00	$ 6.694.856,00	28,00	$ 6.694.856,00
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	Und	1,00	2.303.095,00	2.303.095				1,00	$ 2.303.095,00	1,00	$ 2.303.095,00
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	m	20,00	156.525,00	3.130.500				20,00	$ 3.130.500,00	20,00	$ 3.130.500,00
1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	Und	1,00	527.002,00	527.002				1,00	$ 527.002,00	1,00	$ 527.002,00
	SUBTOTAL CAP 1 INSTALACIONES ELECTRICAS :				$ 21.516.608			$ -		$ 21.516.608		$ 21.516.608


VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 21.516.608	$ -	$ 21.516.608	$ 21.516.608
VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 21.516.608	$ -	$ 21.516.608	$ 21.516.608
ADMINISTRACION	25%	$ 5.381.337	$ -	$ 5.381.337	$ 5.381.337
IMPREVISTOS	1%	$ 215.166	$ -	$ 215.166	$ 215.166
UTILIDAD	4%	$ 860.664	$ -	$ 860.664	$ 860.664
TOTAL AIU	30%	$ 6.457.168	$ -	$ 6.457.168	$ 6.457.168
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		$ 27.973.776	$ -	$ 27.973.775,70	$ 27.973.775,70

VALOR EN LETRAS
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	30

11. Descripción de actividades ejecutadas


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	M	45

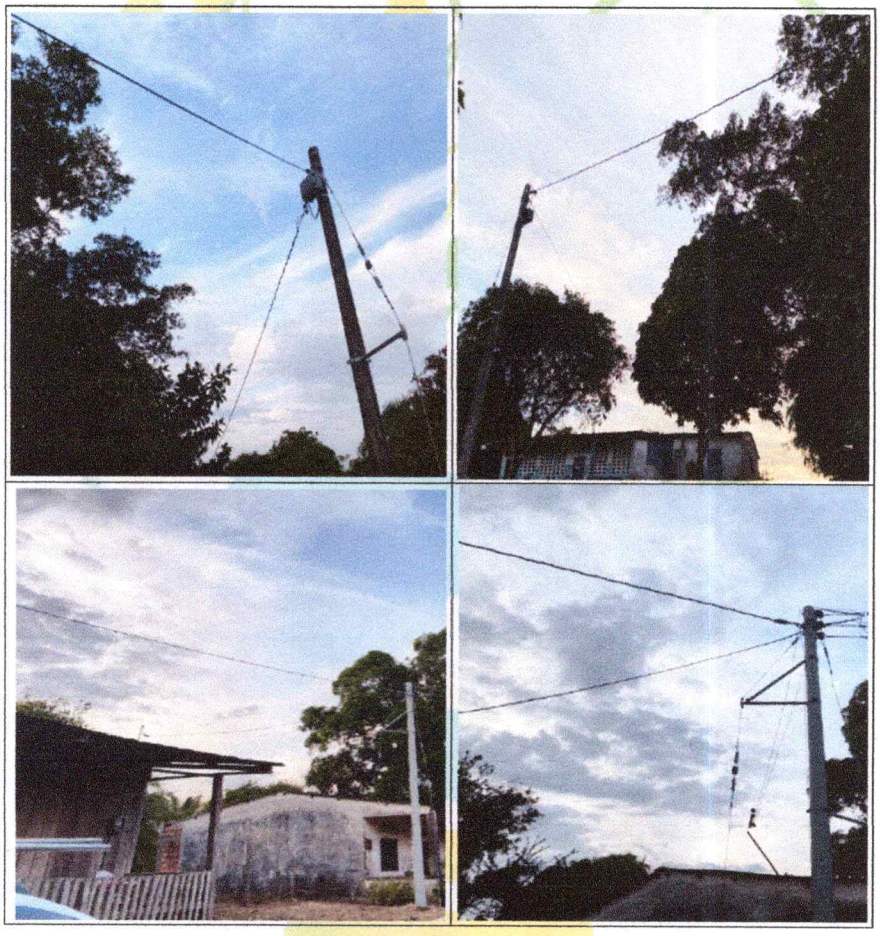

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	UND	4




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,3	Suministro e instalación Caja de Derivación en Policarbonato Trifásico 6 Usuarios - Monofásico 12 Usuarios	UND	2

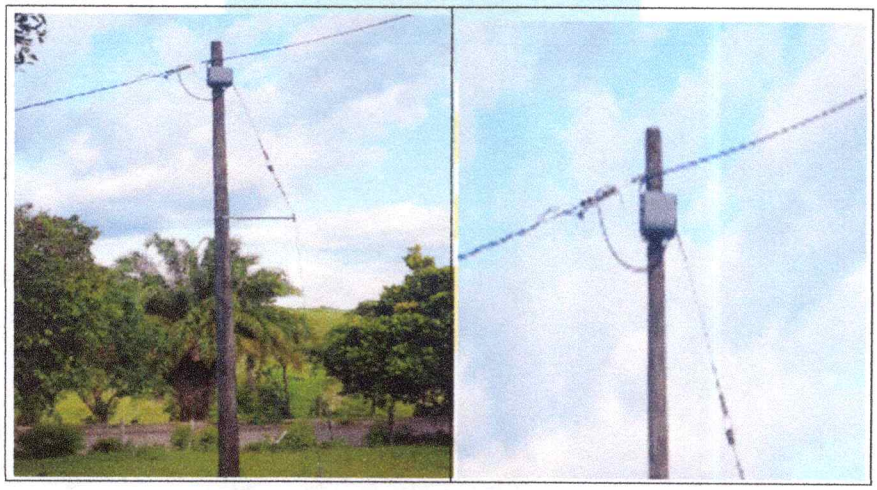

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	UND	4




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	MTS	708

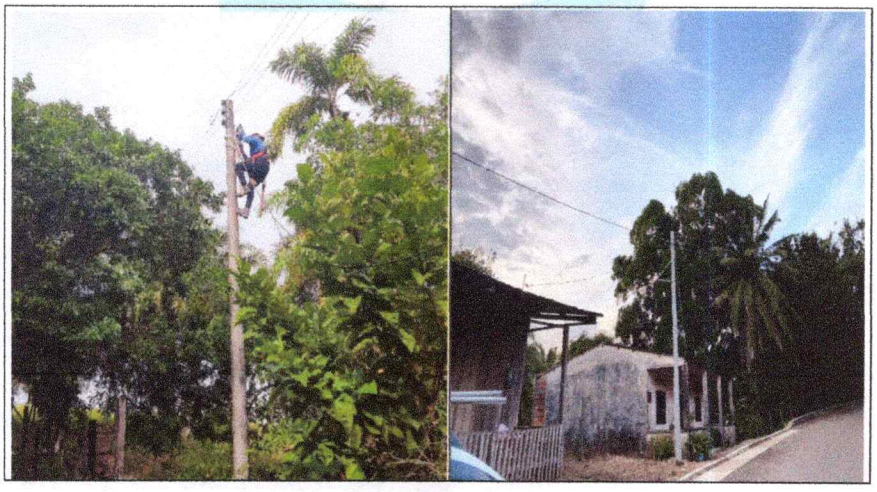

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concéntrico de 2*8+8	M	28




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	UND	1

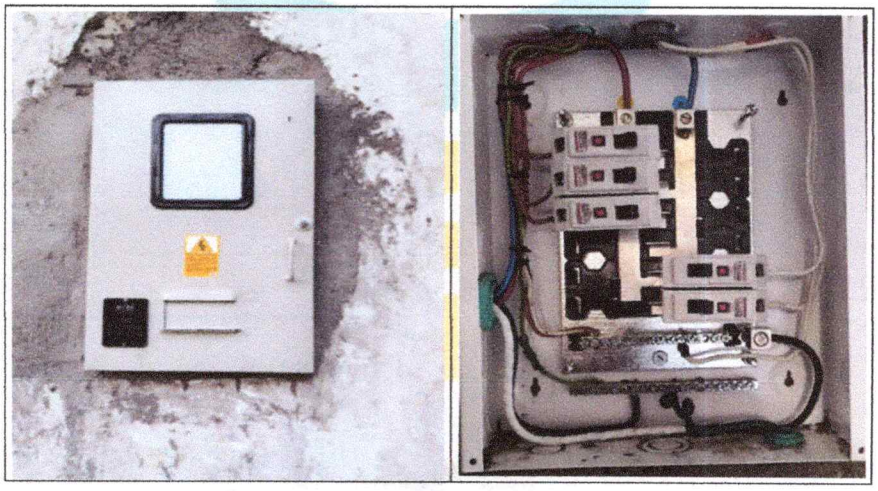


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	M	20



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1,9	Suministro e instalación de punto eléctrico electro bomba	UND	1

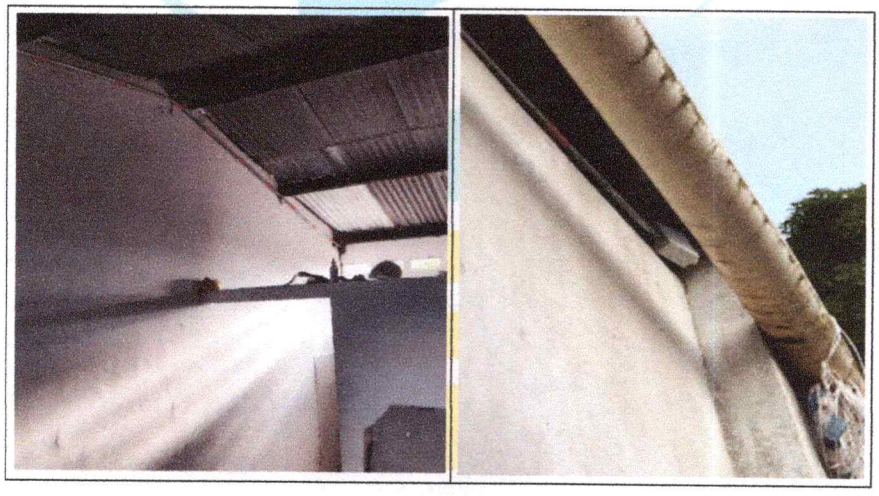

- **Soporte fotográfico**

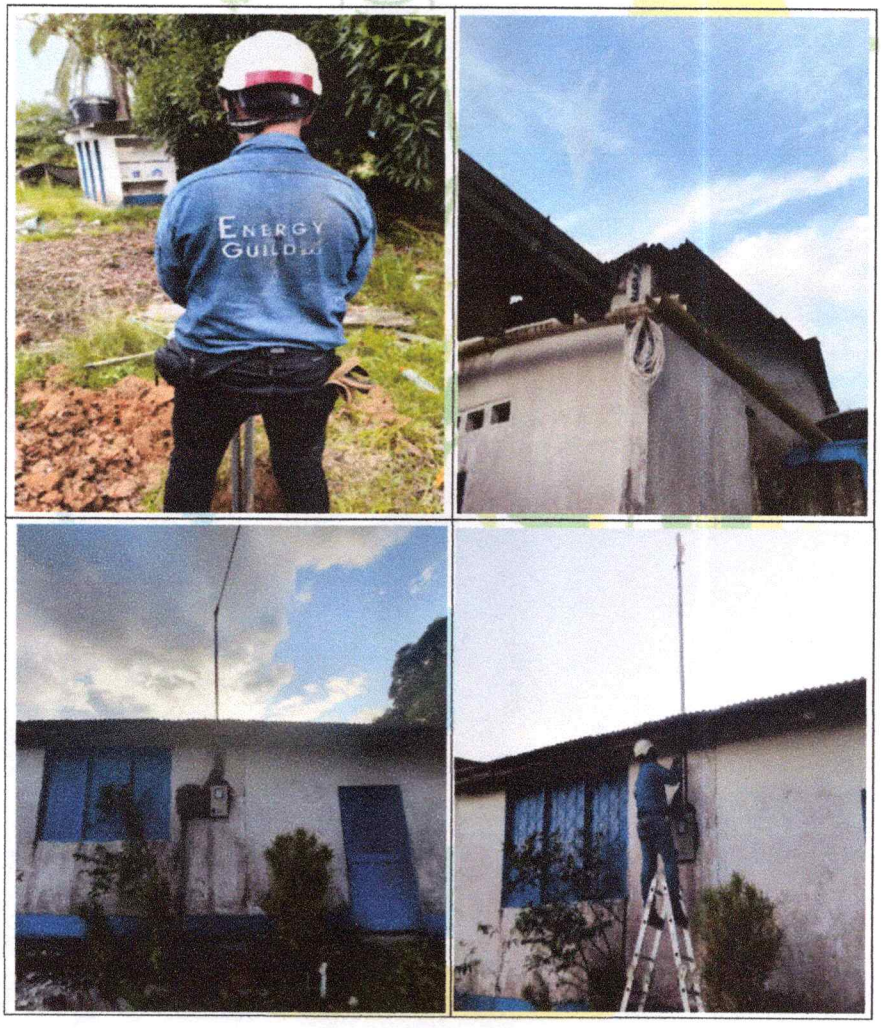



12. SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa planilla de seguridad social

13. BITACORA

Se anexa copia de bitácora del 17 de diciembre al 27 de diciembre de 2024

14. Conclusiones

El desarrollo de la inversión en este proyecto estratégica y sostenible para mejorar la calidad de vida de los niños y docentes, con este proyecto se garantiza el suministro de agua para la institución educativa.

Carlos Ferley Ramírez Usaquén
INGENIERO EN ENERGÍAS (UEAN)
Represéntate Legal de Energy Guild S.A.S
Celular: 310 634 2494
energyguildsas@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

CONTRATO DE OBRA N° 007 -2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO -CAQUETA.

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA — **FECHA ACTA: 26/12/2024**

UBICACIÓN: Municipio de Valparaiso

CONTRATISTA:	**ENERGY BUILD S.A.S/ RL CARLOS FERLEY RAMIREZ**	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	**$ 27.973.776**	**FECHA DE INICIO:**	**17 de diciembre de 2024**
NIT Y/O C.C.	**901.384.307-1**	**VALOR ADICIONAL:**	**0**	**PLAZO INICIAL:**	**Un (01) Mes**
DIRECCIÓN:	**Calle 11 No. 3-47 Barrio el Centro Vaparaiso Caqueta**	**VALOR FINAL CONTRATO:**	**$ 27.973.776**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	**N/A**
TELÉFONO:	**312 435 61 33**	**VR. ANTICIPO:**	**0**	**PLAZO TOTAL:**	**Un (01) Mes**
SUPERVISOR:	**YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO**	**VALOR A PAGAR:**	**0**	**FECHA REINICIO No. 1**	**N/A**
C.C.	**1.117.522.940 de Florencia (Caquetá)**	**ACTA No.**	**N/A**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**jueves, 26 de diciembre de 2024**
CARGO	**Secretaria De Planeación, Desarrollo E Infraestructura**	**ACTA No.**	**N/A**	**FECHA PRORROGA No. 1**	**N/A**
DIRECCIÓN	**Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro**	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:**	**0**	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	**jueves, 26 de diciembre de 2024**

En Valparaiso - Caquetá a los 26 días del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** Secretaria de Planeacion, Desarrollo e Infraestructura del Municipio en calidad de Supervisora, el ing.**FERNEY CAMILO PEREZ MORALES** en calidad de Apoyo a la Secretaría de Planeación y **ENERGY GUILD S.A.S** con NIT: 901384307-1, Representado Legalmente por el ingeniero **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN,** identificado con cedula de ciudadanía N°. 1.117.503.6 80 de FLORENCIA - CAQUETA y M.P 091180-0612086 CND, en calidad de contratista vinculado mediante Contrato de Obra N°. 007 - 2024; ; para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de Obra de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES FINALES EJECUTADAS	
		UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
1,1	Suministro e instalación de red trenzada	m	45,00	$ 32.767,00	$ 1.474.515			$ -	45,00	$ 1.474.515,00
1,2	Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	Und	4,00	$ 251.700,00	$ 1.006.800			$ -	4,00	$ 1.006.800,00
1,3	Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	Und	2,00	$ 1.218.010,00	$ 2.436.020			$ -	2,00	$ 2.436.020,00
1,4	Suministro e instalación de retenida en baja tensión	und	4,00	$ 560.075,00	$ 2.240.300			$ -	4,00	$ 2.240.300,00
1,5	Retiro de red existente en baja tensión	m	60,00	$ 28.392,00	$ 1.703.520			$ -	60,00	$ 1.703.520,00
1,6	Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	m	28,00	$ 239.102,00	$ 6.694.856			$ -	28,00	$ 6.694.856,00
1,7	Suministro e instalación de acometida bifásica	Und	1,00	$ 2.303.095,00	$ 2.303.095			$ -	1,00	$ 2.303.095,00
1,8	Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	m	20,00	$ 156.525,00	$ 3.130.500			$ -	20,00	$ 3.130.500,00
1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	Und	1,00	$ 527.002,00	$ 527.002			$ -	1,00	$ 527.002,00
	SUBTOTAL CAP 1 INSTALACIONES ELECTRICAS:				$ 21.516.608					$ 21.516.608,00

COSTO DIRECTO		**$ 21.516.608**		**$ -**		**$ 21.516.608**
ADMINISTRACION	25%	$ 5.381.337		$ -		$ 5.381.337
IMPREVISTO	1%	$ 215.166		$ -		$ 215.166
UTILIDAD	4%	$ 860.664		$ -		$ 860.664
COSTO INDIRECTO		**$ 6.457.168**		**$ -**		**$ 6.457.168**

COSTO TOTAL OBRA FISICA		**$ 27.973.776**		**$ -**		**$ 27.973.776**

VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES:	$ 0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 27.973.776	SON:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
VALOR POR AMORTIZAR DEL VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00	SON:	CERO PESOS M/CTE
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO:	**$ 0,00**	SON:	**CERO PESOS M/CTE**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	**$ 27.973.776**	SON:	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Supervision, el apoyo a la supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor.

V.B. SUPERVISOR

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeacion, Desarrollo e infraesctructura
Municipio de Valparaiso Caqueta

EL CONTRATISTA:

ENERGY BUILD S.A.S - NIT. 901384307-1
RL/ CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
CONTRATISTA DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISION:

FERNEY CAMILO PEREZ MORALES
Ing. Civil Apoyo a la supervisión
Municipio de Valparaiso Caqueta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	m
ITEM:	1,1 Suministro e instalación de red trenzada	CANTIDAD:	45

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de red trenzada						45,00	m	45,00
				Aproxima Resultado a :	2	Decimales	TOTAL	45,00

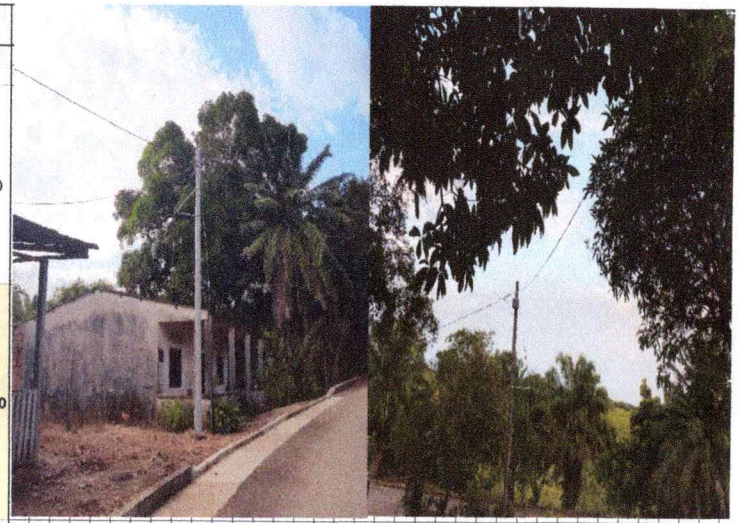

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FC
Revisó y A
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestr
Municipio de Valparaiso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	Und
ITEM:	1,2 Suministro y armado de estructura baja tensión de retención	CANTIDAD:	4

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro y armado de estructura baja tensión de retención						4,00	Und	4,00
				Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL 4,00

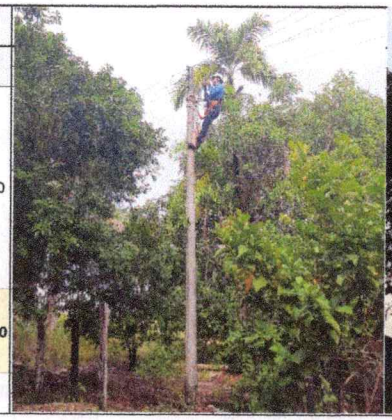

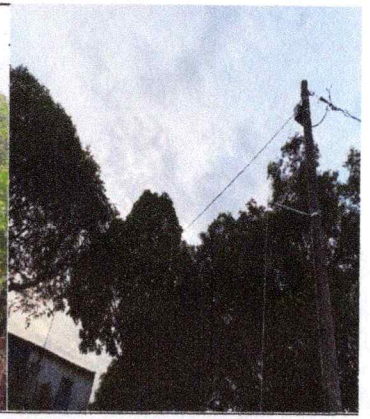

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FO
Revisó y Ap
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	Und
ITEM:	1,3 Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios	CANTIDAD:	2

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalción Caja de Derivacion en Policarbonato Trifasico 6 Usuarios - Monofasico 12 Usuarios						2,00	Und	2,00
				Aproxima Resultado a :	2 Decimales		TOTAL	2,00



Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FO
Revisó y Ap
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Cac

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	und
ITEM:	1,4 Suministro e instalación de retenida en baja tensión	CANTIDAD:	4

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de retenida en baja tensión						4,00	und	4,00
			Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL	4,00



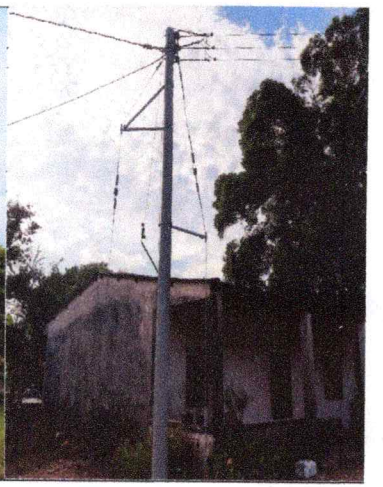

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FO
Revisó y Ap
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO		INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	m
ITEM:	1,5	Retiro de red existente en baja tensión	CANTIDAD:	60

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Retiro de red existente en baja tensión						60,00	m	60,00
			Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL	60,00



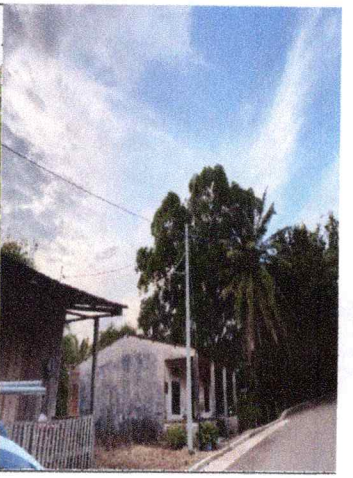

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FC
Revisó y A
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestr
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	m
ITEM:	1,6 Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8	CANTIDAD:	28

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de cable cobre concentrico de 2*8+8						28,00	m	28,00
				Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL 28,00

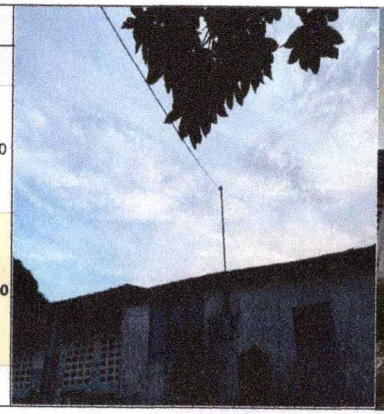

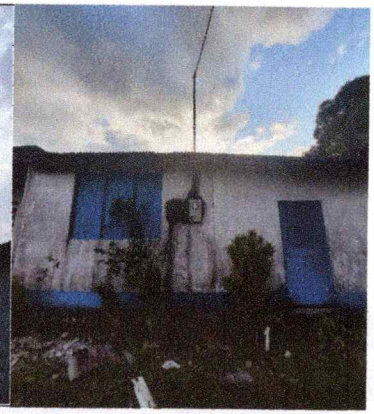

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FC
Revisó y A
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestr
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	Und
ITEM:	1,7 Suministro e instalación de acometida bifásica	CANTIDAD:	1,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de acometida bifásica						1,00	und	1,00
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	1,00

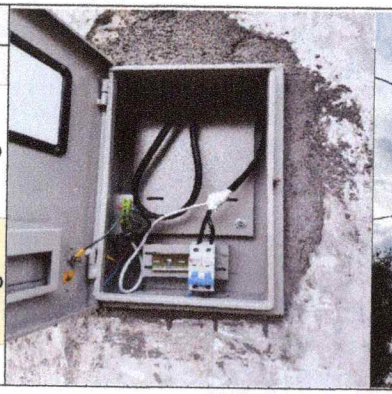

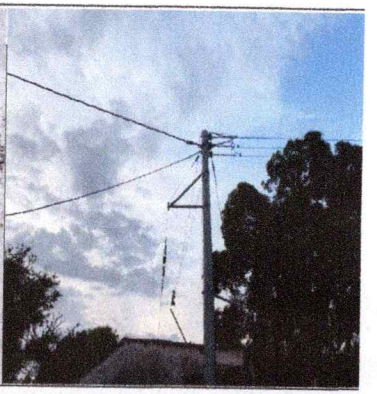

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FC
Revisó y A
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	UNIDAD:	m
ITEM:	1,8 Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario	CANTIDAD:	20

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de cable y ductos EMT de conexión de caja de CTO a poste segundario						20,00	m	20,00
				Aproxima Resultado a :	2 Decimales		TOTAL	20,00



Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

Jainer Delgado
JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FO
Revisó y Ap
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Ca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		UNIDAD:	Und
ITEM:	1,9	Suministro e instalación de punto electrico electro bomba	CANTIDAD:	1

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
Suministro e instalación de punto electrico electro bomba						1,00	m	1,00
			Aproxima Resultado a :	2	Decimales		TOTAL	1,00

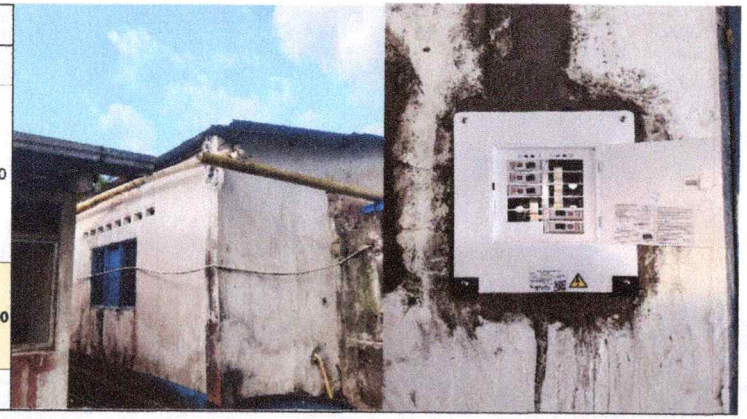

Observaciones:

ING. CARLOS FERLEY RAMÍREZ USAQUÉN
DIRECTOR DE OBRA
R.L ENERGY GUILD S.A.S

JAINER DELGADO
TEC. EELCTRICSTA

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FO
Revisó y Ap
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestru
Municipio de Valparaíso Ca

CONTRATO DE OBRA N°001-2024

BITACORA DE EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.

NUMERO DE PROCESO MC-044-2024

17 de diciembre de 2024, Valparaíso Caquetá

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

En el municipio de Valparaíso, Caquetá, el día 17 de diciembre de 2024, siendo las 3:00 p.m., se realiza la reunión para establecer el Comité de Seguimiento para la ejecución del proyecto No. 007-2024, cuyo objeto es el desarrollo de las actividades estipuladas para el mantenimiento de las instalaciones de la infraestructura física de la Institución Educativa RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA. A continuación, se determina el personal encargado de dar seguimiento a las actividades desarrolladas por la compañía Energy Guild S.A.S., identificada con NIT 901384307-1.

Personal designado para el seguimiento del proyecto:

Nombre	Cedula de ciudadanía	Cargo	Rol designado para el proyecto
Luis Alberto Rojas Parra	1060206579	Testigo #1	Testigo #1
Alejandra Maria Cano	40079903	Testigo #2	Testigo #2
Dairo Melo	1118073022	Testito #3	Testigo #3
Carlos Ferley Ramírez Usaquén	1.117.503.680	Gerente y Representante legal de la empresa Energy Guild S.A.S	Director de Obra

De conformidad a lo anterior, se firma la presente acta:

Testigo #1
Nombre; Luis Alberto Rojas
C.C. 1060206579

Testigo #2
Nombre
C.C. 40079903

Testigo #3
Nombre ; Dairo Melo
C.C. 1118073022

Representante legal de la compañía
Carlos Ferley Ramírez Usaquén
C.C. 1.117.503.680

26 de diciembre de 2024, Valparaíso Caquetá

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

En el municipio de Valparaíso, Caquetá, el día 26 de diciembre de 2024, siendo las 2:00 p.m., se realiza la reunión del Comité de Seguimiento con el objetivo de recibir a conformidad el Proyecto No. 007-2024, objeto del contrato, Mantenimiento de instalaciones de la infraestructura física de la Institución Educativa RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA del municipio de Valparaíso — Caquetá.

Se deja constancia de que las actividades programadas han sido ejecutadas según lo acordado, y que los asistentes firman como soporte de conformidad con lo presentado.

Personal designado para el seguimiento del proyecto:

Nombre	Cedula de ciudadanía	Cargo	Rol designado para el proyecto
Luis Alberto Rojas Parra	1060206579	Testigo #1	Testigo #1
Alejandra Maria Cano	40079903	Testigo #2	Testigo #2
Daira Nulo	1118073022	Testigo #3	Testigo #3
Carlos Ferley Ramírez Usaquén	1.1 17.503.680	Gerente y Representante legal de la empresa Ener Guild S.A.S	Director de Obra

De conformidad a lo anterior, se firma la presente acta:

Testigo #1
Nombre; Luis Alberto Rojas
C.C. 1060206579

Testigo #2
Nombre
C.C. 40079903

Testigo #3
Nombre ; Daira Nulo
C.C. 1118073022

Representante legal de la compañía
Carlos Ferley Ramírez Usaquén
C.C. 1.117.503.680

ACTIVIDAD 17 de Diciembre del 2024

- Excavación para templetes
- Actividades administrativas
- Transporte de material

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 18 de Diciembre del 2024

- Excavación para templetes
- Armado de templetes
- Actividades administrativas
- Transporte de material

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 19 de Diciembre del 2024

- Instalacion de templetes
- Actividades administrativas
- Descargue de material

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 20 de Diciembre del 2024

- Instalación de templetes
- Actividades administrativas

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 21 de Diciembre del 2024

- Retiro de red baja tensión
- Actividades administrativas

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad zz de Diciembre del 2024

- Instalación red baja tensión trenzada
- Retencionado de red baja tensión trenzada
- Actividades administrativas
- Instalación caja de derivación en Policarbonato trifásico.

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 23 de Diciembre del 2024

- Instalación de loncheras en baja tensión
- Instalación de punto electrico
- Actividades administrativas
- Instalación de tubo EMT
- Instalación caja de derivación en policarbonato trifásico.

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad 24 de Diciembre del 2024

- Cierre de pases en baja tensión
- Instalación de tablero de circuitos
- Actividades administrativas
- Instalación de tubo EMT

Director de obra

JAINER DELGADO C.
Residente electricista

Actividad

25 de Diciembre del 2024

* No se opero

Director de obra

JAINER DELGADO C.

Residente electricista

Actividad 26 de Diciembre del 2024

- Instalación de cable de acometida
- Instalación de sistema puesta a tierra
- Actividades administrativas

Director de obra

JAINER DELGADO C.

Residente electricista

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384307	1	ENERGY GUILD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERGY GUILD SAS	CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares	PITALITO-HUILA	3114944879	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162449356	9479749611	E	2025/01/03	2024/12/30	NEQUI	0	$1,661,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
							$ 1.700.000	No	Fijo	COLFONDOS	14	$ 793.334	16%	SIN RIESGO	$ 127.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.000		NUEVA E.P.S.	14	$ 793.334	4%	$ 31.800	$
							$ 1.700.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		FAMISANAR	27	$ 1.530.000	12,5%	$ 191.300	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
																					$ 543.000						$ 437.600	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 162.500		COMFAMILIAR HUILA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 31.800		COMFAMILIAR HUILA	14	$ 793.334	4%	$ 31.800	ARL SURA	14	$ 793.334	6,96%	5	$ 55.300	14	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 191.300		COMFAMILIAR HUILA	27	$ 1.530.000	4%	$ 61.200	ARL SURA	27	$ 1.530.000	6,96%	5	$ 106.500	27	$ 1.530.000	2%	$ 30.600	3%	$45.900	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 52.000		COMFAMILIAR HUILA	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 437.600						$ 197.000						$ 342.800				$ 56.600		$ 84.900		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384307	1	ENERGY GUILD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERGY GUILD SAS	CARRERA 1a # 3 Sur 05 Manzanares	PITALITO-HUILA	3114944879	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162449356	9479749611	E	2025/01/03	2024/12/30	NEQUI	0	$1,661,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$543,000	$0	$0	$543,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$127,000	$0	$0	$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$342,800	$0	$0	$342,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$342,800	$0	$0	$342,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$197,000	$0	$0	$197,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	$197,000	$0	$0	$197,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$437,600	$0	$0	$437,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$191,300	$0	$0	$191,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$31,800	$0	$0	$31,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$84,900	$0	$0	$84,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$84,900	$0	$0	$84,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$56,600	$0	$0	$56,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$56,600	$0	$0	$56,600
TOTAL				4	$1,661,900	$0	$0	$1,661,900

2024/12/30 12:52 PM

Deisy Alexandra Bautista Flórez
Contador Público

CERTIFICACIÓN

Yo DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.095.806.632 de Floridablanca, actuando en calidad de contadora de la ENERGY GUILD S.A.S identificada con nit 901.384.307, certifico que se encuentra al día con salarios a trabajadores, liquidaciones y de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) que como empresa le corresponde hacer por los trabajadores vinculados por contrato laboral en los últimos seis (6) meses. Eso en cumplimiento del art. 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga, Santander a los 30 días del mes de diciembre del 2024.

Cordialmente,

DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ
C.C 1.095.806.632 de Floridablanca
T.P. 259577-T

318 6458491 asesoriasyasesoriascontables@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.095.806.632

BAUTISTA FLOREZ
APELLIDOS

DEISY ALEXANDRA
NOMBRES



ANEXO CERTIFICADO
PARAFISCALES ENERGY GUILD
S.A.S. NOVIEMBRE 2024



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1990


BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

11-NOV-2006 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2708200-00155030-F-1095806632-20090423 0010979946A 1 24151240



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

259577-T

DEISY ALEXANDRA
BAUTISTA FLOREZ
C.C. 1095806632
RES. INSCRIPCION 353 DEL 21/08/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270358 289622

Respaldo certificado de parafiscales
ENERGY GULD S.A.S.
NOVIEMBRE 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 4 0 8 6 0 A 6 C 1 9 0 B 0 D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY ALEXANDRA BAUTISTA FLOREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1095806632 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 259577-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	122666955	1157476304	27/12/2024

Número de Identificación
901384307

Primer Nombre ó Razón Social
ENERGY GUILD

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
HUILA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 1A No 3-05 SUR

Ciudad de Domicilio
Pitalito

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,310 6342494

Correo electrónico
energyguildsas@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Caqueta

Regional Centros SIIF
36-02-00-018-000000

Número Licencia de Obra
007-2014

Número Contrato de Obra
007-2024

Nombre Obra
Electrico Esmeralda

Fecha Inicio Obra
17/12/2024

Fecha Terminación Obra
26/12/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
Valparaiso Caqueta

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
21516608.00

Costo Total Mano de Obra
2145000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
53792.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
53792.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	122666955	1157476304	27/12/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901384307**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.97.10.77**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 53,792.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 53,792.00	COP$ 53,792.00

ecollect

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 007-2024 DEL 11 DE DICIEMBRE EL 2024

FECHA	26	DE	DICIEMBRE	DE	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR, Y CONTRATISTA ASUMEN PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

NÚMERO:	007	DE	11 DE DICIEMBRE EL 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	MINIMA CUANTIA MC-038-2024
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL VALPARAÍSO
NIT:	800.050.407-1
CONTRATISTA:	ENERGY GUILD SAS
NIT / CEDULA DE CIUDADANÍA:	Nit: 901.384.307-1
CDP INICIAL	560 del Veintinueve (29) de Noviembre del 2024
RP INICIAL	851 del Once (11) de diciembre del 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($27.973.776) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024

RIESGOS AMPARADOS:	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA -RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
NÚMERO DE PÓLIZAS:	Cumplimiento No. 560-47-994000185525, Diecisiete (17) de Diciembre del 2024 Extra Contractual No. 560-74-994000034040, Expedida el Diecisiete (17) de Diciembre del 2024.
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS:	Diecisiete (17) de Diciembre del 2024 – Contrato.
FECHA DE INICIO:	Diecisiete (17) de Diciembre del 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	veintiséis (26) de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	veintiséis (26) de diciembre de 2024

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Valparaíso Departamento del Caquetá, se reunieron **YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** secretaria De Planeación, Desarrollo E Infraestructura Municipal, en calidad de SUPERVISORA, el señor **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN**, quien actúa en representación legal y contratista de la empresa **ENERGY GUILD SAS** identificada con Nit No. 901.384.307-1, con el propósito de dar constancia de la terminación a las actividades y suscribir la presente Acta de terminación al Contrato de Obra No. 007 del 11 de Diciembre del 2024 cuyo objeto fue: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA RICO KM 30 SEDE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA".

1. El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN**, del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2024**, según actividades y de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 17 de diciembre de 2024 al 26 de diciembre de 2024, de conformidad con el plazo de ejecución estipulado, en el proceso de ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 007-2024.

2. El Contratista de la Obra No. 007-2024, representado legalmente por CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN, quien actúa en representación legal y contratista de la empresa ENERGY GUILD SAS identificada con Nit No. 901.384.307-1, se compromete a actualizar la garantía única de cumplimiento constituida, de conformidad con los términos establecidos en el contrato y según con la cláusula sexta y a la suscripción de la presente acta hará los respectivos trámites de actualización de las pólizas.

3. El Contratista se compromete a entregar el Informe final de ejecución contractual junto con los soportes correspondientes.

4. Los valores que por concepto de seguridad social se adeuden, antes de la liquidación contractual, so pena que el Municipio realice el descuento correspondiente por saldos en mora por parte del Contratista

5. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente conntrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

6. Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

7. Sin perjuicio de la presente terminación, la Alcaldía Municipal Valparaíso se reserva el derecho de hacer seguimiento a la obra y garantías que amparan la calidad de las misma durante la vigencia de la póliza de estabilidad constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta la que en ella intervinieron, el día veintiséis (26) de diciembre de 2024.

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE
ENERGY GUILD SAS **NIT No. 901.384.307-1** **CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN** **Representante legal**	**YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO** **Secretaria De Planeación, Desarrollo e Infraestructura**

Proyectó: Ferney Camilo Pérez Morales – Ing. Civil Apoyo Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura. Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	**Alcaldía Municipal** **Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro** **Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co** **Código Postal: 185050**

ENERGY GUILD SAS
NIT 901.384.307-1
Cra 40B 10 20 sur cd montes p3
Tel: (604) 3114944879
Bogotá - Colombia
energyguildsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 57

Señores	MUNICIPIO DE VALPARAISO		
NIT	800.050.407-1	**Teléfono**	(000) 6532366 - Ext. 000
Dirección	ALCALDIA DE VALPARAISO	**Ciudad**	Valparaíso - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/12/2024, 15:45
Expedición	28/12/2024, 15:45
Vencimiento	12/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Pago de acta de recibo final del contrato de obra N. 007-2024	1.00	21,516,608.00	21,516,608.00

Total items: 1

Valor en Letras: Veintisiete millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-12 por $ 27,973,776.00

Total Bruto	21,516,608.00
Administración 25.02%	5,383,455.32
Imprevistos 1.00%	215,166.08
Utilidad 4.00%	860,664.32
Copago / Anticipo	2,117.72
Total a Pagar	27,973,776.00

Observaciones: Pago de acta de recibo final del contrato de obra N. 007-2024

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia #453-000060-97

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068881110 aprobado en 20240412 prefijo FE desde el número 29 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: d145d5bbe2a9d01f83b300f089dd601905ce7759ff71392ba6d83c9015ddb094dc9cf0977db8c5efdc3ba9a5fdd13909

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
