

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECORA DE CIUDADANIA

NUMERO 50.852.047

ALVAREZ MARTINEZ
APELLIDOS

ANA MERCEDES
NOMBRE

Ana Alvarez Martinez
(Firma)



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1962
PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.47

ESTATURA O+ SEXO

24-MAR-1981 PUEBLO NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA



A-1303100-38162724-F-0050852047-20080218

008810804511 02 241701165

Montería - Córdoba, 1 de Junio de 2024

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES

Tipo consultoría: Cotización – Toma y Falla de muestras o especímenes de concreto, ensayo de densidad o masa unitaria del suelo en el terreno (ensayo de cono y arena) y ensayo proctor modificado.

Asunto: Oferta de servicio para falla de muestras o especímenes de concreto, ensayo proctor modificado y ensayos de cono y arena, en la vereda apartada los limones, municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Córdoba. Cordial saludo.

Con el fin de servirle en sus proyectos de ingeniería, GEOLABCON le ofrece realizar los ensayos de laboratorio relacionados a continuación:

ALCANCE DEL PROYECTO:

Se realizarán las tomas en campo para su posterior falla (muestras de concreto), con el propósito de determinar su resistencia a compresión, por otro lado se realizará el ensayo de proctor modificado para determinar la compactación del suelo por medio de ensayo de Cono y Arena.

Los ítems del estudio se contemplan en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	ENSAYO (S)	NORMA (s)
1	Se fallarán las muestras o especímenes de concreto.	Ensayo de resistencia a la compresión especímenes de concreto	NTC 673
2	Ensayo de densidad o masa unitaria del suelo en el terreno (ENSAYO DE CONO Y ARENA)	Ensayo para la determinación del porcentaje (%) de compactación del suelo in situ.	INV E-161-13

Síguenos en @geolabcon



ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	ENSAYO (S)	NORMA (s)
3	Ensayo de proctor modificado		INV E-142-13

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Se recogerán las muestras para su posterior falla, por otro lado se realizarán las densidades cuando el cliente las solicite, por último, se entregará informe firmado por laboratorista y el coordinador de ensayos del laboratorio.

LUGAR DE EJECUCIÓN:

Los trabajos se realizarán en el área delimitada por el cliente en la zona de estudio y los ensayos se realizarán en el laboratorio ubicado en Montería.

RECURSOS:

Todos los equipos, materiales e insumos requeridos para la presentación del servicio están contemplados en la presente cotización.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA (CLIENTE):

Para la debida prestación del servicio de la consultoría ofrecida, requerimos de parte del cliente, la siguiente información:

- Nombre exacto del proyecto
- Ubicación exacta del proyecto
- Cliente que aparecerá en el informe
- Cliente a quien se le factura
- Contacto que aparecerá en el informe

COSTOS DE LA COTIZACIÓN:

De acuerdo con su solicitud para el servicio de **TOMA Y FALLA DE ESPECÍMENES EN CONCRETO, REALIZACIÓN DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y REALIZACIÓN DE ENSAYO DE DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO**, en el municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, emitimos nuestra cotización. A continuación, presentamos los detalles:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	Ensayo de densidad o masa unitaria del suelo en el terreno, Incluye viáticos y transporte.	Und	2	\$110.000	\$220.000
2	Ensayo Proctor Modificado	Und	1	\$130.000	\$130.000
3	Alquiler de moldes de cilindro, dimensión 6"x12", para toma de muestras de concreto (3 cilindros) Nota: Alquiler 1 cilindro/día/unidad: \$4.000	Dia	15	\$12.000	\$180.000
4	Falla de especímenes de concreto	Und	10	\$12.000	\$120.000
VALOR TOTAL					\$650.000

Síguenos en @geolabcon



CONDICIONES DEL SERVICIO:

Debido a que no hemos tenido el placer de hacer negocios con ustedes, les proponemos esta oferta especial para expresarles nuestro deseo de comenzar a entablar relaciones comerciales.

- **Forma de pago:** El pago inicial se realizará con el 50% como anticipo para la realización de los ensayos estipulados en la presente cotización y el 50% restante después de haber entregado los resultados obtenidos de los ensayos.
- **Plazo de ejecución:** Después de realizada la confirmación de la presente cotización.
- **Validez de la oferta:** 30 días
- El valor de la oferta incluye viáticos y transporte.
- Si la presente consultoría presenta gastos extras, por información errada de parte del cliente sobre las condiciones del proyecto, deberá ser reconsiderado el valor de la presente oferta.
- La información requerida por parte del cliente es fundamental para el debido proceso del servicio.
- Si el cliente requiere parámetros extras a los relacionados, se deben solicitar antes de aceptar la cotización y esperar el respectivo ajuste.

Estaremos a su disposición ante cualquier inquietud o duda

Cordialmente,



José Cardozo Polo
Director comercial operativo
geolabcon@gmail.com
Cel 3106860462

Síguenos en @geolabcon



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14938509104



(415)7707212489984(8020) 000001493850910 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 0 0 3 0 6 3 1 0 2

5

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 0 3 0 6 3 1 0 2

27. Fecha expedición

2 0 0 9 1 1 0 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Córdoba

2 3

30. Ciudad/Municipio

San Bernardo del Viento

6 7 5

31. Primer apellido

CARDOZO

32. Segundo apellido

POLO

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial

GEOLABCON

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Córdoba

40. Ciudad/Municipio

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

CR 6 W 38 60 BRR JUAN XXIII

42. Correo electrónico geolabcon@gmail.com

43. Código postal 2 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 0 6 8 6 0 4 6 2

45. Teléfono 2

3 2 3 3 2 3 9 7 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 1 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 08 - 16 / 16 : 06 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO
COMERCIANTES QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS

SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad

CUENTA DE COBRO
(Art: 4 decreto 3050 / 97)

Nº 11

DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Art. 3 Decreto 522 /03)

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA APARTADA LOS LIMONES**

N.I.T.: 901.209.182-1

DEBE A:

RESPONSABLE DEL IVA SI ☐ NO ☒

DECLARANTE DE RENTA SI ☐ NO ☒

BENEFICIARIO: ALVARO PEREZ LOBO

NIT -- C.C.: 15.044.172

DIRECCIÓN: CRA 14 A # 4-31 BARRIO SAN RAFAEL

CONCEPTO: MES 1 TOPOGRAFIA PLACA HUELLA APARTADA LOS LIMONES

VALOR REAL	RETEFUENTE	DESCUENTOS	OTROS	VALOR NETO
\$3.900.000	\$234.000	6%		\$3.666.000

VALOR TOTAL A PAGAR \$3.666.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

FECHA: 12/06/2024

BENEFICIARIO: ALVARO PEREZ LOBO
C.C.: 15.044.172

HONORARIO TOPOGRAFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AUXILIAR No.
05502021633ANT
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES

DE FECHA 01/06/2012
ALVARO ENRIQUE
PEREZ LOBO
C.C. 15044172
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"



PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS DREG & SONS.

311.044.31/2

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 15.044.172

PEREZ LOBO

APELLIDOS

ALVARO ENRIQUE

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1964

SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

16-MAR-1983 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1303100-00172879-M-0015044172-20090826

0015412081A 1

7430106223

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141046040968			
		 (415)7707212489984(8020) 000014104604096 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 5 0 4 4 1 7 2		6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería		14. Buzón electrónico 1 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación 1 5 0 4 4 1 7 2		27. Fecha expedición
28. País COLOMBIA		29. Departamento Córdoba	30. Ciudad/Municipio Sahagún		6 6 0
31. Primer apellido PEREZ		32. Segundo apellido LOBO	33. Primer nombre ALVARO		34. Otros nombres ENRIQUE
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Córdoba	40. Ciudad/Municipio Sahagún		6 6 0
41. Dirección principal CR 14 A 4 31 BRR SAN RAFAEL					
42. Correo electrónico alpelo39@yahoo.com.co					
43. Código postal 2 3 5 7 0		44. Teléfono 1 3 1 4 5 4 5 2 8 6 5			
45. Teléfono 2					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 2 9 0	2 0 0 9 0 5 1 5			1 2	3 1 1 2
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024-06-12 17:06					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre PEREZ LOBO ALVARO ENRIQUE					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RACION SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1504172	0	ALVARO ENRIQUE PEREZ LOBO	1	0	POSITIVA - 1423	UNICA		4290	Individual
MUNIDEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
23460	CRA 14.4.2.31 BRS SAN RAFAEL		314542265		ALFLORESYWOOD.COM.CO		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y APORTA	ENTIDAD RECAUDADA
2024-05	2024-05	30159913	1	2024-05-19	112070	CORDOBA	SINAGUA	248.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1481	30159913	2024-05-30	Pagada							

NOVEDADES									
EMPLEADO									
N	ID	EMPLEADO	SALARIO DE SALARIO	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN
01144172	PEREZ LOBO ALVARO ENRIQUE	1300000	30240519						

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1504172	0	ALVARO ENRIQUE PEREZ LOBO	1	0	POSITIVA - 1423	UNICA	4290	Nº de af
MUNIDEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
23460	CRA 14.4.2.31 BRS SAN RAFAEL		314542265		ALFONSO VALBUENA@CLO		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y APORTA	ENTIDAD RECAUDADA
2024-05	2024-05	30159913	1	2024-05-19	112070	CORDOBA	SINAGUA	248.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1481	30159913	2024-05-30	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	693.334	IBC SALUD	693.334
		IBC CAJAS	0
		IBC PARAF	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
FP (Administradoras: 1)				1	111.000	0	0	111.000	
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	111.000	0	0	111.000	
PS (Administradoras: 1)				1	86.700	0	0	86.700	
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	800008384	7	1	86.700	0	0	86.700	
RP (Administradoras: 1)				1	48.300	0	0	48.300	
POSITIVA	1423	800011153	6	1	48.300	0	0	48.300	
rain Total					246.000	0	0	246.000	

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTE QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS

SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad

CUENTA DE COBRO
(Art: 4 decreto 3050 / 97)

Nº 12

DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Art. 3 Decreto 522 /03)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA APARTADA LOS LIMONES

N.I.T.: 901.209.182-1

DEBE A:

RESPONSABLE DEL IVA SI ☐ NO ☒

DECLARANTE DE RENTA SI ☐ NO ☒

BENEFICIARIO: EDILBERTO JOSE TAPIA VERTEL

NIT -- C.C.: 6.882.708

DIRECCIÓN: CRA 9 # 16-24


CONCEPTO: PAGO MES Nº1 MAESTRO DE OBRAS

VALOR REAL	RETEFUENTE	DESCUENTOS	OTROS	VALOR NETO
\$2.320.000	\$139.200	6%		\$2.180.800
\$1.681.074	\$100.864	6%		\$1.580.210

VALOR TOTAL A PAGAR \$3.761.010

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CON DIEZ CENTAVOS MCTE

FECHA: 12/06/2024



BENEFICIARIO: EDILBERTO JOSE TAPIA VERTEL
C.C.: 6.882.708

HONORARIO MAESTRO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.882.708

TAPIA VERTEL

APELLIDOS

EDILBERTO JOSE

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1959

SAN ANTERITO
MONTERIA (CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-MAY-1979 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00126642-M-0006882708-20081111

0005731799A 1

7460002776

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14967824981



(415)7707212489984(8020) 000001496782498 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

6 8 8 2 7 0 8

1

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de Ciudadanía

1 3

6 8 8 2 7 0 8

1 9 7 9 0 5 1 5

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Córdoba

2 3

Montería

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

TAPIA

VERTEL

EDILBERTO

JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Córdoba

2 3

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

CR 9 # 16 - 24

42. Correo electrónico

edilbertotapia1959@gmail.com

43. Código postal

2 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 1 6 5 6 7 0 2 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 1 1 1

2 0 0 4, 0 1, 0 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

2

61. Fecha

2023 - 12 - 15 / 14 : 02: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ PINEDA WENDY VANESSA

985. Cargo Contribuyente

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO
COMERCIANTES QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS

SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad

CUENTA DE COBRO
(Art: 4 decreto 3050 / 97)

Nº 13

DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Art. 3 Decreto 522 /03)

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA APARTADA LOS LIMONES**

N.I.T.: 901.209.182-1

DEBE A:

RESPONSABLE DEL IVA SI ☒ NO ☐

DECLARANTE DE RENTA SI ☒ NO ☐

BENEFICIARIO: JOSE GABRIEL MONTERROSA CHAVEZ

NIT -- C.C.: 1.067.863.516

DIRECCIÓN: TRV 10 8B 46 PUEBLO NUEVO

CONCEPTO:

VALOR REAL	RETEFUENTE	DESCUENTOS	OTROS	VALOR NETO
\$2.000.000	\$0	0%		\$2.000.000
\$1.500.000	\$15.000	1%		\$1.485.000

VALOR TOTAL A PAGAR \$3.485.000

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

FECHA: 12/06/2024

BENEFICIARIO: JOSE GABRIEL MONTERROSA
C.C.: 1.067.863.516

HONORARIO RESIDENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.863.516

MONTERROSA CHAVEZ
APELLIDOS

JOSE GABRIEL
NOMBRES

Jose G. Monterrosa Ch.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1988

PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

15-SEP-2006 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALABO VARGAS



P-1300100-38155221-M-1067863516-20070112

0220107011A 02 221102792

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14969715330



(415)7707212489984(8020) 000001496971533 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1 0 6 7 8 6 3 5 1 6

6

1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 6 7 8 6 3 5 1 6

27. Fecha expedición

2 0 0 6 0 9 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Córdoba

2 3

30. Ciudad/Municipio

Montería

0 0 1

31. Primer apellido

MONTERROSA

32. Segundo apellido

CHAVEZ

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

GABRIEL

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Córdoba

2 3

40. Ciudad/Municipio

Pueblo Nuevo

5 7 0

41. Dirección principal

TV 10 8 B 46 BRR JORGE ELIECER GAITAN

42. Correo electrónico

josephgabo28@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 5 6 9 6 2 8 6

45. Teléfono 2

3 2 3 5 2 2 0 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 2 0 4 1 0

4 2 9 0

2 0 1 2 0 4 1 0

4 2 1 0

4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 1 6 2 2 4 8 5 2

Impo. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 14 : 06 : 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTERROSA CHAVEZ JOSE GABRIEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESARIAL: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDELA DE CIUDADANÍA PIEBLO NUEVO TRV 008 J6 02-802577 PRIVADA ÚNICO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	7925653521 2024 6 2024/06/13 (aaaa/mm/aa):
MAYO AÑO 2024		MAYO AÑO 2024	
MAYO AÑO 2024		MAYO AÑO 2024	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA		
			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP					
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 1.000	\$ 209.000		
											\$ 209.000		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESA: FECHA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE ENONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO: TRV 108449 TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	NÚMERO PLANILLA: 7082427561 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA: 28 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 7082427561 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 28 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 7082427561 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:
MAYO AÑO 2024		MAYO AÑO 2024	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCUENTO	CÓDIGO	DESCUENTO
25-14	\$ 16.000	25-14	\$ 16.000
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NATURALES NO
COMERCIANTES QUE NO SON RESPONSABLE A LAS VENTAS

SEGÚN EL PARAGRAFO 2 DEL ART 383 DE LA LEY 1943 Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el
presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y
por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado
o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad

CUENTA DE COBRO
(Art: 4 decreto 3050 / 97)

Nº 14

DOCUMENTO EQUIVALENTE
(Art. 3 Decreto 522 /03)

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA APARTADA LOS LIMONES**

N.I.T.: 901.209.182-1

DEBE A:

RESPONSABLE DEL IVA SI ☐ NO ☒

DECLARANTE DE RENTA SI ☐ NO ☒

BENEFICIARIO: ELI JOSE CUAVAS VEGA

NIT – C.C.: 78.713.251

DIRECCIÓN: ET 7 MZ 63 LT 12 BRR LA PRADERA

CONCEPTO: ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS MES DE MAYO DEL
2024 JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES

VALOR REAL	RETEFUENTE	DESCUENTOS	OTROS	VALOR NETO
\$1.280.000				\$1.280.000

VALOR TOTAL A PAGAR \$1.280.000

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FECHA: 12/06/2024



BENEFICIARIO: ELI JOSE CUAVAS VEGA
C.C.: 78.713.251

HONORARIOS CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.713.251**

CUAVAS VEGA

APELLIDOS

ELI JOSE

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1973**

MONTERIA
(CORDOBA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G S. RH

M
SEXO

12-JUN-1991 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1300100-00154749-M-0078713251-20090419

0010851414A 1

7460018825

Montería, 03 de abril de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS LIMONES
Municipio de Pueblo Nuevo

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO
1625 DE 2016

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo ELI JOSE CUAVAS VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 78.713.251 expedida en Montería con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 1.2.4.1.6. y 1.2.4.1.17 del Decreto 2231 de 2023, compilado en el Decreto 1625 de 2016, que reglamentó del Decreto 1625 de 2016 que modificó el artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la retención en la fuente como persona natural independiente, en mi declaración de renta.

- ☐ Sí tomaré costos y deducciones (artículo 392 y/o 401 del E.T.)
- ☒ No tomaré costos y deducciones (artículo 383 E.T.)

En caso de que **NO** me tomé costos y deducciones, adjunto los documentos para la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente así:

- | | |
|---|---|
| ☒ Aportes a Salud | ☐ Intereses Préstamo de vivienda |
| ☒ Aportes a Pensión | ☐ Certificado de dependientes. |
| ☐ Aportes ARL | ☐ Medicina Prepagada. |
| ☒ Aportes Voluntarios a Pensión | |

Cordialmente,



Firma:
Nombre: ELI JOSE CUAVAS VEGA

Cédula: 78.713.251

Montería, 12 de junio de 2024

Señores.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA LOS LIMONES

Municipio de Pueblo Nuevo.

Cordial saludo,

Con respecto al requerimiento que me hacen del pago de seguridad social, me permito informarles que el contrato que se realizó con ustedes estipula un pago mensual por concepto de honorarios por valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. (\$1.280.000), pago que está por debajo de un salario mínimo mensual vigente y por ende no está en la obligación de cotizar sobre este mismo

El [artículo 89 de la Ley 2277 de 2022](#) estableció nuevas fórmulas para el cálculo del IBC de los trabajadores independientes resumidas de la siguiente manera:

- El IBC de **los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios** personales con ingresos iguales o superiores a un (1) smmlv será el 40 % del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del IVA.
- Para **los trabajadores independientes por cuenta propia y los que celebran contratos diferentes a los de prestación de servicios**, la cotización será sobre el 40 % del valor mensual de los ingresos causados para quienes estén obligados a llevar contabilidad, o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el valor del IVA.

Este resultado, en todo caso, podrá estar disminuido previamente con costos y gastos, bien sean reales (cumplen con los requisitos del [artículo 107 del ET](#)) o por el sistema de costos presuntos (establecido en el [Decreto 1601 de 2022](#)) El ingreso base de cotización –IBC– es el monto de los ingresos percibidos mensuales que se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte respectivo al momento de realizar la cotización a los diferentes sistemas que conforman el sistema general de seguridad social integral. Por regla general, **la base mínima de cotización es de 1 smmlv y la máxima, de 25 smmlv.**

En principio, un trabajador independiente para el año 2024 no puede efectuar aportes al sistema de seguridad social sobre una base inferior a \$1.300.000 ni superior a \$32.500.000. Sin embargo, mediante el [Decreto 2322 de 2022](#), que

adicionó el parágrafo 2 al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto 1833 de 2016, se estableció una excepción a la regla general consistente en que el límite de la base de cotización al sistema de seguridad social integral será como máximo de 45 smmlv, siempre y cuando



ELI JOSE CUAVAS VEGA
CC.78.713.251
CONTADOR PUBLICO TP 57537-T

Factura Electrónica De Venta No. FE 2

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 13/06/2024 11:40 AM
Fecha de Generación: 13/06/2024 11:40 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO MYS.
Razón Social: CONSORCIO MYS.
NIT: 901734474-6
Teléfono: + (57) 3005045750
Correo Electrónico: carmenedith13@hotmail.com
Dirección: CR 9 11 28 B BRR LAS FLORES
Departamento: CÓRDOBA
Municipio: PUEBLO NUEVO

Receptor : JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES
Razón Social: JAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES
NIT: 901209182-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: alejochan25@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: CÓRDOBA
Municipio: PUEBLO NUEVO



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	TRANSPORTE TRAMITE COTIZACIONES MATERIALES	TRANSPORTE TRAMITE MATERIALES	1.00	cada	80,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
2	2	TRANSPORTE TRAMITES COTIZACIONES DE MAQUINARIA	TRANSPORTE TRAMITES COTIZACIONES DE MAQUINARIA	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
3	3	TRANSPORTE TRAMITE PAGO CHEQUE MES ABRIL	TRANSPORTE TRAMITE PAGO CHEQUE MES ABRIL	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
4	4	TRANSPORTE TRAMITES PAGO CHEQUES MES MAYO	TRANSPORTE TRAMITES PAGO CHEQUES MES MAYO	1.00	unidad	80,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
5	5	TRANSPORTE AGUA DE HIDRATACION	TRANSPORTE AGUA DE HIDRATACION	5.00	cada	80,000.00	400,000.00	0	0.00	400,000.00
6	6	TRANSPORTE GASOLINA	TRANSPORTE GASOLINA	3.00	unidad	80,000.00	240,000.00	0	0.00	240,000.00

Detalles:

Son: NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

CUFE :

9c68554d8b46f6956630c90f7fa179bc95ec13c9fb69fd32b70a9e1b43b94d0fa241994fe1951de31a835032719fddb5

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 960,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 960,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 960,000.00
Total a pagar :	COP 960,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



Impuestos y Aduanas de Monteria

37. Signs

5 7 0

3 0 0 5 0 4 5 7 5 0 45. Teléfono 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

61. Fecha 2024 - 07 - 02 / 16 : 43 : 42

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

141052914691



(415)7707212489984(8020) 000014105291469 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 3 4 4 7 4

6

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	5 7 0	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 5
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141052914691



(415)7707212489984(8020) 000014105291469 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

9 0 1 7 3 4 4 7 4 | 6

14. Buzón electrónico

1 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 3 0 5 1 5

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

Cédula de Ciudadan 1 3

1 0 1 7 1 2 5 1 8 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

GONZALEZ

MEJIA

CARMEN

EDITH

08. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 3 0 5 1 5

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

Cédula de Ciudadan 1 3

5 0 9 2 4 5 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

AGUIRRE

SAURITH

JOSE

ANIBAL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141052914691



(415)7707212489984(8020) 000014105291469 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 3 4 4 7 4 6

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 1 2 0 0 4 9 4 3	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 3 0 5 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 6 5 3 2 5 9	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 8 9 2 0 2 3 0 5 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 5 2 2 8 4 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social INVERSIONES SAIMEREJ S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 3 0 5 1 5	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

8 80 230801 EMVCO



JUN 12 2024 16:08:11 REMDES 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**BARRIO CENTRO PLANETA
CL 17N 7-5 LOCAL 2 BRR**

C.UNICO: 3007040522 TER: GZQLZ888

RECIBO: 000955

RRN: 001396

APRO: 933133

RECAUDO

CONVENIO: 47052

LA PREVISORA S A CIA

REF: 00000112671701

VALOR \$ 77.986

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

8 80 230801 EMVCO



JUN 12 2024 16:09:18 REMDES 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**BARRIO CENTRO PLANETA
CL 17N 7-5 LOCAL 2 BRR**

C.UNICO: 3007040522 TER: GZQLZ888

RECIBO: 000957

RRN: 001398

APRO: 563280

RECAUDO

CONVENIO: 47052

LA PREVISORA S A CIA

REF: 00000112667301

VALOR \$ 89.250

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

PAGO ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209182	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA DE LOS LIMONES	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-570	VDA APARTADA DE LOS LIMONES		3127592267			JACAPARTADADELOSLIMONES@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30021216	E	2024-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	774.200	21.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30021216	2024-07-31	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 78726877	PACHECO VALETA NAVER ANTONIO	1.300.000		F	X														0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	563.334	90.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	563.334	70.500	COMFACOR-CCF16	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	563.334	11.300	17.000	0	0	01	0	250.900	N	5429001
2	CC 1067280980	CONTRERAS HERRERA OSNAY JOSE	1.300.000		F	X														0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	563.334	70.500	COMFACOR-CCF16	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	563.334	11.300	17.000	0	0	01	0	250.900	N	5429001
3	CC 1067282797	HERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO NICOLAS	1.300.000		F	X														0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	563.334	90.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	563.334	70.500	COMFACOR-CCF16	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	563.334	11.300	17.000	0	0	01	0	250.900	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901209182	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA APARTADA DE LOS LIMONES	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-570	VDA APARTADA DE LOS LIMONES		3127592267			JACAPARTADADELOSLIMONES@GMAIL.COM		N



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30021216	E	2024-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	774.200	21.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30021216	2024-07-31	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.690.002	1.690.002	1.690.002	1.690.002	1.690.002

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	270.600	0	7.700	0	278.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	180.400	0	5.100	0	185.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	90.200	0	2.600	0	92.800
EPS(Administradoras: 1)				3	211.500	0	6.000	0	217.500
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	3	211.500	0	6.000	0	217.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	117.900	0	3.400	0	121.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	117.900	0	3.400	0	121.300
CCF(Administradoras: 1)				3	67.800	0	1.900	0	69.700
COMFACOR	CCF16	891080005	1	3	67.800	0	1.900	0	69.700
SENA(Administradoras: 1)				3	33.900	0	1.000	0	34.900
SENA	PASENA	899999034	1	3	33.900	0	1.000	0	34.900
ICBF(Administradoras: 1)				3	51.000	0	1.500	0	52.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	51.000	0	1.500	0	52.500
Gran Total					752.700	0	21.500	0	774.200

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

T.M.C OLASCUAGA S.A.S - FABRICA LA CABAÑA

NIT: 901236854-5
CARRERA 16#25-42
Pueblo Nuevo-Cordoba
Teléfono: 3205577761

COTIZACION

No 148

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS CC o NIT.: 901209182 Contado: ☐ Credito: ☐

Dirección: VDA APARTADA DE LOS LIMONES Fecha de emisión: 20 04 2024

Ciudad: Pueblo Nuevo Teléfono: 3127592267 Vendedor: OLASCUAGA ACEVEDO MARIA

Código	Descripción	Pres.	Cantidad	Vr. Unitario	%Dcto	% INC	% IVA	Valor total
230	CEMENTO ULTRACEM POR 50kg	UND	704.00	31,092.44	0.0	0.0	19.0	29,008.000
225	ARENA METRO CUBICO	M3	70.00	91,400.00	0.0	0.0	19.0	7,613.020
207	TRITURADO	M3	100.00	185,714.28	0.0	0.0	19.0	22,100.000
294	MATERIAL DE SUB-BASE CLASE A SBO-30	6M3	132.00	67,869.75	0.0	0.0	19.0	10,680.980
295	PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO	6M3	26.00	142,857.15	0.0	0.0	19.0	4,420.000
233	VARILLA 1/2"	UND	333.00	26,890.78	0.0	0.0	19.0	10,655.000
234	VARILLA 3/8"	UND	491.00	17,647.09	0.0	0.0	19.0	10,311.000
290	TABLA CEPILLADA	UND	5.00	160,067.20	0.0	0.0	19.0	1,000.000
222	ALAMBRE NEGRO	UND	110.00	5,714.29	0.0	0.0	19.0	740.000

Valor en letras:	NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS	Subtotal	81,107,228
Observaciones:	MATERIAL PUESTO EN LA APARTADA DE LOS LIMONES DESPACHO CON PAGO ANTICIPADO DEL 100%	Descuento	0
		Impuestos	0
		IVA	15,410,372
		VALOR TOTAL	96,517,600

Impreso por Software DIANASIS



T.M.C OLASCUAGA S.A.S - FABRICA LA CABAÑA

NIT: 901236854-5

Dirección: CARRERA 16#25-42

Ciudad: Pueblo Nuevo-Cordoba

Teléfono: 3205577761

Email: fabricalacabanafacturacion@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764066972473 del 2024-03-08 al 2025-03-08 Rango del
FE00434 al FE00500
REGIMEN COMUN



Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA APARTADA LOS LIMONES	Factura Electrónica de Venta:	FE00479
NIT / CC:	901209182-1	Fecha de Expedición:	Fecha de Vencimiento:
Dirección:	VDA APARTADA DE LOS LIMONES	29-06-2024 09:29	29-06-2024
Ciudad:	Pueblo Nuevo	Elaboración:	29-06-2024 09:29
Departamento:	CORDOBA	Forma de Pago:	CONTADO Cheque
Teléfono:	3127592267	Orden de Compra:	
Email:	alejochan25@gmail.com	Orden de Despacho:	
Vendedor:	OLASCUAGA ACEVEDO MARIA MERCEDES	Nro. de Remisión:	
		Moneda Aplicable:	COP Tasa Cambio:

Código	Descripción	UM	Cantidad	Vr.Unitario	%INC	%IVA	Valor Total
230	CEMENTO ULTRACEM POR 50Kg	UND	456.00	24,369.70	0.0	19.0	13,224,000.00
225	ARENA METRO CUBICO	M3	49.00	37,815.10	0.0	19.0	2,205,000.00
207	TRITURADO	M3	59.00	50,420.20	0.0	19.0	3,540,000.00
294	MATERIAL DE SUB-BASE CLASE A SBG-38	6M3	132.00	29,411.80	0.0	19.0	4,620,000.00
295	PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO	6M3	24.00	50,420.20	0.0	19.0	1,440,000.00
233	VARILLA 1/2"	UND	333.00	21,008.40	0.0	19.0	8,325,000.00
210	VARILLA 3/8 LEGITIMA	UND	266.00	17,000.00	0.0	0.0	4,522,000.00
290	TABLA CEPILLADA	UND	5.00	123,025.20	0.0	19.0	732,000.00
222	ALAMBRE NEGRO	UND	110.00	5,714.30	0.0	19.0	748,000.00

Observaciones:	Subtotal: 24,332,169.00
	Descuento: 0.00
	Impoconsumo: 0.00
	IVA: 4,623,113.00
Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS	Total Factura: 28,995,282.00
	Retefuente: 0.00
CUFE: ed0687a1041a37064bc9f4ee85100f647fb0d40b1ab33aa7d049050c5e2fab96aa8f754d03f5f60c8ab08e39e769a73e	RetelIVA: 608.306
	Otros Dscots: 0.00
	NETO A PAGAR: 28,346,976.00
	Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancías y servicios indicados en esta factura
La presente factura de venta se asimila a todos los efectos a una letra de cambio. (Código de Comercio. Artículo 774 Numeral 5). Causará vencida la fecha de pago intereses de mora máximo permitido por la ley.	Nombre, firma, cédula y sello

BALANCE DEL DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DE 2024
JAC APARTADA LOS LIMONES

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA PROYECTADO (A)				%				VALOR PROGRAMA EJECUTADO (B)	%		
	Descripccción de Items	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (Según Propuesta Económica Aprobada)	Valor Total		Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (Según Propuesta Ecomica Aorobada)				
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$ 21,660,604.44	12.16%				\$ 21,660,604.44	12.16%		
1.1	RETROEXCABADORA (PAJARITA) MARCA CATERPILLAR	Und	1	\$ 513,159.00	\$ 513,159.00		Und	1	\$ 513,159.00	\$ 513,159.00			
1.2	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	Und	1	\$ 3,534,203.00	\$ 3,534,203.00		Und	1	\$ 3,534,203.00	\$ 3,534,203.00			
1.3	VIBROCOMPACTADOR RODILLO	Und	1	\$ 1,383,181.00	\$ 1,383,181.00		Und	1	\$ 1,383,181.00	\$ 1,383,181.00			
1.4	VOLQUETA SENCILLA	Und	1	\$ 5,876,243.00	\$ 5,876,243.00		Und	1	\$ 5,876,243.00	\$ 5,876,243.00			
1.5	COMPACTADOR MANUAL (CANGURO) MARCA HONDA	Und	1	\$ 3,097,778.00	\$ 3,097,778.00		Und	1	\$ 3,097,778.00	\$ 3,097,778.00			
1.6	MESCLADORA DE CONCRETO ACPM	Und	1	\$ 2,267,921.39	\$ 2,267,921.39		Und	1	\$ 2,267,921.39	\$ 2,267,921.39			
1.7	VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO TIPO AGUJA	Und	1	\$ 1,045,071.00	\$ 1,045,071.00		Und	1	\$ 1,045,071.00	\$ 1,045,071.00			
1.8	TRONZADORA 7 1/2"	Und	1	\$ 3,638,391.00	\$ 3,638,391.00		Und	1	\$ 3,638,391.00	\$ 3,638,391.00			
1.9	RIEL METALICO 3 M	Und	1	\$ 304,657.05	\$ 304,657.05	Und	1	\$ 304,657.05	\$ 304,657.05				
2	MATERIALES				\$ 89,152,561.80	50.03%				\$ 85,603,878.24	48.04%		
2.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	9.0	\$ 21,819.00	\$ 196,371.00		M3	9.0	\$ 21,819.00	\$ 196,371.00			
2.2	Subbase Granular Clase C	M3	42.0	\$ 181,735.40	\$ 7,632,886.80		M3	42.0	\$ 120,357.70	\$ 5,055,023.40			
2.3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	59.9	\$ 835,518.10	\$ 50,036,876.83		M3	59.9	\$ 786,450.90	\$ 47,098,377.42			
2.3.1	Cemento Uso Estructural	Und	160.0	\$ 36,000.00	\$ 5,760,000.00		Und	160.0	\$ 36,000.00	\$ 5,760,000.00			
2.3.2	Arena Fina	M3	37.0	\$ 87,954.00	\$ 3,254,298.00		M3	37.0	\$ 87,954.00	\$ 3,254,298.00			
2.3.3	Grava	M3	49.0	\$ 117,000.00	\$ 5,733,000.00		M3	49.0	\$ 117,000.00	\$ 5,733,000.00			
2.4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45.5	\$ 381,604.60	\$ 17,363,009.30		M3	45.5	\$ 341,917.60	\$ 15,557,250.80			
2.4.1	Piedra Rajón	M3	7.0	\$ 68,000.00	\$ 476,000.00		M3	7.0	\$ 68,000.00	\$ 476,000.00			
2.4.2	Cemento Uso Estructural	Und	90.0	\$ 36,000.00	\$ 3,240,000.00		Und	90.0	\$ 36,000.00	\$ 3,240,000.00			
2.4.3	Arena Fina	M3	30.0	\$ 87,954.00	\$ 2,638,620.00		M3	30.0	\$ 87,954.00	\$ 2,638,620.00			
2.4.4	Grava	M3	42.0	\$ 117,000.00	\$ 4,914,000.00		M3	42.0	\$ 117,000.00	\$ 4,914,000.00			
2.5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2364.3	\$ 5,889.00	\$ 13,923,417.87	KG	2364.3	\$ 7,485.00	\$ 17,696,855.62				
4	MANO DE OBRA				\$ 13,992,091.20	7.85%	MANO DE OBRA			\$ 11,053,752.05	6.20%		
4.1	Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)			\$ 2,098,813.68	\$ 2,098,813.68		Primera Quincena (Del 01 al 15 de junio 2024)			\$ 2,098,813.68			
4.2	Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)			\$ 3,498,022.80	\$ 3,498,022.80		Segunda Quincena (Del 15 al 30 de junio 2024)			\$ 3,498,022.80			
4.3	Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)			\$ 4,197,627.36	\$ 4,197,627.36		Tercera Quincena (Del 01 al 15 de julio 2024)			\$ 4,197,627.36			
4.4	Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)			\$ 4,197,627.36	\$ 4,197,627.36		Cuarta Quincena (Del 01 al 30 de julio 2024)			\$ 1,259,288.21			
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL				\$ 4,376,808.00	26.94%	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			\$ -	0.00%		
6	GASTOS ADMINSTRATIVOS				\$ 48,008,886.00		GASTOS ADMINSTRATIVOS			\$ 32,717,486.50			
6.1	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO				\$ 26,213,295.00		PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO			\$ 17,159,306.50			
6.1.1	Residente de Obra (CPS)			\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00		Residente de Obra (CPS)			\$ 7,000,000.00			
6.1.2	Contador Público (CPS)			\$ 4,200,000.00	\$ 4,200,000.00		Contador Público (CPS)			\$ 2,100,000.00			
6.1.3	Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional			\$ 11,513,295.00	\$ 11,513,295.00		Maestro de obra (Nómina) + Carga Prestacional			\$ 8,059,306.50			
6.2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN			\$ 2,343,110.00	\$ 2,343,110.00		SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN			\$ 2,293,885.00			
6.3	MEDIDAS AMBIENTALES			\$ 953,000.00	\$ 953,000.00		MEDIDAS AMBIENTALES			\$ 777,319.00			
6.4	GASTOS BANCARIOS			\$ 1,289,481.00	\$ 1,289,481.00		GASTOS BANCARIOS			\$ -			
6.5	OTROS COSTOS			\$ 17,210,000.00	\$ 17,210,000.00		OTROS COSTOS			\$ 12,486,976.00			
6.5.1	Ensayos de Laboratorio			\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		Ensayos de Laboratorio			\$ 325,000.00			
6.5.2	Valla (1x2)			\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		Valla (1x2)			\$ 85,000.00			
6.5.3	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00		Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños			\$ 4,899,523.00			
6.5.4	Topografía			\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00		Topografía			\$ 3,607,000.00			
6.5.5	Bodega			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		Bodega			\$ -			
6.5.6	Exámenes de ingreso personal nómina			\$ 660,000.00	\$ 660,000.00		Exámenes de ingreso personal nómina			\$ 426,888.00			
6.5.7	Pólizas			\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00		Pólizas			\$ 1,893,565.00			
6.5.8	Subsidio al dignatario para transporte			\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		Subsidio al dignatario para transporte			\$ 950,000.00			
6.5.9	Caja menor-Papelería			\$ 900,000.00	\$ 900,000.00		Caja menor-Papelería			\$ 300,000.00			
7	APORTE OAC				\$ 1,000,000.00	0.56%	APORTE OAC			\$ -	0.00%		
TOTALES					\$ 178,190,951.44	100.00%	TOTALES					\$ 151,035,721.23	84.76%

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

BITACORA DE OBRA

29/06/24. Elimo Llovizno moñona, Lluvia tarde,
ACTIVIDADES.


- Se continuó con el alistado de terreno para el fundido de enrocado.
- Se continuó con el vaco de losas de enrocado del canal izquierdo sin embargo se presentó arena en la mezcladora que obligó a la suspensión de las actividades.
- Se presentaron lluvia en horas de la tarde que motivaron la suspensión y terminación de labores.


MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezcladora (1); Vibrocompactador (1); Riel metálico (40)

MANO DE OBRA.

- Obrero (8); Maestro (1).


JSP Fintantría.


RESID. OBRA.

01/07/2024. Soleado (moñona).

ACTIVIDADES

- Se debió realizar terreno de losas de enrocado, averiado por las lluvias presentadas la noche anterior.
- Se continuó con el fundido de losas de enrocado por el canal izquierdo.
- Se realizó alistamiento de terreno para el fundido de losas de concreto reforzado del canal izquierdo.

MAQUINARIA Y EQUIPO

- Mezcladora (1); Vibrocompactador (1); Riel metálico (40)

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).


JSP Fintantría.


RESID. OBRA.

02/07/24. Clima Soleado matutino y tarde Lloviznas

ACTIVIDADES

- Se continuó con el alisado de terreno por fundido de enrocado del caml izquierdo
- Se continuó con el vacio de losas de enrocado por el caml izquierdo
- Se presentaron lluvias que obligaron a la terminación de las actividades de fundido.

MAQUINARIA Y EQUIPO


- Mezcladora (1); Vibrocompactor (1); Riel metálico (40)

MANO DE OBRA

- Obreros (8); Maestro (1)



José Fernández



JOSÉ FERNÁNDEZ

03/07/24. Clima Nublado matutino

ACTIVIDADES

- Se continuó con el vacio de losas de enrocado del caml derecho. Llegando al sector inicial de la placa huela y terminando así esta actividad
- Se dio inicio al fundido de losas de concreto reforzado por el caml izquierdo, en la parte final del tramo de placa huela.
- Se presentaron inconvenientes con vehículos de tipo campero que requiere con el peso, entre ellos el de la empresa AFINIA, sin embargo se regó el mismo dado que podía ocasionar daños en las losas de enrocado debido al peso.


MAQUINARIA Y EQUIPO


- Mezcladora (1); Vibrocompactor (1); Riel metálico (40)
- Vibrador de concreto (1); Texturizador (1)

MANO DE OBRA

- Obreros (8); Maestro (1)

OBS: Se realizó toma de muestras de cilindros de concreto para losa reforzada.


FOSB Interventora.


RESID. OBRA.

4/07/24. Clima Llovizna mañana, Nublado tarde.

ACTIVIDADES:

- Se presentó retrasos para el inicio de las actividades debido a las lloviznas presentadas.
- Se continuó con el fundido de los losas de concreto reforzado por el canal izquierdo. Se verificó el adecuado refuerzo y su colocación, el vibrado, alisado posterior con llana y texturizador y aplicación de entisol.


OBS: Se toman muestras de cilindros de concreto de losa reforzada.


MAQUINARIA Y EQUIPO:

- Mezcladora (1); Vibrocompactador (1); Riel metálico (40); vibrador de concreto (1); texturizador (1)

MANO DE OBRA

- Maestro (1); Obreros (3)


FOSB Interventora.


RESID. OBRA.

5/07/24 clima Lluvia mañana, Nublado tarde.

ACTIVIDADES:

- Las actividades se retrasaron por las lluvias presentadas en horas de la mañana, iniciando actividades después del mediodía.
- Se continuó con el fundido de losas de concreto reforzado del canal izquierdo, cumpliendo con el debido refuerzo y colocación del mismo, vibrado de la mezcla, curado y alisado final con texturizador.
- Se dio inicio al alisado de terreno para cunetas de ambos canales en el tramo final de la placa huelle.

MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Riel Metálico (40); Vibrador de concreto (1); Vibrador de concreto (1); Texturizador (1).

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).

OBS: Se tomaron muestras de cilindros de concreto reforzado del corral requerido.


José Interventor.


José D. OBRERA.

8/07/24. Clima Soleado.

ACTIVIDADES.

- Se continuó con el fundido de losas de concreto reforzado por el corral requerido, llegando a su fin en el sector inicial del horma de placa hella.
- Se verificó el adecuado refuerzo de las losas, la colocación del concreto, el vibrado de la mezcla, el alisado final con el texturizador y la aplicación de antisol por curado.


MAQUINARIA Y EQUIPO.


- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (40); Texturizador (1).

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).

OBS: Se tomaron muestras de cilindros de concreto de losa reforzada.


José Interventor.


José D. OBRERA.

8/07/24. Clima Soleado

ACTIVIDADES


- Se continuó con el alisado de terreno para fundido de cunetas y vigas maestras en ambos carriles, desde el sector final de la placa huella.
- Se abrió paso al tránsito de motocicletas por las placas de concreto reparado, ya que se viene alisando el terreno de los cunetas, lugar por el cual se estaba permitiendo su circulación, por el conl derecho.

MAQUINARIA Y EQUIPO

- Vibrocompactador (1); Riel metálico (40)

MANO DE OBRA

- Obrero (8); Maestro (1).


Insp. Intermitente.


RESID. OBRA

9/07/24 Clima Lluvioso mañana, Soleado tarde.

ACTIVIDADES.

- Se realizó verificación de niveles y alineamiento del tramo de cunetas alisado empleando topografía.
- Se continuó con el alisado de terreno para fundido de cunetas, luego de la verificación topográfica.
- Se colocó acero para cunetas de acuerdo a lo establecido en los diseños, al igual que el acero de vigas maestras.
- Se dio inicio al fundido de los cunetas y de vigas maestras en el tramo final de la placa huella.
- Se verificó el cumplimiento de la adecuada colocación de la mezcla de concreto, el vibrado; el alisado final y la aplicación de antisol.

MAQUINARIA Y EQUIPO

- Mezclador (1); Vibrocompactador (1); Transportador (1); Nivel de precisión (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (40);

Texturizador (1).


MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1); Topógrafo (1).

OBS: Se tomaron muestras de cilindros de concreto para cunetas fundidas.



Insp. Interventora.


RESID. OBRA.

10/07/24. Clima soleado mañana y tarde.

ACTIVIDADES.

- Se continuó con el fundido de cunetas en ambos carriles en el tramo final de la placa huella.
- Se continuó con el fundido de los vigas rieles en el mismo sector.

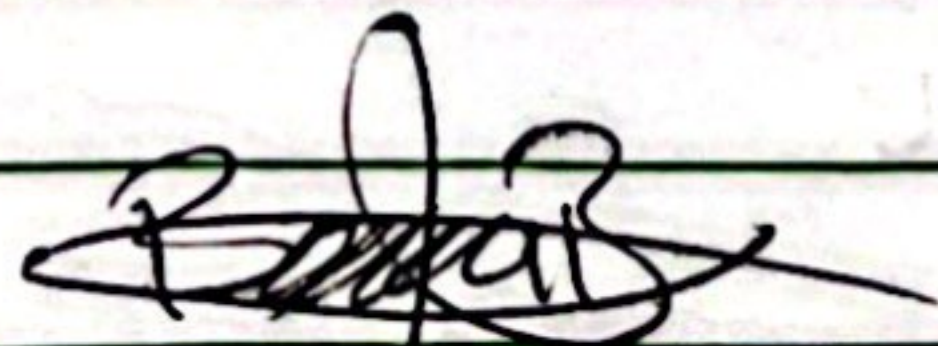
MAQUINARIA Y EQUIPO

- Mezcladora (1); Transportadora (1); Vibrador de concreto (1); texturizador (1).

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).

OBS: Se tomaron muestras de cilindros de concreto para cunetas y vigas rieles.



Insp. Interventora.


RESID. OBRA.

11/07/24. Clima Lluvioso mañana, nublado tarde.

ACTIVIDADES.


- Se realizó alistado de terreno y colocación de acero para cunetas en el tramo central de la placa huella.

MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Tronchadora (1); Vibrocompactadora (1); Riel metálico (40).

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).


JISP Interventora


JISP OBRA.

12/07/24. Clima Soleado mañana y tarde.

ACTIVIDADES.

- Se continuó con el fundido de placas de cunetas en el tramo central de la placa huelle por ombos camiles.
- Se verificó el cumplimiento del refuerzo, vibrado de la mezcla, texturado y posterior curado del concreto con antifol.


MAQUINARIA Y EQUIPO.


- Mezcladora (1); vibrador de concreto (1); texturadora (1).

MANO DE OBRA

- Obreros (8); Maestro (1).

OBS: Se formaron muestros de cilindros de concreto por cunetas.


JISP Interventora


JISP OBRA.

13/07/24. Clima Soleado

ACTIVIDADES.

- Se continuó con el fundido de cunetas por ombos camiles en el sector central de la placa huelle.
- Se continuó con el fundido de vigas nobles en el mismo sector.

MAQUINARIA Y EQUIPO.


- Mezclador (1); Riel metálico (40); Vibrador de concreto (1); Texturador (1).

MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).



José Intendente.



José Obra.

15/07/24 Clima Soleado.

ACTIVIDADES

- Se realizó alistado de cunetas en el tramo inicial de la plaza bella, realizando la colocación de los respectivos aceros, por ambas corrientes, al igual que el acero de los vigas rostradas en el mismo sector, terminando así esta actividad.
- Se continuó con el fundido de cunetas en el sector inicial de la plaza bella, así como el fundido de los respectivos vigas rostradas.


MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Riel metálico (20); Vibrador de concreto (1); Texturador (1); Donador (1).

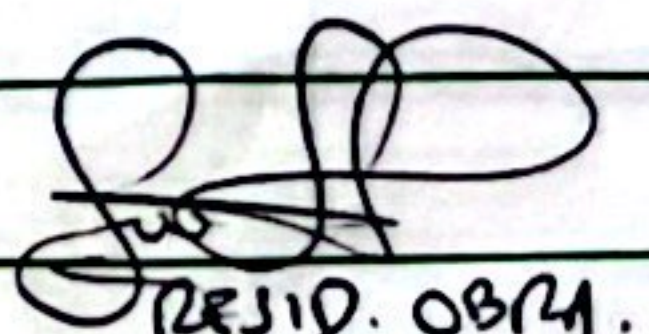
MANO DE OBRA.

- Obreros (8); Maestro (1).

OBS: Se formaron muestras de cilindros de concreto de cunetas.



José Intendente.



José Obra.

16/07/24 Clima. Llovizna, Menor, Llovizna tarde.

No se realizaron actividades por motivo de reunión patronal.



José Intendente.



José Obra.

17/02/24. Clima Soleado.

ACTIVIDADES.

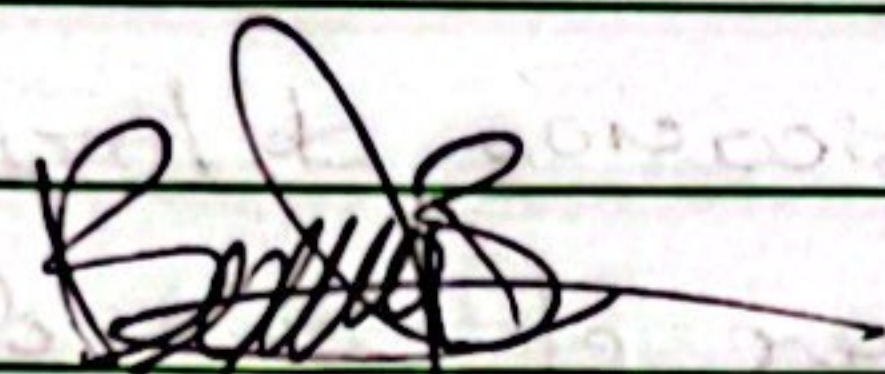
- Se finalizó la construcción de los cunetas en el sector inicial de la placa huela, por el costado izquierdo.
- Se realizó trabajo de detalles para su construcción.

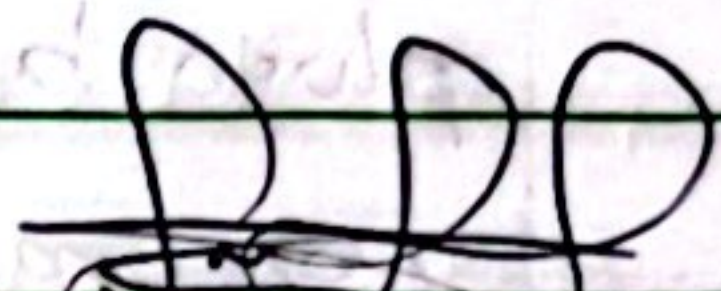
MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (20); Texturizador (1).

MANDO DE OBRA

- Obreros (4); Maestro (1).


Inso Interventora


JES. RESIDENTE OBRA

18/02/2024. Clima Nublado matutno, Soleado tarde.

ACTIVIDADES.

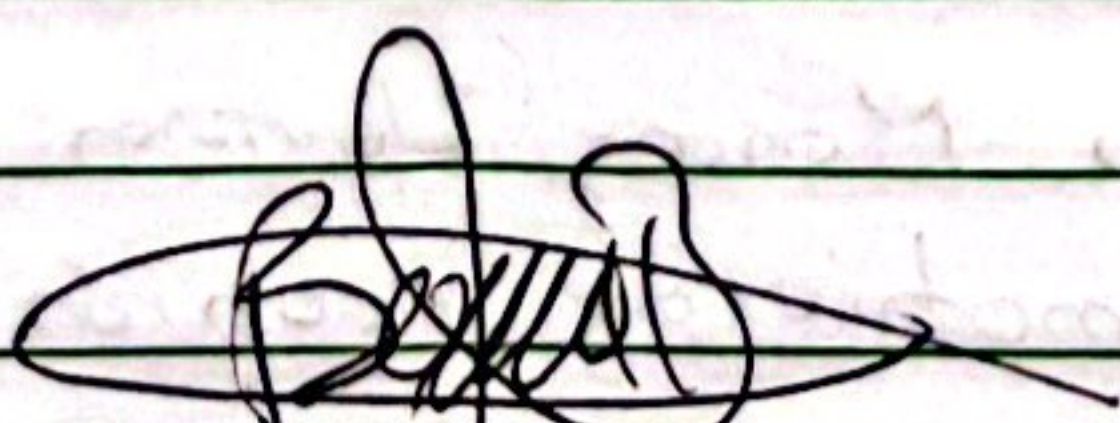
- Se finalizó el fundido de los topes rectos faltantes en el turno inicial de la placa huela.
- Se niveló el terreno, ornó acero y fundieron losos de aproximación al inicio y final de placa huela.

MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (20); Texturizador (1).

MANDO DE OBRA

- Obreros (4); Maestro (1).


Inso Interventora


RES. OBRA

19/07/24. Clima Nublado nublado, Soleado tarde.

- ACTIVIDADES

- Se armaron formalejos para bordillos y se dio inicio al fundido de los mismos por los carriles derecho e izquierdo, en el tramo final de la placa huela.

MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (20).

MANO DE OBRA.

- Obreros (4); Maestro (1).


Insy Interventora.


RESID. OBRA

20/07/24. Clima Soleado nublado

ACTIVIDADES


- Se continuó con el armado y fundido de bordillos en el tramo central del trayecto, por el carril derecho.
- Se hizo y excavó descafe de desague por el carril derecho, al inicio del proyecto. Este desague se realizó al estilo de cuneta en concreto, con una longitud total de 35 ml.


MAQUINARIA Y EQUIPO. Clim

- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (20)
- Texturizador (1).

MANO DE OBRA.

- Obreros (4); Maestro (1).


Insy Interventora.


RESID. OBRA.

22/07/24. Clima Soleado nublado y Tormenta.

ACTIVIDADES

- Se continuó con el armado y fundido de bordillos en el hormo inicial de la placa hella por el canal derecho.
- Se continuó con el armado y fundido de desague al interior de la horma de placa hella.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Mezcladora (1); Vibrador de concreto (1); Riel motorizado (2).


MANO DE OBRA

- Obreros (4); Maestro (1).

OBS: - Se solicitó por parte de la Comunidad la apertura de la vía para el paso de vehículos livianos, dado que ya han transcurrido el tiempo suficiente para el fraguado inicial de los placas, lo cual fue consultado con la Intervención, dando su aprobación.



Interventor



Respo. OBRA

23/07/24. Clima Soleado.

ACTIVIDADES

- Se continuó con el armado y fundido de bordillos en el hormo inicial de placa hella, con 12 puentes.

MAQUINARIA Y EQUIPO

- Mezcladora (1); Vibrador de concreto (1); Riel motorizado (2).

MANO DE OBRA

- Obreros (4); Maestro (1).



Interventor



Respo. OBRA

24/07/24 Clima Soleado.

ACTIVIDADES

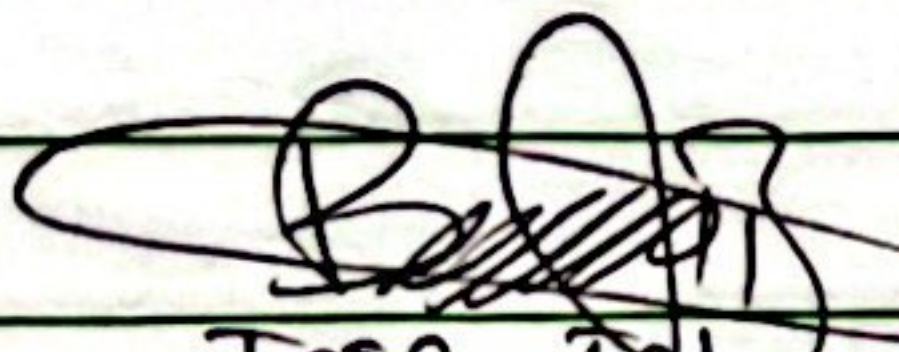
- Se finalizó el fundido de bordillos en el turno central de la placa bella, con el requerido.
- Se fundió de scale margen requerido, en la absase kotogo.
- Se recibió visita de INVIA en compañía con la Interventoría por verificación de los trabajos.
- Se realizó limpieza general de sobantes.


MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Mezclador (1); Vibrador de concreto (1); Riel metálico (20).

MANO DE OBRA.

- Obreros (4); Maestro (1).


Inso Interventor.


Resid. Obra.

25/07/24. Clima Nublado.

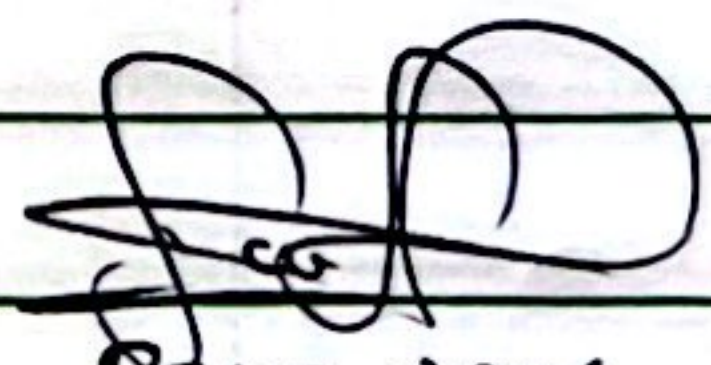
ACTIVIDADES

- Se desmoldaron bordillos fundidos.
- Se construyó placa de acero a escuela.
- Se realizó retiro de equipos de obra y limpieza final.

MANO DE OBRA.

- Obreros (4); Maestro (1).


Inso Interventor.


Resid. Obra.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

8. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-153-2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.SLCNTR.11869822
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5081 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.
CONTRATISTA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LIMITADA
NIT	891.101.100 – 5,
VALOR INICIAL	\$205.455.880,00 incluido IVA
VALOR ADICIONAL N°1	\$ 97.043.072,00 incluido IVA
VALOR TOTAL	\$302.498.952,00 incluido IVA
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-033879 de fecha 30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	23/01/2024
PRÓRROGA No. 1	APROBACIÓN 23/01/2024 DESDE EL 24/01/2024 AL 25/03/2023
PRÓRROGA No. 2	APROBACIÓN 22/03/2024 DESDE EL 26/03/2024 AL 30/04/2024
PRÓRROGA No. 3	APROBACIÓN 30/04/2024 DESDE EL 01/05/2024 AL 15/06/2024
PRÓRROGA No. 4	APROBACIÓN 14/06/2024 DESDE EL 15/06/2024 AL 30/08/2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ELLEN OBEIMAR AICARDI CALEANO

8.1. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

➤ Actividades Técnicas y Administrativas.

- Se realizó visita de seguimiento técnico con el Gestor Ingeniero Levis Sanabria, en todos los Convenios Solidarios, esto con el fin, de verificar los avances y

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

motivos de atrasos que se han presentados durante la ejecución de estos.

- Se ha realizado seguimiento y control técnico a las actividades de obra en los Convenios Solidarios que están en marcha, garantizado el cumplimiento de las explicación y anexo técnico para cada actividad.
- Se hizo la solicitud y trámite de la prórroga N°4 hasta el 31 de agosto de 2024, para todos los convenios solidarios a cargo de la presente Interventoría.
- Se realizaron Comités operativos, en conjunto con las Juntas de Acción Comunal, en ellos estuvieron presente los presidentes y tesoreros, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados y demás integrantes del comité operativo. Esto con el fin de tomar decisiones técnicas, operacionales, administrativas y financieras para el avance del convenio. En estos comités se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.
- Se ha asistido a las reuniones virtuales y presenciales con la Gerencia del programa de la SVR y DT Córdoba.
- Se ha mantenido permanente comunicación con la JAC desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.
- Se mantiene comunicación con la JAC respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.
- Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.
- Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

 	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

- Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan.
- Se efectuaron los diligenciamientos de los informes semanales, así:
 - Informe Semanal 23: desde el 28 de junio al 04 de julio de 2024.
 - Informe Semanal 24: desde el 05 al 11 de julio de 2024.
 - Informe Semanal 25: desde el 12 al 18 de julio de 2024.
 - Informe Semanal 26: desde el 19 al 25 de julio de 2024.
 - Informe Semanal 27: desde el 26 de julio al 01 de agosto de 2024
- Se elaboró el Acta de Costos N°7, correspondiente al mes de julio de 2024.
- Proyección y revisión de correspondencia enviada y recibida.

➤ **Actividades financieras**

Se ha puesto a disposición del proyecto todas las herramientas y recursos de la interventoría para hacer el acompañamiento a la JAC en cuanto a la consecución de cotizaciones y búsqueda de proveedores para la correcta inversión de los recursos del convenio.

➤ **Actividades generales Ambientales.**

Durante el presente periodo, se ha brindado el apoyo necesario, por parte de la Interventoría, hacia las juntas de acción comunales, con la finalidad de avanzar en la entrega de la información ambiental.

De igual manera, se hizo la revisión de los entregables ambientales, que deben ser reportados mensualmente, por parte de las JAC, se procedió con el análisis del apéndice ambiental para los diferentes convenios.

Es de recordar, que estos, son proyectos de baja complejidad, ya que la Intervención se realiza sobre infraestructura existente, no se requiere intervención de cuerpos de agua, el suministro de material se realiza mediante terceros que cuenten con autorización por parte de las autoridades, no se genera ocupación de cauce, no se genera afectación biótica, no se genera excavaciones profundas, no se genera

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		


afectación a la infraestructura de predios y/ servicios públicos aledaños, no procede la implementación de un programa de arqueología preventiva, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente. Las cuales fueron plasmadas en los diferentes PGA entregados por los convenios, y que, a la fecha, se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, es importante mencionar, que, es responsabilidad de las JAC dar cumplimiento a cada programa de manejo con sus respectivos soportes.

- **Subprograma: Capacitación y concienciación para el personal de obra**

Durante el presente periodo, a pesar de los respectivos llamados de atención por parte de la Interventoría, a los diferentes convenios, no se da cumplimiento en su totalidad a las capacitaciones programadas, es de mencionar, que se recibe soporte de capacitación por parte del convenio solidario N° 4127 – 2023, correspondiente a La Apartada de los Limones, en el tema descrito en la siguiente tabla, esto con el objetivo de fortalecer el proceso de concientización sobre la conservación y protección al medio ambiente.

Esta capacitación se realiza de acuerdo al cronograma presentado en el PGA, este puede sufrir variaciones, por situaciones puntuales presentadas en obra, si se requiere refuerzo en algún tema particular por eventos presentados en obra.

Capacitaciones ambientales 2024				
Convenio	JAC	Tema	Fecha	Asistentes
4127de 2023	La Apartada Los Limones	Manejo de materiales de construcción y concreto, manejo de derrames, contaminación del aire y ruido	Mayo 31 del 2024	4
4127de 2023	La Apartada Los Limones	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables, basuras y uso de punto ecológico	Junio 12 del 2024	8
4127de 2023	La Apartada	Manejo y ahorro de recursos naturales	Julio 07 del 2024	8

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

Capacitaciones ambientales 2024				
Convenio	JAC	Tema	Fecha	Asistentes
	Los Limones			

- **Subprograma: Cumplimiento de requerimientos legales.**

Fuentes de materiales: A la fecha de elaboración del presente informe, el convenio solidario 4127, correspondiente a la JAC La Apartada Los Limones, presentó los soportes correspondientes a la fuente de materiales utilizada en obra, es de mencionar, que esta corresponde a cantera SIBERIA LTDA, ubicada en el corregimiento de La Victoria del municipio de Montería departamento de Córdoba.

Concesión de aguas: Para el desarrollo del proyecto no será necesario tramitar permiso de concesión de aguas superficiales, se tiene previsto el almacenamiento de aguas lluvias en los predios de las personas de la comunidad.

Para la utilización de las aguas lluvias no se requiere de permiso de concesión de aguas, mientras estas no conformen un cauce natural que atravesase varios predios, las mismas no podrán ser vertidas en fuentes hídricas cuando contengan sedimentos sólidos sin antes darles un tratamiento previo.

EL Decreto 1076 en sus artículos 2.2.3.2.16.2 y 2.2.3.2.16.3, ordena lo siguiente

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.2. Concesión de aguas lluvias. Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman un cauce natural que atravesase varios predios, y cuando aún sin encausarse salen del inmueble".

"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.3. Aguas lluvias y construcción de obras. La construcción de obras para almacenar conservar y conducir aguas lluvias se podrá adelantar siempre y cuando no se causen perjuicios a terceros".

Por otro lado, respecto a los reservorios artificiales, su utilización no requerirá de permiso de concesión de aguas, si estos son llenados con aguas lluvias, en caso de no ser así, y para su llenado se esté haciendo uso de una fuente hídrica, si se deberá contar con el respectivo permiso por parte de esta Autoridad Ambiental.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Convenio	JAC	Autorización
4127-2023	La Apartada Los Limones	Ana Mercedes Álvarez
3924-2023	Corregimiento Los Limones	Ana María Ricardo Altamiranda
3717 - 2023	Villa Fátima	Miguel Andrés Martínez Peña
3997-2023	Palmira	Bladimir Enrique Hoyos Padilla
3756 -2023	Bajo De Piedra	Manuel Salvador Oliveros
3521- 2023	Santa Fe	No presenta

Vertimientos: Para este caso, se cuenta con unidad sanitaria fija en las viviendas aledañas al proyecto, se presenta a continuación certificación por parte de la JAC de acción comunidad.

Convenio	JAC	Autorización
4127-2023	La Apartada Los Limones	Cumple
3924-2023	Corregimiento Los Limones	Cumple
3717 - 2023	Villa Fátima	Cumple
3997-2023	Palmira	Cumple
3756 -2023	Bajo De Piedra	Cumple
3521- 2023	Santa Fe	No presenta

➤ Manejo de las Actividades Constructivas

• Subprograma Manejo integral de materiales de construcción

Teniendo en cuenta las distancias y condiciones de la vía, de los frentes de obra, hasta el casco urbano, se dificulta la presencia de empresas recolectoras de residuos sólidos ordinarios, por lo cual, se optó por solicitar a las empresas que suministran el cemento a los diferentes convenios, realizar la disposición final de dichos residuos, es de mencionar, que todos los convenios se encuentran en dicha gestión, para este periodo, se presenta el avance respectivo del tema.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Teniendo en cuenta las distancias y condiciones de la vía, de los frentes de obra, hasta el casco urbano, se dificulta la presencia de empresas recolectoras de residuos sólidos ordinarios, por lo cual, se optó por solicitar a las empresas que suministran el cemento a los diferentes convenios, realizar la disposición final de dichos residuos, es de mencionar, que todos los convenios se encuentran en dicha gestión, para este periodo, se presenta el avance respectivo del tema.

Convenio	JAC	Autorización
4127-2023	La Apartada Los Limones	Cumple
3924-2023	Corregimiento Los Limones	No presenta avance
3717 - 2023	Villa Fátima	Cumple
3997-2023	Palmira	Cumple
3756 -2023	Bajo De Piedra	No presenta avance
3521- 2023	Santa Fe	No presenta avance

En obra, se requiere del uso y manejo de materiales de construcción en obra para el desarrollo de actividades objeto de los convenios, estos se adquieren en fuentes legales.

Pétreos: arena, triturado, piedra.

Hierro: estos se acopian en el frente de obra, sobre estibas y protegido con plástico para evitar afectaciones al suelo y aguas de la zona.

Madera: Esta se acopia en los frentes de obra protegida para evitar el deterioro por acción de las lluvias, solo se dispone en obra el material diario debido al poco espacio en las vías.

Cemento: este se acopia en los frentes de obra para la actividad diaria, se almacena sobre estibas y protegido de las lluvias con plástico o almacenado en viviendas alquiladas.

Se verifica la procedencia legal de los materiales pétreos, revisando la documentación minera y ambiental de los proveedores.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Estos se utilizaron la mayor parte del tiempo de manera inmediata en las actividades de realización de mezclas, acopio de cementos, cuando no se consumen en su totalidad, se acopian en los frentes de obra, demarcados y protegidos.

- **Subprograma 2.2. Subprograma 2. Señalización en frentes de obra y sitios temporales**

Se recomendó a los diferentes convenios, implementar señalización para los diferentes acopios, que se tienen a lo largo del tramo intervenido, la interventoría será garante que se cumpla con lo descrito en los diferentes PGA

- **Subprograma 2.3. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RDC) y lodos**

Desde la interventoría, se brindó, el apoyo a los diferentes convenios, para dar un manejo adecuado ambiental y legalmente, a los materiales sobrantes, productos de las excavaciones realizadas, a continuación, se presenta la gestión realizada por las diferentes JAC.

Convenio	JAC	Autorización
4127-2023	La Apartada Los Limones	El pasado 21 de mayo del 2024, la Secretaría de Infraestructura, del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, manifiesta a la JAC La Apartada Los Limones, que el municipio no cuenta con una escombrera certificada para la disposición final de residuos de excavación y demoliciones, por lo tanto, autoriza a la JAC a disponer los materiales resultantes en los sitios descritos en el certificado adjunto, o en su defecto en los predios privados cercanos, previa autorización de sus propietarios.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Convenio	JAC	Autorización
3924-2023	Corregimiento Los Limones	No presenta avance
3717 - 2023	Villa Fátima	En relación a la JAC Villa Fátima se generó un volumen de 198.6 m3 de material sobrante, el cual no se contempló dentro de las actividades contractuales, pero si fue necesario realizar su disposición final o aprovechamiento, para lo cual, se reutilizo para acondicionar y complementar varios sectores de la vía afectados por el recorrido de la maquinaria utilizada para el transporte de materiales de la obra. Se aclara que este material no se dispuso en predios privados, se reutilizo en el mejoramiento de la vía existente.
3997-2023	Palmira	El pasado 29 de julio del 2024, la Secretaría de Infraestructura, del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, manifiesta a la JAC Palmira, que el municipio no cuenta con una escombrera certificada para la disposición final de residuos de excavación y demoliciones, por lo tanto, autoriza a la JAC a disponer los materiales resultantes en los sitios descritos en el certificado adjunto, o en su defecto en los predios privados cercanos, previa autorización de sus propietarios.
3756 -2023	Bajo De Piedra	En relación a la JAC Bajo de Piedra, se generó un volumen de 209,9 m3 de material sobrante, el cual no se contempló dentro de las actividades contractuales, pero si fue necesario

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Convenio	JAC	Autorización
		realizar su disposición final o aprovechamiento, para lo cual, se reutilizo para acondicionar y complementar varios sectores de la vía afectados por el recorrido de la maquinaria utilizada para el transporte de materiales de la obra. Se aclara que este material no se dispuso en predios privados, se reutilizo en el mejoramiento de la vía existente.
3521- 2023	Santa Fe	No presenta avance

➤ **Actividades Sociales.**

Durante el mes de julio del presente año, desde el área social se realizaron diferentes actividades enmarcadas en el manual de INVIAS, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas bajo el contrato de interventoría No. 5081-2023, en los Convenio 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023 y 3924-202 se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó la apertura del buzón de sugerencias, con el apoyo de los presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunales y se realizó con el fin de revisar si se encontraban solicitudes de preguntas, quejas, reclamos y o sugerencias para desarrollar medidas que permitan brindar la atención oportuna y eficiente a los impactos que afectan a la población de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, esto mediante estrategias de información, comunicación, participación y control que propendan por el mejoramiento de sus condiciones de vida, los presidentes de las JAC se comprometen a brindar informar periódica a los miembros de la comunidad sobre la importancia del uso del buzón de sugerencia y a realizar el seguimiento a la apertura del buzón de sugerencia quincenalmente, esto con el acompañamiento del veedor o algún miembro de la comunidad.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Seguimiento a las propuestas de participación comunitaria de los diferentes convenios a través de llamadas telefónicas, reunión con el director de interventoría, residente de interventoría, presidente de la JAC, residente de obra con la finalidad de conocer los avances en el componente social, donde se quedó como compromiso entregar cotizaciones con facturas electrónicas.

Se hizo acompañamiento al estado físico de las obras de los convenios solidarios 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, la profesional social visito las diferentes comunidades para hacerle seguimiento a la ejecución de los convenios, y reporta el estado actual de los obras, quedando como compromiso visitas para registrar el avance eficaz.

Se cumplió con la asistencia a unas capacitaciones convocadas por el líder social Antonio Dajer de manera virtual, se contó con la asistencia del profesional de sostenibilidad, líder social de INVIAS y los profesionales sociales de los distintos contratos de interventoría. en esta reunión se realizó el seguimiento de los formatos que se debe entregar para el cierre de los convenios, se resaltó la importancia de dirigencia los formatos de una manera adecuada y correcta, y se respondieron dudas e inquietudes sobre lo que se debe entregar para la liquidación de cada convenio. quedando como compromiso adelantar los informes para cierre del contrato.

8.2. Informes de especialista y profesionales.

Durante el mes de julio de 2024, las labores del Director y Residente de Interventoría consistieron en realizar los diferentes comités operativos el proyecto con las Organismo de Acciones Comunes, el Residente de Obra, Contador, Comité de Participación ciudadana y comunidad en general, revisando y aprobando cotizaciones presentadas, enfatizando en el alcance de las obras, atendiendo los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, así como los lineamientos de convenios solidarios expuestos por la Subgerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde incluye formatos e instructivos adecuados al alcance de las obras y ser utilizados en la ejecución de los convenios para el seguimiento y control. Así mismo, seguimiento técnico, a todas las actividades de obra que se vienen ejecutando en los Convenios Solidarios.

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

Por otro lado, la profesional Social, apoyo la realización de la ficha de caracterización socioeconómica que tuvo como fin recolectar información de fuentes primarias, para identificar el contexto poblacional, económico y dinámicas comunitarias con el propósito de reconocer las necesidades y potencialidades de cada territorio en el que tendrá incidencia el Convenio Solidario, así como la matriz consolidación de datos socioeconómicos de los diferentes convenios.

De parte del profesional Ambiental, se ha brindado el apoyo necesario, por parte de la Interventoría, hacia las juntas de acción comunales, con la finalidad de avanzar en la entrega de la información ambiental.

De igual manera, se hizo la revisión de los entregables ambientales, que deben ser reportados mensualmente, por parte de las JAC, se procedió con el análisis del apéndice ambiental para los diferentes convenios.

Es de recordar, que estos, son proyectos de baja complejidad, ya que la Intervención se realiza sobre infraestructura existente, no se requiere intervención de cuerpos de agua, el suministro de material se realiza mediante terceros que cuenten con autorización por parte de las autoridades, no se genera ocupación de cauce, no se genera afectación biótica, no se genera excavaciones profundas, no se genera afectación a la infraestructura de predios y/ servicios públicos aledaños, no procede la implementación de un programa de arqueología preventiva, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.

las cuales fueron plasmadas en los diferentes PGA entregados por los convenios, y que, a la fecha, se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, es importante mencionar, que, es responsabilidad de las JAC dar cumplimiento a cada programa de manejo con sus respectivos soportes.

Con respecto al tema de los inspectores de obra, realizaron seguimiento técnico ya administrativo a las actividades de obra en los Convenios Solidarios No. 3717-2023 OAC Villa Fátima, No.3756-23 OAC Bajo de Piedra, No. 4127-23 OAC Apartada Los Limones, No.3521-23 OAC Santa Fe, No.3797 OAC Palmira, No 4127 OAC Los

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

Limones, garantizado así, el cumplimiento de las explicación y anexo técnico para cada actividad.

La personal que Intervinieron durante este periodo fueron:

- Director de Interventoría.
- Residente de Interventoría.
- Profesional Social.
- Profesional Ambiental.
- Inspectores de obra

8.3. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

- **INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC**
No aplica
- **INFORME MATRIZ DE RIESGOS.**
No aplica

9. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

9.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría.

Durante el periodo reportado se contó con un (1) vehículo para el Residente de Interventoría, permitiendo realizar las visitas de obra, asistencia de reunión en la DT Córdoba INVIAS y acompañamiento de visita técnica al gestor Ingeniero Levis Sanabria. Adicionalmente, se contó dos (2) motocicletas para los inspectores de obra en campo.

Así mismo, se contó con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

9.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría y a su efectivamente utilización en el periodo.

Durante este periodo se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO
1	JAVIER BARRERO MOSSOS	Director de Interventoría	19/02/2024
2	OSCAR BULA ESPINOSA	Residente de Interventoría	19/02/2024
3	ISABEL MARCELA BENÍTEZ ALMANZA	Profesional Social	01/04/2024
4	LUIS ALFONSO HIUITA TORRES	Profesional Ambiental.	01/07/2024
5	RAMIRO LUIS LUGO ROMERO	Inspector N°1	11/05/2024
6	YINETH BARRERA BARANOVA	Inspector N°2	11/05/2024

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

9.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría.

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORIA en cual se adjunta a continuación.

Con base en el CDP 169723 del 21 de septiembre del 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de \$205.455.880, así:

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL	CONTRATISTA DE OBRA		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA		SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023		CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402112-02	Nación	10	\$4.109.117,60
C-2402-0600-14-0-2402041-02	Nación	10	\$201.346.762,40

Teniendo en cuenta que en el periodo anterior no hubo ejecución de obra, no se tienen actas de costos tramitadas anteriormente, por lo que el saldo del RP sigue siendo igual al inicialmente dado.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

9.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516
Anexo No. 0 de fecha 28/11/2023.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20.545.588,00	30	12	2023	27	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	27	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	26	1	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 61.636.764,00	2	1	2024	2	1	2029

- Prórroga N°1: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516
Anexo No. 5 de fecha 26/01/2024.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20.545.588,00	30	12	2023	27	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	27	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	26	3	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 61.636.764,00	2	1	2024	2	1	2029

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

- Prórroga N°2: Póliza de cumplimiento No. 61-44-101052516 Anexo No. 6 de fecha 12/04/2024.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20.545.588,00	30	12	2023	2	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	2	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 41.091.176,00	30	12	2023	1	5	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 61.636.764,00	2	1	2024	2	1	2029

Con respecto a la Prórroga N°3 y N°4, se anexará el próximo Informe.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, firmado por las partes, objeto de la solicitud de prórroga N°3 hasta el 15 de junio de 2024.

9.5. Seguimiento al Plan de Calidad de Interventoría.

Debido a que este contrato no tiene supervisión por calidad no se adjuntará el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.6. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la Inversión del Anticipo:

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

Se presenta el Plan de Cargas N°2 del 22 de abril de 2024 firmado por las partes, objeto de la solicitud de prórroga N°3 hasta el 15 de junio de 2024.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

10. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

- Las fuertes precipitaciones presentadas en el departamento de Córdoba, han generado atrasos en las actividades de obra, para los tres (3) Convenios Solidarios que se encuentran en marcha N°3924-2023 – JAC CORREGIMIENTO LOS LIMONES / N°3997-2023 – JAC CORREGIMEINTO PALMIRA, N°3521-23 CORREGIMIENTO SANTA FE, lo cual con lleva a que se presentara un plan de contingencia por parte de la JAC, para minimizar en lo posible los atrasos.
- Con respecto a los Convenios Solidarios No. 3717-2023 OAC CORREGIMIENTO VILLA FÁTIMA, No.3756-23 OAC VEREDA BAJO DE PIEDRA, No. 4127-23 OAC VEREDA APARTADA LOS LIMONES, finalizaron su etapa de obra, lo cual se traduce a que su avance físico sea del 100,0%. Por lo tanto, estos convenios se encuentran en etapa de liquidación.
- Con lo expuesto anteriormente, el 30 de julio de 2024, se legalizo la prórroga N°4, para todos los Convenios Solidarios, con fecha de finalización hasta el 31 de agosto de 2024. El objeto de esta prórroga, es liquidar todos los Convenios Solidarios, desde la parte ambiental, social, contable, administrativa y técnica.
- Así las cosas, los todos los Convenios Solidarios e Interventoría, finalizará su etapa contractual, el 31 de agosto de 2024, lo cual, con lleva que para el mes de agosto, se inicie con la liquidación del Contrato de Interventoría y Convenios Solidarios.
- Desde el área ambiental, durante este periodo, la Interventoría, cumplió con el respectivo acompañamiento a los diferentes convenios, es de mencionar, que los diferentes convenios, deben adquirir un mayor compromiso en cuanto a la entrega de la información en los tiempos establecidos.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

11. ANEXOS

11.1. Relación Correspondencia:

Durante el mes de julio de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

La siguiente tabla relaciona la correspondencia enviada y recibida por correo electrónico durante el presente periodo:

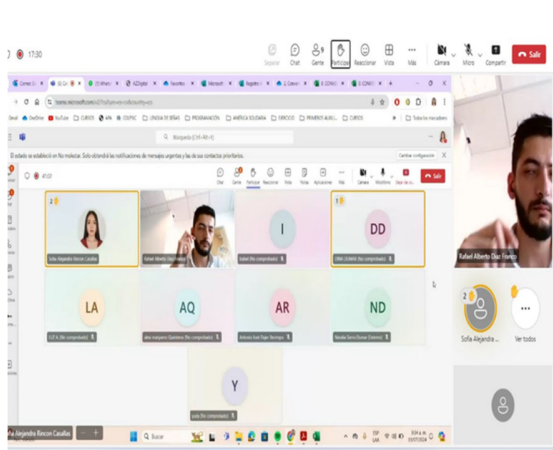
Fecha	Asunto	Destinario
09 DE JULIO 2024	OFI-INT-CORDOBA-020 Solicitud de Prorroga y Adicional No. 6 - Contrato 5081 de 2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
22 DE JULIO 2024	OFI-INT-BAJOPIEDRA-007_ Solicitud de compromisos sociales y ambientales – convenio No 3756-2023	OAC VEREDA BAJO DE PIEDRA
22 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-VILLAFATIMA-007_ Solicitud de compromisos sociales y ambientales – convenio No 3717-2023	OAC VILLA FÁTIMA
25 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-015_ Aprobación Solicitud de Prorroga No. 4 Convenio Solidario No. 3924 -2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
25 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-016 _ Aprobación Solicitud de Prorroga No. 4 Convenio Solidario No. 3997 -2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
25 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-018_Aprobación Solicitud de Prorroga No. 4 Convenio Solidario No. 3521-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
25 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-017_Aprobación Solicitud de Prorroga No. 5 Convenio Solidario No. 3756-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
29 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-019_Aprobación Solicitud de Prorroga No. 4 Convenio Solidario No. 3717-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
29 DE JULIO DE 2024	OFI-INT-CORDOBA-016_Aprobación Solicitud de Prorroga No. 4 Convenio Solidario No. 4127-2023	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

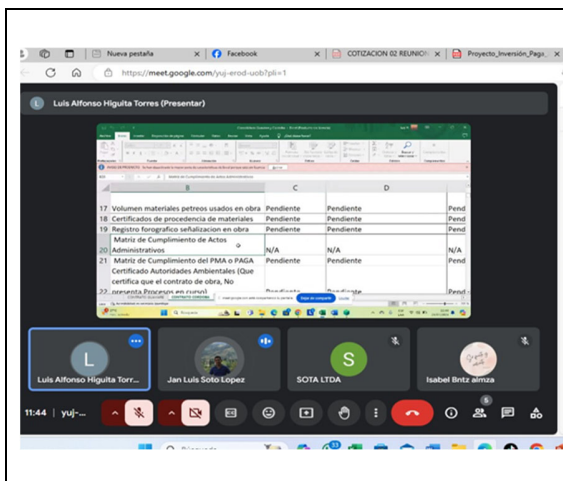
11.2. Registro fotográfico.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			


REGISTRO FOTOFRAFICO SOCIO-AMBIENTAL CONVENIOS SOLIDARIOS

	
ASISTENCIA A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA SOCIAL.	APERTURA BUZON DE SUGERENCIAS CONVENIO 3521.
	
APERTURA BUZON DE SUGERENCIAS CONVENIO 3756.	ACOMPANIAMIENTO COMITÉ OPERATIVO CONVENIO 3717.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			



REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DIA 24 DE JULIO.



REUNION SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 3756 DIA 24 DE JULIO



VISITA DEL INVIAS AL CONVENIO 3521 DIA 24 DE JULIO.



ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO 3924 DIA 2 DE AGOSTO.

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			



**ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO 3997
DIA 24 DE JULIO.**



**ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO 4127
DIA 6 DE JULIO.**


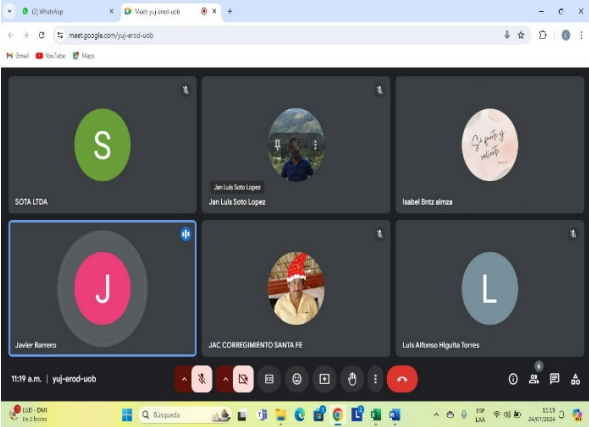
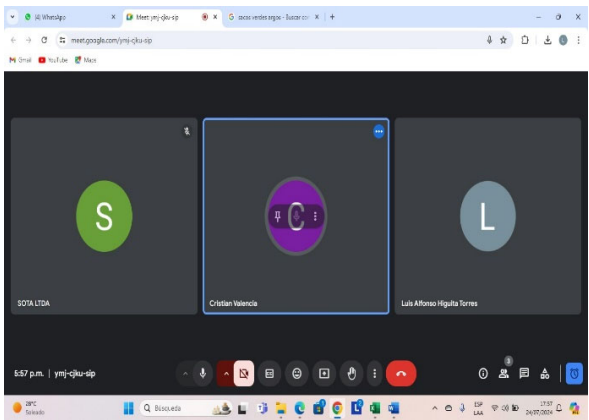


**ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO 3521
DIA 24 DE JULIO.**



**ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO 3717
DIA 27 DE JULIO.**

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

	
Reunión ambiental JAC Bajo de Piedra	Reservorios artificiales para uso de agua en obra
	
Reunión ambiental JAC Santa Fe	Reunión ambiental JAC Palmira

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.			

	
Protección de materiales JAC Villa Fátima	Cemento sobre estibas JAC Villa Fátima
	
Recoleccion de bolsas de cemento JAC Villa Fatima	Varillas sobre estibas JAC Villa Fátima

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6
	JUNTAS DE ACCIONES: SANTA FE, BAJO DE PIEDRA, VILLA FATIMA, LOS LIMONES, APARATADA LOS LIMONES Y PALIMRA	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.	
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3521-2023, 3717-2023, 3756-2023, 3997-2023, 4127-2023, 3924-2023	CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5081de 2023	
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		

 <p>31/05/24 9:56 a. m. +8.528685.-75.384175 #Convenio 4127 de 2023 #JAC Apartada Los Limones</p>	 <p>12/06/24 11:34 a. m. +8.528503.-75.38406 #Convenio 4127 de 2023 #JAC Apartada Los Limones</p>
Capacitacion ambiental mayo del 2024, JAC La Apartada Los Limones	Capacitacion ambiental junio del 2024, JAC La Apartada Los Limones
 <p>3/07/24 10:31 a. m. +8.528191.-75.38403 #Convenio 4127 de 2023 #JAC Apartada Los Limones</p>	 <p>28/05/24 2:33 p. m. +8.526675.-75.383993 Pueblo Nuevo #Convenio 4127 de 2023 #JAC Apartada Los Limones</p>
Capacitacion ambiental julio del 2024, JAC La Apartada Los Limones	Proteccion de materiales JAC La Apartada Los Limones
