"CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS NUMERO 1420.10.4.61 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA"

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como apoyo en la operación del banco municipal de programas y proyectos, Apoyo en la articulación del Plan de Desarrollo Municipal con todos los requerimientos de la plataforma integrada de inversión pública PIIP, y apoyo en el seguimiento de planes de acción de la alcaldía municipal de Aguadas, Caldas.

Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios de apoyo a la gestión son las siguientes:

1. Apoyar a las diferentes dependencias de la entidad en la formulación y estructuración de los planes de acción con base en las acciones y actividades a adelantar en tanto se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024 – 2027.

2. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con la formulación y estructuración de proyectos de inversión en MGA WEB con base en lo establecido por los planes de acción que la entidad defina para la vigencia 2025.

3. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos, desde los respectivos roles, en el proceso de aprobación y viabilización de los proyectos de inversión en Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP.

4. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos en el reporte mensual del avance de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de la entidad en el aplicativo PIIP, con base en la información reportada por los respectivos supervisores.

5. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el ajuste de información, o reprogramación de alcance físico o presupuestal, de los proyectos de inversión de ser necesario.

6. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el seguimiento trimestral de los planes de acción que la entidad defina para

la vigencia 2025, proyectando además los informes que sean requeridos por la alta dirección y la Oficina de Control Interno.

7. Realizar la ordenación y foliación con la debida calidad y oportunidad de todos los tramites adelantados en cumplimiento del objeto contractual, conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, la legislación vigente en la materia y las directrices impartidas por la Oficina de Archivo Municipal

8. Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.

9. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.

10. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación.

PLAZO DE ENTREGA INICIAL: El presente contrato tendrá una duración a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.900.000) El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en periodos mensuales con corte al último día calendario del mes, o por fracción de mes de acuerdo a la ejecución del contrato.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de ejecución del contrato establecidos en las obligaciones específicas, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y *constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social*, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a fecha de presentación del informe de supervisión y acta de avance de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 12.900.000**
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 4.300.000
PENDIENTE POR GIRAR:	$ 8.600.000
FECHA:	30 de junio de 2025

HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ
Secretario de Planeación

CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA
Contratista

A. INFORMACIÓN GENERAL

NRO. DE CONTRATO	**1420.10.4.61 de 2025**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUADAS -CALDAS-
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA
IDENTIFICACIÓN	1.098.633.054
OBJETO CONTRATADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DEL BANCO MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUADAS, CALDAS
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000)**
PLAZO DEL CONTRATO	El presente contrato tendrá una duración desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	291
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	452

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
05/04/2025	05/04/2025	30/06/2025
SUPERVISOR	**NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**
HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ	01	30/04/2025

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
Apoyar a las diferentes dependencias de la entidad en la formulación y	El contratista realizó la estructura de los planes de acción institucionales, así mismo como se expresó en el informe de actividades 003 del mes de marzo se pactó que en mes de abril se llevara seguimientos para contemplar cada caso puntual de

estructuración de los planes de acción con base en las acciones y actividades a adelantar según se requiera con el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024 – 2027.	cada secretaria.
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con la formulación y estructuración de proyectos de inversión en MGA WEB con base en lo establecido por los planes de acción que la entidad defina para la vigencia 2025.	El contratista realizó la formulación del proyecto del sistema general de regalías con el ID 1437658 denominado "Reposición de pavimento en la calle 4 sobre carreras 4 y 5 y en la carrera 5 sobre calles 4 y 5 del municipio de Aguadas" con tipología G del sistema general de regalías SGR llevado a cabo con los lineamientos del departamento nacional de planeación (DNP) y en la articulación de la metodología general ajustada (MGA WEB) donde se anexa los siguientes soportes en la MGA WEB

PLAN DE SOSTENIBILIDAD PAV AGUADAS.pdf	pdf	507 KB	Otro		21/04/2025 10:26:56
PRESUPUESTO .pdf	pdf	247 KB	Presupuesto		21/04/2025 10:26:56
CERTIFICADO INSCRITO ID.pdf	pdf	235 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:56
CERTIFICADO PRECIOS UNITARIOS.pdf	pdf	206 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:56
DOCUMENTO TECNICO CL4 Y CRA 5 AGUADAS.pdf	pdf	719 KB	Documento tecnico		21/04/2025 10:26:56
CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD.pdf	pdf	225 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:54
CERTIFICADO DE USO PUBLICO.pdf	pdf	220 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:54
CERTIFICADO ESTUDIOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	pdf	227 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:54
CERTIFICADO DE NO RIESGO.pdf	pdf	228 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:53
CERTIFICADO DE SERVICIOS PUBLICOS.pdf	pdf	227 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:53

Página 1

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE COMPONENTE JURIDICO ARTICULACION POLITICA PUBLICA SOSTENIBILIDAD.pdf	pdf	224 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:52
CERTIFICADO CUMPLIMIENTO NTC.pdf	pdf	224 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:52
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO.pdf	pdf	225 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:52
CARTA DE PRESENTACION.pdf	pdf	215 KB	Otro		21/04/2025 10:26:51
CERTIFICADO CONCORDANCIA PDM.pdf	pdf	225 KB	Certificacion		21/04/2025 10:26:51
ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES AGUADAS.pdf	pdf	720 KB	Otro		21/04/2025 10:26:50
13 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO.pdf	pdf	408 KB	Otro		21/04/2025 10:15:24
14 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD LOCALIZACION.pdf	pdf	1037 KB	Otro		21/04/2025 10:15:24
11 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO.pdf	pdf	1036 KB	Otro		21/04/2025 10:15:22
12 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.pdf	pdf	1037 KB	Otro		21/04/2025 10:15:23

Página 2

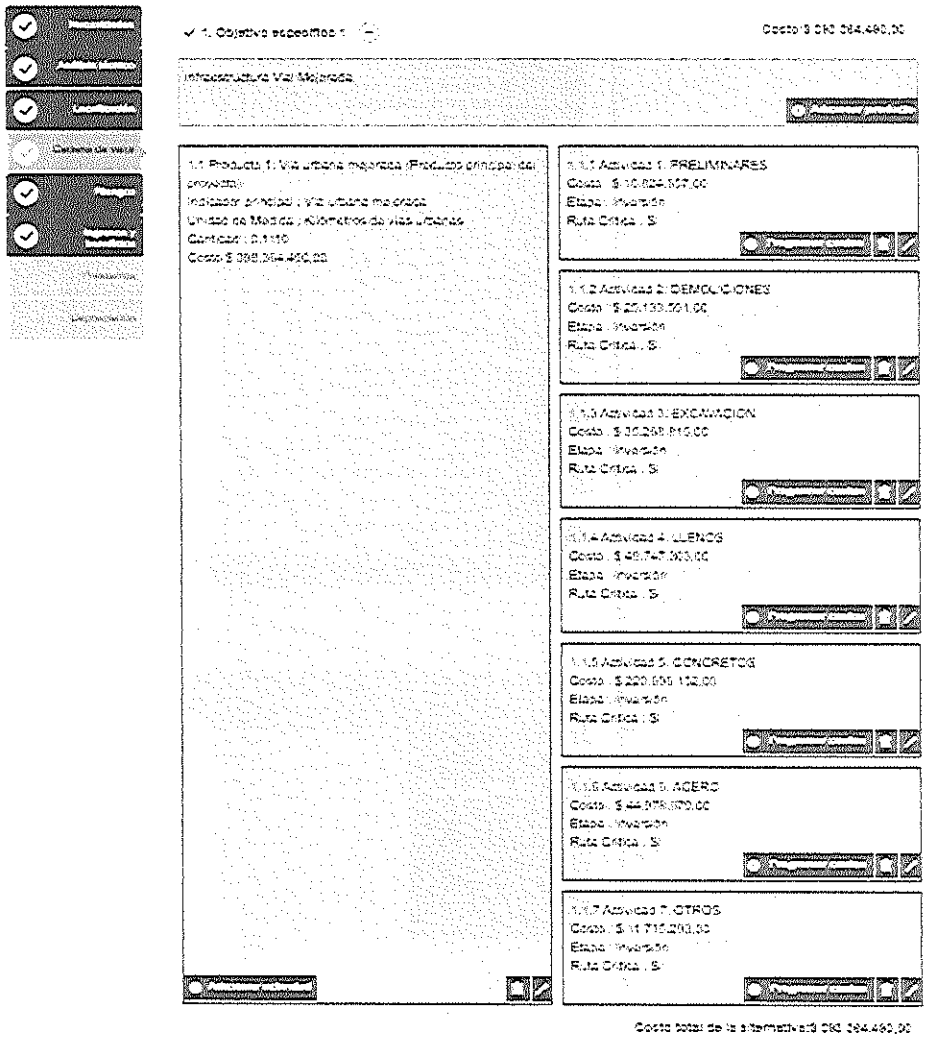
9 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TOPOGRAFO.pdf	pdf	457 KB	Otro			21/04/2025 10:15:22
10 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DISEÑO GEOMETRICO.pdf	pdf	1027 KB	Otro			21/04/2025 10:15:22
6 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO.pdf	pdf	1230 KB	Otro			21/04/2025 10:15:21
7 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf	pdf	402 KB	Otro			21/04/2025 10:15:21
8 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.pdf	pdf	1036 KB	Otro			21/04/2025 10:15:21
4 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DISEÑO DE ESTRUCTURAS.pdf	pdf	1320 KB	Otro			21/04/2025 10:15:20
5 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLANOS DE CONSTRUCCION GENERAL.pdf	pdf	1307 KB	Otro			21/04/2025 10:15:20
2 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.pdf	pdf	2073 KB	Otro			21/04/2025 10:15:19
3 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE SUELOS.pdf	pdf	2001 KB	Otro			21/04/2025 10:15:19
1 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD HIDROLOGICO E HIDRAULICO.pdf	pdf	1020 KB	Otro			21/04/2025 10:15:19

Mis proyectos

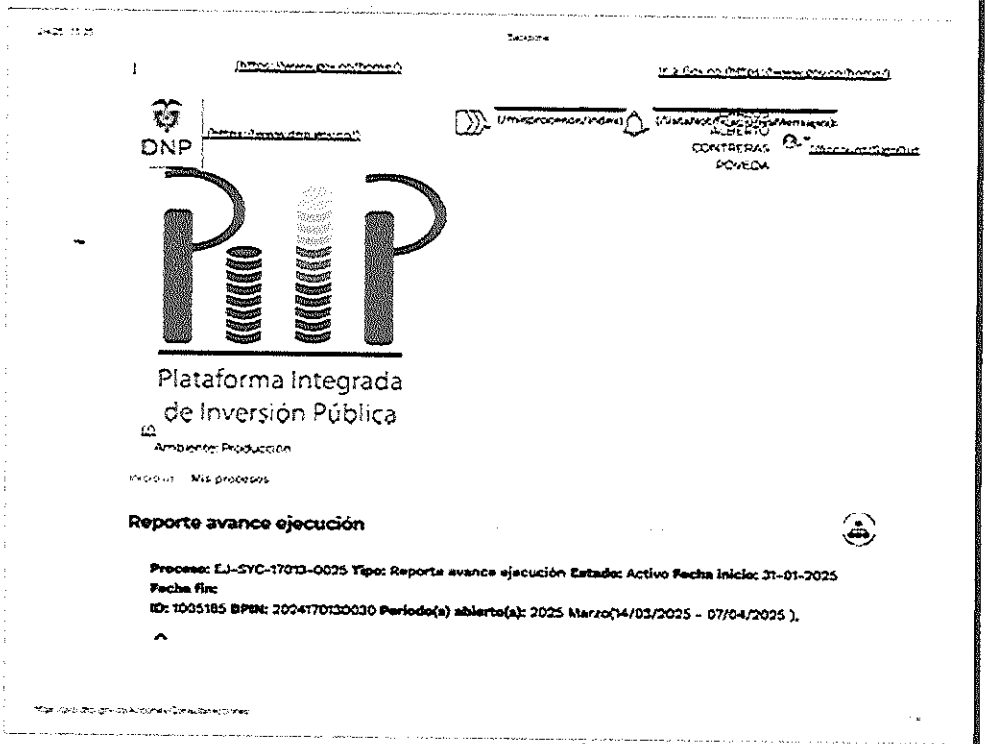
Criterio de búsqueda

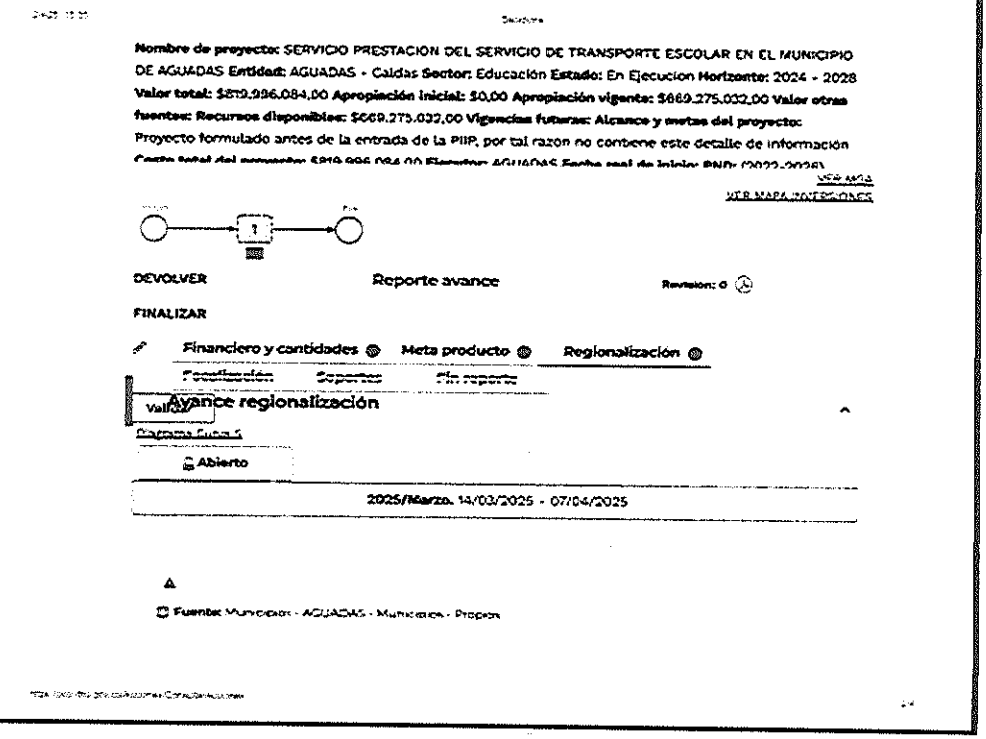
Buscar BPIN/Nombre

1437052		Reposición de pavimento en la calle 4 sobre carreras 4 y 5 y en la carrera 5 sobre calles 4 y 5 del municipio de Aguadas.	10/04/2025	Presentado	AGUADAS - CARLOS CONTRERAS	Tipología: En Plan Tipo: No Inv. Territorial

	
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos, desde los respectivos roles, en el proceso de aprobación y viabilización de los proyectos de inversión en la plataforma integrada de inversión pública PIIP.	En el mes anterior se realizaron todos los procedimientos concernientes a los diferentes roles para dejar en marcha los diferentes proyectos de la administración. Se deja constancia que en el mes de mayo se realizara programación de la Estructura de Desglose de Trabajo EDT, de acuerdo al lineamiento del Departamento Nacional de Planeación y así mismo con los parámetros estructurados por la Plataforma Integrada de Inversión Publica PIIP.
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos en el	Se realiza el reporte con la ejecución presupuestal suministrada por la secretaría de Hacienda en la cual contiene la información de los proyectos concerniente al mes de marzo el martes 04 de

reporte mensual del avance de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de la entidad en el aplicativo PIIP, con base en la información reportada por los respectivos supervisores.	ABRIL de 2025, como se evidencia en cada uno de los proyectos cargados en la PIIP.





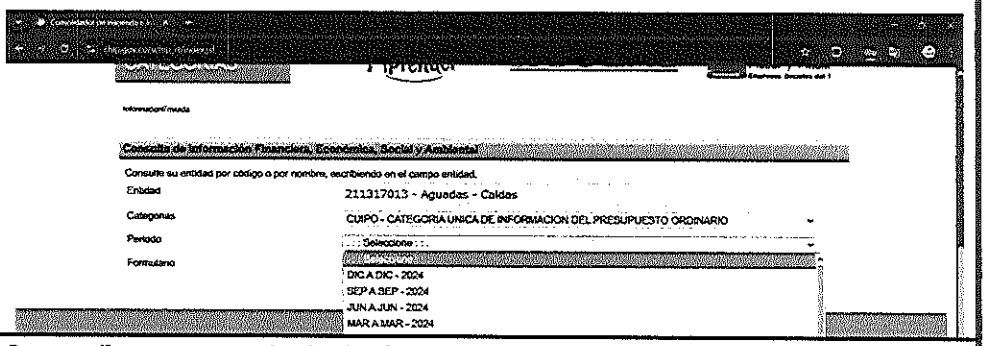

Caldas - AGUADAS

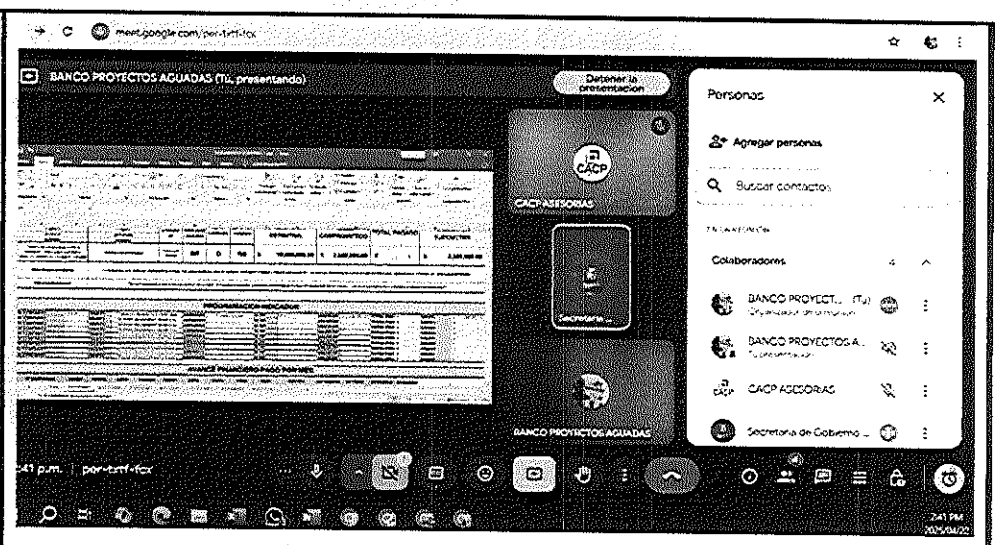
Procesos pendientes: 66

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Unidad responsable
2024170130043 En Ejecución Agricultura y desarrollo rural	Fortalecimiento dotación de infraestructura productiva y comercialización del sector agropecuario Aguadas	Formulación y Presentación EJ-SYC-17013-0042 Activo	1. Registro avance 2025-01-21 20:04:04 / AGUADAS
2024170130045 En Ejecución Agricultura y desarrollo rural	Fortalecimiento de los productores agrícolas a través de alternativas sostenibles de comercialización implementación de herramientas tecnológicas asistencia técnica cadenas productivas entre otras. Aguadas	Formulación y Presentación EJ-SYC-17013-0038 Activo	1. Registro avance 2025-01-21 19:20:54 / AGUADAS
2024170130047 En Ejecución Agricultura y desarrollo rural	Desarrollo de programas y proyectos de asistencia técnica directa rural en el municipio de Aguadas	Formulación y Presentación EJ-SYC-17013-0041 Activo	1. Registro avance 2025-01-21 20:09:28 / AGUADAS

Nombre	Fecha de modificacion	Tipo	Tamaño
2024170130030.pdf	2025/04/03 3:36 PM	Documento PDF	522 KB
2024170130031.pdf	2025/04/03 3:21 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130032.pdf	2025/04/03 3:47 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130033.pdf	2025/04/03 3:51 PM	Documento PDF	559 KB
2024170130034.pdf	2025/04/03 3:59 PM	Documento PDF	581 KB
2024170130036.pdf	2025/04/03 8:24 AM	Documento PDF	784 KB
2024170130037.pdf	2025/04/03 8:23 AM	Documento PDF	580 KB
2024170130039.pdf	2025/04/03 8:41 AM	Documento PDF	580 KB
2024170130040.pdf	2025/04/03 8:48 AM	Documento PDF	559 KB
2024170130041.pdf	2025/04/03 9:00 AM	Documento PDF	580 KB
2024170130042.pdf	2025/04/03 9:03 AM	Documento PDF	550 KB
2024170130043.pdf	2025/04/03 9:17 AM	Documento PDF	550 KB
2024170130044.pdf	2025/04/03 9:20 AM	Documento PDF	559 KB
2024170130045.pdf	2025/04/03 10:04 AM	Documento PDF	559 KB
2024170130046.pdf	2025/04/03 12:07 PM	Documento PDF	579 KB
2024170130047.pdf	2025/04/03 12:14 PM	Documento PDF	550 KB
2024170130048.pdf	2025/04/03 12:18 PM	Documento PDF	574 KB
2024170130049.pdf	2025/04/03 12:21 PM	Documento PDF	540 KB
2024170130050.pdf	2025/04/03 2:07 PM	Documento PDF	524 KB
2024170130052.pdf	2025/04/03 2:31 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130053.pdf	2025/04/03 2:36 PM	Documento PDF	587 KB
2024170130054.pdf	2025/04/03 2:42 PM	Documento PDF	566 KB
2024170130055.pdf	2025/04/03 3:10 PM	Documento PDF	549 KB
2024170130056.pdf	2025/04/03 3:13 PM	Documento PDF	579 KB
2024170130058.pdf	2025/04/03 3:18 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130059.pdf	2025/04/03 3:21 PM	Documento PDF	574 KB
2024170130067.pdf	2025/04/03 3:54 PM	Documento PDF	559 KB
2024170130069.pdf	2025/04/03 3:48 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130070.pdf	2025/04/03 4:21 PM	Documento PDF	559 KB
2024170130072.pdf	2025/04/03 4:33 PM	Documento PDF	555 KB
2024170130073.pdf	2025/04/03 4:56 PM	Documento PDF	559 KB
2024000000001627.pdf	2025/04/03 4:36 PM	Documento PDF	580 KB
2024000000002665.pdf	2025/04/03 4:24 PM	Documento PDF	559 KB
2025000000000368.pdf	2025/04/03 3:27 PM	Documento PDF	580 KB
2025000000000370.pdf	2025/04/03 8:36 AM	Documento PDF	580 KB
2025000000000487.pdf	2025/04/03 3:23 PM	Documento PDF	554 KB
2025000000000633.pdf	2025/04/03 3:26 PM	Documento PDF	551 KB
2025000000001023.pdf	2025/04/03 3:39 PM	Documento PDF	524 KB

	Totalidad de proyectos reportados en PIIP, en anexo se envía evidencia en pdf del reporte de cada proyecto. 2024170130030.pdf 2024170130031.pdf 2024170130032.pdf 2024170130033.pdf 2024170130034.pdf 2024170130036.pdf 2024170130037.pdf 2024170130039.pdf 2024170130040.pdf 2024170130041.pdf 2024170130042.pdf 2024170130043.pdf 2024170130044.pdf 2024170130045.pdf 2024170130046.pdf 2024170130047.pdf 2024170130048.pdf 2024170130049.pdf 2024170130050.pdf 2024170130052.pdf 2024170130053.pdf 2024170130054.pdf 2024170130055.pdf 2024170130056.pdf 2024170130058.pdf 2024170130059.pdf 2024170130067.pdf 2024170130069.pdf 2024170130070.pdf 2024170130072.pdf 2024170130073.pdf 20240000001627.p df 20250000000265.p df 202500000000368.p df 202500000000370.p df

	202500000000487.pdf 202500000000633.pdf 202500000001023.pdf
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el ajuste de información, o reprogramación de alcance físico o presupuestal, de los proyectos de inversión de ser necesario.	En el mes no ha sido necesario realizar ajustes al banco de proyectos, se tiene proyectado realizar ajustes en el banco de proyectos con el cierre del primer trimestre según reporte CUIPO el cual tiene fecha límite de reporte el día 30 de abril de 2025, para sí mismo tener trazabilidad financiera en los proyectos cargados en plataforma como también plataforma SISPT, que articula el plan de desarrollo municipal. SE evidencia en plataforma de Consolidador de Hacienda e Inversión Publica CHIP. Que aun no se ha realizado el cargue para realizar los ajuste pertinentes. 
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el seguimiento trimestral de los planes de acción que la entidad defina para la vigencia 2025, proyectando además los informes que sean requeridos por la alta dirección y la Oficina de Control Interno.	Se realiza mesas de trabajo con cada secretaría en las cuales se socializo el plan de acción por cada secretaria en el cual se definió la elaboración de un Plan de Acción para cada secretaría, así como el nuevo modelo de seguimiento de este, en el cual se afianzó el conocimiento de los secretarios frente a los productos e indicadores de los productos y la consecución de las metas programadas para el cuatrienio como para la vigencia 2025. 



DEPENDENCIA: DIRECCION LOCAL DE SALUD
SECTOR: 10
NOMBRE: SALUD
PROGRAMA: INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL
RESPONSABLE: DIRECCION LOCAL DE SALUD
CODIGO: [illegible]
BPIM: 2024770130000
NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios de vigilancia y control a la oferta en salud en el municipio de Aguadas

Meta Producto	Indicador de Producto	MEDIDO ATRAVEZ DE	META PROGRAMADA 2025	META CUMPLIDA	META POR CUMPLIR	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR EJECUCTAR
CODIGO 1902914 NOMBRE	CODIGO 190201600 NOMBRE								
Servicio de auditoria y visitas inspectivas	Auditorias y visitas inspectivas realizadas	Numero de auditorias	10	0	10	$30.320.000,00	$ -	$ -	$ -

Descripción producto:	el servicio de auditoria y visitas inspectivas realizada para verificar el cumplimiento de los estándares y normatividad vigente
Descripción avance:	(Parrafo explicativo de cómo se avanzó en la meta. Información general: población beneficiada-fechas de desarrollo del producto- ¿se hizo por medio de contratos o capacidad instalada?)

PROGRAMACION INDICADOR

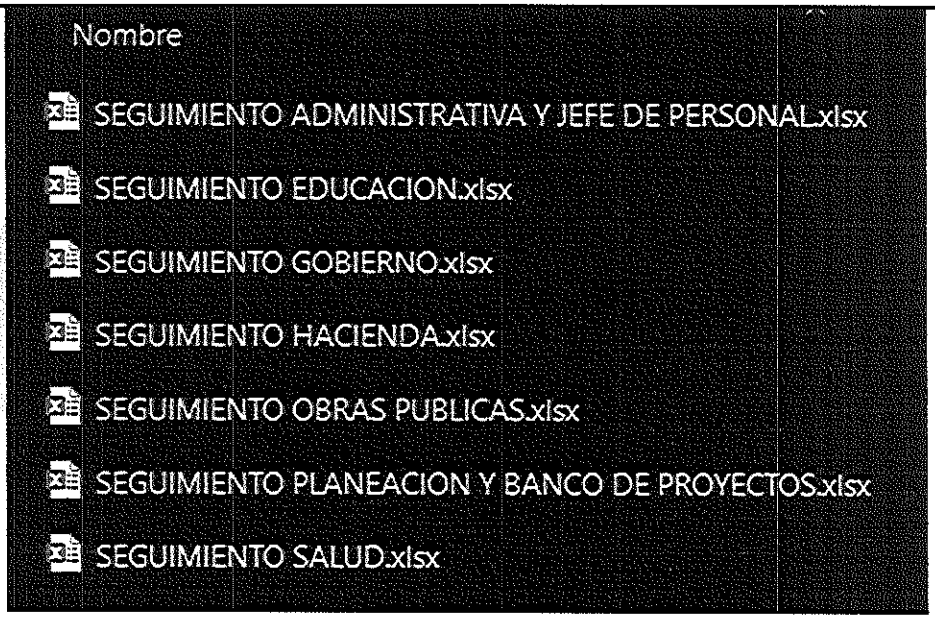
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -
N° CONTRATO		OBJETO	Prestacion de prestacion de servicios	CUMPLIMIENTO	N° RP	VALOR RP	TOTAL PAGA $ -	SALDO	$ -

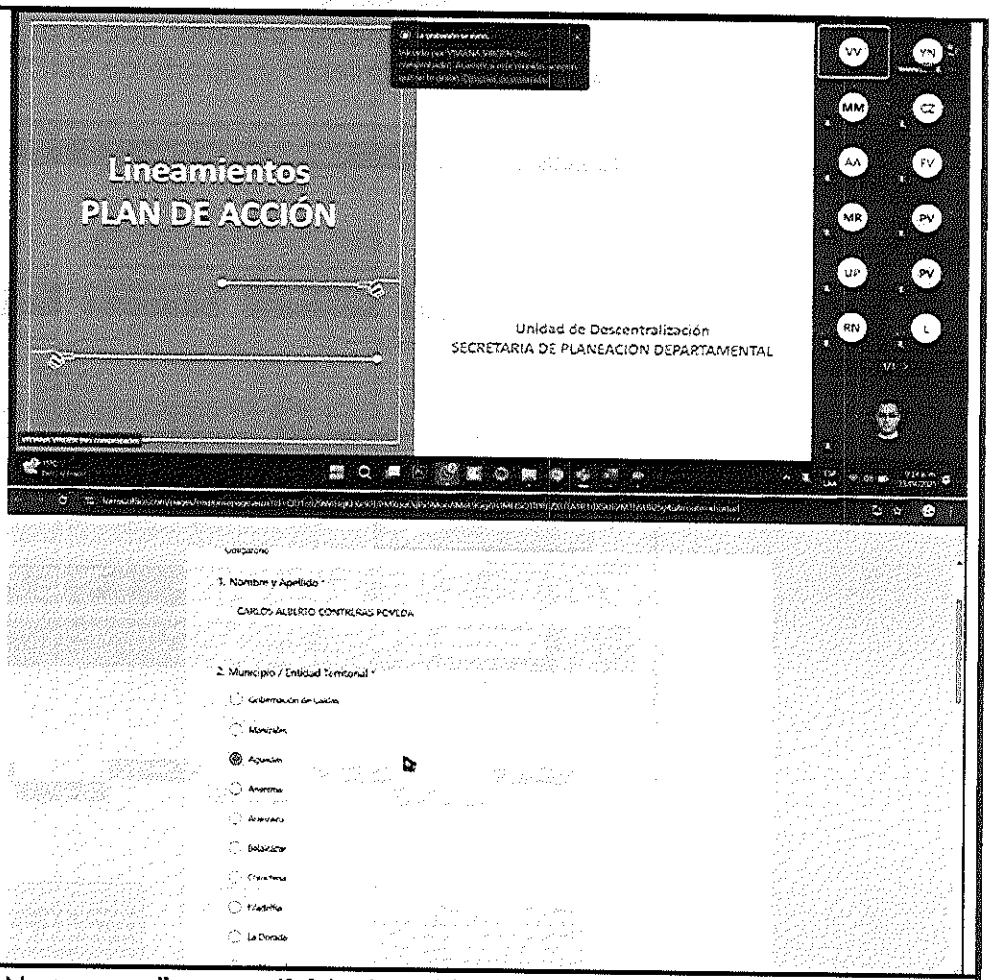
AVANCE FINANCIERO PAGO POR MES

N° CONTRATO	DESDE	HASTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -
0															TOTAL PAGADO $ -

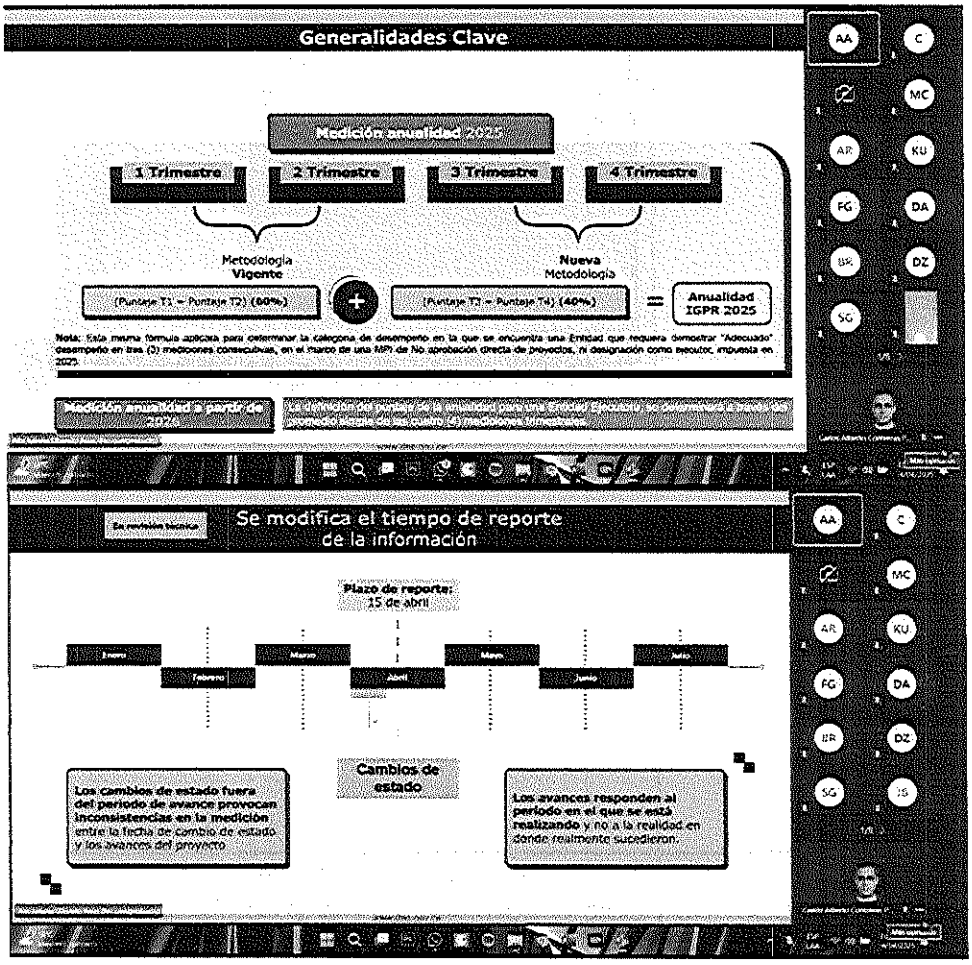
AVANCE FISICO MENSUAL

N° CONTRATO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
0														TOTAL META 0,00
														CONTROL IGUAL 0,00

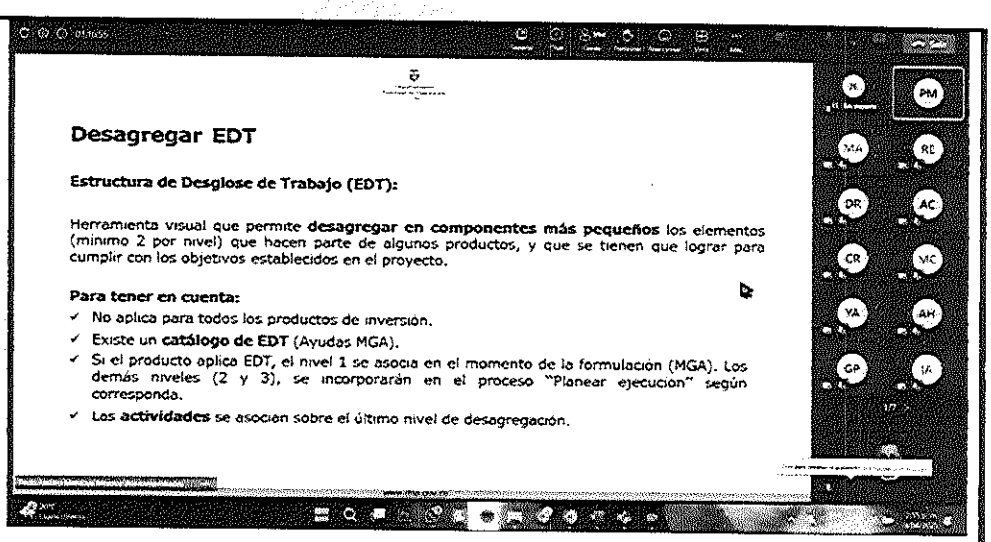
	
Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.	No se tiene ninguna información relevante que ponga en riesgo la ejecución del contrato.
Cargue y seguimiento en la plataforma SISPT, del plan de Desarrollo Municipal, según lineamientos y demás indicaciones del DNP, así como estar pendiente de la integralidad de esta plataforma.	El día 23 de abril de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. se realizó reunión con el DNP estando a cargo por la señora Viviana Virgen referente a los lineamientos del plan de acción y manejo de la estructura del Plan Indicativo en el componente de seguimiento del plan de desarrollo municipal.

	
Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.	No se realizan actividades diferentes a las mencionadas en el objeto contractual y a las obligaciones específicas, puesto que los apoyos requeridos por la dependencia son relacionados con los puntos mencionados.
Ejecutar obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación	Se realizan las actividades de buena fe, propendiendo siempre por el correcto desarrollo de las actividades asignadas.


Otras actividades	**Reunión con el departamento nacional de planeación en lo referente de seguimiento y reporte de SUIFP SGR**



Reunión PIIP referente a nueva estructura de desglose de trabajo EDT PARA LA ARTICULACION Y MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PIIP



Reunión 25 de abril de 2025 con el inspector de tránsito donde se socializo plan de acción y solicitud de certificación al banco de proyectos



En el mes de abril se presentaron 41 solicitudes al banco de proyectos, las cuales fueron atendidas de manera oportuna y realizando las correctas retroalimentaciones a los secretarios y funcionarios en caso de presentar algún error.

Se anexa captura de pantalla del correo aguadasbancoproyectos@gmail.com utilizado para las solicitudes de las certificaciones.

ALCALDÍA DE AGUADAS

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS

CERTIFICA:

Que el siguiente Proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos de la alcaldía de Aguadas Caldas para la vigencia 2025 y este cuenta con presupuesto y viabilidad técnica favorable.

NOMBRE PROYECTO	Programación, difusión de eventos, expresiones artísticas y culturales. Gestión, protección, salvaguarda del patrimonio cultural en el municipio de Aguadas
BPIN MGA WEB	2024170130041
PROCESO DE VIABILIDAD TERRITORIO N°	1033736
RESPONSABLE	SECRETARIA DE EDUCACION – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO CON SENTIDO SOCIAL
SECTOR	CULTURA 33
PROGRAMA	Gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural colombiano 3302
PRODUCTO	Servicio de exposiciones 3302004
INDICADOR DE PRODUCTO	Exposiciones realizadas 3302004 00
INDICADOR PROPIO	Realizar exposiciones a través de diferentes procesos relacionados de carácter municipales y departamentales

Para constancia, se firma en el Municipio de Aguadas a los 12 días del mes de abril de 2025.

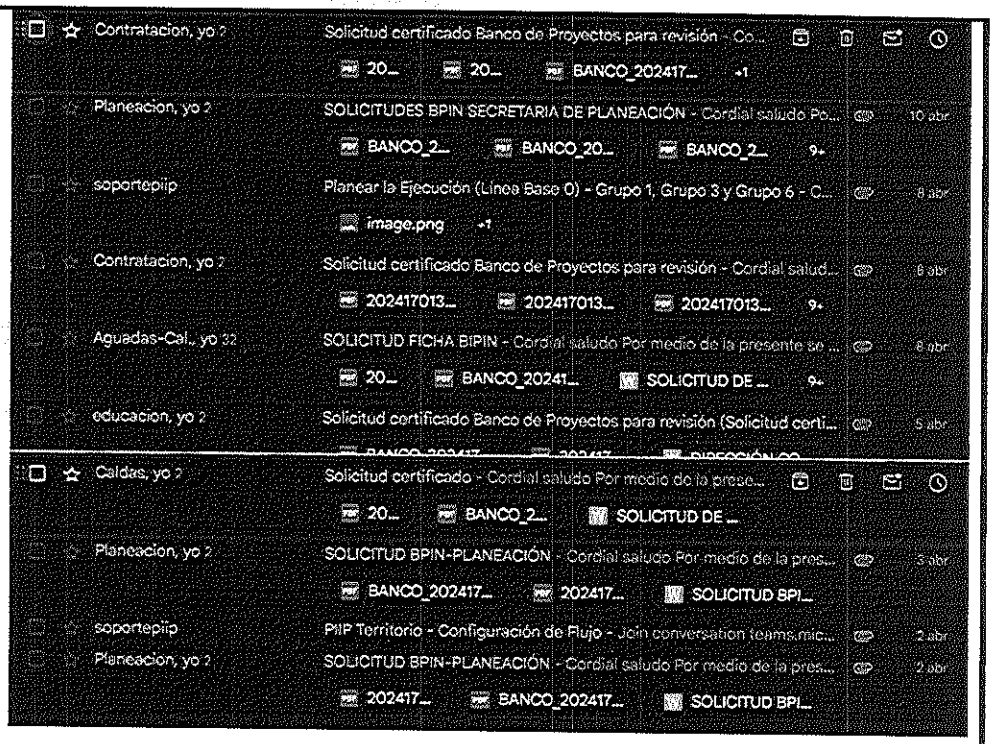
CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA
Profesional Banco de Proyectos

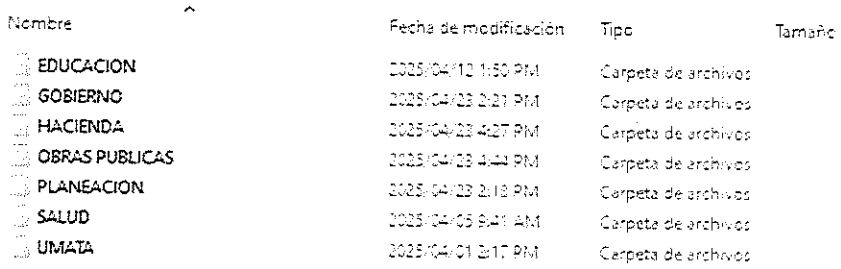
	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA		12-04-2025
Revisó:	HENRY GIOVANNY RUIZ SUAREZ		12-04-2025
Aprobó:	HENRY GIOVANNY RUIZ SUAREZ		12-04-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

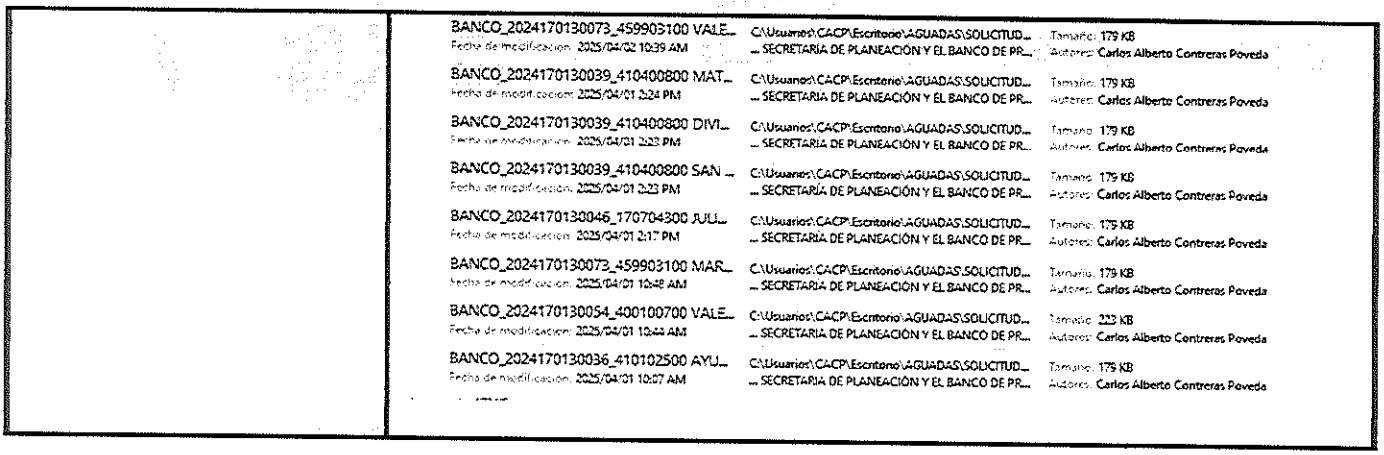
www.aguadas-caldas.gov.co

Hacienda, yo 2	Solicitud Certificado del Banco de Proyectos - Cordial saludo Por me... BANCO_202417... 202417... SOLICITUD DE ...	23 abr
Caldas, yo 2	Solicitud certificado - Cordial saludo Por medio de la presente se env... 2024170... 2024170... BANCO_202417... +3	23 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... BANCO_202417... 2024170... 2024170... +2	12 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... 202417... BANCO_202417... LOGISTICA EVE...	10 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... BANCO_202417... 202417... LOGISTICA EVE...	10 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud...	10 abr


Contratacion, yo 2
Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Co...
20... 20... BANCO_202417... +1
Planeacion, yo 2
SOLICITUDES BPIN SECRETARIA DE PLANEACIÓN - Cordial saludo Po... 10 abr
BANCO_2... BANCO_20... BANCO_2... 9+
soportepiip
Planear la Ejecución (Línea Base 0) - Grupo 1, Grupo 3 y Grupo 6 - C... 8 abr
image.png +1
Contratacion, yo 2
Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... 8 abr
202417013... 202417013... 202417013... 9+
Aguadas-Cal., yo 22
SOLICITUD FICHA BIPIN - Cordial saludo Por medio de la presente se ... 8 abr
20... BANCO_20241... SOLICITUD DE ... 9+
educacion, yo 2
Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión (Solicitud certi... 5 abr
Caldas, yo 2
Solicitud certificado - Cordial saludo Por medio de la prese...
20... BANCO_2... SOLICITUD DE ...
Planeacion, yo 2
SOLICITUD BPIN-PLANEACIÓN - Cordial saludo Por medio de la pres... 3 abr
BANCO_202417... 202417... SOLICITUD BPI...
soportepiip
PIIP Territorio - Configuración de Flujo - Join conversation teams.mic... 2 abr
Planeacion, yo 2
SOLICITUD BPIN-PLANEACIÓN - Cordial saludo Por medio de la pres... 2 abr
202417... BANCO_202417... SOLICITUD BPI...


Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
EDUCACION 2025/04/10 1:50 PM Carpeta de archivos
GOBIERNO 2025/04/23 2:21 PM Carpeta de archivos
HACIENDA 2025/04/23 4:27 PM Carpeta de archivos
OBRAS PUBLICAS 2025/04/23 4:44 PM Carpeta de archivos
PLANEACION 2025/04/23 2:18 PM Carpeta de archivos
SALUD 2025/04/05 9:41 AM Carpeta de archivos
UMATA 2025/04/01 2:17 PM Carpeta de archivos

BANCO_2024170130073_459903800.pdf	Fecha de modificación: 2025/04/23 4:44 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130073_459900200.pdf	Fecha de modificación: 2025/04/23 4:27 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130036_410101400 LOGI...	Fecha de modificación: 2025/04/23 2:21 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130053_240900700 LOGI...	Fecha de modificación: 2025/04/23 2:19 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330200400_BAN...	Fecha de modificación: 2025/04/12 1:50 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 245 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130042_430100700 LOGI...	Fecha de modificación: 2025/04/11 8:52 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 222 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103701_BAN...	Fecha de modificación: 2025/04/11 8:46 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 274 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130042_430100700_BAN...	Fecha de modificación: 2025/04/11 8:22 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 234 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130048_170910600 SEG...	Fecha de modificación: 2025/04/10 11:04 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130048_170910600 ADQ...	Fecha de modificación: 2025/04/10 11:04 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2025000000000633_320502100 PU...	Fecha de modificación: 2025/04/10 11:01 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130056_400304402 POR...	Fecha de modificación: 2025/04/10 10:52 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 222 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130056_400301700 ACU...	Fecha de modificación: 2025/04/10 10:49 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 222 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130042_430100400 OSC...	Fecha de modificación: 2025/04/08 3:19 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 222 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130050_350202400 ALB...	Fecha de modificación: 2025/04/08 3:15 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130032_220206200 PAOL...	Fecha de modificación: 2025/04/08 3:13 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330108700_BAN...	Fecha de modificación: 2025/04/08 3:02 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 234 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330105300 MAN...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:56 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330105300 JUA...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:56 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330108700 OSC...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:53 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330108700 NICO...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:52 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330108700 MON...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:51 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330108700 DAVI...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:50 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 VALE...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:46 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 WIL...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:45 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 MISA...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:44 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 MAU...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:44 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 DAVI...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:43 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130043_430103700 CARL...	Fecha de modificación: 2025/04/08 2:42 PM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 225 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130052_240211200 COM...	Fecha de modificación: 2025/04/08 9:08 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130041_330105300-BAN...	Fecha de modificación: 2025/04/05 11:00 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 223 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130039_410400800.pdf	Fecha de modificación: 2025/04/05 9:41 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda
BANCO_2024170130073_459903100 VALE...	Fecha de modificación: 2025/04/03 11:07 AM	C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... ... SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...	Tamaño: 179 KB Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda



C. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO
ABRIL	$ 4.300.000	PENDIENTE	
TOTAL	$ 4.300.000		

D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo que se realizó la supervisión, no fueron impartidas o realizadas observaciones al contratista.

E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo no se presentaron ni suspensiones, ni reanudaciones, ni modificaciones

F. VERIFICACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PLANILLA	PERIODO	HONORARIOS	IBC	SALUD	PENSIONES	ARL
7965257955	ABRIL	$4.300.000	$1.760.000	$220.000	$281.600	$9.200

G. ANEXOS

Acta parcial N° 01
Informe de actividades.
Cuenta de cobro
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

H. APROBACIÓN DEL PAGO

El supervisor Certifica que a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el contrato y por lo tanto se puede realizar el pago de las actividades supervisadas.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Aguadas a los treinta (30) días del mes de abril de 2025

HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ
Secretario de Planeación

INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	1420.10.4.61 DE 2025		
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA	**IDENTIFICACIÓN**	1.098.633.054
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAES**	
01		**30/04/2025**	

A. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
Apoyar a las diferentes dependencias de la entidad en la formulación y estructuración de los planes de acción con base en las acciones y actividades a adelantar según se requiera con el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024 – 2027.	Ya se realizó la estructura de los planes de acciones institucionales, así mismo como se expresó en el informe de actividades 003 del mes de marzo se pactó que en mes de abril se llevara seguimientos para contemplar cada caso puntual de cada secretaria.
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con la formulación y estructuración de proyectos de inversión en MGA WEB con base en lo establecido por los planes de acción que la entidad defina para la vigencia 2025.	Se realiza la formulación del proyecto del sistema general de regalías con el ID 1437658 denominado "Reposición de pavimento en la calle 4 sobre carreras 4 y 5 y en la carrera 5 sobre calles 4 y 5 del municipio de Aguadas" *con tipología G del sistema general de regalías* SGR llevado a cabo con los lineamientos del departamento nacional de planeación (DNP) y en la articulación de la metodología general ajustada (MGA WEB) donde se anexa los siguientes soportes en la MGA WEB

	Nombre	Extensión	Tamaño	Categoría	Comentarios	Fecha
	PLAN DE SOSTENIBILIDAD PAV AGUADAS.pdf	pdf	507 KB	Otro		21/04/2025 10:28:56
	PRESUPUESTO .pdf	pdf	247 KB	Presupuesto		21/04/2025 10:28:56
	CERTIFICADO INSCRITO ID.pdf	pdf	226 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:55
	CERTIFICADO PRECIOS UNITARIOS.pdf	pdf	328 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:55
	DOCUMENTO TECNICO CLIMA Y CRA 5 AGUADAS.pdf	pdf	713 KB	Documento técnico		21/04/2025 10:28:55
	CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD.pdf	pdf	326 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:54
	CERTIFICADO DE USO PUBLICO.pdf	pdf	326 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:54
	CERTIFICADO ESTUDIOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	pdf	327 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:54
	CERTIFICADO DE NO RIESGO.pdf	pdf	328 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:53
	CERTIFICADO DE SERVICIOS PUBLICOS.pdf	pdf	327 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:53

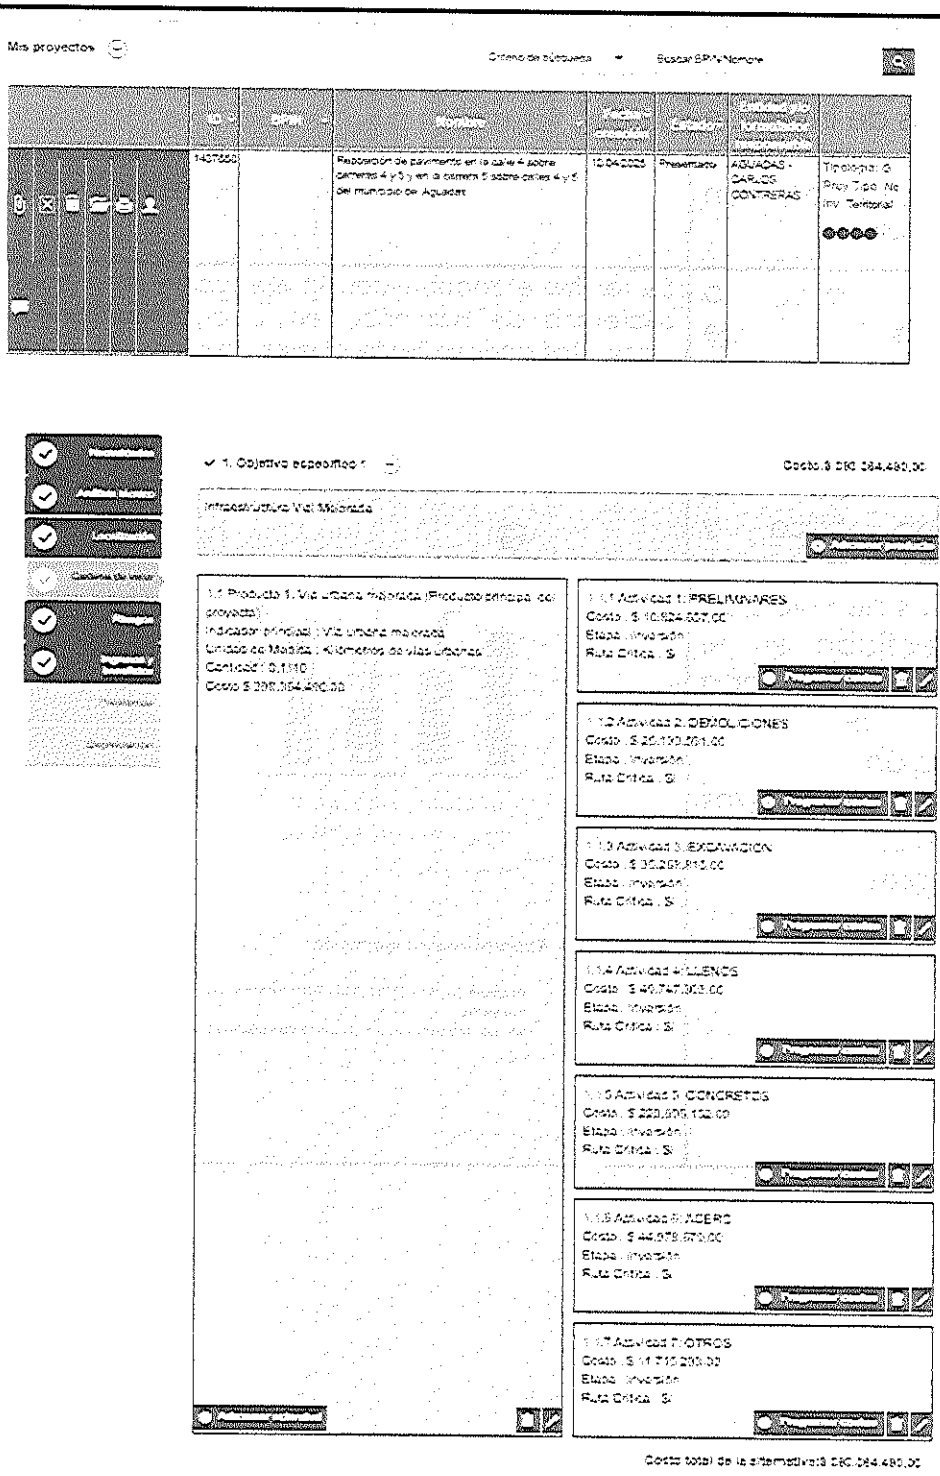
Página 1 de 4

	Nombre	Extensión	Tamaño	Categoría	Comentarios	Fecha
	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE COMPONENTE JURIDICO ARTICULACION POLITICA PUBLICA SOSTENIBILIDAD.pdf	pdf	324 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:53
	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO NTC.pdf	pdf	324 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:52
	CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO.pdf	pdf	326 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:52
	CARTA DE PRESENTACION.pdf	pdf	278 KB	Otro		21/04/2025 10:28:51
	CERTIFICADO CONCORDANCIA POT.pdf	pdf	326 KB	Certificación		21/04/2025 10:28:51
	ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES AGUADAS.pdf	pdf	740 KB	Otro		21/04/2025 10:28:50
	13 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO.pdf	pdf	409 KB	Otro		21/04/2025 10:15:24
	14 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD LOCALIZACION.pdf	pdf	1337 KB	Otro		21/04/2025 10:15:24
	11 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO.pdf	pdf	1336 KB	Otro		21/04/2025 10:15:23
	12 DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.pdf	pdf	1337 KB	Otro		21/04/2025 10:15:23


Página 2 de 4

	Nombre	Extensión	Tamaño	Categoría	Comentarios	Fecha
	9 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TOPOGRAFO.pdf	pdf	467 KB	Otro		21/04/2025 10:15:22
	10 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DISEÑO GEOMETRICO.pdf	pdf	1337 KB	Otro		21/04/2025 10:15:22
	8 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PROCESO CONSTRUCTIVO.pdf	pdf	1336 KB	Otro		21/04/2025 10:15:21
	7 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.pdf	pdf	462 KB	Otro		21/04/2025 10:15:21
	6 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.pdf	pdf	1336 KB	Otro		21/04/2025 10:15:21
	4 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD DISEÑO DE ESTRUCTURAS.pdf	pdf	1336 KB	Otro		21/04/2025 10:15:20
	5 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD PLANOS DE CONSTRUCCION GENERAL.pdf	pdf	1337 KB	Otro		21/04/2025 10:15:20
	2 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.pdf	pdf	2079 KB	Otro		21/04/2025 10:15:19
	3 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ESTUDIO DE SUELOS.pdf	pdf	2091 KB	Otro		21/04/2025 10:15:19
	1 MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD HIDROLOGICO E HIDRAULICO.pdf	pdf	1333 KB	Otro		21/04/2025 10:15:18

Página 3 de 4




Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos, desde los respectivos roles, en el proceso de	En el mes anterior se realizaron todos los procedimientos concernientes a los diferentes roles para dejar en marcha los diferentes proyectos de la *administración.* Se deja constancia que en el mes de mayo se realizara programación de la Estructura de Desglose de Trabajo EDT, de acuerdo a los lineamiento del Departamento Nacional de Planeación y así mismo con

aprobación y viabilización de los proyectos de inversión en la plataforma integrada de inversión pública PIIP.	los parámetros estructurados por la Plataforma Integrada de Inversión Publica PIIP.
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos en el reporte mensual del avance de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de la entidad en el aplicativo PIIP, con base en la información reportada por los respectivos supervisores.	Se realiza el reporte con la ejecución presupuestal suministrada por la secretaría de Hacienda en la cual contiene la información de los proyectos concerniente al mes de marzo el martes 04 de ABRIL de 2025, como se evidencia en cada uno de los proyectos cargados en la PIIP. 

Nombre de proyecto: SERVICIO PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS **Entidad:** AGUADAS - Caldas **Sector:** Educación **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2028 **Valor total:** $879.996.084,00 **Apropiación inicial:** $0,00 **Apropiación vigente:** $669.275.032,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** $669.275.032,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información

Costo total del proyecto: $879.996.084,00 **Ejecutor:** AGUADAS **Fecha real de inicio:** BNPI (2022-2026)

VER MAPA
VER MAPA INTERACTIVO



DEVOLVER Reporte avance Revisión: 0

FINALIZAR

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalizacion

Focalización | Soportes | Fin reporte

Avance regionalización

Valor

Soportes Cuota 5

Abierto

2025/Marzo. 14/03/2025 - 07/04/2025

Fuente: Municipio - AGUADAS - Municipios - Propios

Caldas - AGUADAS

Procesos pendientes: 05

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Codigo / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Unidad responsable
1016024 2024170130040 En Ejecucion Agricultura y desarrollo rural	Fortalecer la dotación de infraestructura productiva y comercial para el sector agropecuario aguadas	[illegible] EJ-SYC-17013-0042 Activo	1. Registro avance 2025-01-31 20:24:04 / AGUADAS
1005805 2024170130045 En Ejecucion Agricultura y desarrollo rural	Fortalecer la vida de los productores agrícolas a través de diferentes estrategias de capacitación implementación de herramientas tecnológicas existentes dentro de cadenas productivas agropecuarias Aguadas	[illegible] EJ-SYC-17013-0038 Activo	1. Registro avance 2025-01-31 18:20:54 / AGUADAS
1031721 2024170130047 En Ejecucion Agricultura y desarrollo rural	Diseñando de programas y proyectos de asistencia técnica directa rural en el municipio de Aguadas	[illegible] EJ-SYC-17013-0041 Activo	1. Registro avance 2025-01-31 20:09:23 / AGUADAS

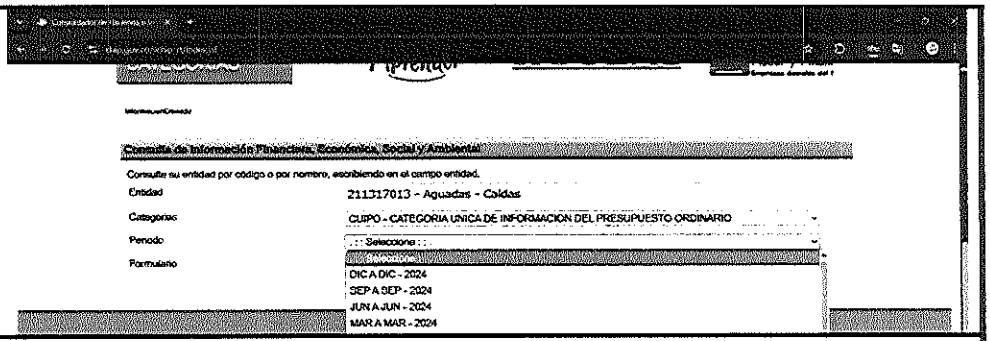

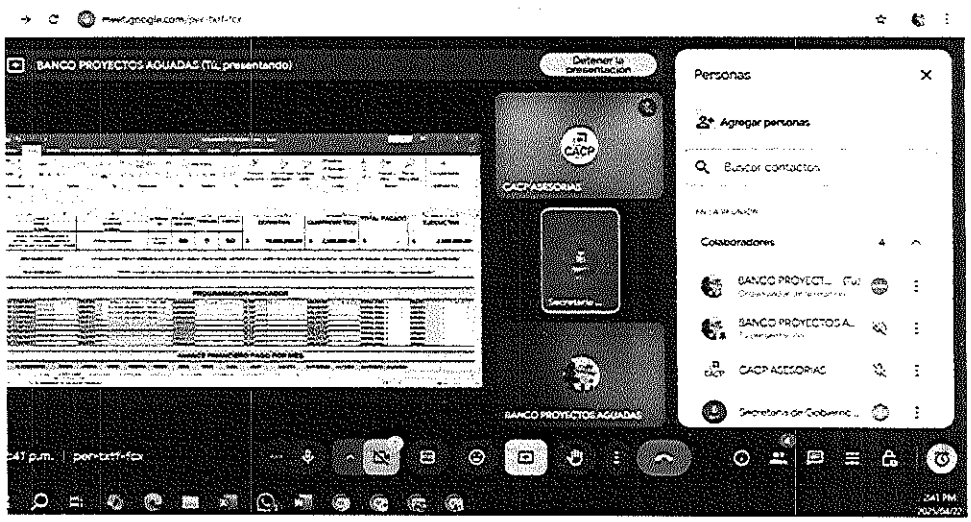


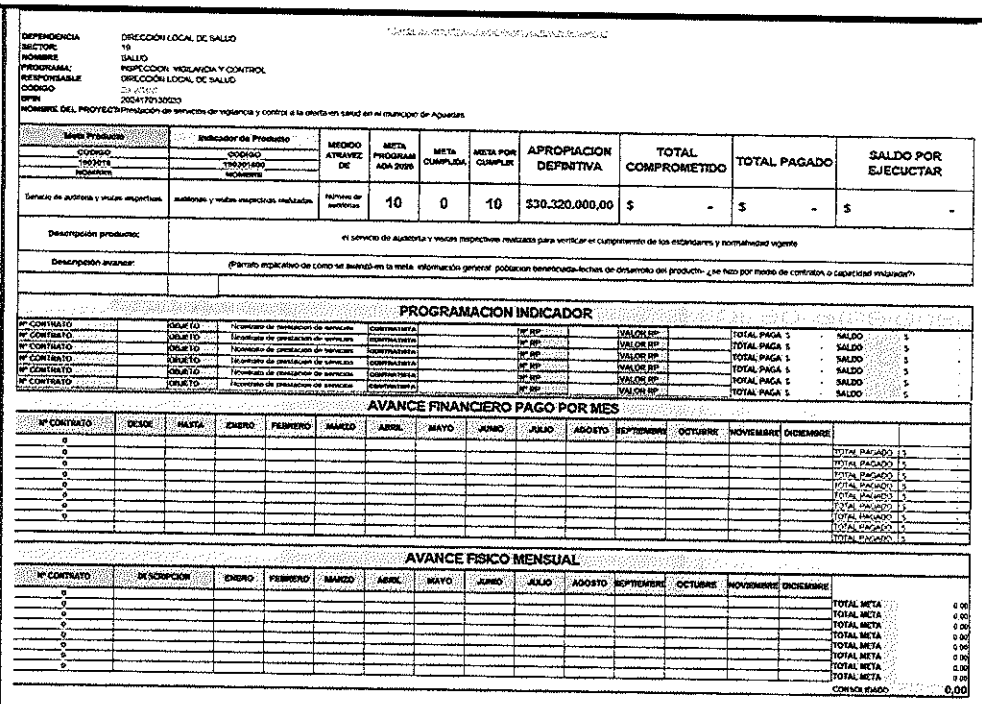
Nombre	Fecha de modificacion	Tipo	Tamaño
2024170130030.pdf	2025/04/02 8:36 PM	Documento PDF	522 KB
2024170130031.pdf	2025/04/02 8:21 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130032.pdf	2025/04/02 8:47 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130033.pdf	2025/04/02 8:51 PM	Documento PDF	550 KB
2024170130034.pdf	2025/04/02 8:58 PM	Documento PDF	581 KB
2024170130036.pdf	2025/04/03 8:24 AM	Documento PDF	784 KB
2024170130037.pdf	2025/04/03 8:38 AM	Documento PDF	560 KB
2024170130039.pdf	2025/04/03 8:41 AM	Documento PDF	580 KB
2024170130040.pdf	2025/04/03 8:46 AM	Documento PDF	568 KB
2024170130041.pdf	2025/04/03 8:00 AM	Documento PDF	562 KB
2024170130042.pdf	2025/04/03 8:03 AM	Documento PDF	550 KB
2024170130043.pdf	2025/04/03 8:17 AM	Documento PDF	580 KB
2024170130044.pdf	2025/04/03 9:09 AM	Documento PDF	553 KB
2024170130045.pdf	2025/04/02 10:54 AM	Documento PDF	562 KB
2024170130046.pdf	2025/04/03 12:07 PM	Documento PDF	579 KB
2024170130047.pdf	2025/04/03 12:14 PM	Documento PDF	550 KB
2024170130048.pdf	2025/04/03 12:16 PM	Documento PDF	574 KB
2024170130049.pdf	2025/04/03 12:21 PM	Documento PDF	546 KB
2024170130050.pdf	2025/04/03 2:07 PM	Documento PDF	594 KB
2024170130052.pdf	2025/04/03 3:31 PM	Documento PDF	568 KB
2024170130053.pdf	2025/04/03 3:36 PM	Documento PDF	587 KB
2024170130054.pdf	2025/04/03 3:43 PM	Documento PDF	566 KB
2024170130055.pdf	2025/04/03 3:50 PM	Documento PDF	543 KB
2024170130056.pdf	2025/04/03 3:53 PM	Documento PDF	579 KB
2024170130058.pdf	2025/04/03 3:16 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130059.pdf	2025/04/03 3:21 PM	Documento PDF	576 KB
2024170130067.pdf	2025/04/03 3:54 PM	Documento PDF	552 KB
2024170130069.pdf	2025/04/03 3:48 PM	Documento PDF	580 KB
2024170130070.pdf	2025/04/03 4:21 PM	Documento PDF	552 KB
2024170130072.pdf	2025/04/03 4:33 PM	Documento PDF	555 KB
2024170130073.pdf	2025/04/03 4:56 PM	Documento PDF	552 KB
20240000000627.pdf	2025/04/03 4:36 PM	Documento PDF	580 KB
20240000002665.pdf	2025/04/03 4:24 PM	Documento PDF	552 KB
20250000000368.pdf	2025/04/03 8:27 PM	Documento PDF	552 KB
20250000000370.pdf	2025/04/03 8:36 AM	Documento PDF	580 KB
20250000000487.pdf	2025/04/03 8:33 PM	Documento PDF	554 KB
20250000000533.pdf	2025/04/03 8:26 PM	Documento PDF	551 KB
20250000001023.pdf	2025/04/03 8:39 PM	Documento PDF	504 KB

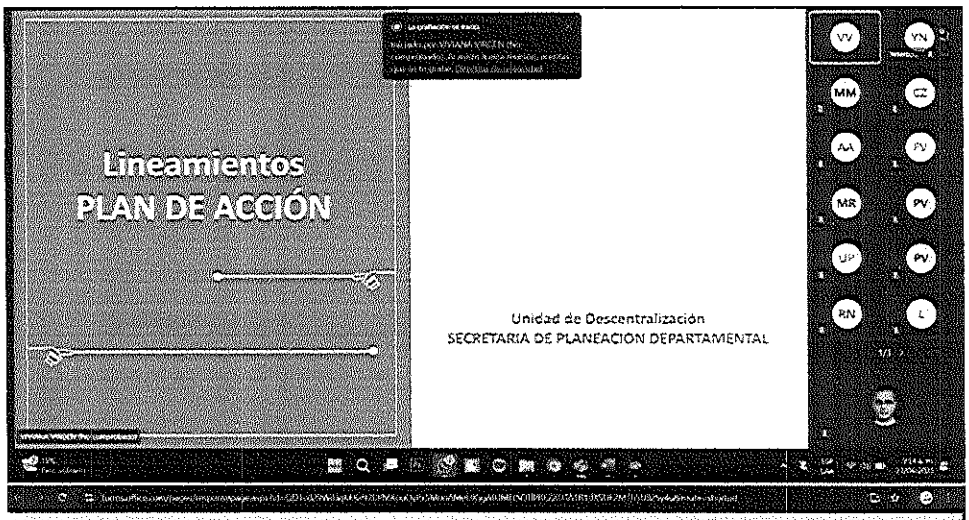
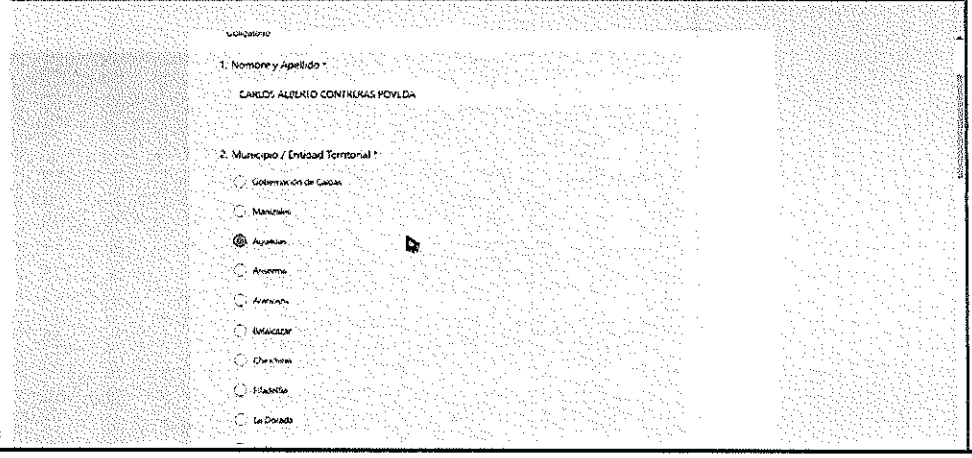
Totalidad de proyectos reportados en PIIP, en anexo se envía evidencia en pdf del reporte de cada proyecto.

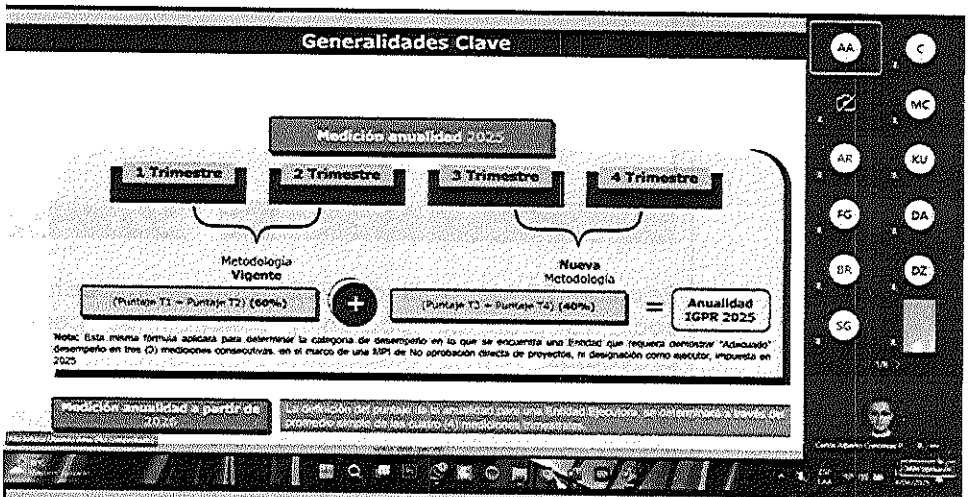
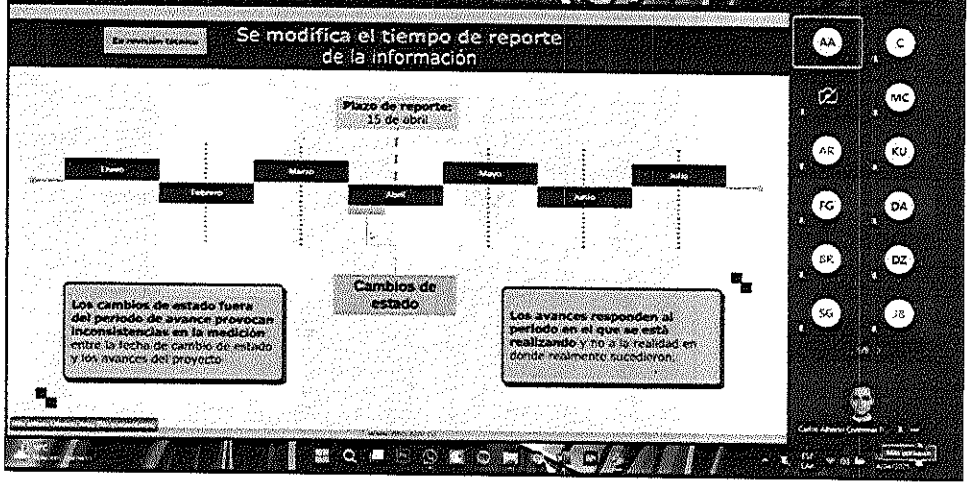
2024170130030.pdf
2024170130031.pdf
2024170130032.pdf
2024170130033.pdf
2024170130034.pdf
2024170130036.pdf
2024170130037.pdf
2024170130039.pdf
2024170130040.pdf
2024170130041.pdf
2024170130042.pdf

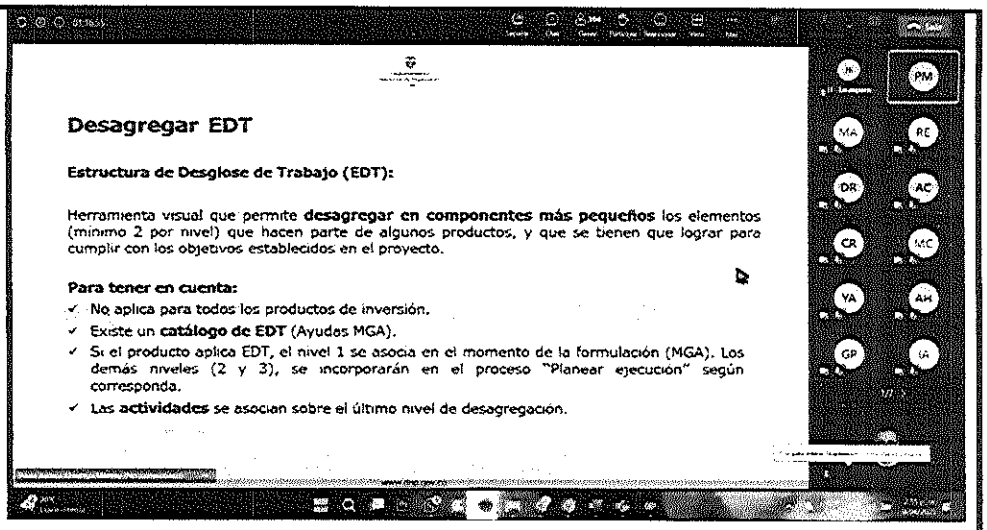
	2024170130043.pdf 2024170130044.pdf 2024170130045.pdf 2024170130046.pdf 2024170130047.pdf 2024170130048.pdf 2024170130049.pdf 2024170130050.pdf 2024170130052.pdf 2024170130053.pdf 2024170130054.pdf 2024170130055.pdf 2024170130056.pdf 2024170130058.pdf 2024170130059.pdf 2024170130067.pdf 2024170130069.pdf 2024170130070.pdf 2024170130072.pdf 2024170130073.pdf 20240000001627.p df 20250000000265.p df 202500000000368.p df 202500000000370.p df 202500000000487.p df 202500000000633.p df 202500000001023.p df
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el ajuste de información, o reprogramación de alcance físico o presupuestal, de los proyectos de inversión de ser necesario.	En el mes no ha sido necesario realizar ajustes al banco de proyectos, se tiene proyectado realizar ajustes en el banco de proyectos con el cierre del primer trimestre según reporte CUIPO el cual tiene fecha límite de reporte el día 30 de abril de 2025, para sí mismo tener trazabilidad financiera en los proyectos cargados en plataforma como también plataforma SISPT, que articula el plan de desarrollo municipal. SE evidencia en plataforma de Consolidador de Hacienda e Inversión Publica CHIP. Que aun no se ha realizado el cargue para realizar los ajuste pertinentes.

	
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Banco de Proyectos con el seguimiento trimestral de los planes de acción que la entidad defina para la vigencia 2025, proyectando además los informes que sean requeridos por la alta dirección y la Oficina de Control Interno.	Se realiza mesas de trabajo con cada secretaría en las cuales se socializo el plan de acción por cada secretaria en el cual se definió la elaboración de un Plan de Acción para cada secretaría, así como el nuevo modelo de seguimiento de este, en el cual se afianzó el conocimiento de los secretarios frente a los productos e indicadores de los productos y la consecución de las metas programadas para el cuatrienio como para la vigencia 2025.  


	 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD SECTOR: 10 NOMBRE: SALUD PROGRAMA: INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL RESPONSABLE: DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD CODIGO: [illegible] BPIN: 2020470130020 NOMBRE DEL PROYECTO: Prestacion de servicios de vigilancia y control a la oferta en salud en el municipio de Aquitania Meta Producto — Indicador de Producto — MEDIDO ATRAVEZ DE — META PROGRAMADA AÑO 2020 — META CUMPLIDA — META POR CUMPLIR — APROPIACION DEFINITIVA — TOTAL COMPROMETIDO — TOTAL PAGADO — SALDO POR EJECUCTAR CODIGO 1903018 NOMBRE — CODIGO 139201400 NOMBRE Servicio de auditoria y visitas inspectivas — auditorias y visitas inspectivas realizadas — Número de auditorias — 10 — 0 — 10 — $30.320.000,00 — $ - — $ - — $ - Descripción producto: el servicio de Auditoria y visitas inspectivas realizadas para verificar el cumplimiento de los estandares y normatividad vigente Descripción avance: (Párrafo explicativo de como se avanzó en la meta. Información general: poblacion beneficiada-fechas de desarrollo del producto- ¿se hizo por medio de contratos o capacidad instalada?) PROGRAMACION INDICADOR Nº CONTRATO — OBJETO — Numerales de prestacion de servicios — CONTRATISTA — Nº RP — VALOR RP — TOTAL PAGA $ - SALDO $ (repetido 7 veces) AVANCE FINANCIERO PAGO POR MES Nº CONTRATO — DESDE — HASTA — ENERO — FEBRERO — MARZO — ABRIL — MAYO — JUNIO — JULIO — AGOSTO — SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE — DICIEMBRE — TOTAL PAGADO $ - (repetido 9 veces) AVANCE FISICO MENSUAL Nº CONTRATO — DESCRIPCION — ENERO — FEBRERO — MARZO — ABRIL — MAYO — JUNIO — JULIO — AGOSTO — SEPTIEMBRE — OCTUBRE — NOVIEMBRE — DICIEMBRE — TOTAL META 0,00 (repetido 9 veces) — CONTROLADO 0,00 Nombre SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVA Y JEFE DE PERSONAL.xlsx SEGUIMIENTO EDUCACION.xlsx SEGUIMIENTO GOBIERNO.xlsx SEGUIMIENTO HACIENDA.xlsx SEGUIMIENTO OBRAS PUBLICAS.xlsx SEGUIMIENTO PLANEACION Y BANCO DE PROYECTOS.xlsx SEGUIMIENTO SALUD.xlsx
Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.	No se tiene ninguna información relevante que ponga en riesgo la ejecución del contrato.

Cargue y seguimiento en la plataforma SISPT, del plan de Desarrollo Municipal, según lineamientos y demás indicaciones del DNP, así como estar pendiente de la integralidad de esta plataforma.	El día 23 de abril de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. se realizó reunión con el DNP estando a cargo por la señora Viviana Virgen referente a los lineamientos del plan de acción y manejo de la estructura del Plan Indicativo en el componente de seguimiento del plan de desarrollo municipal.  
Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.	No se realizan actividades diferentes a las mencionadas en el objeto contractual y a las obligaciones específicas, puesto que los apoyos requeridos por la dependencia son relacionados con los puntos mencionados.
Ejecutar obligaciones contractuales de buena fe, evitando	Se realizan las actividades de buena fe, propendiendo siempre por el correcto desarrollo de las actividades asignadas.

en todo caso la configuración de una relación de subordinación	
Otras actividades	**Reunión con el departamento nacional de planeación en lo referente de seguimiento y reporte de SUIFP SGR**   **Reunión PIIP referente a nueva estructura de desglose de trabajo EDT PARA LA ARTICULACION Y MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PIIP**



Reunión 25 de abril de 2025 con el inspector de tránsito donde se socializo plan de acción y solicitud de certificación al banco de proyectos



En el mes de abril se presentaron 41 solicitudes al banco de proyectos, las cuales fueron atendidas de manera oportuna y realizando las correctas retroalimentaciones a los secretarios y funcionarios en caso de presentar algún error.

Se anexa captura de pantalla del correo aguadasbancoproyectos@gmail.com utilizado para las solicitudes de las certificaciones.

ALCALDÍA DE AGUADAS

LA SECRETARIA DE PLANEACION Y EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS

CERTIFICA:

Que el siguiente Proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos de la alcaldía de Aguadas Caldas para la vigencia 2025 y este cuenta con presupuesto y viabilidad tecnica favorable.

NOMBRE PROYECTO	Programación, difusión de eventos, expresiones artísticas y culturales. Gestión, protección, salvaguarda del patrimonio cultural en el municipio de Aguadas
BPIN MGA WEB	**20241701300041**
PROCESO DE VIABILIDAD TERRITORIO N°	1033706
RESPONSABLE	SECRETARIA DE EDUCACION – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LINEA ESTRATEGICA	DESARROLLO CON SENTIDO SOCIAL
SECTOR	CULTURA 33
PROGRAMA	Gestion, protección y salvaguarda del patrimonio cultural ribereñano 3302
PRODUCTO	Servicio de exposiciones 3302004
INDICADOR DE PRODUCTO	Exposiciones realizadas 330200400
INDICADOR PROPIO	Realizar exposiciones a través de diferentes eventos reconocidos de carácter municipales y departamentales

Para constancia, se firma en el Municipio de Aguadas a los 12 días del mes de abril de 2025.

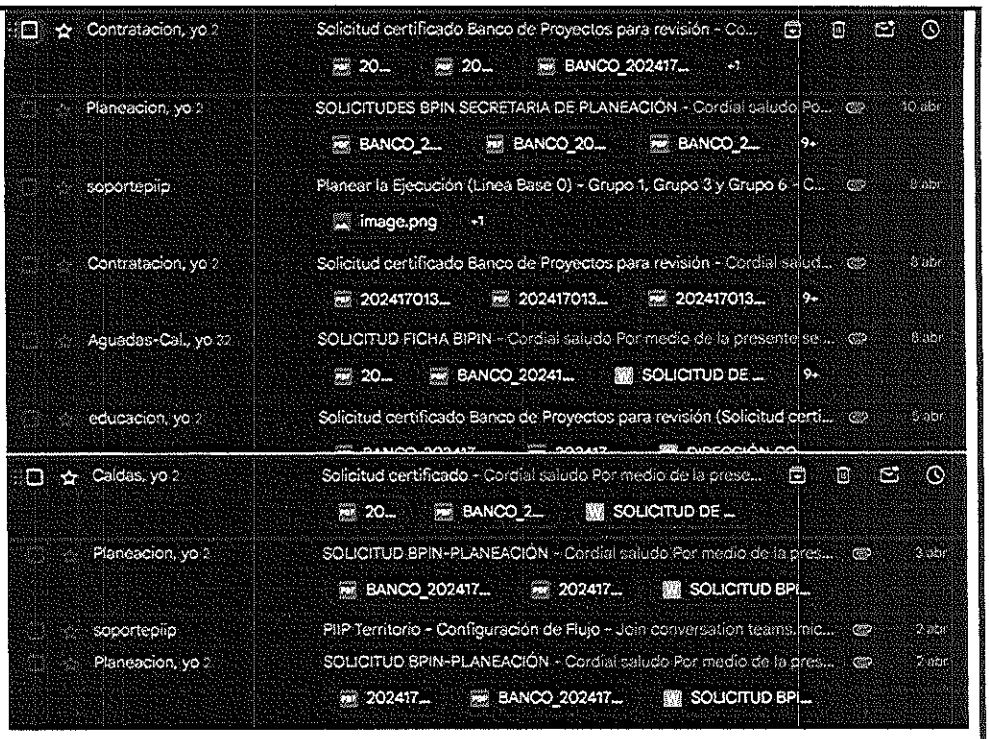
CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA
Profesional Banco de Proyectos

Funcionario o contratista		Firma	Fecha
Elaboró:	CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA		12-04-2025
Revisó:	HENRY GIOVANNY RUIZ SUAREZ		12-04-2025
Aprobó:	HENRY GIOVANNY RUIZ SUAREZ		12-04-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

www.aguadas-caldas.gov.co

Hacienda, yo 2	Solicitud Certificado del Banco de Proyectos - Cordial saludo Por me... BANCO_202417... 202417... SOLICITUD DE ...	23 abr
Caldas, yo 2	Solicitud certificado - Cordial saludo Por medio de la presente se env... 2024170... 2024170... BANCO_202417... +3	23 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... BANCO_202417... 2024170... 2024170... +2	12 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... 202417... BANCO_202417... LOGISTICA EVE...	10 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud... BANCO_202417... 202417... LOGISTICA EVE...	10 abr
Contratacion, yo 2	Solicitud certificado Banco de Proyectos para revisión - Cordial salud...	10 abr



Nombre	Fecha de modificacion	Tipo	Tamaño
EDUCACION	2025/04/12 1:50 PM	Carpeta de archivos	
GOBIERNO	2025/04/22 2:21 PM	Carpeta de archivos	
HACIENDA	2025/04/23 4:27 PM	Carpeta de archivos	
OBRAS PUBLICAS	2025/04/23 4:44 PM	Carpeta de archivos	
PLANEACION	2025/04/23 2:18 PM	Carpeta de archivos	
SALUD	2025/04/03 9:41 AM	Carpeta de archivos	
UMATA	2025/04/01 2:17 PM	Carpeta de archivos	



BANCO_2024170130056_400304402 POR...
Fecha de modificación: 2025/04/10 10:52 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACION Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 222 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130056_400301700 ACU...
Fecha de modificación: 2025/04/10 10:49 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACION Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 222 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130042_430100400 OSC...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:10 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACION Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 222 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130050_350202400 ALB...
Fecha de modificación: 2025/04/08 3:15 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130032_220206200 PAOL...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:13 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330108700_BAN...
Fecha de modificación: 2025/04/08 3:02 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 234 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330105300 MAN...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:56 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330105300 JUA...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:56 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 222 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330108700 OSC...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:53 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330108700 NICO...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:52 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330108700 MON...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:51 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330108700 DAVI...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:50 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 VALE...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:46 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 WIL...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:45 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 MISA...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:44 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 MAU...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:44 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 DAVI...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:43 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130043_430103700 CARL...
Fecha de modificación: 2025/04/08 2:42 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 225 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130052_240211200 COM...
Fecha de modificación: 2025/04/08 9:08 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130041_330105300-BAN...
Fecha de modificación: 2025/04/05 11:00 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 233 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130039_410400800.pdf
Fecha de modificación: 2025/04/05 9:41 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130073_459903100 VALE...
Fecha de modificación: 2025/04/03 11:07 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130073_459903100 VALE...
Fecha de modificación: 2025/04/02 10:39 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130039_410400800 MAT...
Fecha de modificación: 2025/04/01 2:24 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130039_410400800 DIVI...
Fecha de modificación: 2025/04/01 2:23 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130039_410400800 SAN ...
Fecha de modificación: 2025/04/01 2:23 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda


BANCO_2024170130046_170704300 JULI...
Fecha de modificación: 2025/04/01 2:17 PM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130073_459903100 MAR...
Fecha de modificación: 2025/04/01 10:48 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130054_400100700 VALE...
Fecha de modificación: 2025/04/01 10:44 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 223 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

BANCO_2024170130036_410102500 AYU...
Fecha de modificación: 2025/04/01 10:07 AM
C:\Usuarios\CACP\Escritorio\AGUADAS\SOLICITUD... — SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EL BANCO DE PR...
Tamaño: 179 KB
Autores: Carlos Alberto Contreras Poveda

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CONTRERAS
Contratista
Municipio de Aguadas Caldas

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS PARA FACTURAR AÑO 2025

Aguadas Caldas 30 de Abril de 2025

EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

NIT. 890.801.132-0

DEBE A

CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA

CC. 1.098.633.054

La suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (4.300.000.00)

POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 1420.10.4.010 DE 2025

Carlos Alberto Contreras Poveda

BENEFICIARIO

CC. 1.098.633.054

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095633064
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO CONTRERAS POVEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZARES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 N 3-39 APTO 201	TELÉFONO:	3222298
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7955257955	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1441734848

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.600	$ 0	$ 281.600
SUBTOTALES:										$ 281.600	$ 0	$ 281.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 220.000
SUBTOTALES:													$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 220.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNO	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1095633064	CONTRERAS POVEDA CARLOS ALBERTO	N°2 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.760.000				NO																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	PENSIÓN ISC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	SALUD ISC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	ARP ISC	ARP CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	PARAFISCALES ISC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.760.000	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.760.000	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.760.000	$ 109633905	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 510.800

Planilla Pagada
