"CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS NUMERO 1420.10.4.63 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y ANDREA IDARRAGA RINCÓN"

OBJETO: prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento y acompañamiento a los procesos de estructuración y gestión de proyectos, susceptibles de ser financiados con recursos de entidades de orden departamental y/o nacional y de regalías y la operación y actualización de información a las plataformas SUIFP y GESPROY de la secretaria de planeación del municipio de Aguadas, Caldas.

Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios de apoyo a la gestión son las siguientes:

- Apoyar la estructuración y realizar recomendaciones, acompañamiento y seguimiento para la revisión de los proyectos a financiarse con recursos de las entidades de orden departamental y nacional y del sistema general de regalías, sus respectivos presupuestos y componentes técnicos, metodológicos y constitutivos que requieran los proyectos presentados a dichas entidades.

- Acompañamiento de la formulación de proyectos bajo los parámetros de *metodología general aplicada (MGA)*

- Acompañar y orientar en la Recopilación y complementación de la información necesaria para realizar su respectivo cargue y posterior presentación en las mesas técnicas de las entidades.

- Apoyo en los ajustes a los proyectos en caso de requerirse.

- Asesoría y acompañamiento en la revisión y análisis de Gestión de Proyectos

- Brindar acompañamiento a la Secretaría de Planeación en las mesas *técnicas programadas para la revisión de los proyectos por parte de las* entidades en las cuales fueron radicados los proyectos.

- Brindar acompañamiento y asesoría en la formulación y viabilización de los proyectos en cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales financieros de los proyectos que van a ser financiados con los recursos del sistema general de Regalías, con base en las normas que rigen para la gestión de proyectos de inversión y a la ley 2056 del 2020 y demás normas que rigen la materia.

- Realizar el Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a los recursos del Sistema General de Regalías que sean ejecutados por el municipio de Aguadas a través de proyectos de inversión.

- Alimentar, mantener y reportar la información de los proyectos que se hayan ejecutado, estén en trámite y en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías para el municipio de Aguadas en los aplicativos de seguimiento de acuerdo a lo establecido por el DNP para recursos del SGR (SUIFP Y GESPROY).

- Verificar el estado de la plataforma SUIFP y GESPROY.

- Realizar los informes necesarios para la rendición de cuentas del municipio al SGR.

- Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato.

- Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.

- Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación.

PLAZO DE ENTREGA INICIAL: El presente contrato tendrá una duración a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.400.000) El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en periodos mensuales con corte al último día calendario del mes, o por fracción de mes de acuerdo a la ejecución del contrato.

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de ejecución del contrato establecidos en las obligaciones específicas, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a fecha de presentación del informe de supervisión y acta de avance de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 8.400.000**
VALOR ACTA PARCIAL N° 01:	$ 2.800.000
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 2.800.000
PENDIENTE POR GIRAR:	$ 2.800.000
FECHA:	31 de mayo de 2025

HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ
Secretario de Planeación

Andrea Idárraga Rincón
ANDREA IDARRAGA RINCON
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

ALCALDÍA DE AGUADAS

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	1420.10.4.63 DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS
CONTRATISTA	ANDREA IDARRAGA RINCON
IDENTIFICACIÓN	C.C. 24.873.646
OBJETO CONTRATADO	Prestación de servicios profesionales para el Fortalecimiento y Acompañamiento a los procesos de Estructuración y Gestión de Proyectos, Susceptibles de ser financiados con Recursos de Entidades de Orden departamental y/o Nacional y la operación y actualización de información a las plataformas SUIFP y GESPROY de la Secretaria de Planeación del Municipio de Aguadas, Caldas.
VALOR DEL CONTRATO	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.400.000)**
PLAZO DEL CONTRATO	El presente contrato tendrá una duración a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2025.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		292
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		454
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
ABRIL 05 DE 2025	ABRIL 05 DE 2025	JUNIO 30 DE 2025
SUPERVISOR	**NRO DE INFORME DE SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN**
HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ	**02**	31/05/2025

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

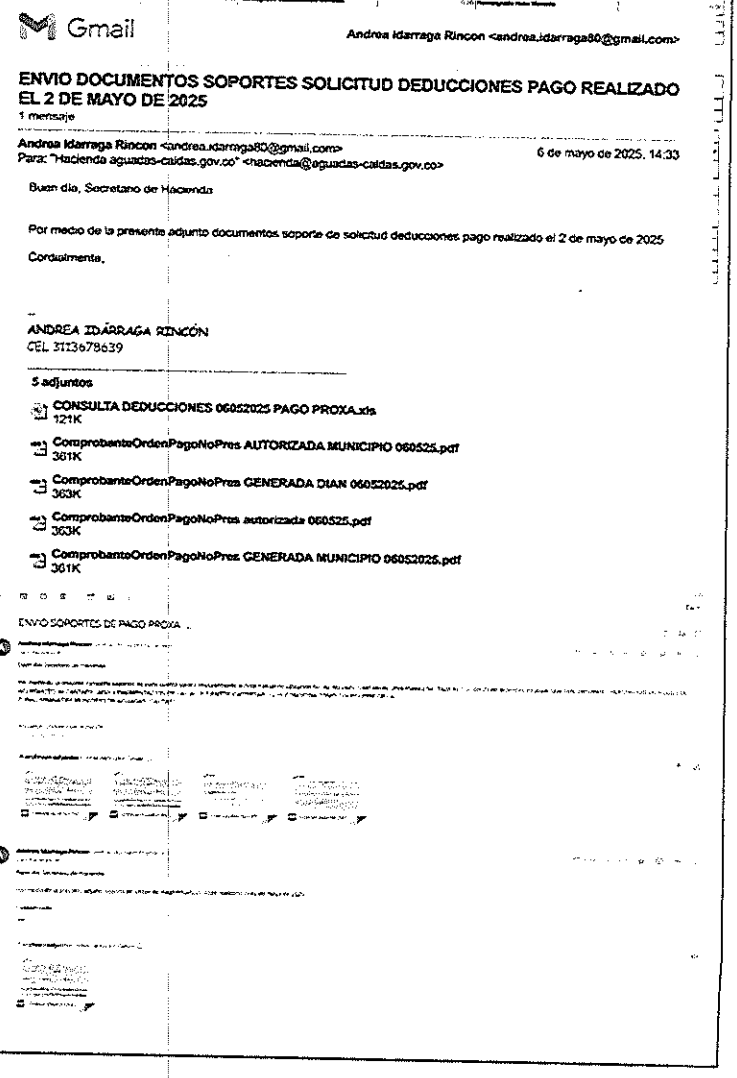
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
Apoyar la estructuración y realizar recomendaciones, acompañamiento y seguimiento para la revisión de los proyectos a financiarse con recursos de las	Durante el periodo la contratista realizó notificación vía telefónica al Alcalde los diferentes rubros Departamentales para realizar gestión de Recursos para financiar proyectos con Recursos del SGR Regional vigencia 2025-2026.

entidades de orden departamental y nacional y del sistema general de regalías, sus respectivos presupuestos y componentes técnicos, metodológicos y constitutivos que requieran los proyectos presentados a dichas entidades.	
Acompañamiento de la formulación de proyectos bajo los parámetros de metodología general aplicada (MGA)	En el presente periodo no se realizó acompañamiento de la formulación de proyectos bajo los parámetros de metodología general aplicada (MGA)
Acompañar y orientar en la Recopilación y complementación de la información necesaria para realizar su respectivo cargue y posterior presentación en las mesas técnicas de las entidades.	Se realizó acompañamiento al secretario de Planeación en el proceso de solicitud mesa técnica revisión Proyecto BPIN 2023170130029 - MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE AGUADAS – solicitando desbloqueo de giros, para posterior pago y liquidación de los contratos correspondientes.
Apoyo en los ajustes a los proyectos en caso de requerirse	Durante este período no se ejecutó esta actividad
Asesoría y acompañamiento en la revisión y análisis de gestión de proyectos	Durante el periodo no se ejecutó esta actividad.
Brindar acompañamiento a la Secretaría de Planeación en las mesas técnicas programadas para la revisión de los proyectos por parte de las entidades en las cuales fueron radicados los proyectos	Durante el periodo se brinda acompañamiento asesoría en la formulación y viabilizara de los proyectos en cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales financieros de los proyectos en la formulación apoyo en la construcción y desarrollo de los proyectos, con base en las normas que rigen para la gestión de proyectos de inversión y a la ley 2056 del 2020 y demás normas que rigen la materia.
Brindar acompañamiento y asesoría en la formulación y Viabilización de los proyectos en cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales financieros de los proyectos que van a ser financiados con los recursos del sistema general de regalías, con base en las normas que rigen para la gestión de proyectos de inversión y a la ley 2056 del 2020 y demás normas que rigen la materia.	Durante este periodo se realizaron las gestiones pertinentes impulsadas por la administración municipal, las cuales son planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional. así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado.

- Acta Parcial de Ejecución No. 02 del 2025. Contrato de Obra Pública No. 1420.10.1.07 del 21 de diciembre de 2024. Que tiene por objeto: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 y 10 CONOCIDA COMO COLEGURRE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS"


SPGR

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL


Gmail

Andrea Idarraga Rincon <andrea.idarraga80@gmail.com>

ENVIO DOCUMENTOS SOPORTES SOLICITUD DEDUCCIONES PAGO REALIZADO EL 2 DE MAYO DE 2025

1 mensaje

Andrea Idarraga Rincon <andrea.idarraga80@gmail.com> 6 de mayo de 2025, 14:33
Para: "Hacienda aguadas-caldas.gov.co" <hacienda@aguadas-caldas.gov.co>

Buen dia, Secretario de Hacienda

Por medio de la presente adjunto documentos soporte de solicitud deducciones pago realizado el 2 de mayo de 2025

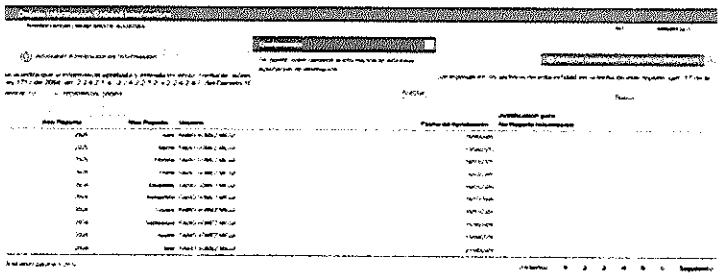
Cordialmente,

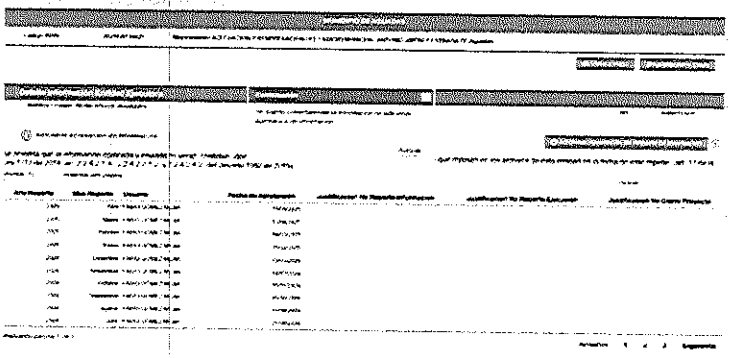
--
ANDREA IDÁRRAGA RINCÓN
CEL 3113678639

5 adjuntos

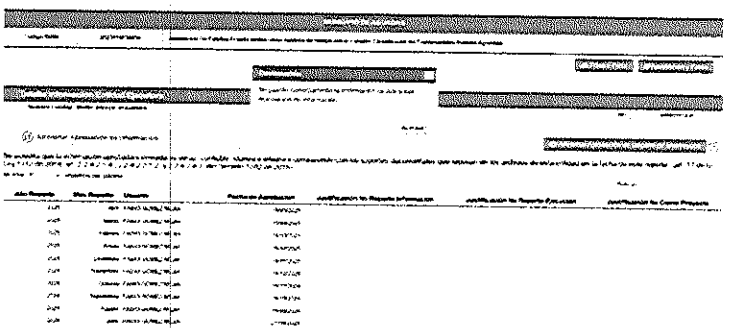
- CONSULTA DEDUCCIONES 06052025 PAGO PROXA.xls 121K
- ComprobanteOrdenPagoNoPres AUTORIZADA MUNICIPIO 060525.pdf 361K
- ComprobanteOrdenPagoNoPres GENERADA DIAN 06052025.pdf 363K
- ComprobanteOrdenPagoNoPres autorizada 060525.pdf 363K
- ComprobanteOrdenPagoNoPres GENERADA MUNICIPIO 06052025.pdf 361K

ENVIO SOPORTES DE PAGO PROXA

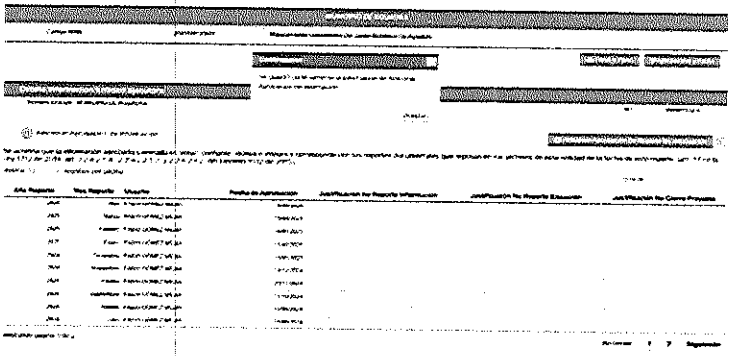
	- En el presente período realicé apoyo a la Secretaría de Hacienda en el proceso de solicitud de deducciones ante el Ministerio de Hacienda y crédito Público
Realizar el Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a los recursos del Sistema General de Regalías que sean ejecutados por el municipio de Aguadas a través de proyectos de inversión	Durante este periodo se suministró información de los proyectos en la plataforma GESPROY 3.0 el sistema que apoya las actividades de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR); como entidad ejecutora se encarga de reportar la información correspondiente a la programación, contratación y ejecución de los proyectos financiados con recursos girados por regalías. En el presente seguimiento se describe el estado actual de los proyectos de inversión y el reporte en el GESPROY donde se realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad programada en los tiempos establecidos en el proyecto. Se realizó APRUEBA Y ENVÍA con el día 15 de febrero se aprobó mediante el aplicativo con corte al último día del mes anterior fue analizada y consolidada por el sistema de monitoreo seguimiento control y evaluación del SGR. La consistencia de la información a portada de la información GESPROY. - Construcción de pavimento rígido de la carrera 5 vía urbana del municipio de Aguadas – BPIN 2019170130038  – Interventoría - Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029



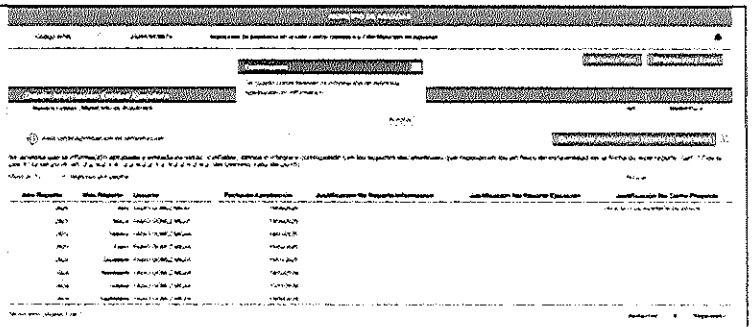


- Instalación De Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación al Cambio Climático en las Comunidades Rurales Aguadas – BPIN 2023170130030




- Mejoramiento Cerramiento del Jardín Botánico de Aguadas – BPIN 2023170130031.



- Reposición de pavimento en la calle 7 entre carreras 6 y 7 del Municipio de Aguadas – BPIN 2024170130075.

	 - Reposición de pavimento cll 2 entre carreras 4 y 5 en el municipio de Aguadas – BPIN 2024170130076.  - Reposición de pavimento acueducto y alcantarillado en la calle 8 sector COLEGURRE en el municipio de Aguadas. 
Alimentar, mantener y reportar la información de los proyectos que se hayan ejecutado, estén en trámite y en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías para el municipio de Aguadas en los aplicativos de seguimiento de acuerdo a lo establecido por el DNP para recursos del SGR (SUIFP Y GESPROY)	Durante el periodo se verificó el estado de los proyectos, Se mantiene actualizada la documentación correspondiente a los proyectos asignados en los diferentes sistemas de información y la ejecución Actualmente la administración Municipal de Aguadas –Caldas registra en la plataforma GESPROY A la fecha se tiene 6 proyectos de inversión provenientes de los recursos del Sistema General de regalías, este es el estado:

	MUNICIPIO DE AGUADAS - Construcción de pavimento rígido de la carrera 5 vía urbana del municipio de Aguadas – BPIN 2019170130038, estado terminado en la espera de que la ERAN realice el proceso de cierre por parte de la entidad ejecutora. - Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029 – en proceso de ejecución, con ejecución cargada a través de control de cambios y envío de carta para realizar mesa técnica para habilitar presupuesto para liquidar los contratos de ejecución. - Instalación De Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación al Cambio Climático en las Comunidades Rurales Aguadas – BPIN 2023170130030 – en proceso de ejecución, en proceso de ejecución, con programación de borrado de ejecución para corrección de esta. - *Mejoramiento Cerramiento* Del Jardín Botánico De Aguadas – BPIN 2023170130031 - en proceso de ejecución, en proceso de ejecución, con liquidación y proceso de cierre de proyecto. - Reposición de pavimento en la calle 7 entre carreras 6 y 7 del Municipio de Aguadas – BPIN 2024170130075 – estado terminado - proceso se liquidación y cierre - Reposición de pavimento cll 2 entre carreras 4 y 5 en el municipio de Aguadas – BPIN 2024170130076 - estado terminado - proceso se liquidación y cierre - *Reposición de pavimento acueducto y alcantarillado en* la calle 8 sector COLEGURRE en el municipio de Aguadas – contratado en ejecución
Verificar el estado de la plataforma SUIFP y GESPROY	Durante este periodo se verificó el estado de la plataforma SUIFP Y GESPROY 3.0
Realizar los informes necesarios para la rendición de cuentas del municipio al SGR	Se envió carta a monitoreo y control SGR DNP – *firmada por el alcalde, solicitando mesa técnica para* revisión del proyecto Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029, para solicitar desbloqueo de recursos y proceder a liquidar y cerrar el proyecto en la plataforma.

	
Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	Durante este periodo se ha dado cumplimiento a esta actividad ejecutando las obligaciones contractuales de buena fe, sin haberse realizado una relación de subordinación
Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante	*Durante este periodo no se desempeñaron actividades* que no estén contenidas en las obligaciones contractuales, se cumplió de acuerdo con lo solicitado en el mismo sin ninguna subordinación
Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación	Durante este periodo se cumplieron con las obligaciones contractuales evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación.

C. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO

PERIODO DE PAGO	VALOR DE PAGO	ESTADO	COMPROBANTE DE EGRESO
ABRIL	$ 2.800.000	PAGO	934-03/05/2025
MAYO	$ 2.800.000	PENDIENTE	
TOTAL	$ 5.600.000		

D. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

Durante el periodo que se realizó la supervisión, no fueron impartidas o realizadas observaciones al contratista.

E. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Durante este periodo no se presentaron ni suspensiones, ni reanudaciones, ni modificaciones

F. VERIFICACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Planilla	Periodo	Honorarios	IBC	Salud	Pensiones	ARL
7968263670	ABRIL	2.800.000	1.423.500	205.000	262.400	8.600
7968264081	MAYO	2.800.000	1.423.500	205.000	262.400	8.600

G. ANEXOS

Acta parcial N° 02
Informe de actividades.
Cuenta de cobro
Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.

H. APROBACIÓN DEL PAGO

Si se cumplen los presupuestos mínimos consignados en el contrato, el supervisor le debe impartir aprobación.

El supervisor Certifica que a la fecha el contratista cumplió con las obligaciones específicas establecidas en el contrato y por lo tanto se puede realizar el pago de las actividades supervisadas.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Aguadas a los *treinta y un (31) días del mes de mayo de 2025.*

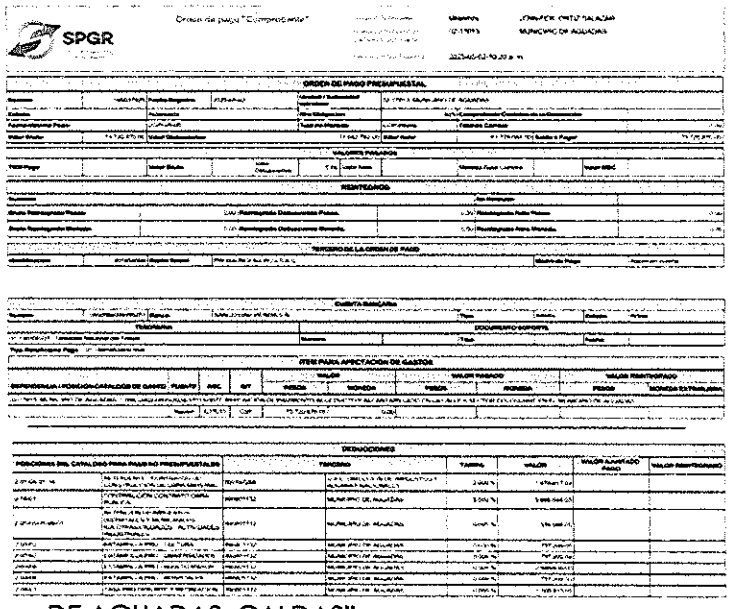
HENRY GIOVANNY IPUZ SUAREZ
Secretario de Planeación


INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	1420.10.4.63 DE 2025		
CONTRATISTA	ANDREA IDARRAGA RINCON	**IDENTIFICACIÓN**	24.873.646
NRO DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**	
2		**31/05/2025**	

A. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

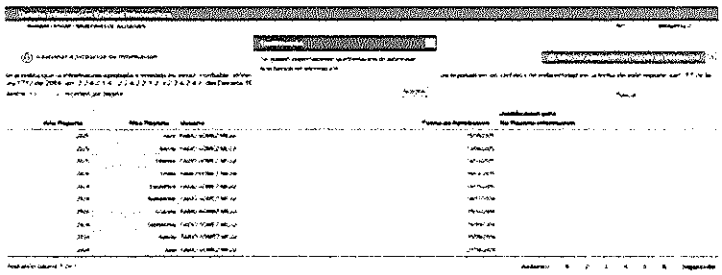
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**
Apoyar la estructuración y realizar recomendaciones, acompañamiento y seguimiento para la revisión de los proyectos a financiarse con recursos de las entidades de orden departamental y nacional y del sistema general de regalías, sus respectivos presupuestos y componentes técnicos, metodológicos y constitutivos que requieran los proyectos presentados a dichas entidades.	Durante el periodo se realizó notificación vía telefónica al Alcalde los diferentes rubros Departamentales para realizar gestión de Recursos para financiar proyectos con Recursos del SGR Regional vigencia 2025-2026.
Acompañamiento de la formulación de proyectos bajo los parámetros de metodología general aplicada (MGA)	En el presente periodo no se realizó acompañamiento de la formulación de proyectos bajo los parámetros de metodología general aplicada (MGA)
Acompañar y orientar en la Recopilación y complementación de la información necesaria para realizar su respectivo cargue y posterior presentación en las mesas técnicas de las entidades.	Realice acompañamiento al secretario de Planeación en el proceso de solicitud mesa técnica revisión Proyecto BPIN 2023170130029 - MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE AGUADAS – solicitando desbloqueo de giros, para posterior pago y liquidación de los contratos correspondientes.
Apoyo en los ajustes a los proyectos en caso de requerirse	Durante este período no se ejecutó esta actividad
Asesoría y acompañamiento en la revisión y análisis de gestión de proyectos	Durante el periodo no se ejecutó esta actividad.

Brindar acompañamiento a la Secretaría de Planeación en las mesas técnicas programadas para la revisión de los proyectos por parte de las entidades en las cuales fueron radicados los proyectos	Durante el periodo se brinda acompañamiento asesoría en la formulación y viabilizara de los proyectos en cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales financieros de los proyectos en la formulación apoyo en la construcción y desarrollo de los proyectos, con base en las normas que rigen para la gestión de proyectos de inversión y a la ley 2056 del 2020 y demás normas que rigen la materia.
Brindar acompañamiento y asesoría en la formulación y Viabilización de los proyectos en cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales financieros de los proyectos que van a ser financiados con los recursos del sistema general de regalías, con base en las normas que rigen para la gestión de proyectos de inversión y a la ley 2056 del 2020 y demás normas que rigen la materia.	Durante este periodo se realizaron las gestiones pertinentes impulsadas por la administración municipal, las cuales son planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión Institucional. así como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las constituidas en el periodo informado. - Acta Parcial de Ejecución No. 02 del 2025. Contrato de Obra Pública No. 1420.10.1.07 del 21 de diciembre de 2024. Que tiene por objeto: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 9 y 10 CONOCIDA COMO COLEGURRE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO  DE AGUADAS, CALDAS"

	- En el presente período realicé apoyo a la Secretaría de Hacienda en el proceso de solicitud de deducciones ante el Ministerio de Hacienda y  Gmail Andrea Idarraga Rincon <andrea.idarraga80@gmail.com> **ENVIO DOCUMENTOS SOPORTES SOLICITUD DEDUCCIONES PAGO REALIZADO EL 2 DE MAYO DE 2025** 1 mensaje Andrea Idarraga Rincon <andrea.idarraga80@gmail.com> 6 de mayo de 2025, 14:33 Para: "Hacienda aguadas-caldas.gov.co" <hacienda@aguadas-caldas.gov.co> Buen dia. Secretario de Hacienda Por medio de la presente adjunto documentos soporte de solicitud deducciones pago realizado el 2 de mayo de 2025 Cordialmente, ANDREA IDÁRRAGA RINCÓN CEL 3113678639 5 adjuntos CONSULTA DEDUCCIONES 06052025 PAGO PROXA.xls 121K ENVIO SOPORTES DE PAGO PROXA crédito Público.
Realizar el Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a los recursos del Sistema General de Regalías que sean ejecutados por el municipio de Aguadas a través de proyectos de inversión	Durante este periodo se suministró información de los proyectos en la plataforma GESPROY 3.0 el sistema que apoya las actividades de seguimiento, control y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR); como entidad ejecutora se encarga de reportar la información correspondiente a la programación, contratación y ejecución de los proyectos financiados con recursos *girados por regalías.* En el presente seguimiento se describe el estado actual de los proyectos de inversión y el reporte en el GESPROY donde se realiza seguimiento al cumplimiento de la actividad programada en los tiempos establecidos en el proyecto. *Se realizó* APRUEBA Y ENVÍA *con el día 15 de febrero se* aprobó mediante el aplicativo con corte al último día del mes anterior fue analizada y consolidada por el sistema de monitoreo seguimiento control y evaluación del SGR. La consistencia de la información a portada


de la información GESPROY.

- Construcción de pavimento rígido de la carrera 5 vía urbana del municipio de Aguadas – BPIN 2019170130038

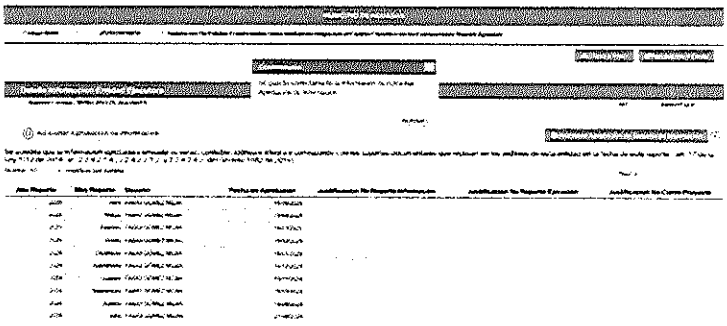


– Interventoría

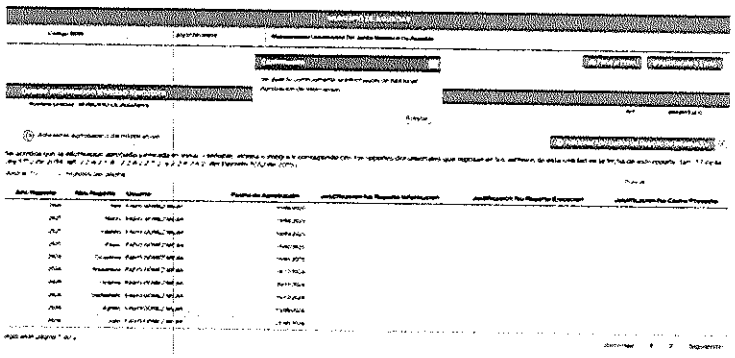
- Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029



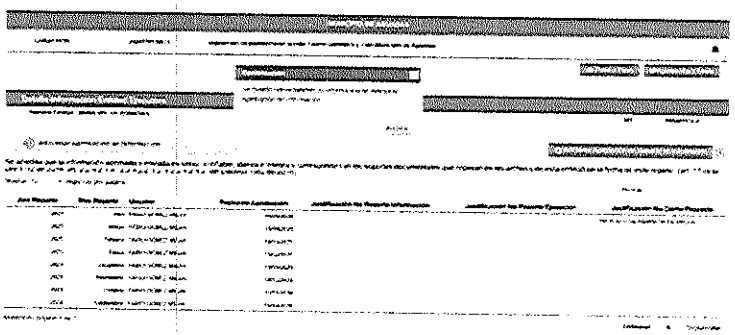
- Instalación De Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación al Cambio Climático en las Comunidades Rurales Aguadas – BPIN 2023170130030



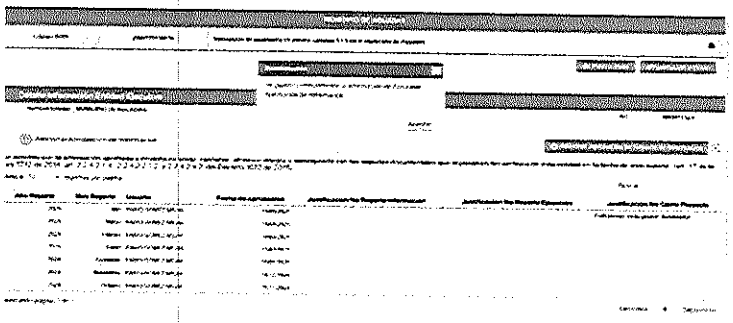
- Mejoramiento Cerramiento del Jardín Botánico de Aguadas – BPIN 2023170130031.




- Reposición de pavimento en la calle 7 entre carreras 6 y 7 del Municipio de Aguadas – BPIN 2024170130075.




- Reposición de pavimento cll 2 entre carreras 4 y 5 en el municipio de Aguadas – BPIN 2024170130076.



- Reposición de pavimento acueducto y alcantarillado en la calle 8 sector COLEGURRE en el municipio de Aguadas.

	
Alimentar, mantener y reportar la información de los proyectos que se hayan ejecutado, estén en trámite y en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías para el municipio de Aguadas en los aplicativos de seguimiento de acuerdo a lo establecido por el DNP *para recursos del SGR (SUIFP Y* GESPROY)	Durante el periodo se verificó el estado de los proyectos, Se mantiene actualizada la documentación correspondiente a los proyectos asignados en los diferentes sistemas de información y la ejecución Actualmente la administración Municipal de Aguadas –Caldas registra en la plataforma GESPROY A la fecha se tiene 6 proyectos de inversión provenientes de los recursos del Sistema General de regalías, este es el estado: MUNICIPIO DE AGUADAS - Construcción de pavimento rígido de la carrera 5 vía urbana del municipio de Aguadas – BPIN 2019170130038, estado terminado en la espera de que la ERAN realice el proceso de cierre por parte de la entidad ejecutora. - Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029 – en proceso de ejecución, con ejecución cargada a través de control de cambios y envío de carta para realizar mesa técnica para habilitar presupuesto para liquidar los contratos de ejecución. - Instalación De Estufas Ecoeficientes como medida de mitigación al Cambio Climático en las Comunidades Rurales Aguadas – BPIN 2023170130030 – en proceso de ejecución, en proceso de ejecución, con programación de borrado de ejecución para corrección de esta. - Mejoramiento Cerramiento Del Jardín Botánico De Aguadas – BPIN 2023170130031 - en proceso de ejecución, en proceso de ejecución, con liquidación y proceso de cierre de proyecto. - Reposición de pavimento en la calle 7 entre carreras 6 y 7 del Municipio de Aguadas – BPIN 2024170130075 – estado terminado - proceso se liquidación y cierre - Reposición de pavimento cll 2 entre carreras 4 y 5 en el municipio de Aguadas – BPIN 2024170130076 - estado terminado - proceso se liquidación y cierre - Reposición de pavimento acueducto y alcantarillado en la calle 8 sector COLEGURRE en el municipio de Aguadas

	– contratado en ejecución
Verificar el estado de la plataforma SUIFP y GESPROY	Durante este periodo se verificó el estado de la plataforma SUIFP Y GESPROY 3.0
Realizar los informes necesarios para la rendición de cuentas del municipio al SGR	Se envío carta a monitoreo y control SGR DNP – firmada por el alcalde, solicitando mesa técnica para revisión del proyecto Mejoramiento ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO JIMÉNEZ ESTRADA DE Aguadas – BPIN 2023170130029, para solicitar desbloqueo de recursos y proceder a liquidar y cerrar el proyecto en la plataforma. 
Informar al supervisor del contrato, cualquier situación que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	Durante este periodo se ha dado cumplimiento a esta actividad ejecutando las obligaciones contractuales de buena fe, sin haberse realizado una relación de subordinación
Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante	Durante este periodo no se desempeñaron actividades que no estén contenidas en las obligaciones contractuales, se cumplió de acuerdo con lo solicitado en el mismo sin ninguna subordinación
Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación	Durante este periodo se cumplieron con las obligaciones contractuales evitando en todo caso la configuración de una relación de subordinación.

Se adjunta a este informe el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la cuenta de cobro correspondiente a este mes.

Andrea Idárraga Rincón

ANDREA IDARRAGA RINCON
Contratista
Municipio de Aguadas Caldas

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR AÑO 2025

Aguadas 31 de mayo de 2025

EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
NIT. 890.801.132-0

DEBE A
ANDREA IDARRAGA RINCON
24.873.646
NIT/C.C NRO.

LA SUMA DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)

Por concepto de: Prestación de servicios profesionales para el Fortalecimiento y *Acompañamiento a los procesos de Estructuración y Gestión de Proyectos*, Susceptibles de ser financiados con Recursos de Entidades de Orden departamental y/o Nacional y de Regalías y la operación y actualización de información a las plataformas SUIFP y GESPROY de la Secretaria de Planeación del Municipio de Aguadas, Caldas al contrato 1420.10.4.63 DE 2025.

Andrea Idárraga Rincón
BENEFICIARIO **ANDREA IDARRAGA RINCON**
C.C. 24.873.646 de Pensilvania Caldas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24873648
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANDREA IDARRAGA RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 19D 4A 3-09	TELÉFONO:	3122733
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - ANDREA IDARRAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7968264081	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1486040209

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 292.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.000	$ 0	$ 292.000
SUBTOTALES:										$ 292.000	$ 0	$ 292.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 228.200
SUBTOTALES:													$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 228.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 9.600
SUBTOTALES:										$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 9.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |
